

Diana Catalina Bejarano Barbosa (REG)

2023ERO160916


De: personero villagarzon-putumayo.gov.co <personero@villagarzon-putumayo.gov.co>
Enviado el: lunes, 4 de septiembre de 2023 5:45 p. m.
Para: cgr@contraloria.gov.co
Asunto: respuesta oficio 801113 expediente 2023EE0109454
Datos adjuntos: OFICIO PMV-0364-2023.pdf; ACTA VISITA OCULAR MACROACUEDUCTO.pdf; OFICIO REQUERIMIENTO 341.pdf; RESPUESTA PLANEACION _AMV-SPIM-CE- 746-2023.pdf

Villagarzón, 4 de septiembre 2023

Doctor:
CRISTIAN CASTRO MEJIA
Contralor Delegado Intersectorial No. 01
Grupo interno de trabajo Coordinación para la Responsabilidad Fiscal.
Mocoa.

POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO ME PERMITO ADJUNTAR OFICIO No. PMV-364 DE 2023, POR EL CUAL SE DA RESPUESTA AL REQUERIMIENTO 2023EE0109454.

SIN OTRO PARTICULAR.



PMV – 0364

Villagarzón, 4 de septiembre 2023

Doctor:
CRISTIAN CASTRO MEJIA
Contralor Delegado Intersectorial No. 01
Grupo interno de trabajo Coordinación para la Responsabilidad Fiscal.
Mocoa.

Asunto: respuesta oficio 801113 expediente 2023ee0109454
Proceso: responsabilidad fiscal No. URFR-PRF-044-2019

Cordial saludo.

La Personería Municipal de Villagarzón Putumayo, en atención al oficio del asunto procede a dar respuesta al requerimiento de la siguiente manera:

1. La Personería Municipal de Villagarzón Putumayo, NO es la entidad competente para expedir certificación de utilidad y funcionamiento de las obras del contrato 056 de 2011, en primera medida porque la Personería no cuenta con el presupuesto para contratar profesionales en el área de ingeniería civil, profesional idóneo que podría verificar y establecer la utilidad y funcionamiento de las obras del MACROACUEDUCTO, en segunda medida, como una Personería de sexta categoría, por tal motivo la planta de personal se circunscribe al PERSONERO y la AUXILIAR ADMINISTRATIVO (secretaria).
2. A pesar de no contar con los profesionales idóneos y la falta de conocimiento en ingeniería civil, se procedió a realizar una visita de inspección ocular a la bocatoma del macroacueducto, por las constantes fallas en la prestación del servicio de la comunidad de Puerto Umbría, afectados constantes por la falta del suministro de agua, se anexa copia del acta de la visita de inspección ocular.
3. En aras de conocer la utilidad y funcionamiento de las obras del contrato No. 056 de 2011, se requirió mediante oficio PMV -0031 a la secretaria de

Trabajamos por los derechos

Planeación e Infraestructura Municipal de Villagarzón, certifique la utilidad y funcionamiento de las obras del contrato No. 056 de 2011.

4. El día 30 de agosto de 2023, mediante radicado interno de la Personería 974, se recibe respuesta por parte de la secretaria de Planeación e infraestructura Municipal a los cinco (05) ítems del requerimiento.

La Personería Municipal reconoce que la comunidad de Puerto Umbría ha sido la mayor afectada con la prestación del servicio de agua, conocimiento que se tiene a través de las diferentes manifestaciones realizadas por la comunidad, plantones con cierre de la vía nacional, acciones judiciales en contra de la administración.

Se anexa los siguientes documentos:

- Acta de visita ocular a la bocatoma sobre el río Dorado
- Copia oficio PMV – 0341
- Copia Respuesta Brindada por la secretaria de planeación Municipal en 96 folios

Sin otro particular



GABRIEL OSWALDO YELA GOYES
Personero Municipal de Villagarzón

ACTA DE DILIGENCIA DE VISITA BOCATOMA MACROACUEDUCTO

La Personería Municipal de Villagarzón, en cumplimiento a las funciones de garantía de los derechos fundamentales, como también, el acceso a los servicios públicos domiciliarios básicos especialmente el derecho al acceso a agua potable, conociendo la situación que atraviesa el corregimiento de puerto Umbría por la falta de agua de manera constante, y las diferentes acciones de dialogo, concertación y medidas de hecho, tomadas por la comunidad por la interrupción del líquido vital por más de 20 días y en diferentes momentos, la Personería en compañía del corregidor de Puerto Umbría y voceros de la comunidad, se procede a realizare una visita de verificación a la bocatoma del Macro acueducto que abastece de agua al corregimiento de puerto Umbría.

La bocatoma del macro acueducto se encuentra ubicada en la parte alta de la vereda Tebaida del Municipio de Mocoa, motivo por el cual se debe trasladar por un tiempo de 40 minutos en vehículo desde Villagarzón hasta el caserío de la tebaida una vez ahí, se debe trasladar a pie, por un tiempo de hora y media, por un camino improvisado.

Durante el recorrido se encontraron materiales de construcción a la intemperie, los mismos que serían utilizados para la adecuación y mejoramiento de la bocatoma.

De igual manera se avanzó hasta el tanque desarenador, el cual estaba con una capa grande de residuos de arena, no se había realizado la limpieza correspondiente, el nivel del agua era muy escaso, ya que la salida de agua era muy lenta, el nivel de agua en el vertedero de salida no alcanza a tapar el tubo de conducción hacia el tanque de almacenamiento, el caudal es muy escaso, se observa que para aumentar el caudal en la salid del tanque desarenador, realizaron fracturas del concreto, específicamente la pared divisoria entre la zona de sedimentación y la zona de salida.

Después de recorrer 1000 metros lineales encontramos la bocatoma al lado del rio dorado, se procedió a realizar una inspección ocular del tanque de captación de agua, el mismo que se encontraba con bastante arena que no permitía que la entrada del agua sea en mayor proporción hacia el tanque de almacenamiento y posterior conducción al tanque desarenador principal, el nivel de agua era muy bajo en el tanque de captación.

Trabajamos por tus derechos



Palacio Municipal de Villagarzón / Cll 2 N° 5-14



320 496 2991



personero@villagarzon-putumayo.gov.co

Código postal urbano: (032) 861080 / Código postal rural: (032) 861087 - 861088

Las líneas de conducción es decir la tubería está en mal estado, se observó una fuga de agua en la tubería de conducción, un empate de tubería amarrado con plásticos y palos de madera, la tubería se encontraba sostenida en piedras, no tenía anclajes fijos en concreto o tubería, aumentando el riesgo de fracturas y desempate de la tubería.

Una vez realizada la verificación de la bocatoma y su tanque de captación, y el tanque desarenador ubicados en la parte alta del rio el dorado, posteriormente se revisó la planta de tratamiento que se encuentra ubicada en la vereda la tebaída.

La planta de tratamiento de agua del macro acueducto, se encuentra en un total abandono, la infraestructura está llena de maleza, deterioro de la infraestructura, falta de pintura, no tiene seguridad, el ingreso a la planta es libremente y sin ninguna restricción a los particulares, exponiendo la infraestructura existente a diferentes delitos, tales como hurtos, actos vandálicos, desmantelamiento y daños generales a la infraestructura.

De la infraestructura existente de la planta de tratamiento se evidencian dos tanques desarenadores, que están con maleza en la parte interna, y sin funcionamiento, tubería desempatada.

El tanque de almacenamiento y distribución de agua tiene una medida de 8x8x5, es decir 8 metros de fondo y ancho y 5 metros de profundidad, al verificar el nivel de agua del tanque, se logró establecer que el máximo de agua era alrededor de 1 metro, una cantidad de agua muy mínima para el total de la capacidad del tanque, el tanque tenía una sola entra de agua sin ningún tratamiento, agua directa desde el rio dorado, no existe proceso de potabilización, el agua se distribuye de manera cruda.

El tanque de almacenamiento y distribución cuenta con dos tubos que llenan el tanque, de los dos tubos, solo uno está en funcionamiento y no es suficiente para lograr aumentar el nivel de agua almacenada.

La visita a la bocatoma se realizó por los continuos problemas de falta de agua que tiene la comunidad del Puerto Umbría, comunidad que ha sido la más perjudicada con la falta de funcionamiento del Macro acueducto, el cual no satisface las necesidades mínimas de agua que requieren las familias.

Trabajamos por tus derechos



Palacio Municipal de Villagarzón / Cll 2 N° 5-14



320 496 2991



personero@villagarzon-putumayo.gov.co

Código postal urbano: (032) 861080 / Código postal rural: (032) 861087 - 861088

Material fotográfico de materiales abandonados al inicio del camino a la bocatoma.





Fotografías del recorrido hacia la bocatoma del río dorado.





Trabajamos por tus derechos

Fotografías tanque Desarenado entra de agua con nivel de agua bajos.

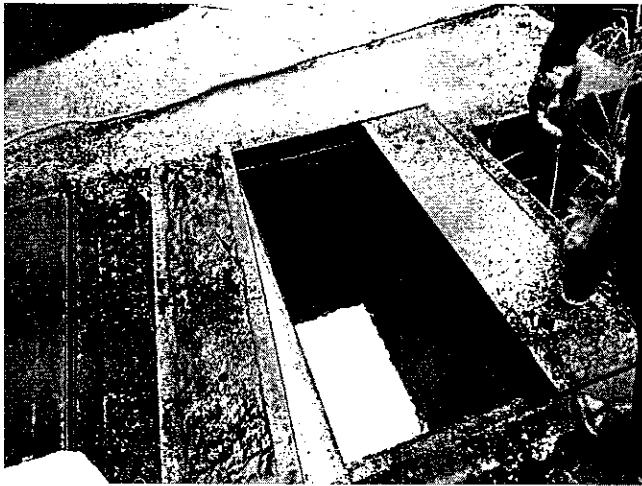

Fotografías de salida de agua del tanque desarenador.

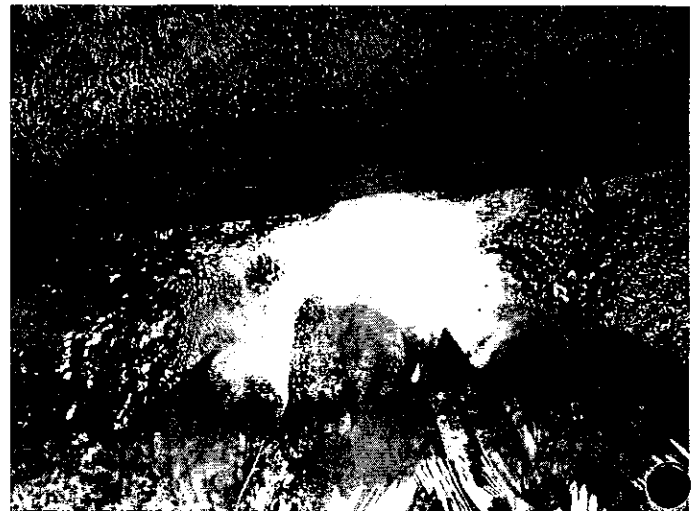

Trabajamos por tus derechos

Materiales abandonados, para el mejoramiento de la bocatomá



Trabajamos por tus derechos



Palacio Municipal de Villagarzón / Cll 2 N° 5-14



320 496 2991




personero@villagarzon-putumayo.gov.co

Código postal urbano: (032) 861080 / Código postal rural: (032) 861087 - 861088



Fotografías Bocatoma, tanque de captación y redes de tubería de distribución de agua







Trabajamos por tus derechos

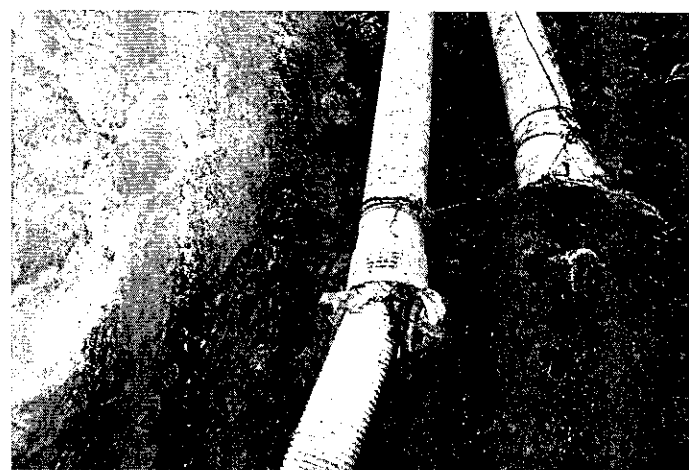

Fotografías planta de tratamiento

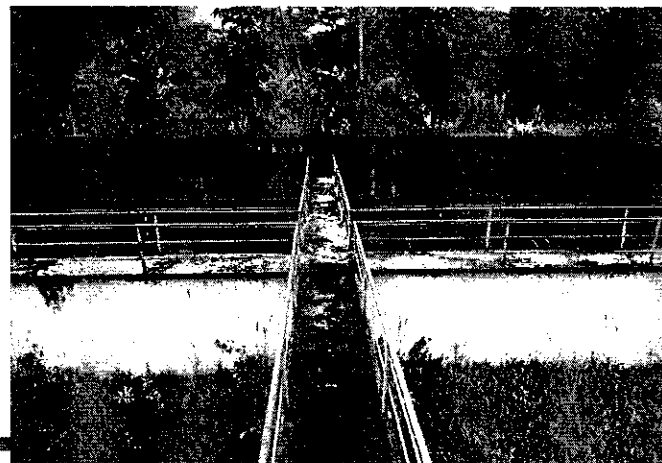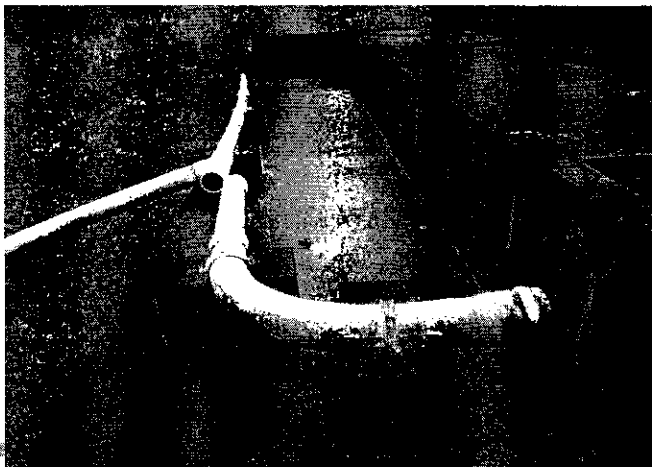

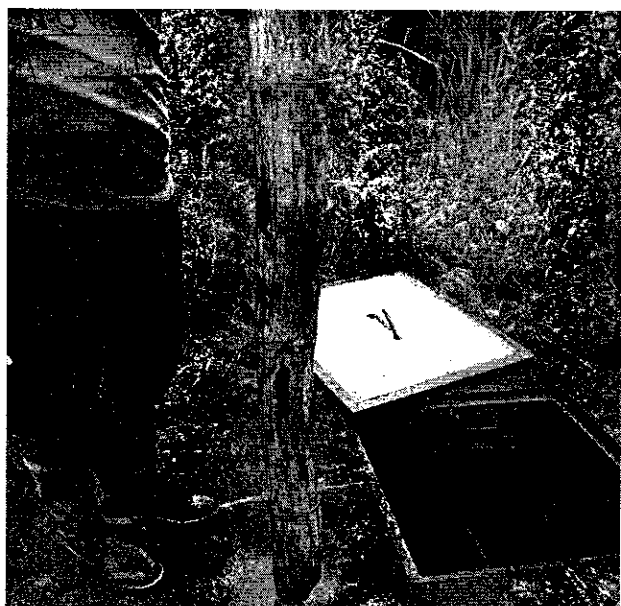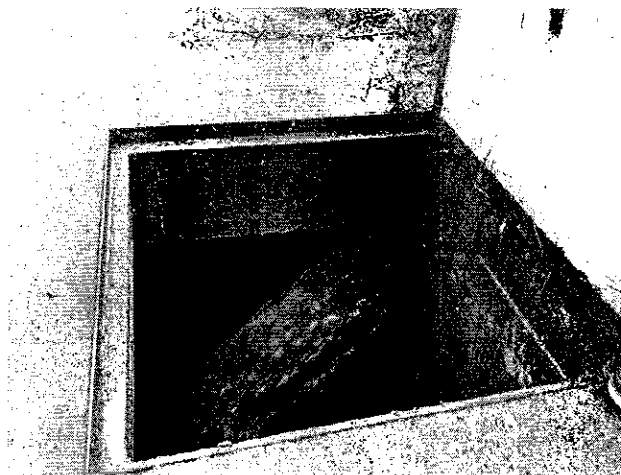


Fotografías tanque de almacenamiento parte interna y nivel de agua.




GABRIEL OSWALDO YELA GOYES.
Personero Municipal de Villagarzón

Trabajamos por tus derechos

 <p>MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN "Unidos de verdad"</p>	<p align="center">REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN <i>Despacho Municipal</i> NIT. 800.054.249-0</p>			
Código: 110	Versión: 2	Vigente desde: 1º de enero de 2022		
COMUNICACIONES EXTERNAS				

AMV-SPIM-CE- 746-2023

Villagarzón, 17 de Agosto 2023

Señor

GABRIEL OSWALDO YELA GOYES

Personero Municipal de Villagarzón

Villagarzón

Asunto: Respuesta a su oficio No. PMV-0341 "solicitud de información."

Cordial Saludo,

En atención a la solicitud de información realizada, me permito informar:

1. Esta administración No emite certificación de utilidad, funcionamiento y operación de las obras del macroacueducto ejecutado mediante contrato de obra pública No. 056 de 2011, toda vez que a la fecha, dicho contrato NO se encuentra liquidado; según el expediente que reposa en la secretaría de planeación e infraestructura, dicho contrato cuenta con acta de recibo final de fecha veintinueve (29) de diciembre de 2014, firmada por el señor JUAN CARLOS GARCIA BUSTOS, R.L UNION TEMPORAL LAS ÁMERICAS, como contratista de obra, el Ing. EIVI MANUEL PIPICANO, R.L INTERVENTORIA, y el señor ALVARO JESUS RODRIGUEZ DIAZ, alcalde Municipal de la época. Acta que cuenta con anexo de acta numérica, firmada por las personas mencionadas anteriormente, sumado al señor VICTOR HUGO ROMO, como supervisor del contrato. Cabe mencionar que según oficio No. AMV-SD-0054-2016 de 12 de abril de 2016, la señora JALYLE MARLEY DIAZ ROJAS, quien fungía como secretaria de planeación e infraestructura del municipio de Villagarzón, dirigido al señor NELSON DARIO ARTEAGA MELO, R.L UNION TEMPORAL LAS AMERICAS, con referencia: "OBSERVACIONES", indica que se solicitó "acompañamiento de las entidades de control del Departamento, para iniciar el proceso de liquidación, frente a lo contratado con lo recibido".
2. En la actualidad, la bocatoma del sistema se encuentra deteriorada por la socavación, fisuras, inclinación de la estructura, exposición de aceros de refuerzo, deterioro del concreto, se debe tener en cuenta que esta última construcción de esa estructura, fue realizada por La "Unión temporal las Américas" (Contratista de obra), que ejecutó la reconstrucción de la bocatoma mediante un acuerdo de voluntades firmado el 31 de mayo de 2017 en el que se acordó el "REDISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA MACRO ACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZÓN – LA JOYA, VILLAGARZÓN -PUTUMAYO".





Palacio municipal Calle 2 No. 5-14

Conmutador (8) 4284213

www.villagarzon-putumayo.gov.co

Código postal urbano 861080 /código postal rural 861087- 861088



  <div>MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN • Unidos de Verdad •</div>	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN Despacho Municipal NIT. 800.054.249-0			
Código: 110	Versión: 2	Vigente desde: 1º de enero de 2022		
COMUNICACIONES EXTERNAS				

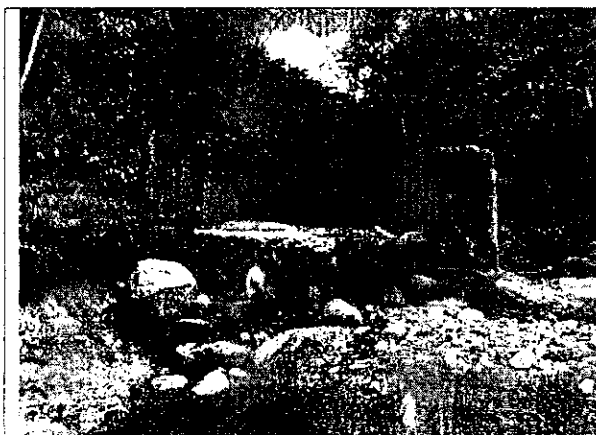


Foto 1. Socavación en bocatoma Macroacueducto Villagarzón la Joya. Fotografía de fecha 12 de agosto de 2023.



Foto 2. Estado de bocatoma Macroacueducto Villagarzón la Joya. Exposición de aceros. Fotografía de fecha 12 de agosto de 2023.



Foto 3. Rejilla de bocatoma lateral. Fotografía de fecha 12 de agosto de 2023.



Foto 4. Inclinación de la estructura. Fotografía de fecha 12 de agosto de 2023.

Sumado a lo anterior, se debe tener en cuenta que la línea de aducción se encuentra habilitada con tubería alterna, actividad realizada por esta administración para garantizar mayor caudal de entrada al sistema; luego se conduce al tanque de almacenamiento, sin entrar a la planta de tratamiento, dado que dicha planta (según diagnóstico del año 2019), no contaba con la construcción del filtro grueso dinámico, parte inicial del sistema estipulado para el tratamiento contratado. La línea de conducción se encuentra habilitada intermitentemente dado que en algunos sectores se han presentado deslizamientos, movimientos de tierra, que afectan la tubería, y también, se ha presentado ruptura de tubería presuntamente por mal proceso constructivo, lo cual se evidencia al encontrar plástico en los empates entre tubo y tubo, además de la no utilización de estructuras de soporte de la tubería o ejecución de viaductos en las zonas inestables. La pérdida de presión del agua se debe a las problemáticas mencionadas, sumado a que existen conexiones no autorizadas a la línea del sistema.

Palacio municipal Calle 2 No. 5-14
 Conmutador (8) 4284213

www.villagarzon-putumayo.gov.co

Código postal urbano 861080 /código postal rural 861087- 861088

VILLAGARZÓN
 "CORAZÓN DEL PUTUMAYO"





  <div>MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN • Unidos de Verdad •</div>	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN Despacho Municipal NIT. 800.054.249-0		 <div>OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL P.O. BOX 1000 VILLAGARZÓN</div>	 <div>REPÚBLICA DE COLOMBIA LIBERTAD Y ORDEN</div>
Código: 110	Versión: 2	Vigente desde: 1º de enero de 2022		
COMUNICACIONES EXTERNAS				



Foto 5. Fugas por inestabilidad de tubería sin soporte.






Foto 6. Ruptura de tubería.

3. Teniendo en cuenta el diagnóstico "INFORME DIAGNOSTICO MACRO ACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZÓN - LA JOYA" realizado por el Ing. Julian Pasuy y el Ing. Juan Duran en el año 2019, el sistema NO contó con la construcción del filtro grueso dinámico contratado en el contrato No. 056 de 2011. Detallan en el informe *"La falta de esta estructura en el proceso de potabilización rompe la línea de tratamiento planteada en el diseño, y oblige al filtro lento de arena a trabajar con toda la carga de turbiedad que lleva el agua captada, haciendo que el filtro se colmate rápidamente, y más adelante se produzca el taponamiento definitivo de la red de tuberías perforadas que están en el fondo del lecho filtrante, razón por la cual en el recorrido la comunidad manifestó que solo les llegó agua los dos primeros meses después de entregada la obra, ya que aparentemente se debió a la colmatación del filtro lento de arena y lógicamente por la no existencia del filtro grueso dinámico."* (Pág. 28 y 29).

A la fecha, el sistema NO se encuentra en óptimo funcionamiento.

4. La utilidad del sistema a la fecha no se ha realizado de manera óptima, sin embargo, de manera intermitente se ha logrado prestar el servicio de agua.
5. Esta administración ha realizado esfuerzos para habilitar la prestación del servicio de agua hasta las veredas porvenir, Canangucho, parte de la vereda Champagnat, Oroyaco, la Paz, Villa Hermosa, Islandia, las Minas, San Isidro y corregimiento de Pto. Umbría, aunque se han realizado diferentes actividades en atención a cada situación que se ha venido presentado, la prestación del servicio ha sido intermitente; en

  <div>MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN • Unidos de verdad •</div>	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN Despacho Municipal NIT. 800.054.249-0		 <div>OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL</div>	 <div>REPÚBLICA DE COLOMBIA JUSTITIA ET ORDO</div>
Código: 110	Versión: 2	Vigente desde: 1º de enero de 2022		
COMUNICACIONES EXTERNAS				


algunas ocasiones, debido a las fuertes crecientes que se han presentado y las afectaciones sobre la bocatoma, en la entrada del agua al sistema, los deslizamientos o fallos en la red de conducción.

Cordialmente,


VIVIAN LORENA MURIEL ARCINIEGAS
 Secretaria de planeación e infraestructura

Anexos: Acta de recibo final contraro No 056 de 2011, de fecha de 29/12/2014
 Informe diagnostico macro acueducto veredal villagarzón - la joya" Julio 2019

	Nombre	Cargo
Proyectó:	Brenda Karin Peña Chavez	Profesional Especializado SPIM
Revisó:	Ángela Sofia Melo	Profesional Especializado SPIM


 Firma

Palacio municipal Calle 2 No. 5-14
 Conmutador (8) 4284213
www.villagarzon-putumayo.gov.co
 Código postal urbana 861080 /código postal rural 861087- 861088


VILLAGARZÓN
 "CORAZÓN DEL PUTUMAYO"



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
NIT 800 054 249 - 0



1404
1395

ACTA DE RECIBO FINAL

Contrato de obra: SPI No. 056 de Fecha 19 de DICIEMBRE de 2011

Contrato de obra: **SPI No. 056 de Fecha 19 DE DICIEMBRE DE 2011**
Contratista: **UNION TEMPORAL LAS AMERICAS**
R.L. JUAN CARLOS GARCIA BUSTOS
Interventor: **CONSORCIO INTERCIVILES 2011**
R.L. EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA
Valor Contrato Obra: **\$12.137.584.273,09**
Objeto: **CONSTRUCCION MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZON LA JOYA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**
Plazo Inicial: **Doce (12) meses**
Prorroga: **Tres (03) meses**
Fecha de Iniciación: **06 de Marzo de 2012**
Fecha de Suspensión 1: **17 de Diciembre de 2012**
Fecha de Reanudación 1: **17 de Enero de 2013**
Fecha de Suspensión 2: **17 de Mayo de 2013**
Fecha de Reanudación 2: **02 de Julio de 2013**
Fecha de Suspensión 3: **12 de Julio de 2013**
Fecha de Reanudación 3: **29 de Noviembre de 2013**
Fecha de Suspensión 4: **20 de Diciembre de 2013**
Fecha de Reanudación 4: **13 de Enero de 2014**
Fecha de Suspensión 5: **30 de Enero de 2014**
Fecha de Reanudación 5: **21 de Agosto de 2014**
Fecha de Terminación Final: **21 de Octubre de 2014**
Contrato de Interventoría: **SPI No. 061 DEL FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2011**
Interventor: **CONSORCIO INTERCIVILES 2011**
R.L. EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA

En Villagarzón a los 29 día del mes de Diciembre de 2014, se reunieron en las oficinas de la Alcaldía Municipal: el Dr. **ALVARO JESUS RODRIGUEZ DIAZ** Alcalde Municipal, el ingeniero **EIVI MANUEL PIPICANO**, Representante Legal del CONSORCIO INTERCIVILES 2011 en calidad de interventor y el Ing. **JUAN CARLOS GARCIA BUSTOS**, Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL LAS AMÉRICAS, en calidad de contratista; con el fin de celebrar la presente de **ACTA DE RECIBO FINAL** de obra conforme al cuadro de ítems adjunto, una vez revisado el informe técnico presentado por el interventor y la forma de pago establecida en la minuta:

BALANCE DEL CONTRATO	ACTA DE RECIBO FINAL
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	12.137.584.273,09
VALOR CONTRATO - ACTA DE MODIFICACION N° 6	12.137.584.251,98
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	21,11
	6.068.792.136,55
VALOR PRESENTE ACTA FINAL	420.241.216,24
AMORTIZACION ANTICIPO	210.120.618,12



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
NIT 800 054 249 - 0



ACTA DE RECIBO FINAL

Contrato de obra: SPI No. 056 de Fecha 19 de DICIEMBRE de 2011

VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL	210.120.598,12
PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA	
VALOR ANTICIPO	6.068.792.136,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N° 1	911.629.833,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N° 2	997.562.090,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N° 3	1.409.975.988,01
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N° 4	1.036.326.998,28
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N° 5	473.271.109,24
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N° 6	553.899.231,10
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N° 7	476.006.268,06
VALOR PAGADO ACTA FINAL	210.120.597,93
TOTAL PAGADO	12.137.584.251,62
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	12.137.584.252,02
AJUSTES POR APROXIMACIONES EN LAS MULTIPLICACIONES	0,04
VALOR POR EJECUTAR	21,11

Para constancia en Villagarzón (Putumayo) a los 29 días del mes de diciembre de 2014, por quienes en ella intervinieron.

Firma:

Nombre: **JUAN CARLOS GARCIA BUSTOS**
Representante Legal o Delegado
Contratista UNION TEMPORAL LAS AMERICAS
Matricula No: 1920-2104613 CAU

Firma:

Nombre: **EIVI MANUEL PIPICANO**
Representante Legal o Delegado
Interventoría
Matricula No. 2520-2127964 CND

Firma:

VoBo ALVARO JESUS RODRIGUEZ DIAZ
Alcalde Municipal



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZON
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORIA
ACTA DE RECIBO FINAL

CODIGO: AAU-SP-007
VERSION: 2
8 DE 33

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VILLAGARZON - LA JOYA	ACTA N°	8	VALOR TOTAL ACTA: \$ 420 241 216 24	PERIODO MES EN EL QUE SE REALIZA	31	10	2014
CONTRATO DE OBRA	SPI No 056 de fecha 19 de DICIEMBRE de 2011	PLAZO REAL	DOCE (12) MESES	PLAZO ACUMULADO	DECIETE (17) MESES			
OBJETO	CONSTRUCCION MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZON LA JOYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON	FECHA DE INICIACION	6 de marzo de 2012	FECHA DE SUSPENSION 1	17 de diciembre de 2012			
CONTRATISTA	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	FECHA DE REANUDACION 2	17 de enero de 2013	FECHA DE SUSPENSION 2	18 de mayo de 2013			
CONTRATO INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL LAS AMERICAS	FECHA DE REANUDACION 3	2 de julio de 2013	FECHA DE SUSPENSION 3	12 de julio de 2013			
INTERVENIOR	SPI No 065 de fecha 29 de DICIEMBRE de 2011	FECHA DE REANUDACION 4	29 de noviembre de 2013	FECHA DE SUSPENSION 4	20 de diciembre de 2013			
	CONSORCIO INTERVALES 2011	FECHA DE REANUDACION 5	13 de enero de 2014	FECHA DE SUSPENSION 5	30 de enero de 2014			
		FECHA DE REANUDACION 6	21 de agosto de 2014	FECHA DE TERMINACION	21 de octubre de 2014			
SUPERVISOR DE CONTRATO:	Alicia VICTOR HUGO ROMO - SECRETARIO DE PLANEACION	VALOR INICIAL (INCLUIDO IVA)	\$12 137 584 273,09	VALOR TOTAL EN ADICIONES				
		VALOR TOTAL ACTUALIZADO	\$12 137 584 251,98	PROPORCION				
					05 MESES			

No. DE ORDEN	ITEM	ESPECIFICACION	CONDICIONES ORIGINALES					OBRA EJECUTADA				
			GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO
7.16		7.16			Releno con material de la excavación	m3	-	\$ 12 608 601 \$	-	197,65	\$	2 531 659,32
7.17		7.17			Escalera para tanque sencilla	m	-	\$ 140 077 001 \$	-	49,30	\$	6 905 796,10
7.18		7.18			Escalera para tanque con protección	m	-	\$ 219 719 001 \$	-	52,82	\$	11 561 613,78
7.19		7.19			Cerramiento en malla elaborada cal 10, postes cada 2.5m cuadrados en L 2"x1/8" y tres filos de alambre de púas en la parte superior, incluye pintura en anticorrosiva y estanco	m	-	\$ 204 920 001 \$	-	38,10	\$	7 807 452,00
7.20		7.20			Baranda de seguridad	m	-	\$ 152 792 001 \$	-	126,42	\$	19 315 964,64
7.21		7.21			Tapa metálica 0.96x0.96m incluye marco y contenedor metálico y tapa en concreto	und	-	\$ 169 479 001 \$	-	5,00	\$	847 395,00
7.22		7.22			Suministro, transporte e instalación Pasamuro h=4"	und	-	\$ 586 255 001 \$	-	10,00	\$	5 862 550,00
7.23		7.23			Suministro, transporte e instalación Pasamuro h=1.12"	und	-	\$ 146 432 001 \$	-	8,00	\$	1 171 456,00
7.24		7.24			Concreto codoado de 2500psi	M3	-	\$ 468 882 001 \$	-	-	\$	-
7.25		7.25			Concreto 3000 psi para estructuras	M3	-	\$ 1 040 257 351 \$	-	-	\$	-
7.26		7.26			Acero de Refuerzo	kg	-	\$ 5 262 301 \$	-	-	\$	-
7.27		7.27			Cerramiento con fibra de polipropileno h=2.00m	m	-	\$ 15 434 001 \$	-	200,00	\$	3 086 800,00
7.28		7.28			Material granular	m3	-	\$ 103 644 001 \$	-	84,00	\$	8 706 086,00
7.29		7.29			Valvula de Punta HF EL 58 D6 1.1/2"	Und	-	\$ 734 215 051 \$	-	-	\$	-
7.30		7.30			Suministro, transporte e instalación valvula compuesta 4" S8	Und	-	\$ 1 240 034 001 \$	-	-	\$	-
7.31		7.31			Caja de protección valvulas ventosas 0.50x0.70 7"	Und	-	\$ 333 784 801 \$	-	11,00	\$	3 671 632,80
7.32		7.32			Suministro, transporte e instalación tubería pvc presión D=4", RDE 211/2	ML	-	\$ 39 671 001 \$	-	-	\$	-
7.33		7.33			Suministro, transporte o instalación tubería sanitaria D=6"	ML	-	\$ 51 649 001 \$	-	170,00	\$	8 780 330,00
7.34		7.34			Suministro, transporte e instalación de estructura metálica	Kg	-	\$ 15 000 001 \$	-	-	\$	-
7.35		7.35			Suministro, transporte e instalación tubería sanitaria PVC 3"	ML	-	\$ 30 285 001 \$	-	27,00	\$	817 695,00
7.36		7.36			Suministro, transporte e instalación de registro de bola 3"	UN	-	\$ 502 925 001 \$	-	5,00	\$	2 514 125,00

8		8			TANQUE DE ALMACENAMIENTO 12 M3 (MILLA HERMOSA, SAN LUIS; LA MARPOSIA; EL DESBIERTO; LA PALANCA; LAS PALMERAS; ALTO SINAI)							
8.01		8.01			Descapeo y limpieza	m2	80.92	\$ 3 599 101 \$	291 239 17		\$	
8.02		8.02			Localización y replanteo	m2	80.92	\$ 2 243 701 \$	181 560 28		\$	
8.03		8.03			Excavación en material común	m3	32.37	\$ 2 820 401 \$	738 696 35		\$	
8.04		8.04			Soldado de limpieza e = 0.05 mils (concreto 21 M.p.a) Tanque 5	m7	80.82	\$ 83 012 851 \$	6 717 399 82		\$	
8.05		8.05			Concreto 28 M.p.a impermeabilizado Tanque 5	m3	101.99	\$ 1 753 845 751 \$	178 874 728 04		\$	
8.06		8.06			Suministro transporte e instalación cinta pvc 0.15m (Tanques)	m	72.1	\$ 32 962 951 \$	2 376 628 70		\$	
8.07		8.07			Suministro, transporte, faja, corte y amarre acero 60000 p.p.s Tanque 5	kg	15 298.5	\$ 5 558 201 \$	96 577 271 20		\$	



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGAZON
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENORIA
ACTA DE RECIBO FINAL

[illegible][illegible]



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZON
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORIA

ACTA DE RECIBO FINAL


UNIDAD EJECUTORA	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VEREDA	Villagarzon - La Joya	ACTIV	8	VALOR TOTAL ACTA	\$ 420 241 216.24	PERIODO 1	01-01-2014	PERIODO 2	31-12-2014
CONTRATO DE OBRA	SPT No 056 del 19 de DICIEMBRE de 2011										
OBJETO	CONSTRUCCION MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZON LA JOYA MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.										
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LAS AMERICAS										
CONTRATO INTERVENTORIA	SPT No 061 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2011										
INTERVENIOR	CONSORCIO INTERCIENALES 2011										
SUPERVISOR DE CONTRATO:	AQU VICTOR HUGO ROMO - SECRETARIO DE PLANEACION										
PLAZO INICIAL	FECHA DE INICIACION	FECHA DE SUSPENSION 1	FECHA DE SUSPENSION 2	FECHA DE SUSPENSION 3	FECHA DE SUSPENSION 4	FECHA DE SUSPENSION 5	FECHA DE TERMINACION	VALOR TOTAL ADICIONES	VALOR TOTAL ACTUALIZADO	PIRORRCA	
DOCE (12) MESES	6 de marzo de 2012	17 de agosto de 2013	2 de julio de 2013	29 de noviembre de 2013	13 de enero de 2014	21 de agosto de 2014		\$12 137 584 273.09	\$12 137 584 251.98	05 MESES	
DECISETE (17) MESES	17 de agosto de 2012	15 de mayo de 2013	12 de julio de 2013	20 de diciembre de 2013	30 de enero de 2014	21 de octubre de 2014					

No DE ORDEN	ITEM	ESPECIFICACION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE MODIFICACION No 6 DE FECHA 22-AGOSTO-2014				OBRA EJECUTADA			
			OR.	PART.	ITEM DE PAGD	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO
11 07		Suministro, transporte e instalacion Cable IWRC (6 x 19) alma de fibra D=1"				ml	320	\$ 58 515.75	\$ 18 725 040.00	174.00	\$ 10 181 740.50		\$	\$ 10 181 740.50
11 08		Suministro, transporte e instalacion Cable IWRC (6 x 19) alma de fibra D=2/8"				ml	220	\$ 44 670.15	\$ 9 827 433.00		\$		\$	\$
11 09		Suministro, transporte e instalacion Pendolones en Cable IWRC (6 x 19) alma de acero D=3/8"				ml	308	\$ 13 284.00	\$ 4 091 472.00	210.00	\$ 2 789 640.00		\$	\$ 2 789 640.00
11 10		Suministro, transporte e instalacion Mordaza 1" T pesado				und	92	\$ 50 500.80	\$ 4 646 073.60	84.00	\$ 4 242 067.20		\$	\$ 4 242 067.20
11 11		Suministro transporte e instalacion de mordaza 7/8" T pesado				und	44	\$ 34 616.05	\$ 1 523 194.20		\$		\$	\$
11 12		Suministro, transporte e instalacion de mordaza 3/8" T pesado				und	352	\$ 15 454.80	\$ 5 440 089.60	280.00	\$ 4 327 344.00		\$	\$ 4 327 344.00
11 13		Suministro, transporte e instalacion de guardacables D=1"				und	4	\$ 46 444.05	\$ 185 778.20	6.00	\$ 276 684.30		\$	\$ 276 684.30
11 14		Suministro, transporte e instalacion de guardacables D=7/8"				und	4	\$ 39 098.70	\$ 156 394.80		\$		\$	\$
11 15		Suministro, transporte e instalacion de guardacables D=3/8"				und	88	\$ 7 862.40	\$ 691 891.20		\$		\$	\$
11 16		Suministro, transporte e instalacion Sahn para cable 1"				und	4	\$ 262 742.40	\$ 1 050 969.60		\$		\$	\$
11 17		Cercia metalica B=0.50 m, H=0.50 m, superior e inferior en angulo de 3"x1/4" y celosa en angulo de 1.1/4"x3/16" cada 0.80 m				M	100	\$ 617 483.25	\$ 61 748 325.00		\$		\$	\$
11 18		Excavacion material con domo en angulo de 1.1/4"x3/16" cada 0.80 m				m3		\$ 45 558.00	\$	61.69	\$ 2 810 473.02		\$	\$ 2 810 473.02
11 19		Abrazaderas en lamina de acero inoxidable. Para tubero de Viaducto				und		\$ 14 735.00	\$	75.00	\$ 1 105 125.00		\$	\$ 1 105 125.00
11 20		Pintura de proteccion para tuberia				ml		\$ 12 295.00	\$	154.00	\$ 1 893 430.00		\$	\$ 1 893 430.00
12		VIADUCTO B4 M PARA TUBERIA DE 6"												
12 01		Localizacion y replanteo				ml	84	\$ 1 501.20	\$ 126 100.80		\$		\$	\$
12 02		Excavacion en material comun				m3	91.31	\$ 22 820.40	\$ 2 083 730.72	137.00	\$ 205 664.40		\$	\$ 205 664.40
12 03		Replanteo con material de la excavacion				m3	55.68	\$ 12 808.80	\$ 713 322.07	34.84	\$ 446 258.59		\$	\$ 446 258.59
12 04		Concreto 21 M p a para bases				m3	8.16	\$ 1 821 983.10	\$ 14 867 269.70		\$		\$	\$
12 05		Concreto 21 M p a para zapatas y muros				m3	35.62	\$ 1 821 983.10	\$ 64 898 503.72	17.86	\$ 37 540 350.27		\$	\$ 37 540 350.27
12 06		Suministro, transporte, fteq, corte y anclaje acero 60000 p s Viaducto				kg	1 575.24	\$ 5 659.20	\$ 8 914 588.21	1092.20	\$ 6 180 976.24		\$	\$ 6 180 976.24
12 07		Suministro, transporte e instalacion Cable IWRC (6 x 19) alma de fibra D=1"				ml	268.9	\$ 58 515.75	\$ 15 729 033.60		\$		\$	\$
12 08		Suministro, transporte e instalacion Cable IWRC (6 x 19) alma de fibra D=7/8"				ml	184.6	\$ 44 670.15	\$ 8 255 043.72		\$		\$	\$
12 09		Suministro, transporte e instalacion Pendolones en Cable IWRC (6 x 19) alma de acero D=3/8"				ml	209	\$ 13 284.00	\$ 2 776 956.00	157.50	\$ 2 092 230.00		\$	\$ 2 092 230.00
12 10		Suministro, transporte e instalacion Mordaza 1" T pesado				und	80	\$ 50 500.80	\$ 4 040 064.00		\$		\$	\$
12 11		Suministro transporte e instalacion de mordaza 7/8" T pesado				und	38	\$ 34 616.05	\$ 1 315 485.90		\$		\$	\$

Handwritten signature and date: 1397



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZON
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORIA
ACTA DE RECIBO FINAL

	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENORIA				ACTA N° 8		VALOR TOTAL ACTA \$ 420 241 216 24		PERIODO/ MES ENE 30 2014 - OCT 31 2014																																						
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		VEREDA: Villagarzon	LA JOYA																																											
CONTRATO DE OBRA GEIETO CONTRATISTA CONTRATO INTERVENTORIA INTERVENIOR SUPERVISOR DE CONTRATO: Aq VICTOR HUGO ROMO - SECRETARIO DE PLANEACION																																															
SPI No 056 de Fecha 19 de DICIEMBRE de 2011 CONSTRUCCION MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZON LA JOYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. UNION TEMPORAL LAS AMERICAS SPI No. 061 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2011 CONSORCIO INTERCAJES 2011																																															
<table><tr><th>PLAZO MICAL</th><th>FECHA DE INICIACION</th><th>FECHA DE REANUDACION 1</th><th>FECHA DE REANUDACION 2</th><th>FECHA DE REANUDACION 3</th><th>FECHA DE REANUDACION 4</th><th>FECHA DE REANUDACION 5</th><th>VALOR INICIAL (en millones)</th><th>VALOR TOTAL ACTUALIZADO</th></tr><tr><td>DOCE (12) MESES</td><td>6 de marzo de 2012</td><td>17 de enero de 2013</td><td>2 de julio de 2013</td><td>29 de noviembre de 2013</td><td>13 de enero de 2014</td><td>21 de agosto de 2014</td><td>\$12 137 584 273.09</td><td>\$12 137 584 251.98</td></tr><tr><td>PLAZA ACUMULADO</td><td>FECHA DE SUSPENSION 1</td><td>FECHA DE SUSPENSION 2</td><td>FECHA DE SUSPENSION 3</td><td>FECHA DE SUSPENSION 4</td><td>FECHA DE SUSPENSION 5</td><td>FECHA DE TERMINACION</td><td>VALOR TOTAL EN ADICIONES</td><td>VALOR TOTAL ACTUALIZADO</td></tr><tr><td></td><td>17 de diciembre de 2012</td><td>16 de mayo de 2013</td><td>12 de julio de 2013</td><td>20 de diciembre de 2013</td><td>30 de enero de 2014</td><td>21 de octubre de 2014</td><td></td><td>05 MESES</td></tr></table>												PLAZO MICAL	FECHA DE INICIACION	FECHA DE REANUDACION 1	FECHA DE REANUDACION 2	FECHA DE REANUDACION 3	FECHA DE REANUDACION 4	FECHA DE REANUDACION 5	VALOR INICIAL (en millones)	VALOR TOTAL ACTUALIZADO	DOCE (12) MESES	6 de marzo de 2012	17 de enero de 2013	2 de julio de 2013	29 de noviembre de 2013	13 de enero de 2014	21 de agosto de 2014	\$12 137 584 273.09	\$12 137 584 251.98	PLAZA ACUMULADO	FECHA DE SUSPENSION 1	FECHA DE SUSPENSION 2	FECHA DE SUSPENSION 3	FECHA DE SUSPENSION 4	FECHA DE SUSPENSION 5	FECHA DE TERMINACION	VALOR TOTAL EN ADICIONES	VALOR TOTAL ACTUALIZADO		17 de diciembre de 2012	16 de mayo de 2013	12 de julio de 2013	20 de diciembre de 2013	30 de enero de 2014	21 de octubre de 2014		05 MESES
PLAZO MICAL	FECHA DE INICIACION	FECHA DE REANUDACION 1	FECHA DE REANUDACION 2	FECHA DE REANUDACION 3	FECHA DE REANUDACION 4	FECHA DE REANUDACION 5	VALOR INICIAL (en millones)	VALOR TOTAL ACTUALIZADO																																							
DOCE (12) MESES	6 de marzo de 2012	17 de enero de 2013	2 de julio de 2013	29 de noviembre de 2013	13 de enero de 2014	21 de agosto de 2014	\$12 137 584 273.09	\$12 137 584 251.98																																							
PLAZA ACUMULADO	FECHA DE SUSPENSION 1	FECHA DE SUSPENSION 2	FECHA DE SUSPENSION 3	FECHA DE SUSPENSION 4	FECHA DE SUSPENSION 5	FECHA DE TERMINACION	VALOR TOTAL EN ADICIONES	VALOR TOTAL ACTUALIZADO																																							
	17 de diciembre de 2012	16 de mayo de 2013	12 de julio de 2013	20 de diciembre de 2013	30 de enero de 2014	21 de octubre de 2014		05 MESES																																							

No. DE ORDEN	ITEM	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE MODIFICACION No 6 DE FECHA 22-AGOSTO-2014					OBRA EJECUTADA			
			ITEM DE PAGO					VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA			ACUMULADO	
			GR.	PART.	UND	CANTIDAD	CANTIDAD					VALOR	CANTIDAD	VALOR		
13.11			13.11	Suministro, transporte e instalación de Mordaza 1/2" Trazado	und	28	\$ 18,381.60	\$ 514,684.80	\$	-	\$	-	\$	\$		
13.12			13.12	Suministro, transporte e instalación de mordaza 3/8"-1" pesade	und	168	\$ 15,454.80	\$ 2,596,406.40	\$	-	\$	-	\$	\$		
13.13			13.13	guardacables D=3/4"	und	4.5	\$ 12,241.80	\$ 55,088.10	\$	-	\$	-	\$	\$		
13.14			13.14	guardacables D=1/2"	und	4.5	\$ 8,761.50	\$ 39,426.75	\$	-	\$	-	\$	\$		
13.15			13.15	Suministro, transporte e instalación de guardacables D=3/8"	und	42	\$ 7,862.40	\$ 330,228.80	\$	-	\$	-	\$	\$		
13.16			13.18	Suministro, transporte e instalación Sillin para cable 3/4"	und	4.5	\$ 246,079.35	\$ 1,107,357.08	\$	-	\$	-	\$	\$		
13.17			13.17	Cercha metálica B=0.50 m, H=0.50 morden superior e inferior en ángulo de 2 1/2"x3/16" y celosía en ángulo de 1 1/4" x 3/16" cada 0.80 m, incluye transporte.	Ml	48	\$ 513,140.40	\$ 24,630,738.20	\$	-	\$	-	\$	\$		
14			14	VIADUCTO 55 M PARA TUBERIA DE 6"												
14.01			14.01	Localización y replanteo	ml	55	\$ 1,501.20	\$ 82,566.00	\$	-	\$	-	\$	\$		
14.02			14.02	Excavación en material común	m3	44.1	\$ 22,820.40	\$ 1,006,379.64	\$	-	\$	-	\$	\$		
14.03			14.03	Refrío con material de la excavación	m3	25.9	\$ 12,969.80	\$ 331,747.92	\$	-	\$	-	\$	\$		
14.04			14.04	Concreta 21 M p.s para toreros	m3	3.19	\$ 1,821,008.10	\$ 5,812,078.24	\$	-	\$	-	\$	\$		
14.05			14.05	Concreta 21 M p.s para zapatas y mueras	m3	18.2	\$ 1,821,008.10	\$ 33,159,819.42	\$	-	\$	-	\$	\$		
14.06			14.06	Suministro, transporte, feje, corte y muerte acero 60000 p.s i.vaducto	kg	881.08	\$ 5,559.20	\$ 4,906,207.94	\$	-	\$	-	\$	\$		
14.07			14.07	Suministro, transporte e instalación Cable IWRC (6 x 19) alma de fibra D=3/4"	ml	200	\$ 30,315.60	\$ 6,063,120.00	\$	-	\$	-	\$	\$		
14.08			14.08	Suministro, transporte e instalación Cable IWRC (6 x 19) alma de fibra D=1/2"	ml	84	\$ 19,581.75	\$ 1,644,867.00	\$	-	\$	-	\$	\$		
14.09			14.09	Suministro, transporte e instalación Pendolinas en CanelWPC (6 x 19) alma de acero D=3/8"	ml	72	\$ 13,284.00	\$ 956,448.00	\$	-	\$	-	\$	\$		
14.10			14.10	Suministro, transporte e instalación de Mordaza 3/4" Trazado	und	56	\$ 26,311.50	\$ 1,473,444.00	\$	-	\$	-	\$	\$		
14.11			14.11	Suministro, transporte e instalación de Mordaza 1/2" Trazado	und	24	\$ 18,381.60	\$ 441,158.40	\$	-	\$	-	\$	\$		
14.12			14.12	Suministro, transporte e instalación de mordaza 3/8" Trazado	und	144	\$ 15,454.80	\$ 2,225,491.20	\$	-	\$	-	\$	\$		
14.13			14.13	Suministro, transporte e instalación Guardacables D=3/4"	und	4	\$ 12,241.80	\$ 48,967.20	\$	-	\$	-	\$	\$		
14.14			14.14	Suministro, transporte e instalación Guardacables D=1/2"	und	4	\$ 8,761.50	\$ 35,046.00	\$	-	\$	-	\$	\$		
14.15			14.15	Suministro, transporte e instalación de guardacables D=3/8"	und	36	\$ 7,862.40	\$ 283,046.40	\$	-	\$	-	\$	\$		
14.16			14.16	Suministro, transporte e instalación Sillin para cable 3/4"	und	4	\$ 246,079.35	\$ 984,317.40	\$	-	\$	-	\$	\$		
14.17			14.17	Cercha metálica B=0.50 m, H=0.50 morden superior e inferior en ángulo de 2 1/2"x3/16" y celosía en ángulo de 1 1/4" x 3/16" cada 0.80 m, incluye transporte.	Ml	55	\$ 513,140.40	\$ 28,222,722.00	\$	-	\$	-	\$	\$		



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZON
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORIA

ACTA DE RECIBO FINAL

UNIDAD EJECUTORA	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VEREDA	VILLAGARZON - LA JOYA	ACTIVIDAD	8	VALOR TOTAL ACTA	\$ 420 241 216,24	PERIODO MES EN EL QUE SE REALIZA	21	ANIO	2014
CONTRATO DE OBRA	SPT No 055 de Fecha 19 de DICIEMBRE de 2011										
OBJETO	CONSTRUCCION MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZON LA JOYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO										
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LAS AMERICAS										
CONTRATO INTERVENTORIA	SPT No. 061 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2011										
INTERVENIOR	CONSORCIO INTERCIVILES 2011										
SUPERVISOR DE CONTRATO	AR VICTOR HUGO ROMO - SECRETARIO DE PLANEACION										
PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES										
FECHA DE INICIACION	6 de marzo de 2012										
FECHA DE REANUACION 1	17 de enero de 2013										
FECHA DE REANUACION 2	2 de julio de 2013										
FECHA DE REANUACION 3	29 de noviembre de 2013										
FECHA DE REANUACION 4	13 de enero de 2014										
FECHA DE REANUACION 5	21 de agosto de 2014										
VALOR INICIAL (Incluso IVA)	\$12.137.584.273,09										
VALOR TOTAL ACTUALIZADO	\$12.137.584.251,98										
PLAZO FINAL	DECIETE (17) MESES										
FECHA DE SUSPENSION 1	17 de diciembre de 2012										
FECHA DE SUSPENSION 2	16 de mayo de 2013										
FECHA DE SUSPENSION 3	12 de julio de 2013										
FECHA DE SUSPENSION 4	20 de diciembre de 2013										
FECHA DE SUSPENSION 5	30 de enero de 2014										
FECHA DE TERMINACION	21 de octubre de 2014										
VALOR FINAL EN ADICIONES	PROBROCA										
VALOR TOTAL ACTUALIZADO	05 MESES										

No. DE DISEÑO	ITEM	ESPECIFICACION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE MODIFICACION No 6 DE FECHA 22-AGOSTO-2014					OBRA EJECUTADA		
			GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO
18.02	18.02	Excavacion en material comun	m3	16			16	\$ 22.820,40	\$ 365.126,40						
18.03	18.03	Relleno con material de la excavacion	m3	5,8			5,8	\$ 12.808,80	\$ 75.290,96	30,70	\$ 393.230,16	\$ -			\$ 393.230,16
18.04	18.04	Concreto 21 M.p.s para zapatas y muros	m3	10,4			10,4	\$ 1.821.968,10	\$ 18.948.468,24	20,06	\$ 36.548.680,09	\$ -			\$ 36.548.680,09
18.05	18.05	Suministro, transporte, flete, corte y amarrar acero 60000 p.s. /Vallada	kg	316			316	\$ 5.659,20	\$ 1.788.307,20	1081,20	\$ 6.118.727,04	\$ -			\$ 6.118.727,04
18.06	18.06	Tierra en tubería acero al carbon D=6" e=8 mm	m	12			12	\$ 2.556.616,80	\$ 3.067.940,16						\$ -
18.07	18.07	Suministro, transporte e instalación Cable IWRC (6 x 19) alma de fibra D=12"	m	240			240	\$ 19.581,75	\$ 4.699.620,00						\$ -
18.08	18.08	Suministro, transporte e instalación Pendolones en Cable IWRC (6 x 19) alma de acero D=3/8"	m	25			25	\$ 13.284,00	\$ 332.100,00	165,75	\$ 2.201.823,00	\$ -			\$ 2.201.823,00
18.09	18.09	Suministro, transporte e instalación Mordaza 5/8"	und	46			46	\$ 22.474,80	\$ 1.033.840,80						\$ -
18.10	18.10	Suministro, transporte e instalación Guardacables D=3/8"	und	48			48	\$ 13.779,45	\$ 653.854,70						\$ -
18.11	18.11	Suministro, transporte e instalación Guardacables D=3/8"	und	50			50	\$ 7.862,40	\$ 393.120,00						\$ -
18.12	18.12	Cercha metálica 8x0.50 m. H=0.60 m. con dón superior e inferior en ángulo de 1 1/2"x3/16" y celosía en varilla 5/8" cada 0.50 m. incluye transporte	Ml	30			30	\$ 358.444,25	\$ 10.753.327,50						\$ -
18.13	18.13	Concreto cotepe de 2500psi	m3					\$ 468.982,00	\$ -	5,10	\$ 2.391.298,20	\$ -			\$ 2.391.298,20
18.14	18.14	Relleno de material sobrante	m3					\$ 9.413,55	\$ -	15,06	\$ 141.768,06	\$ -			\$ 141.768,06
18.15	18.15	Excavación material condimensionado	m3					\$ 3.258,00	\$ -	45,75	\$ 2.084.734,08	\$ -			\$ 2.084.734,08
18.16	18.16	Soldado de limpieza e = 0.05 mts (concreto 21 M.p.s)	m2					\$ 52.232,85	\$ -	32,00	\$ 1.671.451,20	\$ -			\$ 1.671.451,20
18.17	18.17	Suministro, transporte e instalación Cable IWRC (6 x 19) alma de fibra D=3/4"	m					\$ 30.315,60	\$ -	210,00	\$ 6.366.276,00	\$ -			\$ 6.366.276,00
18.18	18.18	Suministro, transporte e instalación de Mordaza 3/4" T=300mm	und					\$ 26.311,50	\$ -	36,00	\$ 947.214,00	\$ -			\$ 947.214,00
18.19	18.19	Suministro, transporte e instalación de Mordaza 3/8" T=300mm	und					\$ 15.454,80	\$ -	195,00	\$ 3.013.686,00	\$ -			\$ 3.013.686,00
18.20	18.20	Fabricación e instalación de Separadores para cables, incluye grapas	und					\$ 34.738,00	\$ -	38,00	\$ 1.354.782,00	\$ -			\$ 1.354.782,00
18.21	18.21	Pinchura de protección para tubería	mt					\$ 12.295,00	\$ -	90,00	\$ 1.106.550,00	\$ -			\$ 1.106.550,00
19	19	VIADUCTO 27 M PARA TUBERIA DE 6"													
19.01	19.01	Localización y replanteo	m	27			27	\$ 1.501,20	\$ 40.532,40						\$ -
19.02	19.02	Excavación en material comun	m3	16			16	\$ 22.820,40	\$ 365.126,40						\$ -
19.03	19.03	Relleno con material de la excavación	m3	5,7			5,7	\$ 12.808,80	\$ 73.010,16						\$ -
19.04	19.04	Concreto 21 M.p.s para zapatas y muros	m3	10,3			10,3	\$ 1.821.968,10	\$ 18.766.271,43						\$ -
19.05	19.05	Suministro, transporte, flete, corte y amarrar acero 60000 p.s. /Vallada	kg	316			316	\$ 5.659,20	\$ 1.788.307,20						\$ -
19.06	19.06	Tierra en tubería acero al carbon D=6" e=8 mm	m	12			12	\$ 2.556.616,80	\$ 3.067.940,16						\$ -
19.07	19.07	Suministro, transporte e instalación Cable IWRC (6 x 19) alma de fibra D=12"	m	240			240	\$ 19.581,75	\$ 4.699.620,00						\$ -
19.08	19.08	Suministro, transporte e instalación Pendolones en Cable IWRC (6 x 19) alma de acero D=3/8"	m	25			25	\$ 13.284,00	\$ 332.100,00						\$ -

Handwritten signature and date: 13/01/14

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE VILLAGARZON

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MANUAL DE INTERVENTORIA

ACTA DE RECIBO FINAL

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

VILLAGARZON - La Joya

ACTA N°

8

VALOR TOTAL ACTA

\$ 420 241 216,24

PERIODO MES ENE 30 2014 - OCT 31 2014

FECHA DE ELABORACION

21

IN

2014

CODIGO

AMN SPI 007

VERSION

2

17

DE

31

CONTRATO DE OBRA	DESCRIPCION	PLAZO INICIAL	FECHA DE INICIACION	DOCE (12) MESES	PLAZO ACUMULADO	DECISETE (17) MESES
OBJETO	CONSTRUCCION MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZON LA JOYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	SPI N° 056 de Fecha 19 de OCTUBRE de 2011	17 de marzo de 2012	6 de marzo de 2012	FECHA DE SUSPENSION 1	17 de diciembre de 2012
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LAS AMERICAS	SPI N° 081 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2011	2 de julio de 2013	2 de julio de 2013	FECHA DE SUSPENSION 2	16 de mayo de 2013
CONTRATO INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCIENILES 2011	29 de noviembre de 2013	13 de agosto de 2014	21 de agosto de 2014	FECHA DE SUSPENSION 3	12 de julio de 2013
SUPERVISOR DE CONTRATO	Aq VICTOR HUGO ROMO - SECRETARIO DE PLANEACION	VALOR INICIAL (incluye IVA)	\$12 137 584 273,09	\$12 137 584 273,09	FECHA DE SUSPENSION 4	20 de diciembre de 2013
	PRIORIDAD	VALOR TOTAL EN ADICIONES	\$12 137 584 273,09	\$12 137 584 273,09	FECHA DE SUSPENSION 5	30 de enero de 2014
	05 MESES					21 de octubre de 2014

No. DE ORDEN	ITEM	ESPECIFICACION	GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ORIGINALS				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE MODIFICACION No 6 DE FECHA 22-AGOSTO-2014				OBRA EJECUTADA				ACUMULADO			
19 09		Suministro, transporte e instalacion Mordaza 5/8" T. pesado		19 09		und	44	\$ 22 474,80	\$ 988 861,20					\$								\$			
19 10		Suministro, transporte e instalacion Guardacables D=3/8"		19 10		und	44	\$ 13 779,45	\$ 606 295,80					\$								\$			
19 11		Suministro, transporte e instalacion Guardacables D=3/8"		19 11		und	25	\$ 7 862,40	\$ 196 560,00					\$								\$			
19 12		Cercha metalica B=0.50 m, H=0.60 m cordon superior e inferior en angulo de 1/2"x3/16" y celosia en varilla 5/8" cada D.50 m, incluye transporte		19 12		Mt	27	\$ 359 444,25	\$ 9 704 994,75					\$								\$			
20		WADCTO 24 M PARA TUBERIA DE 6"		20																					
20 01		Localizacion y replanteo		20 01		mt	24	\$ 1 501,20	\$ 36 028,80					\$								\$			
20 02		Excavacion en material comun		20 02		m3	16	\$ 22 820,40	\$ 365 126,40					\$								\$			
20 03		Relevo con material de la excavacion		20 03		m3	5,7	\$ 12 808,80	\$ 73 110,16					\$								\$			
20 04		Contrato 21 M.p para zapatas y muros		20 04		m3	10,3	\$ 1 821 968,10	\$ 18 766 271,93					\$								\$			
20 05		Suministro, transporte, fleje, corte y amarrar acero 60850 p. a instalacion		20 05		kg	293	\$ 5 658,20	\$ 1 658 145,00					\$								\$			
20 06		Torre an tuberia acero al carbon D=8" e=6 mm		20 06		mt	12	\$ 258 619,80	\$ 3 103 401,60					\$								\$			
20 07		Suministro, transporte e instalacion Cable IWRC 16 x 19, alma de fibra D=1/2"		20 07		mt	200	\$ 19 581,75	\$ 3 916 350,00					\$								\$			
20 08		Suministro, transporte e instalacion Pendones en CableWRC (6 x 19) alma de acero D=3/8"		20 08		mt	41	\$ 13 284,00	\$ 544 644,00					\$								\$			
20 09		T. pesado		20 09		und	38	\$ 22 474,80	\$ 854 042,40					\$								\$			
20 10		Suministro, transporte e instalacion Mordaza 5/8" D=5/8"		20 10		und	38	\$ 13 779,45	\$ 523 619,10					\$								\$			
20 11		Suministro, transporte e instalacion Guardacables D=3/8"		20 11		und	41	\$ 7 862,40	\$ 322 358,40					\$								\$			
20 12		Cercha metalica B=0.50 m, H=0.60 m cordon superior e inferior en angulo de 1/2"x3/16" y celosia en varilla 5/8" cada B.50 m, incluye transporte		20 12		Mt	24	\$ 359 444,25	\$ 8 626 662,00					\$								\$			
20 13		Suministro, transporte e instalacion de Mordaza 3/8" T. pesado		20 13		und		\$ 15 454,80	\$					\$								\$			
20 14		Suministro, transporte e instalacion de Mordaza 1/2" T. pesado		20 14		und		\$ 16 381,60	\$					\$								\$			
20 15		Suministro, transporte e instalacion Mordaza 1" T. pesado		20 15		und		\$ 50 500,80	\$					\$								\$			
21		CERCHAS PARA SOPORTE DE TUBERIA		21																					
21 01		Localizacion y replanteo de tuberia		21 01		mt	945	\$ 1 501,20	\$ 1 478 682,00					\$								\$			
21 02		Excavacion en material comun		21 02		m3	50	\$ 22 820,40	\$ 1 141 020,00					\$								\$			
21 03		Relevo con material de la excavacion		21 03		m3	30	\$ 12 808,80	\$ 384 264,00					\$								\$			
21 04		Cercha metalica cordon superior e inferior en angulo de 1/2"x3/16" y celosia en varilla 1/2" cada B.40 m incluye transporte		21 04		Mt	325	\$ 336 390,30	\$ 109 326 847,50					\$								\$			

[Handwritten signature]

	SUBCATEGORIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DURACIÓN
CONTRATO DE OBRA	SPI No 056 de Fecha 19 de Diciembre de 2011			
OBJETO	CONSTRUCCION MACRODUCUCTO VEECAL VILLAGARZON LA JOYA MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LAS AMERICAS			
CONTRATO INTERVENTORIA	SPI No. 081 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2011			
INTERVENIOR	CONSORCIO INTERCIIVILES 2011			
SUPERVISOR DE CONTRATO	Ara VICTOR HUGO ROMI - SECRETARIO DE PLANEACION			

No. DE DISEÑO	ITEM	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No 6 DE FECHA 22-AGOSTO-2014					OBRA EJECUTADA			
			GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO		
														CANTIDAD	VALOR	
21.05	21.05					m3	20	\$ 1.769.237,35	\$ 35.385.147,00	23,23	\$ 41.089.848,24	3,20	\$ 5.861.823,52	23,23	\$ 41.089.848,24	
21.06	21.06	Concreto 2:1 M. p. a. Soporta tubería de 150mm de diámetro con tubería de aluminio estructural 315 MM				Mi	32,5	\$ 89.260,65	\$ 2.909.711,25	297,00	\$ 26.510.413,05	26,00	\$ 2.320.716,90	297,00	\$ 26.510.413,05	
21.07	21.07	Suministro, transporte, lleve, corte y amane acero 60200 p.s.1. Vialote				Kg		\$ 5.659,20	\$ -	1220,05	\$ 6.904.506,96	292,70	\$ 1.656.447,84	1.220,05	\$ 6.904.506,96	
21.08	21.08	Excavación material con grader				m3		\$ 45.558,00	\$ -	26,88	\$ 1.224.593,04	22,02	\$ 1.003.187,16	26,88	\$ 1.224.593,04	
21.09	21.09	Soldado de limpieza e = 0,05 mm (concrete 2:1 M.p.a)				m2		\$ 52.232,85	\$ -	26,88	\$ 1.404.019,01	16,72	\$ 873.333,25	26,88	\$ 1.404.019,01	
21.10	21.10	Suministro, transporte e instalación Cable IWRC (6 x 19) alma de fibra D=34"				ml		\$ 30.315,60	\$ -	28,00	\$ 848.836,80	28,00	\$ 848.836,80	28,00	\$ 848.836,80	
21.11	21.11	Suministro, transporte e instalación Pendientes en Cable IWRC (6 x 19) alma de acero D=3/8"				ml		\$ 13.284,00	\$ -	15,00	\$ 199.260,00	15,00	\$ 199.260,00	15,00	\$ 199.260,00	
22	22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA P.V.C PRESION Y ACCESORIOS														
22.01	22.01	Localización y replanteo de tubería				ml	9,57/23	\$ 1.501,20	\$ 129.700.879,40	78237,00	\$ 117.449.384,40	7.027,00	\$ 10.546.932,40	78237,00	\$ 117.449.384,40	
22.02	22.02	Excavación en material común educación, conducción y redes de distribución				m3	51439,20	\$ 22.820,40	\$ 1.173.863.119,68	16399,88	\$ 374.023.617,55	766,70	\$ 17.496.400,68	16.389,88	\$ 374.023.617,55	
22.03	22.03	Excavación en roca				m3	3086,35	\$ 151.137,70	\$ 467.081.110,40	204,06	\$ 30.881.971,06		\$ -	204,06	\$ 30.881.971,06	
22.04	22.04	Excavación en material común para domiciliarias				m3	2160	\$ 22.820,40	\$ 49.292.064,00		\$ -		\$ -		\$ -	
22.05	22.05	Repleno con material de la excavación				m3	48239,23	\$ 12.808,80	\$ 617.887.289,66	17601,95	\$ 225.459.857,16	761,30	\$ 9.751.339,44	17.601,95	\$ 225.459.857,16	
22.06	22.06	Suministro, transporte e instalación tubería p.v.c presión D=6 RDE 41 UM				ML	6300,65	\$ 50.668,20	\$ 319.422.850,92	7365,65	\$ 373.403.098,68		\$ -	7.365,65	\$ 373.403.098,68	
22.07	22.07	Suministro, transporte e instalación tubería p.v.c presión D=6 RDE 32.5 UM				ML	1605,55	\$ 59.124,60	\$ 106.752.421,53	1230,00	\$ 72.723.258,00		\$ -	1.230,00	\$ 72.723.258,00	
22.08	22.08	Suministro, transporte e instalación tubería p.v.c presión D=6 RDE 26UM				ml	3096,15	\$ 68.939,10	\$ 213.445.794,47	2807,50	\$ 193.546.523,25		\$ -	2.807,50	\$ 193.546.523,25	
22.09	22.09	Suministro, transporte e instalación tubería p.v.c presión D=6 RDE 21UM				ml	4788,76	\$ 87.176,55	\$ 394.355.130,60	3807,86	\$ 312.923.591,62		\$ -	3.807,86	\$ 312.923.591,62	
22.10	22.10	Suministro, transporte e instalación tubería p.v.c presión D=6 RDE 13,5 UM				ml	19612,77	\$ 145.478,70	\$ 2.863.240.283,00	20813,65	\$ 3.027.942.744,26		\$ -	20.813,65	\$ 3.027.942.744,26	
22.11	22.11	Suministro, transporte e instalación tubería p.v.c presión D=4 RDE 11 UM				ML	1734,74	\$ 125.792,00	\$ 219.951.154,08	1715,65	\$ 217.556.093,20		\$ -	1.715,65	\$ 217.556.093,20	
22.12	22.12	Suministro, transporte e instalación tubería p.v.c presión D=3 RDE 11 UM				ML	3022,74	\$ 93.155,40	\$ 281.584.553,80	3046,25	\$ 283.774.837,25		\$ -	3.046,25	\$ 283.774.837,25	
22.13	22.13	Suministro, transporte e instalación tubería p.v.c presión D=2 RDE 21 UM				ml	9186,23	\$ 17.059,95	\$ 156.716.624,49	3716,00	\$ 63.394.774,20		\$ -	3.716,00	\$ 63.394.774,20	
22.14	22.14	Suministro, transporte e instalación tubería p.v.c presión D= 11/2 RDE 26 EL				ML	5148	\$ 11.349,45	\$ 58.428.968,60		\$ -		\$ -		\$ -	
22.15	22.15	Suministro, transporte e instalación tubería p.v.c presión D= 11/2 RDE 21 EL				ml	14170,66	\$ 14.548,95	\$ 206.163.223,61	756,00	\$ 10.999.006,20	228,00	\$ 3.317.160,60	756,00	\$ 10.999.006,20	
22.16	22.16	Suministro, transporte e instalación tubería p.v.c presión D=3 RDE 21 EL				ml	2979	\$ 9.949,15	\$ 29.659.517,96	7060,00	\$ 63.359.982,00	1.310,50	\$ 11.727.861,08	7.080,00	\$ 63.359.982,00	
22.17	22.17	Suministro, transporte e instalación tubería p.v.c presión D=3/4 RDE 21 EL				ml	3240	\$ 6.372,00	\$ 20.646.280,00		\$ -		\$ -		\$ -	
22.18	22.18	Suministro, transporte e instalación tubería p.v.c presión D=1/2 RDE 0 EL				ml	3600	\$ 5.212,35	\$ 18.764.460,00		\$ -		\$ -		\$ -	

4

7405

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE VILLAGARZON

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MANUAL DE INTERVENTORIA

ACTA DE RECIBO FINAL

CÓDIGO

VERSION

23 DE 33

AMV-STN 001

7

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

VILLAGARZON, La Poma

ACTA N°

8

VALOR TOTAL ACTA \$ 420 241 216,24

PERIODO MES ENE 30 2014 - OCT 31 2014

RENTIN DE N° 6 DE 2014

CONTRATO DE OBRA

SPI No 056 de Fecha 19 de DICIEMBRE de 2011

CONSTRUCCION MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZON LA JOYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL LAS AMERICAS

CONTRATO INTERVENTORIA

SPI No 061 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2011

INTERVENIOR

CONSORCIO INTERCIVILES 2011

SUPERVISOR DE CONTRATO

Aaq VICTOR HUGO ROMO - SECRETARIO DE PLANEACION

Nº DE ORDEN	ITEM	ESPECIFICACION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA 01 MODIFICACION N° 6 DE FECHA 22-AGOSTO-2014				OBRA EJECUTADA			
			GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO
25.2	25.2	FILTRO GRUESO DINAMICO - ESTRUCTURAS EN CONCRETO												
25.2.1	25.2.1	Centrio 28 M p a impermeabilizado (Filtro Grueso Dinamico)				M3	46,46	\$ 1 156 740,75	\$ 53 765 310,06					
25.2.2	25.2.2	Suministro, transporte e instalación cante p v c 0.15m (Filtro Grueso Dinamico)				ML	42	\$ 32 474,25	\$ 1 303 918,50					
25.2.3	25.2.3	Suministro, transporte, fleje, corte y amorte acere 60000 p s (Filtro Grueso Dinamico)				kg	44,16	\$ 5 262,30	\$ 23 238 316,80					
25.3	25.3	FILTRO GRUESO DINAMICO - MEDIO FILTRANTE												
25.3.1	25.3.1	Suministro, transporte e instalación Medio Filtrante Grava de 12 a 28 mm				M3	8,28	\$ 176 202,00	\$ 1 458 952,56					
25.3.2	25.3.2	Suministro, transporte e instalación Medio Filtrante Grava de 12 a 28 mm				M3	8,28	\$ 176 202,00	\$ 1 458 952,56					
25.3.3	25.3.3	Suministro, transporte e instalación Medio Filtrante Grava de 12 a 28 mm				M3	8,28	\$ 176 202,00	\$ 1 458 952,56					
25.4	25.4	FILTRO GRUESO DINAMICO - TUBERIA Y ACCESORIOS												
25.4.1	25.4.1	Suministro, transporte e instalación Tuberia diam = 4" con orificios 3/8"				ML	24	\$ 36 691,65	\$ 880 599,80					
25.4.2	25.4.2	Suministro, transporte e instalación Tuberia diam = 6"				ML	12	\$ 71 374,50	\$ 856 494,00					
25.4.3	25.4.3	Suministro, transporte e instalación Tuberia diam = 1 1/2"				ML	2,51	\$ 17 050,50	\$ 42 626,25					
25.4.4	25.4.4	Suministro, transporte e instalación Codo 90° x 4"				Un	8	\$ 15 662,70	\$ 125 301,60					
25.4.5	25.4.5	Suministro, transporte e instalación Codo 90° x 1 1/2"				Un	3	\$ 6 104,70	\$ 18 314,10					
25.4.6	25.4.6	Suministro, transporte e instalación Tee reducida 6"x4"				Un	16	\$ 134 245,35	\$ 2 147 925,60					
25.4.7	25.4.7	Suministro, transporte e instalación Reducción de 6" x 4"				Un	2	\$ 41 157,45	\$ 82 314,90					
25.4.8	25.4.8	Suministro, transporte e instalación Adaptador de limpieza 4"				Un	101	\$ 43 969,50	\$ 4 339 695,00					
25.4.9	25.4.9	Suministro, transporte e instalación Adaptador de limpieza 6"				Un	2	\$ 116 012,25	\$ 232 024,50					
25.4.10	25.4.10	Suministro, transporte e instalación Union 4"				Un	10	\$ 11 706,05	\$ 117 760,50					
25.4.11	25.4.11	Suministro, transporte e instalación Union 6"				Un	3	\$ 33 274,60	\$ 99 824,40					
25.4.12	25.4.12	Suministro, transporte e instalación Tee 6"				Un	2	\$ 134 245,35	\$ 268 490,70					
25.4.13	25.4.13	Suministro, transporte e instalación Tapon de 20cm diam = 4"				Un	12	\$ 19 934,10	\$ 239 209,70					
25.4.14	25.4.14	Suministro y colocación de adaptador macho 4" pvc presión				Un	4	\$ 43 969,50	\$ 175 878,00					
25.5	25.5	FILTRO GRUESO DINAMICO - Accesorios de Operación y Mantenimiento												

[Handwritten signature]




DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZON
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INVENTORIA
ACTA DE RECIBO FINAL

CODIGO ANV SPI 007
VERSION 2
25 DE 33

UNIDAD EJECUTIVA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA VILLAGARZON - La PPM VALOR TOTAL ACTA \$ 420 241 715.24 PERIODO DE ENE 30 2014 - OCT 31 2014
Nº 177 B DICIEMBRE 31 2014

CONTRATO DE OBRA	SPI No 056 de Fecha 19 de DICIEMBRE de 2011	PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	PLAZO ACUMULADO	DIECISIETE (17) MESES
OBJETO	CONSTRUCCION MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZON LA JOYA MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	FECHA DE INICIACION	6 de marzo de 2012	FECHA DE SUSPENSION 1	17 de diciembre de 2012
		FECHA DE REANUDACION 1	17 de enero de 2013	FECHA DE SUSPENSION 2	16 de mayo de 2013
		FECHA DE REANUDACION 2	2 de julio de 2013	FECHA DE SUSPENSION 3	12 de julio de 2013
		FECHA DE REANUDACION 3	29 de noviembre de 2013	FECHA DE SUSPENSION 4	20 de diciembre de 2013
		FECHA DE REANUDACION 4	13 de enero de 2014	FECHA DE SUSPENSION 5	30 de enero de 2014
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LAS AMERICAS	FECHA DE REANUDACION 5	21 de agosto de 2014	FECHA DE TERMINACION	21 de octubre de 2014
CONTRATO INTERVENTORIA	SPI No. 061 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2011	VALOR INICIAL (probado IVA)	\$12.137.584.273,09	VALOR TOTAL EN ADICIONES	
INTERVENTOR	CDNSORCIO INTERCIUILES 2011	VALOR TOTAL ACTUALIZADO	\$12.137.584.251,98	PROGRESA	05 MESES
SUPERVISOR DE CONTRATO	Arq VICTOR HUGO ROMO - SECRETARIO DE PLANEACION				

3411



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZON
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INVENTORIA

ACTA DE RECIBO FINAL

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
VEREDA Villagarzon - La Joya

CÓDIGO ANA-SPI-007
VERSION 2
28 DE 33

VALOR TOTAL ACTA \$ 420.241.215,24
PENSIÓN MES ENERO 2014 OCT 21 2014
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

No. DE ORDEN	ITEM	ESPECIFICACIÓN	GR.	PART.	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE MODIFICACION No. 6 DE FECHA 22-AGOSTO-2014				OBRA EJECUTADA				ACUMULADO					
					ITEM/DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
CONTRATO DE OBRA																						
OBJETO		SPI No 056 de fecha 19 de DICIEMBRE de 2011 CONSTRUCCION MACROACUEDUCTO VEREDA VILLAGARZON LA JOYA. MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO																				
CONTRATISTA		UNION TEMPORAL LAS AMERICAS																				
CONTRATO INTERVENTORIA		SPI No 061 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2011																				
INTERVENTOR		CONSORCIO INTERCOMUNES 2011																				
SUPERVISOR DE CONTRATO		Arq VICTOR HUGO ROMO - SECRETARIO DE PLANEACION																				

25.19		25.19.1	25.19.1	25.19.1	25.19.1	25.19.1	25.19.1	25.19.1	25.19.1	25.19.1	25.19.1	25.19.1	25.19.1	25.19.1	25.19.1	25.19.1	25.19.1	25.19.1	25.19.1
25.20		25.20.1	25.20.1	25.20.1	25.20.1	25.20.1	25.20.1	25.20.1	25.20.1	25.20.1	25.20.1	25.20.1	25.20.1	25.20.1	25.20.1	25.20.1	25.20.1	25.20.1	25.20.1
25.21		25.21.1	25.21.1	25.21.1	25.21.1	25.21.1	25.21.1	25.21.1	25.21.1	25.21.1	25.21.1	25.21.1	25.21.1	25.21.1	25.21.1	25.21.1	25.21.1	25.21.1	25.21.1
25.22		25.22.1	25.22.1	25.22.1	25.22.1	25.22.1	25.22.1	25.22.1	25.22.1	25.22.1	25.22.1	25.22.1	25.22.1	25.22.1	25.22.1	25.22.1	25.22.1	25.22.1	25.22.1
25.23		25.23.1	25.23.1	25.23.1	25.23.1	25.23.1	25.23.1	25.23.1	25.23.1	25.23.1	25.23.1	25.23.1	25.23.1	25.23.1	25.23.1	25.23.1	25.23.1	25.23.1	25.23.1
25.24		25.24.1	25.24.1	25.24.1	25.24.1	25.24.1	25.24.1	25.24.1	25.24.1	25.24.1	25.24.1	25.24.1	25.24.1	25.24.1	25.24.1	25.24.1	25.24.1	25.24.1	25.24.1
25.25		25.25.1	25.25.1	25.25.1	25.25.1	25.25.1	25.25.1	25.25.1	25.25.1	25.25.1	25.25.1	25.25.1	25.25.1	25.25.1	25.25.1	25.25.1	25.25.1	25.25.1	25.25.1
25.26		25.26.1	25.26.1	25.26.1	25.26.1	25.26.1	25.26.1	25.26.1	25.26.1	25.26.1	25.26.1	25.26.1	25.26.1	25.26.1	25.26.1	25.26.1	25.26.1	25.26.1	25.26.1

Handwritten signature and notes.

COUNGO	ANAP SPI 007		
VERSION	2		
	10	DE	33

[illegible]

No. DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No 6 DE FECHA 22-AGOSTO-2014				OBRA EJECUTADA		
	ITEM	GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
											CANTIDAD	VALOR				
9.03			9.03	Cámara de quiebre tipo (1'x1'4xns-2.0 mt.) en concreto 20Mpa, 14 mpa para soldado, acero de refuerza 50000 psi, accesorios y formaleta incluye Transporte.	und	16	\$ 4 872,556.25	\$ 79 560 900.00	2.00	\$ 8 945 112.50		\$ -	2.00	\$ 8,945 112.50		
9.04			9.04	Suministro, transporte e instalación de válvula de cable completa HF 6" EL.	und	4	\$ 2,407,538.70	\$ 9 630 154.80		\$ -		\$ -		\$ -		
9.05			9.05	Suministro, transporte e instalación de Pasamuro 8" HF, L=0.60m	und	8	\$ 947,689.20	\$ 7 581 513.60	4.00	\$ 3 790 756.80		\$ -	4.00	\$ 3 790 756.80		
9.06			9.06	Suministro, transporte e instalación codo 90° HF 6"	und	4	\$ 741,005.55	\$ 2 964 022.20	2.00	\$ 1,482 011.10		\$ -	2.00	\$ 1,482 011.10		
9.07			9.07	Suministro, transporte e instalación Tee HF 8x6"	und	2	\$ 987,226.40	\$ 1 934 452.80		\$ -		\$ -		\$ -		
9.08			9.08	Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC 6" ROE 21	ml	14	\$ 76,173.75	\$ 1 066,432.50		\$ -		\$ -		\$ -		
9.09			9.09	Tapa metálica 0.90x0.90m incluye marco y contrananco metálico y baga en concreto.	und		\$ 169 479.00	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		
9.10			9.10	Suministro, transporte o instalación Union de reparación 6"	Und		\$ 212 290.20	\$ -	2.00	\$ 424 580.40		\$ -	2.00	\$ 424 580.40		
9.11			9.11	Suministro, transporte e instalación Pasamuro hi 3"	und		\$ 463 026.00	\$ -	4.00	\$ 1 852 104.00		\$ -	4.00	\$ 1 852 104.00		
9.12			9.12	Suministro, transporte e instalación Union de reparación 3"	Und		\$ 47 787.30	\$ -	6.00	\$ 286 723.80		\$ -	6.00	\$ 286 723.80		
9.13			9.13	Suministro, transporte e instalación Válvula de purga HF EL 38" DB 3", incluye Tee HF 3x3 y accesorios	Und		\$ 1 378 531.55	\$ -	2.00	\$ 2 753 063.10		\$ -	2.00	\$ 2 753 063.10		
9.14			9.14	Suministro, transporte e instalación Codo gran radio 3" x 45	Und		\$ 50 804.55	\$ -	2.00	\$ 101 609.10		\$ -	2.00	\$ 101 609.10		
9.15			9.15	Caja de protección válvulas 0.5'0.5'0.7' m	Und		\$ 333 784.80	\$ -	2.00	\$ 667 569.60		\$ -	2.00	\$ 667 569.60		
9.16			9.16	Suministro, transporte e instalación tubería p v c presión 0-3" ROE 21 UZ	ML		\$ 25 052.00	\$ -	107.00	\$ 2 680 564.00		\$ -	107.00	\$ 2 680 564.00		
10			10	CANALETAS DE AFORO												
10.01			10.01	Localización y replanteo	m2	12	\$ 2 243.70	\$ 26 924.40		\$ -		\$ -		\$ -		
10.02			10.02	Excavación en material común	m3	10.6	\$ 22 820.40	\$ 240 460.32		\$ -		\$ -		\$ -		
10.03			10.03	Canaleta de Alono Parshall 4x 3/8", incluye Cto 28 mpa, 14 mpa para soldado, acero de refuerza 60000 psi, accesorios y formaleta	und	1	\$ 6 815 495.25	\$ 6 815 495.25		\$ -		\$ -		\$ -		
11			11	VIADUCTO 100 M PARA TUBERÍA DE 6"												
11.01			11.01	Localización y replanteo	ml	100	\$ 1 501.20	\$ 150 120.00		\$ -		\$ -		\$ -		
11.02			11.02	Excavación en material común	m3	108.7	\$ 2 020.40	\$ 2 200 577.48	154.00	\$ 231 184.80		\$ -	154.00	\$ 231 184.80		
11.03			11.03	Relleno con material de la excavación	m3	66.3	\$ 12 809.80	\$ 849 223.44	30.36	\$ 388 875.17		\$ -	30.36	\$ 388 875.17		
11.04			11.04	Concreto 21 M p a para terreros	m3	9.72	\$ 1 031 988.10	\$ 17 768 529.93	6.08	\$ 11 077 566.05		\$ -	6.08	\$ 11 077 566.05		
11.05			11.05	Concreto 21 M p a para zapatas y muros	m3	42.4	\$ 1 021 988.10	\$ 77 251 447.44	19.46	\$ 35 455 489.23		\$ -	19.46	\$ 35 455 489.23		
11.06			11.06	Suministro, transporte, faja, corra y anclaje acero 60000 p s y yadabo	kg	1875.29	\$ 5 659.20	\$ 10 612 641.17	2,009.70	\$ 11 939 214.24		\$ -	2 009.70	\$ 11 939 214.24		

Nº DE ORDEN	ITEM	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No 6 DE FECHA 22-AGOSTO-2014					OBRA EJECUTADA		
			ITEM DE PAGO							VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
			GR.	PART.	UMD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR		
12 12		12 12		Suministro, transporte e instalación de mordaza 3/8" T pesada	und	280		\$ 1 454,80	\$ 4 327 344,00	325,00	\$ 5 022 810,00		\$ -	325,00	\$ 5 022 810,00		
12 13		12 13		Suministro, transporte e instalación de guardacables D=1"	und	4		\$ 46 444,05	\$ 185 776,20		\$ -		\$ -		\$ -		
12 14		12 14		Suministro, transporte e instalación de guardacables D=1 7/8"	und	4		\$ 39 098,70	\$ 156 394,80		\$ -		\$ -		\$ -		
12 15		12 15		Suministro, transporte e instalación de guardacables D=3/8"	und	70		\$ 7 982,48	\$ 550 368,00		\$ -		\$ -		\$ -		
12 16		12 16		Suministro, transporte e instalación Sillin para cable 1"	und	4		\$ 262 742,40	\$ 1 050 969,60		\$ -		\$ -		\$ -		
12 17		12 17		Cercha metálica 80-50 m, H=0,50 m, con don superior e inferior en ángulo de 2 1/2"x3/16" y colosa en ángulo de 1 1/4" x 3/16" cada 0,80 m, incluye transporte	Ml	84		\$ 513 140,40	\$ 43 103 793,60		\$ -		\$ -		\$ -		
12 18	*****	12 18		Excavación material conlomerado	m3			\$ 4 558,00	\$ -	34,84	\$ 1 587 240,72		\$ -	34,84	\$ 1 587 240,72		
12 19	*****	12 19		Soldado de limpieza e = 0,05 mts (concreto 21 M.P.B.)	m2			\$ 52 232,85	\$ -	26,80	\$ 1 399 840,38		\$ -	26,80	\$ 1 399 840,38		
12 20	*****	12 20		Suministro, transporte e instalación Cable IWRC (6 x 19) alma de fibra D=3/4"	ml			\$ 30 315,80	\$ -	286,00	\$ 8 670 261,60		\$ -	286,00	\$ 8 670 261,60		
12 21	*****	12 21		Suministro, transporte e instalación Cable IWRC (6 x 19) alma de fibra D=1/2"	ml			\$ 19 581,75	\$ -	68,00	\$ 1 331 558,00		\$ -	68,00	\$ 1 331 558,00		
12 22	*****	12 22		Suministro, transporte e instalación de Mordaza 3/4" T pesada	und			\$ 26 311,50	\$ -	24,00	\$ 631 476,00		\$ -	24,00	\$ 631 476,00		
12 23	*****	12 23		Suministro, transporte e instalación de Mordaza 1/2" T pesada	und			\$ 18 381,60	\$ -	14,00	\$ 257 342,40		\$ -	14,00	\$ 257 342,40		
12 24	*****	12 24		Suministro, transporte e instalación Guardacables D=3/4"	und			\$ 12 241,80	\$ -	8,00	\$ 97 934,40		\$ -	8,00	\$ 97 934,40		
12 25	*****	12 25		Fabricación o instalación de Separadores para cables, incluye grapas	und			\$ 34 738,00	\$ -	65,00	\$ 2 257 970,00		\$ -	65,00	\$ 2 257 970,00		
12 26	*****	12 26		Pintura de protección para tuberia	ml			\$ 12 295,00	\$ -	137,00	\$ 1 684 415,00		\$ -	137,00	\$ 1 684 415,00		
13		13		VADUCTO 60 M PARA TUBERIA DE 8"													
13 01		13 01		Localización y epantio	ml	70		\$ 1 501,20	\$ 105 084,00		\$ -		\$ -		\$ -		
13 02		13 02		Excavación en terreno común	m3	42,4		\$ 22 820,40	\$ 967 584,96		\$ -		\$ -		\$ -		
13 03		13 03		Relleno con material de la excavación	m3	21,5		\$ 12 846,90	\$ 276 670,08		\$ -		\$ -		\$ -		
13 04		13 04		Concreto 21 Mts a para torres	m3	4,28		\$ 1 821 968,10	\$ 7 798 023,47		\$ -		\$ -		\$ -		
13 05		13 05		Concreto 21 Mts a para zapatas y muertos	m3	20,77		\$ 1 821 968,10	\$ 37 842 277,44		\$ -		\$ -		\$ -		
13 06		13 06		Suministro, transporte, fleje, cartá y amarre acero 60000 p.s.vaducto	kg	1060,56		\$ 5 659,20	\$ 6 001 921,15		\$ -		\$ -		\$ -		
13 07		13 07		Suministro, transporte e instalación Cable IWRC (6 x 19) alma de fibra D=3/4"	ml	233,4		\$ 30 315,60	\$ 7 075 681,04		\$ -		\$ -		\$ -		
13 08		13 08		Suministro, transporte e instalación Cable IWRC (6 x 19) alma de fibra D=1/2"	ml	151,7		\$ 19 581,75	\$ 2 970 551,48		\$ -		\$ -		\$ -		
13 09		13 09		Suministro, transporte e instalación Pargones en Cable IWRC (6 x 19) alma de acero D=3/8"	ml	98		\$ 13 284,00	\$ 1 301 832,00		\$ -		\$ -		\$ -		
13 10		13 10		Suministro, transporte e instalación de Mordaza 3/4" T pesada	und	70		\$ 26 311,50	\$ 1 841 805,00		\$ -		\$ -		\$ -		

[illegible]



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZON
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORIA
ACTA DE RECIBO FINAL

	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORIA			CODIGO AMV-SPH 007	
	ACTA DE RECIBO FINAL			VERSION 2	
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		VEREDA Villagarzon - La Jirya	ACTA N° 0	VALOR TOTAL ACTA \$ 470 241 2 16 24	PERIODO MES ENF 30 2014 - OCT 21 2014 FECHA DE RECIBIR 21 10 2014
CONTRATO DE OBRA	SPH No 056 de Fecha 19 de DICIEMBRE de 2011 CONSTRUCCION MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZON LA JIRYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO				
OBJETO	UNION TEMPORAL LAS AMERICAS				
CONTRATISTA	SPH No 081 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2011				
CONTRATO INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCIVILES 2011				
INTERVENTOR	Aq VICTOR HUGO ROMO - SECRETARIO DE PLANEACION				
SUPERVISOR DE CONTRATO					
PLAZO INICIAL		DOCE (12) MESES		PLAZO ACUMULADO	
FECHA DE INICIACION		6 de marzo de 2012		FECHA DE SUSPENSION 1	
FECHA DE REANUDACION 1		17 de enero de 2013		FECHA DE SUSPENSION 2	
FECHA DE REANUDACION 2		2 de julio de 2013		FECHA DE SUSPENSION 3	
FECHA DE REANUDACION 3		29 de noviembre de 2013		FECHA DE SUSPENSION 4	
FECHA DE REANUDACION 4		13 de enero de 2014		FECHA DE SUSPENSION 5	
FECHA DE REANUDACION 5		21 de agosto de 2014		FECHA DE TERMINACION	
VALOR INICIAL (incluido IVA)		\$12 137 584 273.09		VALOR TOTAL EN ADICIONES	
VALOR TOTAL ACTUALIZADO		\$12 137 584 251.98		PRORRATA	
				DIECISIETE (17) MESES	
				17 de diciembre de 2012	
				16 de mayo de 2013	
				12 de julio de 2013	
				20 de diciembre de 2013	
				30 de enero de 2014	
				21 de octubre de 2014	
				05 MESES	

No. DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE MODIFICACION No 6 DE FECHA 22-AGOSTO-2014				OBRA EJECUTADA			
			CONDICIONES ORIGINALES										PRESENTE ACTA				ACUMULADO			
			GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR					
16.04	16.04		16.04	Concreta 21 M.p.a para zapatas y cuentes	m3	9.8	\$ 1,821,963.10	\$ 17,855,287.38			\$		\$		\$					
16.05	16.05		16.05	Suministro, transporte, fleje, corte y amarrar acero 60000 p.s. viaducto	kg	360.24	\$ 5,659.20	\$ 2,038,670.21			\$		\$		\$					
16.06	16.06		16.06	Torre en tubería acero al Carbon D=61" e=6 mm	ml	12	\$ 258,616.80	\$ 3,103,401.60			\$		\$		\$					
16.07	16.07		16.07	Suministro, transporte e instalación Cable WRC (6 x 19) alma de fibra D=58"	ml	140	\$ 24,759.00	\$ 3,466,260.00			\$		\$		\$					
16.08	16.08		16.08	Suministro, transporte e instalación Cable WRC (6 x 19) alma de fibra D=38"	ml	100	\$ 13,284.00	\$ 1,328,400.00			\$		\$		\$					
16.09	16.09		16.09	Suministro, transporte e instalaciones Pendientes en Cable WRC (6 x 19) alma de acero D=38"	ml	36	\$ 13,284.00	\$ 478,224.00			\$		\$		\$					
16.10	16.10		16.10	Suministro, transporte e instalación de Mordaza 58" T pesado	und	50	\$ 22,474.80	\$ 1,123,740.00			\$		\$		\$					
16.11	16.11		16.11	Suministro, transporte e instalación de mordaza 38" T pesado	und	128	\$ 15,454.80	\$ 1,978,214.40			\$		\$		\$					
16.12	16.12		16.12	Suministro, transporte e instalación Guardacables D=58"	und	4	\$ 13,779.45	\$ 55,117.80			\$		\$		\$					
16.13	16.13		16.13	Suministro, transporte e instalación guardacables D=38"	und	30	\$ 7,862.40	\$ 235,872.00			\$		\$		\$					
16.14	16.14		16.14	Cercha metálica 0=0.35 m, H=0.35 m cordón superior e inferior en ángulo de 2"x3/16" y celosía en ángulo de 3/4" x1/0" cada 0.80 m, incluye transporte	ML	40	\$ 413,598.15	\$ 16,543,926.00			\$		\$		\$					
17	17		17	VIADUCTO 36 M PARA TUBERÍA DE 6"																
17.01	17.01		17.01	Localización y replanteo	ml	36	\$ 1,501.20	\$ 54,043.20			\$		\$		\$					
17.02	17.02		17.02	Excavación en material común	m3	20	\$ 22,820.40	\$ 456,408.00			\$		\$		\$					
17.03	17.03		17.03	Relevo con material de la excavación	m3	5.6	\$ 12,808.80	\$ 71,728.28			\$		\$		\$					
17.04	17.04		17.04	Concreta 21 M.p.a para zapatas y cuentes	m3	14.4	\$ 1,821,960.10	\$ 26,236,540.64			\$		\$		\$					
17.05	17.05		17.05	Suministro, transporte, fleje, corte y amarrar acero 60000 p.s. viaducto	kg	423	\$ 5,659.20	\$ 2,393,841.60			\$		\$		\$					
17.06	17.06		17.06	Torre en tubería acero al Carbon D=61" e=6 mm	ml	12	\$ 258,616.80	\$ 3,103,401.60			\$		\$		\$					
17.07	17.07		17.07	Suministro, transporte e instalación Cable WRC (6 x 19) alma de fibra D=12"	ml	300	\$ 19,581.75	\$ 5,874,525.00			\$		\$		\$					
17.08	17.08		17.08	Suministro, transporte e instalaciones Pendientes en Cable WRC (6 x 19) alma de acero D=38"	ml	25	\$ 13,284.00	\$ 332,100.00			\$		\$		\$					
17.09	17.09		17.09	Suministro, transporte e instalación Mordaza 58" T pesado	und	46	\$ 22,474.80	\$ 1,033,840.80			\$		\$		\$					
17.10	17.10		17.10	Guardacables D=58"	und	46	\$ 13,779.45	\$ 633,854.70			\$		\$		\$					
17.11	17.11		17.11	Suministro, transporte e instalación Mordaza 38" T pesado	und	18	\$ 7,862.40	\$ 141,523.20			\$		\$		\$					
17.12	17.12		17.12	Cercha metálica B=0.50 m, H=0.60 m cordón superior e inferior en ángulo de 1 1/2"x3/16" y celosía en vanilla 5/8" cada 0.50 m, incluye transporte	ML	36	\$ 359,444.25	\$ 12,939,993.00			\$		\$		\$					
18	18		18	VIADUCTO 30 M PARA TUBERÍA DE 6"																
18.01	18.01		18.01	Localización y replanteo	ml	30	\$ 1,501.20	\$ 45,036.00			\$		\$		\$					




DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZON
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORIA
ACTA DE RECIBO FINAL

UNIDAD EJECUTORA	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VALOR	VALOR TOTAL	ACTIVO	8	VALOR TOTAL ACTA	\$ 420 241 218 24	PERIODO DE VIGENCIA	21	2011
CONTRATO DE OBRA	SPI No 058 de fecha 18 de DICIEMBRE de 2011									
OBJETO	CONSTRUCCION MAGRACUEDUCTO VERED AL VILLAGARZON LA JOYA MUNICIPIO DE VILLAGARZON									
CONTRATISTA	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO									
CONTRATO INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL LAS AMERICAS									
INTERVENIOR	SPI No 061 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2011									
	CONSORCIO INTERMUNICIPALES 2011									
SUPERVISOR DE CONTRATO	AQ VICTOR HUGO ROMO - SECRETARIO DE PLANEACION									

No. DE ORDEN	ITEM	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No 6 DE FECHA 22-AGOSTO-2014					OBRA EJECUTADA		
			GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO	
22.41		Caja de protección de válvulas de purga 0.8" 8" 0.8 m.				Und	92	\$ 387 946.80	\$ 35 691 105.60		\$		\$		\$		
22.42		Concreto 21 mpa para anclaje de tuberías, sin formateo				M3	40	\$ 1 413 787.50	\$ 56 551 500.00	705.11	\$ 996 875 704.13	12.00	\$ 16 965 450.00	705.11	\$ 996 875 704.13		
22.43		Suministro, transporte e instalación adaptador limpieza pvc 4"				Und	50	\$ 42 873.30	\$ 2 143 665.00		\$		\$		\$		
22.44		Suministro, Transporte e instalación Válvula de Purga HF EL SB DB 3", Incluye Tee HF 6x3" y accesorios				Und	13	\$ 2 082 306.15	\$ 27 069 979.95		\$		\$		\$		
22.45		Suministro, Transporte e instalación Válvula de Purga HF EL SB DB 3", Incluye Tee HF 3x3" y accesorios.				Und	71	\$ 1 376 531.55	\$ 97 733 740.05		\$		\$		\$		
22.46		Suministro, transporte a instalación Válvula de Purga HF EL SB DB 2", incluye Tee 2x2" y accesorios				Und	6	\$ 821 803.05	\$ 6 574 424.40	14.00	\$ 11 505 242.70		\$	14.00	\$ 11 505 242.70		
22.47		Válvula de Purga HF EL SB DB 1 1/2", incluye Tee 1 1/2"x1 1/2" y accesorios				Und	16	\$ 734 215.05	\$ 11 747 440.80		\$		\$		\$		
22.48		Suministro, transporte e instalación Válvula HF EL SB DG D=1" (incluye accesorios).				und	8	\$ 341 811.90	\$ 2 734 495.20		\$		\$		\$		
22.49		Suministro, transporte e instalación Llave de paso 3/4", incluye adaptadores machos				und	122	\$ 33 700.05	\$ 4 111 406.10		\$		\$		\$		
22.50		Suministro, transporte e instalación Válvula Ventosa HF6x1/2", incluye Accesorios				Und	13	\$ 1 504 066.05	\$ 19 552 858.65	13.00	\$ 19 552 858.65	13.00	\$ 19 552 858.65	13.00	\$ 19 552 858.65		
22.51		Suministro, transporte e instalación Válvula Ventosa HF 3x1/2", incluye Accesorios				Und	13	\$ 740 322.45	\$ 8 624 191.85	9.00	\$ 6 662 902.05	9.00	\$ 6 662 902.05	9.00	\$ 6 662 902.05		
22.52		Suministro, transporte e instalación Ventosa HF 2", incluye Tee 2x2 pvc y accesorios				Und	15	\$ 346 123.80	\$ 5 191 857.00		\$		\$		\$		
22.53		Suministro, transporte a instalación Ventosa HF 1", incluye Tee 1x1 pvc y accesorios				Und	46	\$ 208 545.30	\$ 9 593 083.80		\$		\$		\$		
22.54		Suministro, transporte e instalación Válvula de flotador D=2"				Und	20	\$ 233 874.00	\$ 4 677 480.00	11.00	\$ 2 572 614.00	11.00	\$ 2 572 614.00	11.00	\$ 2 572 614.00		
22.55		Excavación material conglomerado ventosa 2"x1/2", incluye tee 1 1/2" y accesorios				m3		\$ 45 568.00	\$	4149.35	\$ 189 036 087.30		\$	4149.35	\$ 189 036 087.30		
22.56	N	Suministro e instalación de válvula ventosa doble acción 2" doble cámara br.				Und		\$ 1 045 391.00	\$	55.00	\$ 57 496 505.00	17.00	\$ 17 771 647.00	55.00	\$ 57 496 505.00		
22.57	N	Suministro, transporte e instalación válvula compuesta 2" SB BR con volante				Und		\$ 820 615.00	\$	55.00	\$ 45 133 825.00	17.00	\$ 13 950 455.00	55.00	\$ 45 133 825.00		
22.58	N	Suministro, transporte e instalación válvula ventosa 2"x1/2", incluye tee galv 2" y accesorios				Und		\$ 475 263.00	\$		\$		\$		\$		
22.59	N	Suministro, transporte e instalación válvula ventosa 1 1/2"x1/2", incluye tee 1 1/2" y accesorios				Und		\$ 520 527.00	\$		\$		\$		\$		
22.60	N	Materiales granular				m3		\$ 103 644.00	\$	156.00	\$ 16 168 464.00		\$	156.00	\$ 16 168 464.00		
22.61	N	Refric de material de excavación				M3		\$ 9 413.55	\$	184.84	\$ 1 740 000.58		\$	184.84	\$ 1 740 000.58		
22.62	N	Suministro, transporte e instalación tubería pvc presión D=3" RDE 21 UZ				ML		\$ 25 032.00	\$	491.00	\$ 12 300 532.00		\$	491.00	\$ 12 300 532.00		
22.63	N	Suministro, transporte e instalación tubería sanitaria PVC 3"				ML		\$ 30 285.00	\$	300.00	\$ 9 085 500.00		\$	300.00	\$ 9 085 500.00		

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZON
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORIA

	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORIA		CODIGO VERSION		ANX SPI-007 2	
	ACTA DE RECIBO FINAL				24 DE 33	
UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VEREDA Villagarzon, La Joya	ACTA N° B	VALOR TOTAL ACTA \$ 420 241 216 24	PERIODO MES ENE 30 2014 - OCT 31 2014 11-23-18 11 DE 18-11		
CONTRATO DE OBRA OBJETO CONTRATISTA CONTRATO INTERVENTORIA INTERVENTOR SUPERVISOR DE CONTRATO	SPI No 056 de Fecha 19 de DICIEMBRE de 2011 CONSTRUCCION MACRODISEÑO VERREDA VILLAGARZON LA JOYA MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO UNION TEMPORAL LAS AMERICAS SPI No: 061 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2011 CONSORCIO INTERIOVALES 2011 ARIQ VICTOR HUGO ROMO SECRETARIO DE PLANEACION		PLAZO INICIAL FECHA DE INICIACION FECHA DE REANUDACION 1 FECHA DE REANUDACION 2 FECHA DE REANUDACION 3 FECHA DE REANUDACION 4 FECHA DE REANUDACION 5 VALOR INICIAL (Prestado IVA) VALOR TOTAL ACTUALIZADO	DDCE (12) MESES 8 de marzo de 2012 17 de enero de 2013 2 de julio de 2013 29 de noviembre de 2013 13 de enero de 2014 21 de agosto de 2014 \$12 137 584 273.09 \$17 137 584 251.96	DIECISIETE (17) MESES 17 de diciembre de 2012 16 de mayo de 2013 12 de julio de 2013 20 de diciembre de 2013 30 de enero de 2014 21 de octubre de 2014 PRODUCCION 05 MESES	VALOR TOTAL EN ADICIONES VALOR TOTAL ACTUALIZADO

No. DE ORDEN	ITEM	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE MODIFICACION No 6 DE FECHA 22-AOOS-TO-2014					OBRA EJECUTADA		
			GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALDR UNITARIO	VALDR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
25.5.1		Suministro, transporte e instalación Válvula manopla diam: 8", con bridas de apertura rápida	Un	2	\$	1 101 543.75	\$	2 383 087.50		\$		\$			
25.5.2		Suministro, transporte e instalación llave de paso diam = 6" bronce	Un	2	\$	2 031 972.75	\$	4 063 945.50		\$		\$			
25.5.3		Suministro, transporte e instalación Compuerta Latera 50X50 Sd	Un	7	\$	898 916.40	\$	6 292 414.80		\$		\$			
25.5.4		Suministro, transporte e instalación Vorradero tranqual 90" en acrílico	Un	1	\$	389 416.40	\$	389 416.40		\$		\$			
25.5.5		Suministro, transporte e instalación Regla de alijo an acrílico	Un	3	\$	177 812.55	\$	533 437.65		\$		\$			
25.5.6		Suministro, transporte e instalación Nipa para muro 4" 8x4, L= 380 2x= 279	un	6	\$	1 073 501.10	\$	8 588 008.80		\$		\$			
25.6		FILTRO GRUESO DINAMICO - ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS													
25.6.1		Andén e=0.00m	M2	25	\$	70 985.45	\$	1 774 136.25		\$		\$			
25.6.2		Canalera agua lluvia en concreto 21Mpa 1er 05m a= 2m	Ml	30	\$	106 787.70	\$	3 203 831.00		\$		\$			
25.6.3		Suministro, transporte e instalación canla p v c 0.15m (Filtros Drelmicos)	M2	27	\$	32 474.25	\$	876 804.75		\$		\$			
25.7		FILTROS LENTOS - Prefiniales													
25.7.1		Dacopala y limpete	M2	750	\$	3 589.10	\$	2 693 325.00		\$		\$			
25.7.2		Lacacacón triplante	M2	750	\$	2 243.70	\$	1 682 775.00		\$		\$			
25.7.3		Excavación manual en tierra	M3	1875	\$	31 426.65	\$	58 924 968.75		\$		\$			
25.7.4		Excavación material conglomerado	M3	1875	\$	45 588.45	\$	85 422 093.75		\$		\$			
25.7.5		Retiro de material sobrante	M3	3000	\$	9 413.55	\$	28 240 650.00		\$		\$			
25.7.6		Releño con material de excavación	M3	750	\$	12 808.80	\$	9 606 600.00		\$		\$			
25.7.7		Solado de limpete e = 0.05 mis (concreto 21 Mpa al Filtra Lento)	M2	98.6	\$	46 562.85	\$	4 597 971.31		\$		\$			
25.7.8		Excavación en roca	m3		\$	151 337.70	\$			\$		\$			
25.8		FILTROS LENTOS - Estructuras en Concreto													
25.8.1		Concreto impermeabilizado 28 Mpa (Filtra Lento)	M3	354.09	\$	1 156 740.75	\$	409 590 332.17		\$		\$			
25.8.2		Suministro, transporte e instalación canla p v c 0.15m (Filtros Lentos)	Ml	135	\$	32 474.25	\$	4 384 023.75		\$		\$			
25.8.3		Suministro, transporte, fleje, corte y amarre acero 60000 a 8.1 Filtra Lento	Kg	33839	\$	5 346.00	\$	179 834 094.00		\$		\$			
25.9		FILTROS LENTOS - MEDIO FILTRANTE Y LECHO DE SOPORTE													
25.9.1		Arena media de río diam: 0.15 a 0.35 mm	M3	3301	\$	139 378.05	\$	45 994 258.50		\$		\$			
25.9.2		Arena gruesa diam: 1 a 1.4 mm	M3	331	\$	139 378.05	\$	4 599 475.65		\$		\$			
25.9.3		Gravilla de río diam = 4 a 5.6 mm	M3	331	\$	176 202.00	\$	5 814 886.00		\$		\$			
25.9.4		Grava de río diam = 16 a 25 mm	M3	495	\$	176 202.00	\$	8 721 999.00		\$		\$			

1946



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZON
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORIA
ACTA DE RECIBO FINAL

[illegible]

No. DE ORDEN	ITEM	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No 6 DE FECHA 22-AGOSTO-2014					OBRA EJECUTADA		
		GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO			
25.13.3		25.13.3		Excavación manual en tierra	M3	36.4	\$ 31 425.65	\$ 1,143 930.08										
25.13.4		25.13.4		Excavación en material conglomerado	M3	4	\$ 42 558.45	\$ 162 233.80	34.34	\$			34.34	\$	1 564 477.17			
25.13.5		25.13.5		Retiro de material sobrante (incluye 30% expansión)	M3	43.7	\$ 9 413.55	\$ 411 372.14	3.31	\$			3.31	\$	31 158.85			
25.13.6		25.13.6		Relevo con material de excavación	M3	4.9	\$ 12 808.90	\$ 61 482.24		\$				\$				
25.13.7		25.13.7		Siada de limpieza = 0.05 mts (concreto 21 M2 a)	m2		\$ 52 232.85		70.39	\$			70.39	\$	3 676 670.31			
25.14		25.14		CASETA ALMACENAMIENTO ARENA - Estructuras en Concreto														
25.14.1		25.14.1		Concreto 3000 psi para estructuras Caseta Almacenamiento Arena	M3	4.05	\$ 1 040 257.35	\$ 4 213 042.27	12.01	\$			12.01	\$	12 493 490.77			
25.14.2		25.14.2		Concreto ciclopico Caseta Almacenamiento Arena	M3	2.8	\$ 645 343.20	\$ 1 805 960.96		\$				\$				
25.14.3		25.14.3		Contrapiso e=0.08 m Caseta 1	M2	23	\$ 60 351.45	\$ 1 388 773.35	70.39	\$			70.39	\$	4 350 250.27			
25.14.4		25.14.4		Andén en concreto 17.5 Mts. e= 0.08 m	M2	9.5	\$ 70 965.45	\$ 674 171.78	20.90	\$			20.90	\$	1 476 081.36			
25.14.5		25.14.5		Canaletes equpes lluvias en Concreto 21 Mts	ML	25.8	\$ 106 787.70	\$ 2 755 122.86	19.70	\$			19.70	\$	1 996 929.99			
25.14.6		25.14.6		Suministro, transporte, lleje, cone y amarre acero 600x60 p.s i Caseta 1	Kg	490	\$ 5 346.00	\$ 2 619 540.00	1870.85	\$			1870.85	\$	10 001 564.10			
25.14.7		25.14.7		Concreto ciclopico de 2500psi	M3		\$ 468 882.00	\$	4.32	\$			4.32	\$	2 025 570.24			
25.15		25.15		CASETA ALMACENAMIENTO ARENA - Carpintería metálica														
25.15.1		25.15.1		Suministro, transporte e instalación Puerta con Grapa, lamina cal. 20	M2	4.6	\$ 379 548.45	\$ 1 745 922.87	4.52	\$			4.62	\$	1 753 513.84			
25.15.2		25.15.2		Suministro, transporte e instalación Ventana con marco metálico y reja de seguridad	M2	2.2	\$ 196 549.20	\$ 432 408.24	3.20	\$			3.20	\$	629 957.44			
25.15.3		25.15.3		Suministro, transporte e instalación Marco metálico para puerta	Un	3	\$ 213 439.05	\$ 640 317.15	1.00	\$			1.00	\$	213 439.05			
25.16		25.16		CASETA ALMACENAMIENTO ARENA - Accesorios sanitarios														
25.16.2		25.16.2		Suministro, transporte e instalación Lavamanos sencillo, con accesorios	Un	1	\$ 136 597.05	\$ 136 597.05	1.00	\$			1.00	\$	136 597.05			
25.16.3		25.16.3		Suministro, transporte e instalación Juego de incrustaciones para baño	Un	1	\$ 35 463.15	\$ 35 463.15	1.00	\$			1.00	\$	35 463.15			
25.16.4		25.16.4		Suministro, transporte e instalación Lavaplatos metálico, con accesorios	Un	1	\$ 140 505.30	\$ 140 505.30	1.00	\$			1.00	\$	140 505.30			
25.16.5		25.16.5		Suministro, transporte e instalación Tanque de almacenamiento de 250 lts plastico con tapa y válvula selladora	Un	1	\$ 1 009 727.10	\$ 1 009 727.10		\$				\$				
25.16.6		25.16.6		Suministro, transporte e instalación Dostificador de cloro de cabera constante en tubería pvc sanitaria	Un	1	\$ 3 420 335.70	\$ 3 420 335.70		\$				\$				
25.16.7		25.16.7		Suministro, transporte e instalación Regilla metálica para sifón piso	Un	3	\$ 24 651.00	\$ 73 953.00	1.00	\$			1.00	\$	24 651.00			
25.17		25.17		CASETA ALMACENAMIENTO ARENA - OTROS														
25.17.1		25.17.1		Muros en ladrillo a la vista (P90)	M2	421	\$ 67 409.55	\$ 2 831 201.10	50.43	\$			50.43	\$	3 399 463.61			

[Handwritten signature]




DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZON
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORIA
ACTA DE RECIBO FINAL

COLOMBIA
VERSION
2
27 DE 35

UNIDAD EJECUTORA	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VEREDA	Villagarzon - La Joya	ACTIV	8	VALOR TOTAL ACTA	\$ 420 241 216.24	PERIODO DE VIGENCIA	01/01/2014 - 31/12/2014
CONTRATO DE OBRA	SPT No 056 de fecha 19 de DICIEMBRE de 2011								
OBJETO	CONSTRUCCION MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZON LA JOYA MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO								
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LAS AMERICAS								
CONTRATO INTERVENTORIA	SPT No. 061 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2011								
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVILES 2011								
SUPERVISOR DE CONTRATO	Aui VICTOR HUGO ROMO - SECRETARIO DE PLANEACION								
	PLAZO INICIAL	FECHA DE INICIACION	PLAZO ACUMULADO	DECISETE (17) MESES					
		FECHA DE INICIACION		6 de marzo de 2012	17 de diciembre de 2012				
		FECHA DE REANUDACION 1		17 de enero de 2013	16 de mayo de 2013				
		FECHA DE REANUDACION 2		2 de julio de 2013	12 de junio de 2013				
		FECHA DE REANUDACION 3		29 de noviembre de 2013	20 de diciembre de 2013				
		FECHA DE REANUDACION 4		13 de enero de 2014	30 de febrero de 2014				
		FECHA DE REANUDACION 5		21 de agosto de 2014	21 de octubre de 2014				
		VALOR INICIAL (INCLUIDO IVA)		\$12 137 504.273.09	VALOR TOTAL EN ADICIONES				
		VALOR TOTAL ACTUALIZADO		\$12 137 504.251.96	PRIORIDAD			05 MESES	

No. DE ORDEN	ITEM	ESPECIFICACION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE MODIFICACION No 6 DE FECHA 22-AGOSTO-2014				OBRA EJECUTADA			
			GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO
25 17 2		Suministro, transporte e instalacion Cubierta en lamina ondulada de A - C No 6				M2	40	\$ 36 700.80	\$ 1 468 152.00	148.08	\$ 5 435 098.70	148.08	\$ 5 435 098.70	
25 17 3		Suministro, transporte e instalacion Correa metalica, h= 0.20m, vanilla diam=1" celosias cada 0.30 m en diam= 3/8"				ML	52	\$ 23 614.20	\$ 1 227 938.40		\$		\$	
25 17 4		Suministro, transporte e instalacion Marco para ventana en madera				M2	4	\$ 25 068.15	\$ 100 272.60		\$		\$	
25 17 5		Suministro, transporte e instalacion Enchape pared color blanco				M2	7.1	\$ 49 830.05	\$ 352 373.36	8.15	\$ 305 224.81		\$	\$ 305 224.81
25 17 6		Suministro, transporte e instalacion Piso en Ceramica trafico 4				M2	7	\$ 63 252.90	\$ 442 770.30	20.89	\$ 1 321 363.08		\$	\$ 1 321 363.08
25 17 7		Cableado telefónico				ML		\$ 60 581.25	\$	7.15	\$ 433 155.94		\$	\$ 433 155.94
25 17 8		Canal amazoónico, inc. accesorios				ML		\$ 29 714.95	\$	14.60	\$ 433 836.81		\$	\$ 433 836.81
25 17 9		Balante PVC 3" inc. accesorios				ML		\$ 27 152.55	\$	9.00	\$ 244 372.95		\$	\$ 244 372.95
25 17 10		Panela empalmada muros 1.4 sika 1				M2		\$ 31 468.75	\$	131.85	\$ 4 151 791.89		\$	\$ 4 151 791.89
25 17 11		Plancha de pared (tres manos)				M2		\$ 14 825.70	\$	124.50	\$ 1 845 799.65		\$	\$ 1 845 799.65
25 17 12		Caja de inspección (0.7 x 0.7 m) en concreto				UN		\$ 333 784.80	\$	1.00	\$ 333 784.80		\$	\$ 333 784.80
25 17 13		Meson				M2		\$ 157 535.55	\$	0.90	\$ 141 782.00		\$	\$ 141 782.00
25 17 14		Línea 3"12 AWG por tubería				ML		\$ 19 089.80	\$	21.00	\$ 401 095.80		\$	\$ 401 095.80
25 17 15		Salida lámpara incandescente 100 W				UN		\$ 47 318.95	\$	2.00	\$ 94 637.70		\$	\$ 94 637.70
25 17 16		Salida tema monofásica				UN		\$ 53 374.95	\$	1.00	\$ 53 374.95		\$	\$ 53 374.95
25 17 17		Salida para interruptor sencillo				UN		\$ 22 875.75	\$	1.00	\$ 22 875.75		\$	\$ 22 875.75
25 17 18		Suministro, transporte e instalacion tablero de 3 circuitos				UN		\$ 236 049.00	\$	1.00	\$ 236 049.00		\$	\$ 236 049.00
25 17 19		Acornelida general de 1"				ML		\$ 38 084.00	\$	30.00	\$ 1 141 938.00		\$	\$ 1 141 938.00
25 17 20		Guarda escoba an. cerámica				ML		\$ 16 807.70	\$	17.98	\$ 298 006.43		\$	\$ 298 006.43
25 17 21		Muro en ladrillo tipo No. 4				M2		\$ 41 759.55	\$	87.02	\$ 3 633 916.04		\$	\$ 3 633 916.04
25 17 22		Bufo hidráulico 1/2"				Un		\$ 51 647.00	\$	1.00	\$ 51 647.00		\$	\$ 51 647.00
25 17 23		Bufo sanitario 2"				Un		\$ 61 318.00	\$	3.00	\$ 183 954.00		\$	\$ 183 954.00
25 17 24		Correa metálica an. perfil en C 120x60x1.2mm				ml		\$ 35 330.00	\$	42.00	\$ 1 357 860.00		\$	\$ 1 357 860.00
25 17 25		Escobero sobre panel				M2		\$ 15 320.00	\$	124.50	\$ 1 907 340.00		\$	\$ 1 907 340.00
25 17 26		Conexión de colimación de 0,12 x 0,10 incluye refuerzo en vanda 1/2"				ML		\$ 25 641.00	\$	83.89	\$ 2 151 023.49		\$	\$ 2 151 023.49
25 17 27		Perfil rectangular 150x50x4.9mm				ml		\$ 95 076.00	\$	97.03	\$ 7 404 164.28		\$	\$ 7 404 164.28
25 17 28		Perfil C 120x60x2.00mm cegón				ml		\$ 107 423.00	\$	32.10	\$ 3 445 278.30		\$	\$ 3 445 278.30
25 17 29		Canal en lamina galvanizada L=1.00 m				ml		\$ 99 511.00	\$	17.81	\$ 1 772 290.91		\$	\$ 1 772 290.91
25 18		SALA DE CLORACION - PRELIMINARES												
25 18 1		Descapote a mano. Excm = 0.20 m				M2	20.81	\$ 3 599.10	\$		\$		\$	\$ 3 599.10
25 18 2		Localización y replanteo				M2	23.0	\$ 2 243.70	\$	47.50	\$ 170 947.25		\$	\$ 170 947.25
25 18 3		Excavación en conglomerado				M3	20	\$ 45 586.45	\$	47.50	\$ 106 575.75		\$	\$ 106 575.75
25 18 4		Base receta compactado				M3	2.4	\$ 91 422.00	\$	8.82	\$ 310 708.63		\$	\$ 310 708.63
25 18 5		Refrío material seleccionado y compactado				M3	12	\$ 97 868.80	\$	8.37	\$ 812 412.80		\$	\$ 812 412.80
25 18 6		Concreto cegado				M3	1.8	\$ 645 343.20	\$	1 174 305.50	\$ 823 360.56		\$	\$ 823 360.56
25 18 7		Paga base en concreto (3000 psi)				M2	23.8	\$ 70 965.43	\$	21.40	\$ 1 518 680.63		\$	\$ 1 518 680.63
25 18 8		Concreto cegado de 2500psi				M3		\$ 468 882.00	\$		\$		\$	\$

[Handwritten signature]

	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORIA		
	CODIGO	MAN/SPI-007	
	VERSION	2	
	30 DE 33		


MONEDACUOTRA	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VEREDA	Villagarzon - La Joya	ACTIV	8	VALOR TOTAL ACTA	5	420 241 216,24	PERIODO MES. ENERO 2014 - OCTUBRE 2014	FECHA DE INICIACION	21	10	2014
CONTRATO DE OBRA	SPI No.056 de Fecha 19 de DICIEMBRE de 2011								DICISIETE (17) MESES				
OBJETO	CONSTRUCCION MACROACCUELOTO VEREDAL VILLAGARZON LA JOYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO								PLAZO ACUMULADO				
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LAS AMERICAS								DOCE (12) MESES				
CONTRATO INTERVENTORIA	SPI No. 061 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2011								FECHA DE INICIACION				
INTERVENIDR	CONSORCIO INTERCIVILES 2011								FECHA DE REANUDACION 1				
SUPERVISOR DE CONTRATO	Agr VICTOR HUGO ROMO - SECRETARIO DE PLANEACION								FECHA DE REANUDACION 2				
									FECHA DE REANUDACION 3				
									FECHA DE REANUDACION 4				
									FECHA DE REANUDACION 5				
									FECHA DE TERMINACION				
									VALOR INICIAL (incluye IVA)				
									VALOR TOTAL ACTUALIZADO				
									\$12 137 964 251,98				
									\$12 137 964 251,98				
									PROYECTOR				
									VALOR TOTAL EN ADICIONES				
									05 MESES				

No. DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No.6 DE FECHA 22-AGOSTO-2014				OBRA EJECUTADA	
	ITEM	PART.	ITEM DE PAGO	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALDR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
										CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
25.33		25.33	CASETA OPERADOR PLANTA - Preliminares												
25.33.1		25.33.1	Descapote y limpieza	M2	65.8	\$ 3,599.10	\$ 236,820.78	48.48	\$	167,286.17	\$	48.48	\$ 167,286.17		
25.33.2		25.33.2	Excavación y replanteo	M2	65.8	\$ 2,243.70	\$ 147,833.46	44.70	\$	100,393.39	\$	44.70	\$ 100,393.39		
25.33.3		25.33.3	Excavación manual en tierra	M3	53.3	\$ 31,426.65	\$ 1,675,040.45		\$		\$		\$		
25.33.4		25.33.4	Excavación en material compactado	M3	5.9	\$ 45,558.45	\$ 268,794.88	3.93	\$	174,498.66	\$	3.93	\$ 174,498.66		
25.33.5		25.33.5	Retiro de material sobrante (incluye 30% desperdicio)	M3	64	\$ 9,413.55	\$ 602,467.20		\$		\$		\$		
25.33.6		25.33.6	Relevo con material de excavación	M3	7.5	\$ 12,608.80	\$ 89,661.60	11.19	\$	143,202.38	\$	11.19	\$ 143,202.38		
25.34		25.34	CASETA OPERADOR PLANTA - Estructuras en concreto												
25.34.1		25.34.1	Concreto para estructuras 3000 PSI	M3	5.95	\$ 1,040,257.35	\$ 6,199,533.81	4.44	\$	4,618,432.63	\$	4.44	\$ 4,618,432.63		
25.34.2		25.34.2	Concreto ciclopeo	M3	4.3	\$ 845,343.20	\$ 3,636,785.76	2.30	\$	1,934,789.36	\$	2.30	\$ 1,934,789.36		
25.34.3		25.34.3	Concreto e=0.08 m	M2	4.5	\$ 60,381.45	\$ 2,714,975.78	21.54	\$	1,300,618.43	\$	21.54	\$ 1,300,618.43		
25.34.4		25.34.4	Concreto para andén e = 0.08 m	M2	21	\$ 70,965.45	\$ 1,490,274.42	21.00	\$	1,490,274.42	\$	21.00	\$ 1,490,274.42		
25.34.5		25.34.5	Concreto para cancheta	M2	20	\$ 106,787.70	\$ 2,135,754.00	16.00	\$	1,708,603.20	\$	16.00	\$ 1,708,603.20		
25.34.6		25.34.6	Acero de Refuerzo	Kg	795	\$ 3,466.00	\$ 2,759,430.00	681.69	\$	3,537,394.74	\$	681.69	\$ 3,537,394.74		
25.34.7		25.34.7	Concreto ciclopeo de 2500psi	M3	3	\$ 488,682.00	\$ 1,466,046.00	2.68	\$	1,256,603.76	\$	2.68	\$ 1,256,603.76		
25.35		25.35	CASETA OPERADOR PLANTA - Carpintería metálica												
25.35.1		25.35.1	Puerta con chapla, lamina cal. 20	M2	4.4	\$ 378,548.45	\$ 1,670,013.18	4.26	\$	1,618,876.40	\$	4.26	\$ 1,618,876.40		
25.35.2		25.35.2	Ventilana con marco metálico y resia de seguridad	M2	6.5	\$ 196,549.20	\$ 1,277,569.80	5.13	\$	1,009,297.40	\$	5.13	\$ 1,009,297.40		
25.35.3		25.35.3	Marco metálico puerta	Un	5	\$ 213,439.05	\$ 1,067,195.25	3.00	\$	640,317.15	\$	3.00	\$ 640,317.15		
25.36		25.36	CASETA OPERADOR PLANTA - Aparatos Sanitarios												
25.36.1		25.36.1	Inodoro blanco, con accesorios	Un	1	\$ 355,891.05	\$ 355,891.05	1.00	\$	355,891.05	\$	1.00	\$ 355,891.05		
25.36.2		25.36.2	Lavamanos setado, con accesorios	Un	1	\$ 136,597.05	\$ 136,597.05	1.00	\$	136,597.05	\$	1.00	\$ 136,597.05		
25.36.3		25.36.3	Juego de inodoros para baño	Un	1	\$ 35,463.15	\$ 35,463.15	1.00	\$	35,463.15	\$	1.00	\$ 35,463.15		
25.36.4		25.36.4	Lavaplatos metálico, con accesorios	Un	1	\$ 140,505.30	\$ 140,505.30	1.00	\$	140,505.30	\$	1.00	\$ 140,505.30		
25.36.5		25.36.5	Tanque de almacenamiento de 240 lts plástico con tapa y válvula selladora	Un	1	\$ 1,009,727.10	\$ 1,009,727.10		\$		\$		\$		
25.36.6		25.36.6	Regilla metálica para sifón piso	Un	3	\$ 24,651.00	\$ 73,943.00	3.00	\$	73,943.00	\$	3.00	\$ 73,943.00		
25.37		25.37	CASETA OPERADOR PLANTA - Otros												
25.37.1		25.37.1	Muros en ladrillo a la vista	M2	99.4	\$ 67,409.55	\$ 6,633,069.72		\$		\$		\$		
25.37.2		25.37.2	Cubierta en lamina ondulada de A - C No. 8	M2	66	\$ 36,703.80	\$ 2,422,450.80	42.96	\$	1,577,529.32	\$	42.96	\$ 1,577,529.32		
25.37.3		25.37.3	Correa metálica b= 0.20m, varilla diam= 1"	Ml	46	\$ 23,614.20	\$ 1,086,253.20		\$		\$		\$		
25.37.4		25.37.4	Enchufe pared color blanco	M2	21	\$ 49,650.05	\$ 1,042,231.05	11.87	\$	589,108.69	\$	11.87	\$ 589,108.69		
25.37.5		25.37.5	Piso metálico 3"	M2	42	\$ 83,253.90	\$ 3,516,563.80	21.54	\$	1,362,487.47	\$	21.54	\$ 1,362,487.47		
25.37.6		25.37.6	Cableado 10/2 Alumi	Ml	3	\$ 60,381.25	\$ 181,143.75	9.03	\$	484,650.00	\$	9.03	\$ 484,650.00		
25.37.7		25.37.7	Cableado 10/2 Alumi	Ml	3	\$ 28,714.85	\$ 86,144.55	14.40	\$	427,893.84	\$	14.40	\$ 427,893.84		
25.37.8		25.37.8	Barra 1/2" x 3' inc. accesorios	Ml	5	\$ 27,152.55	\$ 135,762.75	8.00	\$	162,915.30	\$	8.00	\$ 162,915.30		
25.37.9		25.37.9	Pantón impermeabilizado muros 1.4 sika 1	M2	5	\$ 31,685.75	\$ 158,428.75	123.68	\$	3,894,528.60	\$	123.68	\$ 3,894,528.60		
25.37.10		25.37.10	Pintura de pared (tres manos)	M2	5	\$ 14,828.70	\$ 74,143.50	111.36	\$	1,650,989.95	\$	111.36	\$ 1,650,989.95		
25.37.11		25.37.11	Caja de inspección (0.9 x 0.9 m) en concreto	Un	3	\$ 333,784.80	\$ 1,001,354.40	3.00	\$	1,001,354.40	\$	3.00	\$ 1,001,354.40		
25.37.12		25.37.12	Mesón	M2	5	\$ 197,535.55	\$ 987,677.75	1.20	\$	199,042.66	\$	1.20	\$ 199,042.66		



7414

Handwritten signature and date.

<div>  <div> DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORIA </div> </div>									
<div> <div> ACTA N° 8 SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA Villagarzon - La Jirga </div> <div> VALOR TOTAL ACTA \$ 420.241.216,24 PERIODO ENE 30 2014 - OCT 31 2014 11 DE JULIO DE 2014 </div> </div>									
<div> <div> CONTRATO DE OBRA OBJETO CONTRATISTA CONTRATO INTERVENTORIA INTERVENIOR SUPERVISOR DE CONTRATO </div> <div> SPT No 056 de Fecha 18 de DICIEMBRE de 2011 CONSTRUCCION MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZON LA JIRGA MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO UNION TEMPORAL LAS AMERICAS SPT No 061 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2011 CONSORCIO INTERMUNICIALES 2011 Arq VICTOR HUGO ROMO - SECRETARIA DE PLANEACION </div> </div>									
No. DE ORDEN	ITEM	ESPECIFICACION		CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE MODIFICACION No 6 DE FECHA 22-AGOSTO-2014		
		GR.	PART.	UNID.	ITEM DE PAGO	CANTIDAD	VALDR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD
25.37.13				ML	Linea 3"12 AWG por tuberia	28,00	\$ 19.098,80	\$ 534.794,40	28,00
25.37.14				UN	Salida lampara incandescente 100 W	4,00	\$ 47.316,65	\$ 189.275,40	4,00
25.37.15				UN	Salida toma monofasica	4,00	\$ 37.374,95	\$ 150.500,00	4,00
25.37.16				UN	Salida para interruptor sencillo	3,00	\$ 22.875,75	\$ 68.627,25	3,00
25.37.17				UN	Salida para interruptor doble	1,00	\$ 32.513,40	\$ 32.513,40	1,00
25.37.18				UN	Tubo de distribucion 3 cables	1,00	\$ 236.049,00	\$ 236.049,00	1,00
25.37.19				ML	Alcántara general C= 1"	30,00	\$ 1.141.938,00	\$ 1.141.938,00	30,00
25.37.20				M2	Vedro de 4 mm	5,05	\$ 350.078,63	\$ 350.078,63	5,05
25.37.21				M2	Muro en ladrillo faja No. 4	54,04	\$ 2.256.686,06	\$ 2.256.686,06	54,04
25.37.22				M2	Estico sobre pariete	11,36	\$ 1.706.035,20	\$ 1.706.035,20	11,36
25.37.23				UN	punto sanitario 4"	1,00	\$ 104.884,00	\$ 104.884,00	1,00
25.37.24				UN	punto sanitario 2"	3,00	\$ 783.954,00	\$ 783.954,00	3,00
25.37.25				UN	punto hidraulica 1/2"	3,00	\$ 154.841,00	\$ 154.841,00	3,00
25.37.26				UN	alzado de piso	21,54	\$ 600.870,84	\$ 600.870,84	21,54
25.37.27				UN	correa metálica en perfil en C 120x6x1,2mm	42,00	\$ 1.357.860,00	\$ 1.357.860,00	42,00
25.37.28				ML					
25.38									
25.38.1				ML	PTAP - INST. SANITARIAS - Preliminares	162,3	\$ 2.243,20	\$ 364.132,51	
25.38.2				M2	Localización y replanteo	98	\$ 31.426,65	\$ 3.079.811,70	
25.38.3				M3	Excavación manual de tierra	95	\$ 12.808,80	\$ 1.216.836,00	
25.38.4				M3	Relevo de zanjas con material de excavación	12	\$ 9.413,55	\$ 112.962,60	
25.39									
25.39.1				ML	PTAP - INST. SANITARIAS - Tubería y accesorios pvc	102	\$ 71.374,50	\$ 7.280.199,00	
25.39.2				ML	Tubería diámetro 160 mm novato	60	\$ 35.341,65	\$ 2.120.499,90	
25.39.3				Un	Caja de inspección en Concreto 70x70cm	12	\$ 333.784,80	\$ 4.005.417,60	
25.40									
25.40.1				ML	PTAP - INST. HIDRAULICAS - Preliminares	200	\$ 2.243,20	\$ 448.640,00	
25.40.2				M3	Localización y replanteo	92,8	\$ 31.426,65	\$ 2.916.393,12	
25.40.3				M3	Excavación manual de tierra	91	\$ 12.808,80	\$ 1.165.600,80	
25.41									
25.41.1				ML	PTAP - INST. HIDRAULICAS - tubería y accesorios pvc presion	30	\$ 8.044,65	\$ 241.339,50	
25.41.2				ML	Tubería 1" ROE 21	12	\$ 6.372,00	\$ 76.464,00	
25.41.3				ML	Tubería 3/4" ROE 21	18	\$ 5.212,35	\$ 93.822,30	
25.41.4				Un	Tubo 3/4"	2	\$ 5.016,60	\$ 10.033,20	
25.41.5				Un	Codo de 90° x 1"	6	\$ 3.703,05	\$ 22.218,30	
25.41.6				Un	Codo de 90° x 1/2"	10	\$ 939,60	\$ 9.396,00	
25.41.7				Un	Codo de 45° x 3/4"	2	\$ 1.611,90	\$ 3.223,80	
25.41.8				Un	Union 1"	5	\$ 1.150,20	\$ 5.751,00	
25.41.9				Un	Buje 04" x 3/4"	2	\$ 2.788,55	\$ 5.577,10	
25.41.10				Un	Buje de 3/4" x 1/2"	6	\$ 1.586,25	\$ 9.517,50	
25.42									
25.42.1					PTAP OBRAS COMPLEMENTARIAS - Construcción de cerramiento en malla galvanizada con postes metálicos cada 2,5 m y alambre de puer en la parte superior				

Handwritten signature and date.

										DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENIENIA										ACTA DE RECIBO FINAL										CODIGO: AMV SPI 007 VERSION: 2										1 DE 33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA										Villagarzon - La Joya										ACTA N° 8										VALOR TOTAL ACTA 5 420 241 216,24										PROYECTO: M. C. ENH. 30-2014, OCT 21-2014										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11										11																			

		18 JULIO 2014		21 JULIO 2014	
CONTRATO DE OBRA	SPI No 056 del Fecha 18 de DICIEMBRE de 2011	DOCE (12) MESES	PLAZO ACUMULADO	DIECISIETE (17) MESES	
OBJETO	CONSTRUCCION MACROADQUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZON LA JOYA MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	6 de marzo de 2012	FECHA DE SUSPENSIÓN 1	17 de diciembre de 2012	
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LAS AMERICAS	17 de enero de 2013	FECHA DE SUSPENSIÓN 2	16 de mayo de 2013	
CONTRATO INTERVENTORIA	SPI No 061 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2011	2 de julio de 2013	FECHA DE SUSPENSIÓN 3	12 de julio de 2013	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERCIVILES 2011	29 de noviembre de 2013	FECHA DE SUSPENSIÓN 4	20 de diciembre de 2013	
		13 de enero de 2014	FECHA DE SUSPENSIÓN 5	30 de enero de 2014	
		21 de agosto de 2014	FECHA DE TERMINACIÓN	21 de octubre de 2014	
		\$12 137 584 273.09	VALOR TOTAL EN ADICIONES		
SUPERVISOR DE CONTRATO	Arg VICTOR HUGO ROMO - SECRETARIO DE PLANEACION	\$12 137 584 251.98	PROMESA	05 MESES	

No. DE ORDEN	ITEM	ESPECIFICACION		CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE MODIFICACION No. 6 DE FECHA 22-AGOSTO-2014					OBRA EJECUTADA			
		GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALDR	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
8.11			6.11	Suministro, transporte e instalacion Tuberia PVC sanitaria 6" (desaque tanque)	m	8.2	\$ 68 569.20	\$	582 267.44		\$	-	\$	-					
6.12			6.12	Suministro, transporte e instalacion codo pvc sanitaria 6" 90°	und	2	\$ 105 413.40	\$	210 826.80		\$	-	\$	-					
6.13			6.13	Suministro, transporte e instalacion Tee pvc sanitaria 6"	Und	1	\$ 53 168.65	\$	53 186.65		\$	-	\$	-					
6.14			6.14	Suministro, transporte e instalacion de Tuberia PVC 6" RDE21	m	10	\$ 72 555.75	\$	720 557.50		\$	-	\$	-					
6.15			6.15	Cerramiento con Postes en Madera 2m y alambre de pua 5/16s	m	20	\$ 22 626.00	\$	452 520.00	28.00	\$	633 528.00		\$	633 528.00				
6.16			6.16	Relevo con material de la excavacion	m3		\$ 12 808.80	\$			\$	-	\$	-					
6.17	N		6.17	Tapa metalica 0 90x0 90m incluye marco y cablestranco metalico y lepa en concreto	und		\$ 169 475.00	\$			\$	-	\$	-					
6.18	N		6.18	Suministro, transporte e instalacion Pasamuro hf 1 1/2"	und		\$ 146 432.00	\$		2.00	\$	292 864.00	2.00	\$	292 864.00				
6.19	N		6.19	Contrante con fibra de polipropileno 12-2.00m	m		\$ 15 434.00	\$		30.00	\$	463 020.00	30.00	\$	463 020.00				
6.20			6.20	Velvula de Furga HF EL SB DO 1 1/2"	Und		\$ 734 215.05	\$		3.00	\$	2 202 645.15	3.00	\$	2 202 645.15				
6.21			6.21	Caja de proteccion valvulas 0.50x0.50x0.7 m	Und		\$ 333 784.80	\$		1.00	\$	333 784.80	1.00	\$	333 784.80				
7			7	TANQUE DE ALMACENAMIENTO 20 M3 (CHAMPAGNET, ALEMANIA; LA PAZ, UCRUPAYACO; OROYAJO; LAS MINAS; BLANCA; SIMON BOLIVAR; RIO BLANCO)															
7.01			7.01	Descapote y limpieza	m2	104.04	\$ 3 598.10	\$	374 450.36	154.31	\$	555 377.12	154.31	\$	555 377.12				
7.02			7.02	Localizacion y replanteo	m2	104.04	\$ 2 249.70	\$	233 434.35	149.52	\$	335 478.02	149.52	\$	335 478.02				
7.03			7.03	Excavacion en material comun	m3	41.62	\$ 22 820.40	\$	948 785.05	233.23	\$	5 322 401.89	233.23	\$	5 322 401.89				
7.04			7.04	Solado de limpieza e = 0.05 mts (concreto 21 M p al Tanque 4	m2	104.04	\$ 6 622.85	\$	7 035 461.31	154.31	\$	10 434 681.98	154.31	\$	10 434 681.98				
7.05			7.05	Concreto 28 M p a impermeabilizado Tanque 4	m3	171.27	\$ 1 426 475.50	\$	244 654 998.89	195.40	\$	279 124 112.70	195.40	\$	279 124 112.70				
7.06			7.06	Suministro, transporte e instalacion crina pvc 0.15m (Tanque 4)	m	110.7	\$ 32 800.95	\$	3 631 065.17	71.50	\$	2 340 267.93	71.50	\$	2 340 267.93				
7.07			7.07	Suministro, transporte, leje, corte y amarre acero 60000 p.s al tanque 4	kg	25690.5	\$ 5 526.90	\$	141 968 824.45	33209.63	\$	183 546 304.05	33209.63	\$	183 546 304.05				
7.08			7.08	Suministro, transporte e instalacion de respaldieres en tuberia galvanizada D = 2 (Tanque 4 almacenamiento Tipo 4)	und	36	\$ 122 342.40	\$	4 404 326.40	20.00	\$	2 446 648.00	20.00	\$	2 446 648.00				
7.09			7.09	Suministro, transporte e instalacion de valvula sobre companta hf 6" EL	und	27	\$ 2 397 278.70	\$	64 726 524.90		\$	-		\$	-				
7.10			7.10	Suministro, transporte e instalacion de Pasamuro 6" HF, Lx0.50m	Und	27	\$ 940 558.50	\$	25 395 079.50		\$	-		\$	-				
7.11			7.11	Suministro, transporte e instalacion Tuberia PVC sanitaria 6" 90°	m	55.8	\$ 70 378.20	\$	3 927 103.56		\$	-		\$	-				
7.12			7.12	Suministro, transporte e instalacion codo pvc sanitaria 6" 90°	und	18	\$ 105 478.20	\$	1 898 607.60		\$	-		\$	-				
7.13			7.13	Suministro, transporte e instalacion Tee pvc sanitaria 6"	Und	9	\$ 53 253.45	\$	479 281.05		\$	-		\$	-				
7.14			7.14	Suministro, transporte e instalacion de Tuberia PVC 6" RDE21	m	81	\$ 74 364.75	\$	6 023 544.75		\$	-		\$	-				
7.15			7.15	Cerramiento con Postes en Madera 2m y alambre de pua 5/16s	m	345.6	\$ 22 690.80	\$	7 841 940.48	80.00	\$	1 815 264.00	80.00	\$	1 815 264.00				



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZON
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENCION
ACTA DE RECIBO FINAL

COPIA
VERSION
2
3 DE 33

UNIDAD EJECUTORA	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VEREDA	VILLAGARZON, LA JOTA	ACTIVIDAD	8	VALOR TOTAL ACTA	420 241 216,24	PERIODO MES ENE 30 2014 - OCT 31 2014
CONTRATO DE OBRA	SPH No 056 de fecha 19 de OCTUBRE de 2011							
OBJETO	CONSTRUCCION MACRODQUELITO VERTICAL VILLAGARZON LA JOTA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO							
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LAS AMERICAS							
CONTRATO INTERVENCION	SPH No 061 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2011							
INTERVENIOR	CONSORCIO INTERCOMUNES 2011							
SUPERVISOR DE CONTRATO	AA VICTOR HUGO ROMO - SECRETARIO DE PLANEACION							

No. DE DRENI	ITEM	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE MODIFICACION No 6 DE FECHA 27-AGOSTO-2014			OBRA EJECUTADA		
		ESPECIFICACION	ITEM DE PAGO	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	ACTUALIZADO
	GR.	PART.								
	2 22	2 22	Suministro, transporte e instalacion de valvula conectora HF 6" EL.	UN	3,00	\$ 2 387 018,70	\$ -	3,00	\$ 7 161 056,10	
	2 23	2 23	Suministro, transporte e instalacion Codo gran radio 6" x 90	Und	1,00	\$ 321 695,55	\$ -	1,00	\$ 321 695,55	
	2 24	2 24	Suministro, transporte e instalacion Union de separacion 6"	Und	4,00	\$ 212 290,20	\$ -	4,00	\$ 849 160,80	
	2 25	2 25	Suministro, transporte e instalacion tee PVC presion D=45 UZ	Und	1,00	\$ 475 334,00	\$ -	1,00	\$ 475 334,00	
	2 26	2 26	Suministro, transporte e instalacion Union de reparacion pvc 6"	Und	1,00	\$ 417 924,00	\$ -	1,00	\$ 417 924,00	
	2 27	2 27	Suministro, transporte e instalacion Codo gran radio 6" x 45	Und	4,00	\$ 417 121,65	\$ -	4,00	\$ 1 668 496,60	
	2 28	2 28	Suministro, transporte e instalacion tee 6" EL.	Und	2,00	\$ 457 407,00	\$ -	2,00	\$ 914 814,00	
	2 29	2 29	Refrigor con material de la excavacion	m3	11,26	\$ 512 808,80	\$ -	11,26	\$ 5 829 487,27	
	3	3	TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL CAP. 50000	m3	145,95	\$ 1 103 105,25	\$ 160 998 211,24	146,19	\$ 161 262 956,50	
	3 01	3 01	Desagote y limpieza	m2	153,76	\$ 3 399,10	\$ 523 997,82	158,76	\$ 571 393,12	
	3 02	3 02	Localizacion y registro	m2	153,76	\$ 2 243,70	\$ 344 991,31	158,76	\$ 356 206,81	
	3 03	3 03	Excavacion en material comun	m3	61,5	\$ 22 820,40	\$ 1 403 454,60	151,91	\$ 3 565 646,96	
	3 04	3 04	Solado de limpieza e = 0,05 mas (concreto 21 M P al Tanque principal)	m2	153,76	\$ 52 232,85	\$ 8 031 323,02	158,76	\$ 8 292 487,27	
	3 05	3 05	Concreto 28 M P a impermeabilizado Tanque Principal	m3	145,95	\$ 1 103 105,25	\$ 160 998 211,24	146,19	\$ 161 262 956,50	
	3 06	3 06	Suministro, transporte e instalacion cinta PVC 0,13m (Tanque principal)	ml	48,6	\$ 32 637,60	\$ 1 616 824,96	50,40	\$ 1 644 935,04	
	3 07	3 07	Suministro, transporte, flang, cota y anillo anillo 60000 p.s. Tanque principal	kg	21 892,5	\$ 5 394,60	\$ 118 101 280,50	21 885,00	\$ 118 981 901,00	
	3 08	3 08	Suministro, transporte e instalacion de reseradores en tuberia galvanizada D = 4 [Tanque almacenamiento opal]	und	9	\$ 414 621,45	\$ 3 731 593,05	9,00	\$ 3 731 593,05	
	3 09	3 09	Suministro, transporte e instalacion de valvula doble compuerta HF 6" EL.	und	3	\$ 2 387 018,70	\$ 7 161 056,10	3,00	\$ 7 161 056,10	
	3 10	3 10	Suministro, transporte e instalacion de Pastorn 6" HF L=2,50m	Und	3	\$ 933 427,80	\$ 2 800 283,40	4,00	\$ 3 733 711,20	
	3 11	3 11	Suministro, transporte e instalacion Tuberia PVC sanitaria 6" (desague largo)	ml	9,2	\$ 66 569,20	\$ 630 936,64	50,00	\$ 3 428 460,00	
	3 12	3 12	Suministro, transporte e instalacion codo PVC sanitario 6" 90°	und	2	\$ 105 541,65	\$ 211 083,30	2	\$ 211 083,30	
	3 13	3 13	Suministro, transporte e instalacion Tee PVC sanitaria 6"	Und	1	\$ 53 316,90	\$ 53 316,90	1	\$ 53 316,90	
	3 14	3 14	Suministro, transporte e instalacion de Tuberia PVC 6" RDE21	ml	10	\$ 72 555,75	\$ 725 557,50	10	\$ 725 557,50	
	3 15	3 15	Cerramiento con Postes en Madera 2m y alambre de pue 5 filos	ml	80	\$ 22 754,25	\$ 1 820 340,00	80	\$ 1 820 340,00	
	3 16	3 16	Excavacion en roca	m3	42,37	\$ 151 337,70	\$ 6 412 178,35	42,37	\$ 6 412 178,35	
	3 17	3 17	Excavacion material conglomerado	m3	797,50	\$ 45 558,00	\$ 36 332 505,00	797,50	\$ 36 332 505,00	
	3 18	3 18	Refrigor con material de la excavacion	m3	190,48	\$ 12 808,80	\$ 2 439 820,22	190,48	\$ 2 439 820,22	



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZON
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENCIÓN
ACTA DE RECIBO FINAL

CÓDIGO
VERSION
4 DE 33

MODALIDAD

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

AREA

Manejo de la zona

ACTIVIDAD

6

VALOR TOTAL ACTA

470.741.216,24 PERIODO: 1 ENE 2014 - OCT 2014

CONTRATO DE OBRA

SP No 006 de fecha 18 de DICIEMBRE de 2011

OBJETO

CONSTRUCCION YACUACUQUELLO VEREDAL VILLAGARZON LA JOYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL LAS AMERICAS

CONTRATO INTERVENCIÓN

SP No 001 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2011

INTERVENCIÓN

CONSORCIO INTERVIALES 2011

SUPERVISOR DE CONTRATO

AQUICOR HUGO ROMO - SECRETARIO DE PLANEACION

No. DE ORDEN	ESPECIFICACION		CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE MODIFICACION No 6 DE FECHA 22-AGOSTO-2014		OBRA EJECUTADA			
	GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
319	319	319	Materiales para construcción via de acceso a PTAP y Tanque Almacenamiento Piel	m3		\$ 103.644,00	\$	1024.60	\$	106.193.642,40	\$
320	320	320	Refrío de material sobrante	m3		\$ 9.413,55	\$	714,42	\$	6.725.228,39	\$
321	321	321	Filtro perimetral tanque de almacenamiento	ml		\$ 65.106,00	\$	60,00	\$	3.906.360,00	\$
322	322	322	Cerramiento con fibra de polipropileno n=2,00mm	ml		\$ 15.334,00	\$	90,00	\$	1.380.060,00	\$
323	323	323	Tapa metálica 0,90x0,90m incluye marco y contramarcos metálicos y tapa en concreto	und		\$ 168.472,00	\$	2,00	\$	336.944,00	\$
324	324	324	Suministro, transporte e instalación Tee H.T. EL	Und		\$ 457.407,00	\$	1,00	\$	457.407,00	\$
325	325	325	Suministro, transporte e instalación Codo gran radio 6" x 45"	Und		\$ 417.127,65	\$	2,00	\$	834.255,30	\$
326	326	326	Caja de protección de vehículos 0,50x0,80m	Und		\$ 387.946,80	\$	1,00	\$	387.946,80	\$
4	4	4	TANQUE DE ALMACENAMIENTO 150 M3 (Pro Umbra)								
401	401	401	Descapote y limpieza	m2	54,76	\$ 3.599,10	\$	103,74	\$	373.370,63	\$
402	402	402	Locarización y replanteo	m2	54,76	\$ 2.743,70	\$	86,34	\$	193.721,06	\$
403	403	403	Escarización en material común	m3	2,19	\$ 22.820,40	\$	368,80	\$	8.418.163,52	\$
404	404	404	Soldado de lámpara e = 0,05 mm (concreto 21 M.B.3) Tanque Puerto Umbra	m2	61,09	\$ 5.522,85	\$	57,76	\$	3.016.969,42	\$
405	405	405	Concreto 28 M.P. a impermeabilizado (Tanque Puerto Umbra)	m3	45,81	\$ 1.102.105,25	\$	68,44	\$	76.599.628,56	\$
406	406	406	Suministro, transporte e instalación cinta PVC 9,15m (Tanque 1)	m3	28,8	\$ 32.637,60	\$	31,00	\$	1.011.765,00	\$
407	407	407	Suministro, transporte, Mq. con v. amarre acero 60000 D.S. (Tanque Puerto Umbra)	kg	6.871,8	\$ 5.594,60	\$	9556,00	\$	51.550.797,60	\$
408	408	408	Suministro, transporte e instalación de resguardos en tubería galvanizada D = 2" (Tanque Puerto Umbra)	und	9	\$ 118.879,65	\$	8,00	\$	951.037,20	\$
409	409	409	Suministro, transporte e instalación de vehículo doble compuerta H.T. EL	und	3	\$ 2.387.018,70	\$		\$		\$
410	410	410	Suministro, transporte e instalación de Pasamuro 6" H.T. L=0,60m	Und	3	\$ 935.427,80	\$	1,00	\$	933.427,80	\$
411	411	411	Suministro, transporte e instalación Tubería PVC Saniata 6" (désague tanque)	ml	8,2	\$ 72.187,20	\$		\$		\$
412	412	412	Suministro, transporte e instalación codo PVC Saniata 6" 90°	und	2	\$ 105.413,40	\$		\$		\$
413	413	413	Suministro, transporte e instalación Tee PVC Saniata 6"	Und	1	\$ 53.188,65	\$		\$		\$
414	414	414	Suministro, transporte e instalación do Tubería PVC 6" RDE 21	ml	10	\$ 76.173,75	\$		\$		\$
415	415	415	Cerramiento con Postes en Madera 2m y alambre de pua Shiba	ml	52	\$ 22.628,00	\$	52,00	\$	1.176.552,00	\$
416	416	416	Rellevo con material de la excavación	m3		\$ 12.808,80	\$	121,64	\$	1.556.082,43	\$
417	417	417	Tapa metálica 0,90x0,90m incluye marco y contramarcos metálicos y tapa en concreto	und		\$ 168.479,00	\$		\$		\$
418	418	418	Suministro, transporte e instalación Pasamuro H.T.	und		\$ 586.255,00	\$	3,00	\$	1.758.765,00	\$



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZON
TARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORIA
ACTA DE RECIBO FINAL

1000

PRECISION (17) MESES

16 de mayo de 2013

12 de julio de 2013

20 de diciembre de 2013

21 de octubre de 2014

No. DE ORDEN	ITEM	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACUMULADAS SEGUN ACTA DE MODIFICACION No 6 DE FECHA 22-AGOSTO-2014				OBRA EJECUTADA			
		ESPECIFICACIÓN		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GR.	ITEM DE PAGO							VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD
	1.26	1.26	Malla en acero galvanizado cal 10. Encuchetada	m2	545.10	\$	29 743 381.50	545.10	\$	29 743 381.50	545.10	\$	29 743 381.50
	1.27	1.27	Gradienti NT	m2	545.10	\$	5 667 949.80	545.10	\$	5 667 949.80	545.10	\$	5 667 949.80
	1.28	1.28	Concreto de 3600 psi para recubrimiento de hamblo	m3	17.37	\$	27 923 664.60	17.37	\$	27 923 664.60	17.37	\$	27 923 664.60
	1.29	1.29	Relinco con malla 3/8"concreto para jaulon	m3	204.13	\$	48 593 146.50	204.13	\$	48 593 146.50	204.13	\$	48 593 146.50
	2	2	DESARMAADOR										
	2.01	2.01	Desarapio y limpieza	m2	44.00	\$	158 360.40	44.00	\$	158 360.40	44.00	\$	158 360.40
	2.02	2.02	Localización y detección	m2	44.00	\$	98 722.80	44.00	\$	98 722.80	44.00	\$	98 722.80
	2.03	2.03	Excavación en material común	m3	75.81	\$	1 730 014.57	75.81	\$	1 730 014.57	75.81	\$	1 730 014.57
	2.04	2.04	Solado de impreza $c = 0.05$ mts (concreto 2' M.O al Desarapio)	m2	49.6575	\$	4 122 210.60	49.6575	\$	4 122 210.60	49.6575	\$	4 122 210.60
	2.05	2.05	Concreto 28 M.P.a impermeabilizado	m3	36.920	\$	64 751 985.09	36.92	\$	64 751 985.09	36.92	\$	64 751 985.09
	2.06	2.06	Suministro, transporte e instalación cana p.v.c 15mm(Desarapio)	ml	29.82	\$	980 955.17	29.82	\$	980 955.17	29.82	\$	980 955.17
	2.07	2.07	Suministro, transporte, fleje, cona y armazo acero 80000 P.S (Desarapio)	kg	4184.57	\$	23 681 318.54	4184.57	\$	23 681 318.54	4184.57	\$	23 681 318.54
	2.08	2.08	Suministro, transporte e instalación acapador de Impercepti P. 8'	und	4	\$	7 506 054.00		\$			\$	
	2.09	2.09	Suministro, transporte e instalación lubena PVC 8' (desapio desarapio)	ml	18.00	\$	1 950 075.00		\$			\$	
	2.10	2.10	Suministro, transporte e instalación codo 90° HF 8'	und	2	\$	3 001 360.50		\$			\$	
	2.11	2.11	Suministro, transporte e instalación Tee HF 8'	und	1	\$	1 196 101.35		\$			\$	
	2.12	2.12	Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC 6" RCE-21	ml	30.90	\$	2 354 289.46		\$			\$	
	2.13	2.13	Suministro, transporte e instalación de Codo gran radio 90° PVC 6"	und	2	\$	301 824.90		\$			\$	
	2.14	2.14	Cerramiento con Postes en Madera 2m y asamblea de 6x8 Shitas	ml	60.00	\$	1 365 255.00		\$			\$	
	2.15	2.15	Suministro, transporte e instalación de válvula doble compuerta HF 6" EL	und	3	\$	7 222 818.10		\$			\$	
	2.16	2.16	Suministro, transporte e instalación Válvula de Compuerta lateral con Columna de Manobra HF 8" (lavado desarapio)	und	1	\$	6 957 596.25		\$			\$	
	2.17	2.17	Suministro, transporte e instalación de Pasamuro 8" HF	und	1.00	\$	871 079.00		\$			\$	
	2.18	2.18	Suministro, transporte e instalación de Pasamuro 6" HF	und	3.00	\$	2 800 283.40		\$			\$	
	2.19	2.19	Tapa metálica desarapio, incluye marco y contraincendio metálico y ligas en concreto	m2	5.70	\$	1 952 250.00		\$			\$	
	2.20	2.20	Suministro, transporte e instalación codo 6" HF radio 11.25 o 22.5	und	5	\$			\$			\$	
	2.21	2.21	Suministro, transporte e instalación UNION UNIVERSAL DN 6"	UN	5.00	\$	1 367 910.00		\$			\$	



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZON
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORIA
ACTA DE RECIBO FINAL

UNIDAD ACUADA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA VILLAGARZON - PUTUMAYO

ACTIVIDAD 8

VALOR TOTAL ACTA \$ 420.241.216,24

11-10-2014 11-10-2014

CONTRATO DE OBRA SPI No 006 de Fecha 19 de DICIEMBRE de 2011

PLAZO INICIAL DOCE (12) MESES

OBJETO CONSTRUCCION HACIENDA DE VIVEREDAL VILLAGARZON LA JOYA MUNICIPIO DE VILLAGARZON

PLAZO ACUMULADO

CONTRATISTA UNION TEMPORAL LAS AMERICAS

FECHA DE SUSPENSIÓN 1

CONTRATO INTERVENORIA SPI No 001 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2011

FECHA DE SUSPENSIÓN 2

INTERVENIOR CONSORCIO INTERCIVILES 2011

FECHA DE SUSPENSIÓN 3

SUPERVISOR DE CONTRATO ARI VICTOR HUAGO ROMO - SECRETARIO DE PLANEACION

FECHA DE SUSPENSIÓN 4

VALOR TOTAL ACTUALIZADO \$12.137.584.273,09

FECHA DE SUSPENSIÓN 5

VALOR TOTAL EN ADICIONES \$12.137.584.273,09

FECHA DE SUSPENSIÓN 6

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 7

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 8

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 9

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 10

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 11

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 12

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 13

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 14

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 15

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 16

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 17

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 18

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 19

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 20

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 21

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 22

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 23

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 24

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 25

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 26

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 27

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 28

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 29

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 30

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 31

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 32

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 33

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 34

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 35

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 36

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 37

PREPROCESO 05 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN 38



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZON
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORIA
ACTA DE RECIBO FINAL

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

VILLAGARZON - LA JOYA

8

VALOR TOTAL ACTA

\$ 420.241.216,24

PERIODO MES ENERO 2014 - OCT 2014

21

2014

COPIA	AM/SP/007
VERSION	2
DE	13

CONTRATO DE OBRA	SPI No 056 de Fecha 19 de DICIEMBRE de 2011	PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	PLAZO ACUMULADO	DICIEMBRE (12) MESES
OBJETO	CONSTRUCCION MAGROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZON LA JOYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	FECHA DE REANUDACION 1	6 de marzo de 2012	FECHA DE SUSPENSION 1	17 de diciembre de 2012
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LAS AMERICAS	FECHA DE REANUDACION 2	17 de enero de 2013	FECHA DE SUSPENSION 2	16 de marzo de 2013
CONTRATO INTERVENTORIA	SPI No. 061 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2011	FECHA DE REANUDACION 3	2 de julio de 2013	FECHA DE SUSPENSION 3	12 de julio de 2013
INTERVENIENTOR	CONSORCIO INTERVIVILES 2011	FECHA DE REANUDACION 4	29 de noviembre de 2013	FECHA DE SUSPENSION 4	20 de diciembre de 2013
SUPERVISOR DE CONTRATO:	ARG VICTOR HUGO ROMO - SECRETARIO DE PLANEACION	FECHA DE REANUDACION 5	13 de enero de 2014	FECHA DE SUSPENSION 5	30 de enero de 2014
		FECHA DE REANUDACION 6	21 de agosto de 2014	FECHA DE SUSPENSION 6	21 de octubre de 2014
		VALOR TOTAL ACTUALIZADO	\$12.137.584.273,09	VALOR TOTAL EN ADICIONES	
			\$12.137.584.251,99	PROXIMA	05 MESES

No. DE ORDEN	ITEM	GR	PART	ITEM DE PAJO	UND	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE MODIFICACION No 6 DE FECHA 22 AGOSTO 2014				OBRA EJECUTADA			
									CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
5.14	5.14			Suministro, transporte e instalacion de Tuberia PVC 6" RDE21	m	20	\$ 72.555,75	\$ 1.451.115,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
5.15	5.15			Carretería con Postes en Madera 2m y alambre de alu 5 hilos	m	64	\$ 22.025,00	\$ 1.448.064,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
5.16	5.16			Reliño con material de la excavación	m3		\$ 12.008,80	\$ -	271,80	\$ 3.261.431,84		\$ -	271,80	\$ 3.261.431,84		\$ -
5.17	5.17			Escalera para tanque de agua	m		\$ 140.077,80	\$ -	17,18	\$ 2.408.572,86		\$ -	17,18	\$ 2.408.572,86		\$ -
5.18	5.18			Escalera para tanque de agua	m		\$ 219.119,00	\$ -	25,76	\$ 5.659.961,44		\$ -	25,76	\$ 5.659.961,44		\$ -
5.19	5.19			Carretería en mala calidad con cal 10, postes cada 2,5m casados en L 2x1/8" y tres hilos de alambre de puer en la parte superior, incluye pintura en antimicrobiano y barniz	m		\$ 204.920,00	\$ -	52,27	\$ 10.711.166,40		\$ -	52,27	\$ 10.711.166,40		\$ -
5.20	5.20			Baranda de seguridad	m		\$ 152.792,00	\$ -	97,30	\$ 14.866.661,50		\$ -	97,30	\$ 14.866.661,50		\$ -
5.21	5.21			Tapa metálica 0.90x0.90m incluye marco y contrafuerte metálico y lapa en concreto	m		\$ 160.479,00	\$ -	2,00	\$ 336.958,00		\$ -	2,00	\$ 336.958,00		\$ -
5.22	5.22			Suministro, transporte e instalacion Pasamuro H 1 1/2"	und		\$ 146.432,00	\$ -	4,00	\$ 585.728,00		\$ -	4,00	\$ 585.728,00		\$ -
5.23	5.23			Concreto ciclopais de 2500psi	M3		\$ 468.882,00	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
5.24	5.24			Concreto 3000 psi para estructuras	M3		\$ 1.040.257,35	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
5.25	5.25			Acero de Refuerzo	kg		\$ 5.262,30	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
5.26	5.26			Carretería con lapa de polipropileno h=2.00m	m		\$ 15.434,00	\$ -	220,00	\$ 3.395.480,00		\$ -	220,00	\$ 3.395.480,00		\$ -
5.27	5.27			Materia granular	m3		\$ 103.644,00	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
5.28	5.28			Valvula de Purga HF EL 58 DB 1 1/2"	und		\$ 124.215,06	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
5.29	5.29			Caja de proteccion valvulas 0.5x0.5x0.7m	und		\$ 533.764,80	\$ -	4,00	\$ 1.335.138,20		\$ -	4,00	\$ 1.335.138,20		\$ -
5.30	5.30			Suministro, transporte e instalacion Pasamuro H 4"	und		\$ 386.255,00	\$ -	4,00	\$ 2.345.020,00		\$ -	4,00	\$ 2.345.020,00		\$ -
5.31	5.31			Suministro, transporte e instalacion de registro de bola 4"	und		\$ 590.585,00	\$ -	2,00	\$ 1.901.170,00		\$ -	2,00	\$ 1.901.170,00		\$ -
6	6			TANQUE DE ALMACENAMIENTO 36 M3 (E) (Nanibito)	m2		\$ 3.599,10	\$ 69.678,56	31,36	\$ 112.867,78		\$ -	31,36	\$ 112.867,78		\$ -
6.01	6.01			Descapote e limpieza	m2	19,36	\$ 19,36	\$ 372,65	31,36	\$ 70.362,43		\$ -	31,36	\$ 70.362,43		\$ -
6.02	6.02			Localización y regulario	m3	7,74	\$ 22.870,40	\$ 176.629,90	40,77	\$ 930.387,71		\$ -	40,77	\$ 930.387,71		\$ -
6.03	6.03			Escavación en muelina comun	m3		\$ 52.232,85	\$ 1.011.227,98	21,16	\$ 1.105.247,11		\$ -	21,16	\$ 1.105.247,11		\$ -
6.04	6.04			Sopas de limpieza e = 0.05 mts (concreto 21 M.p.a) Tanque 3	m3	26,01	\$ 1.103.105,25	\$ 28.691.767,55	28,02	\$ 30.609.009,11		\$ -	28,02	\$ 30.609.009,11		\$ -
6.05	6.05			Concreto 28 M.p.a impermeabilizado Tanque 3	m3	16,8	\$ 32.637,60	\$ 548.311,68	18,40	\$ 600.531,84		\$ -	18,40	\$ 600.531,84		\$ -
6.06	6.06			Suministro, transporte e instalacion cinto pvc 0.15m (Tanque 3)	kg	3.901,5	\$ 5.399,60	\$ 21.047.031,90	4108,67	\$ 22.164.631,18		\$ -	4108,67	\$ 22.164.631,18		\$ -
6.07	6.07			Suministro transporte, Key corte y anam acido 60000 p.s. Tanque 3	und	4	\$ 118.879,55	\$ 475.518,60	4,00	\$ 475.518,60		\$ -	4,00	\$ 475.518,60		\$ -
6.08	6.08			Suministro transporte e instalacion de reparedos en tuberia galvanizada D = 2	und	3	\$ 3.387.018,70	\$ 7.161.056,10	5	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
6.09	6.09			Tanque almacenamiento tipo 31	und	3	\$ 3.387.018,70	\$ 7.161.056,10	5	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
6.10	6.10			Suministro transporte e instalacion de Pasamuro 6" HF, L=60m	und	3	\$ 933.427,80	\$ 2.800.283,40		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZON
TARIA DE PLANEACION Y INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORIA
ACTA DE RECIBO FINAL

COORD	ANALYST 007		
VERSION	2		
	32	06	13

[illegible]

13 de dezembro de 2012

16 de mayo de 2013

உயர்நீதிமன்றம், சென்னை

30 de enero de 2014

CONDICIONES ORIGINALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE MODIFICACION No.6 DE FECHA 22 AGOSTO 2014										OBRA EJECUTADA									
No. DE ORDEN	ITEM	ESPECIFICACION		UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR												
		GR.	PART.															PRESENTES ACTA	ACUMULADO										
		PTAP OBRAS COMPLEMENTARIAS - Suministro y colocacion de vlvula de control a la entrada de la planta																											
	25.43		25.43	Un	1	\$ 2,376,758.10	\$ 2,376,758.10		\$		\$		\$		\$		\$												
	25.43.1		25.43.1	Un	15	\$ 287,093.70	\$ 3,106,390.50		\$		\$		\$		\$		\$												
	25.43.2		25.43.2	Un	1	\$ 2,845,725.75	\$ 2,845,725.75	1.00	\$		\$ 2,845,725.75		\$		\$	1.00	\$												
	25.43.3		25.43.3	Un	1	\$ 719,262.45	\$ 719,262.45	1.00	\$		\$ 719,262.45		\$		\$	1.00	\$												
	25.43.4		25.43.4	Un	1	\$ 719,262.45	\$ 719,262.45		\$		\$		\$		\$		\$												
	25.43.5		25.43.5	M3	35.25	\$ 1,040,257.35	\$ 37,109,378.84		\$		\$		\$		\$		\$												
	25.43.6		25.43.6	M2		\$ 98,690.00	\$	606.00	\$		\$ 59,805,140.00		\$		\$		\$												
	28		28																										
	26.10		26.10																										
	VALOR TOTAL						\$ 12,137,584,273.09		\$ 12,137,584,251.90		\$ 12,137,584,252.07		\$ 420,241,216.24		\$ 420,241,216.24		\$ 8,990,803,149.64												
	COSTO DIRECTO						\$ 6,890,803,185.25		\$ 6,890,803,143.61		\$ 6,890,803,143.61		\$ 311,289,789.81		\$ 311,289,789.81		\$ 8,990,803,149.64												
	ADMINISTRACION						\$ 2,247,700,787.41		\$ 2,247,700,787.41		\$ 2,247,700,787.41		\$ 77,822,447.45		\$ 77,822,447.45		\$ 2,247,700,787.41												
	IMPREVISTOS						\$ 449,540,157.48		\$ 449,540,157.48		\$ 449,540,157.48		\$ 15,564,489.49		\$ 15,564,489.49		\$ 449,540,157.48												
	UTILIDADES						\$ 449,540,157.48		\$ 449,540,157.48		\$ 449,540,157.48		\$ 15,564,489.49		\$ 15,564,489.49		\$ 449,540,157.48												
	VALOR TOTAL ACTA:						420,241,216.24		CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHESIS PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS																				
	VALOR NETO A PAGAR:						210,120,618.12		OCCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON DOCE CENTAVOS																				
	VALOR NETO A PAGAR:						210,120,596.12		OCCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENA Y OCHO PESOS CON DOCE CENTAVOS																				
	VALORES:						0.04		CUATRO CENTAVOS																				
	Saldo total con ejecutar						21.11		VEINTIUN PESOS CON ONCE CENTAVOS																				
