

Radicado 2023ER0050248
28-03-2023



San Juan de Pasto, 28 de marzo de 2023


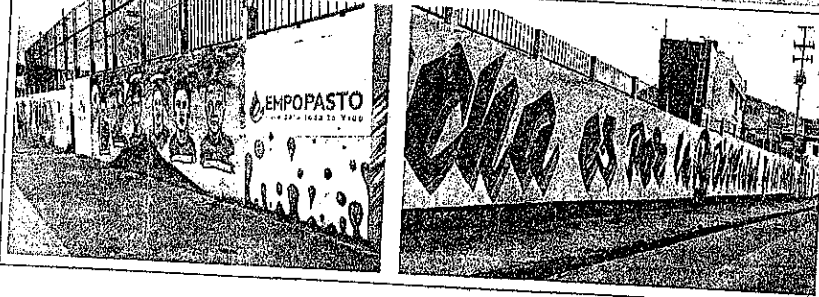
Doctora
ADRIANA PATRICIA LOPEZ RICAURTE
Directivo Colegiado Ponente
Atención: Dra. ELIZABETH JURADO MELO
Profesional Universitario
Gerencia Departamental Colegiada de Nariño
Contraloría General de la República
San Juan de Pasto

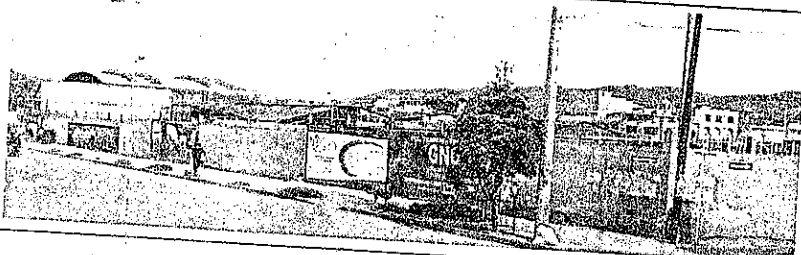
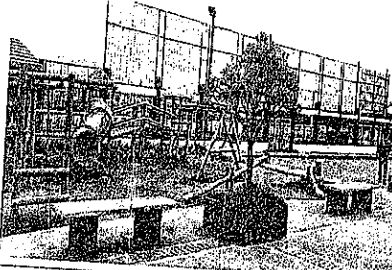
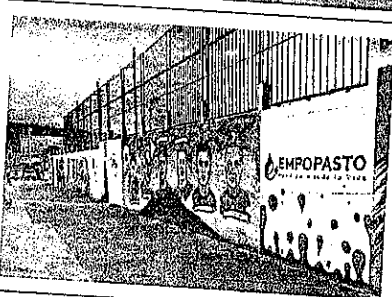
PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIO DE DOBLE INSTANCIA No. 80522 - 2021
- 39273 - CARLOS ZAMBRANO BURGOS Y OTROS


CARLOS ANTONIO ZAMBRANO BURGOS, mayor de edad, domiciliado y residente en Pasto, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.749.674 expedida en Pasto, vinculada dentro del proceso de responsabilidad fiscal en mi condición, de Presidente Junta Acción Comunal Barrio Tejar de la Ciudad de Pasto por medio del presente escrito respetuosamente me dirijo a la Gerencia Departamental de Nariño de la Contraloría General de la República, con el fin de presentar mi versión libre y espontánea, de la siguiente manera:

Considera la Contraloría General de la República, que en mi condición de Presidente Junta Acción comunal Barrio Tejar estoy llamado al presente proceso de responsabilidad fiscal, de la ciudad de Pasto, cuyo objeto es el: "Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros entre el MUNICIPIO DE PASTO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO para la "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA - 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO" Envió reporte técnico con sus respectivos soportes donde por parte de la supervisora del contrato dio visto bueno de la obra realizada.

OBJETO: Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el MUNICIPIO DE PASTO y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO, para la "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO", vigencia 2020					
CONVENIO No. 202754		CONTRATISTA/PARTE 2: JAC TEJAR		PRF - 80522-2021-39273	
Código	Descripción	UN	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Paralel
1	PRELIMINARES				
1	Replanteo general (area menor 1000 m2)	m2	\$ 946,00	2.949,00	\$ 2.769.754,00
HALLAZGO	"1. Replanteo general (área menor 1000m2) [...] En la visita fiscal se procedió a dimensionar las cantidades realmente ejecutadas del ítem, por parte de los funcionarios de la alcaldía, se mencionó que sobre el muro exterior de la calle 18 A se realizó replanteo para el diseño específico del muro [...] Por lo anterior se valida el ajuste de dicha cantidad a una altura promedio de 2,72 metros en la longitud del muro sobre la calle 18 A, y para los demás se tendrá en cuenta el perímetro en un ancho de 2 m puesto que las actividades ejecutadas con el convenio fueron ejecutadas en el perímetro del cerro como se muestra en los cálculos del Anexo 1. Cálculo de cantidades de obra convenio 202754. Cancha de Fútbol barrio el Tejar, por lo anterior se estableció que el área de este ítem realmente ejecutada corresponde a 815,57 m2.				
	En cuanto al ítem de replanteo en la visita que se realizó el 30 del mes de marzo de 2022 se pudo establecer con las mediciones registradas en el acta en mención que la cantidad de intervención es de 3719 m2 lo cual es mayor a la establecida en el acta final. Se anexa cuadro de cantidades				
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
ANTES					
ACTUAL					

Código	Descripción	UN	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcela
1.1	Pañete exterior aligado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm	m2	\$ 18.428,00	649,00	\$ 11.959.772,00
HALLAZGO	"1.1 Pañete exterior aligado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm", en cuantías de \$2.018.226,67 y \$3.610.544,60, respectivamente, pues se ejecutaron en menores metros cuadrados a los pactados por las partes en el Convenio solidario 20202754.				
OBSERVACIONES	En cuanto el ítem de replanteo en la visita que se realizó el 30 del mes de marzo de 2022 se pudo establecer con las mediciones registradas en el acta en mención que la cantidad de intervención Pañete exterior aligado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm es de 3719 m2 la cual es mayor a la establecida en el acta final. Se anexa cuadro de cantidades				
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
ANTES					
ACTUAL					

Código	Descripción	UN	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
2,1	Cerramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3" @ 6mts, marco en ángulo de 2 1/2" * 3/16, refuerzo interno en varilla cuadrada de 1/2 cada 20 cm, H= 3,0 m del módulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte, incluye cimentación en zapatas	ml	\$ 341.523,00	60,00	\$ 20.491.380,00
HALLAZGO	"Pintura para reja metálica con anticorrosivo y pintura color azul 2 manos" y "Cerramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3" @ 6mts, marco en ángulo de 2 1/2" * 3/16, refuerzo interno en varilla cuadrada de 1/2 cada 20 cm, H=3,0 m del módulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte, incluye cimentación en zapatas" y producto de la operación concluyó que los hallazgos de obra totalizan \$4.418.056,96 (\$4.016.415,42 costo directo + \$401.641,54 impuestos 10%).				
OBSERVACIONES	En cuanto al ítem de Cerramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3" @ 6mts, marco en ángulo de 2 1/2" * 3/16, refuerzo interno en varilla cuadrada de 1/2 cada 20 cm, H= 3,0 m del módulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte, incluye cimentación en zapatas en la visita que se realizó el 30 del mes de marzo de 2022 se pudo establecer con las mediciones registradas en el acta en mención que la cantidad de intervención es 81,54 m2 de lo registrado en el acta final. Se anexa cuadro de cantidades				
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
ANTES					
ACTUAL	 				

		NOMBRE DEL FORMATO		PROCESO INFRAESTRUCTURA	
ALCANTARILLA DE PAVIMENTO		VIGENCIA		PREACTA DE OBRA	
CONVENIO: 202754		QUICHA		Código	
CONTRATISTA/PART 2: JAC TELAR		OBJETO:		FECHA: 30 / 03 / 2022	
CANTIDADES DE OBRA VISITAS				PÁGINA	
DESCRIPCION GRAFICA		ITEM		VERBA CONTRALORIA	
		DESCRIPCION		FECHA: 30 / 03 / 2022	
		UN		Cantid Longitud	
				Ancho	
				Espesor	
				Valor	
PANETE		1.1		Panete exterior locustador	
				PUERTA	
				PUERTA	
				ANCHO	
				ALTO	
				panete exterior	
				ANCHO	
				ALTO	
				Panete interior CR 4	
				Panete interior frente al pasadizo	
				Panete interior frente al mercado 1	
				Panete interior frente al mercado 2	
				Panete exterior - interno	
				Tramo 1	
				Tramo 1	
				Tramo 1	
				Tramo 1	
				Tramo 1	
				Tramo 2	
				Tramo 2	
				Tramo 2	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	
				Tramo donde se ubica Reja	

"SEGUIMIENTO AL CONVENIO N°. 202754

De acuerdo a la visita técnica realizada el 30 de marzo del 2022 con los profesionales de la Contraloría en acompañamiento de los profesional de apoyo a la supervisión de la Secretaria de Infraestructura y Valorización registrada en el acta de la fecha en mención se realiza el presente informe solicitado por el señor alcalde del Municipio de Pasto Doctor Vicente German Chamorro de la Rosa para aclaración de las cantidades de obras ejecutadas en el convenio N° 202754.

OBRAS EJECUTAS REFERENCIADAS EN EL PROCESO DE APERTURA AUTO DE APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-80522-2021- 39273

EN EL PROCESO FISCAL PRF 80522-2021-39273 hace referencia la siguiente observación, "existen diferencias en las cantidades de los ítems "1 Replanteo general (área menor 1000m2)" y "1,1 Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm", en cuantías de \$2.018.226,67 y \$3.610.544,60, respectivamente, pues se ejecutaron en menores metros cuadrados a los pactados por las partes en el Convenio solidario 20202754.

Asimismo, el profesional de apoyo calculó (a favor) las cantidades de más de los ítems "Pintura para reja metálica con anticorrosivo y pintura color azul 2 manos" y "Cerramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3" @6mts, marco en ángulo de 2 1/2" * 3/16, refuerzo interno en varilla cuadrada de 1/2 cada 20 cm, H=3.0 m del módulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte, incluye cimentación en zapatas" y producto de la operación concluyó que los faltantes de obra totalizan \$4.418.056,96 (\$4.016.415,42 costo directo + \$401.641,54 impuestos 10%)."

La Secretaria de Infraestructura y Valorización informe que es importante resaltar sobre el hallazgo en contrado las cantidades ejecutadas en los siguientes ítems son las siguientes.

1. En referencia al ítem 1. Replanteo general (área menor 1000m2) podemos observar que las cantidades ejecutadas relacionas en el acta de 30 de marzo del 2022 son mayores a las que se relaciona en el documento PRF-80522-2021-39273 como se puede observar en documento anexo relacionado con el registro fotográfico relacionando el estado inicial y la actividad ejecutada, como las dimensiones correspondientes a esta actividad.
Área ejecutada 8.719 m2 cantidad referenciada en el documento técnico
2. En referencia al ítem 1,1 Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm podemos observar que las cantidades ejecutadas relacionas en el acta de 30 de marzo del 2022 son mayores a las que se relaciona en el documento PRF-80522-2021-39273 como se puede observar en documento anexo relacionado con el registro fotográfico relacionando el estado inicial y la actividad ejecutada como las dimensiones correspondientes a esta actividad.
Área ejecutada 8.719 m2 cantidad referenciada en el documento técnico
3. En referencia al ítem 1.2 Pintura para reja metálica con anticorrosivo y pintura color azul 2 manos" podemos observar que las cantidades ejecutadas relacionas en el acta de 30 de marzo del 2022 son mayores a las que se relaciona en el documento PRF- 80522-2021-39273 como se puede observar en documento anexo relacionado con el registro fotográfico relacionando el estado inicial y la actividad ejecutada como las dimensiones correspondientes a esta actividad.
Área ejecutada 234.96 m2 cantidad referenciada en el documento técnico
4. En referencia al ítem 2.1 Cerramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3" @ 6mts, marco en ángulo de 2 1/2" *3/16, refuerzo interno en barilla cuadrada de 1/2 cada ,20 cm , H= 3.0 m del modulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte. incluye cimentación en zapatas podemos observar que las cantidades ejecutadas relacionas en el acta de 30 de marzo del 2022 son mayores a las que se relaciona en el documento PRF-80522-2021-39273 como se puede observar en documento anexo relacionado con el registro fotográfico relacionando el estado inicial y la actividad ejecutada como las dimensiones correspondientes a esta actividad.


Area ejecutada 234.96 m2 cantidad referenciada en el documento técnico

Solicito a la Contraloría encontrar la verdad real de lo sucedido, efectuar una valoración integral¹, ponderada y razonada de las pruebas recaudadas durante el presente proceso, atendiendo el principio de investigación integral. Que en el caso concreto determinan sin lugar a duda alguna que no existe detrimento patrimonial en contra del Estado.

ANEXO:

Adjunto remito copia de informe técnico elaborado en el mes de enero del año 2023 elaborado por el Arq. ANDRÉS DARÍO VELASCO CADENA, en su condición de Profesional Universitario de la Secretaría de Infraestructura y Valorización, con referencia de visita de obra del 30 de marzo de 2022 de la Contraloría General de la República

Atentamente,


CARLOS ANTONIO ZAMBRANO BURGOS
C.C. No. 12.749.774 Pasto

¹ Ley 610 de 2020, art. 26. APRECIACION INTEGRAL DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional.
