

San Juan de Pasto,
Enero 30 de 2023

VERSION LIBRE

Radicado 2023ER0014058
31-01-2023

Doctores

SANDRA CAROLINA ZARAMA MONCAYO

CARLOS ANDRÉS ALMEIDA MORENO

CARLOS ERNESTO CHAVES BRAVO

Gerencia Departamental Colegiada de Nariño

Contraloría General de la República

Pasto

Ref. Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal PRF-80522-2021-39273

Implicado: Germán Chamorro de la Rosa.

VERSIÓN LIBRE

GERMÁN CHAMORRO DE LA ROSA, obrando en mi propio nombre y representación, de conformidad con el auto 1188 del 21 de octubre de 2022 proferido por esa Directiva Colegiada, me permito presentar la correspondiente VERSIÓN LIBRE en el proceso de la referencia, en la forma siguiente:

Me llamo como queda dicho, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.970.753 expedida en Pasto (N), residente en esta ciudad en la carrera 40 # 15-45 Condominio Las Margaritas de Pasto, Casado, de profesión médico veterinario, actualmente me desempeño como Alcalde Municipal de Pasto, correo electrónico delarosa131@yahoo.es y teléfono celular 3155808810, casado, con sociedad conyugal vigente. Sobre los hechos motivo de investigación es importante resaltar:

En el auto 680 del 29 de julio de 2022 de esa colegiatura, se enuncia que respecto a la ejecución del convenio solidario 20202754 del 13 de noviembre de 2020 suscrito entre la alcaldía de Pasto y la Junta de Acción Comunal del barrio el Tejar, cuyo objeto era *“Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el municipio de Pasto y la Junta de Acción Comunal del barrio el Tejar de la comuna 4 del municipio de Pasto, para la adecuación y mejoramiento de las instalaciones pertenecientes al predio donde se encuentra ubicada la cancha de futbol del barrio El Tejar de la comuna 4 del municipio de Pasto”*, se encontró por parte del ente de control fiscal, un faltante de \$4.418.056 por no ejecutarse las cantidades totales de los ítems a los cuales se obligó la Junta de Acción Comunal del barrio El Tejar, afirmando que el suscrito no reparó en este tópico y pagó la totalidad del valor del convenio, por lo cual se produjo un detrimento patrimonial por el valor indicado, por

no haber controlado la inversión de los recursos públicos y establecer su completa ejecución. Al efecto me permito expresar:

1. Tal como se enuncia en el auto 680 del 29 de julio de 2022 de la Contraloría General de la República, por decreto 0348 del 11 de septiembre de 2020 el suscrito, en su condición de alcalde de Pasto, efectuó una delegación en materia de contratación, tanto en los secretarios de despacho como en el director del Departamento Administrativo de Contratación de la alcaldía de Pasto.

El Control y vigilancia del cumplimiento del objeto y contenido obligatorio del convenio en mención se hizo a través de la secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal, en cabeza de su secretaria, persona idónea y con amplia experiencia en obras, quien además cuenta con personal idóneo para efectos de la verificación, control y vigilancia de la actividad contractual.

No hay que olvidar que las alcaldías no son unipersonales, sino que responden a una estructura que les permita responder las demandas sociales y el cumplimiento de los fines estatales, aunado al cumplimiento de las sentencias judiciales y los dictados de los órganos de control.

La Corte Constitucional, meridianamente ha sostenido al respecto:

“(…) La administración local en Colombia no es unipersonal, por el contrario, está constituida por un andamiaje institucional que lo soporta y asesora en los diversos ámbitos decisionales y de ejecución que están a su cargo. Lo anterior con el fin de que el representante legal del ente territorial –en este caso el alcalde- organice, ejecute y vigile de manera más óptima la gestión de su municipio, la Constitución y la ley determinan también el régimen de los servidores públicos, el ámbito de sus funciones y competencias. En este sentido, la presunción establecida es la idoneidad de sus funcionarios; absurdo sería pensar que los empleados públicos pudieran excusar sus faltas en la ignorancia de la ley o la impericia frente a un ámbito de saber específico. En todo caso, en punto de las actividades desplegadas por la administración, no es admisible presumir la ignorancia de la misma con el solo argumento de la ausencia de saber especializado del burgomaestre”¹.
(Negrillas fuera del texto).

En consecuencia, es necesario tener presente que el alcalde municipal de Pasto, no obstante ser el representante legal del municipio, para atender las innumerables obligaciones que tiene en cumplimiento de su deber misional, social y el que ordenan las distintas autoridades, cuenta con una estructura municipal orgánica y administrativa, que es lo que reitera la Corte Constitucional al establecer que las

¹ Corte Constitucional, sentencia T-1143 del 28 de noviembre de 2003. Sala Séptima de Revisión. M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett.

alcaldías no son unipersonales y que responden a una estructura jerárquica, organizacional y funcional en la que cada servidor público responde por sus actuaciones, omisiones y extralimitaciones.

2. Es importante advertir que al tenor del inciso segundo del artículo 211 de la Constitución Política:

“(...) La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, resumiendo la responsabilidad consiguiente”.

En iguales términos, es fundamental tener presente que el artículo 12 de la ley 80 de 1993 mencionado por ese ente de control, fue adicionado por el artículo 21 de la ley 1150 de 2007, cuyo inciso 2 fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-693 de 2008², en el entendido según el cual el delegante solo responderá del recto ejercicio de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual, cuando haya incurrido en dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones.

Para tal efecto, la Corte Constitucional en la sentencia mencionada consideró lo siguiente:

*“De otro lado, **el principio de responsabilidad subjetiva de los servidores**, a que se refiere el artículo 124 de la Carta, conlleva que **el servidor público responde individualmente por sus acciones y decisiones y no por las de otros**; principio que resulta contrario al de responsabilidad objetiva de dichos servidores, que implicaría que éstos respondieran independientemente del grado de culpa o dolo de su actuar, y que ha sido rechazado por esta Corporación en materia de responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal de dichos funcionarios. Ciertamente, esta Corporación ha sostenido que **“no puede deducirse responsabilidad patrimonial del funcionario o agente público, si no se establece que obró, por acción u omisión, constitutiva de dolo o culpa grave, y que lo hizo en ejercicio o con motivo de sus funciones.”** Así mismo, de manera más general ha explicado que en virtud de lo dispuesto por el artículo 29 superior, conforme al cual **“Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”**, en nuestro sistema jurídico ha sido proscrita la responsabilidad objetiva y, por lo tanto, la culpabilidad es **“supuesto ineludible y necesario de la responsabilidad y de la imposición de la pena lo que significa que la actividad punitiva del estado tiene lugar tan sólo sobre la base de la responsabilidad subjetiva de aquellos sobre quienes recaiga”**. (Negritas fuera del texto).*

² Corte Constitucional, sentencia C-693 de 9 de julio 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

Al evento en ningún momento y de manera alguno se descuidó por parte del suscrito alcalde el control y vigilancia del contrato en sus etapas precontractual y contractual, al punto que se designó como supervisora del convenio suscrito con la Junta de Acción Comunal del barrio El Tejar a la misma secretaria de Infraestructura y Valorización, quien además por su perfil profesional y experiencia era persona idónea para cumplir con las labores de inspección y vigilancia del cumplimiento del objeto y obligacional del convenio signado; además de ello, contaba con personal de apoyo también idóneo y que garantizaba un serio control a la ejecución de las cláusulas contractuales.

En el entendido propuesto, para ningún efecto el suscrito en su condición de alcalde de Pasto, jamás inobservó los deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual, menos aún incurrió en algún tipo de conducta dolosa o culposa grave, ya que el convenio y su ejecución estuvo vigilado, monitoreado y seguido por la Secretaría de Infraestructura y Valorización, quien además contó con un equipo interdisciplinario que le permitió obrar con diligencia en el control, vigilancia y supervisión del convenio en su contenido sinalagmático contractual.

3. Dentro del cumplimiento de sus obligaciones como supervisora del convenio solidario y respondiendo a la indagación preliminar fiscal IP 80522-2021-39273 de la Contraloría General de la República, remite informe en oficio 1520/0184-2022 del 14 de marzo de 2022, en el cual se adjunta la información solicitada por el ente de control (**Prueba 1**).

Para efectos de la verificación de los trabajos de vigilancia y control de la secretaria de Infraestructura y Valorización, en el informe 01 de abril de 2022, en ejercicio de sus funciones de supervisión, la secretaria en mención, representada por la ingeniera NILSA VILLOTA ROSERO, presenta a la contraloría General de la República la información solicitada en el acta de vivista de obra del 30 de marzo de 2022, con el correspondiente registro fotográfico (**Prueba 2**).

En el mismo, se puntualiza que se han realizado las siguientes acciones tendientes a dicho cumplimiento:

- a. Respecto al ítem de replanteo se afirma que las mediciones registradas en el acta del 30 de marzo de 2022, que la cantidad de intervención es de 3.719 m², superior a la establecida en el acta final.
- b. En cuanto al ítem del pañete se enuncia que el mismo es de 3.719 m² mayor al establecido en el acta final.
- c. En cuanto al ítem de pintura para la reja metálica con anticorrosivo y pintura color azul, se afirma que la ejecución es de 3.719 m², mayor al establecido en el acta final.

d. Respecto al ítem de cerramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el muro existente se afirma que las mediciones registradas en el acta en mención, la cantidad de intervención es de 81.54 m2 superior a lo registrado en el acta final.

Del alcance de las obras adelantadas se puede observar el registro fotográfico anexo que permite vislumbrar la ejecución de las mismas **(Prueba 3)**.

4. En virtud a que la ingeniera NILSA VILLOTA ROSERO, presentó renuncia desde hace varios meses, se solicitó a la secretaria de Infraestructura y Valorización un informe explicativo sobre lo acaecido en cumplimiento de su competencia como supervisora del contrato.

Para el caso en concreto, en enero del presente año, el arquitecto ANDRÉS DARÍO VELASCO CADENA, profesional universitario de la secretaria de Infraestructura y Valorización de la alcaldía de Pasto, remite un informe pormenorizado apoyado en las pruebas fotográficas mencionadas (Ver. Prueba 3).

En el mencionado informe se observa detalladamente lo establecido por la Secretaria de Infraestructura y Valorización en cumplimiento a sus competencias de supervisión, en el cual mantiene el criterio expresado en el registro fotográfico e informe ya mencionado **(Prueba 4)**.

5. Como se puede observar en el acta del 30 de marzo de 2022, todo se desencadena a raíz de las observaciones y aclaraciones que se hizo en dicha diligencia practicada por funcionarios de la Contraloría General de la República y de la Secretaria de Infraestructura y Valorización de la alcaldía de Pasto **(Prueba 5)**. Las mismas fueron aclaradas por la ingeniera Nilsa Villota Rosero, como secretaria de Infraestructura y el equipo de apoyo que la acompañaba.

Tanto es así que el primero de diciembre de 2020 la secretaria de Infraestructura y Valorización de la alcaldía de Pasto y el contratista CARLOS ANTONIO ZAMBRANO BURGOS, firmaron el acta de recibo final de las obras contratadas **(Prueba 6)** y, el 30 de diciembre de 2021 se firmó el acta de liquidación del convenio 20202754, finiquitando la relación contractual **(Prueba 7)**.

En suma, en ningún momento y de manera alguna se observa que el suscrito en su condición de alcalde ha obrado con dolo o culpa grave en el proceso de vigilancia y control del convenio solidario multicitado, ya que en todo momento se dispuso que la secretaria de Infraestructura y Valorización junto con todo el equipo de apoyo profesional y técnico disponible, hiciesen el control y vigilancia del contenido obligacional del convenio prenotado y, según los integrantes de la secretaria no existe ningún detrimento patrimonial.

PRUEBAS

A. Documentales:

Prueba 1: Copia del oficio 1520/0184-2022 del 14 de marzo de 2022 suscrito la secretaria de Infraestructura y Valorización de la alcaldía de Pasto, dirigido a la doctora Elizabeth Jurado Melo, Profesional Universitaria de la Contraloría General de la República -Gerencia Departamental Colegiada- (3 folios).

Prueba 2: Copia del Informe 1 de abril de 2022 del convenio 20202754 de la secretaria de Infraestructura y Valorización de la alcaldía de Pasto (5 folios).

Prueba 3: Copia de las observaciones efectuadas por la secretaria de Infraestructura y Valorización de la alcaldía de Pasto respecto a los hallazgos de la Contraloría General de la República (8 folios).

Prueba 4: Copia del informe técnico del mes de enero de 2023 suscrito por el arquitecto ANDRÉS DARIO VELASCO CADENA, profesional universitario de la secretaria de Infraestructura y Valorización de la alcaldía de Pasto (3 folios).

Prueba 5: Copia del acta del 30 de marzo de 2022 suscrita por funcionarios de la Contraloría General de la República y la secretaria de Infraestructura y Valorización de la alcaldía de Pasto (5 folios).

Prueba 6: Copia del acta final de recibo del convenio solidario 20202754 de 2020 suscrito entre la ingeniera NILSA VILLOTA ROSERO, secretaria de Infraestructura y Valorización y el señor CARLOS ANTONIO ZAMBRANO TEJAR, contratista del convenio (2 folios).

Prueba 7: Copia del acta de liquidación del convenio solidario 20202754 de 2020 suscrito entre la ingeniera NILSA VILLOTA ROSERO y el señor CARLOS ANTONIO ZAMBRANO TEJAR, contratista del convenio (3 folios).

B. Testimoniales:

Solicito se recepcione el testimonio del arquitecto ANDRÉS DARIO VELASCO CADENA, identificado con la cédula de ciudadanía 13.072.222 expedida en Pasto, Profesional Universitario de la secretaria de Infraestructura y Valorización de la alcaldía de Pasto, a quien se puede ubicar en el barrio Anganoy, celular 313 629 5499. Correo electrónico andavele77@gmail.com

OBJETO DE LA PRUEBA: Establecer las funciones de control y supervisión de la secretaria de Infraestructura y Obras de la alcaldía de Pasto y la veracidad de la ejecución de las obras relacionadas con el convenio solidario 20202754 de 2020 suscrito entre la alcaldía de Pasto y la Junta de Acción Comunal del barrio El Tejar.

C. Inspección Ocular:

Con el objeto de poder confrontar las pruebas documentales aportadas en la presente versión, como de las testimoniales que se recepcione, solicito respetuosamente se decrete una inspección ocular en el sitio de las obras ejecutadas y supervisadas por la alcaldía de Pasto a través de la secretaria de Infraestructura y Valorización.

PETICIÓN

Con fundamento en la documentación relacionada y detallada, respetuosamente solicito se disponga relevarme de cualquier responsabilidad dentro del proceso de la referencia

Cordialmente,



GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA

PRUEBA 1.

PRUEBA 1



PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN

1520/0184-2022

San Juan de Pasto, 14 de marzo de 2022

Contraloría General de la República
ELIZABETH JURADO MELO
Profesional Universitario sustanciadora
Gerencia Departamental Colegiada Nariño

Asunto: "Indagación preliminar Fiscal IP 80522-2021-39273 Requerimiento información – Solicitud Segunda vez.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta lo enunciado por Yolanda Elizabeth Jurado Melo mediante correo electrónico remitido a : calidadinfraestructura@alcaldiapasto.gov.co de fecha 14-mar 2022: "acuso recibo de su comunicación con la que adjunta oficio de respuesta emitido para la Indagación Preliminar IP-80522-2021-39274, no obstante, es de señalar que la Contraloría General de la República Gerencia Nariño adelanta la IP-80522-2021-39273 relacionada con la ejecución del Convenio 20202754 Mejoramiento cancha de fútbol Barrio El Tejar; última actuación en la que se ha requerido información con el radicado 2022EE0036181 enviado internamente por la Unidad de Correspondencia de la Alcaldía con el radicado 202203980."

La Secretaría de Infraestructura y Valorización remite la información solicitada por la Contraloría General de la República, así:

- o Copia del oficio de diciembre de 2020 suscrito por la comunidad del Barrio el Tejar en el que solicitan la inclusión de unos nuevos ítems en el convenio Solidario 20202754.

Se adjunta archivo en formato pdf nombrado "Solicitud modificación de ítem - cantidades convenio".

- o Informe en el que especifique cuales con las características del reflector tipo led que hace parte del Análisis de precio unitario que reposa en la Oficina técnica de la Secretaría de infraestructura y valorización municipal (potencia; Watts, material, etc).

Se adjunta archivo en formato pdf nombrado "Especificación técnica reflector led tejar".

Alcaldía de Pasto - NIT: 891280000-3
Sitio web: www.pasto.gov.co - Correo: contactenos@pasto.gov.co
Teléfono: +57(2) 7244326, Conmutador Principal: +57(2) 7244326 - Ext: 1001
CAM Anganoy los Rosales II



PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN



**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
BARRIO EL TEJAR**

Comunidad organizada en el barrio El Tejar, del barrio El Tejar,
del municipio de Pasto



San Juan de Pasto, 13 de diciembre de 2020

Señores:
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN
Alcaldía de Pasto San Juan de Pasto

Asunto: solicitud modificación al convenio No. 20202754

Cordial saludo. Mediante el presente oficio, solicito comedidamente se realice y autorice una modificación a las condiciones iniciales del convenio No. 20202754, esto con respecto al cambio de algunas cantidades de los ítems ya contemplados en el convenio y la adición de una actividad necesaria realizarse, debido a las condiciones de la obra. Agradeciendo su atención y colaboración, se suscribe de ustedes.

Atentamente

CARLOS ANTONIO ZAMBRANO BRUGOS
PRESIDENTE JAC BARRIO TEJAR



PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN



PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN

8. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Herramientas menores
- Andamios tubulares

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se cuantificará y pagará unidad instalada (Und) de acuerdo a las especificaciones descriptas y autorizadas por la supervisión.

El valor será el precio unitario estipulado en el contrato y su costo incluye:

- Equipos
- Mano de obra
- Otros costos directos e indirectos que el contratista estime necesarios para la realización de esta actividad.

Se anexa facturas correspondientes de 6 unidades de reflector led de 400 w

NILSA VILLOTA ROSERO

Secretaría de Infraestructura y Valorización

PRUEBA 2

PRUEBA 2



PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN

MUNICIPIO DE PASTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN



CONVENIO DE OBRA No. 20202754 DE

"Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el MUNICIPIO DE PASTO y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO, para la "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO", vigencia 2020"

INFORME No. 01

Abril 2022



PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN

Contraloría General de la Republica
ELIZABETH JURADO MELO
Profesional Universitario sustanciadora
Gerencia Departamental Colegiada Nariño

Asunto: "Indagación preliminar Fiscal IP 80522-2021-39273 Requerimiento información – Solicitud Según acta de visita de Obra del 30 de Marzo 2022.

1. DATOS DEL CONTRATO

No Contrato: 20202754
Fecha Contrato: 30 de diciembre de 2020
Valor Contrato: \$ (70.000.000)

Objeto:

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el MUNICIPIO DE PASTO y **LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO**, para la "ADECUACION Y MEJORAMIENTO CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO ATAHUALPA DE LA COMUNA 2 DEL MUNICIPIO DE PASTO", vigencia 2020.

Plazo: Hasta el 30 de diciembre de 2020.
Contratista: JAC Barrio Tejar







PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN

ANEXO 10 – Registro fotográfico valla informativa


EJECUCION DE OBRA

	
<p><u>Pañete interior en diferentes zonas internas para protección del muro de la humedad.</u></p>	<p><u>Construcción de soportes de la estructura para soporte de los módulos de impacto superiores y exteriores.</u></p>
	
<p>Construcción de módulos de impacto internos y externos de la zona deportiva.</p>	<p>Instalación de módulos en las zonas exteriores ángulo de 1"- internamente en varilla ½ cuadrada</p>

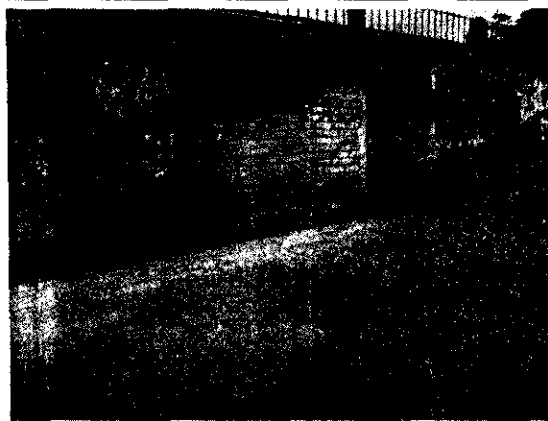


PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN



Retiro de pañete en las paredes exteriores del cerramiento en mampostería causado por deterioro de agentes climáticos y por el tiempo de vida útil.



Retiro de pañete en las paredes exteriores del cerramiento en mampostería causado por deterioro de agentes climáticos y por el tiempo de vida útil.



Retiro de pañete en las paredes exteriores del cerramiento en mampostería causado por deterioro de agentes climáticos y por el tiempo de vida útil.



6 unidades de Luminaria 400 w tipo led que corresponden a la espasificación técnica adjunta, para la practica deportiva nocturna y por seguridad del sector ya que se encuentra en una zona vulnerable por la inseguridad que se presenta.



PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN

Se anexan especificación técnica

CARACTERÍSTICAS DEL REFLECTOR LED - ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA DE FUTBOL
BARRIO EL TEJAR

1. CÓDIGO ÍTEM	2. DESCRIPCIÓN ÍTEM
RTL	Suministro e Instalación de Reflector Tipo Led
3. UNIDAD DE MEDIDA	UND
4. DESCRIPCIÓN <ul style="list-style-type: none"> • Diseño hermético a prueba de agua. • Chasis en aluminio que garantiza la correcta disipación de calor. • Bajo consumo de energía. • Eficiente drive multivoltaje que mantiene estable la corriente en el producto. • Libre de y elementos tóxicos como el mercurio y el plomo. • No emite radiación infrarroja y ultravioleta. • 400 w • Alambre de cobre THHN N°. 12 • Accesorio Conduit de 1/2 	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN <ul style="list-style-type: none"> • Iniciar las actividades una vez la supervisión de la obra de inicio. • Cuantificar la cantidad de unidades a instalar • Programar una secuencia de actividades para la realización de la localización y replanteo de la iluminación. 	
6. TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN N/A	
7. MATERIALES <ul style="list-style-type: none"> • ALUMINIO CHASIS – CONTIENE PLASTICO EN ALGUNOS SECTORES • LUMINARIA TIPO LED 	

PRUEBA 3

PRUEBA 3

OBJETO: Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el MUNICIPIO DE PASTO y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO, para la "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO", vigencia 2020

CONVENIO No: 202754 CONTRATISTA/PARTE 2: JAC TEJAR PRF - 80522-2021-39273

Código	Descripción	UN	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
1	PRELIMINARES				
1	Replanteo general (area menor 1000 m2)	m2	\$ 946.00	2,949.00	\$ 2,789,754.00

HALLAZGO	<p>"1. Replanteo general (área menor 1000m2) {...}</p> <p>En la visita fiscal se procedió a dimensionar las cantidades realmente ejecutadas del ítem, por parte de los funcionarios de la alcaldía, se mencionó que sobre el muro exterior de la calle 18 A se realizó replanteo para el diseño específico del muro {...}</p> <p>Por lo anterior se valida el ajuste de dicha cantidad a una altura promedio de 2.72 metros en la longitud del muro sobre la calle 18 A, y para los demás se tendrá en cuenta el perímetro en un ancho de 2 m puesto que las actividades ejecutadas con el convenio fueron ejecutadas en el perímetro del cerramiento como se muestra en los cálculos del Anexo 1. Cálculo de cantidades de obra convenio 202754. Cancha de Fútbol barrio El Tejar, por lo anterior se estableció que el área de este ítem realmente ejecutada corresponde a 815,57 m2.</p>				

OBSERVACIONES	<p>En cuanto el ítem de replanteo en la visita que se realizó el 30 del mes de marzo de 2022 se pudo establecer con las mediciones registradas en el acta en mención que la cantidad de intervención es de 3719 m2 la cual es mayor a la establecida en el acta final. Se anexa cuadro de cantidades</p>				
---------------	--	--	--	--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES

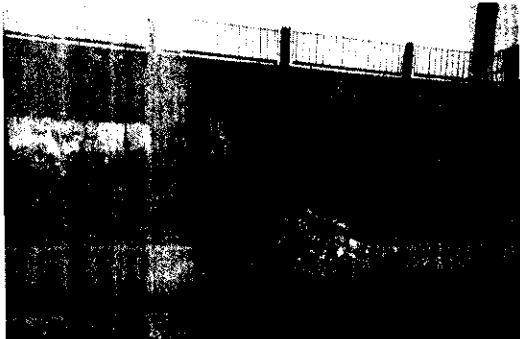





ACTUAL



Código	Descripción	UN	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
1,1	Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm	m2	\$ 18,428.00	649.00	\$ 11,959,772.00
HALLAZGO	"1,1 Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm", en cuantías de \$2,018,226.67 y \$3,610,544.60, respectivamente, pues se ejecutaron en menores metros cuadrados a los pactados por las partes en el Convenio solidario 20202754.				
OBSERVACIONES	En cuanto el ítem de replanteo en la visita que se realizó el 30 del mes de marzo de 2022 se pudo establecer con las mediciones registradas en el acta en mención que la cantidad de intervención Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm es de 3719 m2 la cual es mayor a la establecida en el acta final. Se anexa cuadro de cantidades				

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES		
ACTUAL		

Código	Descripción	UN	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
1,1	Pintura para reja metálica con anticorrosivo y pintura color azul 2 manos	m2	\$ 18,621.72	150.00	\$ 2,793,257.00
HALLAZGO	"Pintura para reja metálica con anticorrosivo y pintura color azul 2 manos" y "Cerramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3" @ 4mts, marco en ángulo de 2 1/2" * 3/16, refuerzo interno en varilla cuadrada de 1/2 cada 20 cm, H=3.0 m del módulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte, incluye cimentación en zapatas" y producto de la operación concluyó que los fallantes de obra totalizan \$4,418,056.96 (\$4,016,415.42 costo directo + \$401,641.54 impuestos 10%).				
OBSERVACIONES	En cuanto el ítem de Pintura para reja metálica con anticorrosivo y pintura color azul 2 manos en la visita que se realizó el 30 del mes de marzo de 2022 se pudo establecer con las mediciones registradas en el acta en mención que la cantidad de intervención del ítem en mención es de 3719 m2 la cual es mayor a la establecida en el acta final. Se anexa cuadro de cantidades				

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBJETO: Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el MUNICIPIO DE PASTO y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO, para la "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO", vigencia 2020


CONVENIO No: 202754 CONTRATISTA/PARTE 2: JAC TEJAR PRF - 80522-2021-39273

Código	Descripción	UN	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
1	PRELIMINARES				
1	Replanteo general (area menor 1000 m2)	m2	\$ 946.00	2.949.00	\$ 2.789.754.00

HALLAZGO	"1. Replanteo general (área menor 1000m2) [...] En la visita fiscal se procedió a dimensionar las cantidades realmente ejecutadas del ítem, por parte de los funcionarios de la alcaldía, se mencionó que sobre el muro exterior de la calle 18 A se realizó replanteo para el diseño específico del muro [...] Por lo anterior se valida el ajuste de dicha cantidad a una altura promedio de 2.72 metros en la longitud del muro sobre la calle 18 A, y para los demás se tendrá en cuenta el perímetro en un ancho de 2 m puesto que las actividades ejecutadas con el convenio fueron ejecutadas en el perímetro del cerramiento como se muestra en los cálculos del Anexo 1. Cálculo de cantidades de obra convenio 202754. Cancha de Fútbol barrio el Tejar, por lo anterior se estableció que el área de este ítem realmente ejecutada corresponde a 815.57 m2.

OBSERVACIONES	En cuanto el ítem de replanteo en la visita que se realizó el 30 del mes de marzo de 2022 se pudo establecer con las mediciones registradas en el acta en mención que la cantidad de intervención es de 3719 m2 la cual es mayor a la establecida en el acta final. Se anexa cuadro de cantidades
---------------	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	
-------	---

ACTUAL	 
--------	--


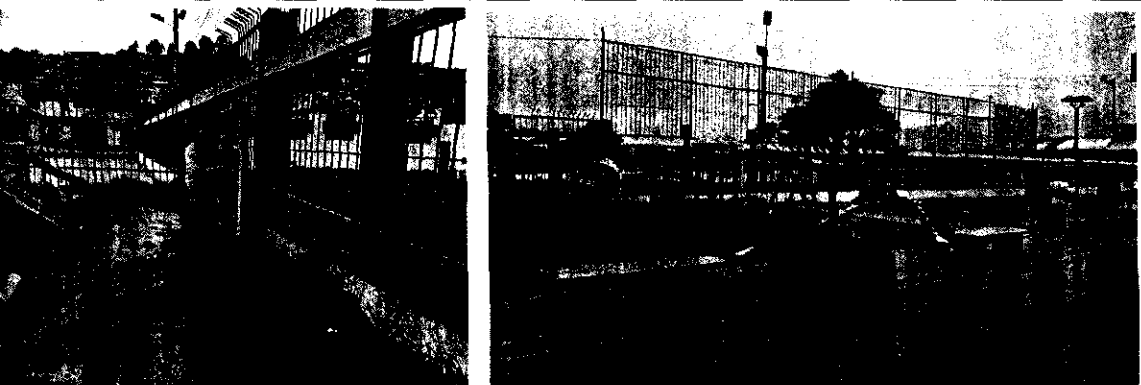
Código	Descripción	UN	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
1,1	Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm	m2	\$ 18,428.00	649.00	\$ 11,959,772.00
HALLAZGO	"1,1 Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm", en cuantías de \$2,018,226.67 y \$3,610,544.60, respectivamente, pues se ejecutaron en menores metros cuadrados a los pactados por las partes en el Convenio solidario 20202754.				
OBSERVACIONES	En cuanto el ítem de replanteo en la visita que se realizó el 30 del mes de marzo de 2022 se pudo establecer con las mediciones registradas en el acta en mención que la cantidad de intervención Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm es de 3719 m2 la cual es mayor a la establecida en el acta final. Se anexa cuadro de cantidades				



REGISTRO FOTOGRÁFICO




Código	Descripción	UN	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
1,1	Pintura para reja metálica con anticorrosivo y pintura color azul 2 manos	m2	\$ 18,621.72	150.00	\$ 2,793,257.00
HALLAZGO	"Pintura para reja metálica con anticorrosivo y pintura color azul 2 manos" y "Cerramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3" @6mts. marco en ángulo de 2 1/2" * 3/16. refuerzo interno en varilla cuadrada de 1/2 cada 20 cm. H=3.0 m del módulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte, incluye cimentación en zapatas" y producto de la operación concluyó que los faltantes de obra totalizan \$4,418,056.96 (\$4,016,415.42 costo directo + \$401,641.54 impuestos 10%).				
OBSERVACIONES	En cuanto el ítem de Pintura para reja metálica con anticorrosivo y pintura color azul 2 manos en la visita que se realizó el 30 del mes de marzo de 2022 se pudo establecer con las mediciones registradas en el acta en mención que la cantidad de intervención del ítem en mención es de 3719 m2 la cual es mayor a la establecida en el acta final. Se anexa cuadro de cantidades				

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES					
ACTUAL					
Código	Descripción	UN	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
2,1	Cerramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3" @ 6mts, marco en ángulo de 2 1/2" * 3/16, refuerzo interno en barilla cuadrada de 1/2 cada .20 cm , H= 3.0 m del modulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte. Incluye cimentación en zapatas	ml	\$ 341,523.00	60.00	\$ 20,491,380.00
HALLAZGO	"Pintura para reja metálica con anticorrosivo y pintura color azul 2 manos" y "Cerramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3" @ 6mts, marco en ángulo de 2 1/2" * 3/16, refuerzo interno en varilla cuadrada de 1/2 cada 20 cm, H=3.0 m del módulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte. Incluye cimentación en zapatas" y producto de la operación concluyó que los faltantes de obra totalizan \$4,418,056.96 (\$4,016,415.42 costo directo + \$401,641.54 impuestos 10%).				
OBSERVACIONES	En cuanto el ítem de Cerramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3" @ 6mts, marco en ángulo de 2 1/2" * 3/16, refuerzo interno en barilla cuadrada de 1/2 cada .20 cm , H= 3.0 m del modulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte. Incluye cimentación en zapatas en la visita que se realizó el 30 del mes de marzo de 2022 se pudo establecer con las mediciones registradas en el acta en mención que la cantidad de intervención es 81,54 m2 de lo registrado en el acta final. Se anexa cuadro de cantidades				
REGISTRO FOTOGRÁFICO					

ANTES	
ACTUAL	

		PROCESO INFRAESTRUCTURA						
NOMBRE DEL FORMATO		PREACTA DE OBRA						
VIGENCIA		VERSION	CÓDIGO	PÁGINA				
03-Oct-18		02	IN-F-013					
CONVENIONo.: 202754		OBJETO:						
CONTRATISTA/PARTE 2: JAC TEJAR		VISITA CONTRALORIA						
CANTIDADES DE OBRA VISITAS		FECHA : 30 / 03 /2022						
DESCRIPCION GRAFICA	ITEM	DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES			Valor	
				Cantid	Longitud	Ancho	Espesor	
PANETE	1.1	Pañete exterior fachada			0.00	0.84		0.00
					28.60	0.50		14.30
		PUERTA			28.60			0.00
		PUERTA			30.90			0.00
					30.90	0.50		15.45
					48.50	0.59		28.62
					61.80	0.64		39.55
					61.80	2.91		179.84
					63.30	2.91		184.20
					63.30	0.73		46.21
TRAMO 4	1.1				70.90	0.68		48.21
					72.40	0.30		21.72
		ANCHO			2.77			0.00
		ALTO			2.55			0.00
		pañete exterior			72.40	0.30		21.72
		ANCHO			2.77			0.00
		ALTO			2.55			0.00
								0.00
		Pañete interior cr 6			14.63	0.85		12.44
		Pañete interior frente al pescado			16.85	0.56		9.44
SALON CULTURAL - CR 6g	1.1	Pañete interior frente al mercado 1			30.00	0.81		24.30
		Pañete interior frente al mercado 2			15.06	0.89		13.40
		Pañete exterior - Interno						
		Tramo 1			16.70	2.20		36.74
		Tramo 1			16.70	2.75		45.93
		Tramo 1			31.00	2.35		72.85
		Tramo 1			51.90	2.40		124.56
		Tramo 1			66.70	2.40		160.08
		Tramo 1			95.40	2.46		234.68
	1.1	Tramo 1			110.20	2.62		288.72
		Tramo 2			14.20	2.54		36.07
		Tramo 2			30.40	2.60		79.04
		Tramo 2			44.80	2.77		124.10
		Tramo 2			59.40	2.98		177.01
		Tramo donde se ubica Reja			5.40	2.43		13.12
		Tramo donde se ubica Reja			20.10	2.77		55.68
		Tramo donde se ubica Reja			40.40	2.70		109.08
		Tramo donde se ubica Reja			60.50	2.64		159.72
		Tramo donde se ubica Reja			73.10	2.34		171.05
	1.1	Tramo donde se ubica Reja			73.10	0.90		65.79
		Tramo donde se ubica Reja			75.60	1.00		75.60
		Tramo donde se ubica Reja			85.50	0.81		69.26
		Tramo donde se ubica Reja			85.50	1.01		86.36
		Tramo donde se ubica Reja			95.70	0.81		77.52
		Pañete lateral mercado			95.70	3.15		301.46
		Pañete lateral mercado			99.50	3.17		315.42
		Pañete lateral mercado			99.50	1.00		99.50
		Pañete lateral mercado			114.70	0.70		80.29



ALCALDIA DE PASTO

PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

PREACTA DE OBRA

VIGENCIA
03-Oct-18

VERSION
02

CÓDIGO
IN-F-013

PAGINA

CONVENIONo.: 202754

OBJETO:





CONTRATISTA/PARTE 2: JAC TEJAR



VISITA CONTRALORIA

CANTIDADES DE OBRA VISITAS

FECHA : 30 / 03 / 2022

[illegible]


Código	Descripción	UN	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial		
1,1	Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1:5 cm	m2	\$ 18.428,00	649,00	\$	11.959.772,00	
HALLAZGO	"1,1 Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm", en cuantías de \$2.018.226,67 y \$3.610.544,60, respectivamente, pues se ejecutaron en menores metros cuadrados a los pactados por las partes en el Convenio solidario 2020/2754.						
OBSERVACIONES	En cuanto el ítem de replanteo en la visita que se realizó el 30 del mes de marzo de 2022, se pudo establecer con las mediciones registradas en el acta en mención que la cantidad de intervención Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm es de 3719 m2 la cual es mayor a la establecida en el acta final. Se anexa cuadro de cantidades						
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
ANTES							
ACTUAL							
DESCRIPCION GRAFICA			ITEM	DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES Cantid Longitud Ancho Espesor	Valor
Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1:5 cm			1	Pañete exterior fachadas		0,00 0,84	0,00
							28,40 0,50
TRAMO 4				PUERTA		28,40	0,00
				PUERTA		30,90 0,50	0,00
SALON CULTURAL - CR 8g						30,90 0,50	15,45
						48,50 0,59	28,62
						41,80 0,64	26,74
						41,80 2,91	119,84
						63,30 2,91	184,20
						63,30 0,75	46,21
						70,90 0,68	48,21
						72,40 0,50	36,20
				ANCHIO		2,77	0,00
				ALTO		2,55	0,00
			1	pañete exterior		72,40 0,50	21,72
					ANCHIO		2,77
				ALTO		2,55	0,00
						14,43 0,85	12,44
				Pañete interior cr 4		16,85 0,54	9,14
				Pañete interior frente al mercado 1		30,00 0,81	24,30
				Pañete interior frente al mercado 2		15,04 0,89	13,40
							659,39
				Pañete exterior - interno			
				Tramo 1		16,70 2,20	36,74
				Tramo 1		16,70 2,75	45,93
				Tramo 1		31,00 2,35	72,85
				Tramo 1		51,90 2,40	124,56
				Tramo 1		46,70 2,40	110,08
				Tramo 1		95,40 2,46	234,68
				Tramo 1		110,30 2,69	288,79
				Tramo 2		14,05 2,34	32,07
				Tramo 2		30,40 2,40	72,94
				Tramo 2		44,80 2,77	124,10
				Tramo 2		59,40 2,96	177,01
				Tramo donde se ubica Reja		5,40 2,40	13,12
				Tramo donde se ubica Reja		20,10 2,77	55,48
				Tramo donde se ubica Reja		40,40 2,70	109,08
				Tramo donde se ubica Reja		40,50 2,44	109,73
				Tramo donde se ubica Reja		73,10 2,34	171,00
				Tramo donde se ubica Reja		73,10 0,90	65,79
				Tramo donde se ubica Reja		75,40 1,00	75,40
				Tramo donde se ubica Reja		85,50 0,81	69,24
				Tramo donde se ubica Reja		85,50 1,01	86,35
				Tramo donde se ubica Reja		95,90 0,81	77,50
				Pañete lateral mercado		95,90 3,15	301,46
				Pañete lateral mercado		99,50 3,17	313,42
				Pañete lateral mercado		99,50 1,00	99,50
				Pañete lateral mercado		114,70 0,70	80,29
							3059,61
1,1 CANTIDAD TOTAL PAÑETE EXTERIOR ALLANADO							3719,00

Código	Descripción	UN	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial			
2.1	Cerramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3" @ 6mts, marco en ángulo de 2 1/2" *3/16, refuerzo interno en: varilla cuadrada de 1/2 cada 20 cm . H= 3.0 m del modulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte. incluye cimentación en zapatas	ml	\$ 341.523,00	60,00	\$ 20.491.380,00			
HALLAZGO	"Pintura para reja metálica con anticorrosivo y pintura color azul 2 manos" y "Ceramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3" @6mts, marco en ángulo de 2½" * 3/16, refuerzo interno en varilla cuadrada de ½ cada 20 cm, H=3.0 m del módulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte, incluye cimentación en zapatas" y producto de la operación concluyó que los faltantes de obra totalizan \$4.418.056,96 [\$4.016.415,42 costo directo + \$401.641,54 impuestos 10%].							
OBSERVACIONES	En cuanto el ítem de Ceramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3" @ 6mts, marco en ángulo de 2 1/2" *3/16, refuerzo interno en: varilla cuadrada de 1/2 cada 20 cm . H= 3.0 m del modulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte, incluye cimentación en zapatas en la visita que se realizó el 30 del mes de marzo de 2022 se pudo establecer con las mediciones registradas en el acta en mención que la cantidad de intervención es: 81,54 m2 de lo registrado en el acta final. Se anexa cuadro de cantidades							
REGISTRO FOTOGRÁFICO								
ANTES								
ACTUAL								
2.1 CERRIENTO DE PROTECCION E IMPACTO								
1				Ceramiento sector Oriente lado parque	3,10	24,78	76,82	
				Ceramiento sector camera 6	2,30	10,74	29,05	
				Ceramiento sector pesado	3,00	30,15	91,25	
					2,40	15,85	38,04	
TOTAL CERRIENTO DE PROTECCION E IMPACTO								234,96

Elaboró:



Arq. Andres Dario Velasco Cadena
Profesional Universitario S.I.V.M


 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			
	VIGENCIA 25-May-18	VERSIÓN 03	CODIGO IN-F-023	PÁGINA 1 de 40

MUNICIPIO DE PASTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN



INFORME TECNICO REALIZADO CON REFERECIA - ACTA DE VISITA DE
OBRA DEL 30 DE MARZO 2022 DE LA CONTRALORIA

Enero de 2023

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			
	VIGENCIA 25-May-18	VERSIÓN 03	CODIGO IN-F-023	PÁGINA 2 de 40

SEGUIMIENTO AL CONVENIO N°. 202754

De acuerdo a la visita técnica realizada el 30 de marzo del 2022 con los profesionales de la Contraloría en acompañamiento de los profesional de apoyo a la supervisión de la Secretaria de Infraestructura y Valorización registrada en el acta de la fecha en mención se realiza el presente informe solicitado por el señor alcalde del Municipio de Pasto Doctor Vicente German Chamorro de la Rosa para aclaración de las cantidades de obras ejecutadas en el convenio N° 202754.

OBRAS EJECUTAS REFERENCIADAS EN EL PROCESO DE APERTURA AUTO DE APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCALPRF-80522-2021-39273

EN EL PROCESO FISCAL PRF 80522-2021-39273 hace referencia la siguiente observación, *“existen diferencias en las cantidades de los ítems “1 Replanteo general (área menor 1000m2)” y “1,1 Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm”, en cuantías de \$2.018.226,67 y \$3.610.544,60, respectivamente, pues se ejecutaron en menores metros cuadrados a los pactados por las partes en el Convenio solidario 20202754.*


*Asimismo, el profesional de apoyo calculó (a favor) las cantidades de más de los ítems “Pintura para reja metálica con anticorrosivo y pintura color azul 2 manos” y “Cerramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3” @6mts, marco en ángulo de 2½” * 3/16, refuerzo interno en varilla cuadrada de ½ cada 20 cm, H=3.0 m del módulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte, incluye cimentación en zapatas” y producto de la operación concluyó que los faltantes de obra totalizan **\$4.418.056,96** (\$4.016.415,42 costo directo + \$401.641,54 impuestos 10%).”*

La Secretaria de Infraestructura y Valorización informe que es importante resaltar sobre el hallazgo en contrario las cantidades ejecutadas en los siguientes ítems son las siguientes.

1. En referencia al ítem 1. Replanteo general (área menor 1000m2) podemos observar que las cantidades ejecutadas relacionas en el acta de 30 de marzo del 2022 son mayores a las que se relaciona en el documento PRF-80522-2021-39273 como se puede observar en documento anexo relacionado con el registro fotográfico relacionando el estado inicial y la actividad ejecutada, como las dimensiones correspondientes a esta actividad.

Área ejecutada 3.719 m2 cantidad referenciada en el documento técnico

2. En referencia al ítem 1,1 Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm podemos observar que las cantidades ejecutadas relacionas en el

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			
	VIGENCIA 25-May-18	VERSIÓN 03	CODIGO IN-F-023	PÁGINA 3 de 40

acta de 30 de marzo del 2022 son mayores a las que se relaciona en el documento PRF-80522-2021-39273 como se puede observar en documento anexo relacionado con el registro fotográfico relacionando el estado inicial y la actividad ejecutada como las dimensiones correspondientes a esta actividad.

Área ejecutada 3.719 m2 cantidad referenciada en el documento técnico

- En referencia al ítem 1.2 Pintura para reja metálica con anticorrosivo y pintura color azul 2 manos" podemos observar que las cantidades ejecutadas relacionas en el acta de 30 de marzo del 2022 son mayores a las que se relaciona en el documento PRF-80522-2021-39273 como se puede observar en documento anexo relacionado con el registro fotográfico relacionando el estado inicial y la actividad ejecutada como las dimensiones correspondientes a esta actividad.


Área ejecutada 234.96 m2 cantidad referenciada en el documento técnico

- En referencia al ítem 2.1 Cerramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3" @ 6mts, marco en ángulo de 2 1/2" *3/16, refuerzo interno en barilla cuadrada de 1/2 cada ,20 cm , H= 3.0 m del modulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte. incluye cimentación en zapatas podemos observar que las cantidades ejecutadas relacionas en el acta de 30 de marzo del 2022 son mayores a las que se relaciona en el documento PRF-80522-2021-39273 como se puede observar en documento anexo relacionado con el registro fotográfico relacionando el estado inicial y la actividad ejecutada como las dimensiones correspondientes a esta actividad.

Área ejecutada 234.96 m2 cantidad referenciada en el documento técnico

Elaboró:


Arg. Andrés Darío Velasco Carena
Profesional Universitario SIVM

 CONTRALORIA	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE NARIÑO Indagación Preliminar IP-80522-2021-39273 Convenio 202754 del 13 de noviembre de 2020 Barrio El Tejar-Municipio de Pasto ACTA DE VISITA DE OBRA	(2)
---	---	------------

En el municipio de Pasto, a los treinta (30) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022), en cumplimiento de la VISITA ESPECIAL a las obras ejecutadas para el mejoramiento de la cancha de fútbol del Barrio El Tejar de la Indagación Preliminar IP-80522-2021-39273, apertura da mediante auto No. 214 del 29 de diciembre de 2021 por la Gerencia Departamental Colegiada de Nariño, se procede a realizar visitas a las obras que ejecutaron en el marco del convenio 202754 del 13 de noviembre de 2020 por valor de Setenta Millones de Pesos (\$70.000.000,00), cuyo objeto fue "Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros entre el MUNICIPIO DE PASTO y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO, para la "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO" vigencia 2020", en el cual se estableció el siguiente presupuesto de obra teniendo en cuenta cantidades contratadas y valores actualizados con ítems no previstos acorde a la información allegada por el Municipio de Pasto así:

N.	DESCRIPCION	VALORES CONTRATADOS				VALORES ACTUALIZADOS		VALORES EJECUTADOS			
		UN	CANTID	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	- CANTID	VR. PARCIAL	VR. UNITAR CONTRALORIA	CANTID	VR. PARCIAL	DIFERENCIA
1	Replanteo general (área menor 1000m2).	M2	7.510,00	846,00	7.104.480,00	2.949,00	2.789.754,00	946,00	678,00	641.368,00	2.146.368,00
1.1	Pintura exterior aluminada proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm	M2	555,00	18.428,00	10.227.540,00	649,00	11.959.772,00	18.428,00	426,00	7.850.328,00	4.108.444,00
1.2	Pintura vinilo tipo 1 interiores y exteriores 3 manos	M2	1.850,00	9.382,00	17.356.700,00	2.100,00	19.702.200,00	9.382,00	2.100,00	19.702.200,00	-
1.3	Cerramiento de protección e impacto en tubo pesado estructural 3" @ 3mts, marco en ángulo de 2 1/2" 3/16, refuerzo en ángulo de 1 1/2" 3/16 y malla es la bonada del 10.5. 11= 3.0 m pintado con anticorrosivo y pintura esmalte	ML	84,76	341.523,00	28.947.683,64	-	0,00	341.523,00	-	-	-
2	Ilum. no previstos										
	refructores alumbración cancha de fútbol tipo led	und	-	400.000,00	-	6,00	2.400.000,00	116.667,00	3,00	350.001,00	2.049.999,00
	Red para luminaria led incluye material	gl	-	3.500.000,00	-	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1,00	3.500.000,00	-
	Pintura para rejas metálicas con anticorrosivo y pintura color azul 2 manos	M2	-	18.621,72	-	150,00	2.793.257,64	18.621,72	187,25	3.486.818,62	- 693.658,98
2.1	Cerramiento de protección e impacto aluminado a altura sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3" @ 6mts, marco en ángulo de 2 1/2" 3/16, refuerzo externo en barilla cuadrada de 1/2 cada 20 cm. 11= 3.0 m del modulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte. incluye ornamentación en zapatas	ML	-	341.523,00	-	80,0000	20.481.380,00	341.523,00	51,45	17.571.358,35	2.920.021,65
COSTO DIRECTO:					83.638.363,64		83.638.363,64			83.102.181,97	10.634.171,67
Impuestos:				10.0%	8.363.636,36		8.363.636,36			5.310.218,20	1.053.417,17
TOTAL:					70.000.000,00		70.000.000,00			88.412.411,16	11.597.588,84
FALTANTE DE OBRA											11.597.588,84

Para la revisión del mencionado contrato se contó con el acompañamiento de

Arquitecto Andrés Velasco y la Ingeniera Camila Lasso de la
Secretaría de Infraestructura Municipal Pasto, el señor Carlos Zambrano
de la JAC B/El Tejar y los PU de la CCR Jhonatan Ahumada y Elizabeth
Jurado

con quién(es) una vez enterados del objeto de la visita se procede a verificar el estado actual de las obras y las cantidades realmente ejecutadas así:



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE NARIÑO
Indagación Preliminar IP-80522-2021-39273
Convenio 202754 del 13 de noviembre de 2020
Barrio El Tejar-Municipio de Pasto
ACTA DE VISITA DE OBRA

En primera instancia se explica a los asistentes que se trata de verificar las cantidades de obra ejecutadas en la cancha respecto de las que existe diferencias, para lo cual se procede a tomar las medidas correspondientes que se anexan en 2 folios. Revisados los medidos, respecto de los reflectores tanto del arquitecto Velasco como el señor Carlos Zambrano informan que efectivamente son 6 unidades de 400 w y que anexarán la factura correspondiente. Así mismo, enviarán el registro fotográfico del canchero exterior ubicada en la cámara 2 este para precisar los detalles del mismo.

Durante la diligencia personal de la Alcaldía de Pasto y el señor Zambrano explican que respecto al ítem 1 Replanteo general se difiere respecto a la cantidad ^{por la CGR} puesto que esta se determinó con el área en planta y en cambio la Alcaldía señala que se realizó una cuadrícula sobre los muros para la pintura que tiene diseño específico. Respecto al ítem 1.1. Paredes exteriores, quienes atienden la visita informan que debido a la presencia de humedad sobre el muro se empujaron la parte inferior interna de algunos muros los cuales se midieron (ver anexos)



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE NARIÑO
Indagación Preliminar IP-80522-2021-39273
Convenio 202754 del 13 de noviembre de 2020
Barrio El Tejar-Municipio de Pasto
ACTA DE VISITA DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	DIMENSIONES				Valor
			Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor	
1.1	Pañete exterior			0.0	0.84		
				28.60	0.50		
				28.60	>	Puerta	
				30.90			
				30.90	0.50		
				48.50	0.59		
				61.80	0.64		
				61.80	2.91	Puerta	
				63.30	2.91		
				63.30	0.73		
				70.90	0.68		
1.1	Pañete exterior			72.40	0.30		
—	Puerta Salón Comunal			2.77	Ancho		
	Cra. 6ª			2.55	Alto		
1.1	Pañete interior Cra. 6			14.63	0.85		
1.1	Pañete interior frente pasadizo			16.85	0.86		
1.1	Pañete interior mercado 1			30.00	0.81		
1.1	Pañete interior mercado 2			15.06	0.89		
2.1	Cerramiento sector			Ancho	Alto		
	oriente (lado parqueo)			24.78	3.10		
2.1	Cerramiento Cra 6			Ancho	Alto		
	Cerramiento pasadizo			10.76	2.70		
				Ancho	Alto		
				30.15	3.02		
				41.30m	Alto		
					2.74 → 15.85		



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE NARIÑO
Indagación Preliminar IP-80522-2021-39273
Convenio 202754 del 13 de noviembre de 2020
Barrio El Tejar-Municipio de Pasto
ACTA DE VISITA DE OBRA

①

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	DIMENSIONES				Valor
			Cantidad	Longitud	Ancho Alto	Espesor	
11	Pañete exterior			16.70	2.20	Tramo 1	Cana interna sin Pintar.
				16.70	2.75		
				31	2.35		
				51.90	2.40		
				86.70	2.40		
				95.40	2.46		
				110.20	2.62		
				14.20	2.54		
				30.40	2.60		
				44.80	2.77		
				59.40	2.98	Tramo 2	
				5.40	2.43		
				20.10	2.77		
				40.40	2.70		
				60.50	2.64		
				73.10	2.34		
				73.10	0.90		
				75.60	1.00		
				85.50	0.81		
				85.50	1.01		
11	Pañete exterior			95.70	1.81	Pera	T.3
	Puerta lateral mercado			95.70	3.15		
				99.50	3.17		
11	Pañete exterior			99.50	1.00	Pera	
				114.70	0.70		



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE NARIÑO
Indagación Preliminar IP-80522-2021-39273
Convenio 202754 del 13 de noviembre de 2020
Barrio El Tejar-Municipio de Pasto
ACTA DE VISITA DE OBRA

Quien atendió la diligencia:

ANDRES DARIO VELASCO C.

Nombre Andrés Velasco C.

Cédula BO-12.222

Cargo Profesional Universitario

Camila Camillo Asso D

Nombre Camila Asso delgado

Cédula 1.085.813.610

Cargo Contratista SUM

Nombre Carlos Zambrano

Cédula 2149614

Cargo Presidente

Nombre

Cédula

Cargo

Por parte de la Contraloría General de la Republica

JONATHAN DAVID AHUMADA CAICEDO

Profesional Universitario

Gerencia Departamental Colegiada de Nariño

Elizabeth Jorda Heb


Nombre Elizabeth Jorda Heb

Cédula 39396000

Cargo Profesional Universitario.

PRUEBA 6

PRUEBA 6

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA FINAL			
	VIGENCIA 03-Oct-18	VERSIÓN 05	CODIGO IN-F-030	CONSECUTIVO

CC IVENIO DE:	SOLIDARIO
No CONVENIO	20202754
Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto 1 de diciembre de 2020
Contratante / Parte 1:	MUNICIPIO DE PASTO NIT: 891280000-3
Representante legal:	Dr. VICENTE GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA
Contratista / Parte 2:	JUNTA DE ACCION COMUNAL TEJAR RL. CARLOS ANTONIO ZAMBRANIO BURGOS
Identificación:	NIT: 900259941-3
Objeto:	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el MUNICIPIO DE PASTO y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO, para la "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO", vigencia 2020
Valor:	SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 70.000.000)
Plazo:	30 días calendarios contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Fecha de finalización:	30 de diciembre de 2020
Registro de compromiso presupuestal:	No. 2020003352
Resolución de aprobación de pólizas:	No. 4379 del 25 de noviembre de 2020
Interventor/Supervisor:	Ing. Nilsa Roció Villota Rosero
Identificación:	34.317.940
Dependencia:	Secretaría de Infraestructura y Valorización
Cargo:	Secretaría de Infraestructura y Valorización

En la presente fecha 1 de diciembre de 2020, en la Secretaría de Infraestructura y Valorización, se reunieron: Ing. Nilsa Roció Villota Rosero en calidad de supervisora y la Junta de acción comunal tejara RL. Carlos Antonio Zambrano Burgos en calidad de controlista de obra, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final del convenio solidario No. 20202754, de acuerdo al cuadro anexo el cual es parte integral de la presente acta, debidamente aprobada por la supervisión.

Según lo estipulado en el convenio, la supervisión, establece que la Junta de Acción comunal del Barrio el tejara de la comuna 4 del municipio de Pasto ha cumplido con lo pactado, y autoriza que el Municipio reciba a satisfacción el proyecto, con el acta de recibo final adjunta.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:

Ing. NILSA ROCÍO VILLOTA ROSERO
Secretaría de Infraestructura y Valorización
Supervisora

JUNTA DE ACCION COMUNAL TEJAR
R. CARLOS ANTONIO ZAMBRANIO BURGOS
Controlista

Elaborado por: [Firma]

Revisado por: [Firma]

Revisó: Oficina Jurídica

Auxiliar Contable de Terceros - Entre Fechas 01/01/2020 y 31/12/2020


Entre Terceros y

Nombre: JAC DEL BARRIO EL TEJAR DEL MCPIO DE PASTO

Nombre: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VDA EL ROSARIO+++++

Nombre: INTEGRAL Y ASOCIADOS SAS

Suma	32,320,373.16	570,320,268.00	32,320,373.16
------	---------------	----------------	---------------


 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL			
	VIGENCIA 03-Oct-18	VERSIÓN 05	CODIGO IN-F-029	PAGINA 1 de 3

CONVENIO DE:	SOLIDARIO
No.CONVENIO	20202754
Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto 1 de diciembre de 2020
Contratante / Parte 1:	MUNICIPIO DE PASTO NIT: 891280000-3
Representante legal:	Dr. VICENTE GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA
Contratista /Parte 2:	JUNTA DE ACCION COMUNAL TEJAR RL. CARLOS ANTONIO ZAMBRANO BURGOS
Identificación:	NIT: 900259941-3
Objeto:	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el MUNICIPIO DE PASTO y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO, para la "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO", vigencia 2020
Valor:	SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 70.000.000)
Plazo:	30 días calendarios contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Fecha de finalización:	30 de diciembre de 2020
Registro de compromiso presupuestal:	No. 2020003352
Resolución de aprobación de pólizas:	No. 4379 del 25 de noviembre de 2020
Interventor/Supervisor :	Ing. Nilsa Roció Villota Rosero
Identificación:	34.317.940
Dependencia:	Secretaría de Infraestructura y Valorización
Cargo:	Secretaría de Infraestructura y Valorización

En la presente fecha 30 de diciembre de 2021, en la Secretaría de Infraestructura y Valorización, se reunieron: Ing. Nilsa Roció Villota Rosero en calidad de supervisora y la junta de acción comunal tejara RL. Carlos Antonio Zambrano Burgos en calidad de contratista de obra, con el fin de suscribir con el fin de realizar de común acuerdo la liquidación del contrato de obra 20202774 conforme a las siguientes consideraciones:

Primera: Que a la diligencia se hace presente las personas suscritas en la presente Acta.

Segunda: Que El Municipio de Pasto y la junta de acción comunal tejara RL. Carlos Antonio Zambrano Burgos en calidad de contratista de obra, celebraron el día 30

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL			
VIGENCIA 03-Oct-18	VERSIÓN 05	CODIGO IN-F-029	PAGINA 2 de 3	

Cuarta: Que la Ley 80 de 1993, en su artículo 60, prevé la liquidación de los contratos en relación con circunstancias similares a la del objeto contractual pactado.

Quinta: Que en la cláusula veinticuatro del contrato No. 20202754, se estipuló: "la Liquidación del contrato: El presente contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto o más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes, contados a partir de la fecha de la extinción del plazo de ejecución del contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación. También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos o que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y Transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al Contratista la extensión o ampliación, si es el caso, de la garantía del contrato para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del mismo."

Sexta: Balance financiero del contrato:

I. Valor contratado:

VALOR CONTRATO:	\$ 70.000.000,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	\$ 0.00
VALOR TOTAL CONTRATADO:	\$ 70.000.000,00

II. Valor anticipo: \$ 63.105.817,68

III. Valor final ejecutado:

VALOR CONTRATO INICIAL:	\$ 70.000.000,00
VALOR EJEUTADO CONTRATO ADICIONAL:	\$ 0.00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$ 70.000.000,00


SON: Ciento Cincuenta y Siete Millones Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Cincuenta y Nueve Pesos 64/100

IV. Pagos efectuados al contratista:

VALOR ANTICIPO:	\$ 35.000.000,00
VALOR ACTA FINAL:	\$ 70.000.000,00
SUMA TOTAL	\$ 70.000.000,00

V. Amortizaciones al anticipo:

AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL:	\$ 70.000.000,00
-----------------------------------	------------------


 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL			
VIGENCIA 03-Oct-18	VERSIÓN 05	CODIGO IN-F-029	PAGINA 3 de 3	

Frente a este informe otorgado por parte de El Municipio de Pasto el respectivo visto bueno, y estando la parte Contratante de acuerdo se pone en consideración del Contratista, junta de acción comunal tejar RL. Carlos Antonio Zambrano Burgos, quien luego de estudiar el contenido de lo expuesto en la presente manifiesta que: El balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollarán efectivamente por las partes con base en la suscripción de presente acuerdo.

Séptima: De conformidad con lo anterior las partes contratantes imparten su aprobación a la presente liquidación.

Octava: En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el contrato de obra No. 20202754, cuyo objeto fue: "Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el MUNICIPIO DE PASTO y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO, para la "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO", vigencia 2020", declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.


Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:


JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TEJAR
 RL. CARLOS ANTONIO ZAMBRANO BURGOS
 Contratista


Ing. NILSA ROCÍO VILLOTA ROSERO
 Secretaria de Infraestructura y Valorización


 Elaboró: Arq. Andrés Velasco C.
 Profesional Universitario S.I.V.M

Revisó: Oficina Jurídica

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA FINAL			
	VIGENCIA 03-Oct-18	VERSIÓN 05	CODIGO IN-F-030	CONSECUTIVO

CONVENIO DE:	SOLIDARIO
No. CONVENIO	20202754
Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto 1 de diciembre de 2020
Contratante / Parte 1:	MUNICIPIO DE PASTO NIT: 891280000-3
Representante legal:	Dr. VICENTE GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA
Contratista /Parte 2:	JUNTA DE ACCION COMUNAL TEJAR RL. CARLOS ANTONIO ZAMBRANIO BURGOS
Identificación:	NIT: 900259941-3
Objeto:	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el MUNICIPIO DE PASTO y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO, para la "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO", vigencia 2020
Valor:	SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 70.000.000)
Plazo:	30 días calendarios contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Fecha de finalización:	30 de diciembre de 2020
Registro de compromiso presupuestal:	No. 2020003352
Resolución de aprobación de pólizas:	No. 4379 del 25 de noviembre de 2020
Interventor/Supervisor:	Ing. Nilsa Roció Villota Rosero
Identificación:	34.317.940
Dependencia:	Secretaría de Infraestructura y Valorización
Cargo:	Secretaría de Infraestructura y Valorización

En la presente fecha 1 de diciembre de 2020, en la Secretaría de Infraestructura y Valorización, se reunieron: Ing. Nilsa Roció Villota Rosero en calidad de supervisora y la junta de acción comunal tejara RL. Carlos Antonio Zambrano Burgos en calidad de contratista de obra, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final del convenio solidario No. 20202754, de acuerdo al cuadro anexo el cual es parte integral de la presente acta, debidamente aprobada por la supervisión.

Según lo estipulado en el convenio, la supervisión, establece que la Junta de Acción comunal del Barrio el tejara de la comuna 4 del municipio de Pasto ha cumplido con lo pactado, y autoriza que el Municipio reciba a satisfacción el proyecto, con el acta de recibo final adjunta.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:

Ing. NILSA ROCÍO VILLOTA ROSERO
Secretaría de Infraestructura y Valorización
Supervisora

JUNTA DE ACCION COMUNAL TEJAR
R. CARLOS ANTONIO ZAMBRANIO BURGOS
Contratista

Elaboró: Arq. Andrés Felipe Cedeño
Profesional Universitario

Revisó: Oficina jurídica

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2020 y 31/12/2020

[illegible]

Tercero: 900259941
Sucursal: 001
Nombre: JAC DEL BARRIO EL TEJAR DEL MCPIO DE PASTO

Fecha	Tipo	Número	Gen.	Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
31/12/2020	CDC	2020000114	18		29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFAZ DE ALMACEN AJUSTES Y RECLAFICACIONES POR REVISION DE DE PARTIDAS- AJUSTE POR PAGO PREDIAL AÑO 2019.	0.00	70,000,000.00	0.000
31/12/2020	COM	2020012557	18		29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20202754 UNICO PAGO ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES	70,000,000.00	0.00	70,000,000.000

Tercero: 900390449 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VDA EL ROSARIO+++++

Fecha	Tipo	Número	Cen.	Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
31/12/2020	ALM	2020120031	18		29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	69,297,383.88	0.00
31/12/2020	COM	2020012571	18		29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CYAN 20201962 PAGO FINAL AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO CON	69,297,383.88	0.00	69,297,383.88

Tercero: 900391165 **Sucursal:** 001 **Nombre:** INTEGRRA Y ASOCIADOS SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen.	Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
01/04/2020	ALM	2020040001	19		29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFAZ DE ALMACENA CONTABILIDAD DE LA FECHA: 01/04/2020	0.00	513,860,000.00	0.00
11/06/2020	ALM	2020060011	19		29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFAZ DE ALMACENA CONTABILIDAD DE LA FECHA: 11/06/2020	0.00	22,520,000.00	0.00
24/07/2020	COS	2020000770	19		29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	PAGO CTO 20193204 COMPAVENTA E INS. MOBILIARIO H1BZENE-2JUN2020	176,111,000.00	0.00	0.00
24/07/2020	COS	2020000770	19		29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	PAGO CTO 20193204 COMPAVENTA E INS. MOBILIARIO H1BZENE-2JUN2020	22,520,000.00	0.00	0.00
24/07/2020	COS	2020000770	19		29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	PAGO CTO 20193204 COMPAVENTA E INS. MOBILIARIO H1BZENE-2JUN2020	275,749,000.00	0.00	0.00
24/07/2020	COS	2020000770	19		29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	PAGO CTO 20193204 COMPAVENTA E INS. MOBILIARIO H1BZENE-2JUN2020	62,000,000.00	0.00	0.00
20/11/2020	ALM	2020110020	18		29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20202701 UNICO PAGO SUMINISTRO DE 400 ANCHETAS DE VIVERES Y	0.00	33,940,268.00	0.00
25/11/2020	COM	20200009749	18		29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFAZ DE ALMACEN AJUSTES Y RECLASIFICACIONES POR REVISION DE DE PARTIDAS- AJUSTE POR PAGO PREDIAL AÑO 2019.	33,940,260.00	0.00	32,320,373.16
31/12/2020	CDC	2020000114	18		29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		8.00	0.00	0.00

51

61117-20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853

09-670,278-00

Suma: 320,570,320,268.00

570,320,268.00

32,320,373.16
