



PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN

1520/0686-2022

San Juan de Pasto, 26 de agosto de 2022

Contraloría General de la República :: SGD 06-09-2022 16:51
Al Contestar Cite Este No.: 2022ER0144863 Fol:1 Anex:1 FA:24
ORIGEN NILSA ROCIO VILLOTA ROSERO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
VALORIZACION- PASTO
DESTINO 80523-GRUPO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE NARIÑO / YOLANDA ELIZABETH
JURADO MELO
ASUNTO REMISION INFORME PRF 80522-2021-39273
OBS SE ANEXA INFORME
2022ER0144863



Señores

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE NARIÑO

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Calle 18 A No. 25 – 64 Pasaje Corazón de Jesús

San Juan de Pasto

Asunto: Remisión informe de Proceso de responsabilidad fiscal PRF
80522-2021-39273.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito remitir informe técnico realizado con respecto a las actividades ejecutadas en el convenio número 20202754, cuyo objeto es: ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO TEJAR.

Agradeciendo su atención, sin otro particular, se suscribe de ustedes.

Atentamente,

ING. NILSA VILLOTA ROSERO
Secretaría de Infraestructura y Valorización

Proyectó:
Arq. Andrés Velasco
Profesional Universitario SIVM

Alcaldía de Pasto - NIT: 891280000-3
Sitio web: www.pasto.gov.co - Correo: contactenos@pasto.gov.co
Teléfono: +57(2) 7244326, Conmutador Principal: +57(2) 7244326 - Ext: 1001
CAM Anganoy los Rosales II

OBJETO: Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el MUNICIPIO DE PASTO y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO, para la "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO", vigencia 2020

CONVENIO No: 202754 CONTRATISTA/PARTE 2: JAC TEJAR PRF - 80522-2021-39273

Código	Descripción	UN	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
1	PRELIMINARES				
1	Replanteo general (area menor 1000 m2)	m2	\$ 946,00	2.949,00	\$ 2.789.754,00

HALLAZGO

"1. Replanteo general (área menor 1000m2)
(...)
En la visita fiscal se procedió a dimensionar las cantidades realmente ejecutadas del ítem, por parte de los funcionarios de la alcaldía, se mencionó que sobre el muro exterior de la calle 18 A se realizó replanteo para el diseño específico del muro (...)
Por lo anterior se valida el ajuste de dicha cantidad a una altura promedio de 2.72 metros en la longitud del muro sobre la calle 18 A, y para los demás se tendrá en cuenta el perímetro en un ancho de 2 m puesto que las actividades ejecutadas con el convenio fueron ejecutadas en el perímetro del cerramiento como se muestra en los cálculos del Anexo 1. Cálculo de cantidades de obra convenio 202754, Cancha de Futbol barrio el Tejar, por lo anterior se estableció que el área de este ítem realmente ejecutada corresponde a 815,57 m2.

OBSERVACIONES

En cuanto el ítem de replanteo en la visita que se realizó el 30 del mes de marzo de 2022 se pudo establecer con las mediciones registradas en el acta en mención que la cantidad de intervención es de 3719 m2 la cual es mayor a la establecida en el acta final. Se anexa cuadro de cantidades



REGISTRO FOTOFRÁFICO

ANTES



ACTUAL



Código	Descripción	UN	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
1,1	Pañete exterior allanado proporcion de la mezcla 1:4 espesor 1:5 cm	m2	\$ 18.428,00	649,00	\$ 11.959.772,00
HALLAZGO	"1,1 Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm", en cuantías de \$2.018.226,67 y \$3.610.544,60, respectivamente, pues se ejecutaron en menores metros cuadrados a los pactados por las partes en el Convenio solidario 20202754.				
OBSERVACIONES	En cuanto el ítem de replanteo en la visita que se realizó el 30 del mes de marzo de 2022 se pudo establecer con las mediciones registradas en el acta en mención que la cantidad de intervención Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm es de 3719 m2 la cual es mayor a la establecida en el acta final. Se anexa cuadro de cantidades				
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
ANTES					
ACTUAL					

Código	Descripción	UN	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
1,1	Pintura para reja metálica con anticorrosivo y pintura color azul 2 manos	m2	\$ 18.621,72	150,00	\$ 2.793.257,00
HALLAZGO	"Pintura para reja metálica con anticorrosivo y pintura color azul 2 manos" y "Cerramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3" @6mts, marco en ángulo de 2½" * 3/16, refuerzo interno en varilla cuadrada de ½ cada 20 cm, H=3,0 m del módulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte, incluye cimentación en zapatas" y producto de la operación concluyó que los faltantes de obra totalizan \$4.418.056,96 (\$4.016.415,42 costo directo + \$401.641,54 impuestos 10%).				
OBSERVACIONES	En cuanto el ítem de Pintura para reja metálica con anticorrosivo y pintura color azul 2 manos en la visita que se realizó el 30 del mes de marzo de 2022 se pudo establecer con las mediciones registradas en el acta en mención que la cantidad de intervención del ítem en mención es de 3719 m2 la cual es mayor a la establecida en el acta final. Se anexa cuadro de cantidades				



REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES




ACTUAL



Código	Descripción	UN	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
2,1	Cerramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3" @ 6mts, marco en ángulo de 2 1/2" * 3/16, refuerzo interno en barilla cuadrada de 1/2 cada ,20 cm , H= 3.0 m del modulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte. incluye cimentacion en zapatas	ml	\$ 341.523,00	60,00	\$ 20.491.380,00
HALLAZGO	"Pintura para reja metálica con anticorrosivo y pintura color azul 2 manos" y "Cerramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3" @6mts, marco en ángulo de 2½" * 3/16, refuerzo interno en varilla cuadrada de ½ cada 20 cm, H=3.0 m del módulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte, incluye cimentación en zapatas" y producto de la operación concluyó que los faltantes de obra totalizan \$4.418.056,96 (\$4.016.415,42 costo directo + \$401.641,54 impuestos 10%).				
OBSERVACIONES	En cuanto el ítem de Cerramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3" @ 6mts, marco en ángulo de 2 1/2" * 3/16, refuerzo interno en barilla cuadrada de 1/2 cada ,20 cm , H= 3.0 m del modulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte. incluye cimentacion en zapatas en la visita que se realizó el 30 del mes de marzo de 2022 se pudo establecer con las mediciones registradas en el acta en mencion que lacantidad de intervencion es 81,54 m2 de lo registrado en el acta final. Se anexa cuadro de cantidades				
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
ANTES					
ACTUAL					



 ALCALDIA DE PASTO	NOMBRE DEL FORMATO	PROCESO INFRAESTRUCTURA				PÁGINA			
	VIGENCIA	VERSION	CÓDIGO						
	03-Oct-18	02	IIF-F-013						
CONVENIONo.: 202754	OBJETO:	VISITA CONTRALORIA							
CONTRATISTA/PARTE 2: JAC TEJAR		FECHA: 30 / 03 /2022							
CANTIDADES DE OBRA VISITAS									
DESCRIPCION GRAFICA	ITEM	DESCRIPCION	UN		DIMENSIONES		Valor		
					Cantid	Longitud	Ancho	Espesor	
PAÑETE	1.1	Pañete exterior fachadas			0,00	0,84			0,00
					28,60	0,50			14,30
		PUERTA			28,60				0,00
		PUERTA			30,90				0,00
					30,90	0,50			15,45
					48,50	0,59			28,62
					61,80	0,64			39,55
TRAMO 4					61,80	2,91			179,84
					63,30	2,91			184,20
					63,30	0,73			46,21
					70,90	0,68			48,21
					72,40	0,30			21,72
		ANCHO			2,77				0,00
		ALTO			2,55				0,00
SALON CULTURAL - CR 6g	1.1	pañete exterior			72,40	0,30			21,72
		ANCHO			2,77				0,00
		ALTO			2,55				0,00
									0,00
		Pañete interior cr 6			14,63	0,85			12,44
		Pañete interior frente al pescado			16,85	0,56			9,44
		Pañete interior frente al mercado 1			30,00	0,81			24,30
		Pañete interior frente al mercado 2			15,06	0,89			13,40
		Pañete exterior - interno							659,39
		Tramo 1			16,70	2,20			36,74
		Tramo 1			16,70	2,75			45,93
		Tramo 1			31,00	2,35			72,85
		Tramo 1			51,90	2,40			124,56
		Tramo 1			66,70	2,40			160,08
		Tramo 1			95,40	2,46			234,68
		Tramo 1			110,20	2,62			288,72
		Tramo 2			14,20	2,54			36,07
		Tramo 2			30,40	2,60			79,04
		Tramo 2			44,80	2,77			124,10
		Tramo 2			59,40	2,98			177,01
		Tramo donde se ubica Reja			5,40	2,43			13,12
		Tramo donde se ubica Reja			20,10	2,77			55,68
		Tramo donde se ubica Reja			40,40	2,70			109,08
		Tramo donde se ubica Reja			60,50	2,64			159,72
		Tramo donde se ubica Reja			73,10	2,34			171,05
		Tramo donde se ubica Reja			73,10	0,90			65,79
		Tramo donde se ubica Reja			75,60	1,00			75,60
		Tramo donde se ubica Reja			85,50	0,81			69,26
		Tramo donde se ubica Reja			85,50	1,01			86,36
		Tramo donde se ubica Reja			95,70	0,81			77,52
		Pañete lateral mercado			95,70	3,15			301,46
		Pañete lateral mercado			99,50	3,17			315,42
		Pañete lateral mercado			99,50	1,00			99,50
		Pañete lateral mercado			114,70	0,70			80,29
									3059,61

81.54



80523

Contraloría General de la República :: SGD 24-06-2022 10:19
Al Contestar Cite Este No.: 2022EE0109122 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 80523-GRUPO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE NARIÑO / YOLANDA ELIZABETH
JURADO MELO
DESTINO GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA / ALCALDIA DE PASTO
ASUNTO COMUNICACIÓN DECISION IP-80522-2021-39273
OBS

San Juan de Pasto,

2022EE0109122



Doctor:
GERMÁN CHAMORRO DE LA ROSA
Alcalde Municipal
Carrera 28 No. 16 -18 San Andrés
contactenos@pasto.gov.co
Ciudad.-

Asunto: Indagación Preliminar Fiscal IP-80522-2021-39273
Comunicación decisión

Respetado señor Alcalde.

En atención a lo decidido por los Directivos de la Gerencia Departamental Colegiada de Nariño de la Contraloría General de la República en el Auto No. 087 de 23 de junio de 2022, de manera atenta me permito informar a Usted que se ordenó el cierre de la indagación preliminar del asunto ordenando el inicio de un Proceso de Responsabilidad Fiscal por encontrar la existencia de un daño patrimonial por faltantes de obra cuantificado en \$4.418.057.

Sea de señalar que la actuación pre procesal fiscal se adelantó para indagar las presuntas irregularidades en la ejecución del Convenio 20202754 suscrito con la Junta de Acción del Barrio El Tejar para mejoramiento de las instalaciones de la cancha de fútbol del Barrio El Tejar de esta ciudad.

Agradezco su atención.

Cordialmente,


ELIZABETH JURADO MELO.

Profesional Universitario sustanciadora
Gerencia Departamental Colegiada Nariño

Archivo: TRD-80522-076 cuaderno principal



PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN

MUNICIPIO DE PASTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN



CONVENIO DE OBRA No. 20202754

"Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el MUNICIPIO DE PASTO y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO, para la "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO", vigencia 2020"

Julio 2022



PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN

Contraloría General de la Republica
ELIZABETH JURADO MELO
Profesional Universitario sustanciadora
Gerencia Departamental Colegiada Nariño

Asunto: Indagación preliminar Fiscal IP 80522-2021-39273

1. DATOS DEL CONTRATO

No Contrato: 20202754

Fecha Contrato: 30 de diciembre de 2020

Valor Contrato: \$ (70.000.000)

Objeto:

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el MUNICIPIO DE PASTO y **LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO**, para la "ADECUACION Y MEJORAMIENTO CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO ATAHUALPA DE LA COMUNA 2 DEL MUNICIPIO DE PASTO", vigencia 2020.

Plazo: Hasta el 30 de diciembre de 2020.

Contratista: JAC Barrio Tejar

La Secretaria de Infraestructura y Valorización realiza la verificación de cantidades realizadas el día 30 de marzo de 2022 en la VISITA ESPECIAL a las obras ejecutadas para la obra de "ADECUACION Y MEJORAMIENTO CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO ATAHUALPA DE LA COMUNA 2 DEL MUNICIPIO DE PASTO", vigencia 2020. Verificación de los ítems

1.1 Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm.

Las cantidades ejecutadas referente a este ítem 1.1 se encuentran en el documento anexo en el cual se puede evidenciar que es mayor a la contratada y a la referenciada en los valores ejecutados 426 relacionada por la Contraloría General de la Republica.

2.1 Cerramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3" @ 6mts, marco en ángulo de 2 1/2" *3/16, refuerzo interno en varilla cuadrada de 1/2 cada ,20 cm , H= 3.0 m.

Las cantidades ejecutadas referente a este ítem 2.1 se encuentran en el documento anexo en el cual se puede evidenciar que es mayor a la contratada y a la referenciada en los valores ejecutados 51.45 relacionada por la Contraloría General de la Republica

NILSA VILLOTA ROSERO

Secretaria de Infraestructura y Valorizació

En el municipio de Pasto, a los treinta (30) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022), en cumplimiento de la VISITA ESPECIAL a las obras ejecutadas para el mejoramiento de la cancha de fútbol del Barrio El Tejar de la Indagación Preliminar IP-80522-2021-39273, apertura da mediante auto No. 214 del 29 de diciembre de 2021 por la Gerencia Departamental Colegiada de Nariño, se procede a realizar visitas a las obras que ejecutaron en el marco del convenio 202754 del 13 de noviembre de 2020 por valor de Setenta Millones de Pesos (\$70.000.000,00), cuyo objeto fue "Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros entre el MUNICIPIO DE PASTO y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO, para la "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO" vigencia 2020", en el cual se estableció el siguiente presupuesto de obra teniendo en cuenta cantidades contratadas y valores actualizados con ítems no previstos acorde a la información allegada por el Municipio de Pasto así:

N.	DESCRIPCIÓN	VALORES CONTRATADOS				VALORES ACTUALIZADOS		VALORES EJECUTADOS			
		UN	CANTID	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANTID	VR. PARCIAL	VR. UNITAR CONTRALORIA	CANTID	VR. PARCIAL	DIFERENCIA
1	Replanteo general (área menor 1000m2).	M2	7.510,00	946,00	7.104.460,00	2.049,00	2.789.754,00	946,00	678,00	641.388,00	2.148.368,00
1.1	Pavimento exterior allanado proporción de la malla 1:4 espesor 15 cm	M2	555,00	18.478,00	10.227.540,00	649,00	11.859.772,00	18.428,00	426,00	7.850.328,00	4.108.444,00
1.2	Pintura vinilo tipo 1 interiores y exteriores 3 manos	M2	1.850,00	9.382,00	17.356.700,00	2.100,00	19.702.200,00	9.382,00	2.100,00	19.702.200,00	-
1.3	Cerramiento de protección e impacto en tubo pesado estructural 3" x 3/16, marco en ángulo de 2 1/2" x 3/16, refuerzo en ángulo de 1 1/2" x 3/16 y malla estabonada cul 10 S, H= 3.0 m pintado con anticorrosivo y pintura esmalte	ML	84,76	341.523,00	28.947.663,64	-	0,00	341.523,00	-	-	-
2	Ítems no previstos										
	refletores iluminación cancha de fútbol tipo led	und	-	400.000,00	-	6,00	2.400.000,00	116.667,00	3,00	350.001,00	2.049.999,00
	Red para luminaria led incluye material	gl	-	3.500.000,00	-	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1,00	3.500.000,00	-
	Pintura para rejas metálica con anticorrosivo y pintura color azul 2 manos	M2	-	18.621,72	-	150,00	2.793.257,84	18.621,72	187,25	3.486.918,62	- 693.658,98
2.1	Cerramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3" x 3/16, marco en ángulo de 2 1/2" x 3/16, refuerzo interno en banilla cuadrada de 1/2" cada 20 cm, H= 3.0 m del modulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte incluye cimentación en zapatas	ML	-	341.523,00	-	60,0000	20.491.380,00	341.523,00	51,45	17.571.358,35	2.920.021,65
COSTO DIRECTO:					63.636.363,64		63.636.363,64		53.102.191,97	10.534.171,67	
Impuestos:					6.363.636,36		6.363.636,36		5.310.219,20	1.053.417,17	
TOTAL:					70.000.000,00		70.000.000,00		58.412.411,18	11.587.588,84	
FALTANTE DE OBRA											11.587.588,84

Para la revisión del mencionado contrato se contó con el acompañamiento del

Arquitecto Andrés Velasco y la Ingeniera Camila Lasso de la
Secretaría de Infraestructura Municipal Pasto, el señor Carlos Zambrano
de la JAC B/El Tejar y los PU de la C6R Jhonatan Ahumada y Elizabeth
Jurado

con quién(es) una vez enterados del objeto de la visita se procede a verificar el estado actual de las obras y las cantidades realmente ejecutadas así:



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE NARIÑO
Indagación Preliminar IP-80522-2021-39273
Convenio 202754 del 13 de noviembre de 2020
Barrio El Tejar-Municipio de Pasto
ACTA DE VISITA DE OBRA

En primera instancia se explica a los asistentes que se trata de verificar las cantidades de obra ejecutadas en la cancha respecto de las que existe diferencias, para lo cual se procede a tomar las medidas correspondientes que se anexan en 2 folios. Revisados los medidas, respecto de los reflectores tanto el arquitecto Velasco como el señor Carlos Zambrano informan que efectivamente son 6 unidades de 400 w y que anexarán la factura correspondiente. Asimismo, enviarán el registro fotográfico del canchero exterior ubicada en la cancha 2 este para precurar los detalles del mismo.

Durante la diligencia personal de la Alcaldía de Pasto y el señor Zambrano explican que respecto al ítem 1 Replanteo general se difiere respecto a la cantidad puesto que esta se determinó ^{por la CGR} con el área en planta y en cambio la Alcaldía señala que se realizó una cuadrícula sobre los muros para la pintura que tiene diseño específico. Respecto al ítem 1.1 pintura exterior, quienes atienden la visita informan que debido a la presencia de humedad sobre el muro se empañó la parte inferior interna de algunos muros los cuales se midieron (ver anexos)



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE NARIÑO
Indagación Preliminar IP-80522-2021-39273
Convenio 202754 del 13 de noviembre de 2020
Barrio El Tejar-Municipio de Pasto
ACTA DE VISITA DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	DIMENSIONES				Valor
			Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor	
1.1	Pañete exterior			0.0	0.84		
				28.60	0.50		
				28.60	>	Puerta	
				30.90			
				30.90	0.50		
				48.50	0.59		
				61.80	0.64		
				61.80	2.91	Puerta	
				63.30	2.91		
				63.30	0.73		
				70.90	0.68		
1.1	Pañete exterior			72.40	0.30		
—	Puerta Salón Comunal			2.77	Ancho		
	Cra. 6ª			2.55	Alto		
1.1	Pañete interior Cra. 6			14.63	0.85		
1.1	Pañete interior front pasadizo			16.85	0.86		
1.1	Pañete interior mercado 1			30.00	0.81		
1.1	Pañete interior mercado 2			15.06	0.89		
2.1	Cerramiento sector oriente (lado parqueo)			Ancho 24.78	Alto 3.10		
2.1	Cerramiento Cra. 6			Ancho 10.76	Alto 2.70		
	Cerramiento pasadizo			Ancho 30.15	Alto 3.02		
				14.30m	Alto 2.74 → 15.85		



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE NARIÑO
Indagación Preliminar IP-80522-2021-39273
Convenio 202754 del 13 de noviembre de 2020
Barrio El Tejar-Municipio de Pasto
ACTA DE VISITA DE OBRA

①

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	DIMENSIONES				Valor
			Cantidad	Longitud	Ancho Alto	Espesor	
11	Pañete exterior			16.70	2.20	Tramo 1	Carra interna sin pintar.
				16.70	2.75		
			31	2.35			
			51.90	2.40			
			66.70	2.40			
			95.40	2.46			
			110.20	2.62			
			14.20	2.54			
			30.40	2.60			
			44.80	2.77			
			59.40	2.98		Tramo 2	
			5.40	2.43			
			20.10	2.77			
			40.40	2.70			
			60.50	2.64			
			73.10	2.34			
			73.10	0.90			
			75.60	1.00			
			85.50	0.81			
			85.50	1.01			
11	Pañete exterior		95.70	0.81		t.3	
	Puerto. lateral mercado.		95.70	3.15			
			99.50	3.17		Pepa	
11	Pañete exterior		99.50	1.00			
			114.70	0.70			



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE NARIÑO
Indagación Preliminar IP-80522-2021-39273
Convenio 202754 del 13 de noviembre de 2020
Barrio El Tejar-Municipio de Pasto
ACTA DE VISITA DE OBRA

Quien atendió la diligencia:

Andrés Darío Velasco C.

Nombre Andrés Velasco C.

Cédula B012.222

Cargo Profesional Universitario

Camila Camillo Casso D

Nombre Camila Casso Delgado

Cédula 1.085.313.610

Cargo Contarista SUM

Nombre Carlos Zambrano

Cédula 12149 614

Cargo Presidente

Nombre

Cédula

Cargo

Por parte de la Contraloría General de la Republica

JONATHAN DAVID AHUMADA CAICEDO

Profesional Universitario

Gerencia Departamental Colegiada de Nariño

Elizabeth Jorda Heb

Nombre Elizabeth Jorda Heb

Cédula 59396 000

Cargo Profesional Universitario.



80522

San Juan de Pasto,

Contraloría General de la República :: SGD 04-03-2022 15:01
 Al Contestar Cite Este No.: 2022EE0036181 Fol:2 Anex:0 FA:0
 ORIGEN 80522-GRUPO DELEGADO DE VIGILANCIA FISCAL DE NARIÑO / YOLANDA ELIZABETH
 JURADO MELO
 DESTINO GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA / ALCALDIA DE PASTO
 ASUNTO INDAGACIÓN PRELIMINAR
 OBS IP-80522-2021-39273

2022EE0036181



Doctor:
 GERMÁN CHAMORRO DE LA ROSA
 Alcalde Municipal
 Carrera 28 No. 16 -18 San Andrés
contactenos@pasto.gov.co
 Ciudad.-


Asunto: Indagación Preliminar Fiscal IP-80522-2021-39273
 Requerimiento información – Solicitud SEGUNDA VEZ

Respetado señor Alcalde.

Mediante oficio 2022EE0022711 de 14 de febrero de 2022 enviado al correo electrónico contactenos@pasto.gov.co, la Contraloría General de la República solicitó la siguiente información para que haga parte de la indagación preliminar del asunto¹:

- Copia del oficio 13 de diciembre de 2020 suscrito por la comunidad del Barrio El Tejar en el que solicitan la inclusión de unos nuevos ítems en el Convenio Solidario 20202754.
-
- Informe en el que especifique cuáles son las características del reflector tipo led que hace parte del Análisis de Precio Unitario que reposa en la Oficina Técnica de la Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal (potencia, watts, material, etc.).

¹ Aperturada para investigar las presuntas irregularidades en la ejecución del Convenio 20202754 Mejoramiento cancha de fútbol Barrio El Tejar.

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA				
	NOMBRE DEL FORMATO				
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA	

CÓDIGO ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD ITEM
REFLECTOR TIPO LED	Suministro e instalación de reflector tipo led	UN

I. EQUIPO						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	UNO	43.109,09	10,00	1,00	4.310,91
ANDMTUB	Andamio metálico tubular	DIA	1.200,00	12,00	0,30	72.000,00
SUB-TOTAL						4.310,91

II. MATERIALES						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
ALAM13C08K	Alambre de cobre THHN No. 12	ML	1.900,00	1,00	1,00	1.900,00
REFLECTOR	reflector tipo led	UNO	350000,00	1,00	1,00	350.000,00
ACCES173C	Accesorio codul de 1/2"	UN	680,00	1,00	1,00	680,00
SUB-TOTAL						352.580,00

III. MANO DE OERA						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA010-6	Cuadro 1-0-0	HORA	13.400,00	1,00	0,50	26.800,00
CUA010-6	Cuadro 0-1-0	HORA	11.200,00	1,00	0,59	14.309,09
SUB-TOTAL						43.109,09

IV. TRANSPORTES						
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL	
SUB-TOTAL						-

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO		400.000,00
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO		400.001,00

Habiéndose superado el término concedido (10 días), de manera atenta me permito **REQUERIR** la información para que en el término de cinco (5) días siguientes a la recepción de esta comunicación se remita lo correspondiente, *so pena* de que el incumplimiento² acarree las sanciones previstas en el artículo 83 del Decreto Ley 403 de 16 de marzo de 2020:

“1. *Multa. Consiste en la imposición del pago de una suma de dinero en moneda colombiana desde uno (1) hasta ciento cincuenta (150) salarios diarios devengados por el sancionado para la época de los hechos. En caso de los particulares la sanción se tasaré entre cinco (5) y diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*

2. *Suspensión. Consiste en la orden de separación temporal del cargo del servidor público sancionado, hasta por ciento ochenta (180) días.*”

² Dispone el artículo 78 del Decreto Ley 403 de 16 de marzo de 2020 que el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal “*propende por el debido ejercicio de la vigilancia y el control fiscal, la protección del patrimonio público y el cumplimiento de los principios constitucionales y legales del control y la gestión fiscal*”. Seguidamente, el artículo 81 enlista las conductas sancionables con el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal PASF; conductas de las que se resalta la del literal h) “*Omitir o no suministrar oportunamente las informaciones solicitadas por los órganos de control incluyendo aquellas requeridas en el procedimiento de cobro coactivo*”



La información deberá allegarse en formato digital al correo electrónico yolanda.jurado@contraloria.gov.co y en todo caso, la digitalización deberá ser completa y clara a fin de que sirva como medio de prueba en la actuación que se adelanta.

Agradezco su atención y colaboración.

Cordialmente,


ELIZABETH JURADO MELO²

Profesional Universitario sustanciadora
Gerencia Departamental Colegiada Nariño

Archivo: TRD-80522-076 cuaderno principal



PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN

MUNICIPIO DE PASTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN



CONVENIO DE OBRA No. 20202754 DE

"Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el MUNICIPIO DE PASTO y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO, para la "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO", vigencia 2020"

INFORME No. 01

Abril 2022



PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN

Contraloría General de la Republica
ELIZABETH JURADO MELO
Profesional Universitario sustanciadora
Gerencia Departamental Colegiada Nariño

Asunto: "Indagación preliminar Fiscal IP 80522-2021-39273 Requerimiento información – Solicitud Según acta de visita de Obra del 30 de Marzo 2022.

1. DATOS DEL CONTRATO

No Contrato: 20202754

Fecha Contrato: 30 de diciembre de 2020

Valor Contrato: \$ (70.000.000)

Objeto:

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el MUNICIPIO DE PASTO y **LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO**, para la "ADECUACION Y MEJORAMIENTO CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO ATAHUALPA DE LA COMUNA 2 DEL MUNICIPIO DE PASTO", vigencia 2020.

Plazo: Hasta el 30 de diciembre de 2020.

Contratista: JAC Barrio Tejar




PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL


SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN

ANEXO 10 – Registro fotográfico valla informativa


EJECUCION DE OBRA

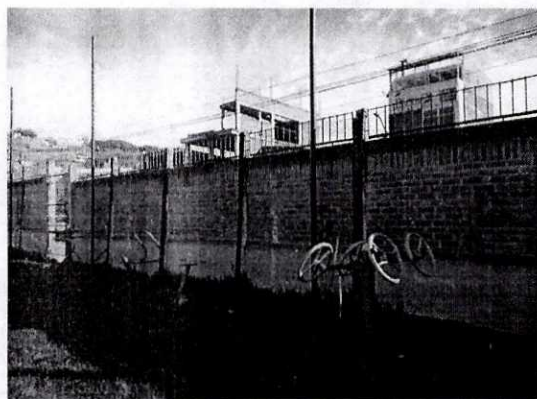

Pañete interior en diferentes zonas internas para protección del muro de la humedad.

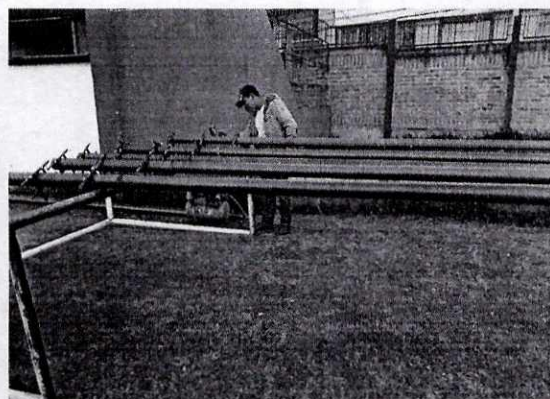

Construcción de soportes de la estructura para soporte de los módulos de impacto superiores y exteriores.

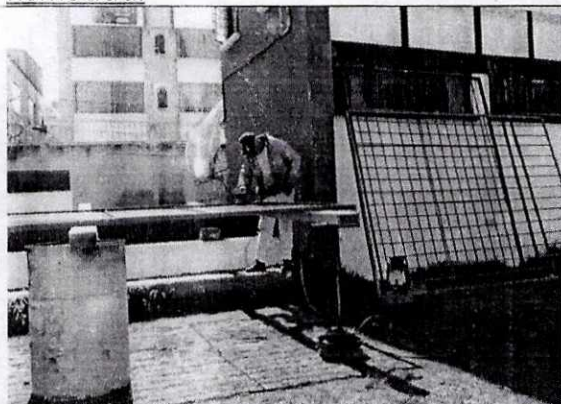

Construcción de módulos de impacto internos y externos de la zona deportiva.



Instalación de módulos en las zonas exteriores ángulo de 1"- internamente en varilla 1/2 cuadrada



PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL


SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN



Retiro de pañete en las paredes exteriores del cerramiento en mampostería causado por deterioro de agentes climáticos y por el tiempo de vida útil.



Retiro de pañete en las paredes exteriores del cerramiento en mampostería causado por deterioro de agentes climáticos y por el tiempo de vida útil.

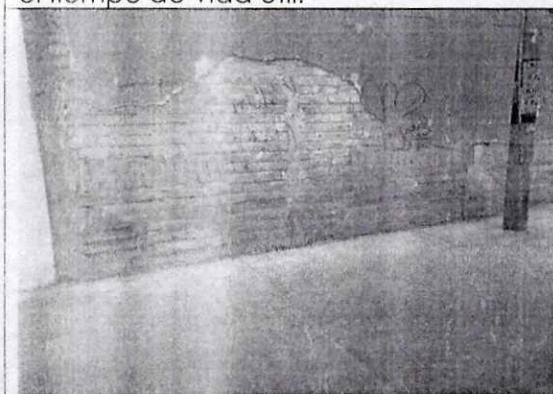

Retiro de pañete en las paredes exteriores del cerramiento en mampostería causado por deterioro de agentes climáticos y por el tiempo de vida útil.



6 unidades de Luminaria 400 w tipo led que corresponden a la especificación técnica adjunta, para la práctica deportiva nocturna y por seguridad del sector ya que se encuentra en una zona vulnerable por la inseguridad que se presenta.



PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN

Se anexan especificación técnica

CARACTERÍSTICAS DEL REFLECTOR LED - ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA DE FUTBOL
BARIO EL TEJAR

1. CÓDIGO ÍTEM	2. DESCRIPCIÓN ÍTEM
RTL	Suministro e Instalación de Reflector Tipo Led
3. UNIDAD DE MEDIDA	UND
4. DESCRIPCIÓN <ul style="list-style-type: none"> • Diseño hermético a prueba de agua. • Chasis en aluminio que garantiza la correcta disipación de calor. • Bajo consumo de energía. • Eficiente drive multivoltaje que mantiene estable la corriente en el producto. • Libre de y elementos tóxicos como el mercurio y el plomo. • No emite radiación infrarroja y ultravioleta. • 400 w • Alambre de cobre THHN N°. 12 • Accesorio Conduit de 1/2 	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN <ul style="list-style-type: none"> • Iniciar las actividades una vez la supervisión de la orden de inicio. • Cuantificar la cantidad de unidades a instalar • Programar una secuencia de actividades para la realización de la localización y replanteo de la iluminación. 	
6. TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN N/A	
7. MATERIALES <ul style="list-style-type: none"> • ALUMINIO CHASIS - CONTIENE PLASTICO EN ALGUNOS SECTORES • LUMINARIA TIPO LED 	



PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN



PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN

8. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Herramientas menores
- Andamios tubulares

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se cuantificará y pagará unidad instalada (Und) de acuerdo a las especificaciones descriptas y autorizadas por la supervisión.

El valor será el precio unitario estipulado en el contrato y su costo incluye:

- Equipos
- Mano de obra
- Otros costos directos e indirectos que el contratista estime necesarios para la realización de esta actividad.

Se anexa facturas correspondientes de 6 unidades de reflector led de 400 w

NILSA VILLOTA ROSERO

Secretaria de Infraestructura y Valorización
