 <p>Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa</p>	<p>FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA EDUCATIVA (FFIE) CONTRATO No. 1380-1497-2021 INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2 23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023</p>	<p>DPC INGENIEROS S.A.S NIT: 830101071-8</p>
--	---	---

**PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCURA
EDUCATIVA – FFIE**



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1380-1497-2021

**“INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL
A LOS CONTRATOS, QUE COMPRENDEN REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS,
ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE
EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN –
SEDE BIENESTAR SOCIAL**

DPC INGENIEROS S.A.S
NIT: 830101071-8

**PERIODO DEL INFORME MENSUAL DEL 23 DE ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL
2023**

FEBRERO DEL 2023



Tabla de contenido

1. ANTECEDENTES.....	5
2. INTRODUCCIÓN	6
3. INFORMACION GENERAL	6
3.1 Datos generales del contrato	6
3.1.2 Contrato de interventoría	6
3.1.3 Contrato de obra.....	7
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	7
5. GARANTÍAS.....	;Error! Marcador no definido.
5.1 Pólizas contrato de obra	;Error! Marcador no definido.
5.2 Pólizas contrato de interventoría	;Error! Marcador no definido.
6. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.....	8
6.1 Actividades contractuales	8
6.2 Actividades ejecutadas Ítems contractuales	8
6.3 Actividades no previstas	9
7. EVALUACIÓN Y AVANCES DEL PROYECTO	9
7.1 Avance Físico.....	9
7.2 Avance Financiero	10
8. RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS DE LAS INTERVENTORÍA	10
9. COMPONENTE ADMINISTRATIVO	10
9.1 Actas de seguimiento al contrato	10
10. CONTROL DE PERSONAL.....	10
10.1 Personal de interventoría.....	11
10.2 Personal del contratista	11
11. CONTROL DE CORRESPONDENCIA	11
12. COMPONENTE TECNICO	11
12.1 Actividades técnicas.....	11
12.2 Informes semanales.....	11
12.3 Estados de los ajustes a los diseños.....	11
13. CONTROL DE CALIDAD	11
13.1 Control de Seguridad	11
13.3 Control de seguridad Industrial	12
RESUMEN DEL INFORME.....	14
4.1. Listado De Personal De Contratista De Obra.....	17
4.1. Personal Profesional, Especializado Y Técnico Mínimo Necesario Para La Fase De Obra.....	17



5.	Gestión Básica Administrativa	18
5.1.	Pagos al Sistema de Seguridad Social Integral	19
5.2.	Pagos salarios y honorarios.....	19
7.2.1	COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo).....	19
	Conformación COPASST - contrato de obra.....	19
	Conformación COCOLA - Contratista de Obra.....	20
4.3.	Gestión Documental	20
4.4.	Ingreso De Personal	20
	Tabla 1. INGRESO DE PERSONAL 2023Fuente: CONSORCIO EDUCACION	21
	Tabla 3. CAPACITACIONES	21
	(Ver Anexo 3 registro de asistencia de capacitaciones)	21
7.	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN	22
	(Ver Anexo 4: Entrega de Epp).....	22
11.2.	INSPECCIONES SST	22
	En el presente mes se realizó inspecciones de seguridad a equipos y herramientas (Ver Anexo 8: Inspecciones Realizadas)	22
	Área técnica	22
	Área SST.....	23
10.	SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	23
11.	BIENESTAR LABORAL.....	23
12.	ORDEN Y ASEO Y LIMPIEZA	23
13.	REPORTE Y ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD.....	24
14.	GESTIÓN SST – REALIZADA POR EL CONTRATISTA.....	24
	REGISTRO FOTOGRÁFICO GESTIÓN SST – CONSORCIO EDUCACION PROYECTO	24
	CHARLAS Y CAPACITACIONES	24
	PAUSAS ACTIVAS.....	25
	LIMPIEZA Y ASEO.....	26
	ENTREGA DE EPP Y REPOSICIÓN Ilustración 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO EPP.....	26
	CERRAMIENTO DE OBRA	27
	Ilustración 6. ZONAS ESPECIALES.	27
	ALMACENAMIENTO H/M PARQUEADERO DE VEHICULOS	28
2.	OBJETIVOS	30
	Consortio Educativo.....	30
3.	ALCANCE.....	30
6.2.1	PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES: CAMPAMENTO.....	32
6.2.2	PROGRAMA – CAPACITACIONES AMBIENTALES.	32



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)**

CONTRATO No. 1380-1497-2021

INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2

23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023

DPC INGENIEROS S.A.S

NIT: 830101071-8

6.3	PROGRAMA - MANEJO DE SEÑALIZACIÓN.....	33
6.4	PROGRAMA BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES (MANEJO DEL AGUA).....	33
6.3	PROGRAMA – MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES	34
6.3	PROGRAMA – MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	35
6.3	PROGRAMA – MANEJO AMBIENTAL DE ETAPA CONSTRUCTIVA	36
6.3	PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL.....	37
1.	INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL	37
	LISTA DE CHEQUEO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	39



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)**
CONTRATO No. 1380-1497-2021
INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2
23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023

DPC INGENIEROS S.A.S
NIT: 830101071-8

1. ANTECEDENTES

En el caso específico del contrato de obra No. 1380-1497-2021, suscrito entre el CONSORCIO EDUCACION y el FFIE, que tiene como objetivo REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL, este se origina por dos procesos anteriores suscritos entre el FFIE y las firmas CONSORCIO MOTA ENGIL y CONSORCIO COLOMBIA ESTUDIA, las cuales no llegaron a terminar sus procesos.

De esta manera se hizo necesario realizar el proceso de contratación de la interventoría con el fin de supervisar, controlar y garantizar, la ejecución de los contratos objeto de la interventoría que se deriven de la Invitación abierta 008 de 2019, asegurando la inversión de los recursos destinados para los proyectos, verificando de esta manera el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratistas de diseño y obra y el oportuno y correcto cumplimiento del objeto contractual.

Por lo anterior y de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario, previa recomendación del Comité Técnico y de la estructuración realizada por parte de la Unidad de Gestión del FFIE, se adelantó la convocatoria denominada INVITACIÓN ABIERTA 026 de 2020 para seleccionar a los proponentes cuyo objeto consiste en: "LA CONFORMACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS, QUE COMPRENDEN LA EJECUCIÓN DE CONSULTORÍAS DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O ESTUDIOS URBANOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE" de acuerdo con los Términos y Condiciones Contractuales establecidos para la citada invitación abierta.



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)**
CONTRATO No. 1380-1497-2021
INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2
23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023

DPC INGENIEROS S.A.S
NIT: 830101071-8

2. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el Informe mensual de Interventoría N° 01 del periodo comprendido entre el 23 de ENERO y el 28 de FEBRERO de 2023, de la fase 2 elaborado por la firma **DPC INGENIEROS S.A.S**, Interventora del Contrato de Obra No. 1380-1497-2021, cuyo objeto es “Realizar la ejecución de diseños, estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa requeridos por el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa – FFIE en el departamento del valle del cauca - grupo 1 i.e. Cristóbal Colón – Sede Bienestar Social”, el cual permitirá a la entidad Contratante tener una visión de las actividades desarrolladas tanto por la Firma Interventora, como por el Contratista de Obra.

Municipio	Institución Educativa	Sede	Mejoramientos	Comedores	Aulas
Santiago de Cali	Cristóbal Colon	Bienestar Social	1	1	12

3. INFORMACION GENERAL

3.1 Datos generales del contrato

3.1.2 Contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contrato Numero	No. 1380-1497-2021
Contratante	Consortio FFIE Alianza BBVA
Contratista	DPC INGENIEROS SAS
Objeto	Realizar interventoría técnica administrativa y financiera jurídica y ambiental a los contratos de obra 1380-1497-2021 que comprenden la elaboración de los diseños y estudios técnicos obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa Cristóbal Colon Sede Bienestar social en Cali Valle del Cauca requeridos por el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa FIIE en desarrollo del plan nacional de infraestructura educativa PNIE de acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente documento en la propuesta en los términos y condiciones contractuales en adelante TCC y sus adendas y en los anexos del presente contrato.
Valor del Contrato	\$ 344.367.738,00
Plazo	Ocho (08) meses contados a partir del Acta de inicio
Fecha de inicio	01 de agosto del 2023
Fecha de terminación	01 de julio del 2023



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)**
CONTRATO No. 1380-1497-2021
INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2
23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023

DPC INGENIEROS S.A.S


NIT: 830101071-8

3.1.3 Contrato de obra

CONTRATO DE OBRA	
Contrato Numero	No. 1380-1497-2021
Contratante	Consorcio FFIE alianza BBVA
Contratista	Consorcio educación
Representante Legal	Víctor Manuel Ariza
Objeto	“Realizar la ejecución de diseños, estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa requeridos por el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa – FFIE en el departamento del valle del cauca - grupo 1 i.e. Cristóbal Colón – Sede Bienestar Social”.
Valor del Contrato	\$2.808.102.309
Plazo	10 meses
Fecha de inicio	01 de agosto del 2023
Fecha de terminación	01 de julio del 2023

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La Institución Educativa Cristóbal Colón-Sede Bienestar Social se encuentra ubicada en el Distrito Especial de Cali, Valle del Cauca de la República de Colombia, se localiza en el predio referenciado con la nomenclatura Carrera 47B No. 45-74.

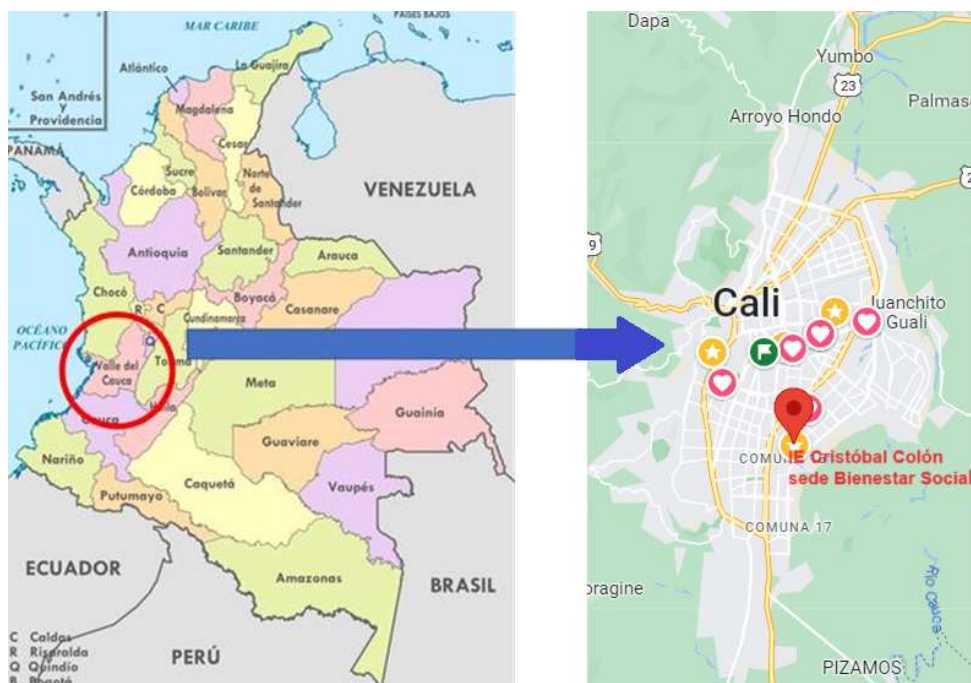




Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
CONTRATO No. 1380-1497-2021
INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2
23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023

DPC INGENIEROS S.A.S

NIT: 830101071-8

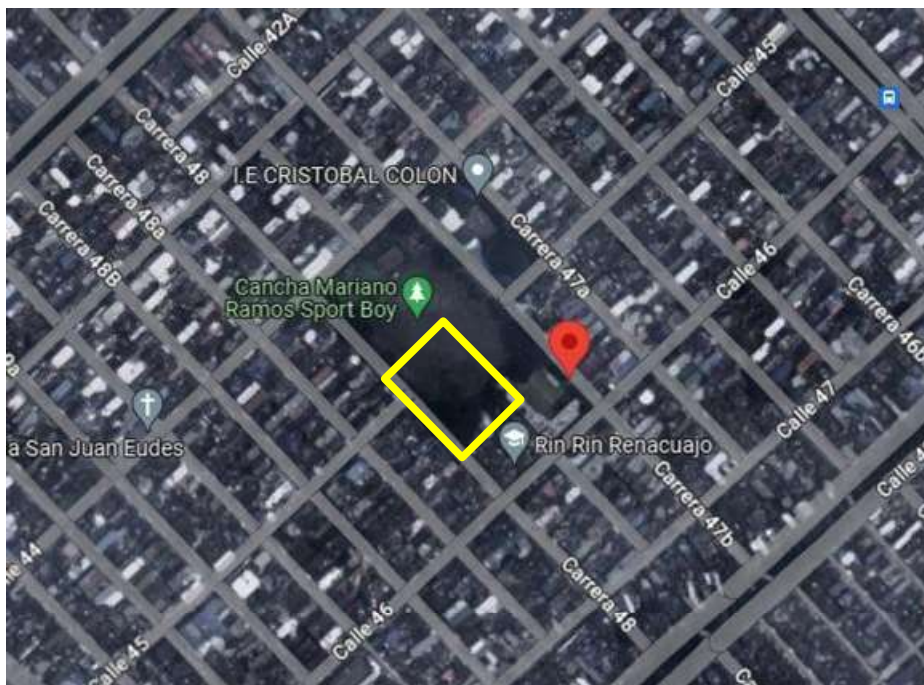

5. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5.1 Actividades contractuales

Durante el desarrollo de las actividades correspondientes a la fase 2 se han realizado las siguientes actividades:

- Limpieza, descapote y retiro
- Inventario de materiales existentes y acopios de bloques de concreto
- Replanteo de muros estructurales
- Adecuación de cerramiento perimetral
- Muro en bloque de hormigón - e = 20 cm
- Muro en bloque concreto - e = 10 cm
- Anclaje para reforzamiento en concreto y epóxido para $\varnothing \frac{1}{2}$
- Relleno con roca muerta
- Excavación manual en material común (incluye cargue, retiro y disposición final)
- Placa contrapiso de 10 cm - concreto 3000 psi. Incluye corte y dilatación
- Retiro de casetones losa de entrepiso bloque 2b
- Concreto de limpieza - 2000 psi

5.2 Actividades ejecutadas ítems contractuales



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)**
CONTRATO No. 1380-1497-2021
INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2
23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023

DPC INGENIEROS S.A.S
NIT: 830101071-8

ACTIVIDADES	UN	CANTIDAD	VR. TOTAL
LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts	M2	270,00	\$ 2.925.600,00
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (Area a pagar es el area de la huella de la edificación)	M2	800,00	\$ 2.065.600,00
RETIRO DE SOBRANTES: CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO (APLICA PARA SOBRANTES QUE NO PERTENECEN A LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA).	M3	12,00	\$ 407.328,00
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	48,00	\$ 3.003.180,00
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y disposición final)	M3	40,00	\$ 2.259.450,00
CONCRETO DE LIMPIEZA - 2000 PSI	M3	4,40	\$ 2.628.851,50
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	60,00	\$ 9.196.200,00
MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG	300,00	\$ 4.130.000,00
DOVELA EN CONCRETO GROUTING. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	147,00	\$ 27.974.100,00
MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm	M2	36,00	\$ 157.602.600,00
MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 20 cm	M2	5,00	\$ 25.242.250,00
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	CM	180,00	\$ 972.000,00
ASEO GENERAL	M2	572,00	\$ 6.765.200,00
TOTAL			\$ 245.172.359,50

5.3 Actividades no previstas

Durante la ejecución de la obra, se cumplió estrictamente con el plan de trabajo previamente establecido, sin realizar ninguna actividad no prevista.


6. EVALUACIÓN Y AVANCES DEL PROYECTO

6.1 Avance Físico

INVERSION POR CAPITULOS					AVANCE FISICO
Items	Capitulos	Programación	Ejecutado	Desv.	
01	PRELIMINARES	100%	39%	39%	
02	CIMENTACION	81%	5%	6%	
03	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	0%	0%	0%	
04	ESTRUCTURA	0%	0%	0%	
05	MAMPOSTERIA	0%	2%	0%	
06	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS	0%	0%	0%	
07	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	0%	0%	0%	
08	INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y	0%	0%	0%	
09	PANETES	0%	0%	0%	
10	PISOS	0%	0%	0%	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	0%	
12	CARPINTERIA METALICA	0%	0%	0%	
13	ENCHAPES	0%	0%	0%	
14	ILUMINACION	0%	0%	0%	
15	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	0%	
16	CIELOS RASOS Y DIVISIONES	0%	0%	0%	
17	PINTURA	0%	0%	0%	
18	CERRADURAS Y VIDRIOS	0%	0%	0%	
19	OBRAS EXTERIORES	0%	0%	0%	
20	ASEO Y VARIOS	35%	40%	114%	
22	NO PREVISTOS			0%	
PORCENTAJE ACUMULADO		11,19%	1,12%		



6.2 Avance Financiero

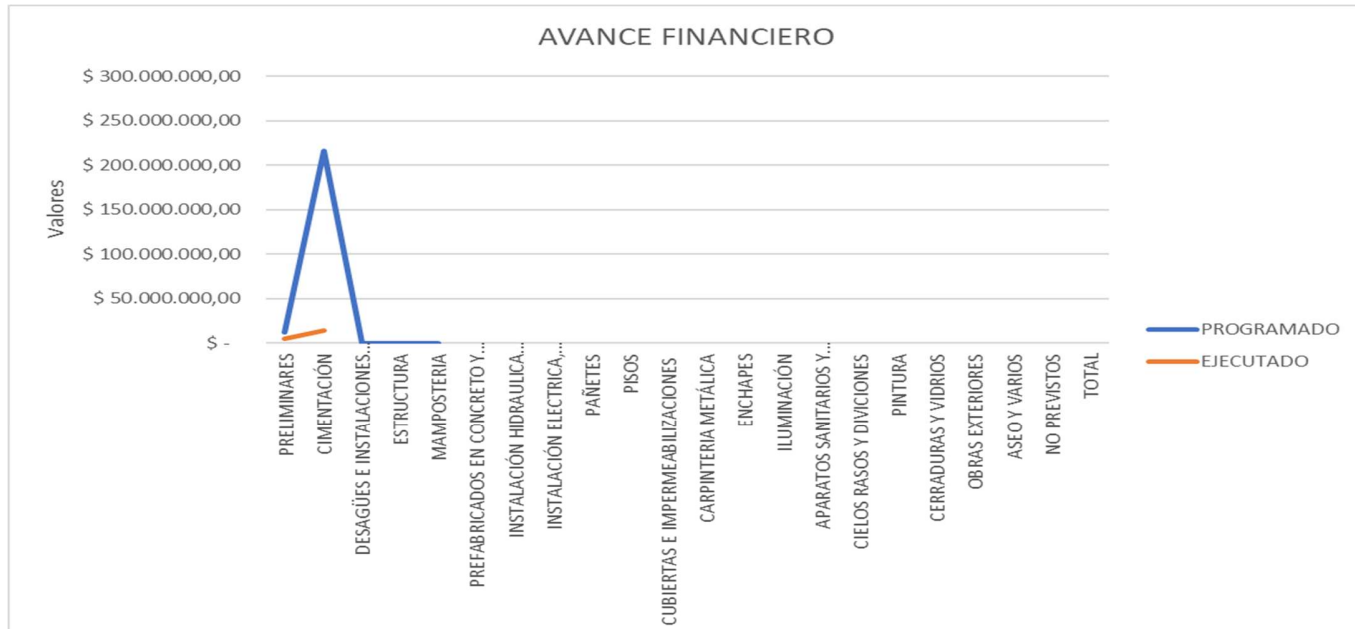

7. RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS DE LAS INTERVENTORÍA

En reiteradas ocasiones se le ha solicitado al contratista general avances significativos, así como el flujo de materiales, equipos y personal necesarios para la ejecución de la obra.

8. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

8.1 Actas de seguimiento al contrato

Durante el periodo se realizaron los siguientes comités de seguimiento, cuyas actas se anexan al presente informe:

- 17 de enero del 2023
- 19 de enero del 2023
- 24 de enero del 2023
- 08 de febrero del 2023
- 21 de febrero del 2023

En estos comités se realizaron revisión del componente estructural, inicio de actividades en obra, entregables fases 2, compromisos, igualmente se definieron las obras complementarias a cargo de la ETC, así mismo el seguimiento del contrato y compromisos.

9. CONTROL DE PERSONAL



9.1 Personal de interventoría

Ver 5.1 listado del personal de contratista de obra – informe mensual SST

9.2 Personal del contratista

Ver 6.1 listado del personal de contratista de obra – informe mensual SST

10. CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Ver anexo 11 control de correspondencia

11. COMPONENTE TECNICO

11.1 Actividades técnicas

11.2 Informes semanales

Durante el periodo se realizaron 6 informes semanales, en los cuales se registró el avance de las actividades ejecutadas – ver Anexo 12.2 Informes semanales.

11.3 Estados de los ajustes a los diseños

El contratista, el día 13 de febrero, mediante oficio C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0057, realiza la entrega de los REMISION DE INFORMACION AJUSTES A DISEÑOS COMPONENTE ELECTRICO Y DE VOZ Y DATOS, para la revisión y aprobación por parte de la interventoría.

El día 13 de febrero, el Contratista hace entrega de los ACLARACION ESTUDIOS TECNICOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, mediante oficio C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0058, para la revisión y aprobación por parte de la interventoría.

La interventoría avalo los ajustes y complementos realizados a los diseños arquitectónicos, estructurales e Hidrosanitarios y solicito al contratista remitir los respectivos planos, debidamente firmados para proceder a realizar la entrega a la entidad.

12. CONTROL DE CALIDAD


La construcción de la obra hasta el momento se desarrolla de acuerdo con los parámetros técnicos, y especificaciones particulares del proyecto.

12.1 Control de Seguridad

Ver informe SST

12.2 Control de equipos de medición

No se realizaron actividades de medición y topografía, por lo tanto, no aplica.

 <p>Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa</p>	<p>FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA EDUCATIVA (FFIE) CONTRATO No. 1380-1497-2021 INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2 23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023</p>	<p>DPC INGENIEROS S.A.S NIT: 830101071-8</p>
--	--	---

12.3 Control de seguridad Industrial

Ver informe SST



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUTURA EDUCATIVA (FFIE)**
CONTRATO No. 1380-1497-2021
INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2
23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023

DPC INGENIEROS S.A.S
NIT: 830101071-8

INFORME SST DE INTERVENTORÍA



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUTURA EDUCATIVA (FFIE)
CONTRATO No. 1380-1497-2021
INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2
23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023

DPC INGENIEROS S.A.S
NIT: 830101071-8

RESUMEN DEL INFORME

El presente informe, tiene por objeto presentar una relación detallada de la Gestión SST que adelantó el contratista de obra **CONSORCIO EDUCACION** y la de Interventoría **CONSORCIO DPC INGENIEROS SAS**, durante la ejecución de actividades del primer mes (1) según el cronograma general, correspondiente al periodo entre el 23 de enero y el 28 de febrero de 2023 para el contrato que tiene por objeto “**REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL**”.



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
CONTRATO No. 1380-1497-2021
INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2
23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023

DPC INGENIEROS S.A.S
NIT: 830101071-8

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

1. OBJETIVO

1.1. Objetivo General

Garantizar y velar por el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad y salud en el trabajo mediante la prevención y mitigación de los peligros y riesgos propios de la actividad en el periodo 23 de enero al 28 de febrero de 2023.

2. Objetivos Específicos

- Supervisar las diferentes actividades realizadas por el contratista de obra CONSORCIO EDUCATIVO, respecto a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Contrato de interventoría.
- Revisar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para el Contrato de obra.
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes en materia Seguridad y salud en el trabajo.

3. Descripción Del Proyecto

“REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS

DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

3.1. Área de Influencia Directa

El área de influencia directa del proyecto involucra el Barrio Cristóbal Colon, municipio de Cali en el Departamento del Valle.

Localización del Proyecto- Fuente: Google Earth.

4. Información Interventoria

Generalidades del contrato de Interventoria No. 1380-1497-2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-09



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)**
CONTRATO No. 1380-1497-2021
INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2
23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023

DPC INGENIEROS S.A.S
NIT: 830101071-8


Fecha de Inicio 01 de agosto de 2022
Plazo Diez (10) meses
Fecha de Terminación 01 de julio de 2023

4. Recurso Humano De La Interventoría

Con el fin de dar cumplimiento al Anexo de requerimientos de personal mínimo y equipo del contrato de interventoría, se describe a continuación el personal profesional y de apoyo con el que cuenta la Interventoría para la verificación y seguimiento de las actividades realizadas por el contrato de obra.

4.1. Listado personal de la Interventoría

Ítem	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DEDICACION
1	Director de Interventoría	Lacides Sanjuán	50%
2	Residente de Interventoría	Ademar Diago	100%
3	Inspector de Interventoría	Suleima Girón	100%
4	Prof. Social	Sandra ramirez	40%
5	Prof. Costos y Presupuestos	Lacides Sanjuán	30%
6	Prof. Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	Nidia Méndez García	30%
7	Ing. Ambiental	Nidia Méndez García	10%
8	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	Jonny Gil	100%
	Especialista Estructural	Carlos Trujillo	

 Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE) CONTRATO No. 1380-1497-2021 INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2 23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023	DPC INGENIEROS S.A.S NIT: 830101071-8
---	---	---

9			10%
10	Especialista Hidrosanitario	Hector de Jesus Gonzalez	10%
11	Especialista Eléctrico	Robert Garcia	10%

4. Información Del Contrato De Obra

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-09	
Fecha de Inicio	01 de agosto de 2022
Plazo	Diez (10) meses
Fecha de Terminación	01 de julio de 2023

4.1. Listado De Personal De Contratista De Obra

Con el fin de dar cumplimiento al Anexo de requerimientos de personal mínimo y equipo del contrato de obra, se describe a continuación el personal profesional y de apoyo con que cuenta el contratista de obra, la verificación y el seguimiento de la interventoría a las actividades realizadas por el contrato de obra.

4.1. Personal Profesional, Especializado Y Técnico Mínimo Necesario Para La Fase De Obra

N.º	CONTRATISTA	NOBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	INGRESO
1	Consorcio Educación	Jhon Fredy Ramírez	7170032	Ingeniero Director	23/01/2023
2	Consorcio Educación	Diana Carolina Bermúdez	1061428639	Residente Sst	21/02/2023
3	Consorcio Educación	Luis Sebastián Mora	1016041287	Ingeniero Ambiental	23/01/2023



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)**
CONTRATO No. 1380-1497-2021
INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2
23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023


DPC INGENIEROS S.A.S
NIT: 830101071-8

4	Consortio Educación	Mónica Del Pilar Arias	34562691	Residente Social	01/02/2023
5	Consortio Educación	Mariano Rivera Velázquez	7529885	Maestro	08/02/2023
6	Consortio Educación	Miguel Ángel Ramos	1111755812	Ayudante	23/01/2023
7	Consortio Educación	Kevin Maturana Maturana	1077468713	Ayudante	23/01/2023
8	Consortio Educación	Luis Jaime Solarte	16662584	Oficial	23/01/2023
9	Consortio Educación	Luis Alberto Cortes Ortiz	16677857	Oficial	23/01/2023
10	Consortio Educación	Eder Casierra Colorado	87949934	Oficial	23/01/2023
11	Consortio Educación	Bolívar Mina Quiñonez	16509185	Ayudante	23/01/2023
12	Consortio Educación	Francisco Peña Conte	19448995	Ingeniero Contr	23/01/2023
13	Consortio Educación	José Argemiro Angulo	16774409	Maestro	23/01/2023
14	Consortio Educación	Segundo Francisco Ortiz Angulo	16765797	Ayudante	23/01/2023
15	Consortio Educación	Eyder Ramos Castillo	14476708	Ayudante	23/01/2023
16	Consortio Educación	Nelson Cuero Olaya	13104107	Oficial	23/01/2023
17	Consortio Educación	Arbey Ramos Castillo	1111771545	Ayudante	23/01/2023

4.1. Seguimiento Y Análisis Del Manejo Sst Al Contratista De Obra.

El presente informe reúne el seguimiento de las actividades de prevención y promoción de Seguridad y Salud en el trabajo, documento mediante el cual se realiza una descripción de cada una de las actividades realizadas por el Contratista, el seguimiento y gestión de la Interventoría

5. Gestión Básica Administrativa

 <p>Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa</p>	<p>FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE) CONTRATO No. 1380-1497-2021 INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2 23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023</p>	<p>DPC INGENIEROS S.A.S NIT: 830101071-8</p>
--	--	---

El Contratista realizó las siguientes actividades respecto a la gestión básica administrativa:

5.1. Pagos al Sistema de Seguridad Social Integral

Respecto al manejo de la seguridad social del personal contratado y subcontratado que ejecuto labores en el proyecto, el Contratista presenta a la fecha los soportes de parafiscales y planillas de pago al Sistema de Seguridad Social para el mes de Septiembre.

5.2. Pagos salarios y honorarios

EI CONSORCIO EDUCACION se encuentra al día con el pago de nómina hasta el mes de febrero. Para el mes de análisis hace entrega de los soportes de pago de nómina y honorarios. En la siguiente tabla se relacionan la cantidad de colaboradores que estuvieron activos durante el mes de noviembre, según la información suministrada en los informes semanales.

7.2.1 COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo)


De acuerdo con lo establecido en la resolución 2013 de 1986 y Decreto 1295 de 1994, Art. 63 se debe conformar el Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el CONSORCIO EDUCATIVO, designo al vigía de seguridad y salud en el trabajo.

Conformación COPASST - contrato de obra

REPRESENTANTE por la EMPRESA	REPRESENTANTE SUPLENTE
José Argemiro Angulo	Eder Casierra Colorado

7.2.2. Comité de Convivencia Laboral (COCOLA)

Dando cumplimiento legal en lo referente a la Res. 1356 de 2012, y a las exigencias de la Res. 0652, el CONSORCIO EDUCATIVO conformo el Comité de Convivencia Laboral así:

 <p>Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa</p>	<p>FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA EDUCATIVA (FFIE) CONTRATO No. 1380-1497-2021 INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2 23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023</p>	<p>DPC INGENIEROS S.A.S NIT: 830101071-8</p>
--	---	---

Conformación COCOLA - Contratista de Obra

REPRESENTANTE por la EMPRESA	REPRESENTANTE SUPLENTE
José Argemiro Angulo	Eder Casierra Colorado

4.2. Programa de inducción y capacitación.

En cuanto al tema de la Inducción y notificación de riesgos al personal de ingreso, el Contratista presenta soportes de cumplimiento a esta actividad contractual acorde a los colaboradores que se encuentran registrados en la obra, que reportan en el formato y en la Base de datos actualizada cada semana, los cuales se adjuntó en informe contratista. La interventoría recibió, por medio de comunicados formales los documentos de vinculación del personal mínimo contractual, en los cuales se adjuntan los soportes de inducción y capacitación del personal que ingreso en el mes del 23 de enero al 28 de febrero de 2023.

4.3. Gestión Documental

Se presenta un informe mensual de Gestión SST, entregado oportunamente a la Interventoría.

4.4. Ingreso De Personal

Todo el personal que ingresa a obra cuenta con afiliación a ARL, EPS, AFP, examen de ingreso, **(Ver Anexo 1. Documentos soportes de examen ocupacional y Ver Anexo 2. Afiliaciones)**. Una vez ingresa el trabajador a obra se le realiza la inducción de SST dando a conocer los factores de riesgos los cuales estarán presentes en el proyecto I.E. **CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL** con sus respectivos controles.

- **Registro de personal:** formato mediante el cual se toman los datos generales del trabajador.
- **Inducción:** consta de información general del trabajador, proceso productivo y las políticas generales de la empresa.

- **Evaluación:** Esta se realiza al ingreso de obra con el fin de medir los conceptos que cada trabajador tiene al iniciar labores y los cuales se afianzarán mediante capacitaciones.

Exámenes ocupacionales: En el momento de ingresar un trabajador se debe contar con toda la documentación entre la que se encuentra el examen de ingreso con el fin saber las condiciones en que ingresa y si se encuentra con alguna restricción para laboral.

Tabla 1. INGRESO DE PERSONAL 2023

Fuente: CONSORCIO EDUCACION

5. CHARLAS Y CAPACITACIONES.

En este mes de enero/febrero el cual fue el inicio del proyecto **I.E. CRISTÓBAL COLÓN –SEDE BIENESTAR SOCIAL** Se realizó las siguientes charlas y capacitaciones.

Tabla 3. CAPACITACIONES


TEMA	FECHA	N.º PARTICIPANTES
Inducción SST	23/02/2023	10
Uso adecuado de EEP'S	24/02/2023	10
Autocuidado	25/02/2023	10
prevención de accidentes	28/02/2023	10

Fuente: CONSORCIO EDUCACION

(Ver Anexo 3 registro de asistencia de capacitaciones)

6. SEÑALIZACIÓN DE AREAS

En el mes de enero / febrero el cual se da inicio al proyecto **I.E. CRISTÓBAL COLÓN –SEDE BIENESTAR SOCIAL** Se evidencia el cerramiento de obra con poli sombra dejando

 <p>Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa</p>	<p>FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE) CONTRATO No. 1380-1497-2021 INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2 23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023</p>	<p>DPC INGENIEROS S.A.S NIT: 830101071-8</p>
--	--	---

el área de intervención delimitada para las personas externas del proyecto en mención.

7. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN

Se evidencia entrega de elementos de protección personal a todo el personal que ingresa al proyecto **I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL**, se realiza reposición de los elementos de protección de acuerdo a la labor a realizar.

(Ver Anexo 4: Entrega de Epp)

8. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN

A la fecha se han evidenciado y acompañado en la realización de las siguientes actividades en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de minimizar incidentes y/o accidentes laborales logrando el bienestar físico, mental y laboral de los trabajadores.

- Se verifico la Matriz de riesgos y peligros de las actividades a intervenir (**Ver Anexo 5: matriz de riesgos y peligros**)
- Se verifico la Matriz de EPP” S (**Ver Anexo 6: matriz de EPP” S**)
- Cronograma de actividades (**Ver Anexo 7: cronograma de actividades**)
- Se realizan recorridos de obra con el fin de identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos de cada una de las actividades se realicen y dar cumplimiento las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Realizar charlas informativas y capacitaciones a todo el personal de la obra, en donde se busca informar y sensibilizar a los trabajadores sobre su seguridad y salud en las labores diarias y procurar el autocuidado.
- Se realizan jornadas de orden y aseo en la obra.

11.2. INSPECCIONES SST

En el presente mes se realizó inspecciones de seguridad a equipos y herramientas (Ver Anexo 8: Inspecciones Realizadas)

9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA

A continuación, se listan las actividades que se realizan en obra a las cuales se les realiza seguimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo:

Área técnica

- Limpieza de lote



- Cerramiento de obra
- Traslado de bloque de concreto anterior contratista
- Preparación de mezcla
- Excavaciones.
- Fundición.

Área SST

- Inspecciones de seguridad.
- Jornada de orden y aseo en la obra.
- Charlas de 5 minutos al personal en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Entrega de dotación y EPP.
- Gestión documental.
- Organización de EPP.
- Inducciones a personal.

10. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se realiza verificación de la seguridad social del personal.

Consorcio Educación, realiza seguimiento al estado de las afiliaciones de ARL, EPS y AFP de todo el personal que ha ingresado en la obra y el pago mensual habilitado de planilla de seguridad de acuerdo al dígito de verificación.

11. BIENESTAR LABORAL

- Se cuenta con 1 campamento para que los trabajadores se cambien y guarden sus cosas personales para su bienestar.
- Se cuenta con zona para consumir alimentación para todo el personal.
- Se realizan las charlas diarias de cinco a diez minutos: con temas de seguridad salud en el trabajo.
- Diariamente se realiza pausas activas, antes de iniciar las actividades de obra.

12. ORDEN Y ASEO Y LIMPIEZA

- Se evidencia jornada de aseo en las diferentes áreas de la obra, esto con el fin de evitar accidentes e incidentes de trabajo.



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
CONTRATO No. 1380-1497-2021
INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2
23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023

DPC INGENIEROS S.A.S
NIT: 830101071-8

- Se cuenta con punto ecológico temporal mente para ubicación los desechos ordinarios.

13. REPORTE Y ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD

Para el periodo comprendido de enero / febrero 2023 no se presentaron accidentes laborales en obra.

14. GESTIÓN SST – REALIZADA POR EL CONTRATISTA

CONSORCIO EDUCATIVO: (se anexan registros fotográficos y documentación en anexos).

- Realiza charlas, capacitaciones de acuerdo al cronograma establecido.
- Jornadas de orden y aseo.
- Entrega de EPP al personal.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO GESTIÓN SST – CONSORCIO EDUCACION PROYECTO
I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL**

CHARLAS Y CAPACITACIONES

Ilustración 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO CAPACITACIONES





Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)**
CONTRATO No. 1380-1497-2021
INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2
23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023

DPC INGENIEROS S.A.S
NIT: 830101071-8



PAUSAS ACTIVAS

Ilustración 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO PAUSAS ACTIVAS





Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)**
CONTRATO No. 1380-1497-2021
INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2
23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023

DPC INGENIEROS S.A.S
NIT: 830101071-8



LIMPIEZA Y ASEO

Ilustración 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO LIMPIEZA Y ORDEN



ENTREGA DE EPP Y REPOSICIÓN

Ilustración 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO EPP



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)**
CONTRATO No. 1380-1497-2021
INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2
23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023

DPC INGENIEROS S.A.S
NIT: 830101071-8



CERRAMIENTO DE OBRA

Ilustración 5. CERRAMIENTO DE OBRA.



**ZONAS ESPECIALES (CONSUMO DE ALIMENTO, VESTIER, PARQUEADERO DE VEHICULO,
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS)**

Ilustración 6. ZONAS ESPECIALES.



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)**
CONTRATO No. 1380-1497-2021
INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2
23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023

DPC INGENIEROS S.A.S
NIT: 830101071-8

CONSUMO DE ALIMENTOS



VESTIER DE TRABAJADORES



ALMACENAMIENTO H/M



PARQUEADERO DE VEHICULOS



Fuente: Consorcio EDUCACION



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
CONTRATO No. 1380-1497-2021
INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2
23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023

DPC INGENIEROS S.A.S
NIT: 830101071-8

INFORME DE GESTION AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
CONTRATO No. 1380-1497-2021
INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2
23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023

DPC INGENIEROS S.A.S
NIT: 830101071-8

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se resumen las actividades de seguimiento realizadas por la interventoría a la Gestión Ambiental del Contratista en el periodo comprendido del 23 de enero al 28 de febrero de 2023.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Evidenciar y hacer seguimiento a la Gestión Ambiental realizada por el contratista **Consorcio Educativo.**

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✓ Realizar el seguimiento, control y evaluación de las actividades de Gestión Ambiental a desarrollar por parte del contratista de obra cumpliendo con todos los requisitos mínimos establecidos en el apéndice ambiental.
- ✓ Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de todas las actividades, programas según el PMA establecido.
- ✓ Presentar el desempeño ambiental de la obra con base en el seguimiento mensual de los indicadores Ambientales definidos en el PMA.

3. ALCANCE

Verificar de las actividades aplicadas y que serán llevadas por todo el personal que labora en el proyecto de obra “**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA, QUE COMPRENDEN LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE**”

Referente al cumplimiento de la Normatividad Ambiental Nacional vigente.

GESTION AMBIENTAL



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)**
CONTRATO No. 1380-1497-2021
INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2
23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023

DPC INGENIEROS S.A.S
NIT: 830101071-8

El presente informe contiene la recopilación y evaluación de las actividades correspondientes a las obligaciones de la Gestión Ambiental, desarrolladas por la interventoría y el contratista de obra. En la presente etapa de ejecución de las actividades, se describe la verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista para la ejecución de las obra REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”

6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES AMBIENTAL

Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición

Con base en lo establecido en la Resolución 01115 de 2012 y la Resolución 932 de 2015, el CONSORCIO Deportivo 009 para la obra: REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GRUPO 1 I.E.

CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”, No requiere presentar el PG-RCD ya que el área del proyecto corresponde a 5139,6 m² y la proyección de generación de RCD es menos de 1.000 m³ por ende, se realizaran y ejecutaran las demás obligaciones ambientales contempladas en el PMA y en la normatividad nacional vigente.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El componente de manejo ambiental establece como requerimientos la gestión documental, el seguimiento a los permisos y licencias otorgadas o en trámite; a su vez establece la disposición del personal y equipo ambiental.

Las actividades que se han implementado en cada una de las fichas de manejo ambiental aplicables al periodo de este informe han sido para prevenir, mitigar, controlar y/o corregir los impactos ambientales generados al medio ambiente, a continuación se relacionan las mismas:



No.	FICHA DE MANEJO AMBIENTAL	APLICA	NO APLICA
1	CAPACITACIONES AMBIENTALES	X	
2	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	X	
3	MANEJO DE SEÑALIZACIÓN	X	
4	MANEJO DE FAUNA, FLORA Y PAISAJE		X
5	BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES (MANEJO DEL AGUA)	X	
6	MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENO		X
7	MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES	X	
8	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	X	
9	MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RCD		X
10	MANEJO EFICIENTE DE MATERIALES E INSUMOS	X	
11	MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS		X
12	MANEJO AMBIENTAL DE ETAPA CONSTRUCTIVA	X	
13	MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS		X
14	AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA		X
15	DESMANTELAMIENTOS DE OBRA		X
16	CONTROL DE DERRAMES SUSTANCIAS QUÍMICAS		X
17	PROCEDIMIENTO BLOQUEO Y TRASLADO		X
18	PREVENCIÓN DE DAÑOS A ESPECIES		X
19	SEGURIDAD VIAL	X	
20	PRÁCTICA SEGURA OPERACIÓN DE MAQUINARIA		X
21	TRASLADO DE MAQUINARIA		X

6.2.1 PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES: CAMPAMENTO

➤ INSTALACION DE CAMPAMENTO

- ✓ Se encuentra señalizado diferenciado cada una de las áreas del mismo y cuenta con las señales reglamentarias: salida de emergencia, Ruta de evacuación, Punto de encuentro, área de almacén, uso adecuado y obligatorio de EPP y las demás que se requieren para la prevención de accidentes.
- ✓ Cuenta con las áreas para las oficinas del personal administrativo y cuenta con el área de cuidado con los elementos requeridos para atender al trabajador en caso de presentar un incidente o caso sospechoso de COVID- 19)
- ✓ El campamento de obra está demarcado y señalizado.

6.2.2 PROGRAMA – CAPACITACIONES AMBIENTALES.

Durante el período, se llevó a cabo una capacitación de 15 minutos a los trabajadores en el frente de obra del tema ambiental mencionado a continuación:

Se adjunta listado de asistencia a capacitación ambiental. Ver anexo 1



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
CONTRATO No. 1380-1497-2021
INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2
23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023

DPC INGENIEROS S.A.S
NIT: 830101071-8



6.3 PROGRAMA - MANEJO DE SEÑALIZACIÓN.

Durante el período el contratista inició con la adecuación de la señalización del campamento, centros de acopio y frente de obra previniendo accidentes, durante el desarrollo de las labores propias de sus cargos, en la ejecución de los trabajos asignados, y durante los desplazamientos o recorridos en los segmentos de vía a intervenir.

Imagen 2 Adecuación campamento



Para la ubicación diaria de materiales, éstos se ubican en sitios que no interfieran con el tránsito del personal de la obra ni de la maquinaria y el equipo.

6.4 PROGRAMA BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES (MANEJO DEL AGUA)

Durante el periodo, el contratista realizó la inspección inicial y prevención de tres (3) sumideros localizados en el AID del proyecto con el propósito de evitar inundaciones de la vía y las zonas aledañas al proyecto.



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
CONTRATO No. 1380-1497-2021
INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2
23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023

DPC INGENIEROS S.A.S
NIT: 830101071-8

Imagen 3 Inspección sumidero



No se ha generado ningún tipo de vertimiento de residuo líquido a las calles, calzadas y sumideros.

Es importante aclarar que el proyecto no cuenta con unidades sanitarias portátiles debido a la instalación de baterías sanitarias provisionales para uso del personal de obra, ubicadas en el área posterior de las graderías.

6.3 PROGRAMA – MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES

Con el fin de minimizar las emisiones atmosféricas, se realizó el aislamiento de los frentes de obra mediante la instalación de cerramiento poli sombra verde, cubriendo todo el frente de obra como se muestra en la siguiente imagen.



Imagen 8 Cerramiento perimetral

Consorcio Educación realiza labores de mantenimiento al cerramiento perimetral de poli sombra verde, cubriendo todo el frente de obra como se muestra en la siguiente imagen.



Imagen 9 Mantenimiento Cerramiento perimetral



6.3 PROGRAMA – MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

El contratista realizó el correcto manejo de los residuos sólidos generados por las actividades de construcción del proyecto, a continuación se listan:

- Separación de residuos sólidos en la fuente, es decir: frente de obra y campamento.
- Organización de material reutilizable y reciclable, producido en los frentes de obra y campamento.
- Almacenamiento temporal del material reutilizable y reciclable en las zonas de acopio, dispuestas para este fin.

Durante el periodo se generó aproximadamente 12 kg de residuos sólidos ordinarios (Código de color verde) producidos por la ejecución de la obra, que fueron entregados a la empresa de recolección de residuos de la ciudad de Cali, en los días y horarios establecidos según su ruteo.

Los residuos sólidos reciclables (código color blanco) generados por las actividades constructivas; se generaron aproximadamente 5 kg los cuales fueron entregados a recicladores del sector.

No se realizó generación de residuos peligrosos.

Estos residuos son separados y clasificados según su origen y disposición final por colores como se enuncian anteriormente.

6.7 PROGRAMA – MANEJO EFICIENTE DE MATERIALES E INSUMOS



Durante el periodo el contratista inició con la identificación de posibles zonas de acopio de materiales que serán utilizados a lo largo del proyecto. Los acopios se deben encontrar debidamente señalados e identificados en un sitio determinado, sin obstruir el paso peatonal de los trabajadores de la obra.

Se realizó (1) acopio de bloques de cemento utilizados para actividades de mampostería en el proyecto.

Imagen 10 Acopio de madera



Estos acopios se deben encontrar localizados lejos de las áreas sensibles identificadas en el Área de Influencia del Proyecto tales como: sumideros, cuerpos de agua, zonas verdes, bosques, zonas de ronda, etc.


6.3 PROGRAMA – MANEJO AMBIENTAL DE ETAPA CONSTRUCTIVA

El contratista mantiene una infraestructura para almacén y administración de la obra. (Campamento), el cual se encuentra demarcado y señalizado temporalmente según las características de la etapa constructiva.



Los frentes de obra se encuentran limpios al finalizar cada jornada laboral con el fin de evitar dispersión de material particulado y prevenir accidentes a trabajadores, como se indica en la siguiente imagen.

Imagen 11 Limpieza frente de obra

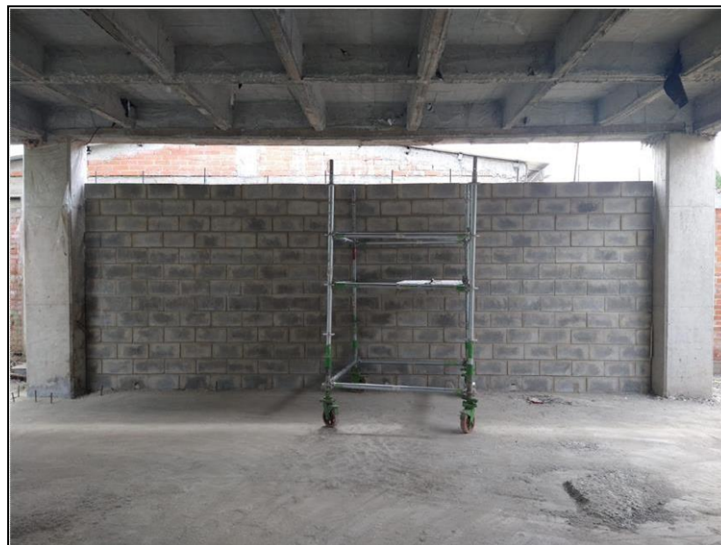

6.3 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL

Para el CONTRATO la velocidad máxima autorizada dentro de la obra es de 20 Kilómetros Por Hora (Km/h). Esto aplica para cualquier vehículo de transporte del CONTRATISTA y de los subcontratistas que participen en las diferentes actividades. Se han definido las rutas de acceso y rutas alternas a la obra para ser utilizadas en caso de emergencia. Estas rutas fueron divulgadas a todo el personal.

1. INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL

A continuación, se presentan los indicadores de gestión ambiental, con la evaluación correspondiente, se acuerdo a su aplicación en el período:

ACTIVIDAD		INDICADOR	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Cronograma Ambiental			
Cumplimiento de actividades	de	(No de actividades ejecutadas en el periodo / No de actividades programadas) * 100 Fichas de manejo ambiental aplicadas.	(9/9)*100 = 100%



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)**
CONTRATO No. 1380-1497-2021
INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2
23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023

DPC INGENIEROS S.A.S
NIT: 830101071-8

Capacitación ambiental			
Cumplimiento actividades	de	(No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas) *100	$(1/1)*100 = 100 \%$
Manejo de señalización			
Cumplimiento actividades	de	(No. De lugares señalizados en el mes / No. De lugares señalizados en total) * 100	$(5/5)*100= 100\%$
Buenas prácticas ambientales - Manejo del agua			
Cumplimiento actividades	de	(No. De sumideros protegidos en el frente de obra / No. De sumideros presentados en obra) * 100	$(3/3)*100=100\%$.
Manejo y control de emisiones			
Cumplimiento actividades	de	(No. Actividades ejecutadas en el mes /No. Actividades programadas) * 100	$(1/1)*100=100\%$
Manejo integral de residuos			
Cumplimiento actividades	de	(Cant. De residuos para reciclar / Cant. De residuos dispuestos adecuadamente) * 100	$(5 \text{ kg}/5 \text{ kg})*100 =100\%$
Cumplimiento actividades	de	(Cant. De residuos sólido ordinarios / Cant. De residuos sólidos ordinarios dispuestos adecuadamente) * 100	$(12 \text{ kg}/12 \text{ kg})*100 =100\%$
Cumplimiento actividades	de	(Cant. De residuos peligrosos / Cant. De residuos peligrosos dispuestos adecuadamente) * 100	No se generaron residuos peligrosos
Manejo de materiales			
Cumplimiento actividades	de	(No de acopios en obra / No de acopios por obra autorizado) *100	$(1/1)*100=100\%$
Manejo ambiental de etapa constructiva			
Cumplimiento actividades	de	(No. De frentes de obra limpios / No. De frentes de obra autorizados) *100	$(3/3)*100=100\%$




Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
CONTRATO No. 1380-1497-2021
INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2
23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023

DPC INGENIEROS S.A.S
NIT: 830101071-8

LISTA DE CHEQUEO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

DPC INGENIEROS S.A.S NIT: 830101071-8		LISTA DE CHEQUEO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		Código: GA-FCIA-028 Versión: 1 Fecha de Aprobación: 15-ENE-2017	
CONTRATO		PROYECTO	8	FASE O ETAPA	2
				No. FASE ETAPA	2
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 23-ene-23 Y EL: 28-feb-23					
INFORME No. 1					
TIPO DE CONTRATO: Desarrollo					
OBJETO: INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE OBLIGACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, QUE SE DESARROLLA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE).					
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZACIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, QUE SE DESARROLLA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE).					
CONTRATISTA:		CONVENIO EDUCACION		CONTRATO No: 1380-1497-2021	
INTERVENIOR:		DPC INGENIEROS S.A.S		CONTRATO No: 1380-1497-2021	
SUPERVISOR:		PPE			
FECHA:		28/02/2023			
No.	DESCRIPCION	SI	NO	N.A.	RESUELTO
1	Se realiza el seguimiento periódico al cumplimiento del PMA	X			
2	Los materiales de la obra están cubiertos con lonas, plásticos o geotextil y acordonados			X	
3	Se realizan quemas a cielo abierto		X		
4	Existe aislamiento del equipo y operador en uso de cortadores, para mitigar el material particulado			X	
5	Los materiales almacenados interfieren al tráfico peatonal, vehicular y espacio público		X		
6	Los vehículos para transporte de material no exceden su capacidad, están cubiertos los sacos/bultos		X		
7	Para transporte de material se modifica los contenedores o plásticos		X		
8	Se garantiza la limpieza de las llantas de todos los vehículos que salen de la obra			X	
9	Hay escombros o materiales en espacio público			X	
10	Se realiza la disposición final de los escombros en lugar autorizados	X			
11	Utilización de canecas tapadas o bolsas plásticas a cada 100 metros para residuos domésticos	X			
12	Utilización de canecas tapadas a cada 100 metros para residuos industriales		X		
13	Las canecas están marcadas para diferenciar el tipo de desecho y están pintadas con color adecuado	X			
14	Los desechos son evacuados máximo cada dos días por empresas públicas	X			
15	Los escombros presentes en el área de la obra se acortan limpios - mantenimiento periódico	X			
16	Se realiza un mantenimiento periódico a las unidades sanitarias	X		X	
17	Se realiza vertimiento de aceites y demás materiales en redes de alcantarillado o al suelo		X		
18	Se realiza vertimiento de aguas contaminadas con mezclas de concreto, aditivos al suelo o redes de alcantarillado		X		
19	Hay kit ambiental para recolección de derrames accidentales de aceite	X			
20	La maquinaria y los equipos están en buen funcionamiento	X			
21	Se realizan arreglos preventivos o reparaciones a equipos en área de trabajo	X			
22	Los vehículos, equipo y maquinaria cuentan con revisión técnica reciente actualizada	X			
23	Los materiales de construcción son adquiridos en sitios autorizados	X			
24	Se realiza acopio temporal de materiales, equipos en predios particulares sin autorización, en zonas verdes, parques o plazas		X		
25	La obra se encuentra en buenas condiciones de Orden, Aseo y Limpieza	X			
26	Se cuenta con personal de medio ambiente encargado de realizar actividades de Orden y Limpieza	X			
Firma:  María Mercedes García Arg. Ambiental - Desarrolladora					



DPC INGENIEROS S.A.S
NIT: 830101071-8

DPC INGENIEROS S.A.S NIT: 830101071-8		LISTA DE CHEQUEO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				"Código: GA-FGA-028 Versión: 1 Fecha de Aprobación: 15-ENE-2017	
CONTRATO		PROYECTO	x	FASE O ETAPA	2	No. FASE / ETAPA:	2
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL:			23-ene-23	Y EL		28-feb-23	
INFORME No.		1					
TIPO DE CONTRATO		Interventoria					
OBJETO		INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL. A LOS CONTRATOS DE OBRA, QUE COMPRENDEN LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE"					
NOMBRE DEL PROYECTO		"REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN - SEDE BIENESTAR SOCIAL					
CONTRATISTA:		CONSORCIO EDUCACION				CONTRATO No:	
INTERVENTOR:		DPC INGENIEROS S.A.S				1379 - 1497 - 2021	
SUPERVISOR:		FFIE				CONTRATO No:	
FECHA:		28/0822023				1380 -1497 -2021	
No.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A.	RESUELTO		
1	Se realiza el seguimiento periodico al cumplimiento del PMA	x					
2	Los materiales de la obra están cubiertos con lonas, plásticos o geotextil y acordonados			x			
3	Se realizan quemas a cielo abierto		x				
4	Existe aislamiento del equipo y operario en uso de cortadora, para mitigar el material particulado			x			
5	Los materiales almacenados interfieren el trafico peatonal, vehicular y espacio publico		x				
6	Los vehículos para transporte de material no exceden su capacidad, están cubiertos los escombros		x				
7	Para transporte de material se modifica los contenedores o platones		x				
8	Se garantiza la limpieza de las llantas de todos los vehículos que salen de la obra			x			
9	Hay escombros o materiales en espacio publico			x			
10	Se realiza la disposición final de los escombros en lugar autorizados	x					
11	Ubicación de canecas tapadas o bolsas plásticas a cada 100 metros para residuos domésticos	x					
12	Ubicación de canecas tapadas a cada 100 metros para residuos industriales		x				
13	Las canecas están marcadas para diferenciar el tipo de desecho y están pintadas con color adecuado	x					
14	Los desechos son evacuados máximo cada dos días por empresas publicas	x					
17	Los sumideros presentes en el area de la obra se ecuentran limpios.- matenimiento periodico	x					
18	Se realiza en mantenimiento periodico a las unidades sanitarias	x		x			
19	Se realiza vertimiento de aceites y demás materiales en redes de alcantarillado o al suelo		x				
20	Se realiza vertimiento de aguas contaminadas con mezzlas de concreto, aditivos al suelo o redes de alcantarillado		x				
21	Hay kit ambiental para recolección de derrames accidentales de aceite	x					
22	La maquinaria y los equipos están en buen funcionamiento	x					
23	Se realizan arreglos preventivos o reparación a equipos en área de trabajo	x					
24	Los vehículos, equipo y maquinaria cuentan con revisión tecno mecánica actualizada	x					
25	Los materiales de construcción son adquiridos en sitios autorizados	x					
26	Se realiza acopio temporal de materiales, equipos en predios particulares sin autorización, en zonas verdes, parques o desagüe		x				
	La obra se encuentra en buenas condiciones de Orden, Aseo y Limpieza	x					
27	Se cuenta con personal de medio ambiente encargado de realizar actividades de Orden y Limpieza.	x					
Firma: _____ Nidia Mendez Garcia Ing. Ambiental - Interventoria							



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FIFE)
CONTRATO N° 1380-497-2021
INFORME MENSUAL N° 1 FASE 2
23 de enero hasta el 28 de febrero de 2023

DPC INGENIEROS S.A.S
NIT: 830101071-8

INFORME DE GESTIÓN SOCIAL DE INTERVENTORÍA



Introducción

La gestión social como herramienta promueve la inclusión social y la vinculación efectiva de la comunidad en los proyectos sociales, con la finalidad de que los sujetos cultiven un sentido de pertenencia, de participación ciudadana y de control social frente al mejoramiento de sus condiciones.

El proyecto no solo busca realizar una infraestructura Educativa, sino que también una de sus finalidades es afianzar e incrementar el sentido de pertenencia de la comunidad por el cuidado de lo público.

Durante ese periodo se realizó verificación, seguimiento y acompañamiento a las actividades realizadas reunión de inicio de obra, realización de las actas de vecindad, fomento al empleo, construcción del diagnóstico social, así como visitas al área de influencia por el área social del contratista Consorcio Educación:

En este periodo se evidenció el cumplimiento de las siguientes actividades:

Identificación de líderes comunitarios, enlace con la rectora y docentes de la Institución educativa.

Fomento al empleo.

No se reportó en este periodo, la recepción de hojas de vida por parte de comunidad, sin embargo, se encuentran vinculados 15 personas al proyecto de acuerdo al reporte del contratista.

Diagnostico social

No se reportó en este periodo, en la cual el contratista menciona su entrega para la primera semana de marzo 2023

Diseño y ejecución de plan pedagógico: *son el conjunto de reuniones, charlas y actividades dirigidas sensibilizar, informar, prevenir, entre otros, a la comunidad educativa y/o trabajadores;* en este periodo de reactivación de los tiempos contractuales la social del contratista realizó la ejecución del plan pedagógico:

Fecha	Tema	Número de participantes
Feb. 23 2023	"Trabajo en equipo",	11 trabajadores
Total de actividades	1	



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUTURA EDUCATIVA (FFIE)
CONTRATO No. 1380-1497-2021
INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2
23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023

DPC INGENIEROS S.A.S
NIT: 830101071-8


Registro fotográfico



Reuniones con comunidad: contractuales y/ extraordinarias

A la fecha la comunidad; realizó reunión de inicio de obra, el 17 de Febrero 2023, a las 2:00 pm con la comunidad educativa, con el objetivo de dar a conocer los alcances del proyecto, las entidades involucradas en el mismo como son FFIE, Consorcio Educación e Interventoría DPC Ingenieros S.A.; así como representantes del distrito de Santiago de Cali (Ver anexo 1 acta de Socialización de inicio de obra)

Registro fotográfico

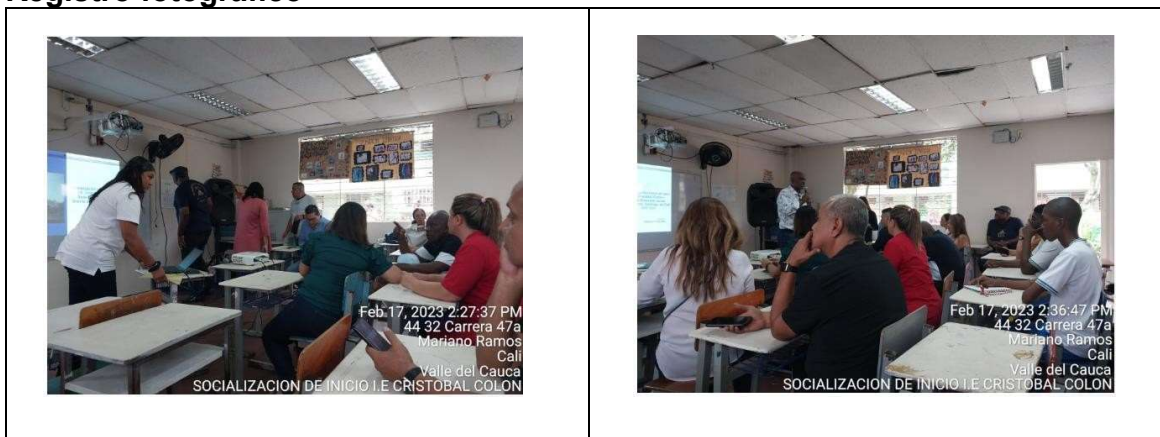

Atención a comunidad:

Buzón de PQRS; La contratista durante este periodo realizó revisión del Buzón de sugerencias, a la fecha no recibió ningún PQRS; sin embargo realizó atención a líder comunal.

Además de habilitar diferentes canales virtuales de comunicación para atender a la comunidad de la institución educativa por medio del correo electrónico: socialconsorcioeducacion@gmail.com y teléfono de contacto 324 516 86 77, en la cual



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**


FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
CONTRATO No. 1380-1497-2021
INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2
23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023

DPC INGENIEROS S.A.S
NIT: 830101071-8

estableció mediante cartelera informativa los horarios de atención de Jueves 8 am a 12 pm, instalación del PAC presencial el día 15 de feb. 2023

Levantamiento de actas de vecindad; para este periodo la contratista realizó identificación de 14 predios, se inició con el levantamiento de actas y a la fecha se ejecutaron seis (6); además se muestra retrasos de esta actividad, dado a situaciones de la disponibilidad técnico para realizar esta actividad.

Registro fotográfico

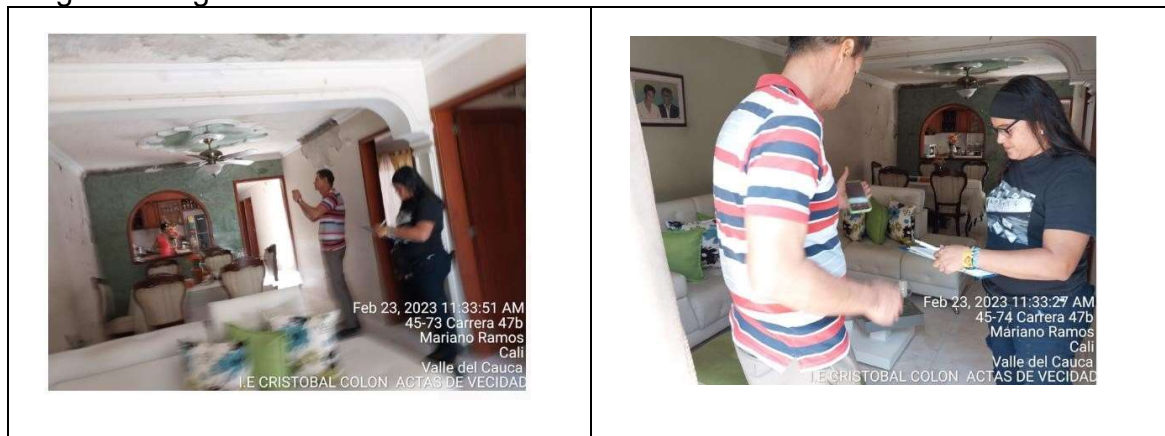

Recorridos de obra: se realizó recorrido de la obra el 17 de febrero con el grupo de gestión social contratista e interventoría y Secretario de Educación del Distrito de Cali.

Actividades dirigidas a promover sentido de pertenencia

No se requirieron en este periodo

Observaciones

De acuerdo a las actividades proyectadas en el plan de gestión social, se ha realizado las actividades por el contratista y se entrega los anexos correspondientes al informe mensual por parte de la contratista; sin embargo, se espera la entrega la entrega de la versión final del Plan de Gestión social; fortalecer la periodicidad del plan pedagógico y terminar la realización de las actas de vecindad como actividades prioritarias.

Se han llevado a cabo comunicación con la contratista, por medio de correo y llamada, así como espacios de trabajo:

Fechas	Actividad
28 de enero 2023	Presentación formal de la profesionales social
1 de febrero 2023	Inducción del FFIE
1 y 2 de febrero 2023	Visita de la contratista e Interventoria a la obra



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)**
CONTRATO No. 1380-1497-2021
INFORME MENSUAL No. 1 FASE 2
23 de enero hasta el 28 de febrero del 2023

DPC INGENIEROS S.A.S
NIT: 830101071-8

9 de febrero 2023	Revisión de volantes y cartelera del PAC
16 de febrero 2023	Ajustes a la presentación de reunión de inicio

ANEXOS

1. ANEXO ADMINISTRATIVO

- 1.1 Actas de seguimiento al Contrato (copia magnética) – Anexo 1
- 1.2 Correspondencia Enviada y Recibida – Formato FE-31 (copia magnética) – Anexo 2

2. ANEXO TÉCNICO

- 2.1 Informes semanales – Anexo 3
- 2.2 Bitácora de obra – Anexo 4
- 2.3 Informe de Gestión Ambiental – Anexo 5
- 2.4 Informe SST – Anexo 6
- 2.5 Informe de Gestión Social – Anexo 7
