

2814

CONSORCIO MATAGUASAN

Nº. 900412456-8

Yopal, 17 de Febrero de 2015

Ingeniero

AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA

Profesional contratado No. 1847/10

Unidad de Construcciones

Secretaria de Obras Públicas y Transporte

Departamento de Casanare

Indicacion de Correspondencia

18 FEB 2015

Nº 02149

OSZOLV
CICM-NA

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 303-11

Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del acueducto vereda Agualinda y construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore".

addp
18-02-15
11:250m

Asunto: Entrega de Informe Final de Interventoría.

Cordial Saludo,

Realizo entrega del siguiente informe:

- o Informe Final de Consultoría No. 15


Esto en cumplimiento de la cláusula segunda del contrato de interventoría No. 303 del 2011, suscrito con el Departamento de Casanare; con el fin de poder llevar a cabo la realización de las actas de terminación, recibo y liquidación final del contrato de interventoría No. 303 - 11.


Al informe se anexa actas, pólizas, seguridad social, planos, informe del contratista de obra, cantidades de obras ejecutadas, entre otros.

Agradezco su colaboración y atentos a cualquier sugerencia y recomendación.

No. De Folios: 921

Atentamente,


CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
R/I CONSORCIO MATAGUASAN

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		CODIGO:	
	PROCESO: PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y SUPERVISION A LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA		FECHA:	
	DOCUMENTOS SOPORTE PARA TRAMITE LIQUIDACION FINAL (TODA MODALIDAD DE CONTRATACION)		VERSIÓN:	
CIUDAD Y FECHA	YOPAL, SEPTIEMBRE 2014			
MODALIDAD DE CONTRATACION	CONTRATO INTERAD Nro _____ CONVENIO Nro _____ CONTRATO OBRA Nro _____ CONTRATO SUMINISTRO Nro _____ CONTRATO CONSULTORIA Nro _____ 303 - 2011 COMODATO Nro _____			
SUPERVISOR	Ing. Agustín González Gualibonza			
SEGUN LA MODALIDAD DE CONTRATACION SE REQUERIRAN LOS DOCUMENTOS QUE APLIQUE PARA CADA CASO.				
SI LA MODALIDAD DE CONTRATACION FUE CONVENIO Y CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DEBERA EXISTIR TODA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS DERIVADOS.				
		DOCUMENTACION	APLICA	REVISION DE SUPERVISOR
JURIDICA	1	MINUTA	✓	
	2	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	✓	
	3	REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	✓	
	4	IMPUESTOS DE LEGALIZACION Y PUBLICACION	✓	
	5	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO -RUT-	✓	
	6	FIC	N/A	
	7	DESIGNACIONES	✓	
	8	POLIZAS (debidamente actualizadas y aprobadas po OAJ)	✓	
	9	COPIA DE ORDENES DE PAGO EFECTUADAS	N/A	
	10	OTRO SI MODIFICATORIO O ACLARATORIO	✓	
	11	PRORROGAS	✓	
	12	ESTUDIO PREVIO	✓	
	13	REPRESENTACION LEGAL DEL CONTRATISTA (C.C. Y ACTA DE POSESION)	✓	
	14	ACTAS GENERADAS DE VIGENCIA DEL CONTRATO EN ORDEN CRONOLOGICO	✓	
	15	ACTA DE TERMINACION	✓	
	16	ACTA DE RECIBO FINAL	✓	
TECNICA	17	ACTA DE INICIO	✓	
	18	ACTAS PARCIALES GENERADAS	N/A	
	19	ITEMS NO PREVISTOS, ITEMS NUEVOS Y ACTA DE PACTACION DE PRECIOS (Aprobados de programacion)	N/A	
	20	ACTA DE RECIBO (COMUNIDAD)	N/A	
	21	ACTA DE ENTREGA (ALCALDIA O EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS) SEGUN FORMATOS	N/A	
	22	ACTA DE LIQUIDACION FINAL	N/A	
	23	PAZ Y SALVO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	
	24	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES	N/A	
	25	DOCUMENTOS DE ENTREGA DE PLANOS RECORD A LA ENTIDAD CONTRATANTE, DISEÑOS	✓	
	26	INFORME FINAL DEBIDAMENTE SUSCRITO	✓	
	27	PAZ Y SALVO IDURY SI AFECTO VIA PUBLICA, ACUERDO 14 DE JUNIO 02 EN YOPAL	N/A	
	28	CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA	✓	
CONTABLE	29	NOMINA MENSUAL DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS TRABAJADORES	✓	
	30	CERTIFICACION DE INTERVENTORIA DEL PAGO EFECTUADO POR EL CONTRATISTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES, COPIA DE PAGOS ORIGINALES Y CONSIGNACION	✓	
	31	VALOR TOTAL NOMINAS	✓	
	32	SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	✓	
	33	PAZ Y SALVO DEL MUNICIPIO, COMUNIDAD Y TRABAJADORES	✓	
	34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CONSIGNACION Y CERTIFICACION DE TESORERIA, REEMBOLSOS SALDOS NO EJECUTADOS	✓	
	35	CERTIFICADO DE APERTURA Y/O CIERRE DE LA CUENTA ENTIDAD BANCARIA DEL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO DEL CONTRATO	✓	
	36	FORMATO UNICO DE HACIENDA DEBIDAMENTE DILIGENCIADO PARA CONTRATOS.	✓	
DOCUMENTO EN TRAMITE	ACTA DE LIQUIDACION (SEGUN EL CASO) Se anexara en la parte superior de toda la informacion			
OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS REVISORES TECNICOS CONTABLES JURIDICO (DOCUMENTOS FALTANTES)				
			Firma Supervisor	

1. DOCUMENTOS JURIDICOS



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS

MINUTA

CÓDIGO: RAB00-25-I

FECHA: 28/09/2009

VERSION:01

CONTRATO DE CONSULTORIA No: **0303** DEL **14 FEB 2011**


CONTRATISTA:	CONSORCIO MATAGUASAN
NIT.	900412456-8
R/L.	LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMENEZ
C.C.	74.861.147 DE YOPAL
VALOR:	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS (\$138.381.040) M/CTE
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE
PLAZO:	CINCO (5) MESES

Entre los suscritos a saber, RODRIGO FLECHAS RAMIREZ mayor de edad, identificado con la C.C. No.6.774.689 de Tunja, quien actúa en nombre y representación del Departamento de Casanare, entidad territorial con NIT 892099216-6, en su calidad de Director de Contratación nombrado mediante Decreto 180 de 2010 y actuando según facultades otorgadas por el Decreto 181 de 2010, quien para el presente contrato será **EL DEPARTAMENTO** y por otra **LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMENEZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 74.861.147 DE YOPAL, en calidad de representante legal del **CONSORCIO MATAGUASAN**, con Nit 900412456-8, quién en adelante se denominara **EL CONTRATISTA** y para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA** hemos convenido en celebrar el presente Contrato de **CONSULTORIA**, previas las siguientes Consideraciones: 1. Que **EL DEPARTAMENTO** elaboró los estudios previos con la formalidades exigidas por la Ley de contratación vigente y los Decretos que la regulan, con el fin de determinar la necesidad de la contratación, la modalidad de Concurso de Méritos, las condiciones del mercado y demás especificaciones que soportaron este proceso contractual, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 2474 de 2008, los cuales fueron publicados. 2. Que la Dirección de Servicios Administrativos expidió el certificado de Plan de Compras No. 002591 del 23 de septiembre de 2010, en el cual se manifiesta que en el Plan de Adquisición de Bienes, Servicios y Obra Pública, esta entidad registró e incluyó ante el SICE los bienes y/o servicios objeto de la presente contratación, conforme a las disposiciones del Literal b) del Artículo 13 del Decreto 3512 de 2003. 3. Que para cubrir los costos de este contrato se cuenta con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 110312 del 24 de Enero de 2011. 4. Que **EL DEPARTAMENTO** requiere contratar la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE". 5. Que en virtud de lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 2474 de 2008 y demás normas concordantes, realizó la publicación del pliego de condiciones en el Portal Único de Contratación del SECOP, del proceso de Convocatoria Publica CAS-SOPT-CM-066-2010. 6. Que se presento solo la propuesta de: a) **CONSORCIO MATAGUASAN RL/ LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMENEZ**. 7. Que dicha propuesta fue evaluada y por cumplir con los requisitos señalados en el

REGISTRADO PRESUPUESTO

DOCUMENTO REVISADO

2818 4

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		CÓDIGO: RAB00-25-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		FECHA: 28/09/2009
	MINUTA		VERSION:01


CONTRATO DE CONSULTORIA No. **0303** DEL **14 FEB 2011**

pliego de condiciones se decidió contratar con **CONSORCIO MATAGUASAN RL/ LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMENEZ**. 8. Que mediante Resolución N° 0132 de fecha 07 de Febrero de 2011, se adjudicó el Concurso de Meritos al **CONSORCIO MATAGUASAN RL/ LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMENEZ**. 9. Que el presente contrato se registrará por las siguientes cláusulas: **PRIMERA - OBJETO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE. **SEGUNDA- ACTIVIDADES:** 1. La Interventoría contratada deberá ejecutarse estrictamente de acuerdo a la Resolución No. 256 de fecha 17 de Mayo de 2004 "Por la cual se adopta el manual del interventor versión 0 en el Departamento de Casanare"; por tal razón las actividades a desarrollar por la Interventoría están claramente enmarcadas en tres grupos expuestos a continuación: **A) FUNCIONES TÉCNICAS:** Como funciones generales que desarrolla la Interventoría dentro de los aspectos técnicos, se pueden enumerar las que se consideran las más representativas, sin olvidar que existan otras de índole particular para cada tipo de obra: * Revisión de los pliegos de condiciones de la selección, al igual que la propuesta del constructor y del contrato. * Revisión y aprobación de los estudios y diseños entregados al contratista y los que el proponga en desarrollo de las obras. * Iniciación de las obras, verificación del replanteo y establecimiento del programa de ejecución de obras. * Revisión del cumplimiento de las especificaciones a través del control de materiales, para lo cual se utilizarán los ensayos de laboratorio y control topográfico de las obras y de más controles que pueden observarse en los formatos que se adjunten. * Control de programación y avance de obras, a través de la línea de balance. * Remisión y aprobación y coordinación, de la señalización preventiva que se utilizará en la obra. * Control de recursos, tales como materiales, mano de obra y equipos. * Solución de problemas técnicos de obra. * Medición y revisión de cantidades de obra que será la base de las actas. * Verificación de recursos mínimos, rendimientos y proyecciones periódicas. * Análisis y sugerencias para cambios o modificaciones a los diseños. * Registro permanente de las modificaciones a los diseños y especificaciones, sucedidas durante la construcción y presentar soportes técnicos y planos record, aprobados. * Dar cumplimiento a la resolución 851 de 2009, artículo 3 del trece de marzo de 2009. **B) FUNCIONES ADMINISTRATIVAS:** De igual forma que las funciones técnicas, las administrativas son de especial importancia en el control del contrato. Estudio y aplicación del contrato de Obra, pliegos de condiciones de la selección y anexos, programas de obra, flujos de fondos e inversión del anticipo. * Seguimiento, aprobación y control de las pólizas y garantías del contrato-inter administrativo. * Seguimiento, aprobación y control de anticipos. * Revisión y aprobación de las actas de obra y de reajuste, en el caso que existieren. * Revisión de las actas de obras adicionales, complementarias y sustitutivas con cantidades de obra. * Emitir el concepto sobre los análisis de precios elaborados por el constructor, ítems no previstos. * Coordinación y colaboración a la Supervisión de las empresas de servicios públicos, durante la construcción, para el recibo y aprobación de las obras realizadas por el constructor. * Revisar y aprobar el reglamento de seguridad industrial que se establezca en la obra y velar porque se cumpla permanentemente. * Aprobación de modificaciones y entregar a la Entidad soportes técnicos y planos aprobados. * Elaboración de informes periódicos mensuales divididos en los capítulos descritos en el estudio previo. **C) FUNCIONES AMBIENTALES:** * Velar porque el contratista cumpla los requerimientos de las medidas ambientales generales para cualquier proyecto de obra civil. *

REGISTRADO PRESUPUESTO
FECHA 14/02/2011

DOCUMENTO REVISADO
FECHA 14/02/2011

2819 5

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-25-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 28/09/2009
	MINUTA	VERSION:01

CONTRATO DE CONSULTORIA No. **0303** DEL **14 FEB 2011**

Realizar control y seguimiento ambiental a las actividades de construcción con el fin de evitar impactos no previstos y evitar daños a terceros. * Solicitar al contratista el cumplimiento del programa de seguridad industrial e higiene en el trabajo. * Verificar el alcance de los permisos ambientales, su vigencia y las necesidades de ampliación o modificación de este. * Realizar acciones adelantadas por parte del contratista para minimizar y mitigar impactos. * Hacer cumplir la normatividad ambiental vigente y actos administrativos de CORPORINOQUIA a través del cual se toman y promulgan las decisiones ambientales. **D) LIQUIDACIÓN DE LA OBRA Y DEL CONTRATO:** Otra de las actividades de gran importancia en los procesos de la Interventoría, dentro del manejo administrativo del contrato de construcción, es la liquidación de la obra al cual se le hace la Interventoría, quien vigilará la ejecución de las siguientes actividades: * Presentar actas (informes) mensuales de avance de obra. * Presentar informe y acta final de obra, acta de entrega a la comunidad. * Presentar acta de liquidación final de obra. * Presentar los rendimientos financieros. * Presentar informes de Interventoría Ambiental al Departamento y a CORPORINOQUIA. * Estas actividades se deben realizar mediante la ejecución de los diferentes componentes de cada una, con base en las especificaciones Técnicas particulares y en las especificaciones de la Secretaría de Obras de la Gobernación de Casanare para cada uno de los ítems contemplados. La cronología de actividades se desarrolla con base en el Programa de Obra Propuesto y según las indicaciones del interventor. **TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** 1. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato. 2. Desarrollar las actividades establecidas en la segunda cláusula del presente contrato. 3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 4. Avisar oportunamente al Departamento de las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero del contrato. 5. Atender las observaciones de quien ejerce el control y vigilancia del contrato. 6. Publicar el contrato en la Gaceta Departamental, lo cual deberá acreditar con la presentación del recibo de pago correspondiente conforme a lo señalado en la cláusula Vigésima Quinta de este contrato, así como la constitución de la garantía única. 7. Cumplir con todas las obligaciones derivadas de los lineamientos técnicos y del presente contrato. 8. EL CONTRATISTA deberá cumplir con todas las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta. 9. EL CONTRATISTA deberá acreditar para el pago y liquidación del contrato, el cumplimiento de sus obligaciones y del aporte de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo a los requerimientos de Ley, o por el representante legal, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. **CUARTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** 1. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea del objeto del contrato. 2. Pagar el valor del presente contrato en la forma pactada en el presente contrato. 3. Aprobar la garantía única que en debida forma constituya EL CONTRATISTA. 4. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. **QUINTA. VALOR DEL CONTRATO:** Para todos los efectos legales y fiscales el valor total del presente contrato es CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS (\$138.381.040) M/CTE. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El valor del contrato incluye todos los gastos directos e indirectos en que deba incurrir EL CONTRATISTA para la ejecución del mismo. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El DEPARTAMENTO efectuará los descuentos de Ley del orden Nacional y Departamental según las normas vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el CONTRATISTA al

REGISTRADO PRESUPUESTO

FECHA 14-02-2011

FIRMA

DOCUMENTO REVISADO

FECHA 14-02-2011

FIRMA



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS

MINUTA

CÓDIGO: RAB00-25-I

FECHA: 28/09/2009

VERSION:01

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303 DEL 14 FEB 2011


6
REGISTRADO PRESUPUESTO
2820
FECHA 14 FEB 2011

DEPARTAMENTO, y con la actividad objeto del contrato. **SEXTA - FORMA DE PAGO:** El Departamento cancelará el valor del contrato que llegare a celebrarse al contratista seleccionado así: a) equivalente al 50% sobre el valor total del contrato previa legalización del contrato. b) Los pagos siguientes se efectuarán mediante actas parciales sobre el avance del contrato, con amortización del anticipo, con aprobación de la Supervisión. La suma de todos los pagos parciales no podrá exceder el 90% del valor total del contrato. c) Un pago final correspondiente al saldo que debe ser como mínimo el diez por ciento (10%) del valor del contrato, una vez se suscriba el acta de liquidación del mismo. **SÉPTIMA: PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución de este contrato es CINCO (5) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. **OCTAVA. EXCLUSION DE RELACIÓN LABORAL:** El presente contrato no genera relación laboral alguna con EL CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de costo distinto al valor acordado en la cláusula quinta de este contrato. **NOVENA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El gasto que ocasione el presente contrato se pagará con cargo a: Certificado de disponibilidad presupuestal No. 110312 del 24 de Enero de 2011, por valor de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$138.426.285) M/CTE, con cargo a la imputación presupuestal N° 6.SFIR.G2065603 (\$138.381.040) M/CTE. **DECIMA. GARANTÍA:** EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de EL DEPARTAMENTO garantía única expedida por una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, cuya póliza matriz esté debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera, de acuerdo a los lineamientos señalados en el Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y del Decreto 2493 de 2009 de: **1. Amparo de Cumplimiento:** Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales a su cargo, el pago de la multa y de la cláusula penal pecuniaria y perjuicios derivados del incumplimiento, la cual será equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con vigencia de la duración del proyecto y cuatro (4) meses más. **2. Amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo:** para garantizar el buen manejo y la correcta inversión del anticipo, equivalente al ciento por ciento (100%) del valor dado en tal calidad, y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. **3. Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral:** Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y con vigencia igual a la duración del contrato y tres (3) años más. **4. Calidad del servicio:** El contratista debe allegar una póliza de cumplimiento amparando la calidad del servicio prestado, por un equivalente al 10% del valor del contrato y con una vigencia de seis (6) meses contados a partir de la suscripción del acta de recibo y terminación de la consultoría a entera satisfacción por parte de la Entidad Contratante". **5. Responsabilidad Extracontractual:** Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, y en ningún caso inferior a doscientos (200) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes y por el termino de ejecución del contrato. **PARÁGRAFO - PRIMERO:** EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento, en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. **DECIMA PRIMERA- CLAUSULA DE INDEMNIDAD:** Será obligación del contratista mantener al Departamento de Casanare libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. **DÉCIMA SEGUNDA: APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:** EL CONTRATISTA, deberá acreditar su afiliación y realizar los pagos de los aportes

DOCUMENTO REVISADO

FECHA 14 FEB 2011

2821-7


 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-25-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 28/09/2009
	MINUTA	VERSION:01

REGISTRADO PRESUPUESTO
FECHA 14/02/2011

CONTRATO DE CONSULTORIA No. **0303** DEL **14 FEB 2011**

durante la ejecución del contrato al Sistema de Seguridad Social Integral, (pensión, riesgos profesionales y salud), así como parafiscales, si a ello hubiere lugar de conformidad con las normas vigentes sobre la materia y las que las modifiquen, sustituyan o adicionen. EL CONTRATISTA deberá certificar los pagos de los aportes durante la ejecución y liquidación del contrato a los sistemas de seguridad social integral (pensión, riesgos profesionales y salud), así como parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El Interventor o Supervisor verificará el pago de los aportes a que se refiere la presente cláusula para autorizar cada uno de los pagos derivados del contrato, de lo contrario incurrirá en causal de mala conducta de conformidad con el régimen disciplinario vigente. **DÉCIMA TERCERA: CADUCIDAD:** EL DEPARTAMENTO podrá declarar la caducidad del contrato en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de EL CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización; o cuando EL CONTRATISTA incumpla la obligación establecida en el numeral 5º del Artículo 5º de la Ley 80 de 1993, o celebre pactos o acuerdos prohibidos. **PARAGRAFO PRIMERO.** Ejecutoriado el acto administrativo por el cual se declare la caducidad, el Departamento procederá a hacer efectivas las garantías a que hubiere lugar y procederá a hacer los pagos de los saldos a favor del contratista si a ello hubiere lugar, así como las compensaciones del caso, lo anterior deberá constar en la respectiva acta de liquidación del presente contrato. **DÉCIMA CUARTA- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b) Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no se deriven mayores costos para el DEPARTAMENTO, ni se causen otros perjuicios. La suspensión se hará constar en acta motivada, suscrita por las partes. El término de la suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato. **DÉCIMA QUINTA - MULTA, SANCIONES E INDEMNIZACIONES:** En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales por parte del contratista este autoriza al Departamento a imponer multas por cada día de retraso sin causa justificada equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del contrato sin que estas sobrepasen el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, multa que se impondrá mediante resolución motivada, previo requerimiento de la entidad contratante mediante escrito, señalando las obligaciones incumplidas y el otorgamiento de un término perentorio para la toma de las medidas correctivas correspondientes, so pena de la aplicación de la multa. **PARRAGRAFO:** La multa podrá ser deducida mediante compensación de cualquier saldo de la entidad contratante debiere al contratista, mediante jurisdicción coactiva o haciendo efectiva la garantía de cumplimiento. **DECIMA SEXTA - INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACIÓN UNILATERALES:** El DEPARTAMENTO con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave en la prestación del servicio o realización de la obra, y asegurar su oportuna, continua y adecuada prestación o ejecución, podrá interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el CONTRATO celebrado de conformidad con los artículos 14,15,16 y 17 de Ley 80/93 En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales deberá procederse al reconocimiento y orden del pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas. Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y terminación unilateral, procederá el recurso de reposición sin perjuicio de la acción contractual que

DOCUMENTO REVISADO
FECHA 14-02-2011

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-25-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 28/09/2009
	MINUTA	VERSION:01


CONTRATO DE CONSULTORIA No. **0303** DEL **14 FEB 2011**

puede Interponer el CONTRATISTA, según lo previsto en el artículo 77 de la Ley 80/93. **DÉCIMA SEPTIMA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN:** EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y escrito del Departamento, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión; la cesión se hará de conformidad con lo previsto en el Artículo 887 del Código de Comercio. Tampoco podrá subcontratar la totalidad de la ejecución del presente contrato con persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, en todo caso el contratista es el único responsable por la celebración de subcontratos y el Departamento no adquirirá vínculo alguno con los subcontratistas. **DÉCIMA OCTAVA: LIQUIDACIÓN:** Terminada la ejecución del contrato, se procederá a su liquidación dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del plazo de ejecución y en todo caso se estará a los términos y plazos previstos en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. **DÉCIMA NOVENA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, si llegare a sobrevenir alguna, EL DEPARTAMENTO actuará conforme lo previsto en el Artículo 9 de la Ley 80 de 1993. **VIGESIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Las diferencias y conflictos que surjan en desarrollo del objeto contractual, se solucionarán a través de los mecanismos de solución directa de las controversias contractuales, previstos en el Artículo 68 de la Ley 80 de 1993. **VIGESIMA PRIMERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** Atendiendo a la cuantía del contrato, el Departamento fijará al contratista, proporcionalmente la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, cuando incumpla con el objeto contratado. Dicho valor se imputará a los perjuicios que sufra el Departamento por el incumplimiento del contratista. El valor de la cláusula penal podrá ser tomado directamente por el Departamento de Casanare del saldo a favor del contratista si lo hubiere, mediante jurisdicción coactiva o haciendo efectivas las garantías constituidas. En caso de que las garantías se disminuyeren o agotaren, éstas deberán ser repuestas hasta el monto inicial. **VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ello se cause perjuicio a la Administración o a terceros en los términos del Artículo 52 de la Ley 80 de 1993. **VIGESIMA TERCERA: INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION:** La Interventoría o supervisión estará a cargo del Secretario de Obras Públicas y Transporte o por quien el designe de conformidad con el decreto departamental 0511 de 26 de Junio de 2008; la cual estará sometida a lo dispuesto en el Manual de Interventoría adoptado por la Gobernación de Casanare, mediante la resolución No. 0256 de 2004 o el acto que la modifique o sustituya. **VIGESIMA CUARTA - CAUSALES DE TERMINACION:** Este contrato se dará por terminado en caso de ocurrir cualquiera de los siguientes eventos: 1. Por mutuo acuerdo de las partes siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad. 2. Por declaración de caducidad o terminación unilateral en los términos previstos en los Artículos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. 3. Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. 4) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En caso de terminación anticipada por las causales 1, 3 y 4 se dejarán constancia en Actas suscritas por las partes. En los demás eventos se aplicarán los procedimientos de Ley. **VIGESIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN:** El presente contrato se perfecciona con

2822
REGISTRADO PRESUPUESTO
14 02 2011
FECHA
FIRMA

DOCUMENTO REVISADO
14 02 2011
FECHA
FIRMA

A 283


 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-25-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 28/09/2009
	MINUTA	VERSION:01

REGISTRADO PRESUPUESTO
12 FEB 2011
FECHA
FIRMA


CONTRATO DE CONSULTORIA No. **0303** DEL **14 FEB 2011**

la firma de las partes. Para su ejecución requiere la aprobación de los mecanismos de cobertura del contrato o garantía única por parte del Departamento y el registro presupuestal. Para su legalización se necesita: 1) Publicación del contrato por parte del CONTRATISTA en la Gaceta departamental, requisito que se entenderá cumplido con la presentación del recibo de pago; 2) Pago de las estampillas que contemple el estatuto de rentas Departamental. 3) La certificación vigente sobre el pago de aportes parafiscales y de seguridad social de los trabajadores a cargo, por parte del contratista, si a ello hubiere lugar. **PARÁGRAFO PRIMERO- COSTOS:** Los costos que ocasione la legalización de este contrato estarán a cargo del CONTRATISTA. Éste deberá realizar dicha legalización dentro de los diez (10) hábiles siguientes a al perfeccionamiento del contrato. **VIGÉSIMA SEXTA: DOMICILIO:** Para todos los efectos se tiene como domicilio la Ciudad de Yopal, para constancia se firma, a los

14 FEB 2011


RODRIGO FLECHAS RAMIREZ
Director de Contratación


LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMENEZ
RL/ CONSORCIO MATAGUASAN

Proyectó: 
CARLOS SILVA
Dirección de Contratación

DOCUMENTO REVISADO
14-02-2011
FECHA
FIRMA

10

GOBERNACION DE CASANARE

Nit : 892099216

YOPAL, 24-ENE-2011

Pagina : 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Documento: 01-CD CERTIFICADO DISPONIBILIDAD

Número : 110312

División: 01-06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Concepto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Fecha: 24-ENE-2011

Vence: 31-DIC-2011

Cuenta	Descripción	Valor
6.SFIR.G2005603	Procesos de Contratacion 2010 (Ley 819/2003)	138.426.285,00

Total : 138.426.285,00

LUZ AMPARO ARIZA SUAREZ

APRUEBA

Digito: BETOG

Documento 01-CO CONTRATOS Numero. [1100303]

Fecha: 14-02-2011

Division 01-06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Tercero 900412456 CONSORCIO MATAGUASAN

Concepto INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Cuenta	Descripción	Valor
6.SFIR.G2065603	Procesos de Contratacion 2010 (Ley 819/2	138,381,040.00
Total :		138,381,040.00

LUZ AMPARO ARIZA SUAREZ

APRUEBA

Digitó: HUMBERTO

689

12

+2

2826

Documento 01-CO CONTRATOS Numero. [1100303]


Fecha: 14-02-2011

Division 01-06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Tercero 900412456 CONSORCIO MATAGUASAN

Concepto INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO
VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA
DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Cuenta	Descripción	Valor
.SPIR.G2065603	Procesos de Contratacion 2010 (Ley 819/2	138,381,040.00
Total :		138,381,040.00


LUZ AMPARO ARIZA SUAREZ

APRUEBA

Digitó: HUMBERTO

688



GOBERNACIÓN DE CASANARE
SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT. 892.099.216-6

FECHA

14-MAR-2011

RECIBO DE CAJA

332624

332624

RECIBIDO DE:

CONSORCIO MATAGUASAN

LA SUMA DE:

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE -

POR CONCEPTO DE:

DERECHO DE LA ORDENANZA 011-2009, POR PAGO DE ESTAMPILLA PROOCULTURA,
ADULTO MAYOR Y PUBLICACIÓN DEL CONTRATO No.0303 DEL 2011 DE LA
GOBERNACIÓN DE CASANARE.





NIT. 600.000.000
900412456

MULTIGRAFICAS - JAIRO MENES P. - NIT. 19.391.927-7





FORMA DE RECIBO		VALORES	IMPUTACION CONTABLE		
EFFECTIVO			CODIGO CUENTA	DEBITO	CREDITO
No. CHEQUE	BANGO	<div>RECEIVED 14 JUN 1971 14 JUN 1971 No. 4 AUS. POR CAJA</div>	110501	6,494,000.00	3,200.00
			411001003		1,384,000.00
			411027001		4,151,000.00
			411027002		955,800.00
			411032		
TOTALES			6,494,000.00	6,494,000.00	

2827 I

44B
2829

 DIAN® <small>Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales</small>	Formulario del Registro Único Tributario		001
Espacio reservado para la DIAN 		Página 2 de 4 Hoja 2 4. Número de formulario 14367478757  <small>(415)7707212489984(8020) 000001436747875 7</small>	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 4 1 2 4 5 6 - 8		6. DV: 8	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Yopai
		14. Buzón electrónico (44)	
Características y formas de las organizaciones			
62. Naturaleza: <input type="checkbox"/> 2 65. Fondos: <input type="checkbox"/> 68. Sin personería jurídica: <input type="checkbox"/> 3	63. Formas asociativas: <input type="checkbox"/> 66. Cooperativas: <input type="checkbox"/> 69. Otras organizaciones no clasificadas: <input type="checkbox"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados 67. Solventes y organismos extranjeros: <input type="checkbox"/> 70. Beneficio: <input type="checkbox"/> 1	
Constitución, Registro y Última Reforma		Composición del Capital	
Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase:	0, 4		82. Nacional: <input type="checkbox"/> 0 %
72. Número:			83. Nacional público: <input type="checkbox"/> 0 %
73. Fecha:	2 0 1 0 1 2 0 7		84. Nacional privado: <input type="checkbox"/> 0 %
74. Número de Notaría:			85. Extranjero: <input type="checkbox"/> 0 %
75. Entidad de registro:	9, 9		86. Extranjero público: <input type="checkbox"/> 0 %
76. Fecha de registro:	2 0 1 1 0 2 0 8		87. Extranjero privado: <input type="checkbox"/> 0 %
77. No. Matrícula mercantil:			
78. Departamento:	8, 5		
79. Ciudad/Municipio:	0, 1, 0		
Vigencia:			
80. Desde:			
81. Hasta:			
Entidad de vigilancia y control			
88. Entidad de vigilancia y control: <input type="checkbox"/>			
Estado y Beneficio			
Item	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vinculación económica			
93. Vinculación económica: <input type="checkbox"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial:		95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:
96. DV: -			
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante:			
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.			





14c
2830

 DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		Formulario del Registro Único Tributario Representación		 001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 3 de 4 Hoja 3		
			4. Número de formulario 14367478757		
 (415)7707212489984(8020) 000001436747875 7					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 4 1 2 4 5 6 - 8		6. DV: 8		12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopal	
				14. Buzón electrónico: (4) 4	
Representación					
98. Representación: REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 1 1 0 3 2 3			
100. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía		101. Número de identificación: 7 9 7 4 3 5 9 3			
102. DV: 1		103. Número de tarjeta profesional:			
104. Primer apellido: ROJAS		105. Segundo apellido: ARGUELLES		106. Primer nombre: CARLOS	
				107. Otros nombres: MAURICIO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):		109. DV:		110. Razón social representante legal:	
2					
98. Representación:		99. Fecha inicio ejercicio representación:			
100. Tipo de documento:		101. Número de identificación:			
102. DV:		103. Número de tarjeta profesional:			
104. Primer apellido:		105. Segundo apellido:		106. Primer nombre:	
				107. Otros nombres:	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):		109. DV:		110. Razón social representante legal:	
3					
98. Representación:		99. Fecha inicio ejercicio representación:			
100. Tipo de documento:		101. Número de identificación:			
102. DV:		103. Número de tarjeta profesional:			
104. Primer apellido:		105. Segundo apellido:		106. Primer nombre:	
				107. Otros nombres:	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):		109. DV:		110. Razón social representante legal:	
4					
98. Representación:		99. Fecha inicio ejercicio representación:			
100. Tipo de documento:		101. Número de identificación:			
102. DV:		103. Número de tarjeta profesional:			
104. Primer apellido:		105. Segundo apellido:		106. Primer nombre:	
				107. Otros nombres:	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):		109. DV:		110. Razón social representante legal:	
5					
98. Representación:		99. Fecha inicio ejercicio representación:			
100. Tipo de documento:		101. Número de identificación:			
102. DV:		103. Número de tarjeta profesional:			
104. Primer apellido:		105. Segundo apellido:		106. Primer nombre:	
				107. Otros nombres:	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):		109. DV:		110. Razón social representante legal:	

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

17

2831
140

		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales		 Unión de Juntas de Ingresos, Rendimientos y Control Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 4			
				4. Número de formulario 14367478757			
 (415)7707212489984(8020) 000001436747875 7							
5. Número de identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 4 1 2 4 5 6 - 8		6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Yopal		14. Buzón electrónico (415)	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
111. Tipo de documento: NIT		112. Número de identificación: 3 1 8 4 4 0 0 1 7 2 0		113. DV 1		114. Nacionalidad: COLOMBIA	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DIARCO S.A.S.							
120. Valor capital del socio:		121. % Participación: 9 0		122. Fecha de ingreso: 2 0 1 0 1 2 0 7		123. Fecha de retiro:	
111. Tipo de documento: NIT		112. Número de identificación: 3 1 9 0 0 1 0 5 1 3 4		113. DV 5		114. Nacionalidad: COLOMBIA	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERIA LTDA EPICO INGENIERIA LTDA							
120. Valor capital del socio:		121. % Participación: 1 0		122. Fecha de ingreso: 2 0 1 0 1 2 0 7		123. Fecha de retiro:	
111. Tipo de documento:		112. Número de identificación:		113. DV		114. Nacionalidad:	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio:		121. % Participación:		122. Fecha de ingreso:		123. Fecha de retiro:	
111. Tipo de documento:		112. Número de identificación:		113. DV		114. Nacionalidad:	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio:		121. % Participación:		122. Fecha de ingreso:		123. Fecha de retiro:	
111. Tipo de documento:		112. Número de identificación:		113. DV		114. Nacionalidad:	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio:		121. % Participación:		122. Fecha de ingreso:		123. Fecha de retiro:	
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.							



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

74
2832

Espacio reservado para la DIAN



2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14146690187



(415)7707212489984(8020) 000001414669018 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 4 1 2 4 5 6

8

Impuestos y Aduanas de Yopal

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

CONSORCIO MATAGUASAN

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

39. Departamento:

Casanare

40. Ciudad/Municipio:

Aguazul

0 1 0

41. Dirección

CR 15 A 22 99

42. Correo electrónico:

crojas192@hotmail.com

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1:

45. Teléfono 2:

3 1 0 3 3 4 3 2 0 5

6 3 8 2 3 0 9

CLASIFICACION

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código:

47. Fecha inicio actividad:

48. Código:

49. Fecha inicio actividad:

50. Código:

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades

53. Código:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	9	1	1	4													

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las v

11- Ventas régimen común

14- Informante de exogena

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos:

SI

X

NO

60. No. de folios:

4

61. Fecha:

2 0 1 1 0 3 3 1

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante:

7-1 7/2/11

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

P/P Diana Velasco

984. Nombre CAMACHO BAUTISTA EDILMA

985. Cargo: Gestor I

702 19

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14146690187



(415)7707212489984(8020) 000001414669018 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bogotá

14. Buzón electrónico

9 0 0 4 1 2 4 5 6

8

Representación

98. Representación:
REPRS LEGAL PRIN

99. Fecha inicio ejercicio representación:

1 8

2 0 1 1 0 3 2 3

100. Tipo de documento:

101. Número de identificación:

Cédula de ciudadanía

1 3

7 9 7 4 3 5 9 3

102. DV 103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

ROJAS

ARGUELLES

CARLOS

MAURICIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:

101. Número de identificación:

102. DV 103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:

101. Número de identificación:

102. DV 103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:

101. Número de identificación:

102. DV 103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:

101. Número de identificación:

102. DV 103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV


110. Razón social representante legal

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

2834
+6

NO APLICA ES CONTRATO DE CONSULTORIA

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: GGD00-04-1
	PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	FECHA: 05/012/08
	MEMORANDO	VERSION:01-

2835⁺⁷

700 46-05 No.0333

Yopal, Abril 27 de 2011

PARA : ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
Profesional Contratado No.1847/10

DE: SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE

ASUNTO: DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.0303-11

Dando estricto cumplimiento a lo establecido en el Decreto 511 del 26 de Junio de 2008 y/o Decreto 193/09 y lo contenido en la CLAUSULA VIGESIMA TERCERA; me permito comunicarle que ha sido designado para ejercer la SUPERVISIÓN por parte de la Secretaria de Obras Públicas y Transporte, cumpliendo con las OBLIGACIONES propias de su contrato al contrato de la referencia y cuyas generalidades son como siguen:

CONTRATO DE CONSULTORIA No.0303/11

CONTRATISTA : CONSORCIO MATAGUASAN
R/L : LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMENEZ

NIT. 900412456-8

OBJETO : INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAS
AGUALINDA Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO
PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE
PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PLAZO : CINCO (05) MESES

VALOR : \$138.381.040.00

En ejecución del acto contractual, se hace necesario dar cabal cumplimiento a las obligaciones que se derivan del respectivo contrato, las contenidas en el Manual de Interventoría y todas aquellas que se requieran para su normal desarrollo. Así mismo será de carácter obligatorio la presentación del informe mensual sobre el avance y estado del acto principal al igual que el reporte de cualquier anomalía a la Dirección de Contratación y/o Oficina Asesora Jurídica para lo de sus obligaciones.

Favor presentarse ante la Comunidad Beneficiada, la J.A.C. con el fin de socializar el proyecto, dejando constancia de la reunión, mediante un acta de visita de obra que deben firmar autoridad municipal, SUPERVISIÓN y contratista antes del inicio de la obra.

Se anexa para el desempeño de sus obligaciones, copia del Contrato, copia CDP., Estudios Previos, pago de estampilla Pro cultura, adulto mayor y publicación del contrato, pólizas aprobadas y demás documentos soportes.

Atentamente,

ING. ARMANDO ALFREDO VARGAS FUENTES
Secretario de Obras Públicas y Transporte

Proyectó : Yelanda G.S

GESTIÓN DOCUMENTAL


Original: Ing. Agustín González

1ª Copia: Despacho Secretario de Obras

2ª Copia: Unidad contratación - Gobernación de Casanare

3ª Copia: D.T.C

Edificio Emiro Sossa Pacheco Carrera 19 No.6-100 Tel. 6358497 Ext. 210 Yopal Casanare
web: <http://www.casanare.gov.co>




RECIBIDO
45406/011
9:50 PM

204 22

2836
18

Yopal, 31 de Marzo de 2011

Doctora
YENNY CONSUELO BARRERA
Directora Unidad de Contratación
Gobernación de Casanare
Ciudad.



Asunto Designación de Supervisión Contrato de Consultoría
N0.0303-2011.

Cordial saludo Doctora Jenny.

Comedidamente me permito solicitarle su colaboración en el sentido de remitir la carpeta del contrato del asunto, a la Dirección Técnica de Construcciones con el fin de que se le designe la respectiva supervisión.

Agradezco su gentil colaboración

ANEXO: AZ con DOCUMENTACIÓN CONTRATO

Atentamente


CARLOS MAURICIO ROJAS
R/L CONSORCIO MATAGUASAN

703

28



**Aseguradora Solidaria
de Colombia**

741 659524654-6

NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
6050594859

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES

PÓLIZA No: 605-47-994000005192 ANEXO: 10

[illegible]

GIRO LE NEGOCIO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASIGNADA
CONTRATO	28/02/2011	25/02/2011	13,839,104.00
CUMPLIMIENTO	28/02/2011	25/02/2011	62,178,500.00
ANTICIPIO	28/02/2011	24/10/2011	5,913,600.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INC	28/02/2011	27/04/2011	13,839,104.00
CALIDAD DEL SERVICIO	28/02/2011	27/04/2011	

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

911 200103131 - ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERIA LEON - ENSE
912 001
912 044901100 - DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DIANES S.A.S. - POST: 50.000

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR
SUBJECT: [Illegible]

COPIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO

80

MANIFIESTA EL PRESUNTO ANEXO DE DA TRICHO AL ANEXO DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LA EMPRESA DE LA CUBA

FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2013

PONARE

VIGENCIA DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 27/04/2016

NOTA: DADO LO DEMAS DE MODIFICADO CONTINUA VIGENTE

[illegible]

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página www.solidaria.com.co servicios en línea, o bien consulte su póliza de cumplimiento.

FIRMA ASEGURADOR

FIRMA TOMADOR


FIRMA ASEGURADOR
DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA CEN 10014 SA-45 F038 y 12 B0245 CLIENTE

0806197-00000000

25




Aseguradora Solidaria
de Colombia
NIT. 860.524.654 - 6



2839

RECIBO DE CAJA No. 605005455

AGENCIA YOPAL	TRANSACCIÓN No. 605005456	FECHA DE RECIBO 20/06/2013	TIPO PAGADOR ASEGURADO
NOMBRE PAGADOR CONSORCIO MATAGUASAN ✓			C.C. O NIT 900.412.456-8
DETALLE DEL PAGO PAGO PÓLIZA No 605-47-994000005192-9 Y 605-74-994000001311-6. ✓			
VALOR EN LETRAS (en pesos) DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE			VALOR \$ 252.898
TIPO PAGO: EFECTIVO 252.898,00			
			
FIRMA RECIBIDO PAGO			

~~SECRET~~

26

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES

**NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
605059485-9**

PÓLIZA No: 605-47-994000005192 ANEXO: 9

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL

COD. AGENCIA: 605 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	06	2013	20	06	2013

FECHA DE EXPEICCIÓN

FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CONSORCIO MATAGUASAN

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.412.456-8

DIRECCIÓN: CRA 13 N 14 09

CIUDAD: AGUAZUL, CASANARE

TELÉFONO: 3103295924

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE

IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.216-6

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE CASANARE

IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.216-6

AMPAROS

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	28/02/2011	25/02/2014	13,838,104.00
ANTICIPO	28/02/2011	25/02/2014	69,190,520.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	28/02/2011	24/10/2016	6,919,052.00
CALIDAD DEL SERVICIO	28/02/2011	27/04/2014	13,838,104.00

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 900105134 - EPICO INGENIERIA LTDA - PART: 10.00%
NIT 844001720 - DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DIARCO LTDA. - PART: 90.00%

BENEFICIARIOS

NIT 892099216 - DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS EN CINCO MESES A LOS AMPAROS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE CONFORMIDAD AL ADICIONAL EN PLAZO No 2 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA N° 003 DEL 14 DE FEBRERO DE 2011 REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE según las coberturas aquí indicadas.

NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFICACION.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***103,785,780.00	VALOR PRIVA: \$ *****78,308.00	GASTOS EXPEDICION: \$*****5,000.00	IVA: \$ ****13,329.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****86,638.00		
NOMBRE INTERMEDIARIO NUBIA STELLA ARIAS		CLAVE 3639	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO 	%PART 	VALOR ASEGURADO

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página www.solidaria.com.co servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento.



FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(2020)00000000007000605059485

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CAREVALO 0

3133670392
Nestor Fernan

775

27

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

2841
27

NUMERO ELECTRONICO PARA PAGOS
605021358-3

PÓLIZA No: 605-74-994000001311

ANEXO:6

AGENCIA EXP.: YOPAL

COD. AGE: 605 RAMO: 74 PAP:

DIA MES AÑO
20 06 2013

DIA MES AÑO HORAS
27 05 2013 23:59

DIA MES AÑO HORAS
27 10 2013 23:59 153

DIA MES AÑO
20 06 2013

FECHA DE EXPEDICIÓN

VIGENCIA DESDE

A LAS

VIGENCIA HASTA

A LAS

DÍAS

FECHA DE IMPRESIÓN

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO MATAGUASAN

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.412.456-8

DIRECCIÓN: CRA 13 N 14 09

CIUDAD: AGUAZUL, CASANARE

TÉLEFONO: 3103295924

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE

IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.216-6

DIRECCIÓN: CRA 19 NO 6-100

CIUDAD: YOPAL, CASANARE

TÉLEFONO: 6358496

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT : 892099216

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CASANARE

CIUDAD: PORE

DIRECCIÓN: VEREDA AGUALINDA No. -

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD

CONSTRUCCION: NO APLICA PARA ESTE RAMO

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL

MANZANA:

DESCRIPCION AMPAROS

SUMA ASEGURADA % INVAR

SUBLIMITE

CONTRATO PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

\$ 107,120,000.00
107,120,000.00

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS

NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA EN CINCO MESES AL AMPARO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE CONFORMIDAD AL ADICIONAL EN PLAZO No 2 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2013 SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA N°0303 DEL 14 DE FEBRERO DE 2011 REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE según las coberturas aquí indicadas.

NOTA: *SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE AMPARO ES: DESDE 28/02/2011 HASTA 27/10/2013.
*LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFICACION.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***107,120,000.00	VALOR PRIMA: \$ *****134,707.00	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ ****21,553.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****156,260.00
--	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

INTERMEDIARIO		CLAVE	%PART	COASEGURO CEDIDO		VALOR ASEGURADO
NOMBRE	NUBIA STELLA ARIAS	3639	100.00	NOMBRE COMPAÑIA	%PART	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTOA. ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)00000000007000605021358

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá


CLIENTE



CAREVALO 0

774 28

RECIBO DE CAJA No. 605005382

AGENCIA YOPAL	TRANSACCIÓN No. 605005382	FECHA DE RECIBO 07/12/2012	TIPO PAGADOR ASEGURADO
NOMBRE PAGADOR CONSORCIO MATAGUASAN			C.C. O NIT 900412456-8
DETALLE DEL PAGO PAGO PÓLIZA ESTATAL 994000005192(8) - 994000001311(6)			
VALOR EN LETRAS (en pesos) CIENTO NOVENTAY CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MATE			VALOR \$ 194.396,00
TIPO PAGO: EFECTIVO 194.396,00			
 FIRMA RECIBIDO PAGO			

Recibi
 Paga
 14/11/13
 H. 03:52 pm

771

605021350-0

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES

2843
23
Aseguradora Solidaria
de Colombia
NIT. 860.524.654 - 6

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia
confirma la información de los clientes a través
del Call Center, por favor tenga en cuenta que
será contactado para realizar el procedimiento

PÓLIZA No: 605-47-994000005192 ANEXO: 8

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL	COD. AGENCIA: 605 RAMO: 47	DIA MES AÑO 07 12 2012	DIA MES AÑO 07 12 2012
TIPO DE NOVIMIENTO: PRORROGA	TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION	FECHA DE EXPOSICIÓN	FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO		IDENTIFICACIÓN: NIT	900.412.456-8
NOMBRE: CONSORCIO MATAGUASAN	CUIDAD: AGUÁZUL, CASANARE	TELÉFONO:	3103295924
DIRECCIÓN: CRA 13 H 14 09			

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO		IDENTIFICACIÓN: NIT	892.099.216-6
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE		IDENTIFICACIÓN: NIT	892.099.216-6
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE CASANARE			

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	28/02/2011	27/09/2013	13,838,104.00
ANTICIPO	28/02/2011	27/09/2013	69,190,520.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	28/02/2011	27/05/2016	6,919,052.00
CALIDAD DEL SERVICIO	28/02/2011	27/11/2013	13,838,104.00

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 900105134 - EPICO INGENIERIA LTDA - PART: 10.00%
NIT 844001720 - DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DIARCO LTDA. - PART: 90.00%

BENEFICIARIOS

NIT 892099216 - DEPARTAMENTO DE CASANARE

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE PRORROGA LA VIGENCIA A LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGÚN ADICIONAL EN PLAZO
DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No 0303 DE 2011.
ADICIONAL EN PLAZO: CUATRO (4) MESES. TODO LO DEMAS NO MODIFICADO CONTINUA VIGENTE.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***103,785,780.00	VALOR PRIMA: \$ *****61,930.00	GASTOS EXPEDICIÓN: \$ *****0.00	IVA: \$ *****9,909.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****71,839.00
--	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

INTERMEDIARIO			COASEGURO CEDIDO		
NOMBRE HUBIA STELLA ARIAS	CLAVE 3639	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

FIRMA ASEGURADOR	(415)7701861000019(8020)0000000000070000605021350	FIRMA TOMADOR
------------------	---	---------------

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CAREVALO 0

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

760

30

2844
24

PARA PAGOS ELECTRONICOS O
EN ENTIDADES FINANCIERAS
CITE ESTE NUMERO DE REFERENCIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL


Aseguradora Solidaria
de Colombia
NIT. 860.574.634 - 6

605021358-3

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia
confirma la información de los clientes a través
del Call Center, por favor tenga en cuenta que
será contactado para realizar el procedimiento.

PÓLIZA No: 605-74-994000001311 ANEXO:5

AGENCIA EXP: YOPAL				COD. AGE: 605				RAMO: 74				PAP:			
DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	
07	12	2012		27	01	2013	23:59	27	05	2013	23:59	120	07	12	2012
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				FECHA DE IMPRESIÓN			
TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA												TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESIÓN			

DATOS DEL TOMADOR	
NOBRE: CONSORCIO MATAGUASAN	IDENTIFICACIÓN: NIT 900.412.456-8
DIRECCIÓN: CRA 13 N 14 09	TELÉFONO: 3103295924
CIUDAD: AGUAZUL, CASANARE	

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO	
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE	IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.216-6
DIRECCIÓN: CRA 19 NO 6-100	TELÉFONO: 6358496
CIUDAD: YOPAL, CASANARE	
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS-MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE CULTURA	IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS	
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE	NIT : 892099216
ITEM: 1	DEPARTAMENTO: CASANARE
DIRECCIÓN: VEREDA AGUALINDA No. -	CIUDAD: PORE
ACTIVIDAD: ACTIVIDAD	
CONSTRUCCION: NO APLICA PARA ESTE RAMO	
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO	TIPO DE RIESGO: ESTATAL
MANZANA:	
DESCRIPCION	AMPAROS
CONTRATO	SUMA ASEGURADA % INVAR
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$ 107,120,000.00
	107,120,000.00
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	
BENEFICIARIOS	
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS	

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE PRORROGA LA VIGENCIA A LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGÚN ADICIONAL EN PLAZO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No 0303 DE 2011.

ADICIONAL EN PLAZO: CUATRO (4) MESES.

TODO LO DEMAS NO MODIFICADO CONTINUA VIGENTE.

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR
\$ ***107,120,000.00	\$ *****105,653.00	\$*****0.00	\$ ***16,904.00	\$ *****122,557.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE	CLAVE	NOMBRE COMPAÑIA	VALOR ASEGURADO
NOBIA STELLA ARTAS	3639		

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

[415]7701861000019[8020]0000000000070000605021358

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

NARIAS O

705

34

GRAN CONTRIBUYENTE RES-2593 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

25
2845

605021350-0

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES



Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia continúa la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

PÓLIZA No: 605-47-994000005192 ANEXO: 7

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAI
TFO DE MOVIMIENTO: PRORROGA
DIA 06 MES 10 AÑO 2012
TFO DE IMPRESION: REIMPRESION
DIA 30 MES 10 AÑO 2012
FECHA DE IMPRESION

INGRESO: CONSORCIO NATALIA CASANARE
DIRECCION: CRA 13 N 14 09
GOBIERNO DE CASANARE
Oficina Asesora Jurídica
Aprobación de Póliza
CUIDO: AGUASQUEL, CASANARE
SEDEAD DEL OFRECIMIENTO
NIT 900.412.456-8
TELÉFONO: 3103295924

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE CASANARE
PAGO ANTICIPADO
DATOS DEL ASEGURADO Y REPRESENTACIONES
RESPONSABLE DEL EXTRA CONTRACTUAL
NIT 892.099.216-6
IDENTIFICACION: NIT 892.099.216-6

DESCRIPCION	AMPAROS	AMPAROS	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	28/02/2011	27/05/2013	13,838,104.00
ANTICIPO	28/02/2011	27/05/2013	69,190,520.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND.	28/02/2011	27/01/2016	6,919,052.00
CALIDAD DEL SERVICIO	28/02/2011	27/07/2013	13,838,104.00

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS
NIT 900105134 - EPICO INGENIERIA LTDA - PART: 10.004
NIT 844001720 - DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DIARCO LTDA. - PART: 90.006

BENEFICIARIOS
NIT 892099216 - DEPARTAMENTO DE CASANARE

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN RESUMEN DE LAS SIGUIENTES ACTAS ASI:
1.- ORDEN DE INICIACION DEL 06 DE MAYO D 2011
2.- ACTA N° 3 DE SUSPENSION N° 1 DEL 14 DE JUNIO DE 2011 - ORDEN DE REINICIACION N° 1 DEL 12 DE AGOSTO DE 2011
3.- ACTA N° 5 DE SUSPENSION N° 2 DEL 16/08/2011
4.- ACTA N° 6 DE AMPLIACION N° 1 A LA SUSPENSION N° 2 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011
5.- ACTA N° 7 ORDEN DE REINICIACION N° 2 DEL 30 DE ENERO DE 2012
6.- ACTA N° 8 DE SUSPENSION N° 3 DEL 25 DE ABRIL DE 2012
7.- ACTA N° 9 DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3 DEL 24 DE AGOSTO DE 2012

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PAGAR	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
\$ ***103,785,780.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00

INTERMEDIARIO	CLAVE	MPART	COMPAÑIA	MPART	VALOR ASEGURADO
NUBIA STELLA ARIAS	3639	100.00			

FIRMA ASEGURADOR
FIRMA TOMADOR
DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá
CLIENTE
NARIAS O

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2569 DIC03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6901 ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

759

2846
26

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES


Aseguradora Solidaria
de Colombia
NIT. 860.524.654-6

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EMISORA: YOPAL COD. AGENCIA: 605 RAZON: 47 IN POLIZA: 994000005192 ANEXO: 7

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO MONTAGUESEN IDENTIFICACION: NIT 900.412.456-8
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE IDENTIFICACION: NIT 892.099.216-6
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE CASANARE IDENTIFICACION: NIT 892.099.216-6


TEXTO ITEM 1

2.- ACTA N° 10 DE ORDEN DE REINICIACION N° 3 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2012
SUSPENSION DESDE EL 14/06/2011 HASTA 08/10/2012 = 402 DIAS
PLAZO EJECUCION CINCO MESES = 150 DIAS
VIGENCIA CONTRATO = 4 MESES = 120 DIAS
PLAZO ENTRE EJECUCION Y ACTA DE INICIO = 67 DIAS (06/05/2011)
TOTAL DE 842 DIAS
VIGENCIAS TOTALES
CUMPLIMIENTO DESDE 28/02/2011 HASTA 27/05/2013 = 819 DIAS
ANTICIPO DESDE 28/02/2011 HASTA 27/05/2013 = 819 DIAS
PREST. SOC. DESDE 28/02/2011 HASTA 27/01/2016 = 1794 DIAS
CALIDAD DESDE 28/02/2011 HASTA 27/07/2013 = 880 DIAS
TODO LO DEMAS NO MODIFICACION CONTINUA VIGENTE

CLIENTE

758
33

2847
27



POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Aseguradora Solidaria
de Colombia
NIT. 860.514.611-6

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia
confirma la información de los clientes a través
del Call Center, por favor tenga en cuenta que
será contactado para realizar el procedimiento.

PÓLIZA No: 605-74-994000001311

ANEXO: 4

AGENCIA EXP: YOPAL	CON. AGE: 605	RAMO: 74	PAI:
DIA MES AÑO 30 10 2012	DIA MES AÑO HORAS 30 06 2012 23:59	DIA MES AÑO HORAS 27 01 2013 23:59	DIA MES AÑO 30 10 2012
FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA A LAS	FECHA DE IMPRESIÓN
TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA		TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESIÓN	

NOMBRE: CONSORCIO MATAGUASAN	IDENTIFICACIÓN: NIT 900.412.456-8
DIRECCIÓN: CRA 13 N 14 09	CIUDAD: AGUAZUL, CASANARE
	TELÉFONO: 3103295924

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE	DIRECCIÓN: CRA 19 NO 6-100	DEPARTAMENTO DE CASANARE	CIUDAD: AGUAZUL, CASANARE	IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.216-6
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS		GOBERNACIÓN DE CASANARE		TELÉFONO: 6358496
		CIUDAD: AGUAZUL, CASANARE		IDENTIFICACIÓN: NIT 001-0

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE	ITEM: 1	DEPARTAMENTO: CASANARE	DIRECCIÓN: VEREDA AGUALINDA No. 11	ACTIVIDAD: ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN: NO APLICA PARA ESTE RAMO	TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO
DESCRIPCIÓN		AMPAROS		SUMA ASEGURADA % INVAR		SUBLÍMITE
CONTRATO		PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES		107,120,000.00		107,120,000.00
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES						

BENEFICIARIOS	
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS	

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN RESUMEN DE LAS SIGUIENTES ACTAS ASI:

- 1.- ORDEN DE INICIACIÓN DEL 06 DE MAYO DE 2011
- 2.- ACTA N° 3 DE SUSPENSIÓN N° 1 DEL 14 DE JUNIO DE 2011 - ORDEN DE REINICIACIÓN N° 1 DEL 12 DE AGOSTO DE 2011
- 3.- ACTA N° 5 DE SUSPENSIÓN N° 2 DEL 16/08/2011
- 4.- ACTA N° 6 DE AMPLIACIÓN N° 1 A LA SUSPENSIÓN N° 2 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2011
- 5.- ACTA N° 7 ORDEN DE REINICIACIÓN N° 2 DEL 30 DE ENERO DE 2012
- 6.- ACTA N° 8 DE SUSPENSIÓN N° 3 DEL 25 DE ABRIL DE 2012
- 7.- ACTA N° 9 DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN N° 3 DEL 24 DE AGOSTO DE 2012
- 8.- ACTA N° 10 DE ORDEN DE REINICIACIÓN N° 3 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2012

SUSPENSIÓN DESDE EL 14/06/2011 HASTA 08/10/2012 = 482 DÍAS
PLAZO EJECUCIÓN CINCO MESES 150 DÍAS
PLAZO ENTRE EJECUCIÓN Y ACTA DE INICIO 67 DÍAS (06/05/2011)

VALOR ASEGURADO TOTAL \$ ***107,120,000.00	VALOR PRIMA \$ *****0.00	GASTOS EMISIÓN \$ *****0.00	IVA \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR \$ *****0.00
NOMBRE INTERMEDIARIO HUBIA STELLA ARIAS	CLAVE 3639	*PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	*PART VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDIAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.		FIRMA ASEGURADOR	FIRMA TOMADOR
--	--	------------------	---------------

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

HARIAS 6

757 34

2848
28

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL



DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: TOTALI CON.AGENCIA: 605 RANVO: 74 No POLIZA: 991000001311 ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO MANTAGUASAH IDENTIFICACION: INT 900,412,456-8
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CAGAHARE IDENTIFICACION: INT 092,099,216-6
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACION: INT 001-8

TEXTO ITEM 1

TOTAL DE 942 DIAS
VIGENCIAS TOTALES
RESP CIVIL DESDE 26/02/2011 HASTA 27/01/2013 = 659 DIAS
TODAS LAS VIGENCIAS NO MODIFICADO CONTINUA VIGENTE

CLIENTE

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES

2849
29

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia
confirma la información de los clientes a través
del Call Center, por favor tenga en cuenta que
será contactado para realizar el procedimiento

PÓLIZA No: 605-47-994000005192 ANEXO: 6

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL

COD. AGENCIA: 605 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

DIA	MES	AÑO
16	02	2012

FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA	MES	AÑO
16	02	2012

FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CONSORCIO MATAGUASAN

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.412.456-8

DIRECCIÓN: CRA 13 N 14 09

CIUDAD: AGUAZUL, CASANARE

TÉLEFONO: 3103295924

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE

IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.216-6

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE CASANARE

IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.216-6

AMPAROS

DESCRIPCIÓN AMPAROS

	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO	28/02/2011	30/10/2012	13,838,104.00
CUMPLIMIENTO	28/02/2011	30/10/2012	69,190,520.00
ANTICIPO	28/02/2011	30/06/2015	6,919,052.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	28/02/2011	30/12/2012	13,838,104.00
CALIDAD DEL SERVICIO			

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 900105134	-	EPICO INGENIERIA LTDA	-	PART: 10.00%	-	PART: 90.00%
NIT 844001720	-	DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DIARCO LTDA.	-		-	

POR EL PRESENTE CERTIFICADO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN ACTA No 05 DE SUSPENSIÓN N°2 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2011, ACTA No 06 DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2011, Y ACTA N°7 DE REINICIACIÓN DE FECHA 30 DE ENERO DE 2012. LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN INMODIFICABLES.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ***103,785,780.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00

INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO
NJBIA STELLA ARIAS	3639	100.00			

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701851000019(8020)000000000007000605021350

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá


CLIENTE

NARIAS 0

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2503 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

7/10

36



POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES

Aseguradora Solidaria
de Colombia
NIT. 860.514.654 - 6

2850
31

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia
confirma la información de los clientes a través
del Call Center, por favor tenga en cuenta que
será contactado para realizar el procedimiento

PÓLIZA No: 605-47-994000005192 ANEXO: 3

AGENCIA EXPE/DORA: YOPAL	COO. AGENCIA: 605 RAMO: 47	DIA MES AÑO 07 09 2011	DIA MES AÑO 07 09 2011
TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION	TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE IMPRESIÓN

NOMBRE: CONSORCIO MATAGUASAN	IDENTIFICACIÓN: NIT 900.412.456-8
DIRECCIÓN: CRA 13 N 14 09	TELÉFONO: 3103295924
CRAID: AGUAZUL, CASANARE	

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE	IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.216-6
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE CASANARE	IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.216-6

DESCRIPCIO AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	28/02/2011	09/05/2012	13,838,104.00
ANTICIPO	28/02/2011	09/05/2012	69,190,520.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	28/02/2011	07/01/2015	6,919,052.00
CALIDAD DEL SERVICIO	28/02/2011	08/07/2012	13,838,104.00

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 900105134	-	ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERIA LTDA	-	PART: 10.00%
NIT 844001720	-	DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DIARCO LTDA.	-	PART: 90.00%

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE INCLUYE AL ANEXO N° 2 LA PRESENTE ACLARACION DE TEXTO DONDE SE AMPLIARON LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN ACTA N° 1 DE SUSPENSION DEL 14 DE JUNIO DE 2011 Y ORDEN DE REINICIACION N° 1 DEL 12 DE AGOSTO DE 2011 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0303 DEL 14 DE FEBRERO DE 2011. TODO LO DEMAS CONTINUA VIGENTE E INMODIFICABLE

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****0.00	VALOR PRIMA: \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00
--	------------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------------------------

INTERMEDIARIO	COASEGURO CEDIDO
NOMBRE NUBIA STELLA ARIAS	NOMBRE COMPAÑIA
CLAVE 3639	%PART
%PART 100.00	VALOR ASEGURADO

FIRMA ASEGURADOR	(415)7701861000019(8020)070900412456000605021350	FIRMA TOMADOR
------------------	--	---------------

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá


CLIENTE

CAREVALO 0

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

724

37



POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

Aseguradora Solidaria
de Colombia
NIT 860.374.654 - 6

2851
32

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia
confirma la información de los clientes a través
del Call Center, por favor tenga en cuenta que
será contactado para realizar el procedimiento.

PÓLIZA No: 605-74-994000001311

ANEXO:3

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL

COD. AGENCIA: 605

RAMO: 7

DIA MES AÑO
16 02 2012

DIA MES AÑO HORAS
08 01 2012 23:59
VIGENCIA DESDE A LAS

DIA MES AÑO HORAS
30 06 2012 23:59
VIGENCIA HASTA A LAS

DIA MES AÑO
16 02 2012
FECHA DE IMPRESIÓN
TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESIÓN

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO MATAGUASAN

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.412.456-8

DIRECCIÓN: CRA 13 N 14 09

CIUDAD: AGUAZUL, CASANARE

TÉLEFONO: 3103295924

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE

IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.216-6

DIRECCIÓN: CRA 19 NO 6-100

CIUDAD: YOPAL, CASANARE

TÉLEFONO: 6358496

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT : 892099216

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CASANARE

CIUDAD: PORE

DIRECCIÓN: VEREDA AGUALINDA No. -

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD

CONSTRUCCIÓN: NO APLICA PARA ESTE RAMO

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL

MANZANA:

DESCRIPCIÓN AMPAROS

SUMA ASEGURADA % INVAR

SUBLÍMITE

CONTRATO PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

\$ 107,120,000.00
107,120,000.00

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

POR EL PRESENTE CERTIFICADO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN CON ACTA No 05 DE SUSPENSIÓN DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2011, ACTA No 05 DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2011, Y ACTA No 06 DE REINICIACIÓN DE FECHA 30 DE ENERO DE 2012. LOS DEMÁS TÉRMINOS CONTINUAN INMODIFICABLES.



VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ***107,120,000.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00

INTERMEDIARIO	CLAVE	SPART	NOMBRE COMPAÑÍA	SPART	VALOR ASEGURADO
NJBIA STELLA ARIAS	3639	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.



(415)7701861000019(8020)0000000000700605021358

FIRMA ASEGURADOR

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

NARIAS 0

739 38

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC.93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES

2852
32

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia
confirma la información de los clientes a través
del Call Center, por favor tenga en cuenta que
será contactado para realizar el procedimiento

PÓLIZA No: 605-47-994000005192 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL	COD. AGENCIA: 605 RAMO: 47	DIA 07 MES 09 AÑO 2011	DIA 07 MES 09 AÑO 2011
TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA	TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO	
NOMBRE: CONSORCIO MATAGUASAN	IDENTIFICACIÓN: NIT 900.412.456-8
DIRECCIÓN: CRA 13 N 14 09	TELÉFONO: 3103295924
CIUDAD: AGUAZUL, CASANARE	




DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO	
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE	IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.216-6
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE CASANARE	IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.216-6

AMPAROS			
DESCRIPCIO AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	28/02/2011	09/05/2012	13,838,104.00
ANTICIPO	28/02/2011	09/05/2012	69,190,520.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	28/02/2011	07/01/2015	6,919,052.00
CALIDAD DEL SERVICIO	28/02/2011	08/07/2012	13,838,104.00

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS			
NIT 900105134	-	ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERIA LTDA	- PART:
10.00%			
NIT 844001720	-	DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DIARCO LTDA.	- PART: 90.00%

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***103,785,780.00	VALOR PRIMA: \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00
--	------------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------------------------

INTERMEDIARIO			COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE NUBIA STELLA ARIAS	CLAVE 3639	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA	%PART
				VALOR ASEGURADO

		
FIRMA ASEGURADOR	(415)7701861000019(6020)07090041245800605021350	FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá CLIENTE CAREVALO 0

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2505 DIC95 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

723 39

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Aseguradora Solidaria
de Colombia
NIT. 860.524.654 - 6

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento.

PÓLIZA No: 605-74-994000001311

ANEXO:2

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL

COD. AGENCIA: 605 RAMO: 74

DIA	MES	AÑO
07	09	2011

DIA	MES	AÑO	HORAS
05	11	2011	23:59

DIA	MES	AÑO	HORAS	MIN	SEG
08	01	2012	23:59	64	

DIA	MES	AÑO
07	09	2011

FECHA DE EXPEDICIÓN

VIGENCIA DESDE

ALAS

VIGENCIA HASTA

A LAS

DÍAS

FECHA DE IMPRESIÓN

TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO MATAGUASAN

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.412.456-8

DIRECCIÓN: CRA 13 N 14 09

CIUDAD: AGUAZUL, CASANARE

TELÉFONO: 3103295924

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE

IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.216-6

DIRECCIÓN: CRA 19 NO 6-100

CIUDAD: YOPAL, CASANARE

TELÉFONO: 6358496

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT : 892099216

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CASANARE

CIUDAD: PORE

DIRECCIÓN: VEREDA AGUALINDA No. -

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD

CONSTRUCCIÓN: NO APLICA PARA ESTE RAMO

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL

MANZANA:

DESCRIPCIÓN AMPAROS

SUMA ASEGURADA % INVAR

SUBLÍMITE

CONTRATO

\$ 107,120,000.00
107,120,000.00

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

POR EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA A LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN ACTA N°1 DE SUSPENSIÓN DEL 14 DE JUNIO DE 2011 Y ORDEN DE REINICIACIÓN N°1 DEL 12 DE AGOSTO DE 2011 AL CONTRATO DE CONSULTORIA N°0303 DEL 14 DE FEBRERO DE 2011. LOS DEMÁS TÉRMINOS CONTINUAN INMODIFICABLES.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ***107,120,000.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00

NOMBRE	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO
NUBIA STELLA ARIAS	3639	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.



FIRMA ASEGURADOR

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CAREVALO 0

402

2853

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE



POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES

2854
34

Aseguradora Solidaria
de Colombia
NIT. 860.524.654 - 6

PÓLIZA No: 605-47-994000005192

ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL

COO. AGENCIA: 605 RAVO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DIA MES AÑO
02 06 2011
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO
02 06 2011
FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CONSORCIO MATAGUASANA

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.412.456-8 ✓

DIRECCIÓN: CRA 13 N 14 09

CIUDAD: AGUAZUL, CASANARE

TÉLEFONO: 3103295924

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE ✓

IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.216-6 ✓

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE CASANARE

IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.216-6

AMPAROS

DESCRIPCIÓN AMPAROS

CONTRATO

CUMPLIMIENTO ✓

ANTICIPO ✓

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND

CALIDAD DEL SERVICIO

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

28/02/2011 ✓

05/03/2012 ✓

28/02/2011 ✓

05/03/2012 ✓

28/02/2011 ✓

05/11/2014 ✓

28/02/2011

05/05/2012

SUMA ASEGURADA

13,838,104.00 ✓

69,190,520.00 ✓

6,919,052.00 ✓

13,838,104.00

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 900105134

ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERIA LTDA

PART:

10.00%

NIT 844001720

DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DIARCO LTDA.

PART: 90.00%

POR EL PRESENTE CERTIFICADO SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS CONTRATADOS AL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0303 DEL 14 DE FEBRERO DE 2011 SEGUN ORDEN DE INICIACION DEL 06 DE MAYO DE 2011. LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN INMODIFICABLES.

GOBERNACION DE CASANARE
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DEC 0157 DE 2010
APROBADA
03 JUN 2011

PAGO ANTICIPADO	SERIAL DEL CUMPLIMIENTO
ANTICIPO	SALARIOS, PRESTACIONES
CUMPLIMIENTO	RESPONSABILIDAD EXTRA CON
ESTABILIDAD CALIDAD DE SERVICIO	CALIDAD DEL SERVICIO
CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE	

REVISOR: [Firma] DIRECTOR DE CONTRATACIÓN: [Firma]

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***103,785,780.00	VALOR PRIMA: \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICIÓN: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00
--	------------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------------------------

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO		VALOR ASEGURADO
NOMBRE	CLAVE	%PART	%PART	
HUBIA STELLA ARIAS	3639	100.00		

FIRMA ASEGURADOR

FIRMA TOMADOR


DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

NARIAS 0

700

46



POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

Aseguradora Solidaria
de Colombia
NIT. 860.524.854 - 6

2855
35

PÓLIZA No: 605-74-994000001311

ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL

COD. AGENCIA: 605

RAMO: 74

DIA MES AÑO
02 06 2011

DIA MES AÑO HORAS
05 08 2011 23:59

DIA MES AÑO HORAS
05 11 2011 23:59

DIA MES AÑO
02 06 2011

FECHA DE EXPEDICIÓN

VIGENCIA DESDE

A LAS

VIGENCIA HASTA

A LAS

DÍAS

FECHA DE IMPRESIÓN

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESIÓN

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO MATAGUASAN

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.412.456-8

DIRECCIÓN: CRA 13 N 14 09

CIUDAD: AGUAZUL, CASANARE

TÉLEFONO: 3103295924

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE

IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.216-6

DIRECCIÓN: CRA 19 NO 6-100

CIUDAD: YOPAL, CASANARE

TÉLEFONO: 6358496

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT: 892099216

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CASANARE

CIUDAD: PORE

DIRECCIÓN: VEREDA AGUALINDA No. -

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD

CONSTRUCCIÓN: NO APLICA PARA ESTE RAMO

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL

MANZANA:

DESCRIPCIÓN AMPAROS

SUMA ASEGURADA % INVAR

SUBLÍMITE

CONTRATO

\$ 107,120,000.00
107,120,000.00

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

POR EL PRESENTE CERTIFICADO SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS CONTRATADOS AL CONTRATO DE CONSULTORIA N°0303 DEL 14 DE FEBRERO DE 2011 SEGUN ORDEN DE INICIACIÓN DEL 06 DE MAYO DE 2011. LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN INMODIFICABLES.

GOBERNACIÓN DE CASANARE	
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DEC 0167 DE 2010	
APROBADA	
03 JUN 2011	
PAGO ANTICIPADO	SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO
ANTICIPO	SALARIOS PRESTACIONES
CUMPLIMIENTO	RESPONSABILIDAD EXTRA CON.
ESTABILIDAD CALIDAD DE LA OBRA	CALIDAD DEL SERVICIO
CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS	
REVISOR	DIRECTOR DE CONTRATACIÓN

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***107,120,000.00	VALOR PRIMA: \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICIÓN: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00
--	------------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------------------------

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE NUBIA STELLA ARIAS	CLAVE 3639	%PART 100.00	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 5 y 12 Bogotá

CLIENTE

NARIAS O

208

42

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/99 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 8601 ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PAJA PAGO ELECTRONICO O
EN ENTIDADES FINANCIERAS
CITE ESTE NUMERO DE REFERENCIA
605021350-0

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES

2856
36
Aseguradora Solidaria
de Colombia
NIT. 160.574.654 - 6

POLIZA No: 605-47-994000005192

ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL

COD. AGENCIA: 605 RAYO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION

TIPO DE IMPRESION: IMPRESION

DIA MES AÑO
28 02 2011
FECHA DE EXPEDICION

DIA MES AÑO
28 02 2011
FECHA DE IMPRESION

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CONSORCIO MATAGUASAN

IDENTIFICACION: NIT 900.412.456-8

DIRECCION: CRA 13 N 14 09

CIUDAD: AGUAZUL, CASANARE

TELÉFONO: 3103295924

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE

IDENTIFICACION: NIT 892.099.216-6

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE CASANARE

IDENTIFICACION: NIT 892.099.216-6

AMPAROS

DESCRIPCION AMPAROS

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

SUMA ASEGURADA

CONTRATO

CUMPLIMIENTO

28/02/2011

05/12/2011

13,838,104.00

ANTICIPO

28/02/2011

05/12/2011

69,190,520.00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND

28/02/2011

05/08/2011

6,919,052.00

CALIDAD DEL SERVICIO

28/02/2011

05/02/2012

13,838,104.00

UNION TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 900105134

EPICO INGENIERIA LTDA

PART: 10.00%

NIT 844001720

DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DIARCO LTDA..

PART: 90.00%

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de la presente póliza es garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contraídas mediante la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORIA N°0303 DEL 14 DE FEBRERO DE 2011 REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ESTEBAN Y SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE según las coberturas indicadas GOBERNACION DE CASANARE

DIRECCION DE CONTRATACION DEC 0167 DE 2010 APROBADA

11 MAR 2011

PAGO ANTICIPADO

ANTICIPO

CUMPLIMIENTO

ESTABILIDAD SALUDAL DE LA OBRA

CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA

SERIEAL DEL CUMPLIMIENTO

SALARIOS PRESTACIONES

RESPONSABILIDAD EXTRA CON

CALIDAD DEL SERVICIO

VALOR ASEGURADO TOTAL:
\$ ***103,785,780.00

VALOR PRIMA:
\$ *****377,951.00

GASTOS EXPEDICION:
\$ *****9,000.00

REVISORA:
\$ ****61,912.00

DIRECCION DE CONTRATACION
\$ *****448,863.00

NOMBRE	CLAVE	HPART	NOMBRE COMPAÑIA	HPART	VALOR ASEGURADO
HUBIA STELLA ARIAS	3639	100.00			

FIRMA ASEGURADOR
FIRMA TOMADOR

DIRECCION NOTARIAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE Calle 129 No. 25-45 Piso 1 y 2 Bogotá

700

48

2857
37

PARA PAGOS ELECTRONICOS O
ENTIDADES FINANCIERAS
CITE ESTE NUMERO DE REFERENCIA
605021358-3

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL


Aseguradora Solidaria
de Colombia
NIT. 860.524.654 - 6

PÓLIZA No: 605-74-994000001311

ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL			COD.AGENCIA: 605			RAMO: 74								
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	
28	02	2011	28	02	2011	23:59	05	08	2011	23:59	158	28	02	2011
FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			ALAS	VIGENCIA HASTA			ALAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN		
TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION									TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION					

DATOS DEL TOMADOR			
NOMBRE:	CONSORCIO MATAGUASAN	IDENTIFICACIÓN: NIT	900.412.456-8
DIRECCIÓN:	CRA 13 N 14 09	CIUDAD:	AGUAZUL, CASANARE
		TELÉFONO:	3103295924

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO			
ASEGURADO:	DEPARTAMENTO DE CASANARE	IDENTIFICACIÓN: NIT	892.099.216-6
DIRECCIÓN:	CRA 19 NO 6-100	CIUDAD:	YOPAL, CASANARE
		TELÉFONO:	6358496
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	IDENTIFICACIÓN: NIT	001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS			
ASEGURADO:	DEPARTAMENTO DE CASANARE	NIT :	892099216
ITEM:	1	DEPARTAMENTO:	CASANARE
		CIUDAD:	PORE
DIRECCION:	VEREDA AGUALINDA No. -		
ACTIVIDAD:	ACTIVIDAD		
CONSTRUCCION:	NO APLICA PARA ESTE RAMO		
TIPO EDIFICIO:	NO APLICA PARA ESTE RAMO		
TIPO DE RIESGO:	ESTATAL		
MANZANA:			
DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA. \$ INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$ 107,120,000.00	107,120,000.00
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES			

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0303 DEL 14 DE FEBRERO DE 2010 REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN JOSE Y SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

GOBERNACIÓN DE CASANARE
DIRECCIÓN DE CONTRATACION DEC 0167 DE 2010
APROBADA

11 MAR 2011

PAGO ANTICIPADO
ANTICIPO
CUMPLIMIENTO
ESTRATEGIA CALIDAD DE SERVICIO
CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE BS


SERIEDAD DEL DESEMPEÑO
SALARIOS Y PRESTACIONES
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL
CALIDAD DEL SERVICIO


REVISOR
DIRECTOR DE CONTRATACION

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICIÓN:	NIT:	TOTAL A PAGAR:
\$ ***107,120,000.00	\$ *****139,109.00	\$ *****9,000.00	\$ ****23,697.00	\$ *****171,807.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE:	CLAVE:	%PART:	VALOR ASEGURADO
NUBIA STELLA ARIAS	3639	100.00	
NOMBRE COMPAÑIA:		%PART:	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.


FIRMA ASEGURADOR


FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

DDA2A 0

PARA PAGO ELECTRONICO
EN ENTIDADES FINANCIERAS
CITE ESTE NUMERO DE REFERENCIA

605021350-0

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES


Aseguradora Solidaria
de Colombia
NIT. 860.574.654 - 6

288
2858

PÓLIZA No: 605-47-994000005192

ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL

COD. AGENCIA: 605 RAN: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DIA MES AÑO
28 02 2011
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO
28 02 2011
FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CONSORCIO MATAGUASAN

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.412.456-8

DIRECCIÓN: CRA 13 N 14 09

CIUDAD: AGUAZUL, CASANARE

TELÉFONO: 3103295924

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE

IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.216-6

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE CASANARE

IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.216-6

AMPAROS

DESCRIPCION AMPAROS

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

SUMA ASEGURADA

CONTRATO

CUMPLIMIENTO

28/02/2011

05/12/2011

13,838,104.00

ANTICIPO

28/02/2011

05/12/2011

69,190,520.00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND

28/02/2011

05/08/2014

6,919,052.00

CALIDAD DEL SERVICIO

28/02/2011

05/02/2012

13,838,104.00

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 900105134

- EPICO INGENIERIA LTDA

PART: 10.00%

NIT 844001720

- DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DIARCO LTDA.

PART: 90.00%

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de la presente póliza es garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contraídas mediante la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORIA N°0303 DEL 14 DE FEBRERO DE 2011 REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN JUAN Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE según las coberturas indicadas.

GOBERNACIÓN DE CASANARE
DIRECCION DE CONTRATACION DEC 0167 DE 2010
APROBADA

11 MAR 2011

PAGO ANTICIPADO

SERIEDAD DEL CUMPLIMIENTO

ANTICIPO

SALARIOS PRESTACIONES

CUMPLIMIENTO

RESPONSABILIDAD EXTRA CON

ESTABILIDAD CALIDAD DE LA OBRA

CALIDAD DEL SERVICIO

CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE BB

VALOR ASEGURADO TOTAL:
\$ ***103,785,780.00

VALOR PRIMA:
\$ *****377,951.00

GASTOS EXPEDICION:
\$ *****9,000.00

REVISORA:
\$ ****61,912.00

DIRECCION DE CONTRATACION
\$ *****448,863.00

NOMBRE
NOBIA STELLA ARIAS

CLAVE
3639

W PART
100.00

NOMBRE COMPAÑIA

W PART

VALOR ASEGURADO

608

45

PARA PAGOS ELECTRONICOS O
ENTIDADES FINANCIERAS
CITE ESTE NUMERO DE REFERENCIA
605021358-3

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL


Aseguradora Solidaria
de Colombia
NIT. 860.514.654 - 6

39
2859

PÓLIZA No: 605 -74 -994000001311

ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL				COD. AGENCIA: 605				RAMO: 74			
DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS
28	02	2011	23:59	28	02	2011	23:59	05	08	2011	23:59
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA			
TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION				ALAS				DIAS			
								FECHA DE IMPRESIÓN			
								TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION			

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO MATAGUASAN	IDENTIFICACIÓN: NIT 900.412.456-8
DIRECCIÓN: CRA 13 N 14 09	TELÉFONO: 3103295924
CIUDAD: AGUAZUL, CASANARE	

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE	IDENTIFICACIÓN: NIT 992.099.216-6
DIRECCIÓN: CRA 19 NO 6-100	TELÉFONO: 6358496
CIUDAD: YOPAL, CASANARE	
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS	IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE	NIT : 892099216
ITEM: 1	DEPARTAMENTO: CASANARE
DIRECCIÓN: VEREDA AGUALINDA No. -	CIUDAD: PORE
ACTIVIDAD: ACTIVIDAD	
CONSTRUCCION: NO APLICA PARA ESTE RAMO	
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO	TIPO DE RIESGO: ESTATAL
MANZANA:	
DESCRIPCION AMPAROS	SUMA ASEGURADA % INVAR
CONTRATO	\$ 107,120,000.00
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	107,120,000.00
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0303 DEL 14 DE FEBRERO DE 2011 REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN JOSE Y EL MONTEPIO DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

GOBERNACIÓN DE CASANARE
DIRECCIÓN DE CONTRATACION DEC 0167 DE 2010
APROBADA

11 MAR 2011

PAGO ANTICIPADO
ANTICIPO
CUMPLIMIENTO
ESTABILIDAD CALIDAD DE LA OBRA
CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE BS

SERIE OAC DEL CUMPLIMIENTO
SALARIOS Y PRESTACIONES
RESPONSABILIDAD EXTRA CON
CALIDAD DEL SERVICIO

RUBRO DIRECTOR DE CONTRATACION

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***107,120,000.00	VALOR PRIMA \$ *****139,109.00	GASTOS EXPEDICION \$ *****9,000.00	IVA \$ ***23,697.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****171,807.00
--	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------	--------------------------------------

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE	CLAVE	%PART	VALOR ASEGURADO
NOBIA STELLA ARIAS	3639	100.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

DP2299 48

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

~~40~~
2860


NO SE REALIZARON ORDENES DE PAGO, YA QUE NO SE COBRO NINGUNA ACTA PARCIAL EN EL
CONTRATO DE CONSULTORIA No 303 - 2011

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

41
2861

NO SE REALIZO OTRO SI MODIFICATORIO O ACLARATORIO AL CONTRATO DE CONSULTORIA No
303 - 2011

2862
42


 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-15-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/03/2011
	ADICIONAL	VERSION:01

ADICIONAL EN PLAZO No. 2 AL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0303 DE 2011 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y EL CONSORCIO MATAGUASAN- R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES

Entre los suscritos a saber **NELSON NADYN NIETO RAMIREZ**, identificado con cédula de ciudadanía N° 74.859.572 expedida en Yopal, obrando en nombre y representación del Departamento de Casanare, con NIT 892099216-6, en su calidad de Secretario de Obras Públicas y Transportes, Nombrado mediante Decreto N° 001 del 02 de Enero de 2012, Delegado para contratar mediante Decreto Departamental N° 032 del 17 de Febrero de 2012, y quien para el presente documento será **EL DEPARTAMENTO** y por la otra parte **CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES** identificado con cedula de ciudadanía N° 79.743.593 expedida en Bogotá, en su condición de representante legal del Consorcio Mataguasan Con NIT 900412456-8, quien en adelante se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos convenido prorrogar el Contrato de Consultoría N° 0303 de 2011, cuyo objeto es: **"INTERVENTORIA, TECNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA. Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, previa las siguientes consideraciones: 1). Que el contratista mediante comunicación de fecha 12 de febrero de 2013, solicita al Departamento una prórroga al Contrato de Consultoría N° 0303 de 2011, por un periodo de cinco (5) meses argumentando que: a) Teniendo en cuenta que el objeto contractual del contrato de la referencia se suscribió con el único fin de hacer control y seguimiento a los contratos de obra derivados de los Convenio 053 del 2010 y Convenio 040 del 2010, suscritos entre la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Pore, los cuales fueron prorrogados de la siguiente manera: Convenio 053 del 2010: Fecha de prórroga, 11 de Diciembre de 2012 por 6 meses. Convenio 040 del 2010: Fecha de prórroga 31 de Octubre de 2012 por 8 meses. b) Y que adicionalmente la interventoría tiene fecha de terminación del 01 de Marzo de 2013, con lo cual dichas obras se quedarían sin su respectivo control y seguimiento por parte de la interventoría, por tal razón ponemos a su consideración una prórroga por un tiempo de 5 meses al contrato de consultoría No 303 del 2011.2). Que se anexa la solicitud en el formato DC-026 del Manual de Interventoría del Departamento, de fecha 14 de Febrero de 2013, debidamente diligenciado por el Contratista y el supervisor, acompañado por los respectivos soportes técnicos. 3). La presente prórroga no genera ningún costo para el Departamento. 4). Que analizadas las causas expuestas se considera viable la prórroga la cual se registrará por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO:** La presente prórroga tiene por objeto ampliar el plazo pactado en la


Digito. Yenny Benavides

Edificio Emiro Sossa Pacheco Carrera 19 N° 6-100 Tel. 6357676 Ext. 401 Yopal, Casanare
Web: <http://www.casanare.gov.co> Email: contratacion@casanare.gov.co



17/3 49


43
2863

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-15-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/03/2011
	ADICIONAL	VERSION:01


ADICIONAL EN PLAZO No. 2 AL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0303 DE 2011 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y EL CONSORCIO MATAGUASAN- R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES

CLAUSULA SEPTIMA del Contrato de Consultoría N° 0303 de 2011:
CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO. Prorróguese el plazo pactado en la CLAUSULA SEPTIMA del Contrato de Consultoría N° 0303 de 2011 en Cinco (5) MESES, contados a partir de la fecha de vencimiento actual. **CLÁUSULA TERCERA: AMPLIACION DE LA GARANTIA:** El contratista se obliga a ampliar en vigencia la garantía única pactada en la CLAUSULA DECIMA del contrato de Consultoría No. 03030 de 2011. **CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS:** Las cláusulas del Contrato que no hubieren sido expresamente modificadas por el presente adicional en plazo, conservan su eficacia y vigencia. **CLAUSULA QUINTA.** Las partes manifiestan que con el presente adicional en plazo no se causa un mayor valor ni un reconocimiento extra económico por parte del Departamento, por lo que se manifiesta que se declaran a paz y salvo de cualquier reclamación económica a futuro por el presente adicional. **CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente prórroga se perfecciona con: 1. la firma de las partes. 2.) Ampliación de las garantías debidamente aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.5. del Decreto 734 de 2012, publíquese la presente acta en la pagina del SECOP a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de su expedición En constancia se firma en Yopal a los 27 días del mes de Febrero de 2013.

EL DEPARTAMENTO


NELSON NADYN NIETO RAMIREZ
Secretario de Obras Públicas y Transporte

EL CONTRATISTA


CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
R/L Consorcio Mataguasan
Contratista

Reviso. GUSTAVO ADOLFO LARA SEPULVEDA
Jefe Oficina Asesora Jurídica

GABRIEL FRANCISCO BARRETO MENENDEZ
Secretario General


VoBo. HELVER ROSSELL MARTINEZ BOHORQUEZ
Secretario Privado

Digito. Yenny Benavides

Edificio Emiro Sossa Pacheco Carrera 19 N° 6-100 Tel. 6357676 Ext. 401 Yopal, Casanare
Web: <http://www.casanare.gov.co> Email: contratacion@casanare.gov.co

772 50


2864
44

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-26-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009
	SOLICITUD DE PRORROGA O ADICION			VERSIÓN:	01
HOJA 1 de 3	Fecha	DD 14	MM 2	AA 2013	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011
DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES					
Nombre dependencia responsable del proyecto o convenio (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)					
SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA					
ADICIÓN <input checked="" type="checkbox"/>		PRÓRROGA <input checked="" type="checkbox"/>			
GRADO DE RESPONSABILIDAD					
1) Mediante la suscripción de la presente acta de adición, el contratista y el Interventor y el Supervisor del contrato asume responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: <ul style="list-style-type: none"> - Avance físico ejecutado de la obra - Valor actual del contrato - Valor facturado hasta la fecha - Valor anticipo, si lo hubo - Valor anticipo amortizado - Valor anticipo por amortizar - Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la prórroga del contrato. 					
2) El supervisor del contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la prórroga del mismo, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.					
3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar estar conforme con la adición, previa aprobación del supervisor.					
A. ANTECEDENTES					
CONTRATO No. <u>0303</u> DE <u>2011</u> <small>(Número de contrato) (Año de suscripción)</small>					
OBJETO DEL CONTRATO					
INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA. Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE					
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO					
CINCO (05) MESES <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el convenio)</small>					
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO					
6 DE MAYO DE 2011 <small>(Mes) (Día) (Año)</small>					
PRORROGAS					
CONTRATO ADICIONAL No		TIEMPO (MESES)			
PRORROGA 1 (01/11/2012)		CUATRO (4) MESES			
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION					
ACTAS No.		TIEMPO (DIAS)			
ACTA 3 SUSPENSION No. 1 (14/06/2011)		SESENTA (60) DIAS			
ACTA No 5 DE SUSPENSION No.2 (16-08-2011)		CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS			
ACTA No 6 AMPLIACION A LA SUSPENSION No.2 (26-12-2011)		TREINTA (30) DIAS			
ACTA No. 8 DE SUSPENSION No. 3 (25/04/2012)		CIENTO VEINTE (120) DIAS			
ACTA No. 9 DE AMPLI A LA SUSPENSION No. 3 (24/08/2012)		CUARENTA Y CINCO (45) DIAS			
FORMATO DC-026					

Departamento de Casanare
O.A. JURIDICA
RECIBIDO: 30 JUL 2013
HORA: 14:20
F. ADICACION

370 51

45
2865

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-26-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009
	SOLICITUD DE PRORROGA O ADICION			VERSIÓN:	01
HOJA 2 de 3	Fecha	DD 14	MM 2	AA 2013	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011
DIRECCION TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES					
Nombre dependencia responsable del proyecto o convenio (Secretaría de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)					
SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA					
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO				1 DE MARZO DE 2013 (Día) (Mes)	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				\$ 138,381,040.00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)	
VALOR ADICIONES					
CONTRATO ADICIONAL No.			VALOR (\$)		
X			X		
CONTRATISTA <u>CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES</u>					
SUPERVISOR <u>ING ADRIANA HERNANDEZ FUENTES</u>					
B. OBJETO					
<p>El presente documento tiene por objeto solicitar a la GOBERNACION DE CASANARE, una PRORROGA de CINCO (05) MESES, a partir de la fecha de terminación actual, una vez analizada la solicitud emanada por el contratista, de fecha 12 de febrero de 2013, la cual forma parte integral de la presente.</p>					
D. ESTADO FINANCIERO					
Valor Aporte Departamento			\$ 138,381,040.00		
Valor actual del contrato			\$ 138,381,040.00		
Valor Anticipo 50% del Aporte de la Gob.				\$ 69,190,520.00	
Valor por transferir				\$ 69,190,520.00	
E. CAUSALES DE LA SOLICITUD					
solicitud del contratista donde argumenta los siguientes hechos:					
<p>Teniendo en cuenta que el objeto contractual del contrato de la referencia fue suscrito con el único propósito para hacer control y seguimiento a los contratos de obra derivados de los Convenio 053 del 2010 y Convenio 040 del 2010, suscritos entre la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Pore, los cuales fueron prorrogados de la siguiente manera:</p> <p>Convenio 053 del 2010: Fecha de prórroga, 11 de Diciembre de 2012 por 6 meses.</p> <p>Convenio 040 del 2010: Fecha de prórroga 31 de Octubre de 2012 por 8 meses.</p>					
<p>Y que adicionalmente la interventoría tiene fecha de terminación del 01 de Marzo de 2013, con lo cual dichas obras se quedarían sin el respectivo control y seguimiento por parte de la interventoría, por tal razón ponemos a su consideración una prórroga por un tiempo de 5 meses al contrato de consultoría No 303 del 2011.</p>					
FORMATO DC-026					

RECIBIDO
10 JUL 2013
Departamento de Casanare
O.A. JURIDICA
EJECUCION

789 52

2866
46

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CODIGO:	RIF02-26-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009
	SOLICITUD DE PRORROGA O ADICION			VERSION:	01
HOJA 3 de 3	Fecha	DD 14	MM 2	AA 2013	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011
DIRECCION TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)					
SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA					
COMENTARIOS DE LA SUPERVISION ACERCA DE LA SOLICITUD					
De acuerdo a la solicitud por parte del Contratista, y considerando que:					
1. Se hace necesario darle continuidad al control y seguimiento a las obras contratadas bajo los contratos de obra Nos, 020 y 021 de 2011 derivados de los convenios Interadministrativos 040 y 053 de 2010					
2. Es necesario darle cumplimiento a lo establecido en el literal D de la clausula Segunda de la minuta de contrato de consultoria					
Por lo anterior se recomienda darle viabilidad a la solicitud presentada por el Contratista					
El contratista se compromete a terminar el objeto del contrato en el plazo faltante, de conformidad con la presente solicitud de adición suscrita.					
Para constancia de lo anterior, firman la presente solicitud los que en ella intervinieron a los catorce (14) días del mes de febrero de 2013.					
 CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES Contratista		 ING. ADRIANA HERNANDEZ FUENTES Directora Técnica de Construcciones			
					
1era copia interventor 2da copia contratista 3ra copia Supervisor de Proyecto y/o Contrato					
FORMATO DC-026					

768

~~107~~

53

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

2867
AA

Yopal, 12 de Febrero de 2013

CICM

Ingeniera
ADRIANA HERNANDEZ FUENTES
Directora Técnica de Construcciones
Secretaria de Obras Públicas y Transporte
Departamento de Casanare

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 303-11
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del acueducto vereda Agualinda y construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore".

Asunto: Solicitud de Prórroga.

Cordial Saludo,


Teniendo en cuenta que el objeto contractual del contrato de la referencia se suscribió con el único fin de hacer control y seguimiento a los contratos de obra derivados de los Convenio 053 del 2010 y Convenio 040 del 2010, suscritos entre la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Pore, los cuales fueron prorrogados de la siguiente manera:

Convenio 053 del 2010: Fecha de prórroga, 11 de Diciembre de 2012 por 6 meses.
Convenio 040 del 2010: Fecha de prórroga 31 de Octubre de 2012 por 8 meses.

Y que adicionalmente la interventoría tiene fecha de terminación del 01 de Marzo de 2013, con lo cual dichas obras se quedarían sin su respectivo control y seguimiento por parte de la interventoría, por tal razón ponemos a su consideración una prórroga por un tiempo de 5 meses al contrato de consultoría No 303 del 2011.


Agradezco su colaboración.

Atentamente,


CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
R/I CONSORCIO MATAGUASAN

767

SA

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-15-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ADICIONAL	VERSION:01


ADICIONAL EN PLAZO AL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0303 DE 2011 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE CONSORCIO MATAGUASAN - R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES

Entre los suscritos a saber **NELSON NADYN NIETO RAMIREZ**, identificado con cédula de ciudadanía N° 74.859.572 expedida en Yopal, obrando en nombre y representación del Departamento de Casanare, con NIT 892099216-6, en su calidad de Secretario de Obras Publicas y Transportes, Nombrado mediante Decreto N° 001 del 02 de Enero de 2012, Delegado para contratar mediante Decreto Departamental N° 032 del 17 de Febrero de 2012, y quien para el presente documento será **EL DEPARTAMENTO** y por la otra parte **CONSORCIO MATAGUASAN** con NIT 900.412.456-8 representado legalmente por **CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES** identificado con cedula de ciudadanía N° 79.743.593 expedida en Bogotá, y quien en adelante se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos convenido prorrogar el CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0303 DE 2011, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION EL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE", previa las siguientes consideraciones: 1). Que el contratista mediante comunicación de fecha 06 de Septiembre 2012, solicita al Departamento una prorroga al Contrato de Consultoria N° 0303 de 2011, por un periodo de cuatro (04) meses argumentando: a) Que el contrato 020-2011 que tiene por objeto: Construcción del sistema de acueducto por gravedad de la vereda Agualinda del Municipio de Pore. Se ha presentado un clima adverso lo que imposibilita la excavación para la instalación de la tubería, ya que es infructuoso el uso de motobombas, esto ha generado retrasos considerables para la ejecución de los trabajos. b). Vereda Matalarga: la caída del puente que es la entrada a la vereda Matalarga ha originado que se acceda por una batea, la cual se crece intempestivamente por las condiciones climáticas reinantes en la zona, lo que impide el acceso a la obra y no es posible llevar materiales. En las excavaciones para la instalación de la tubería el rendimiento es nulo debido al alto nivel freático. c). Vereda San Isidro: El trabajo en la vereda San Isidro es bastante dependiente de las condiciones climáticas ya que para el acceso hay que cruzar dos brazos de dos caños que se crecen intempestivamente lo que ha dificultado el acceso del personal. Para la construcción del pozo lo ideal es que el nivel freático se encuentre más bajo que en condiciones de invierno, para asegurarnos de la real capacidad hidráulica del terreno. Las consideraciones realmente expuestas han generado bajos rendimientos en la ejecución de los contratos N° 020-021, lo que ha fomentado las continuas suspensiones y prorrogas de estos contratos, por las cuales la Interventoría ha quedado por fuera de plazos para ejercer la debida supervisión. d). Que la supervisión considera que es de imperiosa necesidad darle continuidad al control y seguimiento a las obras contratadas bajo los contratos de obra N° 020-021 de 2011 derivados de los convenios Interadministrativos 040 y 053 de 2010 y que tienen el carácter de prioritarios y representa para la comunidad un paso fundamental para su vida social y económica, por lo que su no continuidad de ejecución inmediata y completa ocasiona no solo grandes riesgos de daño de las obras ya ejecutadas, sino que afecta en forma directa a la comunidad beneficiaria de la misma. 2). Que se anexa la solicitud en el formato DC-026 del Manual de Interventoría del Departamento, de fecha 26 de Octubre de 2012, debidamente diligenciado por el contratista y el supervisor, acompañado

Yenny Benavides (SOPT)

Edificio Emiro Sossa Pacheco Carrera 19 N° 6-100 Tel. 6358497 Ext. 201-202 Yopal, Casanare
Web: <http://www.casanare.gov.co> Email: obras@casanare.gov.co

2869
49


 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-15-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ADICIONAL	VERSION:01


ADICIONAL EN PLAZO AL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0303 DE 2011 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE CONSORCIO MATAGUASAN - R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES


por los respectivos soportes técnicos. 3). La presente prórroga no genera ningún costo para el Departamento. 4). Que analizadas las causas expuestas se considera viable la prórroga la cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO:** La presente prórroga tiene por objeto ampliar el plazo pactado en la CLÁUSULA SEPTIMA del Contrato de Consultoría N° 0250 de 2011. **CLÁUSULA SEGUNDA: PLAZO.** Prorróguese el plazo pactado en la CLÁUSULA SEPTIMA del Contrato de Consultoría N° 0303 de 2011 en cuatro (04) meses, contados a partir de la fecha de vencimiento actual. **CLÁUSULA TERCERA: AMPLIACION DE LA GARANTIA:** El contratista se obliga a ampliar en vigencia la Garantía única pactada en la CLÁUSULA DECIMA del Contrato de Consultoría N° 0303 de 2011, en los mismos términos allí pactados y de acuerdo con la presente prórroga. **CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS:** Las cláusulas del contrato que no hubieren sido expresamente modificadas por el presente adicional, conservan su eficacia y vigencia. **CLÁUSULA QUINTA.** Las partes manifiestan que con el presente adicional no se causa un mayor valor ni un reconocimiento extra económico por parte del Departamento, por lo que se manifiesta que se declaran a paz y salvo de cualquier reclamación económica a futuro por el presente adicional. **CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente prórroga se perfecciona con: 1. La firma de las partes. 2) Ampliación de las garantías debidamente aprobadas por la firma de la Oficina Asesora Jurídica. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.5 del Decreto 734 de 2012, publíquese la presente acta en la página del SECOP a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de su expedición En constancia se firma en Yopal a los 01 NOV 2012.


EL DEPARTAMENTO

CONTRATISTA


ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ
Secretario de Obras Públicas y Transporte (E) - R/L-Consortio Mataguasan


CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES

Revop.  **GUSTAVO ADOLFLO LARA SEPULVEDA**
Jefe Oficina Asesora Jurídica


GABRIEL FRANCISCO BARRITO MENENDEZ
Secretario General

VoBo  **HELVER ROSSELL MARTINEZ BOHORQUEZ**
Secretario Privado


Yenny Benavides (S.O.P.T.)

Edificio Emiro Sossa Pacheco Carrera 19 N° 6-100 Tel. 6358497 Ext. 201-202 Yopal, Casanare
Web: <http://www.casanare.gov.co> Email: obras@casanare.gov.co

283


56

2870
50

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-26-I												
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009												
	SOLICITUD DE PRORROGA O ADICION			VERSIÓN:	01												
HOJA 1 de 3	Fecha	DD 26	MM 10	AA 2012	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011 /												
DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES																	
Nombre dependencia responsable del proyecto o convenio (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)																	
SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA																	
ADICIÓN <input checked="" type="checkbox"/>		PRÓRROGA <input checked="" type="checkbox"/>															
GRADO DE RESPONSABILIDAD 1) Mediante la suscripción de la presente acta de adición, el contratista y el Interventor y el Supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: - Avance físico ejecutado de la obra - Valor actual del contrato - Valor facturado hasta la fecha - Valor anticipo, si lo hubo - Valor anticipo amortizado - Valor anticipo por amortizar - Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la prórroga del contrato. 2) El supervisor del contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la prórroga del mismo, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio. 3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar estar conforme con la adición, previa aprobación del supervisor.																	
A. ANTECEDENTES CONTRATO No. <u>0303</u> DE <u>2011</u> <small>(Número de contrato) (Año de suscripción)</small>																	
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE																	
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO CINCO (05) MESES <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el convenio)</small>																	
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 6 DE MAYO DE 2011 <small>(mes) (mes) (año)</small>																	
PRORROGAS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONTRATO ADICIONAL No</th> <th>TIEMPO (MESES)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>						CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (MESES)	X	X								
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (MESES)																
X	X																
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION <table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTAS No.</th> <th>TIEMPO (DIAS)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACTA 3 SUSPENSION No. 1 (14/06/2011)</td> <td>SESENTA (60) DIAS</td> </tr> <tr> <td>ACTA No 5 DE SUSPENSION No.2 (18-08-2011)</td> <td>CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS</td> </tr> <tr> <td>ACTA No 6 AMPLIACION A LA SUSPENSION No.2 (26-12-2011)</td> <td>TREINTA (30) DIAS</td> </tr> <tr> <td>ACTA No. 8 DE SUSPENSION No. 3 (25/04/2012)</td> <td>CIENTO VEINTE (120) DIAS</td> </tr> <tr> <td>ACTA No. 9 DE AMPLI A LA SUSPENSION No. 3 (24/08/2012)</td> <td>CUARENTA Y CINCO (45) DIAS</td> </tr> </tbody> </table>						ACTAS No.	TIEMPO (DIAS)	ACTA 3 SUSPENSION No. 1 (14/06/2011)	SESENTA (60) DIAS	ACTA No 5 DE SUSPENSION No.2 (18-08-2011)	CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS	ACTA No 6 AMPLIACION A LA SUSPENSION No.2 (26-12-2011)	TREINTA (30) DIAS	ACTA No. 8 DE SUSPENSION No. 3 (25/04/2012)	CIENTO VEINTE (120) DIAS	ACTA No. 9 DE AMPLI A LA SUSPENSION No. 3 (24/08/2012)	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
ACTAS No.	TIEMPO (DIAS)																
ACTA 3 SUSPENSION No. 1 (14/06/2011)	SESENTA (60) DIAS																
ACTA No 5 DE SUSPENSION No.2 (18-08-2011)	CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS																
ACTA No 6 AMPLIACION A LA SUSPENSION No.2 (26-12-2011)	TREINTA (30) DIAS																
ACTA No. 8 DE SUSPENSION No. 3 (25/04/2012)	CIENTO VEINTE (120) DIAS																
ACTA No. 9 DE AMPLI A LA SUSPENSION No. 3 (24/08/2012)	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS																

782
A. J. J. J.


51
2871

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD				CÓDIGO:	RIF02-26-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA				FECHA:	22/06/2009
	SOLICITUD DE PRORROGA O ADICION				VERSION:	01
HOJA 2 de 3	Fecha	DD 26	MM 10	AA 2012	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011	
DIRECCION TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES						
Nombre dependencia responsable del proyecto o convenio (Secretaría de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)						
SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA						
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO		1 DE NOV DE 2012 (Día) (Mes) (Año)				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 138,381,040.00 / (Indique el valor del contrato suscrito en números)				
VALOR ADICIONES						
CONTRATO ADICIONAL No.		VALOR (\$)				
X		X				
CONTRATISTA CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES /						
SUPERVISOR ING AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA /						
B. OBJETO						
<p>El presente documento tiene por objeto solicitar a la GOBERNACION DE CASANARE, una PRORROGA de DOS (02) MESES, a partir de la fecha de terminación actual, una vez analizada la solicitud emanada por el contratista, de fecha 06 de Septiembre de 2012, radicado el mismo día mes y año bajo el No. 16846 la cual forma parte integral de la presente.</p>						
D. ESTADO FINANCIERO						
Valor Aporte Departamento		\$ 138,381,040.00				
Valor actual del contrato		\$ 138,381,040.00				
Valor Anticipo 50% del Aporte de la Gob.				\$ 69,190,520.00		
Valor por transferir				\$ 69,190,520.00		
E. CAUSALES DE LA SOLICITUD						
<p>Teniendo en cuenta la solicitud del contratista, de los contratos de obra No. 021 suscritos entre el ingeniero Oscar Javier Acuña y Aguas de Pore, a los cuales el contrato 303-11 esta ejerciendo la interventoría, en donde manifiesta una solicitud de prorroga por 2 meses más, debido a las causas que se exponen a continuación:</p>						
<p>Contrato 020 de 2011 que tiene por objeto: "Construcción del sistema de acueducto por gravedad de la vereda Agualinda del Municipio de Pore Departamento de Casanare".</p>						
<p>Se ha presentado un clima adverso lo que imposibilita la excavación para la instalación de la tubería, ya que es infructuoso el uso de motobombas, esto ha generado retrasos considerables para la ejecución de los trabajos.</p>						
<p>Vereda Matalarga:</p> <p>La calda del puente que es la entrada a la vereda Matalargaha originado que se acceda por una batea, la cual se crece intempestivamente por las condiciones climáticas reinantes en la zona, lo que impide el acceso a la obra y no es posible llevar materiales.</p> <p>En las excavaciones para la instalación de la tubería el rendimiento es bajo a nulo debido al alto nivel freático.</p>						
FORMATO DC-025						

701


58

2872
52

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-26-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009
	SOLICITUD DE PRORROGA O ADICION			VERSION:	01
HOJA 3 de 3	Fecha	DD 26	MM 10	AA 2012	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011
DIRECCION TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)					
SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA					
<p>Vereda San Isidro:</p> <p>El trabajo en la vereda San Isidro es bastante dependiente de las condiciones climáticas ya que para el acceso hay que cruzar dos brazos de dos caños que se crecen interpestivamente lo que ha dificultado el acceso de personal.</p> <p>Para la construcción del pozo lo ideal es que el nivel freático se encuentre más bajo que en condiciones de invierno, para asegurarnos de la real capacidad hidráulica del terreno.</p> <p>Las consideraciones anteriormente expuestas han generado bajos rendimientos en la ejecución de los contratos No. 020 y 021, lo que ha fomentado continuas suspensiones y prorrogas de estos contratos, por las cuales la interventoría ha quedado por fuera de plazos para ejercer la debida supervisión; por tal razón solicito formalmente una prorroga por 4 meses adicionales, sin la cual los contratos de obra quedarían sin la debida supervisión y control. ✓</p>					
COMENTARIOS DE LA SUPERVISION ACERCA DE LA SOLICITUD					
De acuerdo a la solicitud por parte del Contratista, y considerando que:					
<p>1. Es de imperiosa necesidad darle continuidad al control y seguimiento a las obras contratadas bajo los contratos de obra Nos, 020 y 021 de 2011 derivados de los convenios Interadministrativos 040 y 053 de 2010 y que tienen el carácter de prioritarios y representa para la comunidad un paso fundamental para su vida social y económica, por lo que su no continuidad de ejecución inmediata y completa ocasiona no sólo grandes riesgos de daño de las obras ya ejecutadas, sino que afecta en forma directa a la comunidad beneficiaria de la misma, ✓</p>					
<p>2. Es necesario darle cumplimiento al objeto contractual, ✓</p>					
Por lo anterior se recomienda darle viabilidad a la solicitud presentada por el Contratista ✓					
El contratista se compromete a terminar el objeto del contrato en el plazo faltante, de conformidad con la presente solicitud de adición suscrita.					
Para constancia de lo anterior, firman la presente solicitud los que en ella intervinieron a los veintiseis (26) días del mes de Octubre de 2012. ✓					
<p>7.10.12</p> <p>CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES</p> <p>Contratista</p>			<p>Vo.Bo.</p> <p>ING. ADRIANA HERNANDEZ FUENTES</p> <p>Directora Técnica de Construcciones</p>		
<p>Firma</p> <p>AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA</p> <p>Apoyo a Supervision C.P.S No. 1847 de 2010</p>					
<p>1era copia interventor</p> <p>2da copia contratista</p> <p>3ra copia Supervisor de Proyecto y/o Contrato</p>					
FORMATO DC-026					

2872 59


2873
53

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	CODIGO TABLA RETENCIÓN DOCUMENTAL	
-------------	--	-----------------------------------	--

1.INFORMACIÓN GENERAL					
1.1 FECHA DE PRESENTACIÓN:	10 de oct 2008				
1.2 NOMBRE DE PROYECTO:	CONSTRUCCION, OPTIMIZACION, HABILITACION, AMPLIACION, ESTUDIOS, DISEÑOS Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y POZOS PROFUNDOS DE LAS CABECERAS MUNICIPALES, RURALES Y CENTROS POBLADOS.				
1.3 CÓDIGO SSEPI:	2008-085000-0021				
1.4 IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
1.4.1 NOMBRE:	CONSTRUCCION, OPTIMIZACION, HABILITACION, AMPLIACION, ESTUDIOS, DISEÑOS Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y POZOS PROFUNDOS DE LAS CABECERAS MUNICIPALES, RURALES Y CENTROS POBLADOS.				
1.4.2 CÓDIGO:	6. ITRP.92085608				
1.4.3 FUENTE:	ITRP INTERVENTORIA TÉCNICA REGALÍAS PETROLERAS				
1.5 COMPONENTE(S) DEL PROYECTO:	Etapas Inversión.				
1.6 ACTIVIDAD(ES) DEL PROYECTO:	ADMINISTRACION - INTERVENTORIA				
1.7 PRODUCTO(S) DEL PROYECTO:	DIECINUEVE (19) MUNICIPIOS OPTIMIZADOS, HABILITADOS, AMPLIADOS Y MANTENIDOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS Y POZOS PROFUNDOS Y EL OBJETO ES INCREMENTAR EL 90% DE LA COBERTURA PARA CUMPLIR LO REGLAMENTARIO POR LA LEY.				
1.8 PRODUCTO(S) DEL OBJETO A CONTRATAR	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.				
1.9 POBLACIÓN BENEFICIADA CON EL OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR:	Los habitantes de las veredas Agualinda, San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore, Departamento de Casanare.				
1.10 EMPLEOS ESTIMADOS CON LA INVERSIÓN	<table border="1"> <tr> <td>DIRECTO(S)</td> <td>5</td> <td>INDIRECTO (S)</td> <td>4</td> </tr> </table>	DIRECTO(S)	5	INDIRECTO (S)	4
DIRECTO(S)	5	INDIRECTO (S)	4		

2874
51

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. 1113

2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

La ordenanza No 004 de Mayo 24 de 2008 de la Asamblea Departamental mediante la cual se aprobó el Plan de Desarrollo Departamental: "Pensando en Todos" 2008-2011 Casanare, territorio de equidad social; fuerza agroindustrial del llano; Reto VII "INTEGRACIÓN Y AFIRMACIÓN TERRITORIAL: ACUERDOS FUNDAMENTALES HACIA EL DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE URBANO Y RURAL" en el programa 7.5 ESTABLECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANIFICACION EFECTIVA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, en el Subprograma 7.5.1 SISTEMAS DE AGUA POTABLE, se encuentra inmerso el proyecto "CONSTRUCCION, OPTIMIZACION, HABILITACION, AMPLIACION, ESTUDIOS, DISEÑOS Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y POZOS PROFUNDOS DE LAS CABECERAS MUNICIPALES, RURALES Y CENTROS POBLADOS." requiere la construcción de subproyectos en los cuales se den solución a las necesidades, carencias y prioridades y aplicar procesos para garantizar la mejor utilización de los recursos disponibles y de ésta manera cumplir las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental.

La Gobernación de Casanare adelanta el proceso de contratación de las obras físicas que se encuentra previsto en el marco de ayuda mutua de las entidades estatales para desarrollar y dar cumplimiento a la función pública, por medio de la ejecución de los proyectos cuyo objeto son "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA, MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE.", y "CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE" viabilizados por el municipio de Pore.


Por lo anterior se requiere adelantar el proceso de contratación de la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental por parte de la Gobernación, para tener el control detallado de las actividades de ejecución o desarrollo de la obra para que esta se ejecute con calidad y eficiencia, dentro de los términos establecidos en la minuta del contrato, requiriéndose contratar una persona natural o jurídica que preste sus servicios profesionales como apoyo a la Secretaría de Obras Públicas y transporte en la vigilancia de dicha obra, y cumple una función armonizante entre los objetivos particulares de la entidad contratante y el contratista en la ejecución o desarrollo del contrato o convenio, además debe velar por la salvaguardia de los derechos de la comunidad, entidad contratante y contratista, también es la delegada de la entidad contratante, en calidad de mediador entre las partes contractuales, conciliando intereses entre ellas en búsqueda de lograr el objetivo de manera más eficaz y eficiente, puesto que posee un total conocimiento de los procesos que tienen lugar y que además permite tener un nivel de autoridad respetado también por las partes.

Con el presente estudio previo se pretende soportar la contratación de esta Interventoría, de tal manera que una vez se tenga legalizado el contrato de obra, se dé inicio haciendo el correspondiente control y seguimiento, sin pérdida de tiempo y bajo todos los parámetros técnicos y legales que esta implica.

2.2 ANÁLISIS DE CONVENIENCIA:

En el plan de desarrollo Departamental: "PENSANDO EN TODOS" 2008 - 2011 "CASANARE, TERRITORIO DE EQUIDAD SOCIAL; FUERZA AGROINDUSTRIAL DEL LLANO"; se incluye la meta o reto VII "INTEGRACIÓN Y AFIRMACIÓN TERRITORIAL: ACUERDOS FUNDAMENTALES HACIA EL DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE URBANO Y RURAL" en el programa 7.5 ESTABLECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANIFICACION EFECTIVA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, en el subprograma 7.5.1 SISTEMAS DE AGUA POTABLE, se encuentra inmerso el proyecto "CONSTRUCCION, OPTIMIZACION, HABILITACION, AMPLIACION, ESTUDIOS, DISEÑOS Y

2875
55

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. 1513

MANTENIMIENTO DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y POZOS PROFUNDOS DE LAS CABECERAS MUNICIPALES, RURALES Y CENTROS POBLADOS", requiere la construcción de subproyectos en los cuales se den solución a las necesidades, carencias y prioridades y aplicar procesos para garantizar la mejor utilización de los recursos disponibles y de ésta manera cumplir las metas establecidas en el plan de desarrollo departamental.

La ejecución de este proyecto es conveniente pues se garantiza el acceso al servicio de agua potable a la comunidad beneficiada y contribuye a mejorar la calidad de vida, aumentar la cobertura en la zona rural y con esto contribuir al logro de la meta establecida en las Áreas urbanas, rurales, centro poblados de los municipios con red de acueducto y sistemas de tratamiento, cubriendo al menos el 90% de cobertura mejorados o construidos, operando y funcionando sosteniblemente.

De los anteriores considerados y para dar cumplimiento a lo pactado con los organismos de control y garantizar el desarrollo normal de los procesos contractuales vigentes, es conveniente contratar la Interventoría Técnica a los procesos contractuales preestablecidos y por establecer, con el fin de blindar o proteger a la inversión con mecanismos de control que se comprometan jurídicamente al seguimiento de las obras en ejecución para que se cumplan todas las especificaciones técnicas de calidad y los compromisos contractuales para el buen término de las obras y de los servicios e inversiones, así como garantizar el normal seguimiento y liquidación de los procesos contratados tales como: Liquidación de los contratos y/o convenios; la ejecución y seguimiento a las obras físicas.

El ordenador del gasto establecerá para cada caso y atendiendo a las particularidades del objeto contractual, el perfil profesional o empresarial que debe satisfacer la persona natural o jurídica o el servidor público que ejercerá la Interventoría. En todo caso, la Interventoría debe ser atendida a través de personal con formación profesional en el área respectiva, que acredite la experiencia necesaria para cumplir adecuadamente con sus funciones.

En caso de que los proyectos tengan relación o interferencia con redes de servicios públicos, el Interventor deberá verificar la presentación de los documentos por parte del consultor ante las empresas involucradas en el proceso, que requieren de la aprobación previa del Interventor.

Para el trámite de la solicitud de la aprobación de los proyectos se debe tener en cuenta lo siguiente:

- (a) El consultor debe efectuar la solicitud de los datos técnicos a las diferentes Empresas de Servicios Públicos.
- (b) El interventor debe verificar que los datos obtenidos cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por las Empresas de Servicios Públicos e indicar al consultor los ajustes a realizar.
- (c) La Interventoría debe revisar el diseño y los planos junto con la Empresa de Servicios Públicos los cuales deberán contar con el Vo.Bo. de las mismas previos a la iniciación de la obra, al igual que la licencia ambiental por parte de Corporinoquia si se requiere, para lo cual se tramitará los permisos y/o licencias ambientales a que haya lugar con base en los estudios ambientales realizados por el consultor y aprobados por el interventor.


2.3 ANALISIS DE OPORTUNIDAD:

La Gobernación de Casanare formuló el Plan de Desarrollo Departamental, y una vez aprobado, impera la necesidad iniciar la implementación del mismo, donde su contenido requiere incorporar las necesidades de la comunidad como punto de partida de la preinversión de proyectos.

Con la ejecución de este subproyecto, se está contribuyendo al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, por lo tanto es oportuno desarrollarlo en este momento, para que su etapa de ejecución este dentro de este periodo de Gobierno, y además se minimice la problemática presentada en la vereda frente a la carencia de agua potable.

4
12/17/02

2876
56

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01 15 13

No.

De manera indirecta, esta inversión genera empleo al personal de la región, como son mano de obra no calificada y calificada. Personas que se beneficiarían durante la ejecución del contrato de obra, junto con la contratación de personal que opere los equipos requeridos para la ejecución de la obra y equipos menores. Además, también se generarían otros empleos indirectos, tales como las personas que suministren materiales, equipos, alimentación entre otros.

La implementación de este proyecto no interfiere con el medio ambiente ya que todas las infraestructuras existentes no producen daños ecológicos que atenten con el equilibrio del sistema ambiental actual.

Es oportuno por cuanto en la actualidad se pretende contratar la "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA, MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE" y la CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE, enmarcados dentro del proyecto "CONSTRUCCION, OPTIMIZACION, HABILITACION, AMPLIACION, ESTUDIOS, DISEÑOS Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y POZOS PROFUNDOS DE LAS CABECERAS MUNICIPALES, RURALES Y CENTROS POBLADOS.", por tal razón es necesario implementar los mecanismos necesarios para controlar y regular el consumo de agua en los habitantes, a fin de disminuir los costos de tratamiento.

Es oportuno teniendo en cuenta que la Gobernación de Casanare cuenta con los recursos financieros para ejecutar las obras proyectadas, dado que el municipio no cuenta con el patrimonio necesario para llevar a cabo este proyecto.

Es oportuno por cuanto la función de la interventoría implica acciones de carácter administrativo, técnico, financiero, social y legal, y todas ellas con la finalidad de verificar el cumplimiento de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes en tiempo real.

Es pertinente desarrollar la ejecución del proyecto, puesto que se cuenta con los recursos suficientes, y existe la cooperación del Municipio.

2.4 INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:

La Interventoría contratada será financiada con recursos del Departamento y deberá ejecutarse estrictamente, de acuerdo a la Resolución No. 256 de fecha 17 de Mayo de 2004 "Por la cual se adopta el manual del interventor versión 0 en el Departamento de Casanare", o el acto que la modifique o sustituya. Esta a su vez, estará bajo la supervisión del Secretario de Obras Públicas y Transporte, según Decreto 0511 del 26 de junio de 2008, o por el que este designe.

3. DEFINICIÓN TÉCNICA

3.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR:


INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

3.2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DEL OBJETO A CONTRATAR:

La interventoría contratada deberá cumplir con lo estipulado en la Resolución No. 256 de fecha 17 de Mayo de 2004 "Por la cual se adopta el manual del interventor versión 0 en el Departamento de Casanare" y la normatividad nacional vigente en la materia.

91
15/ 63
RMT

2877
51

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. 15 13

Para lograr cumplir el objeto en desarrollo del proyecto, se llevará a cabo las siguientes actividades:

- Legalización del contrato.
- Presentar garantías y pólizas exigidas, así como soporte de la inversión del anticipo.
- Legalización de las actas de visita de obra y acta de inicio de obra.

Es indispensable que el interventor efectúe un reconocimiento de la zona a atender, conjuntamente con el contratista y el supervisor del contrato, antes de iniciar la construcción con el fin de verificar la programación de la Obra Física aprobada por el ente contratante.

Igualmente se deben revisar las cantidades de obra establecidas en el contrato a partir de la información suministrada, teniendo en cuenta las prioridades de obra a ejecutar en esta primera visita.

En caso de presentarse modificaciones en desarrollo de la obra, se deberá sustentar técnica y económicamente dicha modificación y certificar porque es la alternativa más favorable para el proyecto.

Rendir informes al Departamento del Casanare por medio del Supervisor Designado y/o contratado, sobre todos los aspectos que considere importantes para el desarrollo del contrato.

La Interventoría debe convocar una reunión con el contratista de obra o consultor y demás personas que considere conveniente, para analizar la programación de la ejecución del contrato, las posibles modificaciones que requiera el proyecto en donde se establezcan los lineamientos, metodología y demás aspectos que se seguirán a lo largo de toda la ejecución de la obra y dar informe semanal al Supervisor por parte de la Entidad Contratante.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, durante la ejecución del contrato, de tal forma que el Departamento por medio del Supervisor Designado, intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas, igualmente debe organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, manteniéndola a disposición del Supervisor y enviar una vez se produzca, copia de la misma a la oficina Jurídica cuando sean aspectos relevantes.

Coordinar con las dependencias del Departamento que tengan relación con la ejecución del contrato, para que éstas cumplan con sus obligaciones.

Para el trámite de la solicitud de la aprobación de los proyectos se debe tener en cuenta lo siguiente:


- a) El consultor debe efectuar la solicitud de los datos técnicos a la Empresa de Servicios Públicos de Pore.
- b) La Interventoría debe revisar el diseño y los planos junto con la empresa de Servicios Públicos de Pore, los cuales deberán contar con el Vo.Bo. de las mismas previas a la iniciación de la obra, al igual que la licencia ambiental por parte de Corporinoquia, para lo cual se tramitará los permisos y/o licencias ambientales a que haya lugar con base en los estudios ambientales realizados por el consultor y aprobados por el interventor.

La Interventoría contratada deberá ejecutarse estrictamente de acuerdo a la Resolución No. 256 de fecha 17 de Mayo de 2004 "Por la cual se adopta el manual del interventor versión 0 en el Departamento de Casanare"; por tal razón las actividades a desarrollar por la Interventoría están claramente enmarcadas en tres grupos expuestos a continuación.

A) FUNCIONES TÉCNICAS

2877 64

2878
58

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

Nº. 1513

Como funciones generales que desarrolla la Interventoría dentro de los aspectos técnicos, se pueden enumerar las que se consideran las más representativas, sin olvidar que existan otras de índole particular para cada tipo de obra.

- Revisión de los pliegos de condiciones de la selección, al igual que la propuesta del constructor y del contrato.
- Revisión y aprobación de los estudios y diseños entregados al contratista y los que el proponga en desarrollo de las obras.
- Iniciación de las obras, verificación del replanteo y establecimiento del programa de ejecución de obras.
- Revisión del cumplimiento de las especificaciones a través del control de materiales, para lo cual se utilizarán los ensayos de laboratorio y control topográfico de las obras y de más controles que pueden observarse en los formatos que se adjunten.
- Control de programación y avance de obras, a través de la línea de balance.
- Remisión y aprobación y coordinación, de la señalización preventiva que se utilizará en la obra.
- Control de recursos, tales como materiales, mano de obra y equipos.
- Solución de problemas técnicos de obra.
- Medición y revisión de cantidades de obra que será la base de las actas.
- Verificación de recursos mínimos, rendimientos y proyecciones periódicas.
- Análisis y sugerencias para cambios o modificaciones a los diseños.
- Registro permanente de las modificaciones a los diseños y especificaciones, sucedidas durante la construcción y presentar soportes técnicos y planos record, aprobados.
- Dar cumplimiento a la resolución 851 de 2009, artículo 3 del trece de marzo de 2009.

B) FUNCIONES ADMINISTRATIVAS


De igual forma que las funciones técnicas, las administrativas son de especial importancia en el control del contrato.

- Estudio y aplicación del contrato de Obra, pliegos de condiciones de la selección y anexos, programas de obra, flujos de fondos e inversión del anticipo.
- Seguimiento, aprobación y control de las pólizas y garantías del contrato-inter administrativo.
- Seguimiento, aprobación y control de anticipos.
- Revisión y aprobación de las actas de obra y de reajuste, en el caso que existieren.
- Revisión de las actas de obras adicionales, complementarias y sustitutivas con cantidades de obra.
- Emitir el concepto sobre los análisis de precios elaborados por el constructor, ítems no previstos.
- Coordinación y colaboración a la Supervisión de las empresas de servicios públicos, durante la construcción, para el recibo y aprobación de las obras realizadas por el constructor.
- Revisar y aprobar el reglamento de seguridad industrial que se establezca en la obra y velar porque se cumpla permanentemente.
- Aprobación de modificaciones y entregar a la Entidad soportes técnicos y planos aprobados.
- Elaboración de informes periódicos mensuales divididos en los siguientes capítulos:

44
KMY 65

2879
5A

7

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. 15 13

1. Área Técnica

- 1.1 Descripción de actividades
- 1.2 Inconvenientes y determinaciones
- 1.3 Control de programación y avance de obra Proyecciones para el siguiente periodo
- 1.4 Cantidades de obra y valor revisado
- 1.5 Análisis de resultados de laboratorio
- 1.6 Resumen del estado del tiempo
- 1.7 Especificaciones de diseño
- 1.8 Avalar y entregar los planos record de la obra.
- 1.9 Proyección para el siguiente periodo.
- 1.10 Presentar informe resumen del estado en que se entrega la obra, el alcance del contrato, recomendaciones para su operación.
- 1.11 En caso de no entregar la obra en cumplimiento su finalidad específica, en funcionamiento, el interventor debe entregar informe detallado, debidamente soportado con memorias de cálculo y planos de construcción, presupuesto de obra e indicar el motivo por el cual no queda en condiciones de operatividad.

2. Área Administrativa

- 2.1 Estado del contrato de Obra
- 2.2 Resumen de las actas de comités de obra
- 2.3 Informe de equipo y personal
- 2.4 Descripción de actividades
- 2.5 Delación con Empresas Municipales
- 2.6 Exigir los soportes de pago de seguridad social integral vigentes durante el desarrollo de la obra.

3. Área Financiera

- 3.1 Control de avance de obra.

4. Registro Fotográfico.

5. Resumen y conclusiones

6. Anexos


6.1 Área Técnica

- 6.1.1 Línea de Balance
- 6.1.2 Gráfico de % programado Vs Ejecutado
- 6.1.3 Cuadro resumen de ensayos realizados y análisis de los mismos o conclusiones.
- 6.1.4 Resumen del estado del tiempo
- 6.1.5 Esquema de avance de obra

6.2 Área administrativa

94 66
DM7

2880
60

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. 1513

- 6.2.1 Actas de comité de obra
- 6.2.2 Valor total del proyecto
- 6.2.3 Control del estado del contrato
- 6.2.4 Acta mensual
- 6.2.5 Control de pólizas
- 6.2.6 Control de equipo
- 6.2.7 Control de personal
- 6.2.8 Soportes del cumplimiento de las obligaciones de pago de seguridad social integral de los trabajadores directos y administrativos

6.3 Área financiera

- 6.3.1 Control de inversión
- 6.3.2 Gráfico de control de inmersión
- 6.3.3 Flujo de Caja

C) FUNCIONES AMBIENTALES:

- Velar porque el contratista cumpla los requerimientos de las medidas ambientales generales para cualquier proyecto de obra civil.
- Realizar control y seguimiento ambiental a las actividades de construcción con el fin de evitar impactos no previstos y evitar daños a terceros.
- Solicitar al contratista el cumplimiento del programa de seguridad industrial e higiene en el trabajo.
- Verificar el alcance de los permisos ambientales, su vigencia y las necesidades de ampliación o modificación de este.
- Realizar acciones adelantadas por parte del contratista para minimizar y mitigar impactos.
- Hacer cumplir la normatividad ambiental vigente y actos administrativos de CORPORINOQUIA a través del cual se tornan y promulgan las decisiones ambientales.

D) LIQUIDACIÓN DE LA OBRA Y DEL CONTRATO


Otra de las actividades de gran importancia en los procesos de la Interventoría, dentro del manejo administrativo del contrato de construcción, es la liquidación de la obra al cual se le hace la Interventoría, quien vigilará la ejecución de las siguientes actividades:

- Presentar actas (informes) mensuales de avance de obra.
- Presentar informe y acta final de obra, acta de entrega a la comunidad.
- Presentar acta de liquidación final de obra.
- Presentar los rendimientos financieros.
- Presentar informes de Interventoría Ambiental al Departamento y a CORPORINOQUIA.

Estas actividades se deben realizar mediante la ejecución de los diferentes componentes de cada una, con base en las especificaciones Técnicas particulares y en las especificaciones de la Secretaría de Obras de la Gobernación de Casanare para cada uno de los ítems contemplados. La cronología de actividades se desarrolla con base en el Programa de Obra Propuesto y según las indicaciones del interventor.

91
67
12/17

2881
61

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. 3

4. SOPORTE TÉCNICO Y ECONÓMICO

4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR:

Para asegurar la calidad de la Interventoría se requiere que la misma se contrate con personas naturales ó jurídicas, individualmente o asociadas en consorcio o unión temporal, con capacidad técnica, económica, financiera y operativa, tomando como soportes los perfiles profesionales categorizados en la Resolución No. 757 de Agosto 17 de 2000, emitida por la Gobernación de Casanare y conformadas en los términos establecidos en la Ley 80 de 1993, en la ley 1150 de 2007 y sus normas reglamentarias; que este en capacidad de ejecutar el objeto de la Interventoría en los términos del Artículo 6 de la Ley 80 de 1993 y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con Interventoría en la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de obras de saneamiento básico, y que tenga como mínimo dentro de su equipo de trabajo el siguiente personal profesional de acuerdo a las siguientes consideraciones:

PERFIL DEL PERSONAL REQUIRIDO

PERSONAL PROFESIONAL

PROFESIONAL	CATEGORÍA	EXPERIENCIA PROFESIONAL	CANTIDAD
Profesional en el área de la Ingeniero (a) Civil, Ingeniero en recursos hídricos, ingeniero Sanitario y/o afines con dedicación del 80%)	4 (DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN NO. 757 DE AGOSTO 17 DE 2000 DE CONSULTARÍA DE LA GOBERNACIÓN)	TÍTULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO, COMO MÍNIMO 6 GENERAL y 4 AÑOS EXPERIENCIA ESPECÍFICA	1
Profesional en el área de la Ingeniero (a) Civil, Ingeniero en recursos hídricos, ingeniero Sanitario y/o afines con dedicación del 100%)	7 (DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN NO. 757 DE AGOSTO 17 DE 2000 DE CONSULTARÍA DE LA GOBERNACIÓN)	TÍTULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO, COMO MÍNIMO 2 AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL	1

PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO


PERSONAL	CANTIDAD
Conductor o motorista	2

La interventoría debe velar por que el contratista de la obra física efectuó el cumplimiento de especificaciones y normas técnicas que a continuación se describe:

- Las especificaciones particulares que se encuentran contenidas en proyecto de consultaría denominado INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE,

Handwritten signatures and initials: "JP", "68", and a signature.

2882
62

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. 1519

DEPARTAMENTO DE CASANARE, deben cumplirse a cabalidad y cualquier modificación debe ser autorizada por el responsable de la consultoría y por el interventor designado dando previo aviso a la Secretaría de de Obras Publicas del Departamento.

- Las especificaciones particulares deben cumplir con las normas establecidas en el Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2000); las estructuras y construcciones de concreto y estructuras metálicas relacionadas en el presente presupuesto deben seguir las especificaciones constructivas del Código Colombiano de Construcciones Sismorresistente (NSR-98), Decreto 1575/2007, Resolución 2115 del 22 de junio de 2007, las Normas Técnicas Colombianas, ICONTEC, de acuerdo con las exigencias de la interventoría.
- Las demás especificaciones se pueden consultar en el manual de Especificaciones Técnicas de Construcción de la secretaria de Obras Publicas y Transporte de la Gobernación de Casanare. En caso de actividades nuevas el interventor deberá consultar, investigar y entregar las normas técnicas aplicables a cada caso, sustentar y presentar sus conclusiones y recomendaciones. Estas deberán estar avaladas por la Secretaría de Planeación Municipal y la Secretaria de Obras Públicas Departamental.

4.2 SOPORTES TECNICOS:

El proyecto inscrito, viabilizado y revisado en el Banco de Programas y Proyectos Departamental, corresponde al subprograma 7.5.1 "Sistema de agua potable"; proyecto Construcción, optimización, habilitación, ampliación, estudios, diseños y mantenimiento de las redes del acueducto, sistemas de tratamiento de agua potable y pozos profundos de las cabeceras municipales, rurales y centros poblados, código SSEPI No. 2008-085000-0021; el componente del proyecto es Etapa de inversión - Adquisición de bienes, servicios y obra pública.

El proyecto se realizara siguiendo los lineamientos de los estudios y diseños elaborados por el Municipio de Pore, radicados en el banco de proyectos del Municipio.

Este subproyecto es presentado por la Administración Municipal, y reposa en la planoteca de la Gobernación de Casanare de la Secretaria de Obras Públicas y transporte. Se encuentra incluido dentro del plan de desarrollo municipal e inscrito en el Banco de Programas y Proyectos Municipal.

4.3 SOPORTES LEGALES:


La interpretación integral de los preceptos contenidos en los artículos 2º, 29, 209, 287 y concordantes de la Constitución política, señala que las Entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites que consagra la Constitución y la ley.

Dicha viabilidad Constitucional, se va enmarcando dentro de los preceptos normativos que la desarrollan, aplicados en los diferentes componentes del proyecto así:

a) **Componente Administrativo y financiero** : En aplicación de lo previsto la ley 152 de 1.994, en concordancia con la Ordenanza No. 004 de Mayo 24 de 2008 mediante la cual se aprobó el plan de Desarrollo Departamental: 2008 -2011 "Pensando en todos" Casanare, territorio de equidad social; fuerza agroindustrial del llano; Reto VII "INTEGRACION Y AFIRMACION TERRITORIAL: ACUERDOS FUNDAMENTALES HACIA EL DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE URBANO Y RURAL" en el programa 7.5 ESTABLECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE UNA PLANIFICACION EFECTIVA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, en el subprograma 7.5.1 SISTEMAS DE AGUA POTABLE.", en el artículo 345 de la Constitución Nacional en materia de presupuesto, en concordancia con la ley 756 y 781 de 2002, los Decretos 1747 de 1995, 416 de 2007, y demás normas complementarias en materia de utilización de recursos de regalías; Ley 142/94 Servicios públicos; C.N. art. 287, (modalidad de selección); Ley 598 de 2000 y Decreto 3512 de 2003 (SICE).

69
KMT

63
2883

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. 1513

b) **Componente Técnico:** En aplicación de lo previsto en las siguientes normas: Ley 141 y 142 de 1994 (servicios públicos); Ley 400 de 2000 (código de sismoresistencia); NSR-98; RAS 2000; Resolución No. 256 de fecha 17 de Mayo de 2004 "Por la cual se adopta el manual del interventor versión 0 en el Departamento de Casanare", resolución No. 2663 del 21 de julio de 2008 del Ministerio de Transporte para los costos de transporte en el territorio Nacional. Ambientales (Ley 99/93. Permiso de concesión de aguas y ocupación de cauce para las obras proyectadas.

c) **Componente Legal o normativo:** Además de las normas citadas en los anteriores componentes, aplica lo previsto en las siguientes normas: Constitución Nacional arts. 2º, 6º, 29, 209, 287; Ley 80/93 arts. 2º, 24 Numeral 1º literal c), 25 Numeral 19; Ley 489/98 arts. 95 y 107; Ley 1150/07 art. 2 numeral 4 literal c) y 3º; Decreto 2474/08 Art. 2º numeral 4, 3, y 78; Decreto 4828/08 art. 8º.

Dentro del anterior marco normativo general y especial, encuadran los componentes específicos del proyecto, en aplicación del principio de planeación previsto en el artículo 3º del Decreto No. 2474 de 2008 en concordancia con el artículo 25 numerales 7 y 12 de la ley 80 de 1993.

4.4 SOPORTES AMBIENTALES:

Por la naturaleza del presente estudio previo, no requiere de licencias ni permisos ambientales. Es deber de la interventoría, velar por que el contratista de la obra física cumpla a cabalidad todos los requerimientos ambientales aplicables al proyecto.

4.5 SOPORTE ECONOMICO:

El cálculo del presupuesto estimado para la ejecución del objeto que respalda el presente estudio previo, se determinó de acuerdo con el presupuesto las interventorías de cada proyecto vigencia 2010, por el método de factor multiplicador, se requiere que el proponente se cña con lo establecido en la RESOLUCION No. 0757 DEL 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2.000 "Por la cual se establecen los topes máximos para sueldos y demás gastos que se pueden pagar en los contratos de CONSULTORIA, por el sistema de Cobro de Costos Directos mas sueldo afectados por un FACTOR MULTIPLICADOR, en la Gobernación de Casanare, actualizada de acuerdo a los IPC dados por el DANE. El Factor Multiplicador utilizado es de 2.27 (Se anexa), el cual fue aceptado y aprobado por la Oficina Jurídica de la Gobernación de Casanare.

Forma parte integral del presente estudio los anexos sobre la consulta de los CUBS y la consulta de los precios indicativos SICE, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 598 de 2000, decreto 3512 de 2003 y acuerdo 005 de 2005 emanado de la gerencia del SICE es obligatorio consultar el catálogo único de bienes y servicios y los precios indicativos, a excepción de los contratos de prestación de servicios y obras que no estén codificados hasta el 5 nivel. Hecha la consulta, se pudo constatar que no existe codificación hasta el quinto nivel.

Con Las exigencias de idoneidad, experiencia del equipo de trabajo y control de calidad, se establece éste valor a la equivalencia del mercado laboral del sector oficial local en forma global, que se calcula de acuerdo con el presupuesto de cada una de las interventoría a ejecutarse en el 2009, el plazo estimado para cumplir con las actividades a desarrollar del objeto de la referencia deberá ser acorde con el plazo de cada uno de las obras designados hasta la proyección de la liquidación remitido a la Oficina Asesora Jurídica.

Es de anotar que el valor de la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, están dentro del marco estableció por la ley de regalías, por concepto de interventoría técnica (Interventoría y supervisión).

10/11/20

64
2884
12

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No.

El presupuesto para el presente Estudio Previo fue realizado por el ingeniero William Rojas Vergara, Profesional Consultoría para la S.O.P.T. *Se anexa Presupuesto Oficial, incluyendo dentro del mismo los CUBS requeridos para cada una de las actividades programadas de la Interventoría*, los cuales son: 2.31.16, 2.32.1, 2.32.2, 2.37.2.

1. COSTOS DE PERSONAL										Plazo = 5 Meses
PERSONAL	CODIGO CUBS	No	SUELDO MES	DIAS	TIEMPO MES	TIEMPO EFECTIVO	PRIMA	VR. BASICO	F.M.	VR. PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL										
Ingeniero Civil o Ingeniero sanitario y ambiental (categoría 4).	2.31.16	1	4,370,319.00	120.00	5.00	80.0%	0.00	17,481,276.00	2.27	39,682,496.52
Profesional cat 7	2.31.16	1	2,659,226.00	150.00	5.00	100.0%	0.00	13,296,130.00	2.27	30,182,215.10
PERSONAL TECNICO										
Conductor o motorista	2.32.1	2	840,698.00	120.00	4.00	100.0%	0.00	6,725,584.00	2.27	15,267,075.68
TOTAL COSTOS DE PERSONAL										85,131,787.30

2. COSTOS DIRECTOS								
CONCEPTO	CODIGO CUBS	UND	VALOR	DIAS	TIEMPO MES	TIEMPO EFECTIVO	CANT	VR. PARCIAL
Transporte								
Vehiculo >2000 cc.	2.37.2	Mes	3,920,152.00	120.00	4.00	100.0%	2.00	31,361,216.00
Documentacion y papeleria								
Registro fotografico y elaboracion de informes	2.32.2	Mes	380,000.00	120.00	4.00	100.0%	1.00	1,520,000.00
Ploteo de planos	2.32.2	Mes	550,000.00	72.00	4.00	60.0%	1.00	1,320,000.00
						TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS		34,201,216.00


3. COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS										119,333,003.30
4. IVA 16.00%										19,093,280.53
5. COSTO FINAL (ajustado al Peso)										138,426,283.83

5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

Dentro de los mecanismos para que el Estado Social de Derecho logre sus objetivos fundamentales, aparece consagrada en la Constitución Nacional, la disponibilidad de alternativas para obtener el adecuado cumplimiento de

2007

2885
65

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. 1000

dichos fines. En concordancia con lo anterior, es viable la utilización de diferentes modalidades de selección de los contratistas, dentro de las cuales se encuentran disponibles la licitación pública, el concurso de méritos, y la contratación directa entre otras.

Con base en los artículos 2º, 6º, 29, 209, 287 y concordantes de la Constitución, procede la aplicación de la normatividad especial en materia de contratación Estatal (Ley 80/93 Art. 32 numeral 2º, Ley 489/98, Ley 1150/07 arts. 2 numeral 3º, Decreto 2474/08 art. 2 numeral 3º; art. 54), en donde se prevén las modalidades de selección y sus requisitos para aplicarlas, las cuales están y se implementan a discreción de quienes tienen la facultad decisoria, aplicando los postulados previstos en los artículos citados de la Carta Política.

Para este proyecto específico, se plantea un Concurso de Méritos.

El Concurso de Méritos, se encuentra viabilizado y regulado por las siguientes normas: C.N. arts. 2º, 6º, 29º, 209º y 287; Ley 80/93 Art. 32 numeral 2º, Ley 1150-07 art. 2 numeral 3º; Decreto 2474/08 art. 2º numeral 3º, Art. 54, Decreto 4828/08, entendiendo que la ponderación de ésta modalidad de contratación, sugerida para implementación entre otras posibles, obedece a las razones ya expuestas y sustentadas en los factores Administrativo, técnico y financiero, y hacen referencia a la conveniencia para la Administración, dentro de lo cual se busca eficacia y oportunidad en las soluciones, sin perjuicio de la previsión que sobre todos los componentes del negocio jurídico deben incluirse en la minuta correspondiente.

6. RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN, COBERTURAS Y JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN

6.1. RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN, COBERTURAS Y JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN.

Por tratarse de un concurso de méritos, en materia de cobertura de riesgos se da aplicación a lo previsto en el artículo 7º del Decreto 2493/09. Los posibles riesgos frente al contratista interventor de la Obra, deben ser determinados por la entidad ejecutora del proyecto. (Art. 4º Ley 1150/07).

DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS:	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO
	RIESGOS PREVISIBLES
	Seriedad de Oferta, Incumplimiento, Responsabilidad extracontractual, Buen manejo y Correcta inversión del anticipo, Salarios y Prestaciones Sociales, Calidad del Servicio.
	RIESGOS IMPREVISIBLES
	Los que no dependen de la voluntad de las partes tales como: Terremoto, inundación, tormenta eléctrica, huracán, descargas atmosféricas y similares.


6.2 COBERTURA DEL RIESGO.

Para garantizar las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del Contrato a celebrar por la Entidad ejecutora, de acuerdo con el artículo 7º de la ley 1150-07, los amparos que deben solicitarse al contratista, de acuerdo con el objeto del contrato a ejecutar, son los siguientes:

COBERTURA EXIGIBLE	SI	NO	CUANTÍA	VIGENCIA
--------------------	----	----	---------	----------

91
10/11/11 72

2886
66

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

Garantía de seriedad de la propuesta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diez (10%) por ciento del valor total del contrato	Tres (3) meses a partir del cierre del proceso
Cumplimiento general del contrato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diez (10%) por ciento del valor total del contrato	Duración del contrato y cuatro (4) meses más
Estabilidad de Obra	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Diez por ciento (10%) del valor total del contrato	Cinco (5) años a partir de la entrega de la obra
Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ciento por ciento (100%) del Valor del Anticipo	Duración del contrato y cuatro (4) meses más
Salarios, prestaciones e indemnizaciones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato	Duración del contrato y tres (3) años más
Responsabilidad Civil Extracontractual	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, y mayor 200 SMMLV al momento de legalización.	Duración del contrato y dos(2) años más
Suministro de repuestos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Diez por ciento (10%) del valor total del contrato	Duración del contrato Un (1) año más
Correcto funcionamiento de los equipos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Diez por ciento (10%) del valor total del contrato	Duración del contrato Un (1) año más
Calidad del bien o servicio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Diez (10%) por ciento del valor total del contrato	Duración del contrato y cuatro (4) meses más
Otras.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Nota: Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto.


6.3. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN

Conforme a lo expresado en artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, concordado con el Decreto 2474 de 2008 Art 12, los factores de selección que permiten la escogencia del ofrecimiento más favorable para la entidad son los siguientes:			
PROCESO	FACTORES		CONSECUENCIA
VERIFICACIÓN	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	HABILITA/INHABILITA
	EXPERIENCIA	<input checked="" type="checkbox"/>	HABILITA/INHABILITA
	CAPACIDAD FINANCIERA	<input checked="" type="checkbox"/>	HABILITA/INHABILITA
	CAPACIDAD TÉCNICA	<input checked="" type="checkbox"/>	HABILITA/INHABILITA
	CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/>	HABILITA/INHABILITA
EVALUACIÓN	PRECIO	<input type="checkbox"/>	PUNTUACIÓN
	CALIDAD (PROPUESTA TÉCNICA)	<input checked="" type="checkbox"/>	PUNTUACIÓN
	PONDERACIÓN CALIDAD Y PRECIO	<input type="checkbox"/>	PUNTUACIÓN
	RELACIÓN COSTO – BENEFICIO	<input type="checkbox"/>	VALORACIÓN MONETARIA

RM 73

2887
67

10

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. 10131

7. CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL	
7.1 TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE CONSULTORIA
7.2 OBJETO A CONTRATAR:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
7.3 PLAZO:	Cinco (05) meses
7.4 LUGAR DE EJECUCIÓN:	AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PORE
7.5 PRESUPUESTO OFICIAL	Ciento treinta y ocho Millones Cuatrocientos veinte seis Mil Doscientos ochenta y tres pesos, con ochenta y tres centavos (\$138.426.283,83) M/cte.
7.6 FORMA DE PAGO:	<p>El Departamento de Casanare desembolsará al contratista el valor contratado, de la siguiente manera:</p> <p>a) Un anticipo equivalente al 50 % sobre el valor total del contrato previa suscripción del acta de iniciación de obra, por parte del supervisor del contrato.</p> <p>b) Los pagos siguientes se efectuarán mediante actas parciales sobre el avance de la obra con amortización del anticipo, con aprobación de la supervisión. La suma de todos los pagos parciales no podrá exceder el 90% del valor total del proyecto.</p> <p>c) Un pago final correspondiente al saldo que debe ser como mínimo el diez por ciento (10%) del valor del contrato, que será cancelado a la entrega final de la obra a satisfacción del DEPARTAMENTO DE CASANARE previa liquidación final del contrato.</p>
8. RESPONSABLES DEL ESTUDIO PREVIO	
COMPONENTE TÉCNICO Nombre: William Rojas Vergara C.C. No. 79.40.512 de Engativa Cargo: Contrato de Consultoría No. 0881-2010 para la S.O.P.T. Firma: 	COMPONENTE JURÍDICO Nombre: SANDRA CAROLINA C.C. 52.335.065 Pte Cargo:  Firma: 
REVISÓ COMPONENTE TÉCNICO Nombre: Gloria I. Jiménez Rubiano C.C No. 23.978.367 de Recetor Cargo: Jefe Oficina de Programación de Obras Firma: 	
 ARMANDO ALFREDO VARGAS FUENTES Secretario de Obras Públicas y Transporte	 RAFAEL ARIAS MARTINEZ VoBo. Director Técnico Banco de Programas

74

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

68
2888

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.743.593**

ROJAS ARGUELLES
APELLIDOS

CARLOS MAURICIO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1976**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.79 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO





03-FEB-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ







A-4604000-70144275-M-0079743593-20060110 0622406006B 02 182386131

2889

 DIAN <small>Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales</small>		Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal		 <small>Módulo Único de Registro, Servicio y Cobro Tributario</small>		001																																					
2. Concepto 02 Actualización <small>Espacio reservado para la DIAN</small>				4. Número de formulario 14367478757																																							
				 <small>(415)7707212489984(8020) 0000014367478757</small>																																							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 4 1 2 4 5 8 - 8		6. DV: 8		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Yopal		14. Buzón electrónico (44)																																					
IDENTIFICACIÓN																																											
24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica		25. Tipo de documento: 1		26. Número de identificación: 14367478757		27. Fecha expedición: 11/11/16																																					
Lugar de expedición		28. País: COLOMBIA		29. Departamento: Casanare		30. Ciudad/Municipio: Aguazul																																					
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres																																					
35. Razón social: CONSORCIO MATAGUASAN																																											
36. Nombre comercial:																																											
37. Signa:																																											
UBICACIÓN																																											
38. País: COLOMBIA		39. Departamento: Casanare		40. Ciudad/Municipio: Aguazul		010																																					
41. Dirección principal CL 22 11 16																																											
42. Correo electrónico: crojas192@hotmail.com		43. Apartado aéreo		44. Teléfono 1: 3 1 0 3 3 4 3 2 0 6		45. Teléfono 2: 6 3 8 2 3 0 9																																					
CLASIFICACIÓN																																											
Actividad económica				Ocupación																																							
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos																																					
46. Código: 7 1 1 0	47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 1 0 2 0 8	48. Código: 7 1	49. Fecha inicio actividad: 2 0 1 1 0 2 0 8	50. Código: 1 2	61. Código: 1 2	52. Número establecimientos: 1 2																																					
Responsabilidades, Calidades y Atributos																																											
53. Código: <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td></tr><tr><td>7</td><td>9</td><td>1</td><td>1</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	7	9	1	1	4													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																										
7	9	1	1	4																																							
07- Retención en la fuente a título de renta 09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ve. 11- Ventas régimen común 14- Informante de exogena																																											
Usuarios aduaneros				Exportadores																																							
54. Código: <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											55. Forma: <input type="checkbox"/>				56. Tipo: <input type="checkbox"/>				57. Modo: <input type="checkbox"/>				58. CPC: <input type="checkbox"/>							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																		
Para uso exclusivo de la DIAN																																											
59. Anexos: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				60. No. de Folios: 0				61. Fecha: 2 0 1 6 0 4 0 8																																			
La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada. Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013 Firma del solicitante:								Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984 Nombre ROJAS ARGUELLES CARLOS MAURICIO 985 Cargo: Representante legal Certificado																																			

694
2890

		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Especio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 14367478757			
 (415)7707212489984(8020) 000001436747875 7							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT):		6. DV		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Yopal		14. Buzón electrónico	
9 0 0 4 1 2 4 5 8		8				4 4	
Representación							
98. Representación: REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación:					
1 3		2 0 1 1 0 3 2 3					
100. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía		101. Número de identificación:		102. DV		103. Número de tarjeta profesional:	
1 3		7 9 7 4 3 6 9 3					
104. Primer apellido ROJAS		105. Segundo apellido ARGUELLES		106. Primer nombre CARLOS		107. Otros nombres MAURICIO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación:		99. Fecha inicio ejercicio representación:					
100. Tipo de documento:		101. Número de identificación:		102. DV		103. Número de tarjeta profesional:	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación:		99. Fecha inicio ejercicio representación:					
100. Tipo de documento:		101. Número de identificación:		102. DV		103. Número de tarjeta profesional:	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación:		99. Fecha inicio ejercicio representación:					
100. Tipo de documento:		101. Número de identificación:		102. DV		103. Número de tarjeta profesional:	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación:		99. Fecha inicio ejercicio representación:					
100. Tipo de documento:		101. Número de identificación:		102. DV		103. Número de tarjeta profesional:	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):		109. DV		110. Razón social representante legal			

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

Espacio reservado para la DIAN



2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14146690187



5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

6. DV

9 0 0 4 1 2 4 6 - 8

12. Dirección seccional
Registros y Aduanas de Yopal

14. Buzón electrónico

4 4

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

25. Tipo de documento:

1

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

CONSORCIO MATAGUASAN

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento:

Casanare

8 5

40. Ciudad/Municipio:

Aguazul

0 1 0

41. Dirección

CR 15 A 22 99

42. Correo electrónico:

crojas192@hotmail.com

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1:

3 1 0 3 3 4 3 2 0 5

45. Teléfono 2:

6 3 8 2 3 0 9

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

7 4 1 4

47. Fecha inicio actividad:

2 0 1 1 0 2 0 8

Actividad secundaria

48. Código:

49. Fecha inicio actividad:

Otras actividades

50. Código:

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades

53. Código:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 9 1 1 1 4

7- Retención en la fuente a título de renta

3- Retención en la fuente en el impuesto sobre las V

1- Ventas régimen común

14- Informante de exogene

Usuarios aduaneros

54. Código:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

57. Modo

58. CPC

1 2 3
1 2 3
1 2 3

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI ☒ NO ☐

60. No. de Folios: 4

61. Fecha: 2 0 1 1 0 3 3 1

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2768 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del declarante:

7-1 J.A.T. /

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

CAMACHO BAUTISTA EDILMA

985. Cargo:

Gestor I



Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 1 de 1 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14146690187



(415)7707212489984(8020) 000001414669018 7

6. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 1 2 4 5 6

6. DV

8

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Yopal

14. Buzón electrónico



Representación

98. Representación: REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 1 1 0 3 2 3
100. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía	101. Número de identificación: 7 9 7 4 3 5 9 3
102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido ROJAS	105. Segundo apellido ARGUELLES
106. Primer nombre CARLOS	107. Otros nombres MAURICIO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:
102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:
102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:
102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:
102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV
110. Razón social representante legal	

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

29

CONSORCIO MATAGUASAN

2893
71

YOPAL 23 de Marzo de 2011

Señores
Gobernación de Casanare
Atte. Rodrigo Flechas
Dirección de Contratación
La Ciudad


REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA No 303 DEL 14 DE FEBRERO DEL 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Los suscritos. WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ e IVAN RUPERTO SANCHEZ JIMENEZ, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de DIARCO LTDA Y EPICO INGENIERIA LTDA, respectivamente, quienes conforman el CONSORCIO MATAGUASAN, manifestamos por este documento, que hemos convenido cambiar el representante legal Ingeniero LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMENEZ, identificado con C.C. No 74.861.147 de Yopal, a solicitud del mismo por razones de interés personal para poder acceder a un cargo público.

El nuevo representante Legal del Consorcio Mataguasan es el ingeniero CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES, identificado con C.C. No.79.743.593 de Bogotá, el cual será quien está expresamente facultado para firmar y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del Contrato con amplias y suficientes facultades.

La sede del Consorcio queda establecida en:
Dirección de correo: CARRERA 15ª No. 22-99
Dirección electrónica crojas192@hotmail.com
Teléfono 310-3343205
Telefax 6382309
Ciudad Aguazul



DIARCO LTDA
R/L WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ

EPICO INGENIERIA LTDA
R/L IVAN RUPERTO SANCHEZ JIMENEZ

R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES

CASANARE

CONSORCIO MATAGUASAN

72
2894

YOPAL 23 de Marzo de 2011

Señores
Gobernación de Casanare
Atte. Eliana Andrea Vargas
Jefe Oficina Jurídica
La Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA No 303 DEL 14 DE FEBRERO DEL 2011


OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Los suscritos, WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ e IVAN RUPERTO SANCHEZ JIMENEZ, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de DIARCO LTDA Y EPICO INGENIERIA LTDA, respectivamente, quienes conforman el CONSORCIO MATAGUASAN, manifestamos por este documento, que hemos convenido cambiar el representante legal Ingeniero LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMENEZ, identificado con C.C. No 74.861.147 de Yopal, a solicitud del mismo por razones de interés personal para poder acceder a un cargo público.

El nuevo representante Legal del Consorcio Mataguasan es el ingeniero CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES, identificado con C.C. No.79.743.593 de Bogotá, el cual será quien está expresamente facultado para firmar y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del Contrato con amplias y suficientes facultades.

La sede del Consorcio queda establecida en:
Dirección de correo: CARRERA 15ª No. 22-99
Dirección electrónica crojas192@hotmail.com
Teléfono 310-3343205
Telefax 6382309
Ciudad Aguazul

28 MAR 2011
1135
Flw



DIARCO LTDA
R/L WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ



EPICO INGENIERIA LTDA
R/L IVAN RUPERTO SANCHEZ JIMENEZ

R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES

CASANARE

CONSORCIO MATAGUASAN

23
2895

OTROSI MODIFICATORIO DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO

YOPAL 23 de Marzo de 2011

Señores
Gobernación de Casanare
La Ciudad

REFERENCIA: - CONTRATO DE CONSULTORIA No 303 DEL 14 DE FEBRERO DEL 2011

Los suscritos, WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ y IVAN RUPERTO SANCHEZ JIMENEZ, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de DIARCO LTDA Y EPICO INGENIERIA LTDA, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en la contratación directa de la referencia cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE., y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del Contrato.

2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN (%) (1)
DIARCO LTDA	90%
EPICO INGENIERIA LTDA	10%

(1)El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO MATAGUASAN.

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante Legal del Consorcio es LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMENEZ, identificado con C.C. No.74.861.147 de YOPAL, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la oferta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el Contrato y tomar todas las determinaciones que fueren

R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES

CASANARE

/ 8 82

CONSORCIO MATAGUASAN

24
2896

necesarias respecto a la ejecución y liquidación del Contrato con amplias y suficientes facultades.

6. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo CARRERA 13 No 14-09

Dirección electrónica epicoing@gmail.com

Teléfono 3103295924

Telefax 6392602

Ciudad Aguazul

7. Se modifica el numeral 5 y 6 los cuales quedaran asi: El representante Legal del Consorcio es CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES, identificado con C.C. No. 79.743.593 de Bogotá, quien está expresamente facultado para tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del Contrato con amplias y suficientes facultades.

8. La nueva sede del Consorcio queda establecida en:


Dirección de correo: CARRERA 15ª No. 22-99

Dirección electrónica crojas192@hotmail.com

Teléfono 310-3343205

Telefax 6382309


Ciudad Aguazul




DIARCO LTDA
R/L WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ



EPICO INGENIERIA LTDA
R/L IVAN RUPERTO SANCHEZ JIMENEZ



CONSORCIO MATAGUASAN
R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
ENTRANTE




CONSORCIO MATAGUASAN
R/L LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMENEZ
SALIENTE

R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES

CASANARE

NO
RA 7
2897

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-26-I	
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009	
	ACTA DE REINICIO			VERSIÓN:	01	
HOJA 1 de 2	Fecha	DD 8	MM 10	AA 2012	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011	

DIRECCION TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretaría de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 10 ORDEN DE REINICIACION No. 3

Se hace constar:

1) Que mediante acta No.08 se realizó la suspensión No.03 y acta No.09 la ampliación No.01 de la suspensión No.03 del Contrato de Consultoría No. 0303 DE 2011

2) Mediante la suscripción de la presente orden de reiniciación, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del Contrato
- Nueva fecha de terminación del Contrato con respecto a la inicialmente pactada
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
- Relación de personal y maquinaria inactiva
- Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el Contrato

En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad-exclusiva del supervisor y contratista.

3) El supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el Contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.

CONSULTORIA ☒ OTRA ☐ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ☐

CONTRATO No. 0303 DE 2011
(Número de Contrato)

VIGENCIA CINCO (05) MESES
(Indique la vigencia del Contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique el objeto del Contrato de ejecución suscrito)

INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA. Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE.

LOCALIZACION DEL PROYECTO VEREDAS AGUALINDA, SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del Contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO CINCO (05) MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 6 DE MAYO DE 2011
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 138.381.040,00
CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE
(Indique el valor del Contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATANTE GOBERNACION DE CASANARE

SUPERVISOR ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
(Indique el nombre del funcionario designado para ser supervisor de la obra del Contrato)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO


CONTRATO ADICIONAL No.

TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

FORMATO DC-027


755 84


2898
76

 GOBERNACIÓN DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-26-1	
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009	
	ACTA DE REINICIO			VERSIÓN:	01	
HOJA 2 de 2	Fecha	DD 8	MM 10	AA 2012	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011	
DIRECCION TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES						
Nombre dependencia responsable del proyecto o Convenio (Secretaría de despacho, Director de Planeación o representante legal ante descentralizado)						
ACTA No. 10 ORDEN DE REINICIACION No. 3						
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION						
ACTAS No				TIEMPO (DIAS CALENDARIO)		
ACTA No 3 DE SUSPENSION No.1 (14-06-2011)				SESENTA (60) DIAS		
ACTA No 5 DE SUSPENSION No.2 (16-08-2011)				CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS		
ACTA No 6 DE AMP. DE SUSP. No.2 (26-12-2011)				TREINTA (30) DIAS		
ACTA No 8 DE SUSPENSION No.3 (25-04-2012)				CIENTO VEINTE (120) DIAS		
ACTA No 9 DE AMP. DE SUSP. No.3 (24-08-2012)				CUARENTA Y CINCO (45) DIAS		
FECHA DE SUSPENSION VIGENTE		25 (Mes)	DE	ABRIL (Mes)	DE	2012 (Año)
TIEMPO DE SUSPENSION		CIENTO SESENTA Y CINCO 165 DIAS (Indique el tiempo durante el cual el Contrato estuvo suspendido, especificando meses y días según sea necesario)				
FECHA DE REINICIACION		8 (Mes)	DE	OCTUBRE (Mes)	DE	2012 (Año)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		\$ 138.381.040,00 (Indique el valor actual del Contrato en números)				
CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE						
En Yopal; a los Ocho (08) días del mes de OCTUBRE de 2012 se reunieron (Indique en este espacio el día en que se efectuó la reunión, en letra y números)						
CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES representante legal del Contratista de Interventoría (Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)						
ADRIANA HERNANDEZ F. Directora Técnica de Construcciones y AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA (Nombre del representante legal o delegado de la empresa)						
Supervisor designado, con el fin de aprobar la orden de reiniciación del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminación de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.						
El Contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reinicio suscrita						
NUEVA FECHA DE TERMINACION 1 DE NOVIEMBRE DE 2012 (Indique el día, mes y año)						
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los OCHO (08) días del mes de OCTUBRE DE 2012 (Indique el día, mes y año)						
Firma	Ing. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L CONSORCIO MATAGUASAN Contratista			Firma	Ing. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA SUPERVISOR DESIGNADO	
Nombre	Ing. ADRIANA HERNANDEZ FUENTES Directora Técnica Construcciones			Nombre	NELSON NADYD NIETO RAMIREZ Secretario de Obras Publicas Y Transporte	
Original	Copia	Copia	Copia	Copia	Copia	Copia

Departamento de Casanare
24 JUNIO 2012
RECIBIDO
HORA:
FIRMA


120 2899 37


 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-10-1	
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009	
	ACTA DE SUSPENSION			VERSIÓN:	01	
HOJA 1 de 4	Fecha	DD 24	MM 8	AA 2012	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011	
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE						
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación, o representante legal eno descentralizado)						
ACTA No. 9 DE AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No. 3						
(Suspensión/Ampliación de suspensión)						
GRADO DE RESPONSABILIDAD						
1) Mediante la suscripción de la presente acta de ampliación de suspensión, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: - Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender la suspensión del contrato. - Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado - Fecha prevista de reiniciación En consecuencia el contratista continuara con las labores suspendidas a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a finalizar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista. 2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la ampliación de la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio. 3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato continúe suspendido previa aprobación del Interventor y revisión de la condiciones de suspensión por parte del Supervisor de Contrato. 5- El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.						
CONSULTORIA <input checked="" type="checkbox"/> OBRA <input type="checkbox"/> DISEÑO Y CONSTRUCCION <input type="checkbox"/>						
CONTRATO No 0303 DE 2011 (Número de contrato) (Año de suscripción)						
OBJETO DEL CONTRATO (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)						
INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA, Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE						
LOCALIZACION DEL PROYECTO VEREDAS DE AGUALINDA, SAN ISIDRO Y MATALARGA (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)						
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO CINCO (05) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)						
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 6 DE MAYO DE 2011 (Día) (Mes) (Año)						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 138.381.040,00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)						
CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (Indique el valor del contrato suscrito en letras)						
CONTRATISTA CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES (Escriba el nombre o razón social del contratista)						
CONTRATANTE GOBERNACION DE CASANARE (Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)						
SUPERVISOR ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA (Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)						



253 86


2900
78

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-10-1
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA			FECHA:	22/06/2009
	ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO			VERSIÓN:	01
HOJA 2 de 4	Fecha	DD 24	MM 8	AA 2012	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ante descentralizado)					
ACTA No. 9 DE AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No. 3					
ANTECEDENTES DEL CONTRATO					
CONTRATO ADICIONAL No			TIEMPO (DIAS CALENDARIO)		
XX			XX		
ACTAS No			TIEMPO (DIAS CALENDARIO)		
ACTA No. 3 DE SUSPENSION No. 1 (14/08/2011)			SESENTA (60) DIAS		
ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2 (16/08/2011)			CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS		
ACTA No. 6 DE AMP. DE SUSP. No. 2 (26/12/2011)			TREINTA (30) DIAS		
ACTA No. 8 DE SUSPENSION No. 3 (25/04/2012)			CIENTO VEINTE (120) DIAS		
CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO					
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO			CINCO (5) MESES <small>(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)</small>		
FECHA DE TERMINACION ACTUAL			19 DE SEPTIEMBRE DE 2012 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>		
VALOR ACTUAL \$			\$ 138.381.040,00		
CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE					
En Yopal Casanare ; a los <u>Venticuatro (24)</u> días del mes <u>Agosto</u> de <u>2012</u> <small>(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)</small>					
se reunieron <u>CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES</u> representante legal del Interventor, <small>(Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)</small>					
<u>ADRIANA HERNANDEZ</u> Directora Técnica Construcciones y <u>AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA</u> <small>(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)</small>					
Supervisor Designado de la Gobernacion con el fin de <u>Ampliar la suspension</u> del contrato <small>(Suspendir/Ampliar la suspensión)</small>					
anteriormente citado, de acuerdo con la solicitud del <u>contratista</u> del <u>23</u> de <u>Agosto</u> <small>(Interventor o Contratista) (Día de la solicitud) Mes de la solicitud)</small>					
de <u>2012</u> <small>(Año de la solicitud)</small>					
CAUSAS					
Para las veredas San Isidro y Matalarga se argumentaron las siguientes causas:					
1. A la fecha no se han superado las causas que motivaron la suspension.					
Por lo anterior se solicita la ampliacion de la suspension del contrato de obra por un termino de Cuarenta y cinco (45) días, esto queda plasmado en oficio enviado por el contratista el 23/08/2012.					
Para la vereda Agualinda se argumentaron las siguientes causas:					
1. A la fecha no se han superado las causas que motivaron la suspension.					




252
87

2901
79

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-10-I	
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA			FECHA:	22/06/2009	
	ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO			VERSIÓN:	01	
HOJA 3 de 4	Fecha	DD 24	MM 8	AA 2012	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011	
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE						
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretaría de despacho, Director de Planeación o representante legal en la descentralizado)						
ACTA No. 9 DE AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No. 3						
Por lo anterior se solicita la ampliación de la suspensión del contrato de obra por un término de Cuarenta y cinco (45) días, esto queda plasmado en oficio enviado por el contratista el 23/08/2012.						
Por consiguiente se solicita la suspensión del contrato de Consultoría 303-011 por un término de Cuarenta y cinco (45) días, esto queda plasmado en oficio enviado por el contratista el 23/18/2012.						
<div>Departamento de Casanare D.A. JUDICIA RECIBIDO 23 OCT 2012 RADIACION</div>						
NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO						
FECHA DE SUSPENSION		25 DE Abril DE 2012 (Día) (Mes) (Año)				
PLAZO TRANSCURRIDO		Ciento veinte (120) días (Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)				
PLAZO FALTANTE		Cuarenta y cinco (45) días (Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)				
FECHA PREVISTA DE REINICIACION		8 DE Octubre DE 2012 (Día) (Mes) (Año)				
RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO						
PERSONAL DIRECTIVO						
CARGO		ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS		No TARJETA PROF	
PROFESIONAL CAT 4		ING CIVIL	MARTHA JIMENEZ		25202 -62129	
PROFESIONAL CAT 7		ING CIVIL	CARLOS ROJAS		25202- 84567	
PERSONAL OPERATIVO						
CARGO		CANTIDAD				
CONDUCTOR		1				
MAQUINARIA						
TIPO		REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO		
XX		XX	XX	XX		
Nota: Se deja constancia que la presente acta no genera costo adicional al proyecto por lo tanto el contratista renuncia a cualquier reclamación.						

85
2902

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-10-1	
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA			FECHA:	22/06/2009	
	ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO			VERSIÓN:	01	
HOJA 4 de 4	Fecha	DD 24	MM 8	AA 2012	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011	
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE						
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal en lo descentralizado)						
ACTA No. 9 DE AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No. 3						
El Contratista se compromete a terminar el objeto del contrato No. 303 de 2011 (Indique el número y año del contrato que se suspende o amplía la suspensión)						
en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.						
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veinticuatro (24) (Día en letras)						
días del mes de Agosto de 2012 (Mes en que se firma el acta) (Año de finalización)						
Firma 7-1-17-11-1		Firma Ing. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA Supervisor designado				
Nombre Ing. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L. CONSORCIO MATAGUASAN Contralista		RECIBIDO 23 OCT 2012 RADIACIÓN				
Vo.Bo. Ing. ADRIANA HERNANDEZ RUENTES Directora Técnica Construcciones		Vo.Bo. NELSON NADYN NIETO RAMIREZ Secretario de Obras Publicas y Transporte				
Vo.Bo. Nombre GUSTAVO DOLFO LARA SEPULVEDA Jefe Oficina Asesora Jurídica						
Original Oficina Jurídica: 1era copia interventor 2da copia contralista 3ra copia dependencia responsable del contrato						

81
2903

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

Yopal, 23 de Agosto de 2012

Ingeniero
AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
Profesional contratado No. 1847/10
Unidad de Construcciones
Secretaria de Obras Públicas y Transporte
Departamento de Casanare

CICM - NA

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 303-11
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del acueducto vereda Agualinda y construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore".

Asunto: Solicitud de Ampliación de Suspensión.


Cordial Saludo,

Debido a los oficios enviados por el contratista de obra donde solicita la ampliación de la suspensión del contrato No. 020 y No. 021 "ya que no se han superado las causas que motivaron la suspensión".

Por lo tanto el contrato de consultoría No 303 del 2011, solicita considerar la ampliación de la suspensión por un tiempo de 45 días.


Agradezco su colaboración.

Atentamente,


CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
R/I CONSORCIO MATAGUASAN

32
2904


1/R

 GOBERNACION DE CASANARE	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009
	ACTA DE SUSPENSION			VERSION:	01
HOJA 1 de 4	Fecha	DD 25	MM 4	AA 2012	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)					
ACTA No. 8 DE SUSPENSION No. 3 (Suspension/Ampliacion de suspension)					
GRADO DE RESPONSABILIDAD					
1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: - Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender la suspensión del contrato. - Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado. - Fecha prevista de reiniciación. En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.					
2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.					
3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de la condiciones de suspensión por parte del Supervisor de Contrato.					
5- El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.					
CONSULTORIA <input checked="" type="checkbox"/> OBRA <input type="checkbox"/> DISEÑO Y CONSTRUCCION <input type="checkbox"/>					
CONTRATO No 0303 DE 2011 (Número de contrato) (Año de suscripción)					
OBJETO DEL CONTRATO (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)					
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE					
LOCALIZACION DEL PROYECTO VEREDAS DE AGUALINDA, SAN ISIDRO Y MATALARGA (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)					
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO CINCO (05) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)					
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 6 DE MAYO DE 2011 (Día) (Mes) (Año)					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 138,381,040.00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)					
CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (Indique el valor del contrato suscrito en letras)					
CONTRATISTA CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS A. (Escriba el nombre o razón social del contratista)					
CONTRATANTE GOBERNACION DE CASANARE (Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)					
SUPERVISOR ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA (Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)					

Departamento de Casanare
O.A. JURIDICA
RECIBIDO 22 JUN 2009
HORA: 11:00
RUBRICACION

248
94

83
2905

 GOBERNACION DE CASANARE		PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA			FECHA: 22/06/2009
		ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO			VERSIÓN: 01
HOJA 2 de 4	Fecha	DD 25 /	MM 4 /	AA 2012 /	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)					
ACTA No. 8 DE SUSPENSION No. 3					
ANTECEDENTES DEL CONTRATO					
CONTRATO ADICIONAL No XX			TIEMPO (DIAS CALENDARIO) XX		
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION					
ACTAS No			TIEMPO (DIAS CALENDARIO)		
ACTA No 3 DE SUSPENSION No. 1 (14-06-2011)			SESENTA (60) DIAS		
ACTA No 5 DE SUSPENSION No. 2 (16-08-2011)			CIENTO TREINTAY CINCO (135) DIAS		
ACTA No 6 DE AMP No. 1 DE SUSPENSION No. 2 (26-12-2011)			TREINTA (30) DIAS		
CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO					
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO CINCO (5) MESES <small>(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)</small>					
FECHA DE TERMINACION ACTUAL 19 DE MAYO DE 2012 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>					
VALOR ACTUAL \$ 138,381,040.00					
CIENTO TREINTAY OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE					
En Yopal Casanare; a los Veinticinco (25) días del mes Abril de 2012 <small>(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letra (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión))</small>					
se reunieron CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES representante legal del Interventor, <small>Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista</small>					
ADRIANA HERNANDEZ Directora Técnica Construcciones y AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA <small>(Indique el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del Contrato)</small>					
Supervisor Designado de la Gobernación con el fin de suspender el contrato <small>Suspender/Ampliar la suspensión</small>					
anteriormente citado, de acuerdo con la solicitud del contratista del 24 de Abril de 2012 <small>(Interventor o Contratista) (Día de la solicitud) (Mes de la solicitud)</small>					
de 2012 por un término de Cuatro (4) meses a partir de la fecha de suscripción de la presente acta <small>(Año de la solicitud)</small>					
CAUSAS					
Los contratos de obra Nos. 021 de 2011 y 020 de 2011 suscritos entre Aguas de Pore y el ingeniero Oscar Javier Acuña para la construcción de los acueductos de las veredas San Isidro - Matalarga y Aguafina respectivamente, se suspendieron argumentando las siguientes causas:					
1. Que de acuerdo con el oficio enviado por el contratista de obra el 23 de Abril de 2012 y con posterior visita al sitio se encontraron los siguientes inconvenientes para llevar a cabo la ejecución de las obras:					
Para la Vereda San Isidro y Matalarga					
1. El puente metálico de acceso a la vereda Matalarga se desplomo totalmente, por la socavación de los extremos de los estribos, evitando el paso de vehículo.					
2. Esto genera que sea imposible en este momento la entrada de material, equipos y personal al sitio de la obra en la vereda Matalarga.					
Por lo anterior el contratista de obra del contrato 021-2011 suscrito entre Aguas de Pore y el ingeniero Oscar Acuña solicita la suspensión del contrato de obra por un término de CUATRO (04) MESES; esto queda plasmado en oficio enviado por el contratista el 23/04/2012; con registro fotográfico.					

Departamento de Casanare
O.A. JURIDICA
RECIBIDO: 02 OCT 2012
FOLIO: 1

2906

 GOBERNACION DE CASANARE	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA			FECHA:	22/06/2009
	ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO			VERSIÓN:	01
HOJA 3 de 4	Fecha	DD 25	MM 4	AA 2012	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 8 DE SUSPENSION No. 3

Para la vereda Aguablanca se argumentaron las siguientes causas:

1. Debido a las condiciones climaticas reinantes en la zona, el nivel freatico esta muy alto lo cual no permite realizar excavaciones, ya que las zanjas al estar tan saturadas no permiten la correcta instalacion de la tubería, el uso de motobombas es infructuoso.

Por lo anterior el contratista de obra del contrato 020-2011 suscrito entre Aguas de Pore y El ingeniero Oscar Acuña solicita la suspensión del contrato de obra por un termino de CUATRO (4) MESES.

Una vez expuestas esta solicitud la interventoría considera viable realizar la suspensión requerida por el contratista de obra; por lo cual suscribe el acta No.9 de suspensión No- 03, del contrato de obra No. 020-2011 suscrito entre Aguas de Pore y El ingeniero Oscar Acuña.

tambien suscribe el acta No.7 de suspensión No- 03 del contrato de obra No. 021-2011 suscrito ntre Aguas de Pore y El ingeniero Oscar Acuña.

Por lo anterior solicito que el contrato de interventoria No. 3030-2011 sucrito por la Gobernación de Casanare y el Consorcio Mataguasan, sea suspendido por elmismo tiempo de los contartos de obra citados por un lapso de cuatro (4) meses.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSION

25 / DE ABRIL / DE 2012 /
(Dia) (Mes) (Año)

PLAZO TRANSCURRIDO

cero (0) dias /

(Indique en este espacio los dias que hayan transcurrido desde la suspension del contrato)

PLAZO FALTANTE

CIENTO VEINTE (120) DIAS /

(Indique en este espacio los dias faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)

FECHA PREVISTA DE REINICIACION

24 / DE AGOSTO /
(Dia) (Mes)

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO


CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº TARJETA PROFIN
PROFESIONAL CAT 4	ING CIVIL	MARTHA JIMENEZ	25202-62129
PROFESIONAL CAT 7	ING CIVIL	CARLOS ROJAS	25202-84567

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	CANTIDAD
CONDUCTOR	1

















MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
XX	XX	XX	XX



2906 98

85
2907

 GOBERNACION DE CASANARE	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA			FECHA:	22/06/2009						
	ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO			VERSION:	01						
HOJA 4 de 4	Fecha	DD 25	MM 4	AA 2012	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011						
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE											
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)											
ACTA No. 8 DE SUSPENSION No. 3											
<p>Nota: Se deja constancia que la presente acta no genera costo adicional al proyecto por lo tanto el contratista renuncia a cualquier reclamacion./</p> <p>El Contratista se compromete a terminar el objeto del contrato No. 303 de 2011 (Interventor o Contratista según el caso) (Indique el número y año del contrato que se suspende o amplía la suspensión)</p> <p>en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba. Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veinticinco (25) (Día en letras)</p> <p>días del mes de Abril de 2012 (Mes en que se firmó) (Año de finalización)</p> <table border="0"><tr><td>Firma  Nombre Ing. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L. CONSORCIO MATAGUASAN Contratista</td><td>Firma  Nombre Ing. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA Supervisor designado</td></tr><tr><td>Vo.Bo.  Nombre Ing. ADRIANA HERNANDEZ FUENTES Directora Técnica Construcciones</td><td>Vo.Bo.  Nombre NELSON NADYN NIETO RAMIREZ Secretario de Obras Públicas y Transporte</td></tr><tr><td colspan="2">Vo.Bo.  GUSTAVO ADOLFO LARA SEPULVEDA Jefe Oficina Asesora Jurídica</td></tr></table> <p>Original Oficina Jurídica: 1era copia interventor 2da copia contratista 3ra copia dependencia responsable del contrato</p>						Firma  Nombre Ing. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L. CONSORCIO MATAGUASAN Contratista	Firma  Nombre Ing. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA Supervisor designado	Vo.Bo.  Nombre Ing. ADRIANA HERNANDEZ FUENTES Directora Técnica Construcciones	Vo.Bo.  Nombre NELSON NADYN NIETO RAMIREZ Secretario de Obras Públicas y Transporte	Vo.Bo.  GUSTAVO ADOLFO LARA SEPULVEDA Jefe Oficina Asesora Jurídica	
Firma  Nombre Ing. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L. CONSORCIO MATAGUASAN Contratista	Firma  Nombre Ing. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA Supervisor designado										
Vo.Bo.  Nombre Ing. ADRIANA HERNANDEZ FUENTES Directora Técnica Construcciones	Vo.Bo.  Nombre NELSON NADYN NIETO RAMIREZ Secretario de Obras Públicas y Transporte										
Vo.Bo.  GUSTAVO ADOLFO LARA SEPULVEDA Jefe Oficina Asesora Jurídica											

Departamento de Casanare
O.A. JURÍDICA
RECIBIDO 02 OCT 2012
HORA:
RADIACIÓN

245

9A

86
2908

NIT. 900412456-8

Yopal, 24 de Abril de 2012

CICM - NA

Ingeniero
AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
Profesional contratado No. 1847/10
Unidad de Construcciones
Secretaria de Obras Públicas y Transporte
Departamento de Casanare

24-04-012
A: 501

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 303-11
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del acueducto vereda Agualinda y construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore".

Asunto: Solicitud de Suspensión.

Cordial Saludo,

De acuerdo con el oficio enviado por el contratista el 23 de Abril del año en curso y con posterior visita al sitio se encontraron los siguientes inconvenientes para llevar a cabo la ejecución de las obras:

Para la vereda San Isidro Y Matalarga:

1. El Puente metálico de acceso a la vereda Matalarga del Municipio de Pore se desplomo totalmente, por la socavación de los extremos de los estribos, evitando el paso de vehículos.
2. Esto genera que sea imposible en este momento la entrada de material, equipos y personal al sitio de la obra en la vereda Matalarga.

Por lo anterior se solicita la suspensión del contrato de obra por un término de NOVENTA (90) DIAS. Esto queda plasmado en oficio enviado por el contratista de obra el 23/04/2012 con registro fotográfico.

244

41

95

24
2909

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

Para la vereda Agualinda:


1. Debido a las condiciones climáticas reinantes en la zona, el nivel freático esta muy alto lo cual no permite realizar excavaciones, ya que las zanjas al estar tan saturadas no permiten la correcta instalación de la tubería, el uso de motobombas es infructuoso.

Por lo anterior se solicita la suspensión del contrato de obra por un término de NOVENTA (90) DIAS. Esto queda plasmado en oficio enviado por el contratista el 23/04/2012.

Por lo tanto el contrato de consultoría No 303 del 2011, solicita considerar la suspensión por un tiempo de 90 días.

Agradezco su colaboración.

Atentamente,


CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
R/ CONSORCIO MATAGUASAN

243

88
2910

Yopal, 26 de Abril de 2012

Ingeniero

Carlos Mauricio Rojas arguelles

R/L. CONSORCIO MATAGUASAN

AGUAS DE PORE- Entidad Contratante.

Asunto: Contrato de obra 021-2011- CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Referencias: Solicitud Suspensión (90) Noventa días.

Debido a las situaciones inesperadas que suceden en obra solicito muy cordialmente suspensión en tiempo del contrato 021-2011 dado que el puente metálico que comunica a la vereda Matalarga se desplomo totalmente, por la socavación de los extremos de los estribos, evitando el paso de vehículos, además quedando al otro lado una volqueta para el servicio del suministro de los materiales pétreos como arena para la tubería y triturado para el tanque de almacenamiento para la obra sin poder salir del sitio. Siendo esta el único acceso para entrar a la vereda. Según las condiciones este puente será removido y habilitado pero se demoran más de un mes en este proceso de construcción. Anexo un registro fotográfico de la zona.

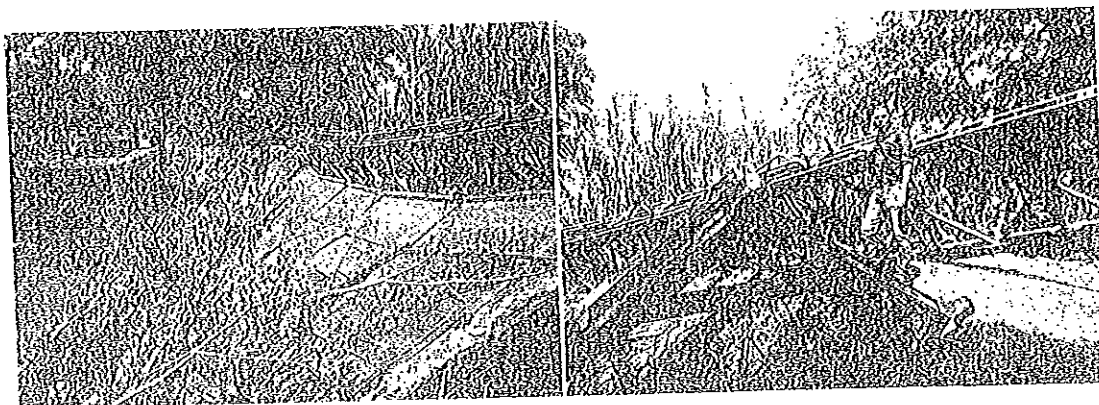


Foto 1,2: caída del puente metálico entrada a Matalarga /

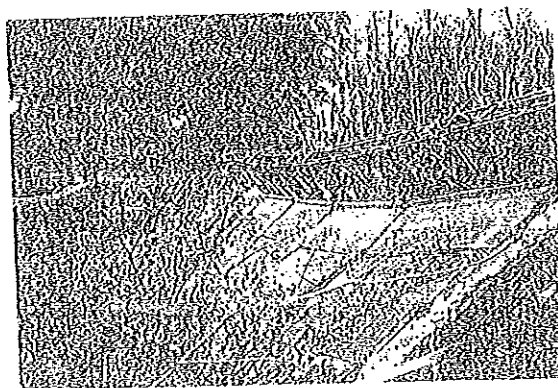


Foto 3: Placa superior metálica derrumbada

Rojas
7.1.14.11.
23/04/2012

742 97

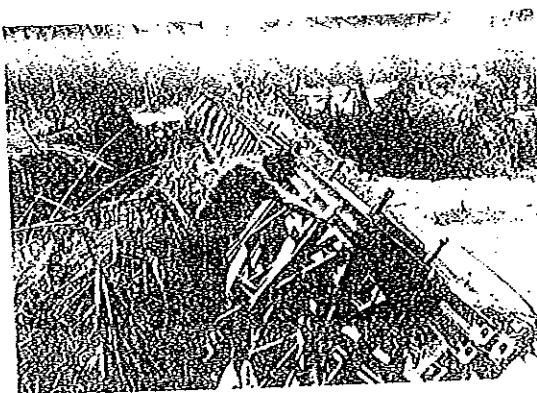


Foto 4: Única forma de paso de personal por encima del puente.

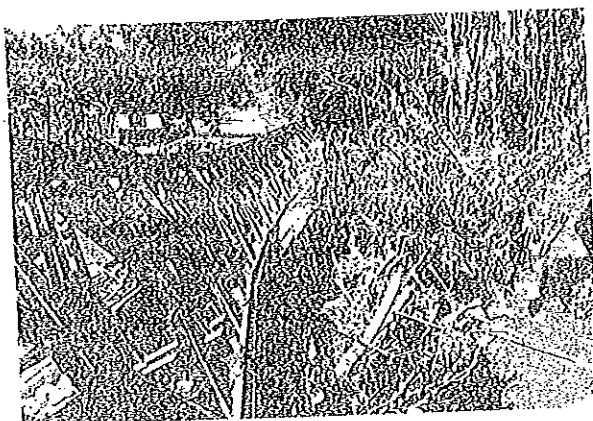


Foto 5: acumulación de palizada en un estribo central del puente

En la vereda San Isidro se presenta en estos momentos también el acceso difícil por la quebrada Alimeta dado por las constantes lluvias en la zona. Se dificulta el transporte de los materiales de obra faltantes para la finalización del tanque de almacenamiento.

Cordialmente,

Ing. OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA.




90
2912

 GOBERNACION DE CASANARE		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-26-I
		PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009
		ACTA DE REINICIO			VERSION:	01
HOJA 1 de 2	Fecha	DD 30	MM 1	AA 2012	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011	
DIRECCION TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES						
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)						
ACTA No. 7 ORDEN DE REINICIACION No. 2						
Se hace constar:						
1) Que mediante acta No. 05 se suspendió el Contrato de Consultoría No. 0303 DE 2011 2) Mediante la suscripción de la presente orden de reiniciación, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: - Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del Contrato - Nueva fecha de terminación del Contrato con respecto a la inicialmente pactada - Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado - Relación de personal y maquinaria inactiva - Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el Contrato En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del supervisor y contratista. 3) El supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el Contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.						
CONSULTORIA <input checked="" type="checkbox"/>		OBRA <input type="checkbox"/>		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO <input type="checkbox"/>		
CONTRATO No.		0303 DE 2011		(Número de Contrato)		
VIGENCIA		CINCO (05) MESES		(Indique la vigencia del Contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)		
OBJETO DEL CONTRATO						
(Indique el objeto del Contrato de ejecución suscrito)						
INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA. Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE						
LOCALIZACION DEL PROYECTO VEREDAS AGUALINDA, SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE						
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del Contrato)						
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO CINCO (05) MESES						
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 6 DE MAYO DE 2011						
(Día) (Mes) (Año)						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 138.381.040,00						
CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE						
(Indique el valor del Contrato suscrito en letras)						
CONTRATISTA		CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES				
		(Escriba el nombre o razón social del contratista)				
SUPERVISOR		ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA				
		(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor de la etapa del Contrato)				

RECIBIDO
DIRECCION DE CONTRATACION
Radicación de Documentos
03 FEB 2012

238


91
2913

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CODIGO:	RIF02-26-I	
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009	
	ACTA DE REINICIO			VERSION:	01	
HOJA 2 de 2	Fecha	DD 30	MM 1	AA 2012	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011	
DIRECCION TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES						
Nombre dependencia responsable del proyecto o Convenio (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)						
ACTA No. 7 ORDEN DE REINICIACION No. 2						
ANTECEDENTES DEL CONTRATO						
CONTRATO ADICIONAL No				TIEMPO (DIAS CALENDARIO)		
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION						
ACTAS No				TIEMPO (DIAS CALENDARIO)		
ACTA No 3 DE SUSPENSION No.1 (14-06-2011)				SESENTA (60) DIAS		
ACTA No 5 DE SUSPENSION No.2 (16-08-2011)				CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS		
ACTA No 6 DE SUSPENSION No.2 (26-12-2011)				TREINTA (30) DIAS		
FECHA DE SUSPENSION VIGENTE		26	DE	DICIEMBRE	DE	2011
		(Mes)		(Mes)		(Año)
TIEMPO DE SUSPENSION		TREINTA 30 DIAS				
		(Indique el tiempo durante el cual el Contrato estuvo suspendido, especificando meses y días según sea necesario)				
FECHA DE REINICIACION		30	DE	ENERO	2012	
		(Mes)		(Mes)		
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		\$ 138.381.040,00				
		(Indique el valor actual del Contrato en números)				
CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE						
En Yopal; a los Treinta 30 días del mes ENERO de 2012 se reunieron						
(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números)						
CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES representante legal del Contratista						
Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)						
y el ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA Supervisor designado, con el fin de aprobar la orden						
(Nombre del representante legal o delegado de la supervisión)						
de reiniciación del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminación de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.						
El Contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reinicio suscrita						
NUEVA FECHA DE TERMINACION 19 DE ABRIL DE 2012						
(Mes) (Año)						
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Treinta 30 días del mes de ENERO DE 2012						
(Mes en que se firma el acta) (Año de finalización)						
Firma						
Nombre	CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L CONSORCIO MATAGUASAN Contratista			ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA SUPERVISOR DESIGNADO		
Original Oficina Jurídica 1era copia: supervisor 2da copia: contratista 3ra copia: dependencia responsable del Contrato FORMATO DC-027						

737

100


92
2914

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-10-1
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009
	ACTA DE SUSPENSION			VERSIÓN:	01
HOJA 1 de 4	Fecha:	DD 26	MM 12	AA 2011	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)					
ACTA N° 6 DE AMPLIACION N° 1 A LA SUSPENSION N° 2 (Suspensión/Ampliación de suspensión)					
GRADO DE RESPONSABILIDAD 1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: - Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender la suspensión del contrato. - Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado - Fecha prevista de reiniciación En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista. 2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio. 3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de la condiciones de suspensión por parte del Supervisor de Contrato. 5- El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.					
CONSULTORIA <input checked="" type="checkbox"/> OBRA <input type="checkbox"/> DISEÑO Y CONSTRUCCION <input type="checkbox"/> CONTRATO No 0303 DE 2011 (Número de contrato) (Año de suscripción)					
OBJETO DEL CONTRATO (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)					
INTERVENTORIA , TECNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA. Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE					
LOCALIZACION DEL PROYECTO PORE CASANARE (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)					
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO CINCO (05) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)					
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 6 DE MAYO DE 2011 (Día) (Mes) (Año)					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 138.381.040,00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)					
CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS					
MONEDA CORRIENTE (Indique el valor del contrato suscrito en letras)					
CONTRATISTA CONSORCIO MATAGUASAN (Escriba el nombre o razón social del contratista)					
CONTRATANTE GOBERNACION DE CASANARE (Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)					
SUPERVISOR ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA (Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)					

RECIBIDO POR DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
1-8-2012
FOLIO 1


236
106

2915
93

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-10-1
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA			FECHA:	22/06/2009
	ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO			VERSIÓN:	01
HOJA 2 de 4	Fecha	DD 26	MM 12	AA 2011	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)					
ACTA No. 6 DE AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No. 2					
ANTECEDENTES DEL CONTRATO					
CONTRATO ADICIONAL No			TIEMPO (DIAS CALENDARIO)		
XX			XX		
ACTAS No			TIEMPO (DIAS CALENDARIO)		
ACTA No. 3 DE SUSPENSION No. 1 (14/06/2011)			SESENTA (60) DIAS		
ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2 (16/08/2011)			CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS		
CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO					
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO			CINCO (5) MESES <small>(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)</small>		
FECHA DE TERMINACION ACTUAL			5 DE DICIEMBRE DE 2011 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>		
VALOR ACTUAL \$			\$ 138.381.040,00		
CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE					
En Yopal Casanare ; a los Ventiseis (26) días del mes Diciembre de 2011 <small>(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, e indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)</small>					
se reunieron CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES representante legal del Interventor, <small>Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)</small>					
XXXXXXX representante legal del contratista, y AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA <small>(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría) (Indique el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del Contrato)</small>					
Supervisor Designado de la Gobernacion con el fin de Ampliar la suspensión del contrato <small>Suspender/Ampliar la suspensión</small>					
anteriormente citado, de acuerdo con la solicitud del contratista <small>(Interventor o Contratista)</small>					
de 2011 <small>(Año de la solicitud)</small>					
CAUSAS					
Para las veredas San Isidro y Matalarga se argumentaron las siguientes causas:					
1. A la fecha no se han superado las causas que motivaron la suspensión. el incremento por encima de su normal historico de las lluvias.					
2. Adicional debido a la temporada de fin de año es difícil conseguir el personal necesario para desarrollo de actividades como oficiales y ayudantes de obra. Lo cual afecta el desarrollo de la misma.					


GOBERNACION DE CASANARE
DIRECCION DE CONTRATACION
FECHA 18 ENE 2012
RADIOACION DE DOCUMENTOS
RADICADO N°
RECIBIDO POR
N° FOLIOS

2915
93

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-10-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA			FECHA:	22/06/2009
	ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO			VERSIÓN:	01
HOJA 2 de 4	Fecha	DD 26	MM 12	AA 2011	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)					
ACTA No. 6 DE AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No. 2					
ANTECEDENTES DEL CONTRATO					
CONTRATO ADICIONAL No			TIEMPO (DIAS CALENDARIO)		
XX			XX		
ACTAS No			TIEMPO (DIAS CALENDARIO)		
ACTA No. 3 DE SUSPENSION No. 1 (14/06/2011)			SESENTA (60) DIAS		
ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2 (16/08/2011)			CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS		
CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO					
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO			CINCO (5) MESES (Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)		
FECHA DE TERMINACION ACTUAL			5 DE DICIEMBRE DE 2011 (Día) (Mes) (Año)		
VALOR ACTUAL \$			\$ 138.381.040,00		
CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS					
MONEDA CORRIENTE					
En Yopal Casanare ; a los <u>Ventiseis (26)</u> días del mes <u>Diciembre</u> de <u>2011</u> (Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, e indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)					
se reunieron <u>CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES</u> representante legal del Interventor, (Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)					
<u>XXXXXXX</u> representante legal del contratista, y <u>AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA</u> (Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)					
Supervisor Designado de la Gobernacion con el fin de <u>Ampliar la suspensión</u> del contrato (Indique el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del Contrato)					
anteriormente citado, de acuerdo con la solicitud del <u>contratista</u> (Interventor o Contratista)					
de <u>2011</u> (Año de la solicitud)					
CAUSAS					
Para las veredas San Isidro y Matalarga se argumentaron las siguientes causas:					
1. A la fecha no se han superado las causas que motivaron la suspensión. el incremento por encima de su normal historico de las lluvias.					
2. Adicional debido a la temporada de fin de año es difícil conseguir el personal necesario para desarrollo de actividades como oficiales y ayudantes de obra. Lo cual afecta el desarrollo de la misma.					

GOBERNACION DE CASANARE
DICIEMBRE
Radicación de Documentos
18 ENE 2012
RECIBIDO POR
N° FOLIOS





2916
94

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-10-1	
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA			FECHA:	22/06/2009	
	ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO			VERSIÓN:	01	
HOJA 3 de 4	Fecha	DD 26	MM 12	AA 2011	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011	
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE						
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)						
ACTA No. 6 DE AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No. 2						
Por lo anterior se solicita la suspensión del contrato de obra por un termino de UN (1) MES. esto queda plasmado en oficio enviado por el contratista el 26/12/2011.						
Para la vereda Agualinda se argumentaron las siguientes causas:						
1. A la fecha no se han superado las causas que motivaron la suspensión. el incremento por encima de su normal historico de las lluvias.						
2. Adicional debido a la temporada de fin de año es difícil conseguir el personal necesario para desarrollo de actividades como oficiales y ayudantes de obra. Lo cual afecta el desarrollo de la misma.						
Por lo anterior se solicita la suspensión del contrato de obra por un termino de UN (1) MES. esto queda plasmado en oficio enviado por el contratista el 26/12/2011.						
Por consiguiente se solicita la suspensión del contrato de Consultoria 303-011 por un termino de UN (1) MES. esto queda plasmado en oficio enviado por el contratista el 26/12/2011.						
NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO						
FECHA DE SUSPENSION		26 DE Diciembre DE 2011		(Día) (Mes) (Año)		
PLAZO TRANSCURRIDO		41		(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)		
PLAZO FALTANTE		109		(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)		
FECHA PREVISTA DE REINICIACION		30 DE Enero		(Día) (Mes)		
RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO						
PERSONAL DIRECTIVO						
CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS		No. TARJETA PROF		
PROFESIONAL CAT 4	ING CIVIL	MARTHA JIMENEZ		25202-62129		
PROFESIONAL CAT 7	ING CIVIL	CARLOS ROJAS		25202- 84567		

GOBERNACIÓN DE CASANARE
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Radicación de Documentos
FECHA 18 ENE 2012
RADICADO N°
RECIBIDO
No. TARJETA PROF

224
103

2917
95

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-10-1
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA			FECHA:	22/06/2009
	ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO			VERSIÓN:	01
HOJA 4 de 4	Fecha	DD 26	MM 12	AA 2011	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)					
ACTA No. 6 DE AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No. 2					
PERSONAL OPERATIVO					
CARGO		CANTIDAD			
CONDUCTOR		1			
MAQUINARIA					
TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO		
XX	XX	XX	XX		
<p>Nota: Se deja constancia que la presente acta no genera costo adicional al proyecto por lo tanto el contratista renuncia a cualquier reclamacion.</p> <p>El Contratista se compromete a terminar el objeto del contrato No. 303 de 2011 <small>(Interventor o Contratista según el caso)</small> <small>(Indique el número y año del contrato que se suspende o amplía la suspensión)</small></p> <p>en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.</p> <p>Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintiseis (26) <small>(Día en letras)</small></p> <p>días del mes de Diciembre de 2011 <small>(Mes en que se firma el acta)</small> <small>(Año de finalización)</small></p>					
Firma					
Nombre	CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L. CONSORCIO MATAGUASAN Contratista				
Firma					
Nombre	AGUSTÍN GONZÁLEZ GUATIBONZA Supervisor designado				
					
Original Oficina Jurídica: 1era copia: interventor 2da copia: contratista 3ra copia: dependencia responsable del contrato					

233

104

2918
96

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

Yopal, 26 de Diciembre de 2011

Ingeniero
AGUSTÍN GONZÁLEZ GUATIBONZA
Profesional contratado No. 1847/10
Unidad de Construcciones
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Departamento de Casanare

DEC 26 2011
26-12-2011

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 303-11
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del acueducto vereda Agualinda y construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore".

Asunto: Solicitud de Ampliación de Suspensión.

Cordial Saludo,

De acuerdo con la visita técnica realizadas a las veredas San Isidro, Matalarga y Agualinda del Municipio de Pore se encontró los siguientes inconvenientes para llevar a cabo la ejecución de las obras:

Para la vereda San Isidro Y Matalarga:

1. A la fecha no se han superado las causas que motivaron la suspensión. El incremento por encima de su normal histórico de las lluvias.

2. Adicional debido a la temporada de fin de año es difícil conseguir el personal necesario para desarrollo de actividades como oficiales y ayudantes de obra. Lo cual afecta el desarrollo de la misma.

Por lo anterior se solicita una Ampliación de suspensión del contrato de obra por un término de UN (1) MES. Esto queda plasmado en oficio enviado por el contratista de obra el 26/12/2011.

Para la vereda Agualinda:

1. A la fecha no se han superado las causas que motivaron la suspensión. el incremento por encima de su normal histórico de las lluvias.

2919
~~97~~

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

2. Adicional debido a la temporada de fin de año es difícil conseguir el personal necesario para desarrollo de actividades como oficiales y ayudantes de obra. Lo cual afecta el desarrollo de la misma.

Por lo anterior se solicita una Ampliación de suspensión del contrato de obra por un término de UN (1) MES. Esto queda plasmado en oficio enviado por el contratista de obra el 26/12/2011.


Por lo tanto el contrato de consultoría No 303 del 2011, solicita considerar la Ampliación de la suspensión por un tiempo de Un (1) Mes.

Agradezco su colaboración.

Atentamente,


CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
R/I CONSORCIO MATAGUASAN


2920
98

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-10-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009
	ACTA DE SUSPENSION			VERSIÓN:	01
HOJA 1 de 4	Fecha	DD 16	MM 8	AA 2011	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretaría de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)					
ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2 (Suspensión/Ampliación de suspensión)					
GRADO DE RESPONSABILIDAD					
1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: <ul style="list-style-type: none"> - Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender la suspensión del contrato - Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado - Fecha prevista de reiniciación En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.					
2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.					
3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de la condiciones de suspensión por parte del Supervisor de Contrato.					
5- El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.					
CONSULTORIA <input checked="" type="checkbox"/> OBRA <input type="checkbox"/> DISEÑO Y CONSTRUCCION <input type="checkbox"/> CONTRATO No 0303 DE 2011 (Número de contrato) (Año de suscripción)					
OBJETO DEL CONTRATO (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)					
INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA. Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE					
LOCALIZACION DEL PROYECTO PORE CASANARE (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)					
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO CINCO (05) MESES. (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)					
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 6 DE MAYO DE 2011 (Día) (Mes) (Año)					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 138.381.040,00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)					
CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (Indique el valor del contrato suscrito en letras)					
CONTRATISTA CONSORCIO MATAGUASAN (Escriba el nombre o razón social del contratista)					
CONTRATANTE GOBERNACION DE CASANARE (Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)					
SUPERVISOR ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA (Indique el nombre del funcionario designado para ser supervisor del contrato)					

GOBERNACION DE CASANARE
 DIRECCION DE CONTRATACION
 RADICACION DE DOCUMENTOS
 RADICADO N° 1-8-ENE-2012


230
107

2921
99

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-10-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA			FECHA:	22/06/2009
	ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO			VERSION:	01
HOJA 2 de 4	Fecha	DD 16	MM 8	AA 2011	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)					
ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2					
ANTECEDENTES DEL CONTRATO					
CONTRATO ADICIONAL No			TIEMPO (DIAS CALENDARIO)		
XX			XX		
ACTAS No			TIEMPO (DIAS CALENDARIO)		
ACTA No. 3 DE SUSPENSION No. 1 (14/06/2011)			SESENTA (60) DIAS		
XX			XX		
CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO					
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO			CINCO (5) MESES <small>(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)</small>		
FECHA DE TERMINACION ACTUAL			5 DE DICIEMBRE DE 2011 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>		
VALOR ACTUAL \$			\$ 138.381.040,00		
CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS					
MONEDA CORRIENTE					
En Yopal Casanare ; a los Dieciseis (16) días del mes Agosto de 2011 <small>(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión))</small>					
se reunieron CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES representante legal del Interventor, <small>Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)</small>					
XXXXXXX representante legal del contratista, y AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA <small>(Indique el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del Contrato)</small>					
Supervisor Designado de la Gobernacion con el fin de suspender el contrato <small>Suspender (Ampliar o suspender)</small>					
anteriormente citado, de acuerdo con la solicitud del contratista de Agosto <small>(Interventor o Contratista) (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)</small>					
de 2011 <small>(Año de la solicitud)</small>					
CAUSAS					
Para las veredas San Isidro y Matalarga se argumentaron las siguientes causas:					
1. Durante el fin de semana se presentaron aguaceros que volvieron a desviar las aguas del río Paulo con el caño Alimeta que nuevamente no permiten la entrada de material, equipos y personal al sitio de la obra en la Vereda San Isidro.					
2. De igual manera ocurre en la entrada a la vereda Matalarga por la vía el Verde - el Banco - Matalarga donde el río Paulo y la Quebrada Alimeta nuevamente se desbordaron hacia esta vía, lo que impide otra vez la entrada de personal, equipos y materiales.					
3. Las lluvias de este fin de semana impiden la ejecución de las actividades tales como excavaciones, rellenos, localización y replanteo y demás inherentes a la ejecución del objeto del contrato					

GOBERNACION DE CASANARE
DIRECCION DE CONTRATACION
Radicación de Documentos
FECHA
RADICADO N°
RECIBIDO
18 ENERO 2012

100
2922

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		CÓDIGO:	RIF02-10-1
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA		FECHA:	22/06/2009
	ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO		VERSIÓN:	01
HOJA 3 de 4	Fecha	DD 16	MM 8	AA 2011

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2

Por lo anterior se solicita la suspensión del contrato de obra por un termino de CUATRO Y MEDIO (4.5) MESES. esto queda plasmado en oficio enviado por el contratista el 16/08/2011.

Para la vereda Agualinda se argumentaron las siguientes causas:

1. Debido a las condiciones de invierno que se presentaron el fin de semana en la vereda, han ocasionado que en los dos accesos con que cuenta la vereda Agualinda se encuentren en mal estado, como se describe a continuación:
Un acceso es por el caño la Atascosa, aunque el puente esta terminado la via tiene mucho problema y el caño no permite el paso.
el otro acceso es por la vereda el Verde - el Banco - La Mapora - Agualinda pero presenta el desbordamiento del rio Pauto y la Quebrada Alimeta a la via, lo que impide la entrada de personal equipos y materiales.

2. Se ha presentando lluvias el fin de semana, las cuales son un impedimento para la ejecucion de las actividades tales como excavaciones, rellenos, localizacion y replanteo y demas inherentes a la ejecucion del objeto del contrato

Por lo anterior se solicita la suspensión del contrato de obra por un termino de CUATRO Y MEDIO (4.5) MESES. esto queda plasmado en oficio enviado por el contratista el 16/08/2011.

Por consiguiente se solicita la suspensión del contrato de Consultoria 303-011 por un termino de CUATRO Y MEDIO (4.5) MESES. esto queda plasmado en oficio enviado por el contratista el 16/08/2011.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSION 16 DE Agosto DE 2011
(Día) (Mes) (Año)

PLAZO TRANSCURRIDO 41
(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)

PLAZO FALTANTE 109
(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)

FECHA PREVISTA DE REINICIACION 30 DE Diciembre DE 2011
(Día) (Mes) (Año)

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO


CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROF
PROFESIONAL CAT 4	ING CIVIL	MARTHA JIMENEZ	25202 -62429
PROFESIONAL CAT 7	ING CIVIL	CARLOS ROJAS	25202- 84567

GOB. DE CASANARE
DIRECCION DE CONTRATACION
Radicación de Documentos
FECHA RECIBIDO No. 18-ENE-2012

728

1.000

2923
107

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-10-I	
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA			FECHA:	22/06/2009	
	ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO			VERSIÓN:	01	
HOJA 4 de 4	Fecha	DD 16	MM 8	AA 2011	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011	


SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)
ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2

PERSONAL OPERATIVO	
CARGO	CANTIDAD
CONDUCTOR	1

MAQUINARIA			
TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
XX	XX	XX	XX

Nota: Se deja constancia que la presente acta no genera costo adicional al proyecto por lo tanto el contratista renuncia a cualquier reclamacion.

El Contratista se compromete a terminar el objeto del contrato No. 303 de 2011
(Interventor o Contratista según el caso) (Indique el número y año del contrato que se suspende o amplía la suspensión)
en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los dieciseis (16)
días del mes de Agosto de 2011
(Mes en que se) (Año de finalización)



Firma [Firma]
Nombre **CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES**
R/L. CONSORCIO MATAGUASAN
Contratista

Firma [Firma]
Nombre **AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA**
Supervisor designado

Original Oficina Juridica:
1era copia interventor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato

227
110

102
2924

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

Yopal, 16 de Agosto de 2011

Ingeniero
AGUSTÍN GONZÁLEZ GUATIBONZA
Profesional contratado No. 1847/10
Unidad de Construcciones
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Departamento de Casanare

RECIBIDO
16-08-2011

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 303-11
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del acueducto vereda Agualinda y construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore".

Asunto: Solicitud de Suspensión.

Cordial Saludo,

De acuerdo con la visita técnica realizadas a las veredas San Isidro, Matalarga y Agualinda del Municipio de Pore se encontró los siguientes inconvenientes para llevar a cabo la ejecución de las obras:

Para la vereda San Isidro Y Matalarga:

1. Durante el fin de semana se presentaron aguaceros que volvieron a desviar las aguas del río Pauto con el caño Alimeta que nuevamente no permiten la entrada de material, equipos y personal al sitio de la obra en la vereda San Isidro.
2. De igual manera ocurre en la entrada a la vereda Matalarga por la vía el Verde - el Banco - Matalarga donde el río Pauto y la Quebrada Alimeta nuevamente se desbordaron hacia esta vía, lo que impide otra vez la entrada de personal, equipos y materiales.
3. Las lluvias de este fin de semana impiden la ejecución de las actividades tales como excavaciones, rellenos, localización y replanteo y demás inherentes a la ejecución del objeto del contrato.

Por lo anterior se solicita la suspensión del contrato de obra por un término de CUATRO Y MEDIO (4.5) MESES. Esto queda plasmado en oficio enviado por el contratista de obra el 16/08/2011.

2925
103

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

Para la vereda Agualinda:

1. Debido a las condiciones de invierno que se presentaron el fin de semana en la vereda, han ocasionado que en los dos accesos con que cuenta la vereda Agualinda se encuentren en mal estado, como se describe a continuación:

Un acceso es por el caño la Atascosa, aunque el puente está terminado la vía tiene mucho problema y el caño no permite el paso.

el otro acceso es por la vereda el Verde - el Banco - La Mapora - Agualinda pero presenta el desbordamiento del río Pauto y la Quebrada Alimeta a la vía, lo que impide la entrada de personal equipos y materiales.


2. Se ha presentado lluvias el fin de semana, las cuales son un impedimento para la ejecución de las actividades tales como excavaciones, rellenos, localización y replanteo y demás inherentes a la ejecución del objeto del contrato.

Por lo anterior se solicita la suspensión del contrato de obra por un término de CUATRO Y MEDIO (4.5) MESES. Esto queda plasmado en oficio enviado por el contratista el 16/08/2011.


Por lo tanto el contrato de consultoría No 303 del 2011, solicita considerar la suspensión por un tiempo de Cuatro y medio (4.5) Meses.

Agradezco su colaboración.


Atentamente,


CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
R/I CONSORCIO MATAGUASAN

2926
104

 GOBERNACIÓN DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-26-I	
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009	
	ACTA DE REINICIO			VERSIÓN:	01	
HOJA 1 de 2	Fecha	DD 12	MM 8	AA 2011	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011	
DIRECCION TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES						
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)						
ORDEN DE REINICIACION No. 1						
Se hace constar:						
1) Que mediante acta No. 01 se suspendió el Contrato de Consultoria No. 0303 DE 2011						
2) Mediante la suscripción de la presente orden de reiniciación, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:						
<ul style="list-style-type: none">- Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del Contrato- Nueva fecha de terminación del Contrato con respecto a la inicialmente pactada- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado- Relación de personal y maquinaria inactiva- Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el Contrato						
En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del supervisor y contratista.						
3) El supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el Contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.						
CONSULTORIA <input checked="" type="checkbox"/> OBRA <input type="checkbox"/> CONTRATO INTERADMINISTRATIVO <input type="checkbox"/>						
CONTRATO No. 0303 DE 2011 (Número de Contrato)						
VIGENCIA CINCO (05) MESES (Indique la vigencia del Contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)						
OBJETO DEL CONTRATO (Indique el objeto del Contrato de ejecución suscrito)						
INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA. Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE						
LOCALIZACION DEL PROYECTO VEREDAS AGUALINDA, SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE (Indique en este espacio el sitio de ejecución del Contrato)						
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO CINCO (05) MESES						
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 6 DE MAYO DE 2011 (Día) (Mes) (Año)						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 138.381.040,00						
CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (Indique el valor del Contrato suscrito en letras)						
CONTRATISTA CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES (Escriba el nombre o razón social del contratista)						
SUPERVISOR ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA (Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor de la etapa del Contrato)						

FORMATO DC-027

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-26-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009
	ACTA DE REINICIO			VERSIÓN:	01

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011
		12	8	2011	

DIRECCION TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ORDEN DE REINICIACION No. 1

Se hace constar:

- 1) Que mediante acta No. 01 se suspendió el Contrato de Consultoria No. 0303 DE 2011
- 2) Mediante la suscripción de la presente orden de reiniciación, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
 - Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del Contrato
 - Nueva fecha de terminación del Contrato con respecto a la inicialmente pactada
 - Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
 - Relación de personal y maquinaria inactiva
 - Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el Contrato

En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del supervisor y contratista.

- 3) El supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el Contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.

CONSULTORIA ☒ **OBRA** ☐ **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO** ☐

CONTRATO No. 0303 DE 2011
(Número de Contrato)

VIGENCIA CINCO (05) MESES
(Indique la vigencia del Contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO _____
(Indique el objeto del Contrato de ejecución suscrito)

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA. Y CONSTRUCCIO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

LOCALIZACION DEL PROYECTO VEREDAS AGUALINDA, SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIO DE PORE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del Contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO CINCO (05) MESES


FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 5/6 DE NOV DE 2010
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 138,381,040.00
 CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE
(Indique el valor del Contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

SUPERVISOR ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor de la etapa del Contrato)

FORMATO DC-027

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-26-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009
	ACTA DE REINICIO			VERSION:	01
HOJA 2 de 2	Fecha	DD 12	MM 8	AA 2011	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011

DIRECCION TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

Nombre dependencia responsable del proyecto o Convenio (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ORDEN DE REINICIACION No. 1

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No

TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No

TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

ACTA DE SUSPENSION No. 1 (14-06-2011)

SESENTA (60) DIAS

FECHA DE SUSPENSION VIGENTE

14

DE

JUNIO

DE

2011

(Mes)

(Mes)

(Año)

TIEMPO DE SUSPENSION

SESENTA

60

DIAS

(Indique el tiempo durante el cual el Contrato estuvo suspendido, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE REINICIACION

12

DE

AGOSTO

DE

2011

(Mes)

(Mes)

(Año)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 138,381,040.00

(Indique el valor actual del Contrato en números)

CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE

En Yopal; a los doce 12 días del mes AGOSTO de 2011 se reunieron
(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números)

CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES

representante legal del Contratista

Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)

y el

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA

Supervisor designado, con el fin de aprobar la orden

(Nombre del representante legal o delegado de la supervisión)

de reiniciación del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminación de dicho objeto, considerando que se encuentran olucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

El Contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reinicio suscrita

NUEVA FECHA DE TERMINACION

5

DE

DIC

DE

2011

(Mes)

(Año)

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

días del mes de

AGOSTO

DE

2011

(Mes en que se firma el acta)

(Año de finalización)

Firma

Nombre

CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES

R/L CONSORCIO MATAGUASAN

Contratista

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA

SUPERVISOR DESIGNADO

Original Oficina Jurídica


1era copia: supervisor

2da copia contratista


3ra copia dependencia responsable del Contrato


FORMATO DC-027

107
2929

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CODIGO	RIF02-10-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA			FECHA	22/06/2009
	ACTA DE SUSPENSION			VERSION	01
HOJA 1 de 4	Fecha	DD 14	MM 6	AA 2011	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)					
ACTA No. 1 DE SUSPENSION (Suspensión/Aprobación de suspensión)					
GRADO DE RESPONSABILIDAD 1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: - Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspensión del contrato. - Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado. - Fecha prevista de reiniciación. En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista. 2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén debidamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio. 3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como tal acta de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de la condiciones de suspensión por parte del Supervisor de Contrato. 5- El Interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.					
CONSULTORIA <input checked="" type="checkbox"/> OBRA <input type="checkbox"/> DISEÑO Y CONSTRUCCION <input type="checkbox"/> CONTRATO No 0303 DE 2011 (Número de contrato) (Año de suscripción)					
OBJETO DEL CONTRATO (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)					
INTERVENTORIA, TECNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA. Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE					
LOCALIZACION DEL PROYECTO (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)					
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO CINCO (05) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)					
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 6 DE MAYO DE 2011 (Día) (Mes) (Año)					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 138,381,040.00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)					
CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS					
MONEDA CORRIENTE (Indique el valor del contrato suscrito en letras)					
CONTRATISTA	CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES (Escriba el nombre o razón social del contratista)				
CONTRATANTE	GOBERNACION DE CASANARE (Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)				
SUPERVISOR	ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA (Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)				


108
2930

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CODIGO:	RIF02-10-1
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA			FECHA:	22/06/2009
	ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO			VERSION:	01
HOJA 2 de 4	Fecha	DD 14	MM 6	AA 2011	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal en la descentralizado)					
ACTA No. 1 DE SUSPENSION					
ANTECEDENTES DEL CONTRATO					
CONTRATO ADICIONAL No			TIEMPO (DIAS CALENDARIO)		
XX			XX		
ACTAS No			TIEMPO (DIAS CALENDARIO)		
XX			XX		
XX			XX		
CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO					
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO			CINCO (5) MESES <small>(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)</small>		
FECHA DE TERMINACION ACTUAL			5 DE OCTUBRE DE 2011 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>		
VALOR ACTUAL \$			\$ 138,381,040.00		
CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS					
MONEDA CORRIENTE					
En Yopal Casanare ; a los catorce (14) días del mes Junio de 2011 <small>(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)</small>					
se reunieron CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES representante legal del Interventor, <small>(Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)</small>					
XXXXXXX representante legal del contratista, y AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA <small>(Indique el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del Contrato)</small>					
Supervisor Designado de la Gobernacion con el fin de suspender el contrato <small>(Suspende/Ampara la suspensión)</small>					
anteriormente citado, de acuerdo con la solicitud del contratista del 13 de junio <small>(Interventor o Contratista) (Día de la solicitud) (Mes de la solicitud)</small>					
de 2011 <small>(Año de la solicitud)</small>					
CAUSAS					
Para las veredas San Isidro y Matalarga se argumentaron las siguientes causas:					
1. El invierno que viene afectando la region desvio las aguas del rio Paulo con el caño Alimeta que es este instante no permite la entrada de material, equipos y personal al sitio de la obra en la vereda San Isidro.					
2. De igual manera ocurre en la entrada a la vereda Matalarga por la via el Verde - el Banco - Matalarga donde el rio Paulo y la Quebrada Alimeta se desbordaron hacia esta via, lo que impide la entrada de personal, equipos y materiales.					
3. Se han venido presentando constantes lluvias las cuales son un impedimento para la ejecucion de las actividades tales como excavaciones, rellenos, localizacion y replanteo y demas inherentes a la ejecucion del objeto del contrato					
4. Adicional a esto el día domingo 29 de Mayo se presento un deslizamiento en la via marginal de la selva Km 4 + 300 que conduce de Yopal a Pore, lo que ocasiono la destruccion de la banca no permitiendo el paso de vehiculos hacia el norte del departamento, quedando incomunicados por via terrestre.					

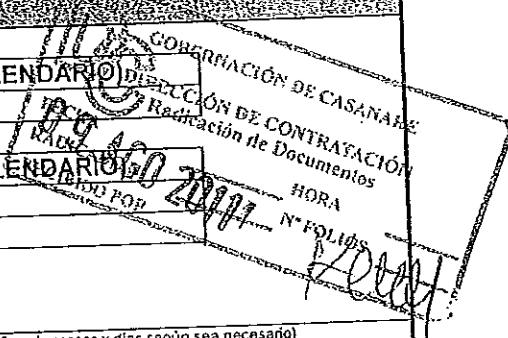


22/7

109
2931

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CODIGO:	RIF02-10-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA			FECHA:	22/06/2009
	ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO			VERSION:	01
HOJA 3 de 4	Fecha	DD 14	MM 6	AA 2011	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ante descentralizado)					
ACTA No. 1 DE SUSPENSION					
<p>Por lo anterior se solicita la suspensión del contrato de obra por un termino de SESENTA (60) DIAS. esto queda plasmado en oficio enviado por el contratista el 01/06/2011 con registro fotografico.</p> <p>Para la vereda Agualinda se argumentaron las siguientes causas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Debido a las condiciones de invierno que imperan en la vereda, han ocasionado que en los accesos con que cuenta la vereda Agualinda se encuentren en mal estado, como se describe a continuación: Un acceso es por el caño la Atascosa, aunque el puente se esta terminando la via tiene muchos problemas y el otro acceso es por la vereda el Verde - el Banco - La Mapora - Agualinda pero presenta el desbordamiento del río Pauto y la Quebrada Alimeta a la vía, lo que impide la entrada de personal equipos y materiales. Se han venido presentando constantes lluvias las cuales son un impedimento para la ejecucion de las actividades tales com excavaciones, rellenos, localizacion y replanteo y demas inherentes a la ejecucion del objeto del contrato Adicional a esto el dia domingo 29 de Mayo se presento un deslizamiento en la via marginal de la selva Km 4 + 300 que conduce de Yopal a Pore, lo que ocaciono la destruccion de la banca no permitiendo el paso de vehiculos hacia el norte del departamento, quedando incomunicados por via terrestre. <p>Por lo anterior se solicita la suspensión del contrato de obra por un termino de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS. esto queda plasmado en oficio enviado por el contratista el 01/06/2011 con registro fotografico.</p> <p>Por consiguiente se solicita la suspensión del contrato de Consultoria 303-011 por un termino de SESENTA (60) DIAS. esto queda plasmado en oficio enviado por el contratista el 13/06/2011.</p>					
NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO					
FECHA DE SUSPENSION		14 DE Junio DE 2011 (Dia) (Mes) (Año)			
PLAZO TRANSCURRIDO		38 (Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)			
PLAZO FALTANTE		112 (Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)			
FECHA PREVISTA DE REINICIACION		13 DE Agosto DE 2011 (Dia) (Mes) (Año)			
RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO					
PERSONAL DIRECTIVO					
CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROF		
PROFESIONAL CAT 4	ING CIVIL	MARTHA JIMENEZ	25202 -62129		
PROFESIONAL CAT 7	ING CIVIL	CARLOS ROJAS	25202- 84567		

718

110
2932

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CODIGO	RIF02-10-1
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA			FECHA	22/06/2009
	ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO			VERSION	01
HOJA 4 de 4	Fecha	DD 14	MM 6	AA 2011	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE
 Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 1 DE SUSPENSION

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	CANTIDAD
CONDUCTOR	1

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
XX	XX	XX	XX

Nota: Se deja constancia que la presente acta no genera costo adicional al proyecto por lo tanto el contratista renuncia a cualquier reclamacion.

El Contratista se compromete a terminar el objeto de contrato 303 de 2011
(Indique el número y año del contrato que se suspende o amplía la suspensión)
(Interventor o Contratista según el caso)

en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los catorce (14)
(Día en letras)

días del mes de Junio de 2011
(Mes en que se) (Año de finalización)

Firma

Nombre CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
 R/L. CONSORCIO MATAGUASAN
 Contratista

Firma


Nombre AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
 Supervisor designado

Original Oficina Jurídica:

1era copia :interventor

2da copia contratista

3ra copia dependencia responsable del contrato



215
119

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

HT
2933

Yopal, 13 de Junio de 2011

CICM - 003

Ingeniero

AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA

Profesional contratado No. 1847/10

Unidad de Construcciones

Secretaria de Obras Públicas y Transporte

Departamento de Casanare

[Handwritten signature and initials]
BOG

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 303-11

Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del acueducto vereda Agualinda y construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore".

Asunto: Solicitud de Suspensión.

Cordial Saludo,

De acuerdo con la visita técnica realizadas a las veredas San Isidro, Matalarga y Agualinda del Municipio de Pore se encontró los siguientes inconvenientes para llevar a cabo la ejecución de las obras:

Para la vereda San Isidro Y Matalarga:

1. El invierno que viene afectando la región desvió las aguas del rio Pauto con el caño Alimeta que es este instante no permite la entrada de material, equipos y personal al sitio de la obra en la vereda San Isidro.
2. De igual manera ocurre en la entrada a la vereda Matalarga por la vía el Verde - el Banco - Matalarga donde el rio Pauto y la Quebrada Alimeta se desbordaron hacia esta vía, lo que impide la entrada de personal, equipos y materiales.
3. Se han venido presentando constantes lluvias las cuales son un impedimento para la ejecución de las actividades tales como excavaciones, rellenos, localización y replanteo y demás inherentes a la ejecución del objeto del contrato.
4. Adicional a esto el día domingo 29 de Mayo se presentó un deslizamiento en la vía marginal de la selva Km 4 + 300 que conduce de Yopal a Pore, lo que ocasionó la destrucción de la banca no permitiendo el paso de vehículos hacia el norte del departamento, quedando incomunicados por vía terrestre.

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

112
2934

Por lo anterior se solicita la suspensión del contrato de obra por un término de SESENTA (60) DIAS. Esto queda plasmado en oficio enviado por el contratista de obra el 01/06/2011 con registro fotográfico.

Para la vereda Agualinda:

1. Debido a las condiciones de invierno que imperan en la vereda, han ocasionado que en los dos accesos con que cuenta la vereda Agualinda se encuentren en mal estado, como se describe a continuación:

Un acceso es por el caño la Atascosa, aunque el puente se está terminando la vía tiene mucho problema y el caño no permite el paso.

El otro acceso es por la vereda el Verde - el Banco - La Mapora - Agualinda pero presenta el desbordamiento del río Pauto y la Quebrada Alimeta a la vía, lo que impide la entrada de personal equipos y materiales.

2. Se han venido presentando constantes lluvias las cuales son un impedimento para la ejecución de las actividades tales como excavaciones, rellenos, localización y replanteo y demás inherentes a la ejecución del objeto del contrato.


3. Adicional a esto el día domingo 29 de Mayo se presentó un deslizamiento en la vía marginal de la selva Km 4 + 300 que conduce de Yopal a Pore, lo que ocasiono la destrucción de la banca no permitiendo el paso de vehículos hacia el norte del departamento, quedando incomunicados por vía terrestre.

Por lo anterior se solicita la suspensión del contrato de obra por un término de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS. Esto queda plasmado en oficio enviado por el contratista el 01/06/2011 con registro fotográfico.

Por lo tanto el contrato de consultoría No 303 del 2011, solicita considerar la suspensión por un tiempo de 60 días.

Agradezco su colaboración.

Atentamente,


CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
R/I CONSORCIO MATAGUASAN

713

121



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO: GESTION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA

ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO

CODIGO

RIF-02-04-1

FECHA

22/06/2009

VERSION

01

HOJA 1 de 2

Fecha

DD

25

MM

05

AA

2011

CONTRATO No. 0303-11

DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

ACTA N° 2 ENTREGA DE ANTICIPO

CONTRATO DE CONSULTORIA No.

0303-011

VIGENCIA

CINCO (05) MESES

LICITACIÓN PUBLICA



CONCURSO DE MERITOS



CONTRATACIÓN DIRECTA



CAS-SOPT-CM-066-2010

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

VEREDAS AGUALINDA, SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CINCO (05) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO

06 DE MAYO DE 2011

FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

05 DE OCTUBRE DE 2011

FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

FECHA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

FECHA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA

VALOR DEL CONTRATO

\$ 138.381.040,00

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS MCTE.

CONTRATISTA

CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES

SUPERVISOR

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA

En Yopal, a los Veinticinco (25) días del mes de Mayo, se reunieron el ING. CARLOS M. ROJAS A., representante legal de CONSORCIO MATAGUASAN, contratista, y el Ing. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA supervisor designado, con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en la cláusula SEXTA, numeral (a), del Contrato para la entrega del anticipo.

El valor de dicho anticipo es de \$ 69.190.520 y corresponde al 50 % del valor del contrato.



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESO: GESTION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA

ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO

CÓDIGO: RIF02-04-I
FECHA: 22/06/2009
VERSION: 01

HOJA 2 de 2

Fecha

DD
25

MM
05

AA
2011

CONTRATO No. 0303-11

DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 2 ENTREGA DE ANTICIPO

El manejo del anticipo esta amparado por la poliza de garantia No. 605-47-994000005192 de ASEGURADORA SOLIDARIA, vigente hasta el CINCO (05) de DICIEMBRE de 2011.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veinticinco (25) dias del mes de Mayo de 2011, bajo la respectiva responsabilidad de cada uno de ellos, de conformidad con las funciones desempeñadas.



ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
R/L CONSORCIO MATAGUASAN
Interventor contratado

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
Supervisor designado
Gobernacion de Casanare

Original Oficina Jurídica

1era copia interventor

2da copia contratista

3ra copia dependencia responsable del contrato



GOBERNACIÓN
DE CASANARE

STEMA DE GESTION DE CALIDAD

CODIGO: RIF02-17-I

FECHA: 22/06/2009

VERSION: 01

PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

HOJA 1 de 2 Fecha DD MM AA CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 303 - 2011

Nombre dependencia responsable (el proyecto o contrato (Secretaría de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado))

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 303 DE 2011 PROGRAMACIÓN INICIAL ☒ REPROGRAMACIÓN ☐

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONTRATISTA
SUPERVISOR,

CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA

DATOS ESPECIFICOS

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de salarios y jornales	41.495.600,00	60%
2	Transporte	15.680.600,00	23%
3	Elaboración de informes y ploteo de planos	2.470.800,00	4%
4	Impuestos (IVA)	9.543.520,00	14%
TOTAL		69.190.520,00	100%

NOTAS:

- Los porcentajes se toman sobre el 100% de valor de la obra sin retenciones
- Sólo se permite un máximo del diez por ciento (10 %) de compra de equipo nuevo y respuestos

(Firma)

(Nombre) CONSORCIO MATAGUASAN
R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
Contratista

(Firma)

(Nombre) AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
Supervisor

Original: Oficina Jurídica


1era copia: Interventor

2da copia: Contralista

3era copia: Supervisor Proyecto y/o Contrato

CasanareWeb: <http://www.casanare.gov.co>

44
2939

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		CÓDIGO:	RIF02-13-1
	PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA		FECHA:	08/06/2009
	ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO		VERSIÓN:	01

HOJA 2 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 303 - 2011
		1	8	2013	

SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS Y TRANSPORTE

Miembro dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal en caso de descentralizado)

ACTA No. 11 DE TERMINACION DE CONTRATO POR

CONTRATISTA CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR ING. GILBERTO ANTONIO CABRERA ARANGO
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR ING. GILBERTO ANTONIO CABRERA ARANGO
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En YOPAL; el PRIMERO (01) día del mes AGOSTO de 2013
(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y nros. (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión))

se reunieron CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES representante
(Indique en este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

legal del contratista, GILBERTO ANTONIO CABRERA ARANGO Supervisor, con el fin de terminar el Contrato
(Nombre del Supervisor)

de CONSULTORIA anteriormente citado, dado que el contratista: CUMPLIO
(Cumplió o incumplió)

A. TRABAJO EJECUTADO
 El trabajo ejecutado se relaciona a continuación

A.1- CONSULTORIA

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR
INFORMES	15		

A.2- OBRA PUBLICA


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
SUBTOTAL					
% AIU					
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS					
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES					

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
(Describe aspectos referentes a la calidad de los trabajos realizados)

Nota: Las obras y trabajos que presentan observaciones por parte de la interventoría están relacionadas en esta acta y se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de obra de acuerdo con la cláusula No. del contrato anteriormente citado.

17
126

118
2940


 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-13-I
	PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA			FECHA	08/06/2009
	ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO			VERSIÓN:	01
HOJA 1 de 3	Fecha	DD 1	MM 8	AA 2013	CONTRATO DE CONSULTORIA (NO. 303 DE 2011)
SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS Y TRANSPORTE					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretaría de despacho, Director de Planeación o representante legal en caso descentralizado)					
ACTA No. 11 DE TERMINACION DE CONTRATO POR					
VENCIMIENTO DE PLAZO		<input checked="" type="checkbox"/>	CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL		<input type="checkbox"/>
OBRA TERMINADA		<input type="checkbox"/>			
INTERVENTORIA		<input type="checkbox"/>	CONSULTORIA		<input checked="" type="checkbox"/>
TIPO DE CONSULTORIA		INTERVENTORIA			
Indique en este espacio si se trata de Estudios y Diseños, Interventoría, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría					
CONTRATO No		303 DE 2011			
		(Número de (Año de suscripción))			
VIGENCIA		NUEVE (9) MESES			
		(Indique la vigencia del contrato suscrita especificando días y meses según sea necesario)			
LICITACION PUBLICA		<input type="checkbox"/>		CONCURSO DE MERITOS	
CONTRATACION DIRECTA		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
		CAS/SOPT-CM/066-2010			
		(Indique en este espacio la clasificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)			
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA			
		(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrita)			
Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA, Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PÓRE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.					
LOCALIZACION DEL PROYECTO		VEREDAS AGUALINDA, SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PÓRE			
		(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO		CINCO (5) MESES			
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO		6 DE MAYO DE 2011			
		(Día) (Mes) (Año)			
PRORROGAS					
CONTRATO ADICIONAL No		TIEMPO (MESES)			
PRORROGA No 01 (01/11/2012)		4 MESES			
PRORROGA No 02 (27/02/2013)		5 MESES			
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION					
ACTAS No		TIEMPO (MESES)			
ACTA No 3 DE SUSPENSION No 1 (14-06-2011)		DOS (2) MESES			
ACTA No 5 DE SUSPENSION No 2 (16-08-2011)		CUATRO Y MEDIO (4.5) MESES			
ACTA No 6 DE AMPL. SUSP No 2 (26-12-2011)		UN (1) MES			
ACTA No 8 DE SUSPENSION No 3 (25-04-2012)		CUATRO (4) MESES			
ACTA No 9 DE AMPL. SUSP No 3 (24-08-2012)		UN MES Y MEDIO (1.5) MESES			
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO		1 DE 8 DE 2013			
		(Día) (Mes) (Año)			
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 138.381.040,00			
		(Indique el valor del contrato suscrito en números)			
CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS M/CTE.					

129

2941
1197C

27 NOV 2015
 RECEIVED
 DEPARTAMENTO DE CASANARE
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO FINAL OBRA Y/O CONSULTORIA
 FO-AB-32
 2015-07-10
 V.03


 GOBERNACION DE CASANARE
 NIT 892699216-6

HOJA 1 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE CONSULTORIA No 303 DE 2011
		27	10	2016	

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

Nombre dependiente responsable del proyecto o contrato (Secretario o delegado, Director o Financiero o representante legal de la Contratación)

ACTA No 12 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA Y/O CONSULTORIA

CONTRATO No 303 2011

VIGENCIA NUEVE (9) MESES

OBJETO DEL CONTRATO
 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

LOCALIZACION DEL PROYECTO VEREDAS AGUALINDA, SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO CINCO (5) MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 6 DE MAYO DE 2011

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	No.	TIEMPO (MESES)	FECHA
PRORROGA	1	CUATRO (4) MESES	01/11/2012
PRORROGA	2	CINCO (5) MESES	27/02/2013

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTA No.	OBJETO	FECHA	TIEMPO (MESES)
1	ORDEN DE INICIO	08/05/2011	CINCO (5) MESES
2	DE SUSPENSION No 1	14/08/2011	DOS (2) MESES
3	DE SUSPENSION No 2	16/08/2011	CUATRO MESES Y MEDIO (4.5)
4	AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION No 2	26/12/2011	UN (1) MES
5	DE SUSPENSION No 3	25/04/2012	CUATRO (4) MESES
6	AMPLI 1 A LA SUSPENSION No 3	24/08/2012	UN MES Y MEDIO (1.5)
7	DE TERMINACION	01/03/2013	


FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO 1 DE AGOSTO DE 2013

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 138.331.040.00

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR (\$)

448
2942



ACTA DE RECIBO FINAL OBRA Y/O CONSULTORIA


FO-AB-32
2015-07-10
V.03

HOJA 2 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303 DE 2011
		27	10	2013	
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE					
Nombre de la entidad, empresa del proyecto o contrato o de la obra, Director de Planeación, representante legal de la entidad o contratista					
ACTA No. 12 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA Y/O CONSULTORIA					
VALOR ACTUAL		\$ 138.381.040.00			
(esto que el valor actual del contrato es nulo)					
CONTRATISTA		CONSORCIO MATAGUASANTO CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES			
(esto que el nombre o razón social del contratista)					
SUPERVISOR		GILBERTO ANTONIO CABREJA ARANGO			
(esto que el nombre o razón social del supervisor)					
En Yopal, a los Veintisiete 27 días del mes, Octubre de 2013					
(esto que en este espacio se da por que se efectúa la entrega, en físico y moral)					
se reunieron CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES representante legal del contratista,					
(esto que el nombre o razón social del contratista)					
GILBERTO ANTONIO CABREJA ARANGO Supervisor Delegado por parte de la Secretaría de Obras Públicas					
(esto que el nombre o razón social del supervisor)					
del Departamento con fin de constatar el estado de la Consultoría objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la Supervisión la Consultoría ejecutada. Dicha Consultoría fue terminada el día Primero 1 de Agosto de 2013					
(esto que el nombre o razón social del contratista)					
según el acta No. ONCE 11 de terminación de Contrato de Consultoría					
(esto que el nombre o razón social del supervisor)					
A OBRA EJECUTADA Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS					
ITEM	DESCRIPCION / NOMBRE	UNIDAD CANT	Nº FOLIOS	V. UNIT	V. TOTAL
1	Informes Mensuales	Un	16		
SUBTOTAL					
% AUI					
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS					
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES					
OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS Y/O LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS					
1. El consultor cumplió con su objeto Contractual					
2. En tratándose de un Contrato de Consultoría y tal como lo estableció el literal D de la Clausula Segunda de la minuta del contrato una de las actividades de gran importancia, dentro del manejo administrativo, está la Liquidación de los contratos de obra a los cuales se les realizó la interventoría (No. 020 y 021 de 2011), actividad, que no se realizó, debido a que la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio de Pora "Aguas De Pora S.A. E.S.P" entidad contratante, que actúa como ejecutora de los recursos asignados y en su autonomía de voluntad suscribió el día 28 Junio de 2013, con su contratista de dichos negocios jurídicos una prórroga por tiempo cuatro (4) meses, por lo que su nueva fecha de terminación quedaba para el día 27 de octubre de 2013 con pleno conocimiento que el contrato de interventoría vencía su plazo contractual el día 1 de agosto del mismo año, sin que se le solicitara al Departamento una prórroga a la interventoría para continuar con el control y seguimiento a dichos contratos.					
3. Por lo anterior, la interventoría no podía realizar actas de terminación, ni de recibo final y mucho menos liquidación de los contratos 020 y 021 de 2011, objeto del contrato de consultoría, dado que el plazo contractual de dichos contratos no había terminado, cuando terminó el del contrato de consultoría					

1261

444
2943

GOBIERNO DE CASAPARE
 NIT 892699216-6



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

FO-AB-32
 2015-07-10
 V 03

HOJA 3 de 3 Fecha DD MM AA 27 10 2015

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303 DE 2011

ACTA DE RECIBO FINAL OBRA Y/O CONSULTORIA

ACTA No. 12 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA Y/O CONSULTORIA

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA /CONSULTORIA Y/O DE AJUSTES.

La interventoría presentó y fueron tramitadas 0 actas de recibo parcial de obra y/o consultoría y de ajustes correspondientes a la ejecución de MAYO de 2011 a AGOSTO de 2013 por un valor total de 0 por obra o actividad ejecutada y de 30.0 por ajustes.

C. POLIZA DE CALIDAD
 El contratista presentó el correspondiente certificado de modificación del amparo de la Calidad del Servicio de la consultoría ejecutada, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

COMPANIA	RIESGO	POLIZA O CERT MODIFICA No.	VIGENCIA	Vr ASEGURADO	DESDE HASTA

D. ESTADO GENERAL DE LA CONSULTORIA
 Una vez realizada la inspección total de la consultoría, se constató que a la fecha Veintisiete 27 de Octubre de 2015 los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la consultoría ejecutada a la supervisión y ésta la recibe. El recibo de la Consultoría terminada, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato. Nota: Las obras o trabajos que presentan observaciones por parte de la interventoría están relacionadas en esta acta y se tendrá en cuenta para la liquidación del contrato de obra de acuerdo con la cláusula No. del contrato anteriormente citado. Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintisiete 27 días del mes de Octubre de 2015.

CARLOS MAURICIO ROMAS ARGUELLES
R/L. CONSORCIO MAJAGUASAN
Contratista

GILBERTO ANTONIO CABRERA ARANGO
Supervisor Delegado

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

119
2944

2. DOCUMENTOS TECNICOS



GOBERNACION DE
CASANARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
PUBLICA

ACTA DE INICIACION

CODIGO: RIF-02-01-1

FECHA: 22/06/2009

VERSION: 01

HOJA 1 de 2

FECHA

DD

6

MM

5

AA

2011

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011

DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Nombre dependencia responsable del proyecto o CONTRATO (Secretaría de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ORDEN DE INICIACION DE

INTERVENTORIA ☒

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ☐

OBRA ☐

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente orden de iniciación, el supervisor del contrato asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Fecha de iniciación y fecha de terminación del contrato
- Valor del contrato
- avance de metas físicas del contrato

En consecuencia representante legal del contratista inicia la ejecución del contrato bajo la supervisión designada

1) El representante legal del contratista manifiesta que antes de suscribir el contrato de obra conoce ampliamente las condiciones de las obras a ejecutar.

TIPO DE CONTRATO

DE CONSULTORIA

(Indique en este espacio si se trata de Obra Pública o si corresponde a Estudios o Diseños, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de contratación consultoría)

CONTRATO DE CONSULTORIA No.

0303 DE

2011

VIGENCIA

CINCO (05) MESES

(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

CONVOCATORIA PUBLICA

() CONCURSO DE MÉRITOS (X)

CONTRATACION DIRECTA

() CAS-SOPT-CM-066-2010

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

LOCALIZACION DEL PROYECTO

VEREDAS AGUALINDA, SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

CINCO (05) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

6 DE MAYO DE 2011

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO

5 DE OCT DE 2011

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 138,381,040.00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATANTE

DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA

CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES

SUPERVISOR

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA

(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

FORMATO DC-001

Edificio Emiro Sossa Pacheco Carrera 19 N° 6-100 Tel. 6358497 Ext. 210-208 Yopal, Casanare
Web: <http://www.casanare.gov.co> Email: construcciones@casanare.gov.co

707

133



GOBERNACION DE
CASANARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
PUBLICA

ACTA DE INICIACION

CODIGO

RIF02-01-I

FECHA

22/06/2009

VERSION

01

HOJA 2 de 2

FECHA

DD

6

MM

5

AA

2011

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0303-011

En Yopal, a los seis (06) días del mes de Mayo de 2011, se reunieron CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L del CONSORCIO MATAGUASAN como entidad contratista y el ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA como supervisor por parte de la Secretaría de Obras Publicas y Transporte del Departamento de Casanare, según contrato de Prestación de servicios profesionales 1847 del 10 de Diciembre de 2010 y memorando 700 46 05 No. 0333 del 27 de abril de 2011, con el fin de iniciar el contrato anteriormente citado, según lo estipulado en la cláusula VIGESIMA TERCERA- SUPERVISION, previa las siguientes aclaraciones:

1. El representante Legal del Contratista, conoce todas y cada una de las cláusulas estipuladas en el presente contrato.

2. Que el plazo contractual es de CINCO (05) MESES a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

3. El representante Legal del Contratista se compromete a cumplir estrictamente con las actividades y obligaciones pactadas en las cláusulas SEGUNDA Y TERCERA del contrato.

El representante Legal del Contratista, deberá ajustarse a lo establecido en el Manual de Interventoría del Departamento en lo concerniente a la ejecución de los recursos transferidos en el contrato en mención.

5. El representante Legal del Contratista, a través de sus funcionarios deberá programar comités semanales con participación del Supervisor de la Gobernación.

6. La Interventoría contratada por EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, verificará previa a la iniciación de la ejecución de las obras lo concerniente a la parte técnica, administrativa, financiera y ambiental.

Se verificó el personal y equipo con que cuenta el contratista para la ejecución de la interventoría de acuerdo con la propuesta presentada así:

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	TARJETA PROFESIONAL
DIRECTOR	INGENIERO CIVIL	MARTA YORLENY JIMENEZ ARANGUREN	25202-62129
RESIDENTE	INGENIERO CIVIL	CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES	25202-084567

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
CONDUCTOR	ARTURO MORENO PEREZ

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato en mención, el cual debe concluir el día SEIS (06) de MAYO DE 2011. Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los CINCO (05) días del mes de OCTUBRE de 2011.

Firma

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
SUPERVISOR

Firma

Nombre

CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
R/L. CONSORCIO MATAGUASAN
CONTRATISTA

Original Oficina Jurídica

1era copia : Supervisor

2da copia La Empresa

3ra copia dependencia responsable del contrato

FORMATO DC-001

Edificio Emiro Sossa Pacheco Carrera 19 N° 6-100 Tel. 6358497 Ext. 210-208 Yopal, Casanare
Web: <http://www.casanare.gov.co>
Email construcciones@casanare.gov.co

208

134

123
2948

INVERSION ANTICIPO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONSORCIO MATAGUASAN

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJES	TOTALES
1 COSTOS DE PERSONAL			30%
PERSONAL	\$ 41,495,600.00	29.99%	
Ingeniero Civil (categoria 4)	\$ 18,886,400.00	13.65%	
Ingeniero Civil (categoria 7)	\$ 14,982,000.00	10.83%	
Conductor	\$ 7,627,200.00	5.51%	
2 COSTOS DIRECTOS	\$ 18,151,400.00	13.12%	13%
Transporte	\$ 15,680,600.00	11.33%	
Documentacion y papeleria	\$ 2,470,800.00	1.79%	
3 PAGO DE IMPUESTOS	\$ 9,543,520.00	6.90%	7%
TOTAL			50%

(Signature)

CONSORCIO MATAGUASAN
R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES

705

135

CONSORCIO MATAGUASAN

NIT. 900412456-8

~~124~~
2949

NO SE GENERARON ACTAS PARCIALES AL CONTRATO DE CONSULTORIA No 303 - 2011

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

~~125~~
2950

NO SE GENERARON ITEMS NO PREVISTOS, ITEMS NUEVOS Y ACTA DE PACTACION DE PRECIOS
AL CONTRATO DE CONSULTORIA No 303 - 2011

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

2951
126

NO APLICA ES CONTRATO DE CONSULTORIA

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

~~127~~
2952

NO APLICA ES CONTRATO DE CONSULTORIA

2933



LIQUIDACION DE CONSULTORIA

FO-AB-52
2015-07-10
V.03

HOJA 1 de 5	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303 DE 2011
		28	1	2016	

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretaría de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

INTERVENTORIA	<input type="checkbox"/>	CONSULTORIA	<input checked="" type="checkbox"/>
TIPO DE CONSULTORIA	INTERVENTORIA		
CONTRATO No.	303	DE	2011
LICITACION PUBLICA	<input type="checkbox"/>	CONCURSO DE MERITOS	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRATACION DIRECTA	<input type="checkbox"/>		

OBJETO DEL CONTRATO
INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA, Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONTRATISTA / CONSULTOR: CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES

INTERVENTOR: N.A.

NIT:

LOCALIZACION DEL PROYECTO VEREDAS AGUALINDA, SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE

PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO CINCO (5) MESES

FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	6	DE	MAYO	DE	2011
FECHA INICIAL DE TERMINACION DEL CONTRATO:	5	DE	OCTUBRE	DE	2011

PROROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (MESES)
PRORROGA No. 1(01/11/2012)	CUATRO (4) MESES
PRORROGA No.2 (27/02/2013)	CINCO (5) MESES

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS N°	FECHA	TIEMPO (MESES)
ORDEN DE INICIO	06/05/2011	CINCO (5) MESES
DE SUSPENSION No. 1	14/06/2011	DOS (2) MESES
DE SUSPENSION No.2	16/08/2011	CUATRO MESES Y MEDIO (4.5)
AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION No.2	26/12/2011	UN (1) MES
DE SUSPENSION No. 3	25/04/2012	CUATRO (4) MESES
AMPLI. 1 A LA SUSPENSION No. 3	24/08/2012	UN MES Y MEDIO (1.5)
DE TERMINACION	01/08/2013	
RECIBO FINAL	27/10/2015	

FECHA DE TERMINACION DEFINITIVA DEL CONTRATO 1 DE AGOSTO DE 2013

PLAZO DE EJECUCION REAL DEL CONTRATO: CATORCE (14) MESES

Meses y días



LIQUIDACION DE CONSULTORIA

FO-AB-52
2015-07-10
V.03

HOJA 2 de 5	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303 DE 2011
		28	1	2016	

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

En Yopal, a los veintiocho (28) días del mes Enero de 2016, se reunieron Carlos Mauricio Rojas Arguelles, Interventor Contratado y Lida Milena Lara Fuentes supervisor del Contrato de Consultoría No 303 de 2011 ; con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado, el cual fue terminado el día Primero (1) de Agosto de 2013, según Acta de Terminación N° 11 de fecha 1° de Agosto de 2013 y con acta de recibo de fecha 27 de Octubre de 2015.

A. ESTADO FINANCIERO

1, Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	\$ 138,381,040.00	Valor consultoría mas ajustes	\$ 138,381,040.00
Valor Adiciones	0	Valor Anticipo o pago anticipado	\$ 69,190,520.00
Valor del Contrato mas adiciones	\$ 138,381,040.00	Valor Anticipo Amortizado	
Valor Objeto ejecutado	\$ 138,381,040.00	Valor anticipo por amortizar	\$ 69,190,520.00
		Valor Por Pagar	\$ 69,190,520.00

2, Disponibilidad y reservas presupuestales.

Las disponibilidades y las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

Disponibilidades Presupuestales

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
CDP 110312	24/01/2011	6.SFIR	G2065603	\$ 138,426,285.00

Reservas Presupuestales.

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
1100303	14/02/2011	6.SFIR	G2065603	\$ 138,381,040.00

3, Ordenes de Pago

El valor ejecutado y pagado se relaciona a continuación:

ACTA No.	MES EJECUCION	ORDEN DE PAGO No	FECHA	VALOR (sin tener en cuenta los descuentos de impuestos)
2	ANTICIPO	01-1104265	17/06/2011	\$ 69,190,520.00
			VALOR TOTAL	\$ 69,190,520.00

B. ESTADO LEGAL

1, Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA	TIEMPO (MESES)
1	ORDEN DE INICIO	06/05/2011	CINCO (5) MESES
2	ENTREGA DE ANTICIPO	25/05/2011	
3	DE SUSPENSION No. 1	14/06/2011	DOS (2) MESES
4	REINICIO No. 1	12/08/2011	
5	DE SUSPENSION No.2	16/08/2011	CUATRO MESES Y MEDIO (4.5)
6	AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION No.2	26/12/2011	UN (1) MES
7	DE REINICIO No. 2	30/01/2012	
8	DE SUSPENSION No. 3	25/04/2012	CUATRO (4) MESES
9	AMPLI. 1 A LA SUSPENSION No. 3	24/08/2012	UN MES Y MEDIO (1.5)
10	DE REINICIO No. 3	08/10/2012	
11	DE TERMINACION	01/08/2013	
12	DE RECIBO FINAL	27/10/2015	

2955

LIQUIDACION DE CONSULTORIA

FO-AB-52
2015-07-10
V.03

HOJA 3 de 5	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303 DE 2011
		28	1	2016	

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

2, Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	TIEMPO (MESES)	FECHA
PRORROGA	1	CUATRO (4) MESES	01/11/2012
PRORROGA	2	CINCO (5) MESES	27/02/2013

3, Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

4, Sanciones

RESOLUCION No.	OBJETO	FECHA
N. A.		

5, Garantías

COMPANIA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No	VIGENCIA	CERT MODIFIC VIGENCIA	Vr ASEGURADO
Aseguradora Solidaria	Cumplimiento	605-47-99400005192	28/02/2011 - 25/02/2014	anexo 10	\$ 13,838,104.00
Aseguradora Solidaria	Anticipo	605-47-99400005192	28/02/2011 - 25/02/2014	anexo 10	\$ 69,190,520.00
Aseguradora Solidaria	Salarios	605-47-99400005192	28/02/2011 - 24/10/2016	anexo 10	\$ 6,919,052.00
Aseguradora Solidaria	Calidad	605-47-99400005192	27/10/2015 - 27/04/2016	anexo 10	\$ 13,838,104.00
Aseguradora Solidaria	Extracontractual	605-74-99400001311		anexo 6	\$ 107,120,000.00

C. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (DEBE ACONDICIONARSE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS)

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 138,381,040.00		
VALOR ANTICIPO (50%)			\$ 69,190,520.00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA		101,017,440.00	
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA (GIRO A EMPRESAS ADMINISTRADORAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS APORTES NO CANCELADOS)		\$ 37,363,600.00	
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA			\$ 31,826,920.00
VALOR PAGADO (GIRO A EMPRESAS ADMINISTRADORAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS APORTES NO CANCELADOS)			\$ 37,363,600.00
TOTALES	\$ 138,381,040.00	\$ 138,381,040.00	\$ 138,381,040.00



GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892099216-6

LIQUIDACION DE CONSULTORIA

FO-AB-52
2015-07-10
V.03

HOJA 4 de 5	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303 DE 2011
		28	1	2016	

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

Nota: El valor a girar al contratista corresponde a TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (\$31.826.920,00).

1, Recibo de documentos

Se deja constancia que el consultor hace entrega, al Interventor o Supervisor según el caso, de los siguientes documentos:

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	NUMERO DE COPIAS
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORA	16	921 Folios	1

OBSERVACIONES:

La liquidación del contrato de consultoría no releva al Interventor o consultor, según el caso, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.

- Se procede a suscribir la presente acta dando cumplimiento a la cláusula DECIMA OCTAVA Liquidación : " Terminada la liquidación del contrato se procederá a su liquidación dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del plazo de ejecución y en todo caso se estará a los términos y plazos previstos en el artículo once de la ley 1150 de 2007", se aclara que el plazo de ejecución venció el día primero (1) de agosto de 2013 según acta de terminación, de igual manera se suscribió acta de recibo final de interventoría el día 27 de octubre de 2015, por tal razón la supervisión manifiesta que procede a suscribir la presente acta de liquidación sustentada en el acta de recibo la cual hace parte integral de la misma.
- Que el contratista presentó pólizas debidamente vigentes y aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica del Departamento el día 30 de noviembre de 2015, dando cumplimiento al contrato, CLAUSULA DÉCIMA: GARANTÍAS.
- En cumplimiento con el artículo 2º de la Ley 828 del 10 de julio de 2003, por la cual se expiden normas para el control a la evasión del Sistema de Seguridad social, se verificó los pagos que realizó el contratista encontrándose faltantes respecto a los aportes obligatorios frente a los pagos de los aportes de Salud, Pensión, riesgos laborales y parafiscales establecidos en el contrato. En tal sentido se dio aplicación a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, tal y como se presenta en el Anexo N°2 (APORTES SIN CANCELAR), anexo que fue concertado con el contratista; documentos que reposan en el expediente contractual en la Secretaría de Obras Públicas y Transporte.
- Para dar aplicación a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista solicita el descuento de los aportes no cancelados, mediante oficio con radicado No. 01265 del 27 de Enero de 2016, descuento que autoriza el contratista y renuncia a términos de notificación a fin de dar celeridad al proceso de giro por concepto de pago pendiente a las administradoras del sistema de seguridad social y parafiscales.
- De acuerdo a la solicitud y autorización realizada por el contratista con respecto al descuento de los aportes no cancelados, la Gobernación de Casanare, aprueba dicha solicitud, para lo cual la Gobernación realizara los tramites pertinentes para realizar los pagos correspondientes a las administradoras del sistema de seguridad social y parafiscales.
- En virtud del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan proceder de inmediato y en este mismo instrumento a efectuar la respectiva liquidación por mutuo acuerdo del contrato de Consultoría N°303 de 2011, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas entre las partes.



GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892099216-6

LIQUIDACION DE CONSULTORIA

FO-AB-52
2015-07-10
V.03

HOJA 5 de 5	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303 DE 2011
		28	1	2016	
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE					

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

7. Con la firma de la presente Acta, el contratista manifiesta que la Gobernación de Casanare cumplió con cada una de las obligaciones adquiridas con la suscripción del Contrato de referencia; así mismo manifiesta que renuncia a cualquier reclamo posterior, declarándose las partes a paz y salvo por la ejecución del contrato, exceptuando la obligación que se tiene por parte de la Gobernación de realizar los pagos correspondientes a las administradoras del sistema de seguridad social y parafiscales.

8. Se adjunta y hace parte integral de la presente acta:

8.1 Comunicación con radicado No. 02149 de 17 de Febrero de 2015 con asunto: Entrega de Informe Final de Interventoría, con 921 Folios, y comunicación con radicado No. 01265 de 27 de Enero de 2016. con asunto: Solicitud de suscripción acta de liquidación.

8.2 Acta de Terminación de fecha 01 de Agosto de 2013.

8.3 Acta de recibo de fecha 27 de Octubre de 2015.

8.4 Anexo No. 1; Formato FO-AB-27.

8.5 Anexo No. 2 APORTES SIN CANCELAR (ART. 50 LEY 789 DE 2002), Incluye Planillas pagas de aportes a seguridad social y aportes parafiscales N°1306504256 periodo mayo-2011, 1306504264 periodo junio-2011, 1306504213 periodo agosto-2011, 1306504272 periodo enero-2012, 1306504221 periodo febrero-2012, 1306504231 periodo marzo-2012, 1306504299 periodo abril-2012, 1306504248 periodo octubre-2012, 1306504302 periodo nov-2012, 1306504310 periodo dic-2012, 1306504353 periodo enero-2013.

EL VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA LUEGO DEL GIRO A LOS ADMINISTRADORES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, CORRESPONDE A TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (\$31.826.920,00), POR CONCEPTO DE INTERVENTORIA EJECUTADA.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintiocho 28 días del mes de Enero de 2016 (Año de finalización)

Firma

CONSORCIO MATAGUASAN
R/L Carlos Mauricio Rojas Arguelles
Contratista

Firma

Lida Milena Lara Fuentes
Directora Técnica de Construcciones
Resolución 0017 del 6 de Enero de 2016
Supervisora

Firma

Hector Miguel Gonzalez Lozano
Secretario de Obras Publicas y Transporte
Resolución 002 del 1 de enero de 2016

Firma


Carmen Hilmenda Gonzalez Pinilla
Jefe Oficina Asesora Juridica

Firma

Josue Alirio Barrera Rodriguez
Gobernador de Casanare

Original Oficina Jurídica:
1era copia interventor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato

2958

 GOBIERNO DE CASANARE NIT. 892099216-6															ACTA DE LIQUIDACION FINAL FO-AB-27 30/05/2014 V.03																																																																																																																																											
CONTRATO No. 303 DE 2011 INTERVENCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN SIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE POPE, DEPARTAMENTO DE CASANARE															ANEXO No. 1 ACTA DE LIQUIDACION FINAL CANTIDADES EJECUTADAS 19/05/2016																																																																																																																																											
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE <small>Nombre dependencia responsable (Caratula de despacho o sello de identificación)</small>															PLAZO: 5 meses PRORROGA: 5 meses																																																																																																																																											
CONTRATISTA: CONSORCIO MATAGUASAN R L CARLOS MAURICIO ROJAS ARQUELLES															PERIODO CORRO 6 de Mayo de 2011 - 01 de Agosto de 2013																																																																																																																																											
SUPERVISOR: LIDA MILENA LARA FUENTES															FECHA DE INICIO: 06/05/2011 FECHA TERMINACION: 01/08/2013 FECHA DE RECIBO: 27/10/2015 VALOR INICIAL: \$139,361,040.00 ADICIONAL: \$0.00 VALOR TOTAL CONVENCIO: \$139,361,040.00																																																																																																																																											
HOJA 1 de 2															CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS																																																																																																																																											
CONDICIONES ORIGINALES															EJECUTADO PRESENTE ACTA																																																																																																																																											
1. COSTOS DE PERSONAL																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PERSONAL</th> <th>CUBS</th> <th>CANT</th> <th>SUELDO MIES</th> <th>DIAS</th> <th>T.M.</th> <th>DEDICACION</th> <th>VR. BASICO</th> <th>F.M.</th> <th>VALOR PARCIAL</th> <th>CANT</th> <th>DIAS</th> <th>T.M.</th> <th>DEDICACION</th> <th>VR. BASICO</th> <th>F.M.</th> <th>VALOR PARCIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PERSONAL PROFESIONAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ingeniero Civil (Categoría 4)</td> <td>2,31-16</td> <td>1</td> <td>\$ 4,150,000.00</td> <td>120.00</td> <td>5</td> <td>80%</td> <td>\$16,640,000.00</td> <td>2,27</td> <td>\$ 37,772,000.00</td> <td>1</td> <td>120.00</td> <td>5</td> <td>80%</td> <td>\$ 16,640,000.00</td> <td>2,27</td> <td>\$ 37,772,000.00</td> </tr> <tr> <td>Ingeniero Civil (Categoría 7)</td> <td>2,31-10</td> <td>1</td> <td>\$ 2,640,000.00</td> <td>120.00</td> <td>5</td> <td>100%</td> <td>\$13,200,000.00</td> <td>2,27</td> <td>\$ 29,664,000.00</td> <td>1</td> <td>120.00</td> <td>5</td> <td>100%</td> <td>\$ 13,200,000.00</td> <td>2,27</td> <td>\$ 29,664,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="17">PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO</td> </tr> <tr> <td>Conductor o materia</td> <td>2,32-1</td> <td>2</td> <td>\$ 640,000.00</td> <td>120.00</td> <td>4</td> <td>100%</td> <td>\$4,720,000.00</td> <td>2,27</td> <td>\$ 15,254,400.00</td> <td>2</td> <td>120.00</td> <td>4</td> <td>100%</td> <td>\$ 4,720,000.00</td> <td>2,27</td> <td>\$ 15,254,400.00</td> </tr> <tr> <td colspan="15"></td> <td colspan="2">Total Costos de Personal</td> <td colspan="2">\$ 82,991,200.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">\$ 82,991,200.00</td> </tr> </tbody> </table>															PERSONAL	CUBS	CANT	SUELDO MIES	DIAS	T.M.	DEDICACION	VR. BASICO	F.M.	VALOR PARCIAL	CANT	DIAS	T.M.	DEDICACION	VR. BASICO	F.M.	VALOR PARCIAL	PERSONAL PROFESIONAL																	Ingeniero Civil (Categoría 4)	2,31-16	1	\$ 4,150,000.00	120.00	5	80%	\$16,640,000.00	2,27	\$ 37,772,000.00	1	120.00	5	80%	\$ 16,640,000.00	2,27	\$ 37,772,000.00	Ingeniero Civil (Categoría 7)	2,31-10	1	\$ 2,640,000.00	120.00	5	100%	\$13,200,000.00	2,27	\$ 29,664,000.00	1	120.00	5	100%	\$ 13,200,000.00	2,27	\$ 29,664,000.00	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO																	Conductor o materia	2,32-1	2	\$ 640,000.00	120.00	4	100%	\$4,720,000.00	2,27	\$ 15,254,400.00	2	120.00	4	100%	\$ 4,720,000.00	2,27	\$ 15,254,400.00																Total Costos de Personal		\$ 82,991,200.00				\$ 82,991,200.00																
PERSONAL	CUBS	CANT	SUELDO MIES	DIAS	T.M.	DEDICACION	VR. BASICO	F.M.	VALOR PARCIAL	CANT	DIAS	T.M.	DEDICACION	VR. BASICO	F.M.	VALOR PARCIAL																																																																																																																																										
PERSONAL PROFESIONAL																																																																																																																																																										
Ingeniero Civil (Categoría 4)	2,31-16	1	\$ 4,150,000.00	120.00	5	80%	\$16,640,000.00	2,27	\$ 37,772,000.00	1	120.00	5	80%	\$ 16,640,000.00	2,27	\$ 37,772,000.00																																																																																																																																										
Ingeniero Civil (Categoría 7)	2,31-10	1	\$ 2,640,000.00	120.00	5	100%	\$13,200,000.00	2,27	\$ 29,664,000.00	1	120.00	5	100%	\$ 13,200,000.00	2,27	\$ 29,664,000.00																																																																																																																																										
PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO																																																																																																																																																										
Conductor o materia	2,32-1	2	\$ 640,000.00	120.00	4	100%	\$4,720,000.00	2,27	\$ 15,254,400.00	2	120.00	4	100%	\$ 4,720,000.00	2,27	\$ 15,254,400.00																																																																																																																																										
															Total Costos de Personal		\$ 82,991,200.00				\$ 82,991,200.00																																																																																																																																					
2. COSTOS DIRECTOS																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>CUBS</th> <th>UNO</th> <th>VALOR MENSUAL</th> <th>DIAS</th> <th>T.M.</th> <th>CANT</th> <th>DEDICACION / MIES</th> <th>VALOR PARCIAL</th> <th>CANT</th> <th>DIAS</th> <th>T.M.</th> <th>DEDICACION / MIES</th> <th>VALOR PARCIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TRANSPORTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vanclusa - 2000 CC</td> <td>2,37-2</td> <td>mes</td> <td>\$ 3,620,150.00</td> <td>120.00</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>100%</td> <td>\$ 31,301,200.00</td> <td>2</td> <td>120.00</td> <td>4</td> <td>100%</td> <td>\$ 31,301,200.00</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTO Y PAPELERIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Registros fotograficos y elaboracion de informes</td> <td>2,37-2</td> <td>mes</td> <td>\$ 725,400.00</td> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td>100%</td> <td>\$ 2,901,600.00</td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td>100%</td> <td>\$ 2,901,600.00</td> </tr> <tr> <td>Papeles de plancha</td> <td>2,37-2</td> <td>mes</td> <td>\$ 695,000.00</td> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td>60%</td> <td>\$ 2,040,000.00</td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td>60%</td> <td>\$ 2,040,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="13">Total Costos Directos</td> <td colspan="2">\$ 36,302,800.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>															CONCEPTO	CUBS	UNO	VALOR MENSUAL	DIAS	T.M.	CANT	DEDICACION / MIES	VALOR PARCIAL	CANT	DIAS	T.M.	DEDICACION / MIES	VALOR PARCIAL	TRANSPORTE														Vanclusa - 2000 CC	2,37-2	mes	\$ 3,620,150.00	120.00	4	2	100%	\$ 31,301,200.00	2	120.00	4	100%	\$ 31,301,200.00	DOCUMENTO Y PAPELERIA														Registros fotograficos y elaboracion de informes	2,37-2	mes	\$ 725,400.00		4		100%	\$ 2,901,600.00			4	100%	\$ 2,901,600.00	Papeles de plancha	2,37-2	mes	\$ 695,000.00		4		60%	\$ 2,040,000.00			4	60%	\$ 2,040,000.00	Total Costos Directos													\$ 36,302,800.00																																										
CONCEPTO	CUBS	UNO	VALOR MENSUAL	DIAS	T.M.	CANT	DEDICACION / MIES	VALOR PARCIAL	CANT	DIAS	T.M.	DEDICACION / MIES	VALOR PARCIAL																																																																																																																																													
TRANSPORTE																																																																																																																																																										
Vanclusa - 2000 CC	2,37-2	mes	\$ 3,620,150.00	120.00	4	2	100%	\$ 31,301,200.00	2	120.00	4	100%	\$ 31,301,200.00																																																																																																																																													
DOCUMENTO Y PAPELERIA																																																																																																																																																										
Registros fotograficos y elaboracion de informes	2,37-2	mes	\$ 725,400.00		4		100%	\$ 2,901,600.00			4	100%	\$ 2,901,600.00																																																																																																																																													
Papeles de plancha	2,37-2	mes	\$ 695,000.00		4		60%	\$ 2,040,000.00			4	60%	\$ 2,040,000.00																																																																																																																																													
Total Costos Directos													\$ 36,302,800.00																																																																																																																																													
3. COSTOS DE PERSONAL (+) COSTOS DIRECTOS																																																																																																																																																										
																	\$ 119,294,000.00				\$ 119,294,000.00																																																																																																																																					
4. IVA 10%																																																																																																																																																										
																	\$ 19,087,640.00				\$ 19,087,640.00																																																																																																																																					
5. COSTO FINAL (ajustado al peso)																																																																																																																																																										
																	\$ 138,381,640.00				\$ 138,381,640.00																																																																																																																																					

1149

ING. LIDA MILENARA FUENTES
SUPERVISOR DEL CONTRATO
ASOCIACIONES



GOBERNACION DE CASANARE
NIT. 892099216-6

RESOLUCION No. 014 DE 2016

"Por la cual se ordena girar a los administradores del sistema de seguridad social y parafiscales, los aportes no cancelados"

EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE DEPARTAMENTAL
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y,

CONSIDERANDO

Que el Artículo 3 de la Ley 797 de 2003, modificatorio del Artículo 15 de la Ley 100 de 1993, establece que serán afiliados al Sistema General de Pensiones:

"1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos. Así mismo, las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier otra modalidad de servicios que adopten, los trabajadores independientes y los grupos de población que por sus características o condiciones socioeconómicas sean elegidos para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales".

Que al aportante le asiste la obligación de cotizar sobre la totalidad de ingresos que perciba, lo cual implica que la cotización que en salud y pensiones efectúa como dependiente o independiente, no supe ni reemplaza la que tiene que hacer como contratista, en este caso, los aportes que como contratista o independiente debe efectuar deben ser girados a la misma EPS y AFP a la que viene cotizando, sin que ello implique una doble afiliación o un doble pago de aportes.

Que en los contratos, sin importar su duración o valor, en donde esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o jurídica, el contratista deberá estar afiliado obligatoriamente al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes, sea cual fuere la duración o modalidad de contrato que se adopte, teniendo presente lo dicho en el Artículo 23 del decreto 1703 de 2002, en el cual se establece que solo será obligatorio por parte del contratante verificar el pago a dicho Sistema de Seguridad, cuando el contrato de prestación de servicios sea superior a los tres meses.

Que el Departamento de Casanare suscribió Contrato de Consultoría No.303 del 14 de Febrero de 2011, con la empresa CONSORCIO.MATAGUASAN, Identificada con Nit.900412456-8, cuyo objeto es. "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

F. J. J. 1418



GOBERNACION DE CASANARE
NIT. 892099216-6

RESOLUCION No. 014 DE 2016

"Por la cual se ordena girar a los administradores del sistema de seguridad social y parafiscales, los aportes no cancelados"

Que la empresa contratista CONSORCIO MATAGUASAN, radicó comunicación escrita, ante la dirección Técnica de Construcciones de la Secretaria de Obras Públicas y Transporte, el día 27 de Enero de 2016, con radicado No. 01265 y asunto: Solicitud de suscripción acta de liquidación final del contrato.

Que esta Dirección Técnica realizó la verificación consignada en el expediente y en el informe final de interventoría radicado con fecha 17 de Febrero de 2015 con 921 Folios, donde se evidencio el no pago de seguridad social y parafiscales.

Que la empresa CONSORCIO MATAGUASAN, en radicado de solicitud de fecha el día 27 de Enero de 2016, solicita *"....realizar los descuentos correspondientes a dichos pagos de seguridad social y aportes parafiscales, de los valores que faltan por cobrar, del contrato de la referencia, con el fin de subsanar estos pagos pendientes"*.

Que la Dirección Técnica de Construcciones de la Secretaria de Obras Públicas y Transporte, en calidad de supervisor del Contrato de Consultoría No.303 del 14 de Febrero de 2011, y en cumplimiento con la Ley 828 del 10 de Julio de 2003, por la cual se expiden normas para el control a la evasión del Sistema de Seguridad social, realizo un análisis de los aportes sin cancelar, de acuerdo al personal relacionado en la propuesta, los tiempos establecidos de ejecución y verificado en las nóminas, consignadas en el informe final de interventoría.

Que la Dirección Técnica de Construcciones de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte, en calidad de supervisor del Contrato de Consultoría No.303 del 14 de Febrero de 2011, encuentra procedente la solicitud de la empresa CONSORCIO MATAGUASAN, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Teniendo en cuenta que es un trámite necesario para proceder a suscribir el acta de liquidación del contrato de consultoría No. 303 del 2011, dando cumplimiento de acuerdo a la minuta del contrato en la cláusula DECIMA OCTAVA Liquidación : " Terminada la liquidación del contrato se procederá a su liquidación dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del plazo de ejecución y en todo caso se estará a los términos y plazos previstos en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007", se aclara que el plazo de ejecución venció el día primero (1) de agosto de 2013 según acta de terminación, de igual manera se suscribió acta de recibo final de interventoría el día 27 de octubre de 2015.



GOBERNACION DE CASANARE
NIT. 892099216-6

RESOLUCION No. 014 DE 2016

"Por la cual se ordena girar a los administradores del sistema de seguridad social y parafiscales, los aportes no cancelados"

ARTÍCULO 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales. La celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, la Entidad pública deberá retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y efectuará el giro directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y pensiones, conforme lo define el reglamento.

Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

Para la presentación de ofertas por parte de personas jurídicas será indispensable acreditar el requisito señalado anteriormente. El funcionario que no deje constancia de la verificación del cumplimiento de este requisito incurrirá en causal de mala conducta.

Para poder ejercer el derecho de movilidad de Administradora de Riesgos Profesionales o Caja de Compensación, el empleador se debe encontrar al día con los sistemas de salud y pensiones".

Que la Dirección Técnica de Construcciones de la Secretaria de Obras Públicas y Transporte, en calidad de supervisor del Contrato de Consultoría No.303 del 14 de Febrero de 2011, se reunió con el contratista, para verificar con nóminas y presupuesto contractual, los aportes sin cancelar.

A continuación se relacionan los aportes no cancelados y adeudados a cada uno de los administradores de seguridad social y parafiscales, en donde se indican las valores establecidos en las planillas de acuerdo a la fecha correspondiente de pago, con sus respectivos intereses y se relaciona la fecha máxima de pago: (ver la tabla).

2967
*



GOBERNACION DE CASANARE
NIT. 892099216-6

RESOLUCION No. **014** DE 2016

"Por la cual se ordena girar a los administradores del sistema de seguridad social y parafiscales, los aportes no cancelados"

	PLANILLA No. 1306504255	PLANILLA No. 1306504256	PLANILLA No. 1306504257	PLANILLA No. 1306504258	PLANILLA No. 1306504259	PLANILLA No. 1306504260	PLANILLA No. 1306504261	PLANILLA No. 1306504262	PLANILLA No. 1306504263	PLANILLA No. 1306504264	PLANILLA No. 1306504265	PLANILLA No. 1306504266	VALORES TOTALES
PERSONAL	\$1.876.350,00	\$1.876.350,00	\$1.876.350,00	\$1.876.350,00	\$1.876.350,00	\$1.876.350,00	\$1.876.350,00	\$1.876.350,00	\$1.876.350,00	\$1.876.350,00	\$1.876.350,00	\$1.876.350,00	\$18.763.500,00
COLACIONES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
PROTECCION	\$583.300,00	\$197.100,00	\$70.400,00	\$22.200,00	\$443.800,00	\$443.800,00	\$443.800,00	\$355.900,00	\$323.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.469.300,00
FORNIRE	\$112.000,00	\$22.700,00	\$22.400,00	\$4.500,00	\$134.400,00	\$134.400,00	\$134.400,00	\$540.900,00	\$413.600,00	\$341.600,00	\$541.600,00	\$541.600,00	\$3.949.700,00
SALUD	\$222.900,00	\$222.900,00	\$12.500,00	\$12.500,00	\$12.500,00	\$12.500,00	\$12.500,00	\$12.500,00	\$12.500,00	\$12.500,00	\$12.500,00	\$12.500,00	\$4.827.400,00
COOKEVA	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
POSTGA	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
NUOVA EPS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
CAFESALLO	\$512.900,00	\$223.000,00	\$72.500,00	\$72.500,00	\$435.000,00	\$435.000,00	\$435.000,00	\$158.100,00	\$125.000,00	\$125.000,00	\$125.000,00	\$125.000,00	\$4.827.400,00
CCF	\$155.200,00	\$155.200,00	\$23.200,00	\$23.200,00	\$112.200,00	\$112.200,00	\$112.200,00	\$112.200,00	\$112.200,00	\$112.200,00	\$112.200,00	\$112.200,00	\$1.544.200,00
COMARCASANARE	\$156.700,00	\$23.200,00	\$23.200,00	\$5.700,00	\$139.200,00	\$139.200,00	\$139.200,00	\$122.400,00	\$122.400,00	\$122.400,00	\$122.400,00	\$122.400,00	\$1.544.200,00
ARL	\$230.000,00	\$155.000,00	\$67.200,00	\$11.200,00	\$121.200,00	\$121.200,00	\$121.200,00	\$121.200,00	\$121.200,00	\$121.200,00	\$121.200,00	\$121.200,00	\$1.544.200,00
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$293.000,00	\$113.000,00	\$63.300,00	\$11.600,00	\$242.200,00	\$242.200,00	\$242.200,00	\$353.600,00	\$200.800,00	\$348.000,00	\$348.000,00	\$348.000,00	\$2.687.700,00
SENA	\$123.700,00	\$123.700,00	\$11.000,00	\$11.000,00	\$55.500,00	\$55.500,00	\$55.500,00	\$113.300,00	\$113.300,00	\$113.300,00	\$113.300,00	\$113.300,00	\$772.400,00
SENA	\$33.200,00	\$33.200,00	\$11.600,00	\$3.400,00	\$19.600,00	\$19.600,00	\$19.600,00	\$110.300,00	\$122.200,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$772.400,00
ICF	\$122.000,00	\$48.300,00	\$17.400,00	\$5.000,00	\$51.400,00	\$51.400,00	\$51.400,00	\$113.200,00	\$150.300,00	\$150.300,00	\$150.300,00	\$150.300,00	\$5.155.600,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$125.000,00	\$48.800,00	\$17.400,00	\$5.000,00	\$104.600,00	\$104.600,00	\$104.600,00	\$185.200,00	\$138.200,00	\$150.000,00	\$150.000,00	\$150.000,00	\$1.158.500,00
VALOR PLANILLA SIN INTERESES DE MOROS	\$1.876.350,00	\$1.876.350,00	\$1.876.350,00	\$1.876.350,00	\$1.876.350,00	\$1.876.350,00	\$1.876.350,00	\$1.876.350,00	\$1.876.350,00	\$1.876.350,00	\$1.876.350,00	\$1.876.350,00	\$18.763.500,00
FECHA LIMITE DE PAGO	13/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	13/05/2016
VALORES DE MOROS	\$2.757.400,00	\$1.037.700,00	\$358.900,00	\$91.400,00	\$1.567.300,00	\$1.567.300,00	\$1.567.300,00	\$2.586.000,00	\$2.123.000,00	\$2.291.500,00	\$2.292.000,00	\$2.172.300,00	\$18.593.800,00
VALOR PLANILLA CON INTERESES DE MOROS	\$4.633.750,00	\$2.914.050,00	\$2.235.250,00	\$1.967.750,00	\$3.443.650,00	\$3.443.650,00	\$3.443.650,00	\$4.462.350,00	\$4.299.350,00	\$4.487.800,00	\$4.484.000,00	\$4.348.600,00	\$37.363.600,00

Que la Dirección Técnica Construcción de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte, en calidad de supervisor del Contrato de Consultoría No.303 del 14 de Febrero de 2011, certifica que el giro a las Administradoras del sistema de seguridad social y parafiscales corresponde a un valor de TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$37.363.600.00); teniendo en cuenta planillas anexas que corresponden a los periodos de Mayo, Junio, Agosto del 2011, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Octubre, Noviembre, Diciembre del 2012 y Enero del 2013. (anexo 12 Folios).

Que el contratista aprueba descontar el valor de TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$37.363.600.00), y renuncia a términos de notificación a fin de dar celeridad al proceso del giro por concepto de pago pendiente a las administradoras del sistema de seguridad social y parafiscales.

Que por las razones expuestas anteriormente y en acatamiento a las leyes que rigen al Estado Colombiano, se hace necesario realizar el giro a los administradores del sistema de seguridad social y parafiscales, de los aportes no cancelados.

En mérito de lo expuesto,



GOBERNACION DE CASANARE
NIT. 892099216-6

RESOLUCION No. 014 DE 2016

"Por la cual se ordena girar a los administradores del sistema de seguridad social y parafiscales, los aportes no cancelados"

RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorícese a la Secretaria de Hacienda Departamental, realizar el giro de la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$37.363.600.00), a favor de las Administradoras del sistema de seguridad social y parafiscales, indicadas en las planillas anexas y relacionadas en la presente Resolución, por concepto de aportes a los sistemas de seguridad social y parafiscales no cancelados, valor a ser pagado del Contrato de Consultoría No.303 del 14 de Febrero de 2011.


ARTÍCULO 2º: Autorícese a la Secretaria de Hacienda Departamental, efectuar las operaciones y ajustes respectivos para dar cumplimiento a lo aquí resuelto.


ARTÍCULO 3º: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y hacen parte integral doce (12) folios, que corresponden a las planillas integradas de autoliquidación de aportes de los periodos de Mayo, Junio, Agosto del 2011, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Octubre, Noviembre, Diciembre del 2012 y Enero del 2013.

ARTÍCULO 4º: Contra la presente proceden los recursos de Ley.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE


Dada en Yopal a los 06 MAY 2016


HECTOR MIGUEL GONZALEZ LOZANO
Secretario de Obras Públicas y Transporte



Revisó: LIDA MILENA LARA FUENTES
Directora Técnica de Construcciones


Revisó: JULIAN FIGUERO
Asesor Jurídico SOPT


Proyectó: LIDA MILENA LARA FUENTES.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900412456
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO MATAGUASAN	
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 11 16 TELÉFONO:	6382309
TIPO APORTANTE:	1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO


DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	1306504353	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2013	SALUD:	AÑO: 2013
DÍAS DE MORA:	1193		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2016/05/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	91708220

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	\$ 1.653.200
SUBTOTAL:			2	\$ 1.653.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800140949	EPS003	EPS003-CAFESALUD	2	\$ 1.227.700
SUBTOTAL:			2	\$ 1.227.700
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	2	\$ 392.900
SUBTOTAL:			2	\$ 392.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	\$ 683.600
SUBTOTAL:			2	\$ 683.600
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	2	\$ 196.400
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	\$ 294.600
SUBTOTAL:				\$ 491.000

TOTAL PAGADO:	\$ 4.448.400
---------------	--------------

2967

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



501

1. DATOS GENERALES DEL APORTANTE:
NOMBRE: CONSORCIO MATAQUAN
CALLE: CALLE 22 N° 18
TELEFONO: 1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:
ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDADES DE arquitectura e Ingeniería y otras
UNICO
NIT: 900412456
NÚMERO PLANILLA: 900412456
PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2013
DÍAS DE MORA: 2013
FECHA PAGO (aaaa/mm/aa): 2010/05/15
NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2010/05/15
MCS: MCS
emano AÑO: 2013
E-EMPLA002: 21700220


TOTAL APORTES A PENSION									
Nº. COTIZANTES		COTIZACIÓN	Nº. COTIZANTES		COTIZACIÓN	Nº. COTIZANTES		COTIZACIÓN	Nº. COTIZANTES
2		\$ 100.000	2		\$ 100.000	2		\$ 100.000	2
ADMINISTRADORA		NOMBRE	ADMINISTRADORA		NOMBRE	ADMINISTRADORA		NOMBRE	ADMINISTRADORA
COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

TOTAL APORTES A SALUD									
Nº. COTIZANTES		COTIZACIÓN	Nº. COTIZANTES		COTIZACIÓN	Nº. COTIZANTES		COTIZACIÓN	Nº. COTIZANTES
2		\$ 100.000	2		\$ 100.000	2		\$ 100.000	2
ADMINISTRADORA		NOMBRE	ADMINISTRADORA		NOMBRE	ADMINISTRADORA		NOMBRE	ADMINISTRADORA
COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.


TOTAL APORTES A OTRAS PENSIONES									
Nº. COTIZANTES		COTIZACIÓN	Nº. COTIZANTES		COTIZACIÓN	Nº. COTIZANTES		COTIZACIÓN	Nº. COTIZANTES
2		\$ 100.000	2		\$ 100.000	2		\$ 100.000	2
ADMINISTRADORA		NOMBRE	ADMINISTRADORA		NOMBRE	ADMINISTRADORA		NOMBRE	ADMINISTRADORA
COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

TOTAL APORTES A OTRAS PENSIONES									
Nº. COTIZANTES		COTIZACIÓN	Nº. COTIZANTES		COTIZACIÓN	Nº. COTIZANTES		COTIZACIÓN	Nº. COTIZANTES
2		\$ 100.000	2		\$ 100.000	2		\$ 100.000	2
ADMINISTRADORA		NOMBRE	ADMINISTRADORA		NOMBRE	ADMINISTRADORA		NOMBRE	ADMINISTRADORA
COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

TOTAL APORTES A OTRAS PENSIONES									
Nº. COTIZANTES		COTIZACIÓN	Nº. COTIZANTES		COTIZACIÓN	Nº. COTIZANTES		COTIZACIÓN	Nº. COTIZANTES
2		\$ 100.000	2		\$ 100.000	2		\$ 100.000	2
ADMINISTRADORA		NOMBRE	ADMINISTRADORA		NOMBRE	ADMINISTRADORA		NOMBRE	ADMINISTRADORA
COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO




DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900412456
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO MATAGUASAN	
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 11 16 TELÉFONO:	6382309
TIPO APORTANTE:	1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	1306504310	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2012	SALUD:
DÍAS DE MORA:	1223	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2016/05/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		91193197


LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	\$ 1.674.600
SUBTOTAL:			2	\$ 1.674.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800140949	EPS003	EPS003-CAFESALUD	2	\$ 1.243.600
SUBTOTAL:			2	\$ 1.243.600
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	2	\$ 398.000
SUBTOTAL:			2	\$ 398.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	\$ 692.400
SUBTOTAL:			2	\$ 692.400
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	2	\$ 199.000
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	\$ 298.500
SUBTOTAL:				\$ 497.500

TOTAL PAGADO:	\$ 4.506.100
----------------------	---------------------

[illegible]



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



2970


DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900412456
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO MATAGUASAN	
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 11 16 TELÉFONO:	6382309
TIPO APORTANTE:	1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	1306504302	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2012	SALUD:
DÍAS DE MORA:	1254	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2016/05/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		91192422

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	\$ 1.696.800
SUBTOTAL:			2	\$ 1.696.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800140949	EPS003	EPS003-CAFESALUD	2	\$ 1.260.200
SUBTOTAL:			2	\$ 1.260.200
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	2	\$ 403.300
SUBTOTAL:			2	\$ 403.300
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	\$ 701.700
SUBTOTAL:			2	\$ 701.700
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	2	\$ 201.600
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	\$ 302.400
SUBTOTAL:				\$ 504.000


TOTAL PAGADO:	\$ 4.566.000
---------------	--------------

157



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

SOPORTE DE PAGO GENERAL

[illegible]

2972

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800412456
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO MATAGUASAN	
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 11 16 TELÉFONO:	6382309
TIPO APORTANTE:	1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO



DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	1306504248	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2012	SALUD:
DÍAS DE MORA:	1282	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2016/05/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		91191457

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	\$ 660.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	\$ 843.800
SUBTOTAL:			3	\$ 1.504.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800140949	EPS003	EPS003-CAFESALUD	3	\$ 1.175.400
SUBTOTAL:			3	\$ 1.175.400
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	3	\$ 376.200
SUBTOTAL:			3	\$ 376.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	\$ 654.500
SUBTOTAL:			3	\$ 654.500
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	3	\$ 188.100
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	3	\$ 282.000
SUBTOTAL:				\$ 470.100

TOTAL PAGADO: \$ 4.180.600

2973

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE TIT: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 200413468 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO MATAJAGUAN CALIFICACIÓN: CLASIFICACIÓN: 0402020 DIRECCIÓN: BANDO DE 200 COTIZANTES TIPO DE EMPRESA: ACTIVIDADES DE APLICACIÓN E INGENIERÍA Y OTRAS FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO APORTANTE DONADOR PAGO APORTES SALUD, SEHA S E CUP (REFORMA TRIBUTARIA)		DATOS GENERALES DE LA FAMILIA NÚMERO PLANILLA: 1306504288 PERÍODO COTIZACIÓN: 2012 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2012 DÍAS DE MORA: 0 FECHA PAGO (mes/año/día): 2010/07/10 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 01181467	
---	--	---	--

TOTAL APORTES A PAGAR									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	EXEMPLE	EXEMPLE	EXEMPLE	EXEMPLE
00000	SEHA	SEHA	00000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000
00000	SEHA	SEHA	00000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000
SUBTOTAL									

TOTAL APORTES A PAGAR									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	EXEMPLE	EXEMPLE	EXEMPLE	EXEMPLE
00000	SEHA	SEHA	00000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000
00000	SEHA	SEHA	00000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000
SUBTOTAL									

TOTAL APORTES A PAGAR									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	EXEMPLE	EXEMPLE	EXEMPLE	EXEMPLE
00000	SEHA	SEHA	00000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000
00000	SEHA	SEHA	00000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000
SUBTOTAL									

TOTAL APORTES A PAGAR									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	EXEMPLE	EXEMPLE	EXEMPLE	EXEMPLE
00000	SEHA	SEHA	00000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000
00000	SEHA	SEHA	00000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000
SUBTOTAL									


TOTAL APORTES A PAGAR									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	EXEMPLE	EXEMPLE	EXEMPLE	EXEMPLE
00000	SEHA	SEHA	00000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000
00000	SEHA	SEHA	00000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000
SUBTOTAL									

TOTAL APORTES A PAGAR									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	EXEMPLE	EXEMPLE	EXEMPLE	EXEMPLE
00000	SEHA	SEHA	00000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000
00000	SEHA	SEHA	00000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000
SUBTOTAL									


TOTAL \$ 4.180.600

160

2974



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900412456
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO MATAGUASAN	
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 11 16 TELÉFONO:	6382309
TIPO APORTANTE:	1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	1306504299	TIPO DE PLANILLA:
PERÍODO COTIZACIÓN:	MES: abril	PERÍODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2012	SALUD:
DÍAS DE MORA:	1469	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2016/05/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		91190714

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	\$ 855.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	\$ 1.189.700
SUBTOTAL:			3	\$ 2.045.100
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800140949	EPS003	EPS003-CAFESALUD	3	\$ 1.515.400
SUBTOTAL:			3	\$ 1.515.400
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	3	\$ 484.800
SUBTOTAL:			3	\$ 484.800
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
880011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	\$ 843.700
SUBTOTAL:			3	\$ 843.700
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	3	\$ 242.600
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	3	\$ 363.600
SUBTOTAL:				\$ 606.200


TOTAL PAGADO:

\$ 5.495.200


**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

TOTAL	\$ 5,495.200
--------------	---------------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900412458
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO MATAGUASAN	
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 11 16 TELÉFONO:	6382309
TIPO APORTANTE:	1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	1306504231	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2012	AÑO: 2012
DÍAS DE MORA:	1497	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2016/05/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 91189850

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO	
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1		\$ 997.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	1		\$ 298.800
SUBTOTAL:			2		\$ 1.296.400
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800140949	EPS003	EPS003-CAFESALUD	2		\$ 967.000
SUBTOTAL:			2		\$ 967.000
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	2		\$ 309.400
SUBTOTAL:			2		\$ 309.400
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		\$ 538.400
SUBTOTAL:			2		\$ 538.400
OTROS PARAFISCALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
899999034	PASENA	PASENA-SENA	2		\$ 154.700
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	2		\$ 232.100
SUBTOTAL:					\$ 386.800

TOTAL PAGADO:	\$ 3.498.000
----------------------	---------------------


[illegible][illegible][illegible]

TOTAL APORTES A REDES Y PROYECTOS									
		INGRESOS		EGRESOS		TOTAL		VALOR	
1	INGRESOS								
2	EGRESOS								
3	INGRESOS								
4	EGRESOS								
5	INGRESOS								
6	EGRESOS								
7	INGRESOS								
8	EGRESOS								
9	INGRESOS								
10	EGRESOS								
11	INGRESOS								
12	EGRESOS								
13	INGRESOS								
14	EGRESOS								
15	INGRESOS								
16	EGRESOS								
17	INGRESOS								
18	EGRESOS								
19	INGRESOS								
20	EGRESOS								
21	INGRESOS								
22	EGRESOS								
23	INGRESOS								
24	EGRESOS								
25	INGRESOS								
26	EGRESOS								
27	INGRESOS								
28	EGRESOS								
29	INGRESOS								
30	EGRESOS								
31	INGRESOS								
32	EGRESOS								
33	INGRESOS								
34	EGRESOS								
35	INGRESOS								
36	EGRESOS								
37	INGRESOS								
38	EGRESOS								
39	INGRESOS								
40	EGRESOS								
41	INGRESOS								
42	EGRESOS								
43	INGRESOS								
44	EGRESOS								
45	INGRESOS								
46	EGRESOS								
47	INGRESOS								
48	EGRESOS								
49	INGRESOS								
50	EGRESOS								
51	INGRESOS								
52	EGRESOS								
53	INGRESOS								
54	EGRESOS								
55	INGRESOS								
56	EGRESOS								
57	INGRESOS								
58	EGRESOS								
59	INGRESOS								
60	EGRESOS								
61	INGRESOS								
62	EGRESOS								
63	INGRESOS								
64	EGRESOS								
65	INGRESOS								
66	EGRESOS								
67	INGRESOS								
68	EGRESOS								
69	INGRESOS								
70	EGRESOS								
71	INGRESOS								
72	EGRESOS								
73	INGRESOS								
74	EGRESOS								
75	INGRESOS								
76	EGRESOS								
77	INGRESOS								
78	EGRESOS								
79	INGRESOS								
80	EGRESOS								
81	INGRESOS								
82	EGRESOS								
83	INGRESOS								
84	EGRESOS								
85	INGRESOS								
86	EGRESOS								
87	INGRESOS								
88	EGRESOS								
89	INGRESOS								
90	EGRESOS								
91	INGRESOS								
92	EGRESOS								
93	INGRESOS								
94	EGRESOS								
95	INGRESOS								
96	EGRESOS								
97	INGRESOS								
98	EGRESOS								
99	INGRESOS								
100	EGRESOS								
TOTAL									


TOTAL PONTOS A LA DE COMPENSACION FAMILIAR		TOTAL PONTOS	
ADMINISTRADOR	NO. CO-TITANTES	ADJUNTES	VALOR PUNTOS
250560	2	\$ 330.00	\$ 330.00
250560	2	\$ 330.00	\$ 330.00
SUBTOTAL		\$ 660.00	\$ 660.00

[illegible][illegible]

TOTAL	\$ 3,498,000
--------------	---------------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900412456
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO MATAGUASAN	
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 11 16 TELÉFONO:	6382309
TIPO APORTANTE:	1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	1306504221	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2012	SALUD:
DÍAS DE MORA:	1531	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2016/05/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		91188206


LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	\$ 1.010.200
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 302.500
SUBTOTAL:			2	\$ 1.312.700
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800140949	EPS003	EPS003-CAFESALUD	2	\$ 979.200
SUBTOTAL:			2	\$ 979.200
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	2	\$ 313.300
SUBTOTAL:			2	\$ 313.300
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	\$ 545.200
SUBTOTAL:			2	\$ 545.200
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	2	\$ 156.700
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	\$ 235.000
SUBTOTAL:				\$ 391.700

TOTAL PAGADO:	\$ 3.542.100
----------------------	---------------------

2979



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA FAMILIA																																																																																																																																																																																													
TIPO IDENTIFICACIÓN:					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					NÚMERO DE PLANILLA:					MIS																																																																																																																																																																																								
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:					ASOCIADO DEPARTAMENTO:					NOMBRE AÑO:					MIS																																																																																																																																																																																								
DIRECCIÓN:					CALLE/APOYADOR CLASO APORTANTE:					PERIODO COTIZACIÓN OTROS:					PERIODO COTIZACIÓN CAUUP:																																																																																																																																																																																								
TIPO APORTANTE:					PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMÍA:					FICHA PAGO (ver Anexo 1):					2016/07/19 NÚMERO AUTORIZACIÓN:																																																																																																																																																																																								
FORMA DE PRESENTACIÓN:					UNICO																																																																																																																																																																																																		
APORTANTE PARTICIPADO PAGO APORTES SALUD, EDU. E OTR (REFORMA TRIBUTARIA):																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">TOTAL APORTES A PERSONA</th> <th colspan="10">TOTAL APORTES A SALUD</th> </tr> <tr> <th colspan="5">PERSONA</th> <th colspan="5">SALUD</th> <th colspan="5">PERSONA</th> <th colspan="5">SALUD</th> </tr> <tr> <th>COSEJO</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>COSEJO</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>COSEJO</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>COSEJO</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> </tr> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> </tr> </thead> </table>																				TOTAL APORTES A PERSONA										TOTAL APORTES A SALUD										PERSONA					SALUD					PERSONA					SALUD					COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">TOTAL APORTES A PERSONA</th> <th colspan="10">TOTAL APORTES A SALUD</th> </tr> <tr> <th colspan="5">PERSONA</th> <th colspan="5">SALUD</th> <th colspan="5">PERSONA</th> <th colspan="5">SALUD</th> </tr> <tr> <th>COSEJO</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>COSEJO</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>COSEJO</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>COSEJO</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> </tr> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> </tr> </thead> </table>																				TOTAL APORTES A PERSONA										TOTAL APORTES A SALUD										PERSONA					SALUD					PERSONA					SALUD					COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
TOTAL APORTES A PERSONA										TOTAL APORTES A SALUD																																																																																																																																																																																													
PERSONA					SALUD					PERSONA					SALUD																																																																																																																																																																																								
COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA																																																																																																																																																																																				
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE																																																																																																																																																																																				
TOTAL APORTES A PERSONA										TOTAL APORTES A SALUD																																																																																																																																																																																													
PERSONA					SALUD					PERSONA					SALUD																																																																																																																																																																																								
COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA																																																																																																																																																																																				
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">TOTAL APORTES A PERSONA</th> <th colspan="10">TOTAL APORTES A SALUD</th> </tr> <tr> <th colspan="5">PERSONA</th> <th colspan="5">SALUD</th> <th colspan="5">PERSONA</th> <th colspan="5">SALUD</th> </tr> <tr> <th>COSEJO</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>COSEJO</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>COSEJO</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>COSEJO</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> </tr> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> </tr> </thead> </table>																				TOTAL APORTES A PERSONA										TOTAL APORTES A SALUD										PERSONA					SALUD					PERSONA					SALUD					COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">TOTAL APORTES A PERSONA</th> <th colspan="10">TOTAL APORTES A SALUD</th> </tr> <tr> <th colspan="5">PERSONA</th> <th colspan="5">SALUD</th> <th colspan="5">PERSONA</th> <th colspan="5">SALUD</th> </tr> <tr> <th>COSEJO</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>COSEJO</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>COSEJO</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>COSEJO</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> <th>ADMINISTRADORA</th> </tr> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> <th>NOMBRE</th> </tr> </thead> </table>																				TOTAL APORTES A PERSONA										TOTAL APORTES A SALUD										PERSONA					SALUD					PERSONA					SALUD					COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
TOTAL APORTES A PERSONA										TOTAL APORTES A SALUD																																																																																																																																																																																													
PERSONA					SALUD					PERSONA					SALUD																																																																																																																																																																																								
COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA																																																																																																																																																																																				
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE																																																																																																																																																																																				
TOTAL APORTES A PERSONA										TOTAL APORTES A SALUD																																																																																																																																																																																													
PERSONA					SALUD					PERSONA					SALUD																																																																																																																																																																																								
COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	COSEJO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA																																																																																																																																																																																				
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE																																																																																																																																																																																				

166


DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900412456
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO MATAGUASAN	
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 11 16 TELÉFONO:	6382309
TIPO APORTANTE:	1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	1306504272	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2012	SALUD:
DÍAS DE MORA:	1560	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2016/05/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		91193901


LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	\$ 50.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 10.200
SUBTOTAL:			2	\$ 60.700
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800140949	EPS003	EPS003-CAFESALUD	2	\$ 47.500
SUBTOTAL:			2	\$ 47.500
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	2	\$ 15.200
SUBTOTAL:			2	\$ 15.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	\$ 26.400
SUBTOTAL:			2	\$ 26.400
OTROS PARA FISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	2	\$ 7.700
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	\$ 11.400
SUBTOTAL:				\$ 19.100

TOTAL PAGADO: \$ 168.900

[illegible]



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



2982

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900412456
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO MATAGUASAN	
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 11 16 TELÉFONO:	6382309
TIPO APORTANTE:	1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO


DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	1306504213	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2011	SALUD:	AÑO: 2011
DÍAS DE MORA:	1713		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2016/05/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	91187384

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	\$ 168.700
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 53.700
SUBTOTAL:			2	\$ 222.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800140949	EPS003	EPS003-CAFESALUD	2	\$ 173.700
SUBTOTAL:			2	\$ 173.700
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	2	\$ 55.600
SUBTOTAL:			2	\$ 55.600
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	\$ 96.600
SUBTOTAL:			2	\$ 96.600
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	2	\$ 27.800
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	\$ 41.700
SUBTOTAL:				\$ 69.500

TOTAL PAGADO:	\$ 617.800
---------------	------------


169

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**


[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

TOTAL	\$ 617.800
-------	------------

170



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



2984

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900412456
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO MATAGUASAN	
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 11 16 TELÉFONO:	6382309
TIPO APORTANTE:	1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	1306504284	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2011	SALUD:
DÍAS DE MORA:	1772	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2016/05/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		91186484

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)			1	\$ 481.200
800224808	230301	230301-PORVENIR			1	\$ 153.100
SUBTOTAL:					2	\$ 634.300
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800140949	EPS003	EPS003-CAFESALUD			2	\$ 495.600
SUBTOTAL:					2	\$ 495.600
CAJA DE COMPENSACIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE			2	\$ 158.700
SUBTOTAL:					2	\$ 158.700
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			2	\$ 275.900
SUBTOTAL:					2	\$ 275.900
OTROS PARAFISCALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
899999034	PASENA	PASENA-SENA			2	\$ 79.100
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF			2	\$ 119.200
SUBTOTAL:						\$ 198.300

TOTAL PAGADO: \$ 1.762.800

150
171



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**




Banco de Occidente


[illegible]

172

2986



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900412456
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO MATAGUASAN	
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 11 16 TELÉFONO:	6382309
TIPO APORTANTE:	1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	1306504256		TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2011	SALUD:
DÍAS DE MORA:	1804		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2016/05/18		NÚMERO AUTORIZACIÓN:
			91189061

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	\$ 1.452.700
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 276.100
SUBTOTAL:			2	\$ 1.728.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800140949	EPS003	EPS003-CAFESALUD	2	\$ 1.284.200
SUBTOTAL:			2	\$ 1.284.200
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	2	\$ 411.000
SUBTOTAL:			2	\$ 411.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	\$ 714.900
SUBTOTAL:			2	\$ 714.900
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	2	\$ 205.400
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	\$ 308.200
SUBTOTAL:				\$ 513.600

TOTAL PAGADO:	\$ 4.652.500
----------------------	---------------------

173

105-105

105-105

105-105

105-10000

105-105

105-10000

105-10000

105-10000

105-10000

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

2988
129

NO APLICA ES CONTRATO DE CONSULTORIA

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

2989
130

NO SE GENERARON ACTAS DE MODIFICACION AL CONTRATO DE CONSULTORIA No 303 - 2011

176

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

+31 2990

NO APLICA ES CONTRATO DE CONSULTORIA

2991
132

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUAHINDA Y
CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO
DE CASANARE

CONSULTORIA

INFORME DE CONSULTORIA FINAL SEPTIEMBRE DE 2014

CONSORCIO MATAGUASAN

Contratista

CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA No. 303 / 2011

CONTRATO DE OBRA No. 020 - 2011

"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE"



CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011

"CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE"



CONSORCIO MATAGUASAM
CALLE 100 N° 10000
BOGOTÁ, COLOMBIA

134
2993

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS
SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL
MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION	ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSULTOR	CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

CONTENIDO

- I. LISTA DE DISTRIBUCION
- II. REVISION Y APROBACION
 1. INFORMACION BASICA DE LA CONSULTORIA
 2. CONTROL DE POLIZAS CONSULTORIA
 3. RELACION DE ACTAS CONSULTORIA
 4. PLAN DE TRABAJO
 5. AVANCE DE LA CONSULTORIA
 6. CONTROL DE AVANCE CONSULTORIA
 7. RELACION PERSONAL CONSULTORIA
 8. RELACION PAGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 9. BALANCE DE CONTRATO CONSULTORIA
 10. INCONVENIENTES
 11. REGISTRO FOTOGRAFICO
 12. CANTIDADES DE OBRA RECIBIDAS POR LA CONSULTORIA DE CONTRATO DE OBRA No. 020 - 2011
 13. CANTIDADES DE OBRA SIN EJECUTAR DE CONTRATO DE OBRA No. 020 - 2011

1180

2994
135

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS
SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL
MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION	ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSULTOR	CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

CONTENIDO

14. CANTIDADES DE OBRA RECIBIDAS POR LA CONSULTORIA DE CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011

15. CANTIDADES DE OBRA SIN EJECUTAR DE CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011

16. ANEXOS

17. INFORME FINAL CONSULTORIA DE CONTRATO DE OBRA No. 020 - 2011

18. INFORME FINAL CONSULTORIA DE CONTRATO DE OBRA No. 021 - 2011

188

2995
136

CONSORCIO MATAGUASAN

NIT. 900412456-8

I. LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Este documento ha sido entregado a La Gobernación de Casanare y a las dependencias mencionadas a continuación. Las observaciones que resulten de su revisión y aplicación deben ser informadas al responsable de su elaboración para proceder a realizar su modificación.

DEPENDENCIA	ORIGINAL	COPIAS
GOBERNACION DE CASANARE, DIRECCION DE CONSTRUCCIONES	01	
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE PORE.		01
CONSORCIO MATAGUASAN		01

CONSORCIO MATAGUASAN

NIT. 900412456-8

137
2996

II. REVISIÓN Y APROBACIÓN

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 606 / 2014		
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE."		
Título documento	: Informe de Interventoría Final Septiembre de 2014	
Versión	: 3	
ELABORACIÓN		
Responsable de la elaboración	Nombre	ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES R/L CONSORCIO MATAGUASAN
	Firma	
	Fecha	26/05/2015

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VALOR: \$ 138.381.040,00

CONTRATO No.: 303 - 2011

CONTRATISTA: CONSORCIO MATAGUASAN

INFORME DE CONSULTORIA FINAL SEPTIEMBRE DE 2014

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

ACTA	FECHA	PLAZO	TIEMPO SUSPENSION	REINICIO
CONTRATO	14/02/2011	5 MESES		06/05/2011
ACTA No. 01 DE INICIACION				
ACTA No. 02 DE ANTICIPO	25/05/2011			
ACTA No. 03 DE SUSPENSION No. 01	14/06/2011		2 MESES	
ACTA No. 04 DE REINICIACION No. 01				12/08/2011
ACTA No. 05 DE SUSPENSION No. 02	16/08/2011		4,5 MESES	
ACTA No. 06 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 02	26/12/2011		1 MES	
ACTA No. 07 DE REINICIACION No. 02				30/01/2012
ACTA No. 08 DE SUSPENSION No. 03	25/04/2012		4 MESES	
ACTA No. 09 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 03	24/08/2012		1,5 MESES	
ACTA No. 10 DE REINICIACION No. 03				08/10/2012
PRORROGA No 1	01/11/2012	4 MESES		
PRORROGA No 2	27/02/2013	5 MESES		

420 DIAS TRABAJADOS
150 DIAS CONTRACTUALES

PERIODOS TRABAJADOS			
---------------------	--	--	--

06/05/2011	A	14/06/2011	38 DIAS
12/08/2011	A	16/08/2011	4 DIAS
30/01/2012	A	25/04/2012	84 DIAS
08/10/2012	A	01/08/2013	294 DIAS

138
2993

2998
B9

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

I. INFORMACION BASICA DE LA CONSULTORIA	
CONSULTORIA	
Nombre del Contratante Supervisor	DEPARTAMENTO DE CASANARE ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
Nombre del Contratista	CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
Numero del Contrato	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303
Plazo (Meses)	CINCO (5) MESES
Valor fiscal	\$ 138.381.040,00
Fecha de Iniciación	06/05/2011
Fecha de terminación contractual	05/10/2011
Objeto	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
SUSPENSIONES	
Fecha de suspensión No. 01	14 de Junio de 2011
Motivo	. Debido a las condiciones de invierno que imperan en las veredaa, han ocasionado que en los accesos con que cuentan las veredas se encuentren en mal estado, presentandose dificultades de acceso por desbordamiento de caños y destrucción de las vías, que impiden la entrada de personal equipos y materiales, ademas las lluvias constantes son un impedimento para la ejecución de las actividades tales como excavaciones, rellenos, localización y replanteo y demás inherentes a la ejecución del objeto del contrato.
Tiempo de suspensión	DOS (2) MESES
Nueva fecha de Terminación	05 DE DICIEMBRE DE 2011
Fecha de reiniciación No. 01	12 de Agosto de 2011
Fecha de suspensión No. 02	16 de Agosto de 2011
Motivo	. Durante el fin de semana se presentaron aguaceros que causaron que el río Pauto volviera a desviar su cauce al caños alimeta lo que origino inundaciones en las vías de acceso de las veredas Agualinda; San Isidro y Matalarga como se plasma en el oficio enviado al supervisor de la Gobernacion de Casanare. estas inundaciones impiden el acceso de equipos, personal y material a las zonas de trabajo.
Tiempo de suspensión	CUATRO Y MEDIO (4,5) MESES
Fecha de Ampliacion de suspensión No. 02	26 de Diciembre de 2011
Motivo	Aun no se han superado las causas que motivaron la suspensión No. 02, como se plasma en oficio enviado al supervisor de la Gobernacion de Casanare.
Tiempo de suspensión	UN (1) MES

185

2999
140

Nueva fecha de Terminación	19 de Mayo de 2012
Fecha de reiniciación No. 02	30 de enero de 2012
Fecha de suspensión No. 03	25 de Abril de 2012
Motivo	<p>1. El Puente metálico de acceso a la vereda Matalarga del Municipio de Pore se desplomo totalmente, por la socavación de los extremos de los estribos, evitando el paso de vehículos.</p> <p>2. Esto genera que sea imposible en este momento la entrada de material, equipos y personal al sitio de la obra en la vereda Matalarga.</p> <p>Para la vereda Agualinda:</p> <p>1. Debido a las condiciones climáticas reinantes en la zona, el nivel freático esta muy alto lo cual no permite realizar excavaciones, ya que las zanjas al estar tan saturadas no permiten la correcta instalación de la tubería, el uso de motobombas es infructuoso.</p>
Tiempo de suspensión	CUATRO (04) MESES
Nueva fecha de Terminación	01 de Noviembre de 2012
Fecha de Ampliación de suspensión No. 03	24 de Agosto de 2012
Motivo	A la fecha no se han superado las causas que motivaron la suspensión.
Tiempo de suspensión	UN Y MEDIO (1.5) MESES
Fecha de reiniciación No. 03	08 de Octubre de 2012
Nueva fecha de Terminación	01 de Agosto de 2013

Fecha de autorización Prorroga No. 01	01 de Noviembre de 2012
Periodo autorizado	CUATRO (4) MESES
Motivo	<p>Contrato 020 de 2011 que tiene por objeto: "Construcción del sistema de acueducto por gravedad de la vereda Agualinda del Municipio de Pore Departamento de Casanare".</p> <p>Se ha presentado un clima adverso lo que imposibilita la excavación para la instalación de la tubería, ya que es infructuoso el uso de motobombas, esto ha generado retrasos considerables para la ejecución de los trabajos.</p> <p>Contrato 021 de 2011 que tiene por objeto: Construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore Departamento de Casanare".</p> <p>Vereda Matalarga:</p> <p>La caída del puente que es la entrada a la vereda Matalarga ha originado que se acceda por una batea, la cual se cree intempestivamente por las condiciones climáticas reinantes en la zona, lo que impide el acceso a la obra y no es posible llevar materiales.</p> <p>En las excavaciones para la instalación de la tubería el rendimiento es bajo a nulo debido al alto nivel freático.</p>

14) 3000

Vereda San Isidro:

El trabajo en la vereda San Isidro es bastante dependiente de las condiciones climáticas ya que para el acceso hay que cruzar dos brazos de dos caños que se crecen intempestivamente lo que ha dificultado el acceso de personal.

Para la construcción del pozo lo ideal es que el nivel freático se encuentre más bajo que en condiciones de invierno, para asegurarnos de la real capacidad hidráulica del terreno.

Fecha de autorización Prorroga No. 02	27 de Febrero de 2013
Periodo autorizado	CINCO (5) MESES

Motivo	<p>a) teniendo en cuenta que el objeto contractual del contrato de la referencia se suscribio con el unico fin de hacer control y seguimiento a los contratosde obra derivados de los convenios 053 del 2010 y convenio 040 del 2010, suscritos entre la Gobernacion de Casanare y la Alcaldia de Pore, los cuales fueron prorogados de la sifuyente manera: Convenio 053 del 2010: fecha de prorroga, 11 de Diciembre de 2012 por 6 meses. Convenio 040 del 2010: fecha de prorroga 31 de Octubre de 2012 por 8 meses.</p> <p>b) que adicionalmente la interventoria tiene fecha de terminacion del 01 de Marzo de 2013, con lo cual dichas obras se quedarían sin su respectivo control y seguimiento por parte de la interventoria.</p>
--------	--

Fecha	
Plazo Adicional	
Valor Adicional	
Valor ejecutado (Según Actas)	\$ -
Valor acta de suspensión	\$ -
Valor acta de Adición	\$ -
Valor sobranste contrato	\$ -
Valor reajustes	\$ -

3001
H2

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA/ AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISOR/COORDINADOR
CONSULTOR
DOMINANTE

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

2. CONTROL DE POLIZAS

CONDICIONES INICIALES

GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	VIGENCIA		CONDICIONES ACTUALES	VALOR ASEGURADO
		FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO		
CUMPLIMIENTO	SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860,524,654-6	28-feb-11	05-dic-11	25-feb-14	\$13.838.104,00
ANTICIPO	SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860,524,654-6	28-feb-11	05-dic-11	25-feb-14	\$69.190.520,00
PRESTACIONES SOCIALES	SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860,524,654-6	28-feb-11	05-ago-14	24-oct-16	\$6.919.052,00
CALIDAD DEL SERVICIO	SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860,524,654-6	28-feb-11	05-feb-12	27-abr-14	\$13.838.104,00
RESPONSABILIDAD CIVIL	SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860,524,654-6	28-feb-11	05-ago-11	27-oct-13	\$107.120.000,00

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

5 DEVOLUCIONES ACTAS PARCIALES DE LA CONSULTORIA

SUPERVISION GOBERNACIÓN		ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA									
CONSULTOR		CONSORCIO MATAGUASAN									
		CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303									
		VALOR DEL CONTRATO									
		VALOR ANTICIPO									
		RESUMEN DEL CONTRATO ACUMULADO A LA FECHA									
		RESUMEN SEGÚN ACTAS									
ACTA	FECHA	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR NETO PAGADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR AMORTIZACION ACUMULADA	VALOR NETO PAGADO ACUMULADO	VALOR AMORTIZAR POR	VALOR A LIQUIDAR EN ACTAS	VALOR FALTANTE POR PAGAR	
No											
1		\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	69,190,520.00	-	-	
2		\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	69,190,520.00	-	-	
3		\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	69,190,520.00	-	-	
4		\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	69,190,520.00	-	-	
5		\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	69,190,520.00	-	-	

NOTA: NO SE REALIZARON ACTAS PARCIALES DE CONSULTORIA

3002
193

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALUNDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORRE. DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACIÓN

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA

CONSULTOR

CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES

CONTRATO

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

4. PLAN DE TRABAJO

FUNCIONES TECNICAS		Oportunidad de Entrega del Producto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1
Inicio de las obras, verificación del replanteo y establecimiento del programa de ejecución de obras.		1 Mes																															
Revisión del cumplimiento de las especificaciones a través del control de materiales y avance de obra.		Permanente																															
Control de programación y avance de obras, a través de la línea de balance.		Permanente																															
Remisión, aprobación y coordinación, de la señalización preventiva que se utilizará en la obra.		Permanente																															
Control de recursos, tales como materiales, mano de obra y equipos.		Permanente																															
Solución de problemas técnicos de obra.		Permanente																															
Medición y revisión de cantidades de obra que será la base de las sugerencias para cambios o modificaciones a los diseños.		Permanente																															
Registro permanente de las modificaciones a los diseños y especificaciones, sucedidas durante la construcción y presentar soportes técnicos y planos records aprobados.		Permanente																															
Dar cumplimiento a la resolución 851 de 2009, Artículo 3.		Permanente																															
Otras actividades: vistas técnicas		Permanente																															
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS		Oportunidad de Entrega del Producto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1
Estudio y aplicación del contrato de obra, pliegos de condiciones de la selección y anexos, programas de obra, flujos de fondo e inversión del anticipo.		1 Mes																															
Seguimiento, aprobación y control de las pólizas y garantías del contrato inter-administrativo.		Cada retención y/o cambio de condiciones																															
Seguimiento, aprobación y control de las pólizas y garantías de anticipos.		Cada retención y/o cambio de condiciones																															
Revisión y aprobación de las actas de obra y de reajustes, en el caso que existieren.		Permanente																															

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE POBE. DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORME DE CONSULTORIA

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACIÓN

CONSULTOR

CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA

CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

4. PLAN DE TRABAJO

Revisión de las actas de obras adicionales, complementarias y sustitutas con cantidades de obra.	Permanente	
Emitir el concepto sobre los análisis de precios elaborados por el constructor, items no previstos.	Permanente	
Coordinación y colaboración a la supervisión de las Empresas de Servicios Públicos, durante la construcción, para el recibo y aprobación de las obras realizadas por el constructor.	Permanente	
Realizar y aprobar el reglamento de seguridad industrial que se establezca en la obra y velar porque se cumpla permanentemente.	1 Mes	
Aprobación de modificaciones y entregar a la entidad soportes técnicos y planos aprobados.	1 Mes	
Elaboración de informes periodicos mensuales divididos en los capítulos descritos en el estudio previo.	Primeros días del mes	

3

FUNCIONES AMBIENTALES

FUNCIONES AMBIENTALES																															
Oportunidad de Entrega del Producto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1
Velar porque el contratista cumpla con los requerimientos de las medidas ambientales generales para cualquier proyecto de obra civil.	Permanente																														
Realizar control y seguimiento ambiental a las actividades de construcción con el fin de evitar impactos no previstos y evitar daños a terceros.	Permanente																														
Solicitar al contratista el cumplimiento del programa de seguridad industrial e higiene en el trabajo.	Permanente																														
Verificar el alcance de los permisos ambientales, su vigencia y las necesidades de ampliación o modificación de este.	1 Mes																														
Realizar acciones adelantadas por parte del contratista para minimizar y mitigar impactos.	Permanente																														
Hacer cumplir la normatividad ambiental vigente y actos administrativos de CORPOINOQUIA a través del cual se toman y promulgan las decisiones ambientales.	Permanente																														
Solicitar al contratista el plan de manejo ambiental o instructivo de mínimas implicaciones ambientales.	1 Mes																														

4

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

4. PLAN DE TRABAJO

LIQUIDACION DE LA OBRA Y DEL CONTRATO		Oportunidad de Entrega del Producto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Presentar actas (informes) mensuales de avance de obra.		Cada Mes																															
Presentar informe y acta final de obra, acta de entrega a la comunidad.		Cuando corresponda																															
Presentar acta de liquidación final de obra.		en ejecución																															
Presentar los rendimientos financieros.		en ejecución																															
Presentar informes de interventoría ambiental al Departamento y a CORPORINOQUIA.		Cuando corresponda																															
Estas actividades se deben realizar mediante la ejecución de los diferentes componentes de cada una, con base en las especificaciones técnicas particulares y en las especificaciones de la secretaría de obras de la Gobernación de Casanare, para cada uno de los ítems contemplados.		Permanente																															

AVANCE

3006
147

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL	SEPTIEMBRE DE 2014
ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA	
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES	
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303	

CAPÍTULO 1 FUNCIONES TECNICAS

Actividades Contractuales	Informe Final
Revisión de los pliegos de condiciones de la selección, al igual que la propuesta del constructor y del contrato.	Se reviso esta actividad para determinar que clausulas le generarian multas o llamados de atencion nuevamente.
Revisión y aprobación de los estudios y diseños entregados al contratista y los que el proponga en desarrollo de las obras.	Para el presente informe no fue necesario realizar esta actividad.
Inicio de las obras, verificación del replanteo y establecimiento del programa de ejecución de obras.	<p>La interventoria llevo a cabo el control de dos contratos de obra que suscribio Aguas de Pore con Oscar Javier Acuña.</p> <p><u>1. Contrato de Obra No. 020 del 2011.</u></p> <p>Objeto: Construcción del sistema de acueducto por gravedad para la vereda Agualinda del Municipio de Pore, Departamento de Casanare.</p> <p>Se realizo el replanteo con los planos existentes y se llevo a cabo la topografia correspondiente donde se levantaron nuevos planos.</p> <p><u>2. Contrato de Obra No. 021 del 2011.</u></p> <p>Objeto: Construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore, departamento de Casanare.</p> <p>Se realizo el replanteo con los planos existentes y se llevo a cabo la topografia correspondiente donde se levantaron nuevos planos.</p> <p><u>1. Contrato de Obra No. 020 del 2011.</u></p> <p><u>En la vereda Agualinda:</u></p> <p>Se hace recibo y se cuantifica las cantidades de obra, que la interventoria reconoció y verifico su calidad de materiales y especificaciones tecnicas hasta el 01 de Agosto de 2013, que es el tiempo contractual de la interventoria.</p> <p><u>2. Contrato de Obra No. 021 del 2011.</u></p> <p><u>En la vereda Matalarga:</u></p> <p>Se hace recibo y se cuantifica las cantidades de obra, que la interventoria reconoció y verifico su calidad de materiales y especificaciones tecnicas hasta el 01 de Agosto de 2013, que es el tiempo contractual de la interventoria.</p> <p><u>En la vereda San Isidro:</u></p> <p>Se hace recibo y se cuantifica las cantidades de obra, que la interventoria reconoció y verifico su calidad de materiales y especificaciones tecnicas hasta el 01 de Agosto de 2013, que es el tiempo contractual de la interventoria.</p> <p><u>1. Contrato de Obra No. 020 del 2011.</u></p> <p><u>En la vereda Agualinda</u> Desafortunadamente NO se cumplio con el 100% de la ejecucion de los trabajos hasta el 01 de Agosto de 2013 plazo contractual de la interventoria.</p> <p><u>2. Contrato de Obra No. 021 del 2011.</u></p> <p><u>En la vereda Matalarga</u> Desafortunadamente NO se cumplio con el 100% de la ejecucion de los trabajos hasta el 01 de Agosto de 2013 plazo contractual de la interventoria.</p> <p><u>En la vereda San Isidro</u> Desafortunadamente NO se cumplio con el 100% de la ejecucion de los trabajos hasta el 01 de Agosto de 2013 plazo contractual de la interventoria.</p>
Revisión del cumplimiento de las especificaciones a través del control de materiales y avance de obra.	
Control de programación y avance de obras, a través de la línea de balance.	

3003
148

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL	SEPTIEMBRE DE 2014
ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA	
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES	
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303	

AVANCE DE LA CONSULTORIA

Remisión, aprobación y coordinación, de la señalización preventiva que se utilizara en la obra.	Durante la ejecucion se requirieron cada vez que se necesito y se llevo a cabo.
Control de recursos, tales como materiales, mano de obra y equipos.	<p>Durante la ejecucion de las actividades se llevo a cabo estricto control de los materiales, la mano de obra y los equipos.</p> <p>Todos los problemas tecnicos que se presentarondo, se revisaron en comité tecnico que se realizaron los miercoles.</p> <p><u>1. Contrato de Obra No. 020 del 2011.</u></p> <p><u>En la vereda Aqualinda</u></p> <p>Los problemas tecnicos se solucionaron en su mayoría, desafortunadamente el contratista de obra NO realizo las actividades para terminar en el periodo contractual de la interventoria.</p> <p><u>2. Contrato de Obra No. 021 del 2011.</u></p> <p><u>En la vereda Matalarga</u></p> <p>Los problemas tecnicos se solucionaron en su mayoría, desafortunadamente el contratista de obra NO realizo las actividades para terminar en el periodo contractual de la interventoria.</p> <p><u>En la vereda San Isidro</u></p> <p>Los problemas tecnicos se solucionaron en su mayoría, desafortunadamente el contratista de obra NO realizo las actividades para terminar en el periodo contractual de la interventoria.</p> <p><u>2. Contrato de Obra No. 021 del 2011.</u></p> <p><u>En la vereda Matalarga</u></p> <p>Se realizo la medicion de las cantidades de obra a diario, y se plasman en el cuadro de cantidades de obra, cantidades supervisadas por la interventoria a las cuales se les hizo seguimiento completo. Hasta el 01 de agosto de 2013.</p> <p>Los diseños NO se modificaron</p> <p><u>En la vereda San Isidro</u></p> <p>Se realizo la medicion de las cantidades de obra a diario, y se plasman en el cuadro de cantidades de obra, cantidades supervisadas por la interventoria a las cuales se les hizo seguimiento completo. Hasta el 01 de agosto de 2013.</p> <p>Los diseños NO se modificaron</p> <p><u>1. Contrato de Obra No. 020 del 2011.</u></p> <p><u>En la vereda Aqualinda</u></p> <p>Se realizo la medicion de las cantidades de obra a diario, y se plasman en el cuadro de cantidades de obra, cantidades supervisadas por la interventoria a las cuales se les hizo seguimiento completo. Hasta el 01 de agosto de 2013.</p> <p>Los diseños NO se modificaron</p>
Solución de problemas tecnicos de obra.	
Medición y revision de cantidades de obra que sera la base de las sugerencias para cambios o modificaciones a los diseños.	
Registro permanente de las modificaciones a los diseños y especificaciones, sucedidas durante la construccion y presentar soportes tecnicos y planos records aprobados.	<p>En este periodo NO se han modificado los diseños ni las especificaciones del contrato de obra, se realizo acta de modificación del dia 05 de Septiembre de 2012, donde se establecieron Items no previstos y mayores y menores cantidades en algunos items.</p>

3008
149

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA

CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

AVANCE DE LA CONSULTORIA

Dar cumplimiento a la resolución 851 de 2009, Artículo 3.

No se encontro la Resolución 851 del 2009, sino el Decreto 851 del 13 de Marzo de 2009, en las que se establece: 'Artículo 3.....En tales contratos se establecerá como obligación a cargo del interventor, el suministro de la información técnica, administrativa, financiera y legal que les sea requerida por el Departamento Nacional de Planeación o por las entidades públicas o privadas contratadas por este, con la periodicidad y calidad determinada por dicho Departamento. El contenido de los informes de los interventores técnicos se debe ajustar a la naturaleza y complejidad de cada contrato objeto de Interventoría.'

Esta actividades se realizaron cada vez que correspondio y se solicitara.

CAPÍTULO 2 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

Actividades Contractuales	Informe Final
Estudio y aplicación del contrato de obra, pliegos de condiciones de la selección y anexos, programas de obra, flujos de fondo e inversión del anticipo.	Esta actividad se habia realizado previamente
Seguimiento, aprobación y control de las polizas y garantías del contrato inter-administrativo.	El contrato de Consultoría NO tenía el alcance de segur y controlar las polizas y garantías de los contratos inter-administrativos
Seguimiento, aprobación y control de las polizas y garantías de anticipos.	Se entrega anexo de control de polizas de los contratos No 020-2011 y 021-2011
Revisión y aprobación de las actas de obra y de reajustes, en el caso que existieren.	Se entrega anexo de las actas suscritas de los contratos No 020-2011 y 021-2011
Revisión de las actas de obras adicionales, complementarias y sustitutivas con cantidades de obra.	Se entrega anexo de las actas de modificacion de los contratos No 020-2011 y 021-2011
Emitir el concepto sobre los analisis de precios elaborados por el constructor, ítems no previstos.	Se entrega anexo de las actas de los ítems no previstos de los contratos No 020-2011 y 021-2011
Coordinación y colaboración a la supervisión de las Empresas de Servicios Publicos, durante la construcción, para el recibo y aprobación de las obras realizadas por el constructor.	Se realizo coordinación con la Empresa de Acueducto, alcantarillado y aseo de Pore, Aguas de Pore S.A E.S.P., en todas las determinaciones que se tomaron en cuanto a las suspensiones y reinicio de las actividades de los contratos de obra, asi como el seguimiento para determinar un posible Incumplimiento. Tambien se realiza un comite tecnico los miercoles donde se revisan el avance de las actividades que ha realizado el constructor y que no ha ejecutado. Adicionalmente se realizan visitas tecnicas a la obra en apoyo con los supervisores.
Realizar y aprobar el reglamento de seguridad industrial que se establezca en la obra y velar porque se cumpla permanentemente.	Se solicito mediante oficio al contratista el plan de seguridad industrial y salud ocupacional, para ser revisado y avalado por la interventoria.
Aprobación de modificaciones y entregar a la entidad soportes técnicos y planos aprobados.	Desafortunadamente el contratista d obra NO hizo entrega de los planos record del acueducto de las veredas de los contratos 020-2011 y 021-2011.
Elaboración de informes periodicos mensuales divididos en los capitulos descritos en el estudio previo.	El informe final corresponde al informe No 15 que se entrega en la Gobernacion de Casanare.

CAPITULO 3. FUNCIONES AMBIENTALES

Actividades Contractuales	Informe Final
Velar porque el contratista cumpla con los requerimientos de las medidas ambientales generales para cualquier proyecto de obra civil.	
Realizar control y seguimiento ambiental a las actividades de construcción con el fin de evitar impactos no previstos y evitar daños a terceros.	

recibo de
01 de

3009
156

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

CLIENTE:	ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
CONTRATO:	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

AVANCE DE LA CONSULTORIA

- Solicitar al contratista el cumplimiento del programa de seguridad industrial e higiene en el trabajo.
- Verificar el alcance de los permisos ambientales, su vigencia y las necesidades de ampliación o modificación de este.
- Realizar acciones adelantadas por parte del contratista para minimizar y mitigar impactos.
- Hacer cumplir la normatividad ambiental vigente y actos administrativos de CORPORINOQUIA a través del cual se toman y promulgan las decisiones ambientales.
- Solicitar al contratista el plan de manejo ambiental o instructivo de mínimas implicaciones ambientales.

En proceso de
cantidades hasta
agosto 2013

CAPITULO 4. LIQUIDACION DE LA OBRA Y DEL CONTRATO

Actividades Contractuales	Informe Final
Presentar actas (informes) mensuales de avance de obra.	El presente informe se realiza en cumplimiento de esta actividad.
Presentar informe y acta final de obra, acta de entrega a la comunidad.	Desafortunadamente en el tiempo contractual de la interventoria, el contratista no ejecuto el 100% de lo establecido en los contratos de obra No. 020-2011 y 021 - 2011
Presentar acta de liquidación final de obra.	El contratista de obra de los contratos de obra No. 020 - 2011 y No. 021 - 2011 NO termino la ejecucion de las obras correspondientes durante el tiempo contractual de la interventoria.
Presentar los rendimientos financieros.	Se solicitaron periordicamente al contratista, con el fin de realizar seguimiento continuo, y rendir los informes pertinentes a las entidades que lo soliciten.
Presentar informes de interventoria ambiental al Departamento y a CORPORINOQUIA.	No se realizo esta actividad para el presente informe, de ser requeridos se presentaran a la Autoridad Ambiental de la Región y/o el Departamento.

3010
LFT



INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORME DE CONSULTORIA

SEPTIEMBRE DE 2014

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

1 FUNCIONES TECNICAS

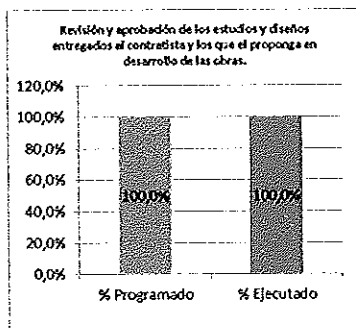
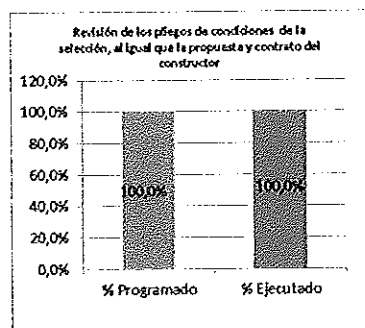


Revisión de los pliegos de condiciones de la selección, al igual que la propuesta y contrato del constructor

% Programado 100,0%
% Ejecutado 100,0%

Revisión y aprobación de los estudios y diseños entregados al contratista y los que el proponga en desarrollo de las obras.

% Programado 100,0%
% Ejecutado 100,0%

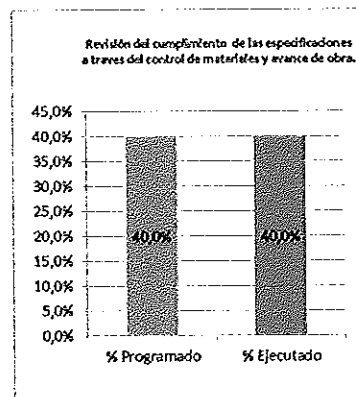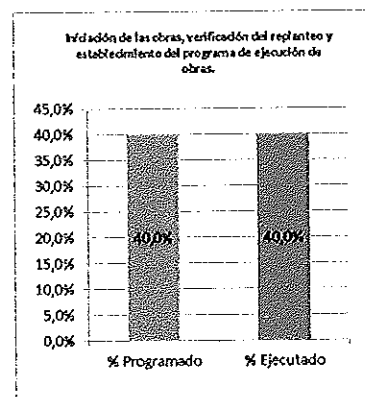



Iniciación de las obras, verificación del replanteo y establecimiento del programa de ejecución de obras.

% Programado 40,0%
% Ejecutado 40,0%

Revisión del cumplimiento de las especificaciones a través del control de materiales y avance de obra.

% Programado 40,0%
% Ejecutado 40,0%

NOTA: Las actividades que están enlazadas con el inicio de obra, no se contemplan en este control de avance, se programaron de acuerdo al cronograma de obra ajustado.

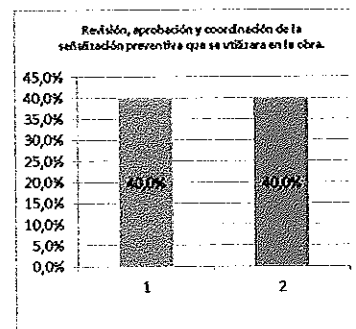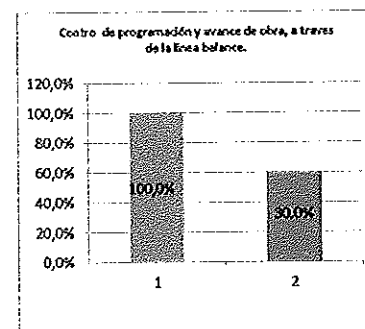

Control de programación y avance de obra, a través de la línea balance.

% Programado 100,0%
% Ejecutado 60,0%

Revisión, aprobación y coordinación de la señalización preventiva que se utilizara en la obra.

% Programado 40,0%
% Ejecutado 40,0%



3011
15/2

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALUNDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORME DE CONSULTORIA

SEPTIEMBRE DE 2014

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

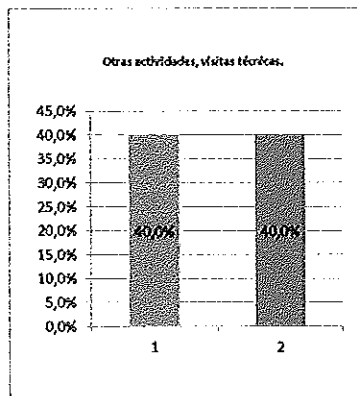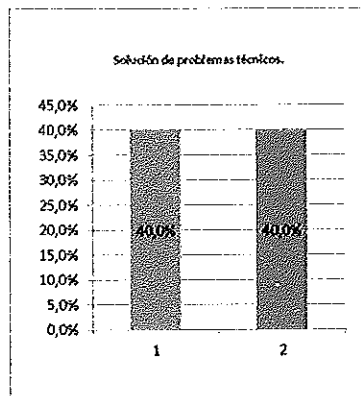

Solución de problemas técnicos



% Programado 40,0%
% Ejecutado 40,0%

Medición y revisión de cantidades de obra que sera la base de las sugerencias para cambios o modificaciones a los diseños.

% Programado 40,0%
% Ejecutado 40,0%

NOTA: Las actividades que estan enlazadas con el inicio de obra, no se contemplan en este control de avance, se programaran de acuerdo al cronograma de obra ajustado.

2. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

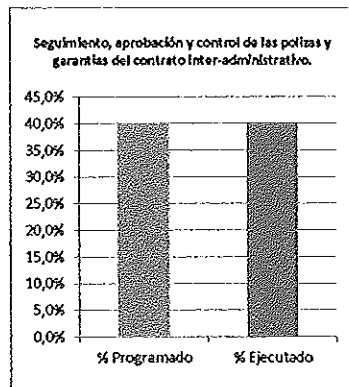
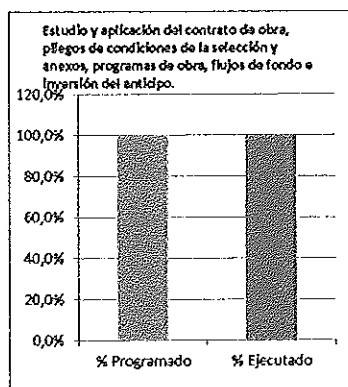


Estudio y aplicación del contrato de obra, pliegos de condiciones de la selección y anexos, programas de obra, flujos de fondo e inversión del anticipo.

% Programado 100,0%
% Ejecutado 100,0%

Seguimiento, aprobación y control de las pólizas y garantías del contrato inter-administrativo.

% Programado 40,0%
% Ejecutado 40,0%

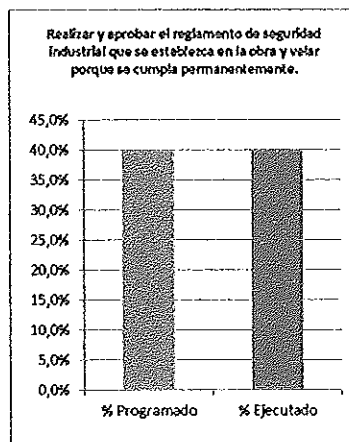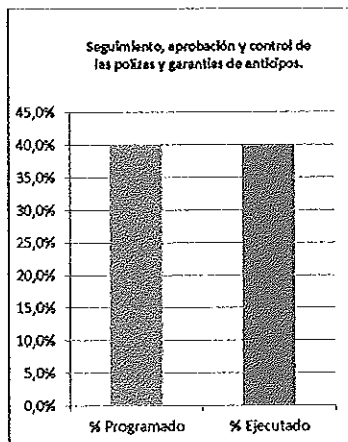

Seguimiento, aprobación y control de las pólizas y garantías de anticipos.

% Programado 40,0%
% Ejecutado 40,0%

Realizar y aprobar el reglamento de seguridad industrial que se establezca en la obra y velar porque se cumpla permanentemente.

% Programado 40,0%
% Ejecutado 40,0%

NOTA: Las actividades que estan enlazadas con el inicio de obra, no se contemplan en este control de avance, se programaran de acuerdo al cronograma de obra ajustado.



3012
L53

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA

SEPTIEMBRE DE 2014

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

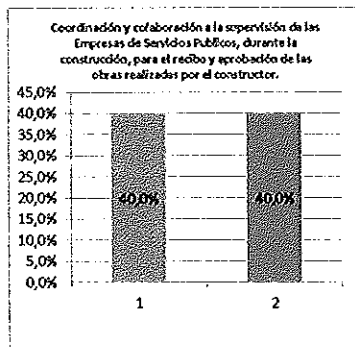
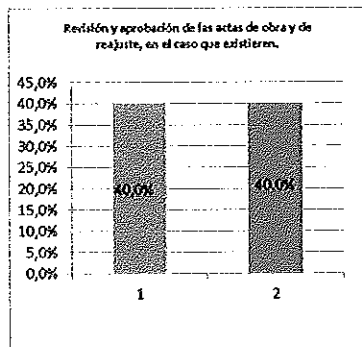


Revisión y aprobación de las actas de obra y de reajuste, en el caso que existieren.

% Programado 40,0%
% Ejecutado 40,0%

Coordinación y colaboración a la supervisión de las Empresas de Servicios Públicos, durante la construcción, para el recibo y aprobación de las obras realizadas por el constructor.

% Programado 40,0%
% Ejecutado 40,0%

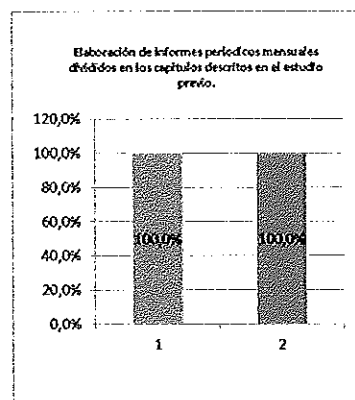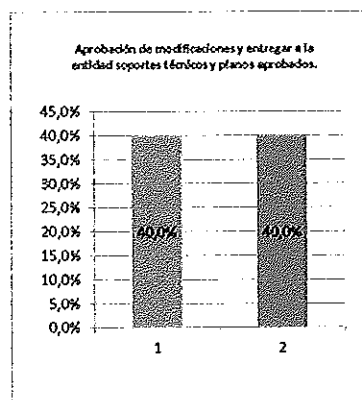

Aprobación de modificaciones y entregar a la entidad soportes técnicos y planos aprobados.



% Programado 40,0%
% Ejecutado 40,0%

Elaboración de informes periódicos mensuales divididos en los capítulos descritos en el estudio previo.

% Programado 100,0%
% Ejecutado 100,0%

NOTA: Las actividades que están enlazadas con el inicio de obra, no se contemplan en este control de avance, se programarán de acuerdo al cronograma de obra ajustado.

3 FUNCIONES AMBIENTALES

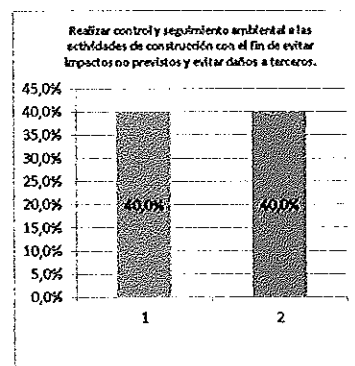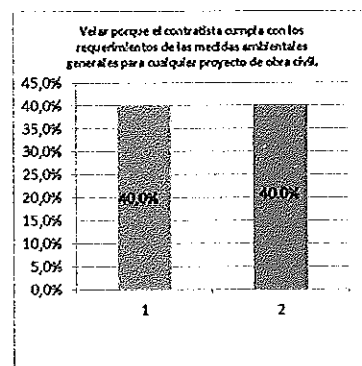

Velar porque el contratista cumpla con los requerimientos de las medidas ambientales generales para cualquier proyecto de obra civil.

% Programado 40,0%
% Ejecutado 40,0%

Realizar control y seguimiento ambiental a las actividades de construcción con el fin de evitar impactos no previstos y evitar daños a terceros.

% Programado 40,0%
% Ejecutado 40,0%



3013
154

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA

SEPTIEMBRE DE 2014

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

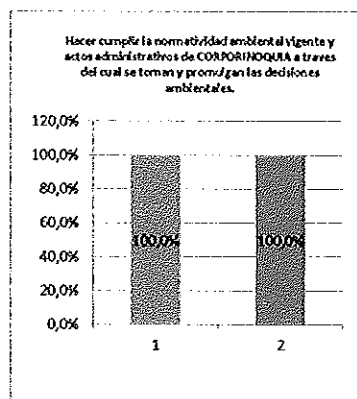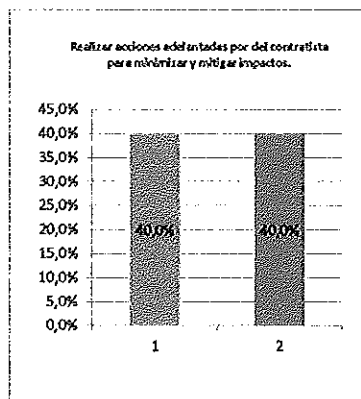



Realizar acciones adelantadas por del contratista para minimizar y mitigar impactos.

% Programado 40,0%
% Ejecutado 40,0%

Elaboración de informes periodicos mensuales divididos en los capitulos descritos en el estudio previo.

% Programado 100,0%
% Ejecutado 100,0%

NOTA: Las actividades que estan enlazadas con el inicio de obra, no se contemplan en este control de avance, se programaran de acuerdo al cronograma de obra ajustado.

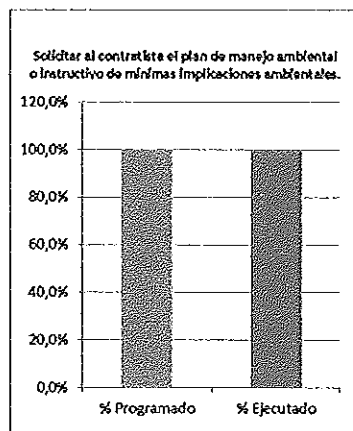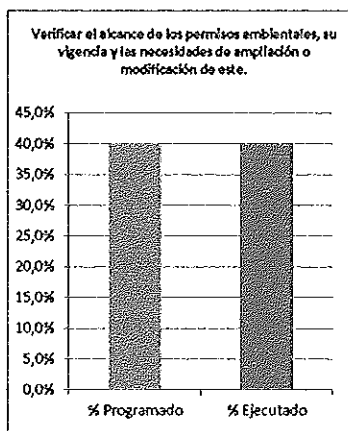

Verificar el alcance de los permisos ambientales, su vigencia y las necesidades de ampliación o modificación de este.


% Programado 40,0%
% Ejecutado 40,0%

Solicitar al contratista el plan de manejo ambiental o instructivo de mínimas implicaciones ambientales.

% Programado 100,0%
% Ejecutado 100,0%

NOTA: Las actividades que estan enlazadas con el inicio de obra, no se contemplan en este control de avance, se programaran de acuerdo al cronograma de obra ajustado.

4 LIQUIDACION DE LA OBRA Y DEL CONTRATO

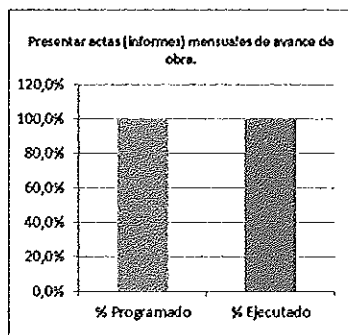

Presentar actas (informes) mensuales de avance de obra.

% Programado 100,0%
% Ejecutado 100,0%

NOTA: Estos informes y arances corresponden hasta el periodo contractual de la interventoria 01 de Agosto de 2013

NOTA: Las actividades que estan enlazadas con el inicio de obra, no se contemplan en este control de avance, se programaran de acuerdo al cronograma de obra ajustado.

3014
JFS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

INTERVENION GOBERNACION	ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSULTOR	CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

7. RELACION PERSONAL CONSULTORIA

PERSONAL PROFESIONAL

Director de interventoria	Director, (Ingeniero civil) profesional universitario Cat. 4	MARTHA YORLENY JIMENEZ ARANGUREN	T.P. 25202-62129
Residente de interventoria	Residente, (Ingeniero civil) profesional universitario Cat. 7	CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES	T.P. 25202-084567

PERSONAL TECNICO

Conductor	ARTURO MORENO PEREZ
-----------	---------------------

3015
L86

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y
CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE
CASANARE.**

INFORME DE CONSULTORIA FINAL	SEPTIEMBRE DE 2014
ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA	
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES	
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303	

9. BALANCE CONTRATO

1. COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL	CUBS	CANT	SUELDO MES	DIAS	TIEMPO MES	DEDICACION	VR. BASICO	F.M.	VR. PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL									
Ingeniero Civil (Categoría 4)	2,31,16	1	4.160.000,00	120,00	5	80,00%	16.640.000,00	2,27	37.772.800,00
Ingeniero Civil (Categoría 7)	2,31,16	1	2.640.000,00	150,00	5	100,00%	13.200.000,00	2,27	29.964.000,00
PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO									
Conductor o motorista	2,32,1	2	840.000,00	120,00	4	100,00%	6.720.000,00	2,27	15.254.400,00
									82.991.200,00

2. COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO	CUBS	UND	VALOR MENSUAL	DIAS	TIEMPO MES	DEDICACION /MES	VR. PARCIAL
TRANSPORTE							
Vehículo > 2000 CC	2,37,2	mes	3.920.150,00	120,00	4	100,00%	31.361.200,00
DOCUMENTO Y PAPELERIA							
Registro fotografico y elaboracion de informes	2,32,2	mes	725.400,00		4	100,00%	2.901.600,00
Ploteo de planos	2,32,2	mes	850.000,00		4	60,00%	2.040.000,00
							36.302.800,00

3. COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS	119.294.000,00
4. IVA 16.00%	19.087.040,00
5. COSTO FINAL (ajustado al Peso)	138.381.040,00

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 138.381.040,00		
VALOR DEL ANTICIPO PAGADO (50%)		\$ 69.190.520,00	
VALOR ACTA FINAL			\$ 138.381.040
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL			
VALOR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN			
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		\$ 69.190.520,00	
VALOR NO EJECUTADO			\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 138.381.040,00	\$ 138.381.040,00	\$ 138.381.040,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 69.190.520,00		

187
3016

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO
VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y
MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISIÓN GOBERNACIÓN	ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSULTOR	CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLE
CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

10. INCONVENIENTES PRESENTADOS

En el desarrollo de la ejecución de las actividades se presentaron los siguientes problemas:

VEREDA AGUALINDA:

El contratista NO cumplió con la ejecución del 100% de la obra de acuerdo con el contrato 020-2011 suscrito entre La Empresa de Servicios Públicos Aguas de Pore y Oscar Javier Acuña, hasta el 01 de Agosto de 2013 tiempo contractual de la interventoría.

El contratista Oscar Javier Acuña no atiende ningún tipo de comunicación.

A continuación se describen las actuaciones de la interventoría cronológicamente informando oportunamente el incumplimiento, hasta el momento en que se venció el contrato de consultoría y no fue prorrogado.

VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA:

El contratista NO cumplió con la ejecución del 100% de la obra de acuerdo con el contrato 021-2011 suscrito entre La Empresa de Servicios Públicos Aguas de Pore y Oscar Javier Acuña hasta el 01 de Agosto de 2013 tiempo contractual de la interventoría.

El contratista Oscar Javier Acuña no atiende ningún tipo de comunicación.

A continuación se describen las actuaciones de la interventoría cronológicamente informando oportunamente el incumplimiento, hasta el momento en que se venció el contrato de consultoría y no fue prorrogado.

158
3017

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

CONTRATO DE OBRA 020 DE 2011

ANTECEDENTES

Diciembre 13 de 2012

Se realiza comité de obra con Aguas de Pore, contratista e interventoría, donde el contratista debe realizar reprogramación de obra, para reiniciar actividades, teniendo en cuenta la solicitud de adicional en plazo solicitada por el contratista, en donde había pasado una programación que no estaba cumpliendo a la fecha de este comité.

Enero 04 de 2013

Se remitió oficio por parte de la interventoría de incumplimiento al contratista, teniendo en cuenta que no cumplió con los compromisos pactados en el comité del 13 de diciembre de 2012, a pesar de que se presentó un nuevo plan de trabajo por parte del contratista de obra, no dio cumplimiento a este, sino que abandono las obras injustificadamente en el mes de Diciembre.

Enero 15 de 2013

Se remite comunicación a la Empresa Aguas de Pore, teniendo en cuenta que el contratista continuo con el abandono de la obra, esta situación se notificó a la Empresa de Aguas de Pore, además se comunicó el incumplimiento del contratista a las citaciones de comité de los días 3 y 10 de Enero de 2013. En esta comunicación se solicita a la Empresa Aguas de Pore, que se haga la respectiva notificación a la aseguradora, para que esta tome las medidas del caso, así como la misma Empresa Aguas de Pore.

Enero 28 de 2013

Se suscribió acta de descargos por el incumplimiento que se viene presentando, donde el contratista no dio soluciones concretas y reales a los incumplimiento que viene presentando, ni mucho menos soluciones; por lo cual la interventoría reitera "que mantiene la posición de incumplimiento y solicita se continúen con los trámites necesarios".

Este mismo día la interventoría realiza entrega de informe al supervisor de Aguas de Pore, para evidenciar el incumplimiento del contratista.

3018
JF9

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

Marzo 13 de 2013

Se realiza una audiencia de seguimiento por el incumplimiento del contrato de obra 020 de 2011. En esta audiencia se entregó a cada uno de los asistentes, un informe del estado actual de los contratos de obra, con base a la información entregada por la interventoría a la Empresa Aguas de Pore; con la finalidad de contextualizar, el avance y constatación de los posibles incumplimientos. ✓

En esta audiencia se dio contestación a los descargos del contratista; donde se reportan por parte de la interventoría los nulos rendimientos en obra y el abandono de los trabajos en el mes de Diciembre de 2012, así como también sustenta las afirmaciones del contratista con respecto a la demora de los pagos y direccionamiento de estos hacia trabajadores y proveedores. ✓

En esta audiencia se le dio como alternativas al contratista que la aseguradora ejecute el contrato o que lo ceda a un tercero y que este asuma la carga de una proposición para el cumplimiento de su obligación. ✓

Marzo 15 de 2013

El 14 de Marzo de 2013, el contratista radica oficio donde expone como alternativa mantener la ejecución de las obras ya que cuenta con un socio capitalista y allega cronograma para dar cumplimiento a las actividades faltantes, en un plazo de 3 meses y 10 días, en este comité se deja claro el seguimiento técnico, administrativo y financiero que se ha venido realizando a las obras, lo que ha permitido evidenciar los atrasos de manera oportuna. ✓

En este comité de acuerdo de acuerdo a valoración jurídica de parte de la Empresa Aguas de Pore, determinan que es una alternativa positiva la terminación del contrato de acuerdo a lo solicitado por el contratista. ✓

Junio 28 de 2013

Se dio ampliación en plazo al contratista por cuatro meses, mediante acta suscrita, por la Doctora Yuliet Gutierrez Novoa, Gerente de Aguas de Pore S.A E.S.P., Oscar Javier Acuña Correa, Contratista de obra, la Interventoría y Boris Andrés Roa Pineda en calidad de supervisor de Aguas de Pore; teniendo en cuenta y que en razón a los requerimientos y compromisos establecidos con el contratista, este venía avanzando en actividades como la instalación de la tubería y mantenimiento del tanque de almacenamiento, actividades que por aspectos climáticos, disminuyeron su rendimiento y no han permitido un avance adecuado de acuerdo a los cronogramas establecidos para estas actividades; de igual manera se afectaron las vías de acceso, lo que dificultó el suministro de materiales para la ejecución de las actividades faltantes. ✓

Sin embargo como consideración final se aclara que el contratista se encuentra en proceso de llamamiento por cumplimiento; razón por la cual de advertirse circunstancias que ameriten el seguimiento del proceso, las mismas serán adelantadas en el estado en que se encuentre el contrato. ✓

3019
160

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

Agosto 20 de 2013

Se suscribió acta de audiencia para la liquidación del contrato 020 de 2011 con Aguas de Pore, Secretaría de Obras de Pore, los jurídicos de las dos entidades, el contratista de obra y la interventoría. En esta audiencia se informó al contratista que teniendo en cuenta la persistencia del incumplimiento, "se liquidaría el contrato en el estado en el que el mismo se encuentra"; y se le realizó requerimientos de la documentación necesaria para realizar este trámite, dándole tres (3) días hábiles para entregarlos y de no cumplirse, la liquidación se adelantará, teniendo en cuenta los soportes con los que cuente la interventoría, la supervisión del Municipio y de la Empresa Aguas de Pore. ✓

Es importante aclarar que para esta fecha la interventoría, ya se encontraba por fuera de plazo contractual, pero a pesar de esto presento los sustentos técnicos, que permitieron generar esta audiencia para liquidación del contrato de obra. ✓

CONCLUSIONES

La existencia de la interventoría en los contratos estatales, obedece al deber que el legislador ha impuesto a las entidades en el numeral 1º del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en el cual se consagran los medios que ellas pueden utilizar para el cumplimiento del objeto contractual y de esta manera lograr los fines de la contratación (...). El actual estatuto de contratación estatal no define el contrato de interventoría ni lo regula directamente, como sí lo hacía el anterior Decreto-Ley 222 de 1983, el cual disponía, en su artículo 120, que la entidad pública contratante debía verificar "la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades de los contratistas por medio de un interventor" que podía ser funcionario suyo o que podía contratar la interventoría con personas naturales o jurídicas especializadas que poseyeran experiencia en la materia y que estuvieran registradas, calificadas y clasificadas como tales.¹ ✓

De acuerdo a los anteriores antecedentes, se evidencian las acciones que ha realizado la interventoría en cuanto a los incumplimientos que presento el contratista de obra, lo que igualmente evidencia el continuo control y seguimiento que se venían realizando a los contratos de obra, lo cual también certifico en varias oportunidades la entidad que suscribió estos contratos, esto además confirma que dicha entidad, tenía pleno conocimiento tanto de las acciones de la interventoría, como de los incumplimientos del contratista de obra, así como de los informes presentados por la interventoría. <

¹ LEY 80 DE 1993 - ARTICULO 14.1 / LEY 80 DE 1993 - ARTICULO 53 / LEY 1474 DE 2011 - ARTICULO 82 / DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTICULO 120 / DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTICULO 121 / DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTICULO 123.

3020
167

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

Así las cosas, esta interventoría realizó y cumplió sus actividades, conforme los preceptos dados en la ley 80 de 1.993, 1150 de 2.007 y de manera muy especial, la obligación contenida en el artículo 1603 del Código Civil, aplicable de manera analógica y expresa al contrato referido ². ✓

Es importante resaltar que si bien es cierto que la interventoría como un contrato íntimamente relacionado en su objeto con el de obra respecto del cual ejerce su actividad el interventor, y como un contrato que a pesar de lo anterior, resulta independiente de éste en aspectos específicos como la prórroga y el incumplimiento, esto es, que la prórroga de la obra no implica de suyo la del interventor y que el incumplimiento del contrato de obra jamás significa por sí solo el incumplimiento del de interventoría. ✓

Además, al suscribir el contrato, el contratista interventor también pone de manifiesto que su suerte no va a depender del contrato de obra sino de razones de oportunidad o conveniencia pública, pero siempre dentro de los límites que sólo pueden variarse en una extensión razonable. ³ ✓

El interventor adelanta, básicamente, una función de verificación y control de la ejecución contractual, pero no le compete introducir modificación alguna en los términos del negocio jurídico sobre el cual recae su función, puesto que esa es materia del resorte exclusivo de las partes del contrato, entidad contratante y contratista. Al respecto, resulta ilustrativo observar cómo en razón de la naturaleza de las funciones que desarrollan, el artículo 53 del código único disciplinario -Ley 734 de 2002- estableció que se hallan sujetos al régimen disciplinario especial contenido en el Libro III de dicha ley, los particulares "que cumplan labores de interventoría en los contratos estatales", disposición que la Corte Constitucional declaró exequible (...) la función del interventor es de intermediación entre la entidad contratante y el contratista, dirigida a cumplir el control y vigilancia de la correcta ejecución de las obligaciones surgidas del contrato y no la de sustituir o reemplazar a la entidad en la toma de las decisiones, quien conserva dicha potestad y la ejerce a través de su propio representante legal, que adelanta las actuaciones que le corresponden en virtud de su posición de parte dentro de la relación negocial. ⁴ ✓

Por otra parte, conforme lo ha sostenido el Honorable Consejo de Estado, el consultor (interventor en este caso), le corresponde asesorar y sugerir acciones preventivas y correctivas en el desarrollo del contrato intervenido, pero las decisiones de fondo (liquidación, imposición de multas, declaratoria de caducidad entre otras), corresponden de manera exclusiva al contratante ⁵. ✓

² Señala la norma referida lo siguiente: "ARTICULO 1603. EJECUCION DE BUENA FE. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella. /

³ Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de marzo de 1996, expediente 8070, C. P. José María Carrillo Ballesteros.

⁴ LEY 80 DE 1993 - ARTICULO 32 / LEY 734 DE 2002 - ARTICULO 53

⁵ Cf. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera Consejero ponente: Danilo Rojas Betancourth. Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil trece (2013). Radicación número: 25000-

207

3021
162

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

Más aún, cuando las entidades que intervienen en la ejecución contractual son entidades públicas, las cuales no son objeto de la imposición de cláusulas excepcionales, a la luz del artículo 14 de la ley 80 de 1.993 ⁶. ✓

Teniendo en cuenta esto es importante resaltar que la interventoría, cumplió cabalmente sus funciones hasta, el cumplimiento de su plazo contractual, y hasta que se encontró vigente su contrato, adicionalmente las decisiones que se tomaron con respecto a la continuidad o no de los contratos de obra fueron expresas de la entidad contratante. ✓

Ahora bien, tanto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, como en la correspondiente modificación realizada por la Ley 1150 de 2007, dispone que los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación y así mismo establece que "También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar", de modo que "En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo". Es decir que la liquidación del contrato corresponde a una etapa posterior a su terminación cuya finalidad es la de establecer el resultado final de la ejecución de las prestaciones a cargo de las partes y determinar el estado económico final de la relación negocial, definiendo en últimas, quién le debe a quién y cuánto. Es en ese momento cuando las partes se ponen de acuerdo respecto de sus mutuas reclamaciones derivadas de la ejecución contractual y es en la liquidación en la que deben incluirse los arreglos, transacciones y conciliaciones a los que lleguen. Por ello, constituye un negocio jurídico que debe ser suscrito en principio de común acuerdo por ellas, a través de sus representantes legales y sólo a falta de tal acuerdo, deberá proceder la entidad a liquidarlo en forma unilateral a través de un acto administrativo y si ésta no la hace, puede acudir ante el juez del contrato, quien deberá definir las prestaciones mutuas entre los contratantes. (...) si el contratista eleva reclamaciones

23-26-000-2001-02118-01(25199). Actor: Sociedad E.L. Profesionales Ltda. Demandado: Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA. En esta providencia manifestó: "De acuerdo con lo expuesto, el interventor adelanta, básicamente, una función de verificación y control de la ejecución contractual, pero no le compete introducir modificación alguna en los términos del negocio jurídico sobre el cual recae su función, puesto que esa es materia del resorte exclusivo de las partes del contrato, entidad contratante y contratista. Es por ello que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, establece que "Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente", que "Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias" y además, que "ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato", es decir que el negocio jurídico sobre el cual ejercerá vigilancia, constituye el marco dentro del cual la misma debe llevarse a cabo"

⁶ Establece el parágrafo de la norma citada: "Parágrafo.- En los contratos que se celebren con personas públicas internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito, donación y arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o industriales de las entidades estatales que no correspondan a las señaladas en el numeral 2o. de este artículo; o que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, así como en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales, se prescindirá de la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales." (Subraya fuera de texto).

208

3022
165

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

durante la ejecución del contrato, existe el mecanismo legal para acceder a tal solicitud en caso de que la entidad la considere pertinente y ajustada a la realidad de la ejecución contractual y no es otro que el de la liquidación del contrato, como lo tiene sentado la jurisprudencia. ✓

(...) dicha acta de recibo final es concebida como un medio de verificación de la ejecución del objeto contractual, para determinar si el mismo se efectuó cabalmente y de acuerdo con las especificaciones pactadas en el contrato, lo que significa que dicha acta constituye un elemento anterior y útil para la liquidación de los contratos, puesto que a través de ella se constata cualitativa y cuantitativamente el cumplimiento de las prestaciones a cargo del contratista como paso previo para efectuar el respectivo corte de cuentas que implica la liquidación del contrato - aunque en algunas ocasiones, las partes de hecho liquidan el contrato en la que denominan acta de recibo final-. ✓

La suscripción por parte del interventor de las distintas actas de recibo -parcial o final- corresponde a una labor de verificación de la ejecución contractual, como requisito indispensable para el reconocimiento de su pago por parte de la entidad. Dado que el interventor es quien efectúa el control directo y permanente de la ejecución de las prestaciones a cargo del contratista, está llamado en primer lugar a realizar la verificación necesaria para el recibo final del objeto contractual. ✓

Para este caso la interventoría no podría realizar actas de terminación, ni de recibo final y mucho menos liquidación de los contratos, dado que el plazo contractual de dichos contratos no había terminado, cuando terminó el contrato de interventoría. Por esta razón el único soporte técnico que puede entregar la interventoría es el informe final, con las respectivas cantidades certificadas por la interventoría, que fueron ejecutadas hasta la fecha en la que esta estuvo vigente. CANTIDADES QUE SIEMPRE ESTUVIERON A DISPOSICIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, ASÍ COMO LOS RESPECTIVOS INFORMES DE AVANCE. ✓

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que el plazo contractual del contrato de obra, no había terminado, y que el 20 de Agosto de 2013, se suscribió acta de audiencia para la liquidación del contrato, de acuerdo a unos plazos establecidos que dio la entidad contratante, el proceso de la continuidad de estos actos administrativos quedaban en potestad de entidad contratante. ✓

Sin embargo la interventoría, realiza las siguientes recomendaciones de las actuaciones que se deben adelantar, para la continuidad del objeto del contrato o de sus procesos sancionatorios, de acuerdo a algunas sentencias del concejo de estado.

3023
1169

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

1. La interventoría contaba con un plazo contractual hasta el 01 de Agosto de 2013, y el contrato de obra el 27 de Octubre de 2013, por lo tanto en este plazo la entidad contratante, tiene la responsabilidad, de dar continuidad con los procesos sancionatorios y para que la entidad contratante pueda asumir la dirección y control de la ejecución del contrato y ejercer la correspondiente potestad sancionatoria, se establece un programa o cronograma de trabajo que contiene una serie de plazos parciales, dentro de los cuales el contratista debe ejecutar el contrato de tracto sucesivo. De manera que el vencimiento del plazo estipulado en el contrato sin que el contratista haya satisfecho sus prestaciones o las haya atendido tardía o defectuosamente, configura ipso iure o de pleno derecho el fenómeno del incumplimiento contractual. En estos casos, opera automáticamente la mora sin necesidad de reconvención o intimación para que el contratista cumpla la prestación; conforme al aforismo romano dies interpellat pro homine previsto en el artículo 1608, ordinal 1º del Código Civil. ✓

En este orden de ideas, debe precisarse que dentro de los plazos para la ejecución del contrato existe uno y con seguridad el de mayor importancia y es aquél que corresponde a la terminación definitiva de la obra, momento en el cual la entidad contratante podrá igualmente, como lo venía haciendo durante la ejecución del contrato, evaluar el cumplimiento del contratista para poderle recibir a satisfacción, puesto que es una exigencia del interés público que el colaborador privado cumpla sus prestaciones conforme al ritmo previsto en el programa y con sujeción a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. En el evento de que el contratista no haya cumplido cabalmente, vale decir, porque entrega la obra inconclusa o se presentan faltantes o se requiere de reparaciones, la entidad contratante podrá hacer valer sus poderes sancionatorios de acuerdo con la magnitud del incumplimiento. ✓

(...)

Es verdad que vencido el plazo del contrato éste se coloca en la etapa de liquidación, pero no resulta razonable sostener que en esta fase la entidad contratante no pueda hacer uso de sus potestades sancionatorias frente al contratista, puesto que vencido el plazo del contrato es cuando la administración puede exigir y evaluar su cumplimiento y de manera especial definir si éste es satisfactorio; es cuando puede apreciar la magnitud de los atrasos en que incurrió el contratista.

Por la tanto la entidad contratante en el plazo en el cual no se contaba ya con interventoría contratada, debe medir los avances realizados por el contratista de obra y evaluar la dimensión del incumplimiento que presento el contratista hasta el vencimiento del plazo del contrato. ✓

165
3024

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

2. En vigencia de la Ley 80 de 1993, la Sala refiriéndose a la competencia temporal de la administración con respecto al ejercicio de sus poderes exorbitantes y concretamente los sancionatorios, en la sentencia del 13 de septiembre de 1999, expediente No. 10.264, precisó hasta cuando puede la administración hacer uso de dichos poderes, de la cual se resaltan los siguientes apartes: La sala retoma y reitera la doctrina sentada en la sentencia de enero 29 de 1988, Exp. 3615, en cuanto rectificó la tesis anterior sobre el término para el ejercicio de las potestades excepcionales en la actividad contractual y sostuvo que la administración podrá declarar el incumplimiento (o la caducidad) después del vencimiento del plazo contractual de ejecución y antes de la liquidación o dentro del acto liquidatorio mismo, pero no después de la expedición de éste".i. ✓

La Sala precisa que la evaluación sobre el cumplimiento del contratista, la aplicación de los correctivos que la administración considere necesarios y las sanciones impuestas, son válidas si se efectúan durante el plazo para el cumplimiento del objeto del contrato y la liquidación del mismo. Practicada la liquidación del contrato o vencido el plazo para hacerlo por mutuo acuerdo o unilateralmente por la administración a falta de aquél dentro de los dos (2) meses siguientes que hoy establece la ley (art. 136 numeral 10 lit.d.) C.C.A.), la administración queda despojada de sus potestades sancionatorias y cualquier incumplimiento que se le impute al contratista debe ser constatado por el juez". ✓

Por la tanto, la entidad contrate tiene la potestad de declarar el incumplimiento al contratista, en armonía con el porcentaje de las obras faltantes, que debe corresponder al porcentaje de incumplimiento. Este porcentaje de obras faltantes las puede determinar de acuerdo a la certificación de cantidades de obras ejecutadas, realizada por la interventoría y a la verificación de actividades y cantidades ejecutadas por el contratista, por parte de la entidad contratante de acuerdo a los avances realizados en el tiempo en el cual ya no se contaba con interventoría contratada. ✓

En conclusión, cuando el contratista no cumple dentro del plazo establecido en el contrato; es precisamente el vencimiento del plazo el que pone en evidencia su incumplimiento y es este el momento en el que la administración debe calificar la responsabilidad que le incumbe al contratista, de manera que si lo fue por motivos únicamente imputables a él que no encuentran justificación, debe sancionar su incumplimiento. ✓

3. "(...) Si la caducidad es facultad que tiene la entidad pública para dar por terminado un contrato por el incumplimiento del contratista, es obvio que si transcurre el término establecido para la ejecución de la obra sin que ella se hubiere terminado, puede la

3025
166

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

entidad pública decretar inmediatamente la caducidad, ya que el no terminar la obra dentro del plazo previsto, bien puede considerarse como el incumplimiento por excelencia por parte del contratista. La caducidad tiene por sí misma sus consecuencias muy importantes, a las cuales no puede renunciar la entidad que en los contratos administrativos goza de ese privilegio. Lo contrario, la no declaración de caducidad, podría llevar a un litigio prolongado y de consecuencias imprevisibles para la administración. Es una obligación declararla en los casos de incumplimiento del contratista. ✓

Vale la pena añadir en este punto que una de las causales de caducidad, como es el incumplimiento del contratista respecto al término de que disponía para la realización de la obra, no puede establecerse sino en el momento mismo en que ese término expiró. Por consiguiente, si bien el contrato no ha terminado por el hecho mismo del incumplimiento del contratista en cuanto al término, la entidad pública lo da por terminado en ejercicio de la facultad que le confiere la cláusula de caducidad". ✓

La nueva regulación le da libertad a la administración para declarar o no la caducidad, es decir, le es facultativo hacerlo, pues ella debe apreciar la gravedad del incumplimiento y deducir del comportamiento del contratista, si podrá llevar a cabo la ejecución del objeto del contrato. Pero si la entidad pública se abstiene de declarar la caducidad en caso de incumplimiento, ordena el párrafo segundo del Artículo 18, que deberá adoptar las medidas de control e intervención necesarias que garanticen la ejecución del objeto contratado. Pero además consagra una previsión importante, en el evento de que se declare la caducidad, pues ello "no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiera lugar",

La caducidad halla definición en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, que reza: " La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenara su liquidación en el estado en que se encuentre".

De la definición del Artículo de la Ley 80 de 1993, se exige la presencia de tres elementos condicionantes para su declaración.

- a. Que haya un incumplimiento de las obligaciones del contratista.
- b. Que ese incumplimiento afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato, y
- c. Que se evidencie que ese incumplimiento y afectación grave del contrato puede conducir a su paralización.

Esa facultad de sancionar está concebida en una forma gradual, de acuerdo a la magnitud del incumplimiento. Por tanto, ante un incumplimiento parcial pero que no impide la ejecución final del contrato, procede la aplicación de multas; pero si el incumplimiento conlleva a la paralización misma del contrato o se deduce que hará imposible la ejecución del mismo, o se tiene certeza que en virtud de ese incumplimiento se causara perjuicios irreparables a la entidad la administración puede declarar la caducidad.ⁱⁱ

La caducidad es considerada por todos los tratadistas como la medida que la Administración solo debe tomar cuando ya es claro que constituye el único medio para sojuzgar la situación anormal que presenta la ejecución del contrato. Y se declara la caducidad cuando ya es claro que el contratista no ejecutara el contrato, pues si a pesar del incumplimiento que viene presentando, con los requerimientos y medidas administrativas que tome la Entidad, el contratista es capaz de ejecutar el contrato, no puede declararse la caducidad.ⁱⁱⁱ

“Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hara acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley.”

4. La interventoría ve viable la culminación de los trabajos en el tiempo que queda de plazo del contrato, ya que falta por instalar 4386 metros de tubería en la vereda Agualinda, de 21229.5 metros contratados; también hace falta la instalaciones eléctricas contratadas y la instalación de una planta de tratamiento; como actividades principales.

Con los recursos existentes se puede dar culminación a la totalidad de la obra; el único ítem que la interventoría considera se debe tener en cuenta una revisión presupuestal es la planta de tratamiento ya que los recursos asignados \$33.382.540 (incluye ensayos de análisis físico químico del agua) está por debajo de los costos del mercado; este ítem se podría modificar ya que en el ítem de transporte mular queda un remanente.

Dado el tiempo de instalación de la tubería es importante realizar las pruebas hidráulicas de presión y de estanqueidad que no se han realizado ya que no ha culminado la totalidad de la instalación.

ⁱ Fallo 10540 de 2000 Consejo de Estado

ⁱⁱ Juan Angel Palacio Hincapie. Obra Citada. Pag. 281 y 282

ⁱⁱⁱ Algunos Apuntes sobre la caducidad de los contratos estatales en el Régimen Jurídico Colombiano. Autor: Felipe Pable Mojica Cortes.

168
3027

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

CONTRATO DE OBRA 021 DE 2011

ANTECEDENTES

Diciembre 13 de 2012

Se realiza comité de obra con Aguas de Pore, contratista e interventoría, donde el contratista debe realizar reprogramación de obra, para reiniciar actividades, teniendo en cuenta la solicitud de adicional en plazo solicitada por el contratista, en donde había pasado una programación que no estaba cumpliendo a la fecha de este comité.

Enero 04 de 2013

Se remitió oficio por parte de la interventoría de incumplimiento al contratista, teniendo en cuenta que no cumplió con los compromisos pactados en el comité del 13 de diciembre de 2012, a pesar de que se presentó un nuevo plan de trabajo por parte del contratista de obra, no dio cumplimiento a este, sino que abandono las obras injustificadamente en el mes de Diciembre.

Enero 15 de 2013

Se remite comunicación a la Empresa Aguas de Pore, teniendo en cuenta que el contratista continuo con el abandono de la obra, esta situación se notificó a la Empresa de Aguas de Pore, además se comunicó el incumplimiento del contratista a las citaciones de comité de los días 3 y 10 de Enero de 2013. En esta comunicación se solicita a la Empresa Aguas de Pore, que se haga la respectiva notificación a la aseguradora, para que esta tome las medidas del caso, así como la misma Empresa Aguas de Pore.

Enero 28 de 2013

Se suscribió acta de descargos por el incumplimiento que se viene presentando, donde el contratista no dio soluciones concretas y reales a los incumplimientos que viene presentando, ni mucho menos soluciones; por lo cual la interventoría reitera "que mantiene la posición de incumplimiento y solicita se continúen con los trámites necesarios".

Este mismo día la interventoría realiza entrega de informe al supervisor de Aguas de Pore, para evidenciar el incumplimiento del contratista:

Marzo 13 de 2013

Se realiza una audiencia de seguimiento por el incumplimiento del contrato de obra 021 de 2011. En esta audiencia se entregó a cada uno de los asistentes, un informe del estado actual de los

3029
16-9

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

contratos de obra, con base a la información entregada por la Interventoría a la Empresa Aguas de Pore; con la finalidad de contextualizar, el avance y constatación de los posibles incumplimientos.

En esta audiencia se dio contestación a los descargos del contratista, donde se reportan por parte de la interventoría los nulos rendimientos en obra y el abandono de los trabajos en el mes de Diciembre de 2012, así como también sustenta las afirmaciones del contratista con respecto a la demora de los pagos y direccionamiento de estos hacia trabajadores y proveedores.

En esta audiencia se le dio como alternativas al contratista que la aseguradora ejecute el contrato o que lo ceda a un tercero y que este asuma la carga de una proposición para el cumplimiento de su obligación.

Marzo 15 de 2013

El 14 de Marzo de 2013, el contratista radica oficio donde expone como alternativa mantener la ejecución de las obras ya que cuenta con un socio capitalista y allega cronograma para dar cumplimiento a las actividades faltantes, en un plazo de 3 meses y 10 días, en este comité se deja claro el seguimiento técnico, administrativo y financiero que se ha venido realizando a las obras, lo que ha permitido evidenciar los atrasos de manera oportuna.

En este comité de acuerdo de acuerdo a valoración jurídica de parte de la Empresa Aguas de Pore, determinan que es una alternativa positiva la terminación del contrato de acuerdo a lo solicitado por el contratista.

Junio 28 de 2013

Se dio ampliación en plazo al contratista por cuatro meses, mediante acta suscrita, por la Doctora Yuliet Gutierrez Novoa, Gerente de Aguas de Pore S.A E.S.P., Oscar Javier Acuña Correa, Contratista de obra, la Interventoría y Boris Andrés Roa Pineda en calidad de supervisor de Aguas de Pore; teniendo en cuenta y que en razón a los requerimientos y compromisos establecidos con el contratista, este venía avanzando en actividades como la construcción del pozo profundo en la vereda Matalarga, y San Isidro, actividades que por aspectos climáticos, disminuyeron su rendimiento y colapsaron las construcciones que se venían avanzando de los pozos profundos; de igual manera se afectaron las vías de acceso, lo que dificultó el suministro de materiales y equipos para la ejecución de las actividades faltantes.

De acuerdo a lo reportado por la interventoría al culminar los dos pozos el contrato de obra llegaría a un 90% aproximadamente, que el contrato a la fecha tiene un 68,6%, que aunque no es un porcentaje optimo, es una muestra que los trabajos han tenido un avance con respecto al corte del 28 de Enero de 2013 y que se pretende continuar, con el fin de llevar a cabo el cumplimiento del objeto contractual.

3029
170

CONSORCIO MATAGUASAN

NIT. 900412456-8

Sin embargo como consideración final se aclara que el contratista se encuentra en proceso de llamamiento por cumplimiento, razón por la cual de advertirse circunstancias que ameriten el seguimiento del proceso, las mismas serán adelantadas en el estado en que se encuentre el contrato.

Agosto 20 de 2013

Se suscribió acta de audiencia para la liquidación del contrato 021 de 2011 con Aguas de Pore, Secretaria de Obras de Pore, los jurídicos de las dos entidades, el contratista de obra y la interventoría. En esta audiencia se informó al contratista que teniendo en cuenta la persistencia del incumplimiento, "se liquidaría el contrato en el estado en el que el mismo se encuentra"; y se le realizó requerimientos de la documentación necesaria para realizar esta trámite, dándole tres (3) días hábiles para entregarlos y de no cumplirse, la liquidación se adelantara, teniendo en cuenta los soportes con los que cuente la interventoría, la supervisión del Municipio y de la Empresa Aguas de Pore.

Es importante aclarar que para esta fecha la interventoría, ya se encontraba por fuera de plazo contractual, pero a pesar de esto presento los sustentos técnicos, que permitieron generar esta audiencia para liquidación del contrato de obra.

CONCLUSIONES

La existencia de la interventoría en los contratos estatales, obedece al deber que el legislador ha impuesto a las entidades en el numeral 1º del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en el cual se consagran los medios que ellas pueden utilizar para el cumplimiento del objeto contractual y de esta manera lograr los fines de la contratación (...) El actual estatuto de contratación estatal no define el contrato de interventoría ni lo regula directamente, como sí lo hacía el anterior Decreto-Ley 222 de 1983, el cual disponía, en su artículo 120, que la entidad pública contratante debía verificar "la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades de los contratistas por medio de un interventor" que podía ser funcionario suyo o que podía contratar la interventoría con personas naturales o jurídicas especializadas que poseyeran experiencia en la materia y que estuvieran registradas, calificadas y clasificadas como tales.¹

De acuerdo a los anteriores antecedentes, se evidencian las acciones que ha realizado la interventoría en cuanto a los incumplimientos que presento el contratista de obra, lo que

¹ LEY 80 DE 1993 - ARTICULO 14.1 / LEY 80 DE 1993 - ARTICULO 53 / LEY 1474 DE 2011 - ARTICULO 82 / DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTICULO 120 / DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTICULO 121 / DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTICULO 123.

3029
170

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

Sin embargo como consideración final se aclara que el contratista se encuentra en proceso de llamamiento por cumplimiento, razón por la cual de advertirse circunstancias que ameriten el seguimiento del proceso, las mismas serán adelantadas en el estado en que se encuentre el contrato.

Agosto 20 de 2013

Se suscribió acta de audiencia para la liquidación del contrato 021 de 2011 con Aguas de Pore, Secretaría de Obras de Pore, los jurídicos de las dos entidades, el contratista de obra y la interventoría. En esta audiencia se informó al contratista que teniendo en cuenta la persistencia del incumplimiento, "se liquidaría el contrato en el estado en el que el mismo se encuentra"; y se le realizó requerimientos de la documentación necesaria para realizar esta trámite, dándole tres (3) días hábiles para entregarlos y de no cumplirse, la liquidación se adelantara, teniendo en cuenta los soportes con los que cuente la interventoría, la supervisión del Municipio y de la Empresa Aguas de Pore.

Es importante aclarar que para esta fecha la interventoría, ya se encontraba por fuera de plazo contractual, pero a pesar de esto presento los sustentos técnicos, que permitieron generar esta audiencia para liquidación del contrato de obra.

CONCLUSIONES

La existencia de la interventoría en los contratos estatales, obedece al deber que el legislador ha impuesto a las entidades en el numeral 1º del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en el cual se consagran los medios que ellas pueden utilizar para el cumplimiento del objeto contractual y de esta manera lograr los fines de la contratación (...) El actual estatuto de contratación estatal no define el contrato de interventoría ni lo regula directamente, como sí lo hacía el anterior Decreto-Ley 222 de 1983, el cual disponía, en su artículo 120, que la entidad pública contratante debía verificar "la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades de los contratistas por medio de un interventor" que podía ser funcionario suyo o que podía contratar la interventoría con personas naturales o jurídicas especializadas que poseyeran experiencia en la materia y que estuvieran registradas, calificadas y clasificadas como tales.¹

De acuerdo a los anteriores antecedentes, se evidencian las acciones que ha realizado la interventoría en cuanto a los incumplimientos que presento el contratista de obra, lo que

¹ LEY 80 DE 1993 - ARTICULO 14.1 / LEY 80 DE 1993 - ARTICULO 53 / LEY 1474 DE 2011 - ARTICULO 82 / DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTICULO 120 / DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTICULO 121 / DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTICULO 123.

177
3030

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

Igualmente evidencia el continuo control y seguimiento que se venían realizando a los contratos de obra, lo cual también certifico en varias oportunidades la entidad que suscribió estos contratos, esto además confirma que dicha entidad, tenía pleno conocimiento tanto de las acciones de la interventoría, como de los incumplimientos del contratista de obra, así como de los Informes presentados por la interventoría.

Así las cosas, esta interventoría realizó y cumplió sus actividades, conforme los preceptos dados en la ley 80 de 1.993, 1150 de 2.007 y de manera muy especial, la obligación contenida en el artículo 1603 del Código Civil, aplicable de manera analógica y expresa al contrato referido ².

Es importante resaltar que si bien es cierto que la interventoría como un contrato íntimamente relacionado en su objeto con el de obra respecto del cual ejerce su actividad el interventor, y como un contrato que a pesar de lo anterior, resulta independiente de éste en aspectos específicos como la prórroga y el incumplimiento, esto es, que la prórroga de la obra no implica de suyo la del interventor y que el incumplimiento del contrato de obra jamás significa por sí solo el incumplimiento del de interventoría.

Además, al suscribir el contrato, el contratista interventor también pone de manifiesto que su suerte no va a depender del contrato de obra sino de razones de oportunidad o conveniencia pública, pero siempre dentro de los límites que sólo pueden variarse en una extensión razonable.”³

El interventor adelanta, básicamente, una función de verificación y control de la ejecución contractual, pero no le compete introducir modificación alguna en los términos del negocio jurídico sobre el cual recae su función, puesto que esa es materia del resorte exclusivo de las partes del contrato, entidad contratante y contratista. Al respecto, resulta ilustrativo observar cómo en razón de la naturaleza de las funciones que desarrollan, el artículo 53 del código único disciplinario –Ley 734 de 2002- estableció que se hallan sujetos al régimen disciplinario especial contenido en el Libro III de dicha ley, los particulares “que cumplan labores de interventoría en los contratos estatales”, disposición que la Corte Constitucional declaró exequible (...) la función del interventor es de intermediación entre la entidad contratante y el contratista, dirigida a cumplir el control y vigilancia de la correcta ejecución de las obligaciones surgidas del contrato y no la de sustituir o reemplazar a la entidad en la toma de las decisiones, quien conserva dicha potestad y la ejerce a través de su propio representante legal, que adelanta las actuaciones que le corresponden en virtud de su posición de parte dentro de la relación negocial.⁴

² Señala la norma referida lo siguiente: “ARTICULO 1603. EJECUCION DE BUENA FE. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella;

³ Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de marzo de 1996, expediente 8070, C. P. José María Carrillo Ballesteros.

⁴ LEY 80 DE 1993 - ARTICULO 32 / LEY 734 DE 2002 - ARTICULO 53

217

3031
H

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

Por otra parte, conforme lo ha sostenido el Honorable Consejo de Estado, el consultor (interventor en este caso), le corresponde asesorar y sugerir acciones preventivas y correctivas en el desarrollo del contrato intervenido, pero las decisiones de fondo (liquidación, imposición de multas, declaratoria de caducidad entre otras), corresponden de manera exclusiva al contratante ⁵.

Más aún, cuando las entidades que intervienen en la ejecución contractual son entidades públicas, las cuales no son objeto de la imposición de cláusulas excepcionales, a la luz del artículo 14 de la ley 80 de 1.993 ⁶.

Teniendo en cuenta esto es importante resaltar que la interventoría, cumplió cabalmente sus funciones hasta, el cumplimiento de su plazo contractual, y hasta que se encontró vigente su contrato, adicionalmente las decisiones que se tomaron con respecto a la continuidad o no de los contratos de obra fueron expresas de la entidad contratante.

Ahora bien, tanto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, como en la correspondiente modificación realizada por la Ley 1150 de 2007, dispone que los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación y así mismo establece que "También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar", de modo que "En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo". Es decir que la liquidación del contrato corresponde a una etapa posterior a su terminación cuya finalidad es la de establecer el resultado final de la ejecución de las prestaciones a cargo de las partes y determinar el estado económico final de la relación negocial, definiendo en últimas, quién le debe a quién y cuánto. Es en ese momento cuando las partes se ponen de acuerdo respecto de sus mutuas reclamaciones

⁵ Cf. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera Consejero ponente: Danilo Rojas Betancourth. Bogotá D.C, veintiocho (28) de febrero de dos mil trece (2013). Radicación número: 25000-23-26-000-2001-02118-01(25199). Actor: Sociedad E.L. Profesionales Ltda. Demandado: Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA. En esta providencia manifestó: "De acuerdo con lo expuesto, el interventor adelanta, básicamente, una función de verificación y control de la ejecución contractual, pero no le compete introducir modificación alguna en los términos del negocio jurídico sobre el cual recae su función, puesto que esa es materia del resorte exclusivo de las partes del contrato, entidad contratante y contratista. Es por ello que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, establece que "Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente", que "Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias" y además, que "ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato", es decir que el negocio jurídico sobre el cual ejercerá vigilancia, constituye el marco dentro del cual la misma debe llevarse a cabo"

⁶ Establece el parágrafo de la norma citada: "Parágrafo.- En los contratos que se celebren con personas públicas internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito, donación y arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o industriales de las entidades estatales que no correspondan a las señaladas en el numeral 2o. de este artículo; o que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, así como en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales, se prescindirá de la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales." (Subraya fuera de texto).

173
3032

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

derivadas de la ejecución contractual y es en la liquidación en la que deben incluirse los arreglos, transacciones y conciliaciones a los que lleguen. Por ello, constituye un negocio jurídico que debe ser suscrito en principio de común acuerdo por ellas, a través de sus representantes legales y sólo a falta de tal acuerdo, deberá proceder la entidad a liquidarlo en forma unilateral a través de un acto administrativo y si ésta no la hace, puede acudir ante el juez del contrato, quien deberá definir las prestaciones mutuas entre los contratantes. (...) si el contratista eleva reclamaciones durante la ejecución del contrato, existe el mecanismo legal para acceder a tal solicitud en caso de que la entidad la considere pertinente y ajustada a la realidad de la ejecución contractual y no es otro que el de la liquidación del contrato, como lo tiene sentado la jurisprudencia.

(...) dicha acta de recibo final es concebida como un medio de verificación de la ejecución del objeto contractual, para determinar si el mismo se efectuó cabalmente y de acuerdo con las especificaciones pactadas en el contrato, lo que significa que dicha acta constituye un elemento anterior y útil para la liquidación de los contratos, puesto que a través de ella se constata cualitativa y cuantitativamente el cumplimiento de las prestaciones a cargo del contratista como paso previo para efectuar el respectivo corte de cuentas que implica la liquidación del contrato - aunque en algunas ocasiones, las partes de hecho liquidan el contrato en la que denominan acta de recibo final-.

La suscripción por parte del interventor de las distintas actas de recibo -parcial o final- corresponde a una labor de verificación de la ejecución contractual, como requisito indispensable para el reconocimiento de su pago por parte de la entidad. Dado que el interventor es quien efectúa el control directo y permanente de la ejecución de las prestaciones a cargo del contratista, está llamado en primer lugar a realizar la verificación necesaria para el recibo final del objeto contractual.

Para este caso la interventoría no podría realizar actas de terminación, ni de recibo final y mucho menos liquidación de los contratos, dado que el plazo contractual de dichos contratos no había terminado, cuando terminó el contrato de interventoría. Por esta razón el único soporte técnico que puede entregar la interventoría es el informe final, con las respectivas cantidades certificadas por la interventoría, que fueron ejecutadas hasta la fecha en la que esta estuvo vigente. Cantidades que siempre estuvieron a disposición de la entidad contratante, así como los respectivos informes de avance.

3033
274

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que el plazo contractual del contrato de obra, no había terminado, y que el 20 de Agosto de 2013, se suscribió acta de audiencia para la liquidación del contrato, de acuerdo a unos plazos establecidos que dio la entidad contratante, el proceso de la continuidad de estos actos administrativos quedaban en potestad de entidad contratante.

Sin embargo la interventoría, realiza las siguientes recomendaciones de las actuaciones que se deben adelantar, para la continuidad del objeto del contrato o de sus procesos sancionatorios, de acuerdo a algunas sentencias del concejo de estado.

1. La Interventoría contaba con un plazo contractual hasta el 01 de Agosto de 2013, y el contrato de obra el 27 de Octubre de 2013, por lo tanto en este plazo la entidad contratante, tiene la responsabilidad, de dar continuidad con los procesos sancionatorios y para que la entidad contratante pueda asumir la dirección y control de la ejecución del contrato y ejercer la correspondiente potestad sancionatoria, se establece un programa o cronograma de trabajo que contiene una serie de plazos parciales, dentro de los cuales el contratista debe ejecutar el contrato de tracto sucesivo. De manera que el vencimiento del plazo estipulado en el contrato sin que el contratista haya satisfecho sus prestaciones o las haya atendido tardía o defectuosamente, configura ipso iure o de pleno derecho el fenómeno del incumplimiento contractual. En estos casos, opera automáticamente la mora sin necesidad de reconvención o intimación para que el contratista cumpla la prestación, conforme al aforismo romano dies interpellat pro homine previsto en el artículo 1608, ordinal 1º del Código Civil.

En este orden de ideas, debe precisarse que dentro de los plazos para la ejecución del contrato existe uno y con seguridad el de mayor importancia y es aquél que corresponde a la terminación definitiva de la obra, momento en el cual la entidad contratante podrá igualmente, como lo venía haciendo durante la ejecución del contrato, evaluar el cumplimiento del contratista para poderle recibir a satisfacción, puesto que es una exigencia del interés público que el colaborador privado cumpla sus prestaciones conforme al ritmo previsto en el programa y con sujeción a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. En el evento de que el contratista no haya cumplido cabalmente, vale decir, porque entrega la obra inconclusa o se presentan faltantes o se requiere de reparaciones, la entidad contratante podrá hacer valer sus poderes sancionatorios de acuerdo con la magnitud del incumplimiento.

(...)

Es verdad que vencido el plazo del contrato éste se coloca en la etapa de liquidación, pero no resulta razonable sostener que en esta fase la entidad contratante no pueda hacer uso

CONSORCIO MATAGUASAN

NIT. 900412456-8

de sus potestades sancionatorias frente al contratista, puesto que vencido el plazo del contrato es cuando la administración puede exigir y evaluar su cumplimiento y de manera especial definir si éste es satisfactorio; es cuando puede apreciar la magnitud de los atrasos en que incurrió el contratista.

Por la tanto la entidad contratante en el plazo en el cual no se contaba ya con interventoría contratada, debe medir los avances realizados por el contratista de obra y evaluar la dimensión del incumplimiento que presento el contratista hasta el vencimiento del plazo del contrato.

2. En vigencia de la Ley 80 de 1993, la Sala refiriéndose a la competencia temporal de la administración con respecto al ejercicio de sus poderes exorbitantes y concretamente los sancionatorios, en la sentencia del 13 de septiembre de 1999, expediente No. 10.264, precisó hasta cuando puede la administración hacer uso de dichos poderes, de la cual se resaltan los siguientes apartes: La sala retoma y reitera la doctrina sentada en la sentencia de enero 29 de 1988, Exp. 3615, en cuanto rectificó la tesis anterior sobre el término para el ejercicio de las potestades excepcionales en la actividad contractual y sostuvo que la administración podrá declarar el incumplimiento (o la caducidad) después del vencimiento del plazo contractual de ejecución y antes de la liquidación o dentro del acto liquidatorio mismo, pero no después de la expedición de éste".i

La Sala precisa que la evaluación sobre el cumplimiento del contratista, la aplicación de los correctivos que la administración considere necesarios y las sanciones impuestas, son válidas si se efectúan durante el plazo para el cumplimiento del objeto del contrato y la liquidación del mismo. Practicada la liquidación del contrato o vencido el plazo para hacerlo por mutuo acuerdo o unilateralmente por la administración a falta de aquél dentro de los dos (2) meses siguientes que hoy establece la ley (art. 136 numeral 10 lit.d.) C.C.A.), la administración queda despojada de sus potestades sancionatorias y cualquier incumplimiento que se le impute al contratista debe ser constatado por el juez".

Por la tanto, la entidad contrate tiene la potestad de declarar el incumplimiento al contratista, en armonía con el porcentaje de las obras faltantes, que debe corresponder al porcentaje de incumplimiento. Este porcentaje de obras faltantes las puede determinar de acuerdo a la certificación de cantidades de obras ejecutadas, realizada por la interventoría y a la verificación de actividades y cantidades ejecutadas por el contratista, por parte de la entidad contratante de acuerdo a los avances realizados en el tiempo en el cual ya no se contaba con interventoría contratada.

En conclusión, cuando el contratista no cumple dentro del plazo establecido en el contrato, es precisamente el vencimiento del plazo el que pone en evidencia su

CONSORCIO MATAGUASAN

NIT. 900412456-8

incumplimiento y es este el momento en el que la administración debe calificar la responsabilidad que le incumbe al contratista, de manera que si lo fue por motivos únicamente imputables a él que no encuentran justificación, debe sancionar su incumplimiento.

3. "(...) Si la caducidad es facultad que tiene la entidad pública para dar por terminado un contrato por el incumplimiento del contratista, es obvio que si transcurre el término establecido para la ejecución de la obra sin que ella se hubiere terminado, puede la entidad pública decretar inmediatamente la caducidad, ya que el no terminar la obra dentro del plazo previsto, bien puede considerarse como el incumplimiento por excelencia por parte del contratista. La caducidad tiene por sí misma sus consecuencias muy importantes, a las cuales no puede renunciar la entidad que en los contratos administrativos goza de ese privilegio. Lo contrario, la no declaración de caducidad, podría llevar a un litigio prolongado y de consecuencias imprevisibles para la administración. Es una obligación declararla en los casos de incumplimiento del contratista.

Vale la pena añadir en este punto que una de las causales de caducidad, como es el incumplimiento del contratista respecto al término de que disponía para la realización de la obra, no puede establecerse sino en el momento mismo en que ese término expiró. Por consiguiente, si bien el contrato no ha terminado por el hecho mismo del incumplimiento del contratista en cuanto al término, la entidad pública lo da por terminado en ejercicio de la facultad que le confiere la cláusula de caducidad".

La nueva regulación le da libertad a la administración para declarar o no la caducidad, es decir, le es facultativo hacerlo, pues ella debe apreciar la gravedad del incumplimiento y deducir del comportamiento del contratista, si podrá llevar a cabo la ejecución del objeto del contrato. Pero si la entidad pública se abstiene de declarar la caducidad en caso de incumplimiento, ordena el párrafo segundo del Artículo 18, que deberá adoptar las medidas de control e intervención necesarias que garanticen la ejecución del objeto contratado. Pero además consagra una previsión importante, en el evento de que se declare la caducidad, pues ello "no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiera lugar",

La caducidad halla definición en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, que reza: " La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su

paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenara su liquidación en el estado en que se encuentre”.

De la definición del Artículo de la Ley 80 de 1993, se exige la presencia de tres elementos condicionantes para su declaración.

- a. Que haya un incumplimiento de las obligaciones del contratista.
- b. Que ese incumplimiento afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato, y
- c. Que se evidencie que ese incumplimiento y afectación grave del contrato puede conducir a su paralización.

Esa facultad de sancionar está concebida en una forma gradual, de acuerdo a la magnitud del incumplimiento. Por tanto, ante un incumplimiento parcial pero que no impide la ejecución final del contrato, procede la aplicación de multas; pero si el incumplimiento conlleva a la paralización misma del contrato o se deduce que hará imposible la ejecución del mismo, o se tiene certeza que en virtud de ese incumplimiento se causara perjuicios irreparables a la entidad la administración puede declarar la caducidad.ⁱⁱ

La caducidad es considerada por todos los tratadistas como la medida que la Administración solo debe tomar cuando ya es claro que constituye el único medio para sojuzgar la situación anormal que presenta la ejecución del contrato. Y se declara la caducidad cuando ya es claro que el contratista no ejecutara el contrato, pues si a pesar del Incumplimiento que viene presentando, con los requerimientos y medidas administrativas que tome la Entidad, el contratista es capaz de ejecutar el contrato, no puede declararse la caducidad.ⁱⁱⁱ

“Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley.”

4. La interventoría ve viable la culminación de los trabajos en el tiempo que queda de plazo del contrato 021 - 2011, ya que falta las plantas de tratamiento, las instalaciones eléctricas y el suministro e instalación de las bombas sumergible como actividades principales. Con los recursos existentes se puede dar culminación a la totalidad de la obra; el único ítem que la interventoría considera se debe tener en cuenta una revisión presupuestal es las plantas de tratamiento ya que los recursos asignados están por debajo de los costos del mercado; este ítem se podría modificar ya que en el ítem de transporte mular queda un remanente. Dado el tiempo de instalación de la tubería es importante realizar las pruebas hidráulicas de presión y de estanqueidad que no se han realizado.

ⁱ Fallo 10540 de 2000 Consejo de Estado

ⁱⁱ Juan Angel Palacio Hincapié. Obra Citada. Pag. 281 y 282

ⁱⁱⁱ Algunos Apuntes sobre la caducidad de los contratos estatales en el Régimen Jurídico Colombiano. Autor: Felipe Pable Mojica Cortes.

3037
1/18

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 01

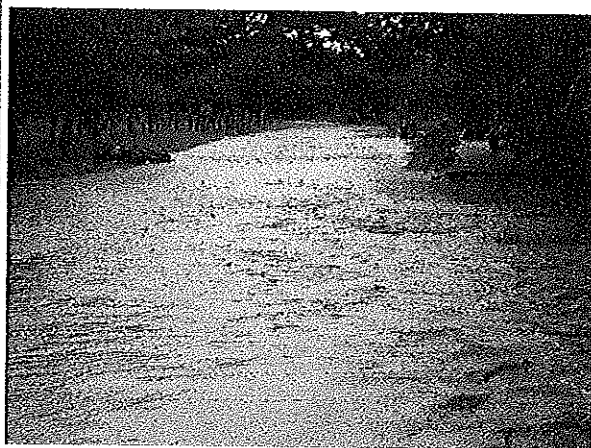


FOTO No. 02



EL ACCESO VEHICULAR A LAS VEREDAS AGUALINDA, MATALRGA Y SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE PORE ES IMPOSIBLE

FOTO No. 03



FOTO No. 04



LA LLEGADA A LA VEREDA SAN ISIDRO SE CONVIRTIÓ EN UN BRAZO DEL ALIMETA, EN LA CUAL ES INVIABLE PASAR EQUIPOS, PERSONAL Y MATERIALES.

299

3038
179

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO


ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARG
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 05



FOTO No. 06

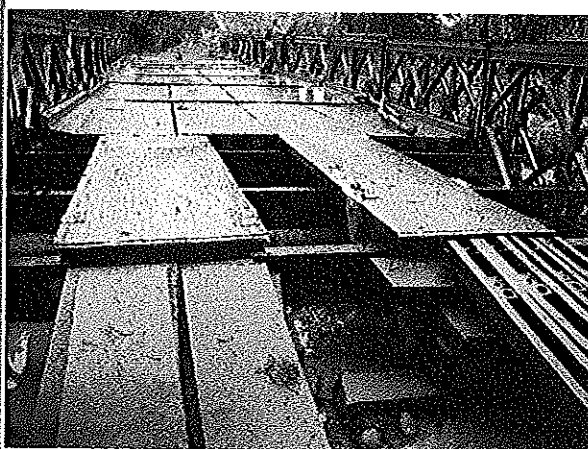

EL CRUCE A LA VEREDA SAN ISIDRO ES INACCESIBLE Y EL PUENTE DE ACCESO A LA VEREDA MATALARGA ESTA EN MAL ESTADO

FOTO No. 07



ACCESO VEREDA AGUALINDA INUNDADO

FOTO No. 08



ACCESO A LA VEREDA MATALARGA INUNDADO

898

225

100
3039

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

**SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO**

**ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303**

II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 09



ENTRADA DEL RIO A LA VIA LO QUE IMPIDE EL ACCESO A LAS VEREDAS AGUALINDA Y MATALARGA

FOTO No. 10



RECORRIDO REALIZADO CON EL GERENTE DE AGUAS DE PORE

FOTO No. 11



ACCESO DEL RIO A LA VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS AGUALINDA Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, ENTRADA POR LA VIA EL BANCO

FOTO No. 12



187
3040

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONITATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

EL REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 13

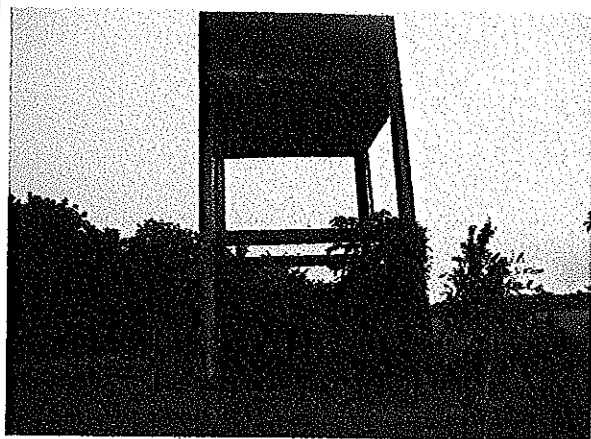


FOTO No. 14




SOCIALIZACION DE UN PROYECTO DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL AS VEREDAS LA CAPILLA, MARAURE, ALTAGRACIA Y SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

FOTO No. 15



TANQUE EXISTENTE VEREDA AGUALINDA

FOTO No. 16

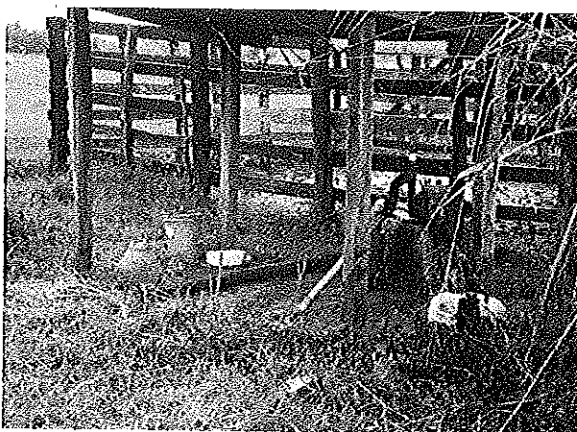

POZO PROFUNDO EXISTENTE VEREDA AGUALINDA

806

227

182
3041

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
COMITATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

EL REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 17

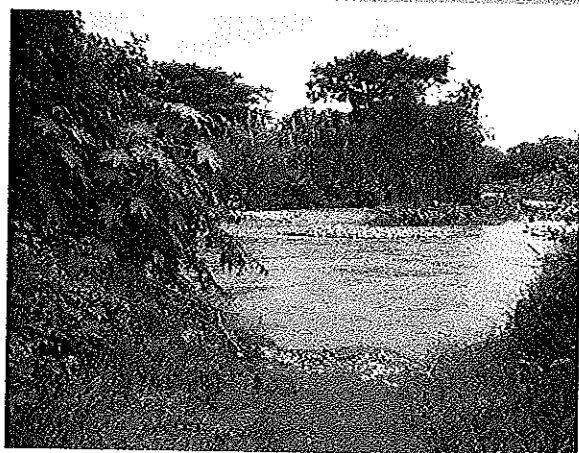


FOTO No. 18



DIFICULTADES DE ACCESO A LAS VEREDAS POR LA OLA INVERNAL

FOTO No. 19



FOTO No. 20



EL ACCESO VEHICULAR ES IMPOSIBLE

205

228

3042
183

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 21



FOTO No. 22




LOS CRUCES DE LOS CAÑOS A LO LARGO DE TODOS LOS TRAYECTOS ESTAN DESBORDADOS

FOTO No. 23



FOTO No. 24

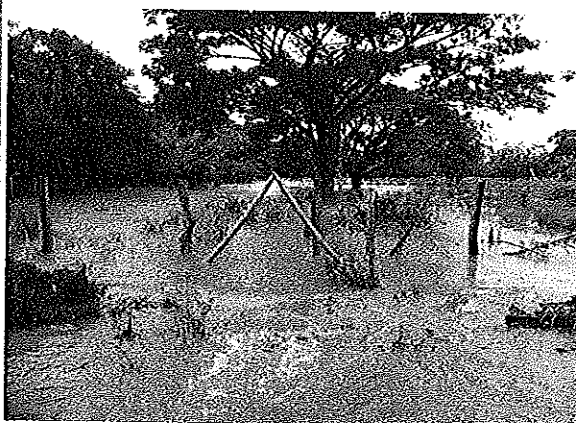

LAS VIAS ESTAN TOTALMENTE INUNDADAS DEBIDO AL DESBORDAMIENTO DE TODOS LOS
CAÑOS PRESENTES EN LA ZONA

604

3043
184

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 25



FOTO No. 26




ACCESOS IMPOSIBLES DEBIDO A LOS FUERTES AGUACEROS DEL FIN DE SEMANA

FOTO No. 27



FOTO No. 28

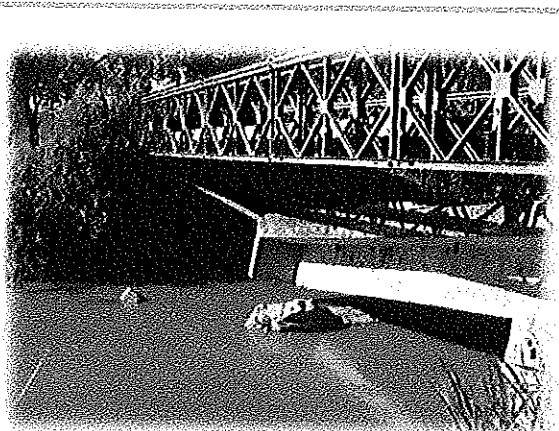

Puente de acceso a la vereda Matalarga averiado por las inclemencias del clima

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 29



FOTO No. 30



No hay acceso vehicular para ningun lado por el aguacero del fin de semana moto ubicada parte alta via

FOTO No. 31



FOTO No. 32



Vehiculos de las compañías a un costado de la via por que no hay acceso

3045
186

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 33

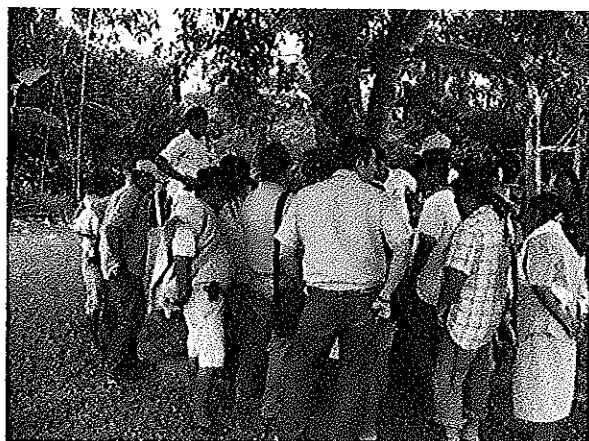


FOTO No. 34




SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD DE LA VEREDA AGUALINDA

FOTO No. 35



FOTO No. 36

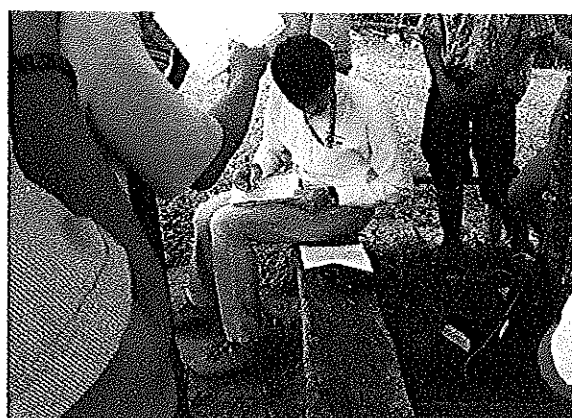

SOCIALIZACIÓN VEREDA AGUALINDA, EN COMPAÑÍA DE SUPERVISORES Y CONTRATISTA

891

232

3046
187

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 37

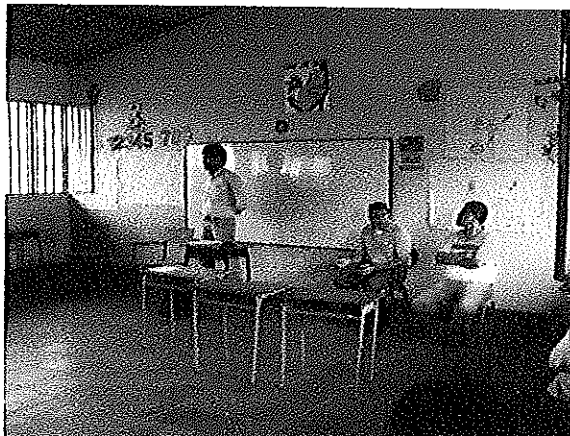


FOTO No. 38



SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD DE LA VEREDA MATALARGA

FOTO No. 39

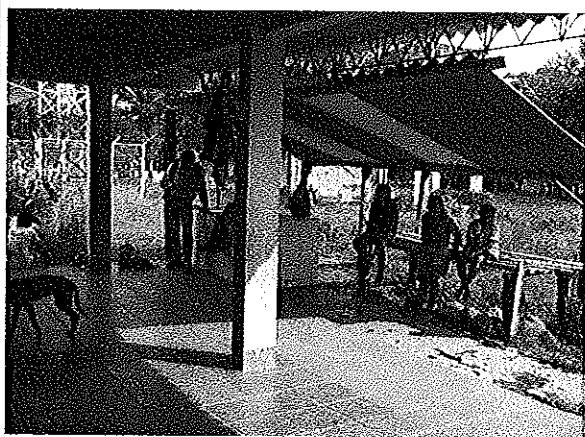


FOTO No. 40



LA SOCIALIZACION SE REALIZO EN LA ESCUELA DE LA VEREDA MATALARGA DONDE QUEDARAN UBICADAS LA
ESTRUCTURA DEL TANQUE, POZO Y PLANTA DE TRATAMIENTO.

880

188
3047

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACIÓN
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

EL REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 41

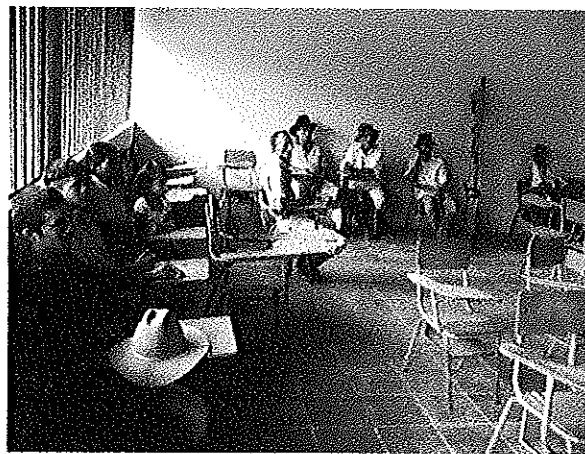


FOTO No. 42



SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD DE LA VEREDA SAN ISIDRO

FOTO No. 43



FOTO No. 44



Hierro construccion tanque Vereda Matalarga.

889

284

189
3048

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 45



Replanteo Tanque vereda Matalarga

FOTO No. 46



Ubicación puntos vereda Matalarga

FOTO No. 47



Excavacion zapatas vereda Matalarga

FOTO No. 48



-688-

190
3049

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 49



Sobre excavacion vereda Matalarga

FOTO No. 50



Ubicación entibado zapatas vereda Matalarga

FOTO No. 51



Colocacion entibado zapatas vereda Matalarga

FOTO No. 52



estabilizacion taludes zapatas vereda Matalarga

887

191
3050

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303


II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 53



armazon columna vereda Matalarga

FOTO No. 54

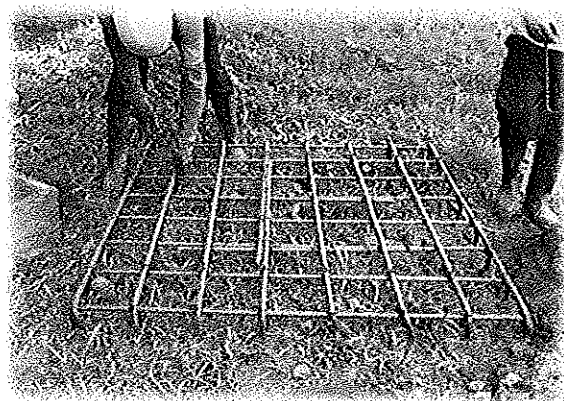


parrilla zapata vereda Matalarga

FOTO No. 55



Fundida pedestales

FOTO No. 56

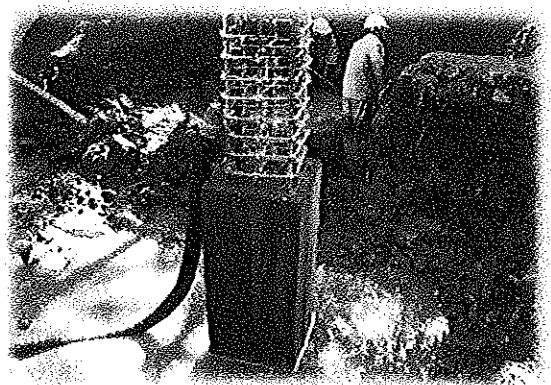

Pedestal vereda Matalarga

182
3051

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL


SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303


II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 57

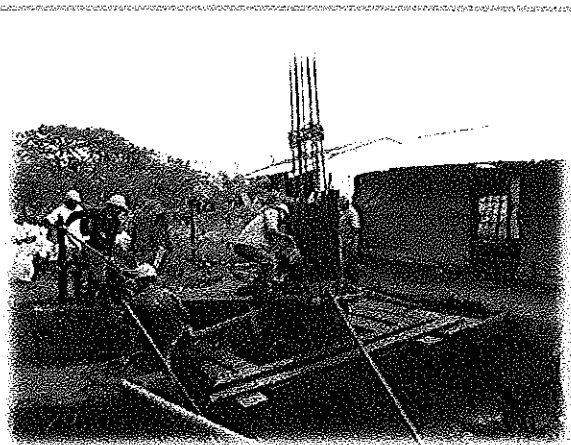

Fundida Pedestales vereda Matalarga

FOTO No. 58

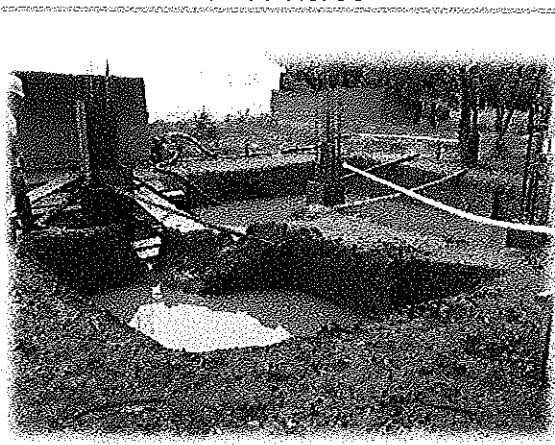

Sobre excavacion, zapatas y pedestales vereda
Matalarga

FOTO No. 59



Excavacion Manual Zapatas Vereda San Isidro

FOTO No. 60



Acopio de material vereda San Isidro

3052
193

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303


II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 61



Relleno con crudo de rio cimentacion y pedestal
vereda Matalarga

FOTO No. 62

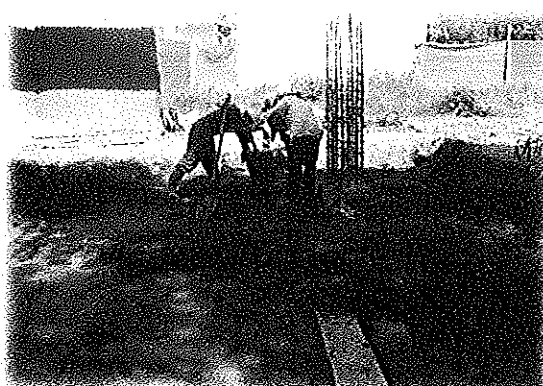

Compactacion por capas vereda Matalarga

FOTO No. 63



Panoramica pedestales y relleno cimentacion
vereda Matalarga

FOTO No. 64



toma cilindros vereda Matalarga

884

239

3053
~~174~~

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL


SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303


EL REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 65

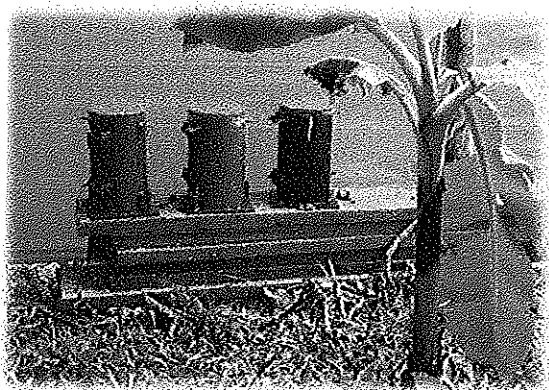


toma cilindros vereda San Isidro

FOTO No. 66

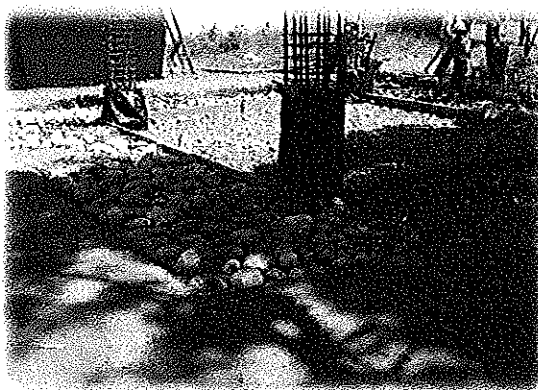


colchon piedra proteccion columnas vereda Matalarga

FOTO No. 67

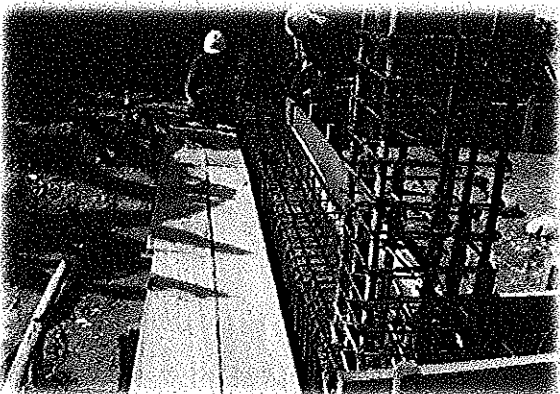

encofrado viga de arrastre vereda San Isidro

FOTO No. 68

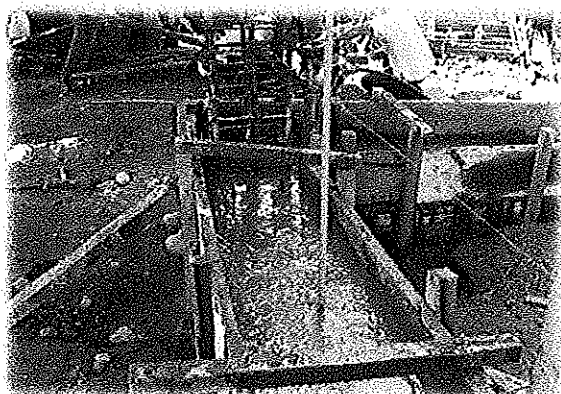

Fundida viga de arrastre vereda San Isidro

~~683~~

240

3054
198

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL


SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303


II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 69

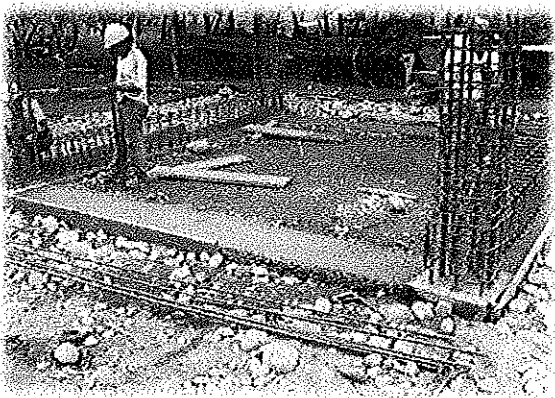

Fundida solado para viga de arrastre vereda
Matalarga

FOTO No. 70

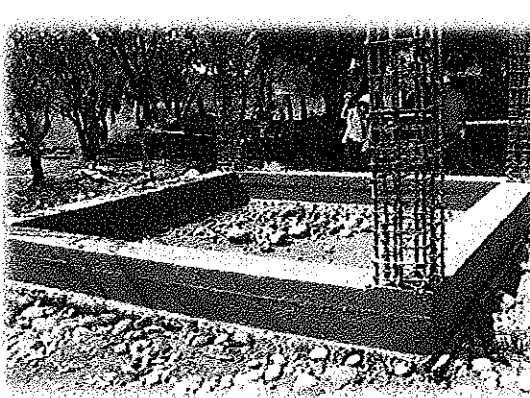

Viga de arrastre vereda Matalarga

FOTO No. 71



Relleno vereda Matalarga

FOTO No. 72



Verificacion de plomado

882

3055
1916

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303


EL REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 73




Fundida Columnas primer nivel vereda San Isidro

FOTO No. 74

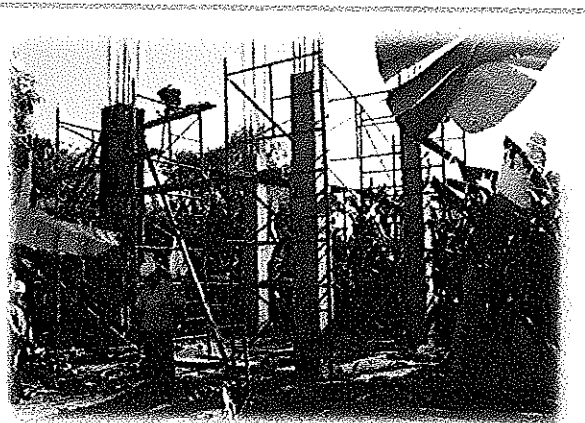

Panoramica columnas vereda San Isidro primer nivel

FOTO No. 75

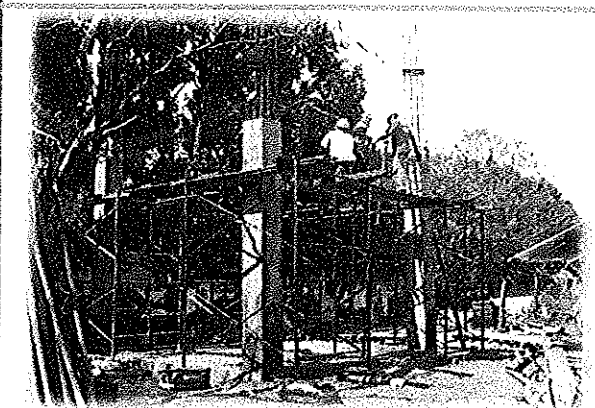

Panoramica columnas primer nivel vereda
Matalarga

FOTO No. 76



Armazon vigas segundo nivel vereda Matalarga

3056
197

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL


SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303


II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 77

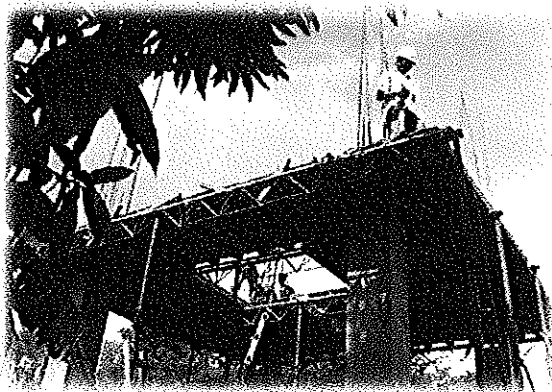

Plataforma segundo nivel vereda San Isidro

FOTO No. 78

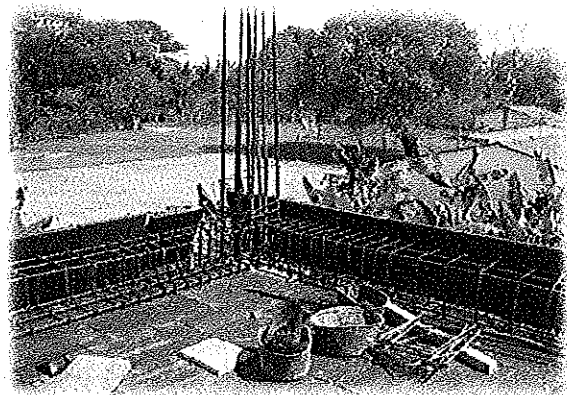

Armazon hierro viga segundo nivel vereda San Isidro

FOTO No. 79



Equipo de perforacion Pozo vereda San Isidro

FOTO No. 80



Fundida viga segundo nivel vereda Matalarga

498
3057

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL


SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

EL REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 81

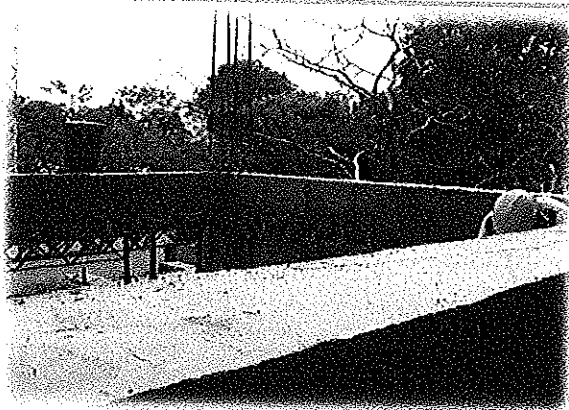


Viga segundo nivel vereda Matalarga

FOTO No. 82



Excavacion Vereda Matalarga

FOTO No. 83

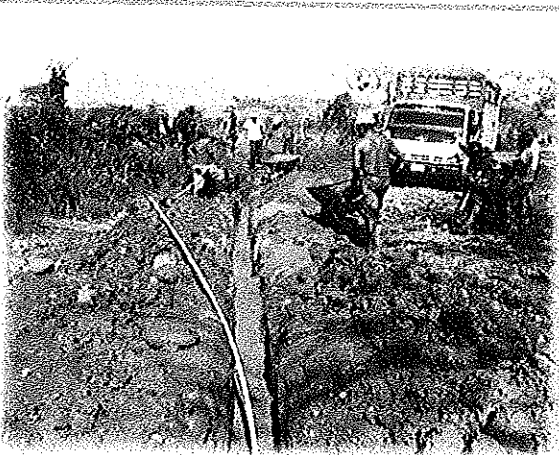

Instalacion tuberia vereda Matalarga

FOTO No. 84



Relleno y medicion vereda Matalarga

~~879~~

3058
~~199~~

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL


SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303


II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 85

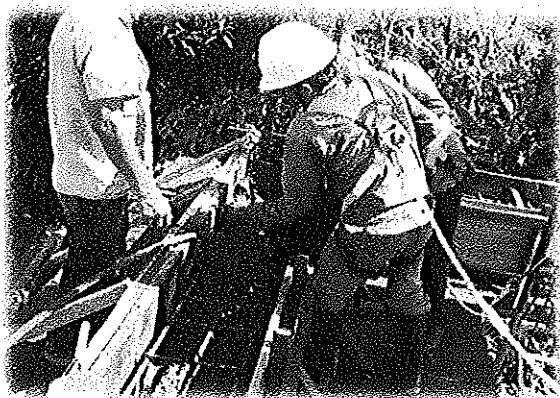


Fundida viga segundo nivel vereda San Isidro

FOTO No. 86

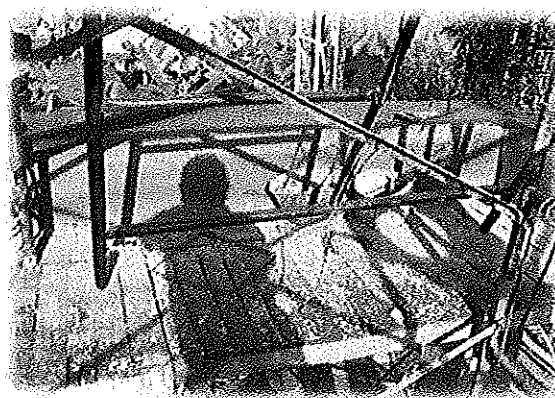

Viga segundo nivel vereda San Isidro

FOTO No. 87

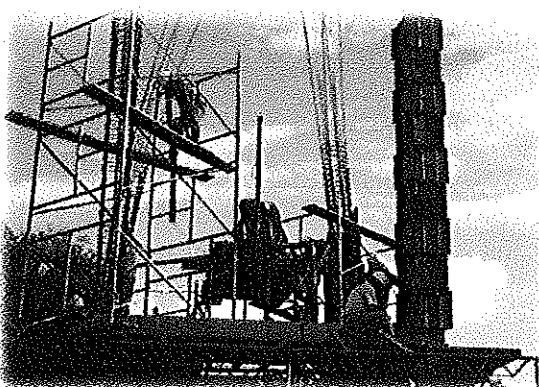

Armazon y encofrado columna segundo nivel
vereda San Isidro

FOTO No. 88



Armazon y encofrado columna segundo nivel
vereda Matalarga

~~3058~~

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 89



Excavacion tuberia vreda Matalarga

FOTO No. 90




Medicion excavacion tuberia vereda Matalarga

FOTO No. 91



verificacion plomo ejes columnas segundo nivel
vereda San Isidro

FOTO No. 92

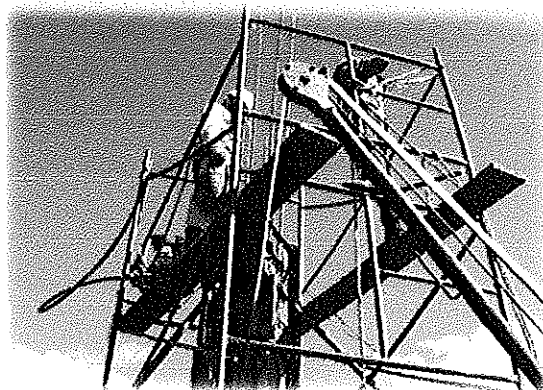

Fundida columnas segundo nivel vereda San
Isidro

3060
201

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL


SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303


II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 93

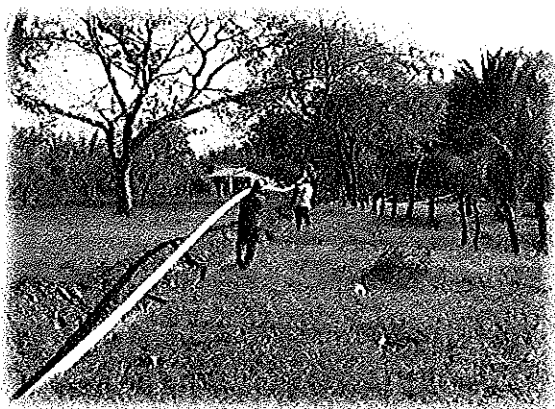

Instalacion de tuberia vereda Matalarga

FOTO No. 94

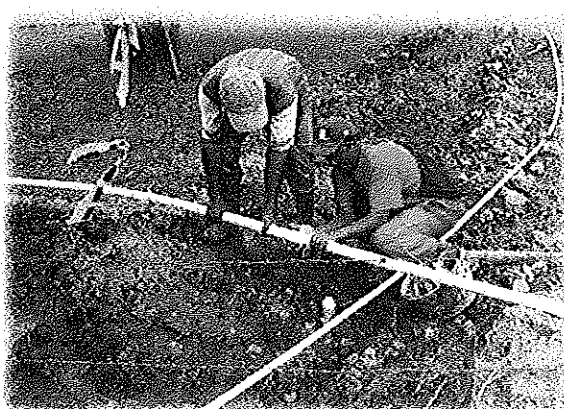


Pegue de tuberia vereda Matalarga

FOTO No. 95



Excavacion Vereda Matalarga

FOTO No. 96

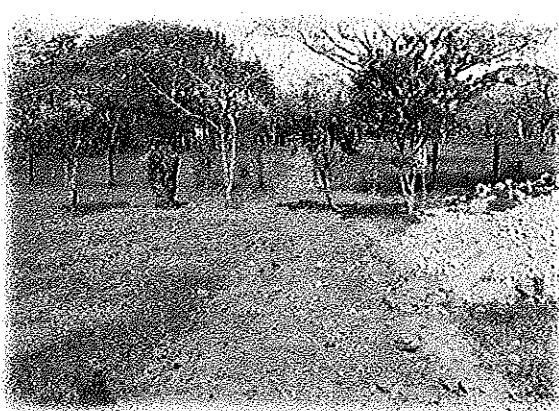

Relleno Vereda Matalarga

876
247

202
3061

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACIÓN
CONSULTOR
CONFIRMATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜ
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

EL REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 97




Armazon columna tercer nivel vereda San Isidro

FOTO No. 98




Fundida viga tercer nivel vereda San Isidro

FOTO No. 99

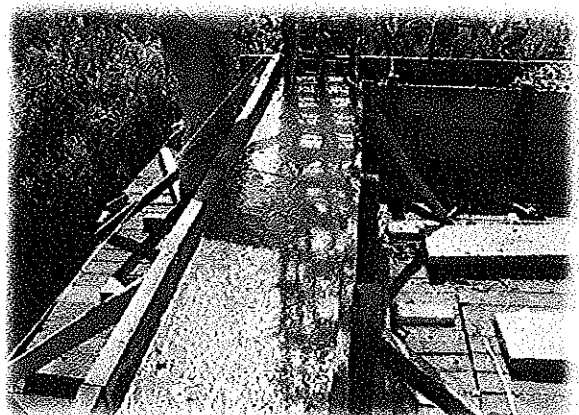

Viga fundida tercer nivel vereda San Isidro

FOTO No. 100

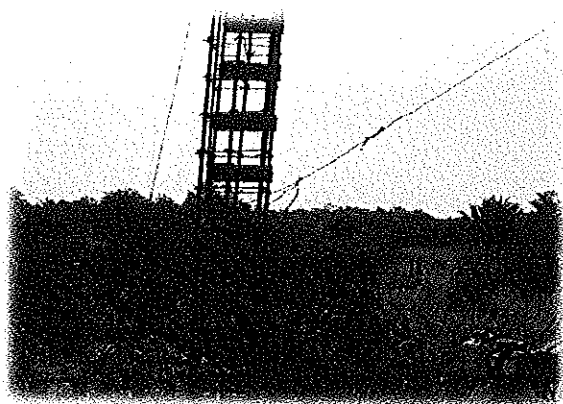

Instalacion anclajes vereda San Isidro

8175
248

3062
703

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL


SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303


II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 101

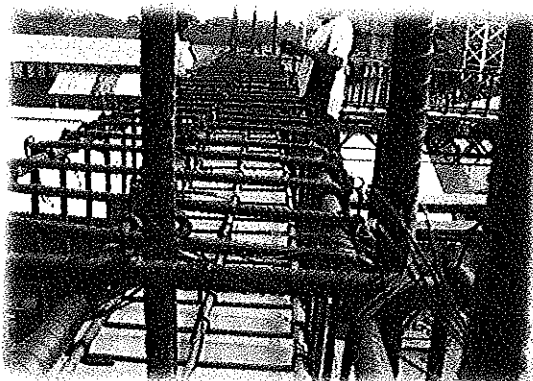

AMARRE REFUERZO VIGAS MATALARGA

FOTO No. 102

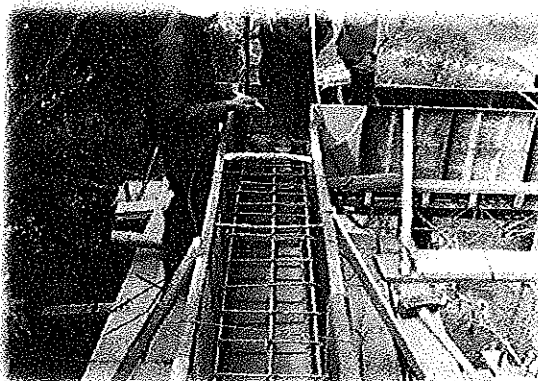


AMARRE REFUERZOS VIGAS SAN ISIDRO

FOTO No. 103



FUNDIDA DE VIGAS MATALARGA

FOTO No. 104

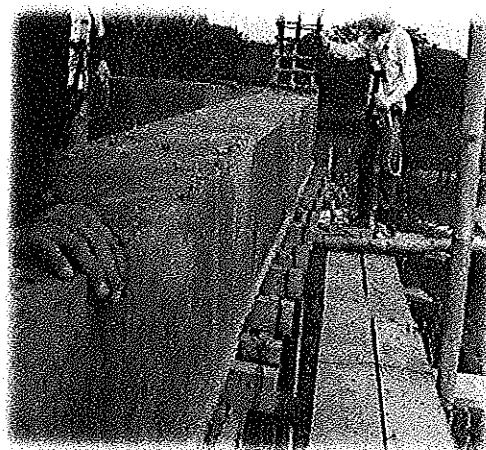

FUNDIDA DE VIGAS MATALARGA

874

3063
294

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL


SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISIÓN GOBERNACIÓN
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303


II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 105

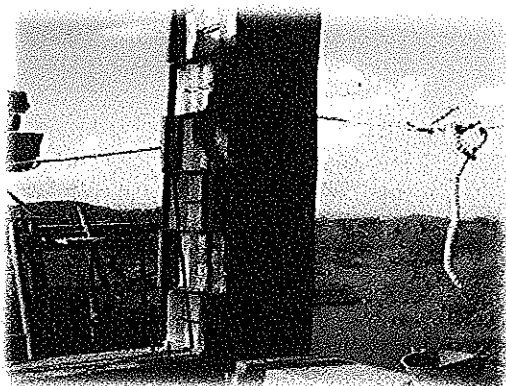

ENCOFRADO COLUMNAS QUINTO NIVEL SAN
ISIDRO

FOTO No. 106

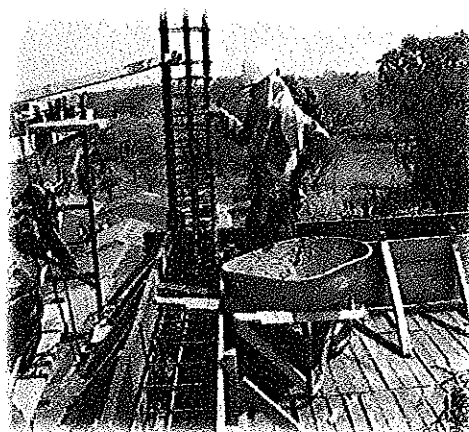


FUNDIDA DE VIGAS SAN ISIDRO

FOTO No. 107



AMARRE REFUERZOS COLUMNAS SAN ISIDRO

FOTO No. 108

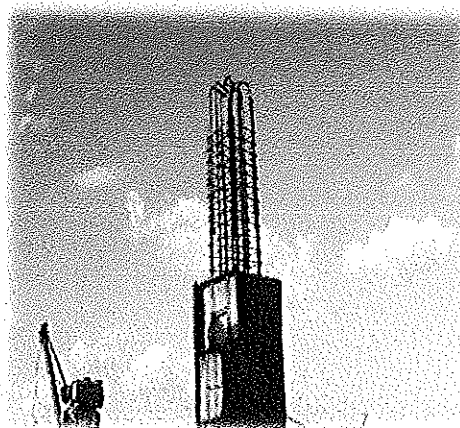

ENCOFRADO COLUMNAS SAN ISIDRO

873

3064
200

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL


SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

EL REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 109

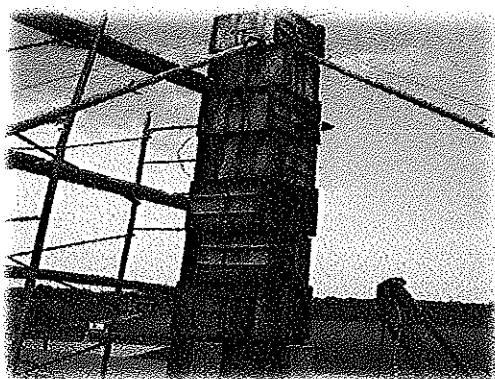

APUNTALAMIENTO, ENCOFRADO DE
COLUMNAS SAN ISIDRO

FOTO No. 110




COLUMNA FUNDIDA SAN ISIDRO

FOTO No. 111



panoramica de armado plataforma soporte
tanque de almacenamiento quinto nivel san isidro

FOTO No. 112

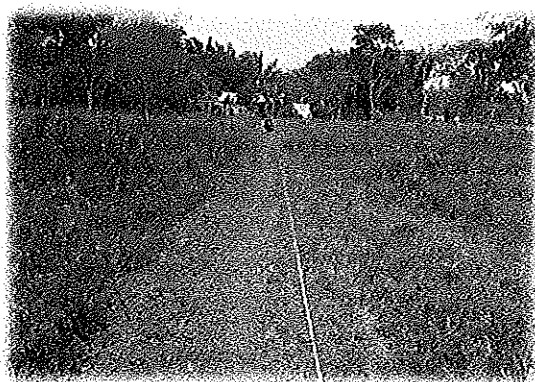

VERIFICACION Y MEDICION DE RELLENOS

872

281

3065
~~206~~

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 113



VERIFICACION ATRAQUES EN ARENA

FOTO No. 114




PEGA DE TUBERIA

FOTO No. 115



RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

FOTO No. 116

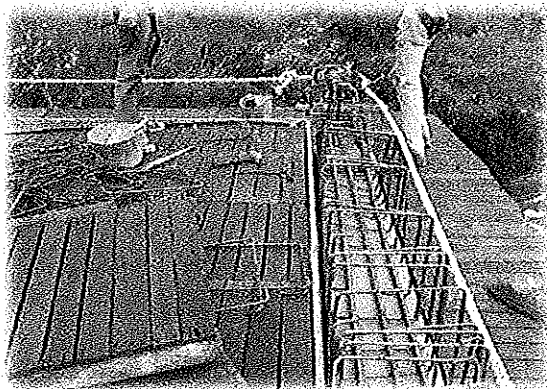

AMARRE DE VIGAS TANQUE ALMACENAMIENTO

~~871~~

207
3066

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 117




DISTRIBUCION DE FLEJES

FOTO No. 118



TRANSPORTE DE ARENA A LOMO DE MULA "SAN ISIDRO"

FOTO No. 119

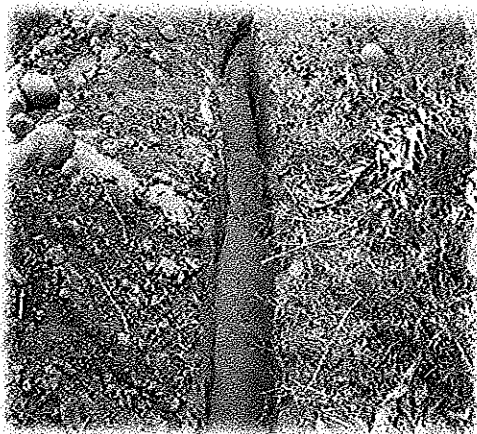

ATRAQUE EN ARENA

FOTO No. 120



RELLENO DE EXCAVACIONES

870

208
3069

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303


EL REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 121



PEGA DE TUBERIA

FOTO No. 122

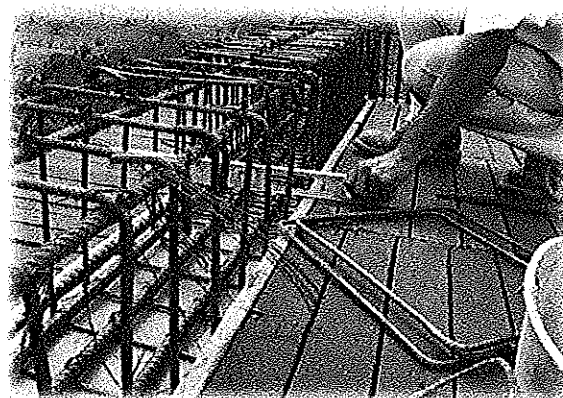


SE TERMINA EL AMARRE DE REFUERZOS DE
VIGAS SECC (0,40*0,50)

FOTO No. 123



ATRAQUES EN ARENA

FOTO No. 124

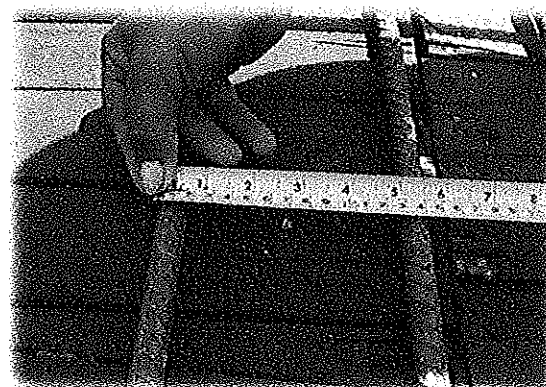

DISTRIBUCION REFUERZOS PARRILLA LOSA DE
FONDO

869

3068
209

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 125




AMARRE REFUERZOS 5/8" PARRILLA LOSA DE FONDO

FOTO No. 126



VERIFICACION DE REFUERZOS LOSA DE FONDO
(SAN ISIDRO)

FOTO No. 127

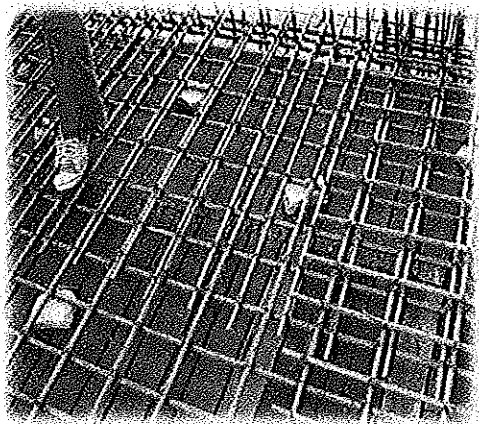

AMARRE REFUERZOS LOSA DE FONDO (SAN
ISIDRO)

FOTO No. 128



PANORAMICA REFUERZOS TANQUE DE
ALMACENAMIENTO (SAN ISIDRO)

668

3069
-210

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL


SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303


II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 129

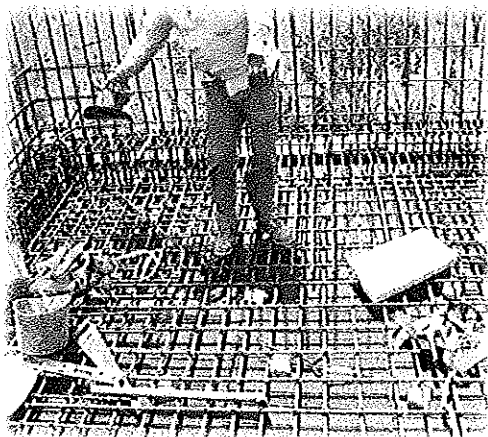

AMARRE REFUERZOS TANQUE DE
ALMACENAMIENTO (SAN ISIDRO)

FOTO No. 130

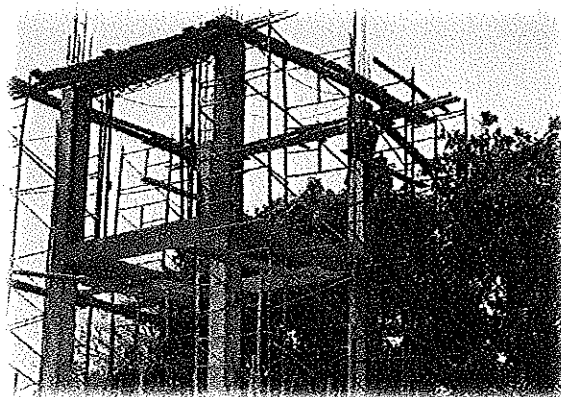


PANORAMICA COLUMNAS CUARTO NIVEL
FUNDIDAS (MATALARGA)

FOTO No. 131



AMARRE REFUERZOS VIGAS CUARTO NIVEL
(MATALARGA)

FOTO No. 132

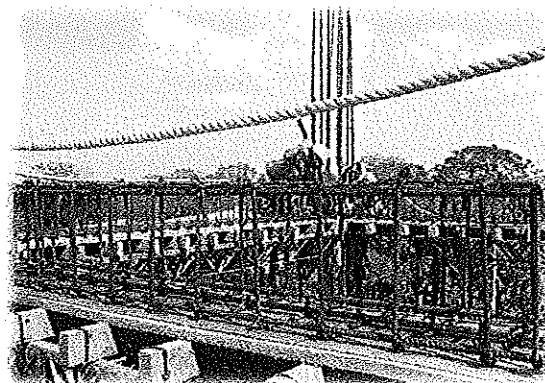

PANORAMICA COLUMNAS CUARTO NIVEL
(MATALARGA)

887

Do

24/8070

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL


SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

EL REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 133

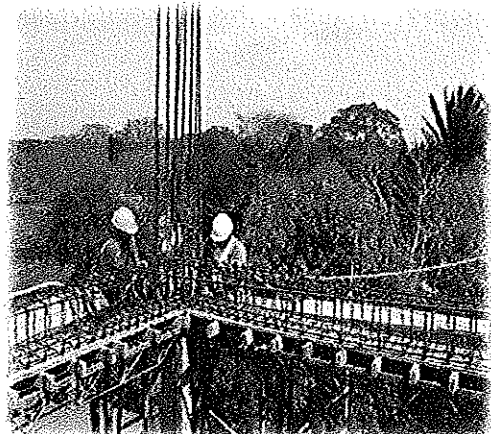


RE REFUERZOS COLUMNAS QUINTO NIVEL (MATA

FOTO No. 134



AMARRE REFUERZOS MURO TANQUE
ALMACENAMIENTO (SAN ISIDRO)

FOTO No. 135

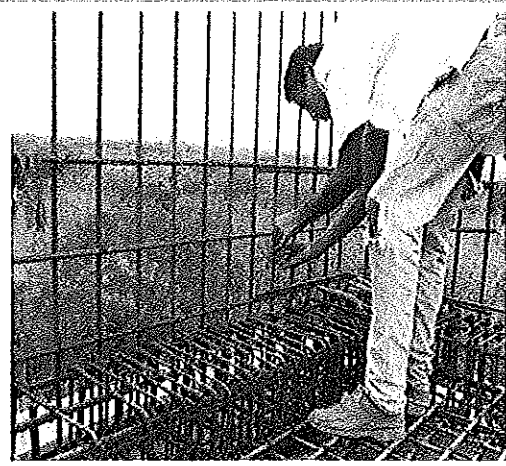

AMARRE REFUERZOS (SAN ISIDRO)

FOTO No. 136



RECTIFICACION EXCAVACIONES (SAN ISIDRO)

868

257

3071
212

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

EL REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 137



INSTALACION CODO (SAN ISIDRO)

FOTO No. 138



EXCAVACIONES RED DE DISTRIBUCION
(MATALARGA)

FOTO No. 139



EXCAVACIONES RED DE DISTRIBUCION
(MATALARGA)

FOTO No. 140



DISTRIBUCION DE TUBERIA PARA LA RED DE
DISTRIBUCION (MATALARGA)

865

258

3092
213

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303


II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 141




CARGUE DE TUBERIA PARA LA RED DE DISTRIBUCION (MATALARGA)

FOTO No. 142

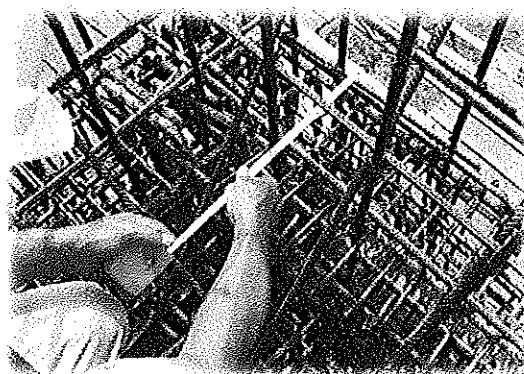


VERIFICACION DISTRIBUCION AMARRE REFUERZOS (SAN ISIDRO)

FOTO No. 143

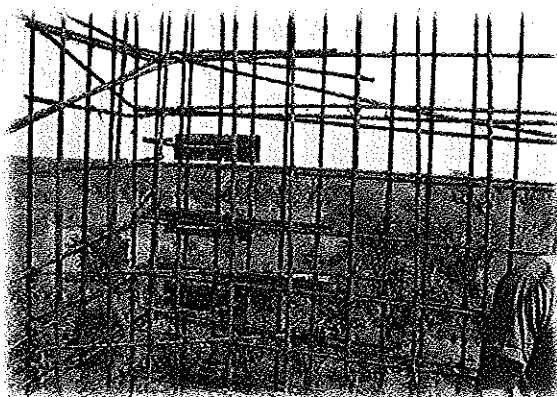

AMARRE PLATINAS DE LA ESCALERA (SAN ISIDRO)

FOTO No. 144

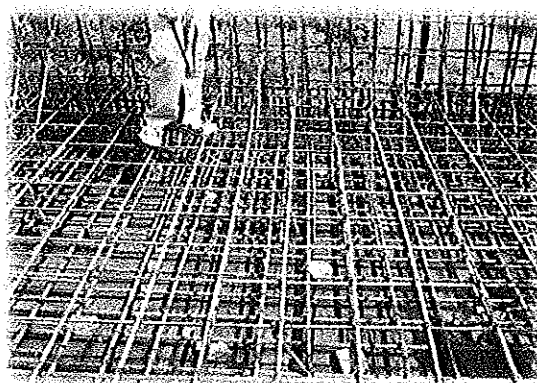

REFUERZOS LOSA DE FONDO (SAN ISIDRO)

884

3073
21/7

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL


SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

EL REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 145

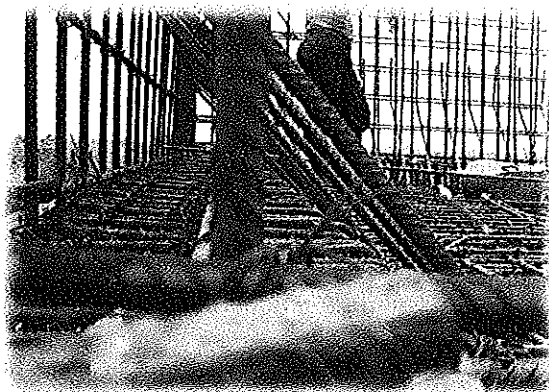

REFUERZOS LOSA DE FONDO (SAN ISIDRO)

FOTO No. 146




EXCAVACIONES RED DE DISTRIBUCION
(MATALARGA)

FOTO No. 147



VERIFICACION SECCION EXCAVACION
(MATALARGA)

FOTO No. 148

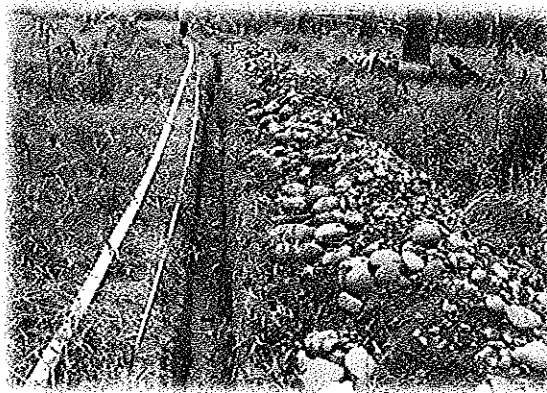

EXCAVACION EN CONGLOMERADO
(MATALARGA)

843

3074
215

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

EL REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 149



MEDICION DE LA RED DE DISTRIBUCION
INSTALADA (MATALARGA)

FOTO No. 150




INSTALACION DE COLLARINES (SAN ISIDRO)

FOTO No. 151



INSTALACION SEMICURVA (SAN ISIDRO)

FOTO No. 152

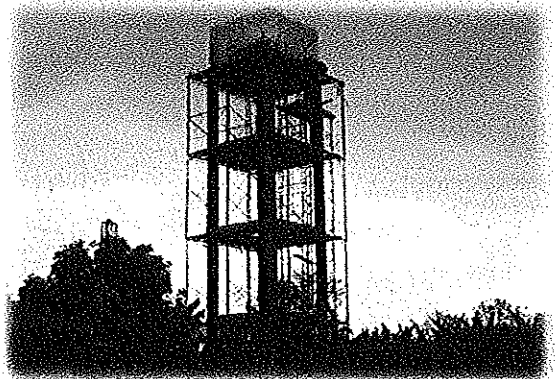

PANORAMICA EXSTRUCTURA TANQUE (SAN
ISIDRO)

262

261

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 153




REFUERZOS TANQUE ALMACENAMIENTO (SAN ISIDRO)

FOTO No. 154



RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL SUPERVISOR
ING. ABEL (MATALARGA)
REVISION ESTRUCTURA

FOTO No. 155

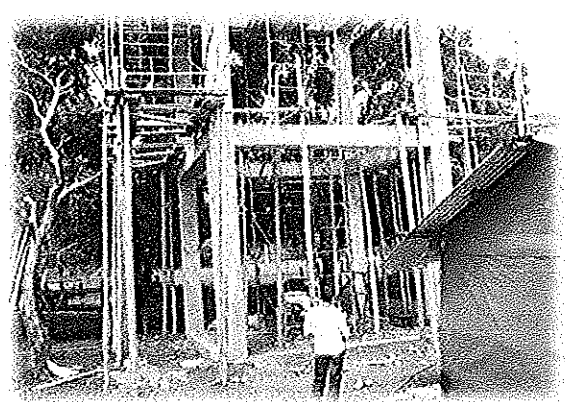

ESTRUCTURA RECHAZADA MATALARGA

FOTO No. 156



EXCAVACIONES ABIERTAS (MATALARGA)

3076
247

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL


SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303


II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 157

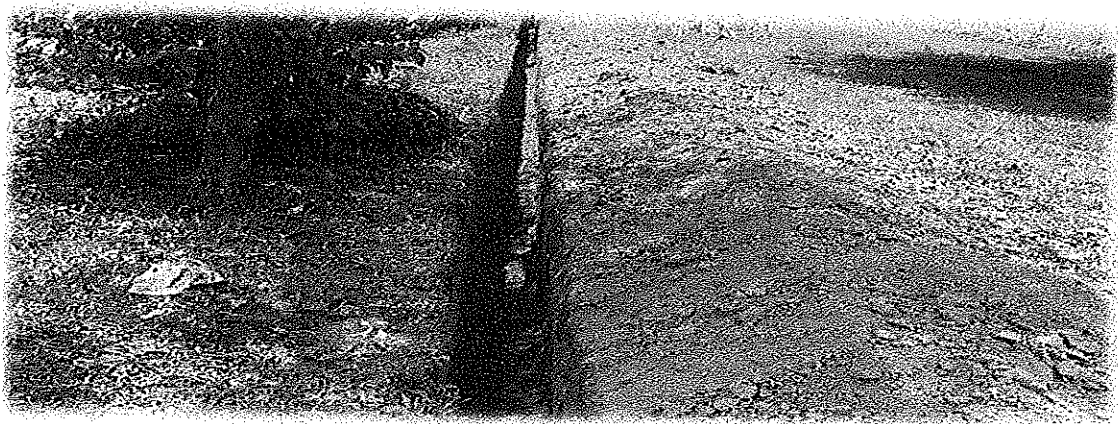


EXCAVACIONES ABIERTAS (MATALARGA)

FOTO No. 158

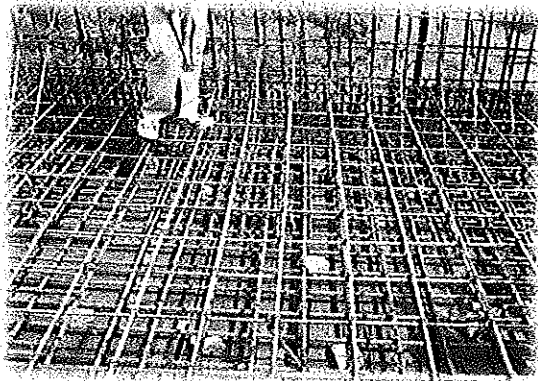

REFUERZOS LOSA DE FONDO (SAN ISIDRO)

FOTO No. 159

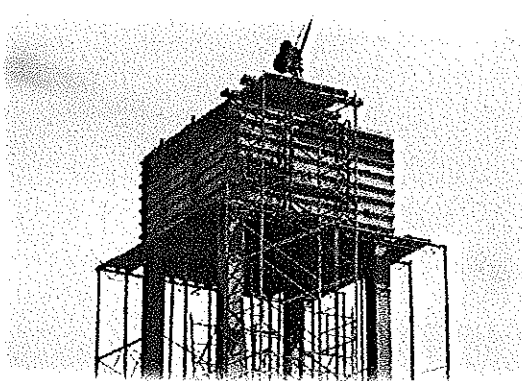

ENCOFRADO PARA FUNDIDA DE MUROS

880

263

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303


EL REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 160




FUNDIDA DE MUROS EN CONCRETO 3000 PSI
IMPERMEABILIZADO

FOTO No. 161

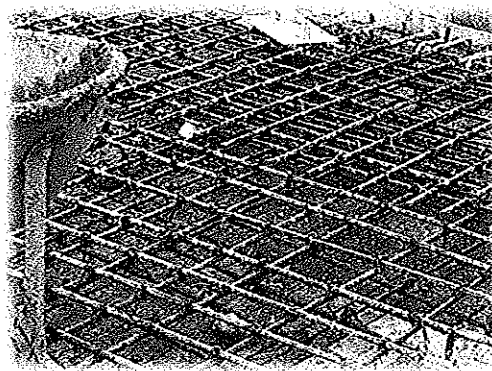

ARMADA DE HIERRO LOSA SUPERIOR TANQUE
ELEVADO

FOTO No. 162

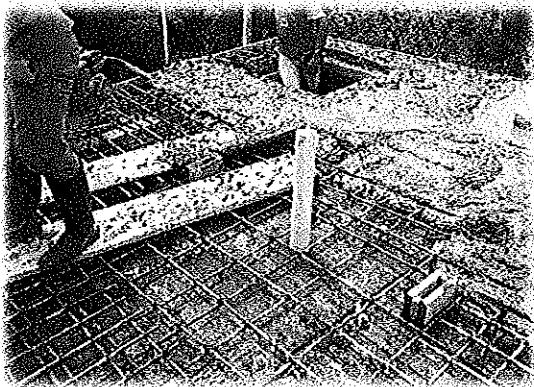

FUNDIDA PLACA SUPERIOR TANQUE SAN ISIDRO

FOTO No. 163



LOSA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL


SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303


II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 164

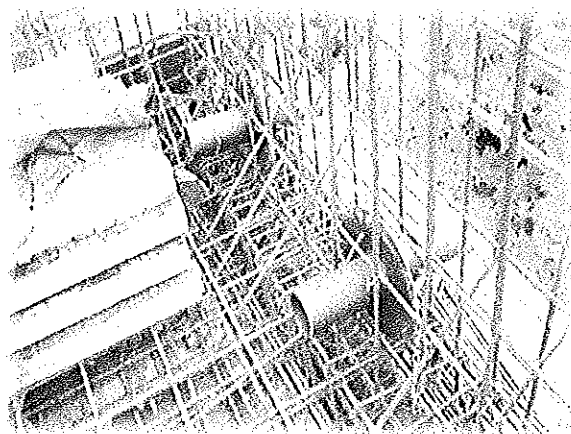

INSTALACION DE PASAMUROS

FOTO No. 165

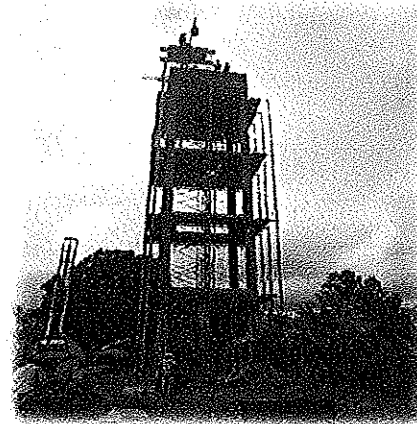

VISTA GENERAL DEL TANQUE EN LA FUNDIDA
DE MUROS

FOTO No. 166



INSTALACION DE TUBERIA

FOTO No. 167



VERIFICACION Y MEDICIONES DE LA
INSTALACION DE LA TUBERIA

228
3079

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014


SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

EL REGISTRO FOTOGRAFICO


PROYECTO VEREDA MATALARGA

FOTO No. 168

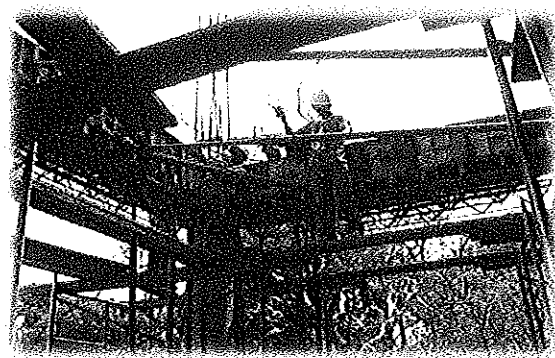


ENCOFRADO PARA FUNDIDA DE LA VIGA DE
AMARRE (CUARTO NIVEL)

FOTO No. 169

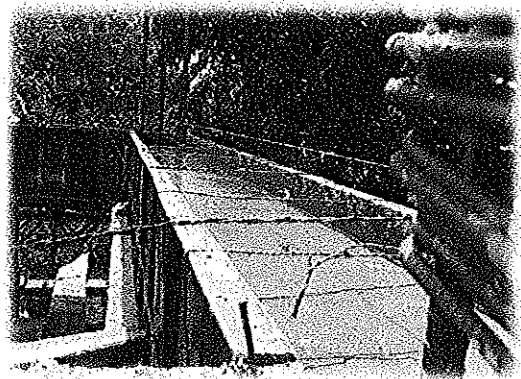

FUNDIDA DE LA VIGA DE AMARRE DEL CUATO
NIVEL

FOTO No. 170

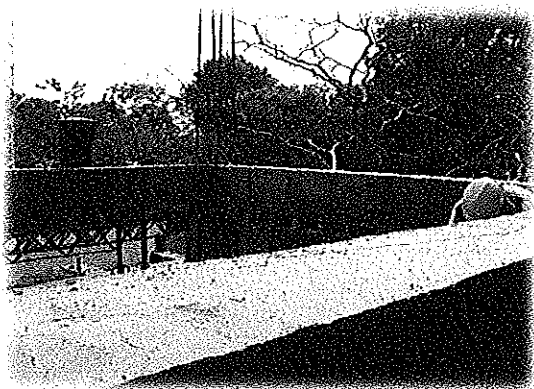

VIGA DE AMARRE CUARTO NIVEL FUNDIDA

FOTO No. 171



EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIA

257

266

227
3080

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONFIRMATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303


II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 172



INSTALACION DE TUBERIA

FOTO No. 173

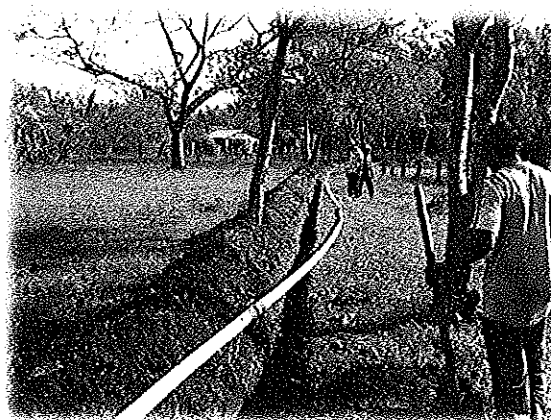

INSTALACION DE TUBERIA

FOTO No. 174



INSTALACION CAMA DE ARENA PARA LA
TUBERIA

FOTO No. 175



RELLENOS DE LA EXCAVACION

856

267

3081
222

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 176



MEDICIONES REALIZADAS DE LA TUBERIA
INSTALADA

FOTO No. 177



VERIFICACION DE MEDICIONES DE TUBERIA
INSTALADA

PROYECTO VEREDA AGUALINDA

FOTO No. 178



LLEGADA DE LA TUBERIA A LA OBRA

FOTO No. 179



TUBERIA PARA LA INSTALACION DE REDES DE
DISTRIBUCION Y DOMICILIARIAS

855

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303


II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 180




ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE LA
TUBERIA

FOTO No. 181

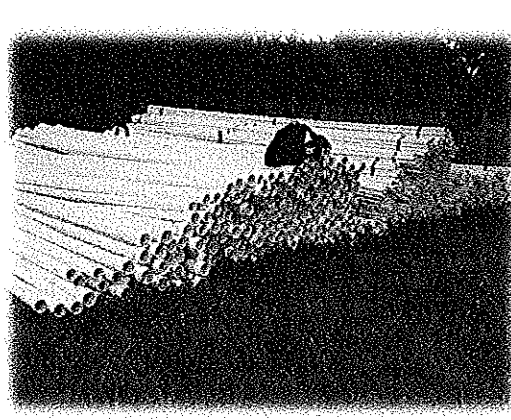


TUBERIA PARA INSTALAR

FOTO No. 182

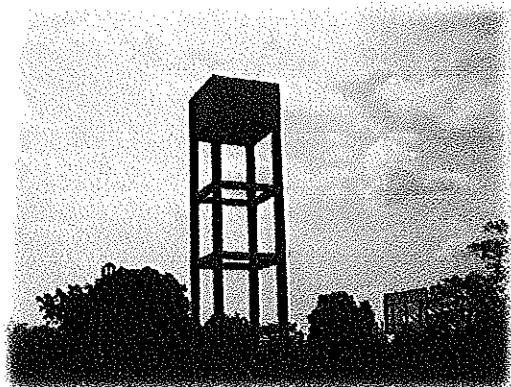

VISTA FINAL DEL TANQUE ELEVADO

FOTO No. 183



TANQUE ELEVADO CONSTRUIDO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 184



INSTALACION DE TUBERIA

FOTO No. 185



INSTALACION DE TUBERIA

FOTO No. 186



INSTALACION DE TUBERIA

FOTO No. 187



INSTALACION DE TUBERIA

3084
225

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 188




INSTALACION DE TUBERIA

FOTO No. 189



INSTALACION DE LA TUBERIA

FOTO No. 190

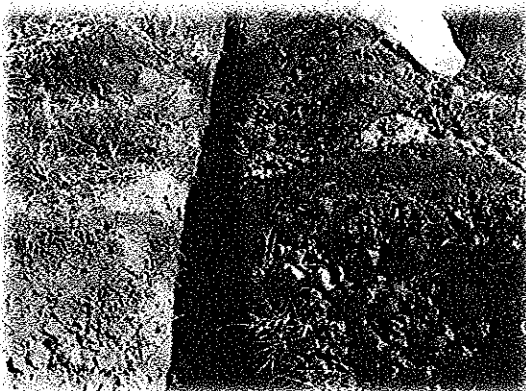

INSTALACION DE TUBERIA

FOTO No. 191



INSTALACION DE TUBERIA

852

221

3085
226

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014


SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

EL REGISTRO FOTOGRAFICO


PROYECTO VEREDA MATALARGA

FOTO No. 192

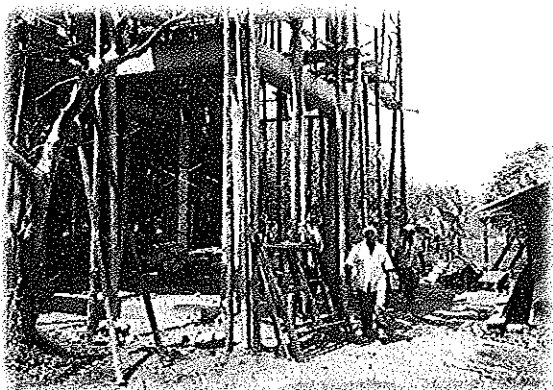

ESTRUCTURA DE SOPORTE NO AUTORIZADA
POR INTERVENTORIA

FOTO No. 193

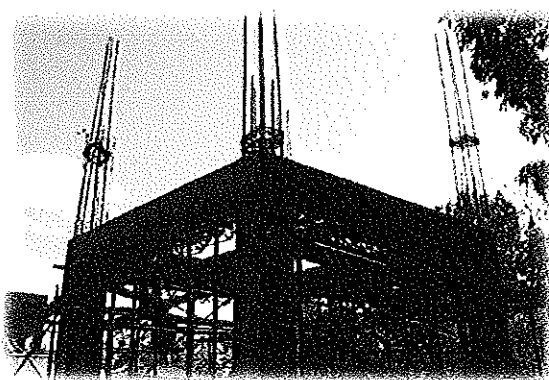

ESTADO ACTUAL Y NIVEL EN QUE SE
ENCUENTRA LA ESTRCTURA DEL TANQUE
ELEVADO

FOTO No. 194



INSTALACION DE TUBERIA

FOTO No. 195



VERIFICACION DE MEDICIONES DE TUBERIA
INSTALADA

851

272

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL


SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACIÓN
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 196

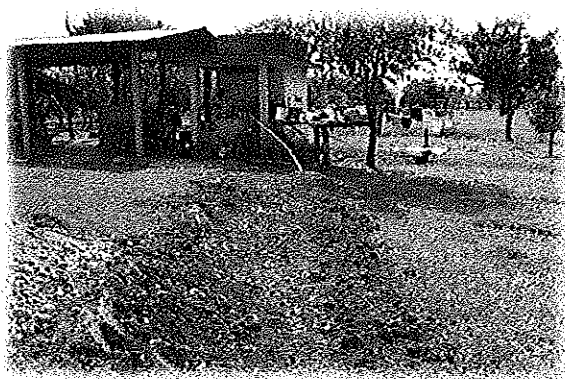

RELLENOS DE LA EXCAVACION

FOTO No. 197



INSTALACION DE TUBERIA

FOTO No. 198



INSTALACION DE TUBERIA

FOTO No. 199



VERIFICACION DE MEDICIONES DE
EXCAVACIONES

3097
228

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303


II. REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO VEREDA AGUALINDA

FOTO No. 200



FOTO No. 201

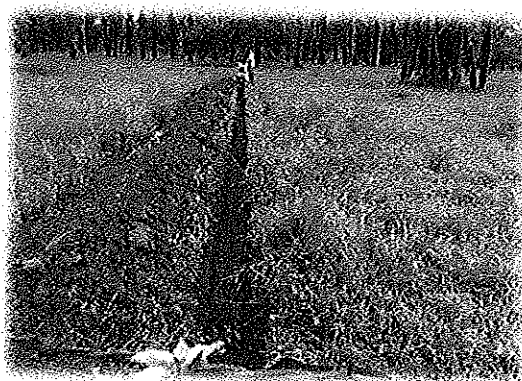


EXCAVACIONES PARA INSTALACION DE TUBERIA EXCAVACIONES PARA INSTALACION DE TUBERIA

FOTO No. 202



MEDICION DE LAS EXCAVACIONES

FOTO No. 203

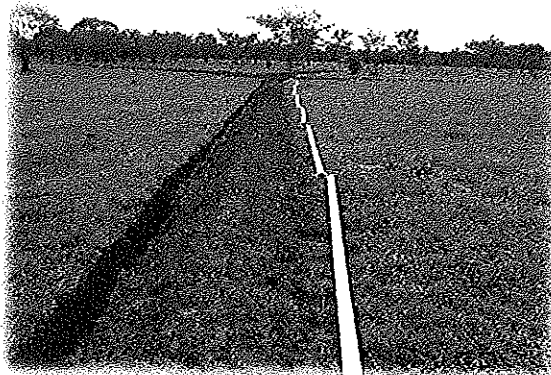

TUBERIA PARA INSTALAR

849

224

3088
229

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL


SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 204

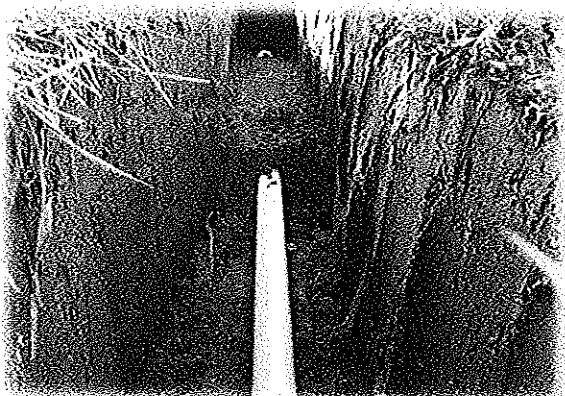

CAMA Y ATRAQUE EN ARENA

FOTO No. 205




INSTALACION DE TUBERIA

FOTO No. 206



INSTALACION DE ACCESORIOS

FOTO No. 207

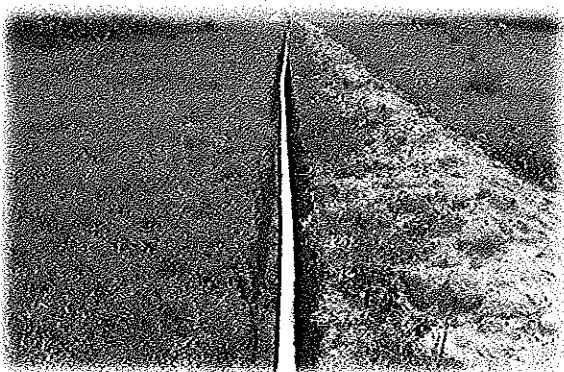

INSTALACION DE TUBERIA

3088
275

3089
~~230~~

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

II REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 208



RELLENOS DE LA EXCAVACION

FOTO No. 209



RELLENOS DE LA EXCAVACION


PROYECTO VEREDA SAN ISIDRO

FOTO No. 210



VISTA FINAL DEL TANQUE ELEVADO

FOTO No. 211

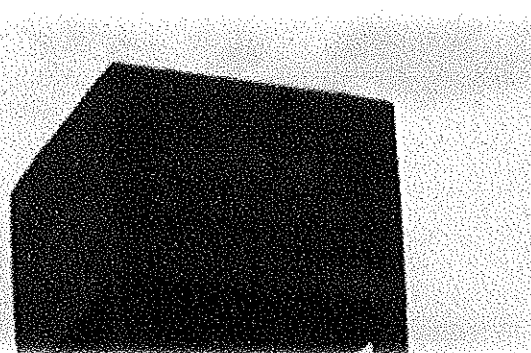

TANQUE ELEVADO CONSTRUIDO

847
276

3090
231

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL


SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

EL REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 212

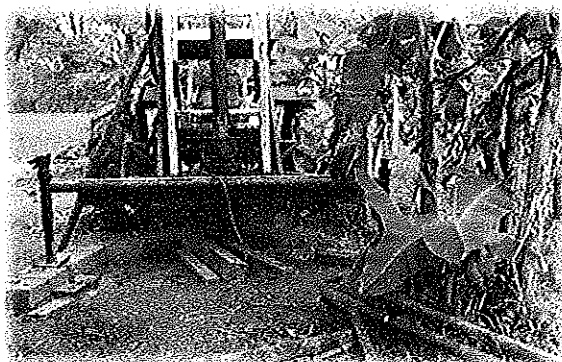

EQUIPO DE PERFORACION ABONDONADO


FOTO No. 213



EQUIPO DE PERFORACION ABONDONADO


PROYECTO VEREDA MATALARGA

FOTO No. 214

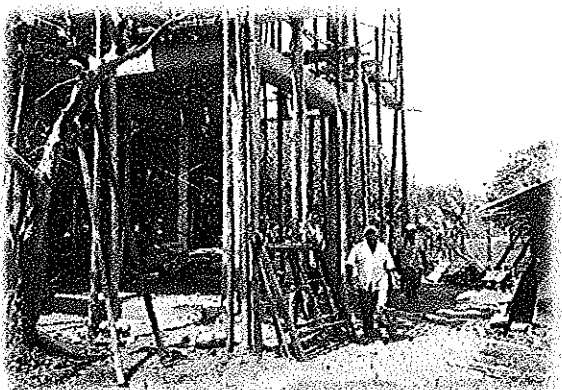

ESTRUCTURA DE SOPORTE NO AUTORIZADA
POR INTERVENTORIA

FOTO No. 215

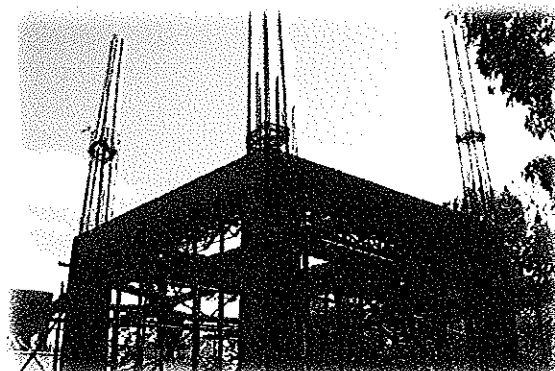

ESTRUCTURA NO ALINEADA EN QUE SE
ENCUENTRA LA ESTRUCTURA DEL TANQUE
ELEVADO

346

297

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014


SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

II ANEXOS FOTOGRAFICOS

PROYECTO VEREDA AGUALINDA

FOTO No. 216

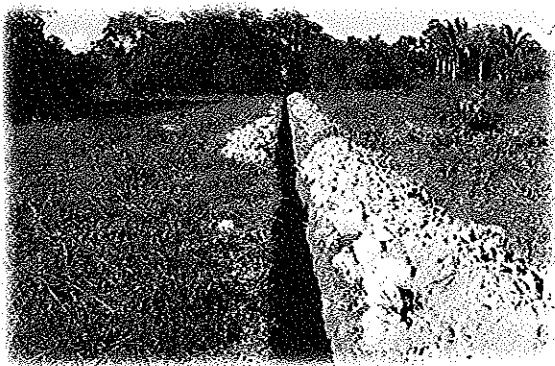

EXCAVACIONES PARA INSTALACION DE TUBERIA

FOTO No. 217




INSTALACION DE TUBERIA

FOTO No. 218



INSTALACION DE TUBERIA

FOTO No. 219

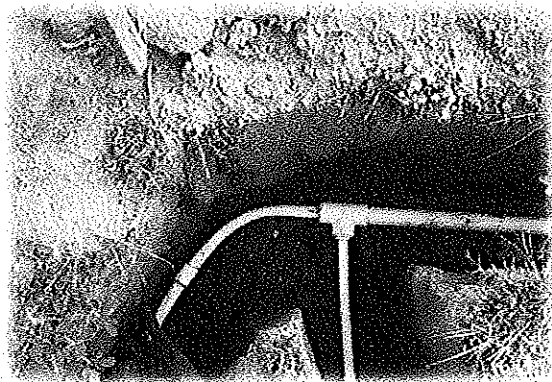

VERIFICACION DE MEDICIONES DE TUBERIA
INSTALADA

3092
~~233~~

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 220




SUMINISTRO DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA

FOTO No. 221



CAMA Y ATRAQUE EN ARENA

FOTO No. 222

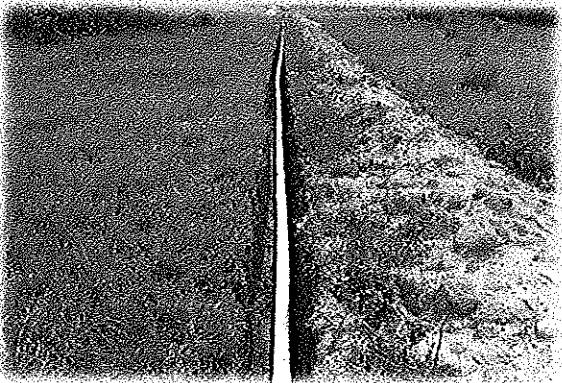

INSTALACION DE TUBERIA

FOTO No. 223



VERIFICACION DE MEDICIONES DE EXCAVACIONES

344

229

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

EL REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 224



VERIFICACION DE MEDICIONES DE
EXCAVACIONES


FOTO No. 225



RELLENOS DE LA EXCAVACION


PROYECTO VEREDA SAN ISIDRO

FOTO No. 226

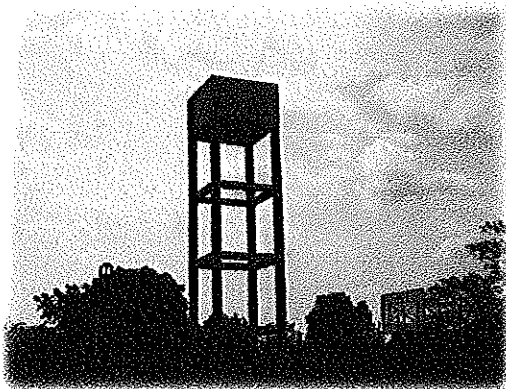

VISTA FINAL DEL TANQUE ELEVADO

FOTO No. 227



TANQUE ELEVADO CONSTRUIDO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL


SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 228

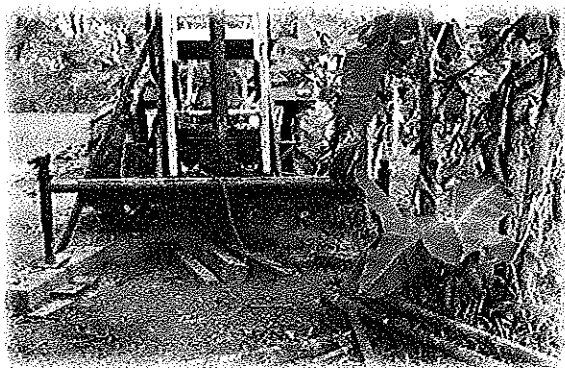

EQUIPO DE PERFORACION ABANDONADO


FOTO No. 229



EQUIPO DE PERFORACION ABANDONADO

PROYECTO VEREDA MATALARGA

FOTO No. 230

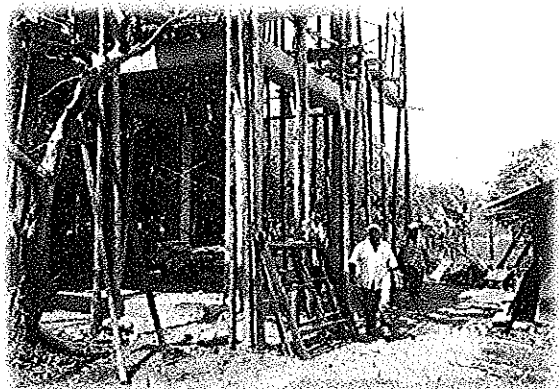

ESTRUCTURA DE SOPORTE NO AUTORIZADA
POR INTERVENTORIA

FOTO No. 231



ESTRUCTURA DE SOPORTE EN QUE SE
ENCUENTRA LA ESTRUCTURA DEL TANQUE
ELEVADO

3095
226

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

II. REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO VEREDA SAN ISIDRO

FOTO No. 232



PICADA DE PLACA CASETA QUE NO FUE RESIVIDO POR LA INTERVENTORIA

FOTO No. 233



PICADA DE PLACA CASETA QUE NO FUE RESIVIDO POR LA INTERVENTORIA

FOTO No. 234



FUNDIDA PLACA NUEVA CASETA CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES

FOTO No. 235



FUNDIDA PLACA NUEVA CASETA CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES

3096
237

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL


SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 236

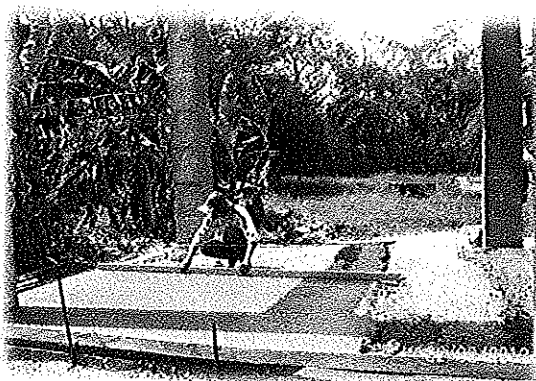

FUNDIDA PLACA NUEVA CASETA CUMPLIENDO
LAS ESPECIFICACIONES

FOTO No. 237



FUNDIDA PLACA NUEVA CASETA CUMPLIENDO
LAS ESPECIFICACIONES

FOTO No. 238



CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA CASETA

FOTO No. 239



CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA CASETA

840 283

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

II. REGISTRO FOTOGRAFICO


PROYECTO VEREDA MATALARGA

FOTO No. 240




CONSTRUCCION INICIAL POZO PROFUNDO

FOTO No. 241

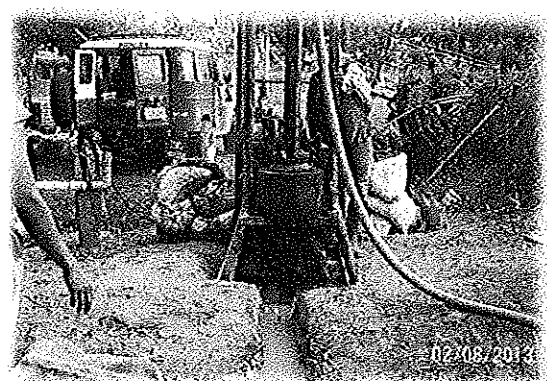


CONSTRUCCION INICIAL POZO PROFUNDO

FOTO No. 242

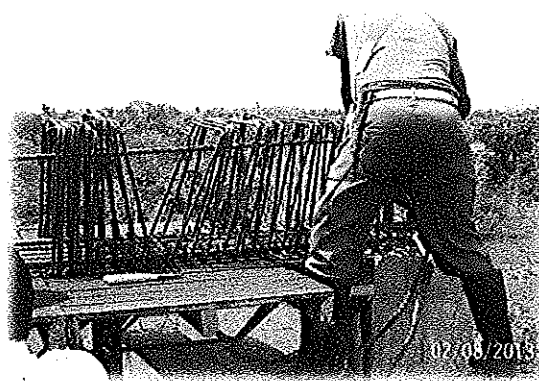

INSTALACION DE HIERRO VIGA SUPERIOR

FOTO No. 243

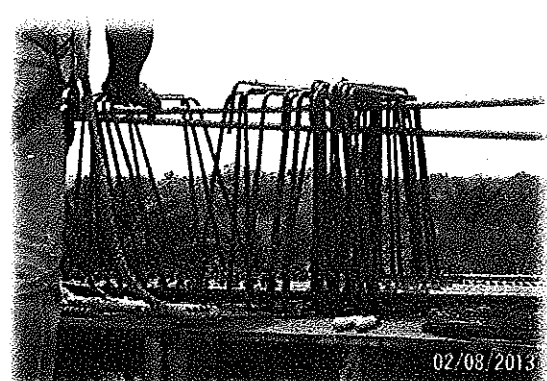

INSTALACION DE HIERRO VIGA SUPERIOR

3098
239

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL


SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303


EL REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 244

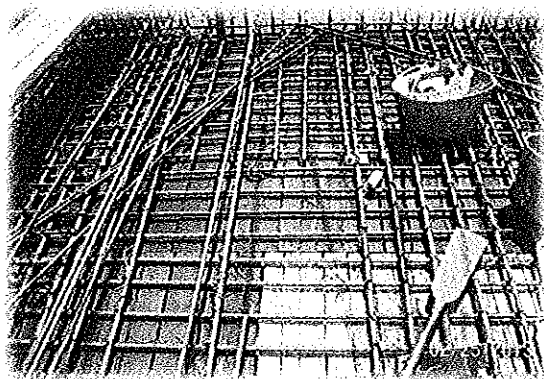

INSTALACION HIERRO PLACA PISO TANQUE DE ALMACENAMIENTO

FOTO No. 245

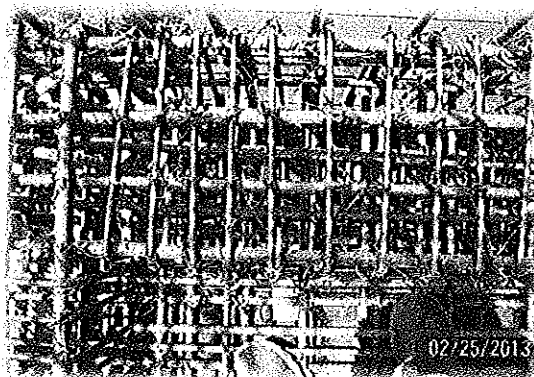


INSTALACION HIERRO VIGA SUPERIOR TANQUE DE ALMACENAMIENTO

FOTO No. 246



CONSTRUCCION HIERRO MUROS TANQUE DE ALMACENAMIENTO

FOTO No. 247

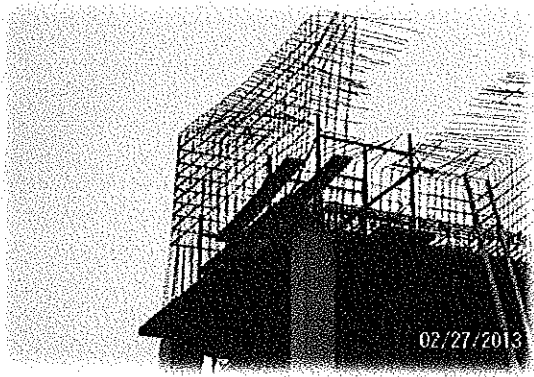

CONSTRUCCION HIERRO MUROS TANQUE DE ALMACENAMIENTO

828

3099
240

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL


SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303


EL REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 248

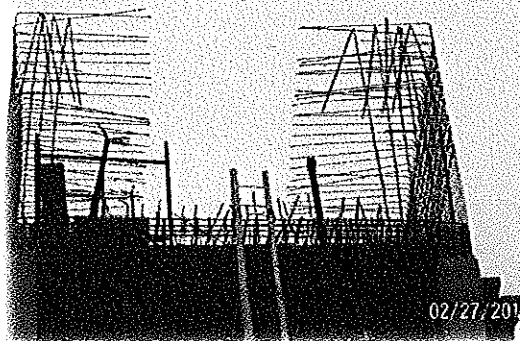


CONSTRUCCION HIERRO MUROS TANQUE DE
ALMACENAMIENTO

FOTO No. 249

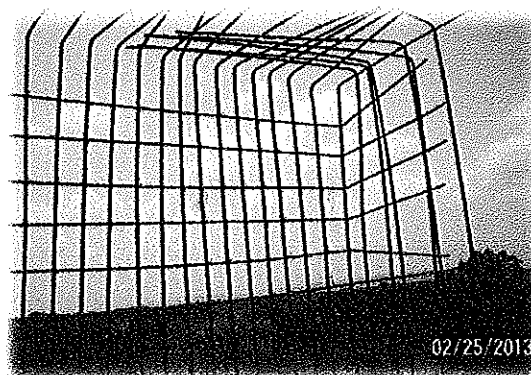

CONSTRUCCION HIERRO MUROS TANQUE DE
ALMACENAMIENTO

FOTO No. 250

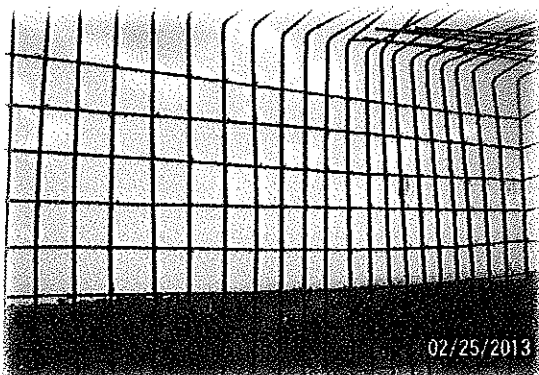

CONSTRUCCION HIERRO MUROS TANQUE DE
ALMACENAMIENTO

FOTO No. 251



VISTA AEREA TALADRO POZO DE INSPECCION

837 286

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014


SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

II. REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO VEREDA SAN ISIDRO

FOTO No. 252

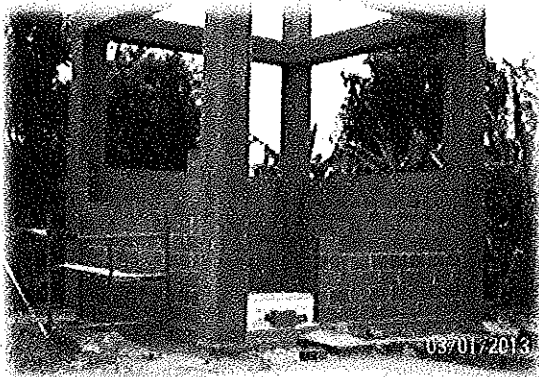

MAMPOSTERIA CASETA CONTINUA IGUAL
PERIODO ANTERIOR

FOTO No. 253



TALADRO QUE LLEGO A LA VEREDA

FOTO No. 254



TALADRO

FOTO No. 255



TALADRO

242
3107

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

II. REGISTRO FOTOGRAFICO


PROYECTO VEREDA MATALARGA

FOTO No. 256




VISTA CONSTRUCCION HIERROS MUROS

FOTO No. 257

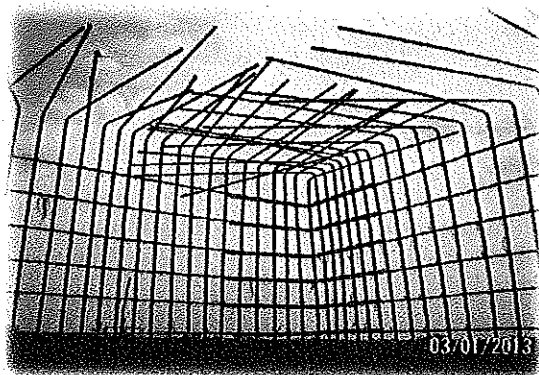


ARMADO HIERROS MUROS

FOTO No.258

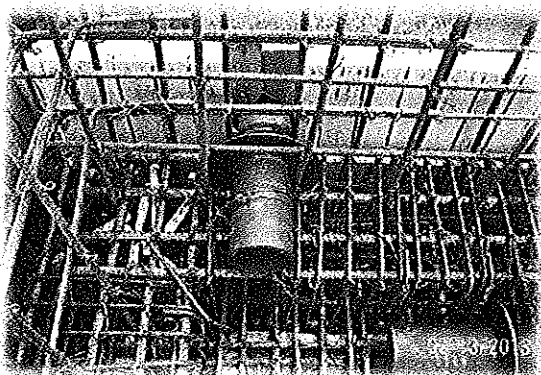

PASAMUROS TANQUE DE ALMACENAMIENTO

FOTO No. 259

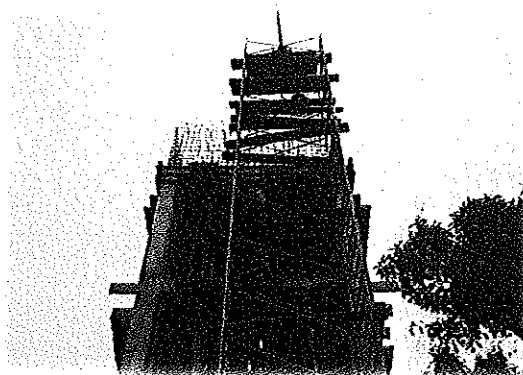

ESTRUCTURA UBICACION PLUMA

243
3102

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014


SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

II. REGISTRO FOTOGRAFICO


PROYECTO VEREDA MATALARGA

FOTO No. 260

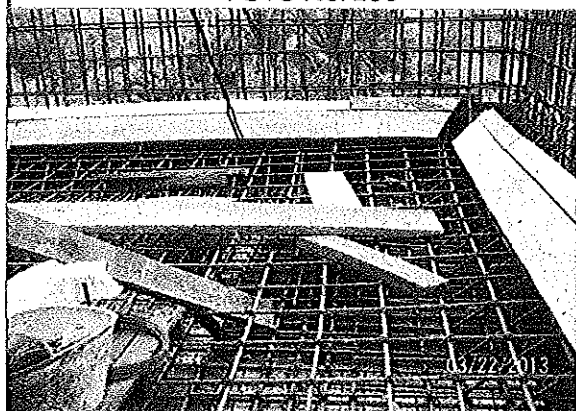


ARMADO HIERRO PISO TANQUE DE
ALMACENAMIENTO

FOTO No. 261

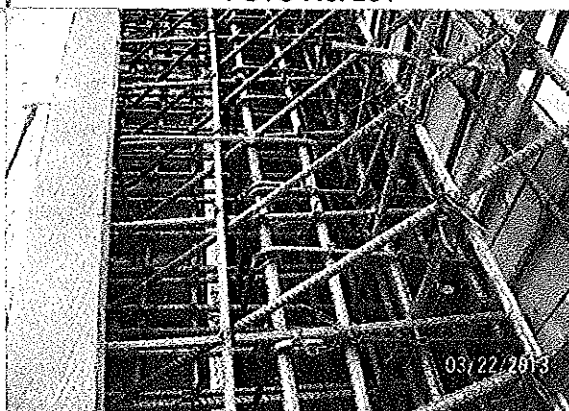

UNION VIGA PISO MURO TANQUE DE
ALMACENAMIENTO

FOTO No. 262

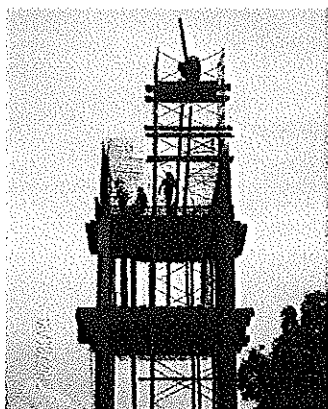

ARMADO HIERRO MUROS

FOTO No. 263



HIERRO MUROS PISO

8/4 289

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014


SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

II. REGISTRO FOTOGRAFICO


PROYECTO VEREDA SAN ISIDRO

FOTO No. 264

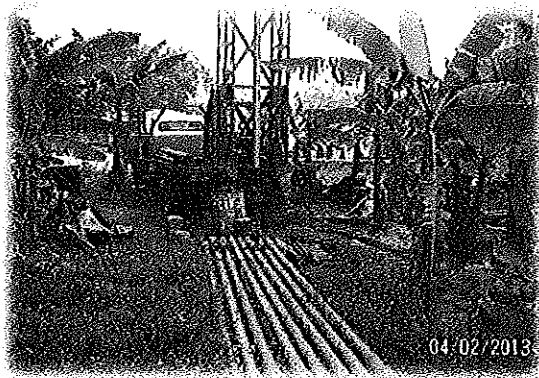

SE INICIA LA PERFORACION DEL POZO
PROFUNDO

FOTO No. 265

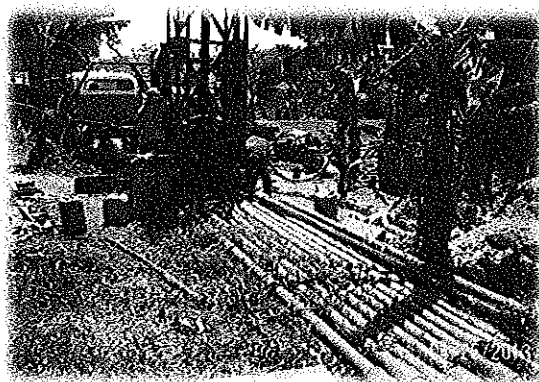

PERFORACION POZO PROFUNDO

FOTO No. 266



PERFORACION POZO PROFUNDO

FOTO No. 267



PERFORACION POZO PROFUNDO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL


SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303


II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 268

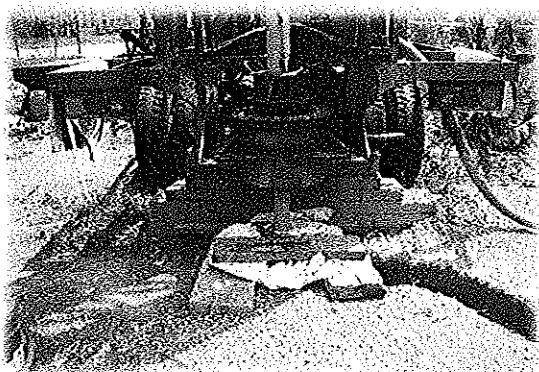

PERFORACION POZO PROFUNDO

FOTO No. 269

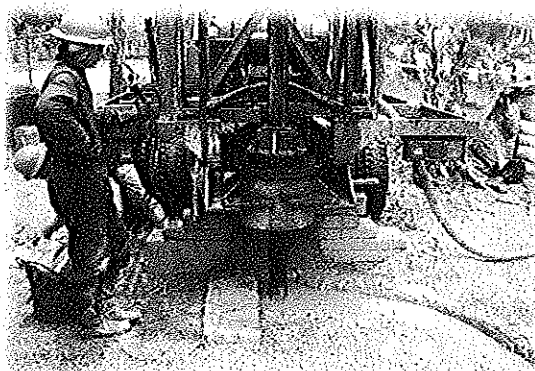


PERFORACION POZO PROFUNDO

FOTO No. 270



PERFORACION POZO PROFUNDO

FOTO No. 271

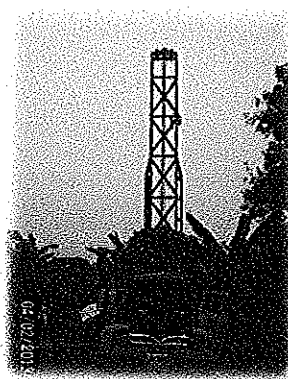

PERFORACION POZO PROFUNDO

3105
246

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL


SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303


II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 272

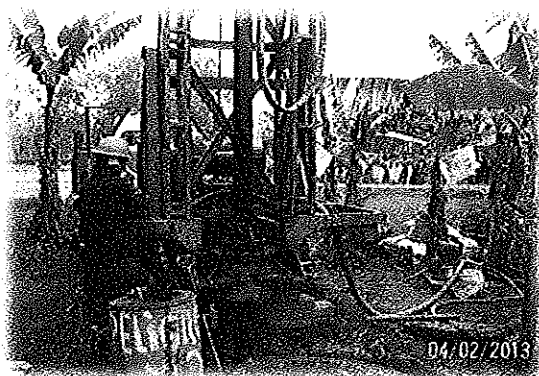


PERFORACION POZO PROFUNDO

FOTO No. 273

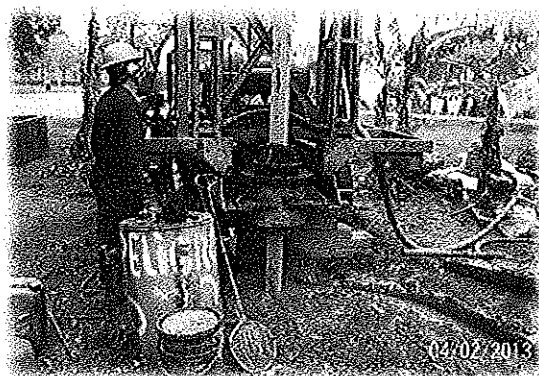


PERFORACION POZO PROFUNDO

FOTO No. 274

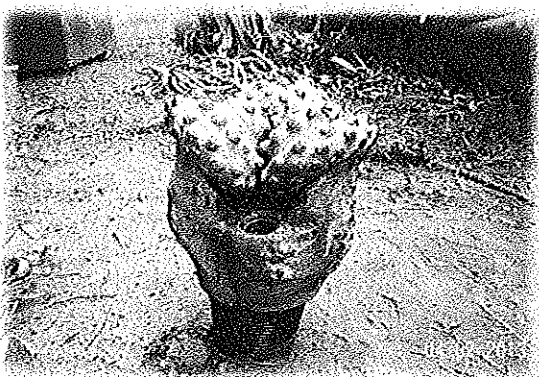

BROCA TALADRO

FOTO No. 275

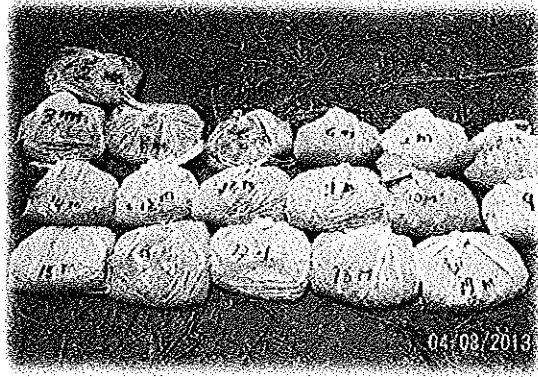

MUESTRAS CADA METRO

831 292

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014


SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

II. REGISTRO FOTOGRAFICO


PROYECTO VEREDA MATALARGA

FOTO No. 276

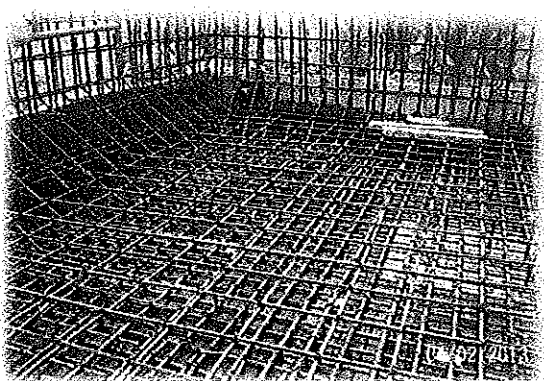

PISO COMPLETAMENTE ARMADO EN HIERRO
TANQUE DE ALMACENAMIENTO

FOTO No. 277

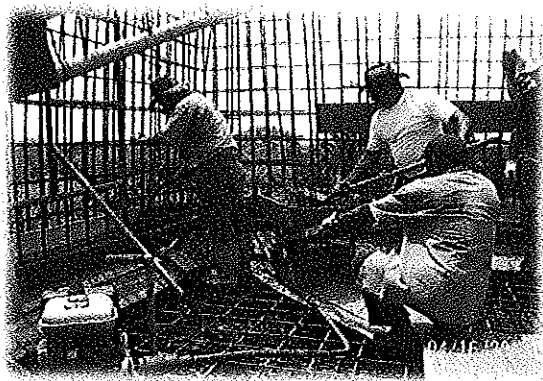

FUNDIDA VIGA, MURO Y PISO

FOTO No. 278



FUNDIDA VIGA Y PISO

FOTO No. 279



FUNDIDA VIGA, MURO Y PISO

298
3107

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

EL REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 280




FUNDIDA PISO TANQUE DE ALMACENAMIENTO

FOTO No. 281



FUNDIDA PISO TANQUE DE ALMACENAMIENTO

FOTO No. 282

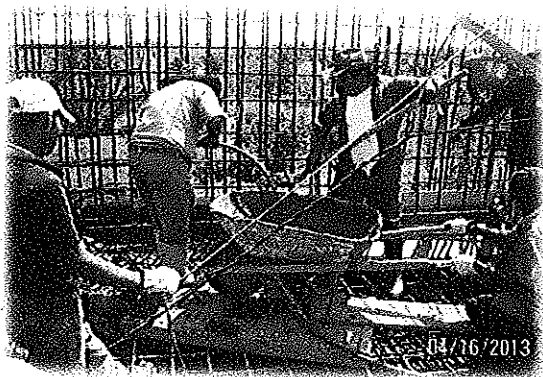

FUNDIDA PISO TANQUE DE ALMACENAMIENTO

FOTO No. 283



FUNDIDA PISO TANQUE DE ALMACENAMIENTO

294

329

219
3108

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303


EL REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 284



FUNDIDA VIGA, PISO TANQUE DE ALMACENAMIENTO

FOTO No. 285

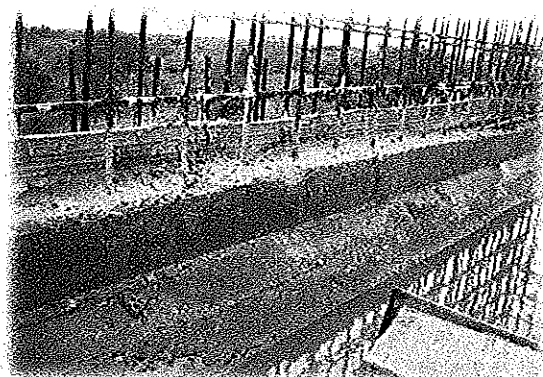


FUNDIDA VIGA, PISO TANQUE DE ALMACENAMIENTO

FOTO No. 286



FUNDIDA VIGA, PISO TANQUE DE ALMACENAMIENTO

FOTO No. 287

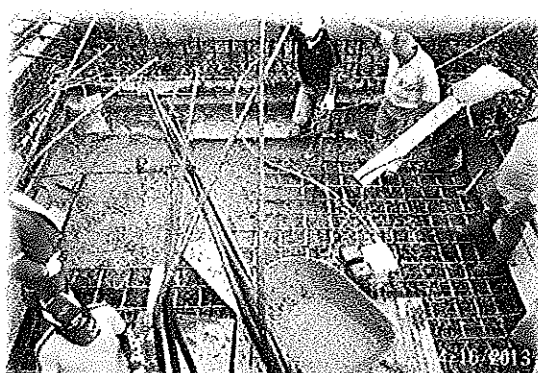

FUNDIDA VIGA, PISO TANQUE DE ALMACENAMIENTO

828 295

210
3109

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL
ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE CONSULTORIA FINAL

SEPTIEMBRE DE 2014

SUPERVISION GOBERNACION
CONSULTOR
CONTRATO

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGU
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303


II. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 288



FUNDIDA VIGA, PISO TANQUE DE
ALMACENAMIENTO

FOTO No. 289

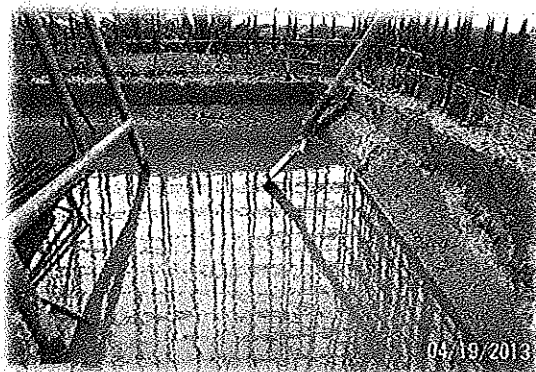

FUNDIDA VIGA, PISO TANQUE DE
ALMACENAMIENTO

FOTO No. 290



MEZCLA CONCRETO

FOTO No. 291



APLICACIÓN ACELERANTE MEZCLA CONCRETO

827
