



**ALCALDÍA
MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NTT. 800014434-6

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

**INFORME DE EJECUCION CONSOLIDADO
CONVENION INTERADMINISTRATIVO- CRAVO NORTE- ARAUCA- SUBDIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA N° 1619 DE 2021**

OBJETO

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE - ARAUCA.

CONTRATISTA

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
R/L NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS

SUPERVISOR

ANDRÉS FELIPE GIRALDO JIMÉNEZ

Supervisor
Ministerio del Interior

APOYO A LA SUPERVISIÓN

JUAN SEBASTIAN DUQUE

Arquitecto

ENERO DE 2024



**ALCALDÍA
MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT. 800014434-6

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO

CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
DIRECCIÓN CONTRATISTA:	Cra 4 # 2-62, Brr El Centro, CRAVO NORTE
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE - ARAUCA.
PLAZO INICIAL:	31 DE MAYO DE 2022
VALOR DEL CONTRATO:	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$ 1.250.000.000,00) M/CTE
FECHA DE INICIO:	08 DE OCTUBRE DE 2021

CUADRO 1. Aspectos generales del Contrato

1.1 EJECUCION Y AVANCE DEL CONVENIO:

A continuación, se relaciona todas las actividades que se han venido desarrollando en lo que lleva de ejecución y avance el presente convenio.

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT. NO.	800014434-6
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PARQUE SACÚDETE CRAVO NORTE
REPRESENTANTE LEGAL:	YAJAIRA MARYURI TOVAR CISNEROS
CÉDULA NO.	68.297.504 de Arauca - Arauca
DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA:	Calle 2 No. 7-44 Arauca
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PÚBLICA
OBJETO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO1 OPCIÓN 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE.



**ALCALDÍA
MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT. 800014434-6

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

VALOR:	MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES MCTE (\$ 1.125.000.000,00)
PLAZO:	SEIS MESES (6)
SUSPENSION No. 01	14 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 01	04 DE JULIO DE 2022
PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 01	03 DE OCTUBRE DE 2022
REINICIO No. 01	16 DE DICIEMBRE DE 2022
SUSPENSION No. 02	30 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSION No. 2	30 DE ENERO DE 2023
PRORROGA No. 02 A LA SUSPENSION No. 2	14 DE MARZO DE 2023
ACTA DE REINICIO 2	13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSION No. 3	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO NO. 3	14 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION No. 4	22 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 4	19 DE ENERO DE 2024
PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 4	8 DE FEBREO DE 2024
REINICIO No. 4	28 DE FEBRERO DE 2024

Pólizas según firma del contrato:

Que el contratista **UNIÓN TEMPORAL PARQUE SACÚDETE CRAVO NORTE**, identificado con NIT No 901.562.581-7 R/L **YAJAIRA MARYURI TOVAR CISNEROS**, identificada con cédula de ciudadanía No **68.297.504** de Arauca - Arauca, ha presentado a este despacho la Póliza expedida por **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**, que a continuación se detalla:

ESTADO DE PÓLIZAS

Teniendo presente que una vez establecido el reinicio No. 2, mediante acta firmar mediante acta firmada entre los interesados, se debe actualizar el registro de pólizas con el fin de amparar los aspectos de cumplimiento, manejo del anticipo, calidad de la obra, estabilidad de la obra y responsabilidad.



ALCALDÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT. 800014434-6

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

Con base en lo anterior las pólizas se encuentran en el siguiente avance.

Tabla 3. Póliza de Cumplimiento de Obra – Anexo 0

Póliza No.	Vigencia		Suma Asegurada
	Desde	Hasta	
730-47-994000015464			
CUMPLIMIENTO	28/04/22	28/04/23	\$ 225.000.000
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	28/04/22	28/04/23	\$ 562.500.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND.	28/04/22	28/10/25	\$ 56.250.000
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA No. Póliza 73047994000015464	SUJETA A LA APROBACION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE		\$ 225.000.000
CALIDAD DEL BIEN	28/10/22	28/10/27	\$ 225.000.000
CALIDAD DEL SERVICIO	28/04/22	28/04/23	\$ 8.333.300
RESPONSABILIDAD CIVIL	28/04/22	28/10/22	\$ 300.000.000
LEXTRA CONTRACTUAL			

NOTA: Objeto de la garantía: mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley Colombiana en virtud de la ejecución del contrato de obra n° 045 de fecha 7 de febrero de 2022, referente a: Realizar los estudios, diseños y construcción del proyecto sacúdete al parque tipo 1 opción 1 ubicado en el Municipio de Cravo Norte. Póliza correlativa de cumplimiento estatal n° 994000015464.

Tabla 4. Póliza de Cumplimiento de Obra – Anexo 1

Póliza No.	Vigencia		Suma Asegurada
	Desde	Hasta	
730-47-994000015464			
CUMPLIMIENTO	28/04/22	02/05/23	\$ 225.000.000
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	28/04/22	02/05/23	\$ 562.500.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND.	28/04/22	02/11/25	\$ 56.250.000
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA No. Póliza	SUJETA A LA APROBACION POR PARTE DE LA		\$ 225.000.000



**ALCALDÍA
MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT. 800014434-6

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

73047994000015464	ENTIDAD CONTRATANTE		
CALIDAD DEL BIEN	28/10/22	28/10/27	\$ 225.000.000
CALIDAD DEL SERVICIO	28/04/22	28/05/23	\$ 8.333.300
RESPONSABILIDAD	CIVI	02/11/22	\$ 300.000.000
LEXTRACONTRACTUAL			

NOTA: Según acta de inicio de fecha 02-05-2022, se actualiza vigencia. Aclaremos vigencia de la póliza: desde 28/04/2022 hasta 02/11/2022.

Tabla 5. Póliza de Cumplimiento de Obra – Anexo 2

Póliza No.	Vigencia		Suma Asegurada
	Desde	Hasta	
730-47-994000015464			
CUMPLIMIENTO	28/04/22	14/10/23	\$ 225.000.000
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	28/04/22	14/10/23	\$ 562.500.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND.	28/04/22	14/04/26	\$ 56.250.000
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA No. Póliza 73047994000015464	SUJETA A LA APROBACION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE		\$ 225.000.000
CALIDAD DEL BIEN	28/10/22	28/10/27	\$ 225.000.000
CALIDAD DEL SERVICIO	28/04/22	14/10/23	\$ 8.333.300
RESPONSABILIDAD	CIVI	02/11/22	\$ 300.000.000
LEXTRACONTRACTUAL			

DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA:

Las actividades y cantidades que se relacionan a continuación, son las ejecutadas en el periodo comprendido ENERO DE 2024 y representa un 42.45% SEGÚN LA ÚLTIMA INFORMACION ENTREGADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA Y AVALADO POR LA INTERVENTORIA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	Metrado	Parcial	%
1.0	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES					
1.1	Localización y replanteo: Nivelación, altimetría, planimetría, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ejecución	m ²	\$ 4.913.00	1.200.00	\$5.895.600.00	100.00%
1.2	Relleno en material seleccionado compactado al 95% del PM. (Incluye transporte)	m ³	\$ 95.204.82	960.00	\$91.396.627.20	100.00%
2.0	BLOQUE BAÑOS, SALA COMUNITARIA, y					



ALCALDÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT. 800014434-6

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

CATEGORIA						
2.1 Preliminares						
2.1.1	Excavación manual en material común. Incluye retiro en sitio designado por el municipio	m3	\$ 65,511.67	43.22	\$2,831,414.38	100.00%
2.2 Acero de refuerzo y concretos						
2.2.1	Concreto de limpieza 2.000 PSI e=0.10m de espesor para cajas de registro y vigas de cimentación	m3	\$ 600,787.01	2.80	\$1,682,203.63	95.89%
2.2.2	Plantilla de contrapiso e=0.10m 3.000 PSI, incluye malla electrosoldada 15x15, 5mm	m2	\$ 81,614.39	62.18	\$5,074,782.77	100.00%
2.2.3	Acero de refuerzo fy=60000 PSI, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ejecución	Kg	\$ 8,796.58	664.89	\$5,848,758.08	44.17%
2.2.4	Concreto 4000 PSI para vigas de cimentación, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ejecución	m3	\$ 792,929.16	7.86	\$6,232,423.20	100.00%
2.3 Instalaciones hidráulicas						
2.3.1	Suministro e instalación de tubería hidráulica 1/2" PVC	m	\$ 26,379.93	17.16	\$452,679.60	70.01%
2.3.2	Suministro e instalación de tubería hidráulica 3/4" PVC	m	\$ 26,196.60	10.87	\$284,757.04	69.99%
2.3.3	Suministro e instalación de tubería hidráulica 1. 1/2" PVC	m	\$ 35,528.26	52.77	\$1,874,826.28	70.01%
2.3.4	Suministro e instalación de accesorios para tubería hidráulica	Und	\$ 359,210.31	1.00	\$359,210.31	100.00%
2.3.6	Conexión servicio público de agua	Gl	\$ 655,712.21	1.00	\$655,712.21	100.00%
2.3.7	Caja de registro de 0,80 x 0,50 x 0,50 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa	Und	\$ 654,126.44	1.00	\$654,126.44	100.00%
2.3.8	Caja de registro de 0,50 x 0,50 x 0,50 m en concreto de 17,2 con llave de cierre	Und	\$ 602,701.53	1.00	\$602,701.53	100.00%
2.4 Instalaciones sanitarias y ventilación						
2.4.1	Suministro e instalación de tubería Sanitaria 2" PVC	m	\$ 38,026.95	19.17	\$728,976.63	70.01%
2.4.2	Suministro e instalación de tubería Sanitaria 4" PVC	m	\$ 47,926.95	37.70	\$1,806,846.02	70.01%
2.4.3	Suministro e instalación de accesorios para tubería sanitaria	Und	\$ 800,845.89	1.00	\$800,845.89	100.00%
2.4.4	Caja de registro y paso de 0,80 x 0,80 x 0,80 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa	Und	\$ 826,779.41	2.00	\$1,653,558.82	100.00%
2.4.5	Caja de paso con trampa de grasa de 1,0 x 1,1 x 1,0 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa	Und	\$ 1,158,743.36	1.00	\$1,158,743.36	100.00%
2.5 Mampostería						
2.5.1	Mampostería en bloque estructural 15x19x39	m2	\$ 106,385.37	196.32	\$20,885,575.84	70.00%
2.5.2	Dovelas para mampostería en bloque estructural, orificio 10x10, con mortero fluido y epóxico de anclaje a viga de cimentación.	m	\$ 14,384.62	403.00	\$5,797,001.86	69.99%
2.5.3	Acero de refuerzo fy=60000 PSI, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ejecución	Kg	\$ 8,796.58	670.00	\$5,893,708.60	69.91%
3.4 Mampostería para tarima						
3.4.1	Mampostería en bloque estructural 15x19x39	m2	\$ 106,385.37	23.27	\$2,475,587.56	70.01%
4.0 ZONAS EXTERIORES Y ARBORIZACIÓN						
4.4	Bordillo prefabricado A-80(0.45x0.2x0.80m)ZV-	m	\$ 87,127.00	248.22	\$21,626,663.94	70.00%
4.8 Jardinerías y zonas verdes						
4.8.5	Mampostería en bloque estructural 15x19x39	m2	\$ 106,385.37	10.70	\$1,138,323.46	69.98%
4.8.8	Relleno en material seleccionado para jardinerías (Incluye transporte)	m3	\$ 90,404.82	3.93	\$355,290.94	100.00%
6.0 ILUMINACION EXTERIOR						
6.1 RED ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN						
6.1.2	Suministro e instalación de trenza en aluminio #3x 6-ihhn-awg, incluye herraje par su instalación	ml	\$ 153,687.86	17.50	\$2,689,537.55	70.00%
6.1.3	Suministro e instalación de SPT con cinta austenítica para poste de 9 metros	Und	\$ 433,391.06	1.00	\$433,391.06	100.00%
6.1.4	Adecuación de punto de conexión según operador de red	Und	\$ 534,038.38	1.00	\$534,038.38	100.00%



**ALCALDÍA
MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT. 800014434-6

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

6.2	RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN					
6.2.1	Suministro e instalación de acometida principal en cable 2x N°6 Thhn-CU F + 1x1 N°6 Thhn-CU N, incluye tubería IMC de 1 1/2"	mi	\$ 204,140.68	14.00	\$2,857,969.52	70.00%
6.2.2	Suministro e instalación Alimentador en cable 2xThhn8-CU F + 1xThhn8-CU T, incluye tubería PVC de 1" (iluminación exterior)	mi	\$ 103,996.96	106.75	\$11,101,675.48	70.00%
6.2.3	Suministro e instalación de ramal de iluminación en cable encauchetado 3xN°14 en tubería pvc de 3/4"	mi	\$ 49,023.89	90.50	\$4,436,662.05	70.00%
6.2.5	Suministro e instalación de tablero monofásico de 12 circuitos con espacio para totalizador	Und	\$ 658,592.51	1.00	\$658,592.51	100.00%
6.2.6	Suministro e instalación de registro Eléctrico de tipo incluye: marco fijo en ángulo de 2 x 1/4, platina para marco de tapa móvil de 2 x 1/4, capsulas para visagra, caja de empalme ip 55+ bloque de conexión, acabado en granito lavado.	Und	\$ 658,178.84	1.00	\$658,178.84	100.00%
6.2.7	Suministro e instalación de caja de inspección AP 247	Und	\$ 580,205.67	9.10	\$5,279,871.60	70.00%
6.2.8	Excavaciones y posterior tapado de 0,50x0,50 mts	ml	\$ 12,095.39	42.18	\$510,183.55	21.85%
6.2.9	Suministro e instalación de tubería PVC de 1", reserva	ml	\$ 33,471.28	73.00	\$2,443,403.44	100.00%
6.2.10	Suministro e instalación de pedestal en concreto	Und	\$ 388,770.44	8.40	\$3,265,671.70	70.00%
6.3	SISTEMA DE ILUMINACIÓN					
6.3.5	Poste Metálico para Alumbrado Público de 10mts, Certificado	Und	\$ 7,418,815.81	8.00	\$59,350,526.48	66.67%
6.4	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA					
6.4.1	Malla de puesta a tierra	Und	\$ 2,734,325.53	1.00	\$2,734,325.53	100.00%
6.4.2	Suministro e instalación de sistema de apantallamiento con punta captadora para postes metálicos de 10 metros	Und	\$ 2,041,335.53	2.00	\$4,082,671.06	50.00%
7.0	JUEGOS PARA NIÑOS					
7.3	Pisos					
7.3.4	Bordillo prefabricado A-80(0.45x0.2x0.80m)ZV-	m	\$ 74,376.92	21.86	\$1,625,879.47	69.97%
8.0	CANCHA SINTÉTICA					
8.1	Cancha sintética					
8.1.1	Relleno en material seleccionado e-30 para caja de registro compactado al 95% del PM (Incluye transporte)	m3	\$ 95,204.82	0.19	\$18,088.92	100.00%
8.1.2	Subbase compactada e=20 cm, incluye extendido, humedecimiento, compactado al 95% del PM (Incluye transporte) y pruebas de verificación	m3	\$ 129,794.98	90.05	\$11,688,037.95	100.00%
8.1.3	Excavación mecánica en material común. Incluye retiro en sitio designado por el municipio	m3	\$ 60,013.70	293.61	\$17,620,622.46	100.00%
8.1.4	Excavación manual en material común. Incluye retiro en sitio designado por el municipio	m3	\$ 65,512.00	0.00	\$0.00	
8.1.5	Suministro e instalación de geotextil NT2000 para filtro	m2	\$ 15,154.46	551.89	\$5,029,615.73	70.00%
8.1.6	Relleno drenante D=1" y 1/2" para zanja triturada, caras fracturadas	m3	\$ 156,144.78	2.51	\$391,923.40	70.11%
8.1.7	Base permeable en triturado de 1/2" y 3/8", triturada, caras fracturadas	m3	\$ 156,144.78	94.55	\$14,763,488.95	70.00%
8.1.8	Suministro e instalación de tubería perforada 4" para drenaje	m	\$ 56,381.37	56.00	\$3,157,356.72	70.00%
8.1.9	Suministro e instalación de tubería perforada 6" para drenaje	m	\$ 85,881.37	18.41	\$1,544,256.02	70.00%
8.1.10	Caja de registro y paso de 0,80 x 0,80 x 0,80 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa	Und	\$ 843,620.62	1.00	\$843,620.62	100.00%
8.1.11	Concreto de limpieza 2.000 PSI e=0.10m	m3	\$ 600,787.01	2.75	\$1,652,164.28	100.00%
8.2	Cerramiento					
8.2.1	Excavación manual en material común. Incluye retiro en sitio designado por el municipio	m3	\$ 65,511.67	4.88	\$319,696.95	28.21%
8.2.2	Acero de refuerzo fy=60.000 PSI, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ejecución	Kg	\$ 8,796.58	1,072.50	\$9,434,332.05	84.32%
8.2.3	Concreto de limpieza 2.000 PSI e=0.10m	m2	\$ 600,787.01	3.49	\$2,096,746.66	100.00%
8.2.4	Concreto 4000 PSI para vigas de cimentación del	m3	\$ 811,206.75	10.46	\$8,485,222.61	100.00%



ALCALDÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT. 800014434-6

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

	cerramiento.					
8.2.5	Concreto 4000 PSI para pilotes.	m3	\$ 767,710.24	6.07	\$4,663,072.00	89.46%
8.2.6	Cerramiento contraimpacto H=5.0m, tipo IDR; malla eslabonada 2" calibre 10, Tubo Estructural Galv. Ø 3"-2.5mmASTM A-500, Tubo Estructural Galv. Ø 1 1/2"-2.5mmASTM, Tubo Acero Estructural Galv. 4" e=4.0mm sin rosca, Tapon HG d=3" macho; Platinas: 1/8" D=0.30m, 1 1/4" x 1/8" x 6.00m, 3/4" x 1/8", 1/8" media luna r=0.15m, angulos 1 1/4" x 1/8" y 1/8" x 1 1/2" x 1 1/2", Hierro A-36 Liso/Rect 3/4" y demas elementos y accesorios necesarios para su correcta ejecución. incluye instalación.	m	\$ 1,199,083.93	30.21	\$36,224,325.53	70.00%
8.2.7	Cerramiento en malla eslabonada galvanizada tipo IDR, calibre 10, H=2.5m, tubería galvanizada D=2" -2.5mmASTM A-500 Grad-C, anclaje chazo metalico exp. 1/2 x 2 3/4", lamina alijador 3/16 - 1.00 x 3.00 - 4.5 mm, brocas HSS juego 15Pzs 1/16 A 3/8. incluye instalación.	m	\$ 641,446.00	30.83	\$19,775,780.18	70.00%
10.0	SEÑALIZACIÓN					
10.1	Valla 1,50 X 2,50 Informativa de obra (SUM + INST)	Und	\$ 903,000.00	1.00	\$903,000.00	100.00%
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$434,245,958.30	27.40%
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS					
	Los porcentajes presentados por concepto de AIU son indicativos, cada entidad territorial tiene la responsabilidad de ajustarlos y presentar el correspondiente análisis detallado, de acuerdo a sus condiciones particulares.	ADMINISTRACIÓN	25%		\$108,561,489.57	6.85%
		IMPREVISTO	3%		\$13,027,378.75	0.82%
		UTILIDAD	7%		\$30,397,217.08	1.92%
		SUBTOTAL AIU	35%		\$151,986,085.40	9.59%
	TOTAL COSTO DIRECTO + AIU (VALOR TOTAL OBRA)				\$586,232,043.70	36.99%
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				\$3,283,224.89	0.21%
	RETIE					0.00%
	RETLAP					0.00%
	CONSULTORIA (ESTUDIOS Y DISEÑOS)				\$83,333,000.00	5.26%
	TOTAL COSTO OBRA				\$672,848,268.59	42.45%

EL PROYECTO EN MENCIÓN SE HA MANTENIDO SUSPENDIDO SEGÚN LA ACTA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 4, con reinicio del día 28 de febrero de 2024. Que por tal motivo se mantienen básicamente los mismos avances reportados en el mes anterior teniendo en cuenta que el tiempo para la ejecución de actividades para el mes de febrero es irrelevante por los pocos días a ejecutar, a sabiendas que el mes de febrero solo cuenta con 29 días calendarios.

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DERIVADO:

A la fecha del presente informe se ha adelantado el pago por concepto de anticipo con fecha del 13/05/2022 por un monto de \$ 562.500.000,00

Acta parcial No. 1 Tramitada en diciembre de 2023

Parcial No. 1 valor total reportado acumulado = \$ 633.999.012,07

Amortización de anticipo 35% = \$ 221.899.012,07



**ALCALDÍA
MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT. 800014434-6

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

Valor a pagar Acta parcial No. 1= \$ 412.099.357,84

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 063-2022

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT NO	800014434-6
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL SACUDETE CRAVO NORTE
NIT. NO.	901585865-2
REPRESENTANTE LEGAL:	RICHARD CAMILO ARGUELLO QUENZA
CÈDULA NO.	1.116.776.835 de Arauca - Arauca
DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA:	CALLE 2 # 7 – 42 Cravo Norte, Arauca
TIPO DE CONTRATO:	CONSULTORÍA
OBJETO:	“REALIZAR LAS INTERVENTORÍAS TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCIÓN 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE”
VALOR:	CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE(\$ 125.000.000.00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES
ACTA DE INICIO	02 DE MAYO DE 2022
SUSPENSION No. 01	14 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 01	04 DE JULIO DE 2022
PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 01	03 DE OCTUBRE DE 2022
REINICIO No. 01	16 DE DICIEMBRE DE 2022
SUSPENSION No. 02	30 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSION No. 2	30 DE ENERO DE 2023
PRORROGA No. 02 A LA SUSPENSION No. 2	14 DE MARZO DE 2023
ACTA DE REINICIO No. 2	13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSION No. 3	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO NO. 3	14 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION No. 4	22 DE DICIEMBRE DE 2023



**ALCALDÍA
MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT. 800014434-6

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 4	19 DE ENERO DE 2024
PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 4	8 DE FEBREO DE 2024
REINICIO No. 4	28 DE FEBRERO DE 2024

- Pólizas según firma del contrato:

DESARROLLO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORIA)

Se encuentra en las mismas condiciones de suspensión que el contrato de obra.

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DERIVADO:

A la fecha del presente informe se ha adelantado el pago por concepto de anticipo con fecha del 11/05/2022 por un monto de \$ 62.500.000,00

TRAMITE PARCIAL No. 1 VALOR TOTAL DE \$ 99.999.800,00

AMORTIZACION CONCEPTO ANTICIPO \$ 49.999.900,00

VALOR A PAGADO ACTA PARCIAL No. 1 \$ 49.999.900,00

1.2 ASPECTOS FINANCIEROS.

ACTUALMENTE al presente convenio de la referencia se le han adelantado dos giros parciales por un total de setecientos cincuenta millones de pesos (\$ 750.000.000,00)

FECHA DE GIRO		
29/10/2021	GIRO 1	\$ 375.000.000,00
10/12/2021	GIRO 2	\$ 375.000.000,00

CUADRO. Desembolsos adelantados ministerio del interior

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO	
FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/10/2021	\$ 16.406,00
30/11/2021	\$ 118.965,00
31/12/2021	\$ 282.984,00



**ALCALDÍA
MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT. 800014434-6

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

31/01/2022	\$ 370.141,00
28/02/2022	\$ 297.426,00
31/03/2022	\$ 427.728,00
30/04/2022	\$ 445.365,00
31/05/2022	\$ 195.290,00
30/06/2022	\$ 62.526,00
29/07/2022	\$ 69.147,00
31/08/2022	\$ 78.444,00
30/09/2022	\$ 99.690,00
31/10/2022	\$ 119.074,00
30/11/2022	\$ 133.142,00
30/12/2022	\$ 142.176,00
31/01/2023	\$ 133.437,00
28/02/2023	\$ 170.527,00
31/03/2023	\$ 203.282,00
28/04/2023	\$ 178.911,00
31/08/2023	\$ 192.385,00
30/09/2023	\$ 192.677,00
31/10/2023	\$ 186.739,00
31/11/2023	\$ 210.046,00
31/12/2023	\$ 407.140,00
31/01/2024	\$ 332.329,00
29/02/2024	\$ 321.715,00

CUADRO. Rendimientos financieros


ARQ. MIGUEL FERNANDO MARTINEZ BERNAL
Secretario de Planeación y Obras
Supervisor



**ALCALDÍA
MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT. 800014434-6

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

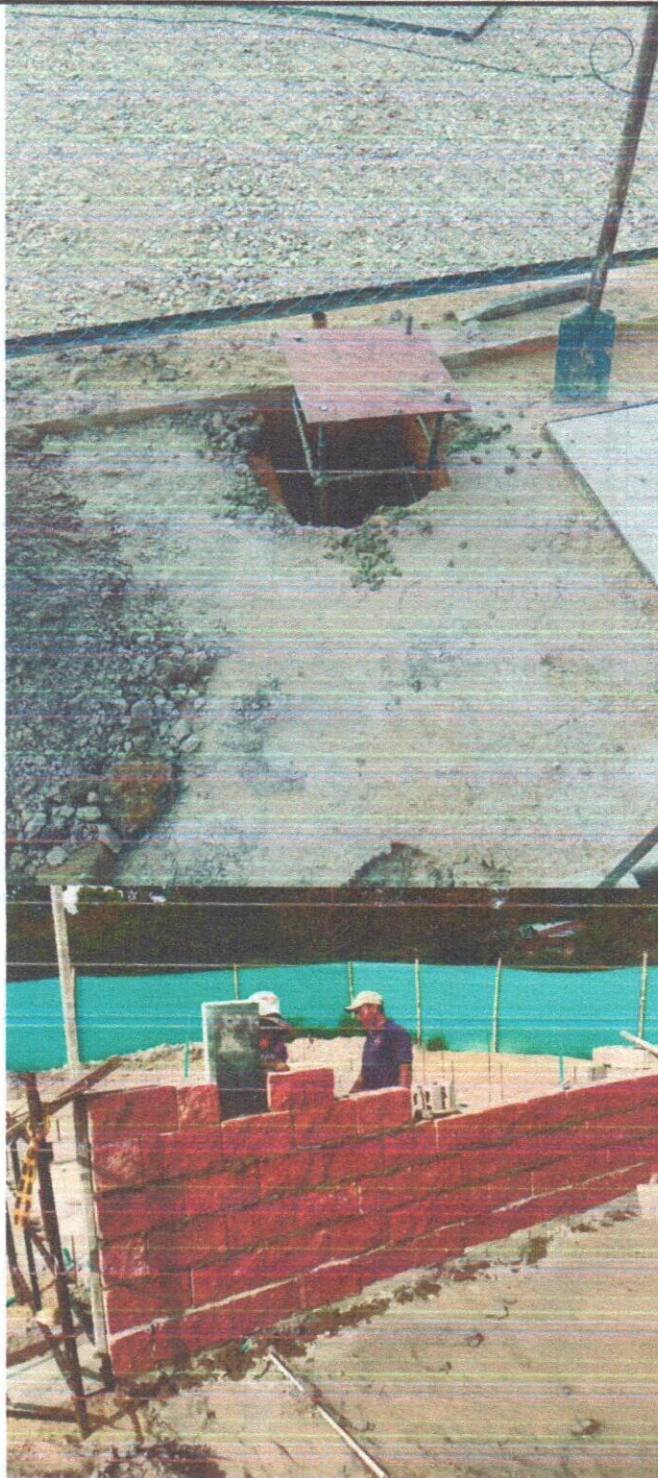

GESTIÓN, CAMBIO Y DESARROLLO

CRA 4 NO 2-62 BARRIO EL CENTRO CELULAR 315 222 3159

WEB: WWW.CRAVONORTE-ARAUCA.GOV.CO EMAIL: ALCALDIA@CRAVONORTE-ARAUCA.GOV.CO

CRAVO NORTE-ARAUCA



**ALCALDÍA
MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT. 800014434-6

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



GESTIÓN, CAMBIO Y DESARROLLO*

CRA 4 NO 2-62 BARRIO EL CENTRO CELULAR 315 222 3159


WEB: WWW.CRAVONORTE-ARAUCA.GOV.CO EMAIL: ALCALDIA@CRAVONORTE-ARAUCA.GOV.CO
CRAVO NORTE-ARAUCA



**ALCALDÍA
MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT. 800014434-6

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

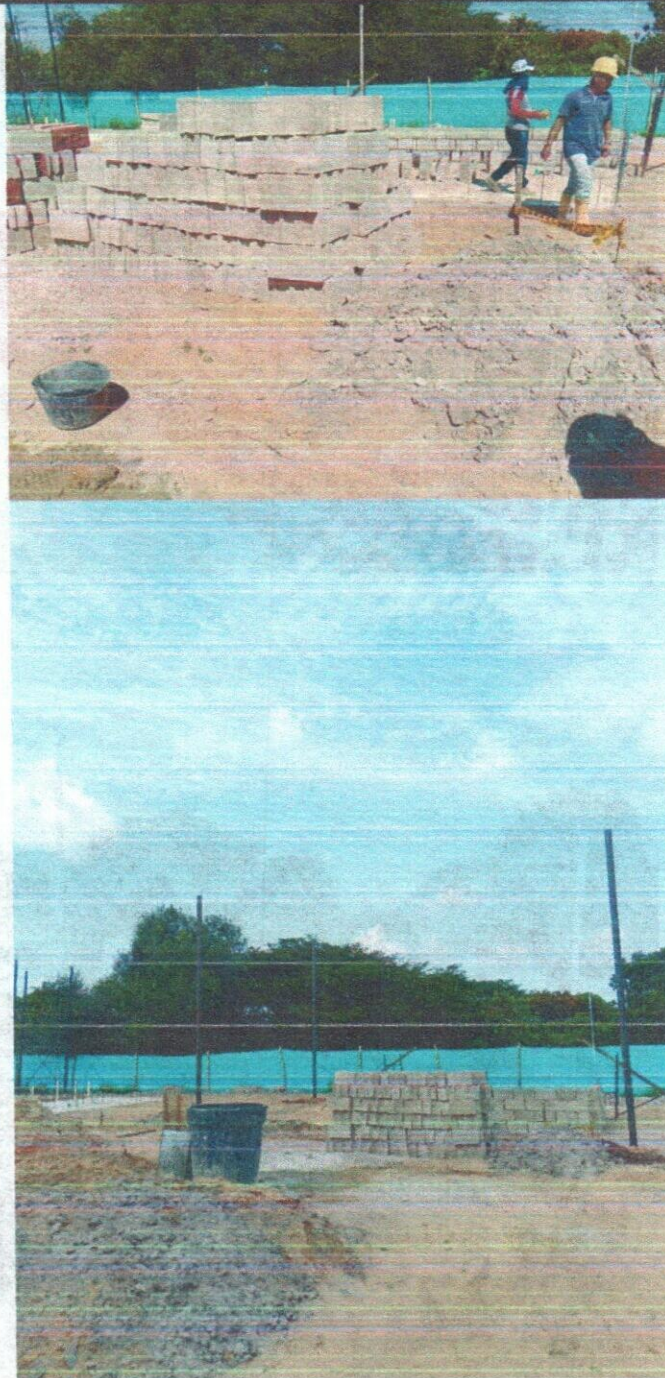

GESTIÓN, CAMBIO Y DESARROLLO

CRA 4 NO 2-62 BARRIO EL CENTRO CELULAR 315 222 3159

WEB: WWW.CRAVONORTE-ARAUCA.GOV.CO EMAIL: ALCALDIA@CRAVONORTE-ARAUCA.GOV.CO
CRAVO NORTE-ARAUCA



**ALCALDÍA
MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT. 800014434-6

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



GESTIÓN, CAMBIO Y DESARROLLO*

CRA 4 NO 2-62 BARRIO EL CENTRO CELULAR 315 222 3159

WEB: WWW.CRAVONORTE-ARAUCA.GOV.CO EMAIL: ALCALDIA@CRAVONORTE-ARAUCA.GOV.CO
CRAVO NORTE-ARAUCA



**ALCALDÍA
MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT. 800014434-6

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL



9

GESTIÓN, CAMBIO Y DESARROLLO

CRA 4 NO 2-62 BARRIO EL CENTRO CELULAR 315 222 3159

WEB: WWW.CRAVONORTE-ARAUCA.GOV.CO EMAIL: ALCALDIA@CRAVONORTE-ARAUCA.GOV.CO

CRAVO NORTE-ARAUCA



**ALCALDÍA
MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT. 800014434-6

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL



GESTIÓN, CAMBIO Y DESARROLLO"

CRA 4 NO 2-62 BARRIO EL CENTRO CELULAR 315 222 3159


WEB: WWW.CRAVONORTE-ARAUCA.GOV.CO EMAIL: ALCALDIA@CRAVONORTE-ARAUCA.GOV.CO
CRAVO NORTE-ARAUCA



**ALCALDÍA
MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT. 800014434-6

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

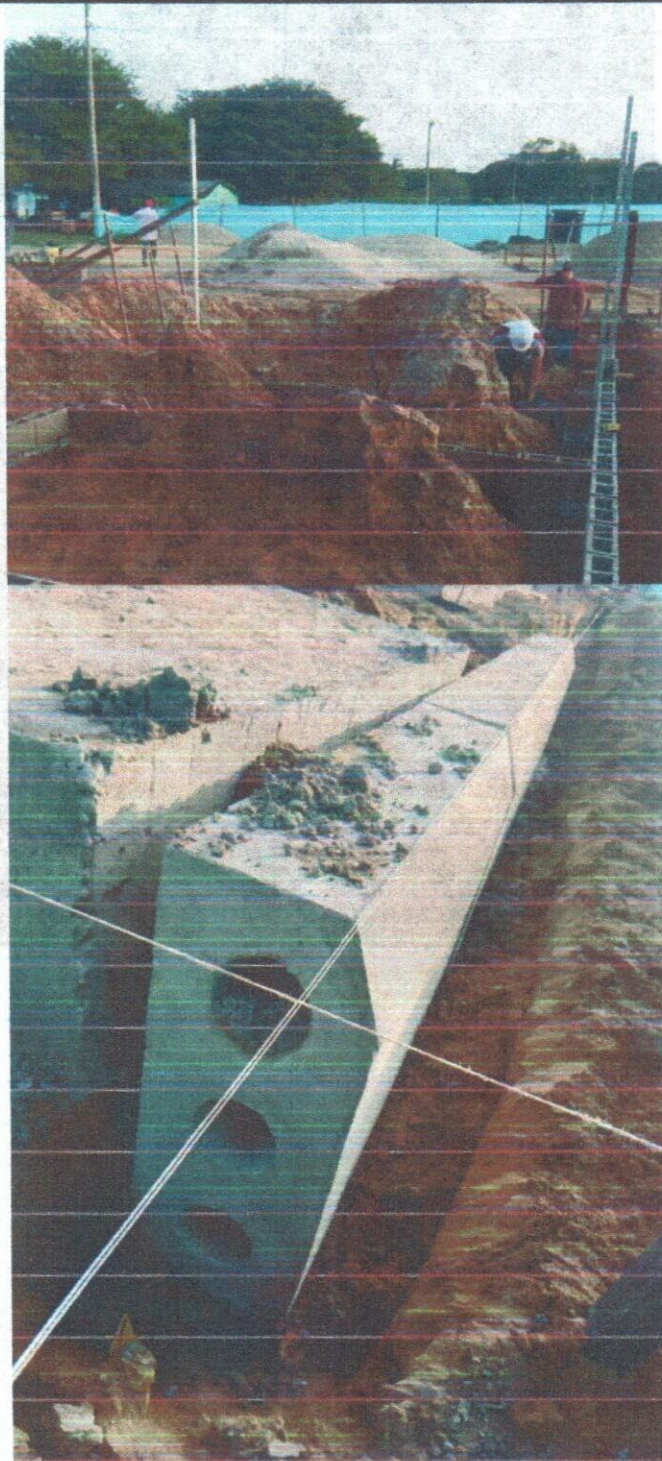

GESTIÓN, CAMBIO Y DESARROLLO"

CRA 4 NO 2-62 BARRIO EL CENTRO CELULAR 315 222 3159

WEB: WWW.CRAVONORTE-ARAUCA.GOV.CO EMAIL: ALCALDIA@CRAVONORTE-ARAUCA.GOV.CO
CRAVO NORTE-ARAUCA



**ALCALDÍA
MUNICIPAL**

**MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT. 800014434-6**

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



GESTIÓN, CAMBIO Y DESARROLLO*

CRA 4 NO 2-62 BARRIO EL CENTRO CELULAR 315 222 3159

WEB: WWW.CRAVONORTE-ARAUCA.GOV.CO EMAIL: ALCALDIA@CRAVONORTE-ARAUCA.GOV.CO
CRAVO NORTE-ARAUCA



**ALCALDÍA
MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT. 800014434-6

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
PROCESO LICITACION PUBLICA No. LP-CN-005-2021

PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN
No 4 CONTRATO DE OBRA N° 045 – 2022

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT No:	800014434-6
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PARQUE SACUDETE CRAVO NORTE
NIT No:	901562581-7
REPRESENTANTE LEGAL:	YAJAIRA MARYURI TOVAR CISNEROS
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	68.297.504 DE ARAUCA
OBJETO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION EL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO:	MIL CIENTO VEINTI CINCO MILLONES DE PESOS (\$1.125.000.000)M/CTE
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES
FECHA DE SUSCRIPCION:	7 DE FEBRERO DE 2022
FECHA DE INICIO:	02 DE MAYO 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2022
SUSPENSION No. 01:	LUNES 4 DE JULIO DE 2022
PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1:	LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022
REINICIO 1:	VIERNES 16 DE DICIEMBRE DE 2022
SUSPENSIÓN 02:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN 2:	LUNES 30 DE ENERO DE 2023
PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN 2:	MARTES 14 DE MARZO DE 2023
REINICIO 2:	MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
SUSPENSIÓN No. 3	JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DE 2023
REINICIO No. 3	JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	VIERNES 12 DE ENERO DE 2024
SUSPENSIÓN No. 4	VIERNES 22 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 4:	VIERNES 19 DE ENERO DE 2024
REINICIO No. 4	JUEVES 08 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	SÁBADO 02 DE MARZO DE 2024
SUSPENSIÓN No. 4	VIERNES 22 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 4:	JUEVES 08 DE FEBRERO DE 2024
REINICIO No. 4	MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	VIERNES 22 DE MARZO DE 2024

En el municipio de Cravo Norte, a los OCHO (08) días del mes de FEBRERO de 2024, se reunieron el Arq. **MIGUEL FERNANDO MARTINEZ BERNAL**, Secretario de Planeación y Obras Públicas, designado Supervisor del contrato en referencia en representación del Municipio de Cravo Norte; el contratista **UNION TEMPORAL P A R Q U E SACUDETE CRAVO NORTE**, representado legalmente por **YAJAIRA MARYURI TOVAR CISNEROS**, identificado con Cedula de Ciudadanía No **68.297.504** de Arauca, y la interventoría **UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE CRAVO NORTE R/L HERMES JAVIER BARRERA BLANCO** con el fin de suscribir la prórroga 1 a la suspensión No. 4.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
PROCESO LICITACION PUBLICA No. LP-CN-005-2021

CONSIDERANDOS

PRIMERO: Que el día 05 de febrero la contratista por parte de la obra dio a conocer a la interventoría mediante oficio solicitud de prórroga del plazo para el reinicio del contrato, de acuerdo a la situación que se está presentando de acuerdo a los siguientes hechos:

1. Dificultad en la vinculación de personal para la obra de construcción: Se proyecta iniciar la obra física con mano de obra de Arauca ya que la local ha resultado imperiosa, no hay oficiales calificados para el desarrollo de los trabajos que quedan por realizarse. Y el desarrollo de los trabajos que se proyectan requieren de oficiales altamente calificados.

Debido a esto, se ha optado por vincular personal de otras zonas del departamento resultando un poco tedioso, hay que reunir las cuadrillas y eso lleva tiempo. Perjudicando en gran medida los tiempos de ejecución.

Se ha proyectado diferentes cuadrillas para optimizar los rendimientos en las unidades constructivas que están pendientes por ejecutar, pero no ha sido posible encontrar en el sitio los trabajos.

La mano de obra es muy escasa y los poquitos que hay ya están vinculados en otras obras. Para dar cumplimiento con lo que se reprogramme se hace necesario conformar tres cuadrillas con un promedio de cinco personas cada una para lograr de manera óptima la construcción.

2. Incertidumbre con proveedores de los materiales para la construcción: Se ha venido presentando el inconveniente con uno de los proveedores, puesto que al momento de solicitar el suministro de materiales de ferretería le indica que despachó unos pedidos anticipados al de la contratista y en el momento no dispone de la cantidad requerida de hierro y cemento para el contrato.

Lo cual le afecta porque los precios del mercado de los suministros han variado en otras ferreterías y se sale del presupuesto. En cuanto al otro proveedor de ferretería alternativo que tiene la contratista, no maneja estos materiales específicamente.

Por lo anterior, solicita prórroga para que en la logística de pre alistamiento pueda reiniciar las actividades sin más contratiempos.

SEGUNDO: Que los conceptos argumentados en el numeral anterior están justificados en las respuestas físicas que hacen soporte de la presente acta de suspensión.

TERCERO: El día 02 de febrero la interventoría emite oficio a la entidad estatal reafirmando la necesidad a la vez que da a conocer los efectos negativos que impactan la obra por la escasez de insumos de materiales para la construcción, además que ha verificado que los insumos de materiales en stock con que la obra se venía ejecutando ya se han agotado lo que deja ver atrasos en su ejecución.

CUARTO: Que con los argumentos anteriormente expuesto justificados en la correspondencia entre proveedores, contratista de obra y contratista de interventoría, la entidad considera suficiente para tramitar las firmas entre las partes por el plazo de veinte (20) días conforme al plazo de suspensión solicitado y queda expuesto al hecho de reiniciar con anterioridad si las condiciones que originan la suspensión han sido superadas para la fecha prevista.

QUINTO: Que para reconsiderar la situación emitida en los oficios de obra e interventoría fue necesario una reunión técnica entre las partes entidad, obra e interventoría, con la finalidad de ver las condiciones técnicas,



**ALCALDÍA
MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT. 800014434-6

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
PROCESO LICITACION PUBLICA No. LP-CN-005-2021

administrativas, jurídicas, financieras y ambientales del proceso de la referencia y se aceptaron los argumentos presentados en los respectivos oficios.

SEXTO: Que expuestas y debatidas las consideraciones entre las partes se encontró que es viable tales solicitudes y la entidad con el fin de garantizar la ejecución normal de la obra procede a considerar viable dichas solicitudes y emite los siguientes argumentos:

RESUELVE

PRIMERO: Que las partes en mutuo acuerdo pactan suscribir prórroga 2 a la suspensión No. 4 por el tiempo de 20 días a partir de la fecha o antes si las razones expuestas han sido superadas.

SEGUNDO: Que la interventoría aprueba dicha prórroga 2 a la suspensión 4 de igual forma por los motivos expuestos anteriormente.

TERCERO: Que se aprueba y se firma la prórroga 2 a la suspensión 4 por los motivos expuestos, toda vez que las justificaciones se consideran como situaciones de fuerza mayor o caso fortuito y son ajenas a la voluntad del contratista.

CUARTO: El contratista de obra, contrato de obra No. 045 de 2022, renuncia a cualquier reclamación en contra del municipio de Cravo Norte con motivo de la suspensión acordada entre las partes.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

UNION TEMPORAL PARQUE SACUDETE CRAVO NORTE
YAJAIRA MARYURI TOVAR CISNEROS
Contratista

UNION TEMPORAL SACUDETE CRAVO NORTE
HERMES JAVIER BARRERA BLANCO
Interventoría Externa

Arq. MIGUEL FERNANDO MARTINEZ BERNAL
Secretario de Planeación y Obras públicas
Supervisor



**ALCALDÍA
MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT. 800014434-6

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
PROCESO LICITACION PUBLICA No. LP-CN-005-2021

ACTA DE REINICIO No. 04
CONTRATO DE OBRA N° 045 – 2022

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT No:	800014434-6
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PARQUE SACUDETE CRAVO NORTE
NIT No:	901562581-7
REPRESENTANTE LEGAL:	YAJAIRA MARYURI TOVAR CISNEROS
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	68.297.504 DE ARAUCA
OBJETO:	REALZIAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION EL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO:	MIL CIENTO VEINTI CINCO MILLONES DE PESOS (\$1.125.000.000) M/CTE
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES
FECHA DE SUSCRIPCION:	7 DE FEBRERO DE 2022
FECHA DE INICIO:	02 DE MAYO 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2022
SUSPENSION No. 01:	LUNES 4 DE JULIO DE 2022
PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1:	LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022
REINICIO 1:	VIERNES 16 DE DICIEMBRE DE 2022
SUSPENSIÓN 02:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN 2:	LUNES 30 DE ENERO DE 2023
PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN 2:	MARTES 14 DE MARZO DE 2023
REINICIO 2:	MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
SUSPENSIÓN 03:	01 DE DICIEMBRE DE 2023
REINICIO 3:	14 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION No 4	22 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN 4	19 DE ENERO DE 2024
PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN 4	08 DE FEBRERO DE 2024
REINICIO No. 4	28 DE FEBRERO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	22 DE MARZO DE 2024

En el municipio de Cravo Norte, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2024, se reunieron el Arq. **MIGUEL FERNANDO MARTINEZ BERNAL**, Secretario de Planeación y Obras Públicas, designado Supervisor del contrato en referencia en representación del Municipio de Cravo Norte; el contratista **UNION TEMPORAL PAR Q U E SACUDETE CRAVO NORTE**, representado legalmente por **YAJAIRA MARYURI TOVAR CISNEROS**, identificado con Cedula de Ciudadanía No **68.297.504** de Arauca, y la interventoría **UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE CRAVO NORTE R/L HERMES JAVIER BARRERA BLANCO** con el fin de suscribir el acta de reinicio No. 4.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el día 28 de febrero se reunieron las partes con el ánimo de ver las condiciones técnicas, administrativas, jurídicas, financieras y ambientales del proceso de la referencia.

"GESTION, CAMBIO Y DESARROLLO"

Cra 4 No 2-62 Barrio el Centro Teléfono 3152223159

Web: www.cravonorte-arauca.gov.co Email: alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co
Cravo Norte-Arauca



**ALCALDÍA
MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT. 800014434-6

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
PROCESO LICITACION PUBLICA No. LP-CN-005-2021

SEGUNDO: Que las razones por las cuales se dio lugar a la prórroga 2 suspensión No. 4 fueron superadas y que por tal motivo se requiere firmar el acta de reinicio No. 4 con el ánimo de continuar con las actividades contractuales de dicho proyecto en mención.

RESUELVE

PRIMERO: Suscribir el acta de Reinicio No. 4 al contrato de obra No. 045/2022 ya que fueron resueltas las razones por las que se dieron lugar a la prórroga 2 suspensión No. 4.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

UNION TEMPORAL PARQUE SACUDETE CRAVO NORTE
YAJAIRA MARYURI TOVAR CISNEROS
Contratista

UNION TEMPORAL SACUDETE CRAVO NORTE
HERMES JAVIER BARRERA BLANCO
Interventoría Externa

Arq. MIGUEL FERNANDO MARTINEZ BERNAL
Secretario de Planeación y Obras públicas
Supervisor



UNIÓN TEMPORAL
SACÚDETE CRAVO NORTE
NIT. 901.583.865-2

Arauca, 06 de marzo de 2024.

Señores:
NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS
Alcalde
MIGUEL FERNANDO MARTINEZ BERNAL
Arquitecto
Cravo-Norte

Asunto: Entrega acta de REINICIO N° 4 CONTRATO DE CONSULTORIA
063/2023 y CONTRATO DE OBRA 045/2022.

Referencia: **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 063 DE 2022 CON OBJETO:
"REALIZAR LAS INTERVENTORÍAS TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS,
FINANCIERAS Y AMBIENTALES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO
1 OPCIÓN 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE"**

**CONTRATO DE OBRA NO. 045 DE 2022, "REALIZAR LOS ESTUDIOS,
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE
TIPO I OPCIÓN I, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE".**

Cordial saludo,

Mediante la presente, envío de manera formal las actas de reinicio N° 4 correspondientes a CONTRATO DE CONSULTORIA 063/2023 y CONTRATO DE OBRA 045/2022 respectivamente.

Se le agradece por de más de las actas que ya se les ha enviado anteriormente para que por favor nos colabore con la debida firma, esto con el fin de dejar el

CALLE 2 N° 7-42 CRAVO NORTE
CEL:3208849631
r-arguello87@hotmail.com



UNIÓN TEMPORAL
SACUDETE CRAVO NORTE
NIT. 901.585.865-2

archivo en orden cronológico y a su vez actualizar las pólizas que amparan dichos contratos.

Agradezco la atención prestada. Quedo al pendiente, sin otro particular.

Cordialmente,

HERMES JAVIER BARRERA BLANCO

C.C. 17.587.277 de Arauca

R/L UNION TEMPORAL SACUDETE CRAVO NORTE

NIT:901.585.865-2

Copia a la obra.

YAJAIRA MARYURI TOVAR CISNEROS

R/L. UNION TEMPORAL PARQUE SACUDETE CRAVO NORTE

Contratista

CALLE 2 N° 7-42 CRAVO NORTE

CEL:3208849631

r-arguello87@hotmail.com
