

F-212/15



MININTERIOR

## MEMORANDO

MEM15-000030454-SIN-4020

Bogotá, D.C. Martes, 01 de Septiembre de 2015

**PARA:** Doctora Luz Mary Rincón Romero, Subdirectora de Gestión Contractual

**DE:** Subdirección de Infraestructura

**ASUNTO:** Entrega de informes de apoyo a la supervisión de los meses MAYO Y JUNIO convenios CIC (Colocar No. de radicado que se responde)

Adjunto envió documentación de soporte de los convenios de apoyo celebrados entre el Ministerio del Interior y los Municipios; Informes entregados por parte del apoyo de la supervisión del Ministerio:

### RELACION MES DE MAYO:

1. Informe mensual del mes de Mayo – Ministerio F- 208 COELLO , 3 folios
2. Informe mensual del mes de Mayo – Ministerio F- 247 PALOCABILDO , 3 folios
3. Informe mensual del mes de Mayo – Ministerio F- 212 SAN JOSE DE FRAGUA , 3 folios
4. Informe mensual del mes de Mayo – Ministerio F- 218 SAN LUIS , 3 folios
5. Informe mensual del mes de Mayo – Ministerio F- 232 SAN VICENTE DEL CAGUAN , 3 folios
6. Informe mensual del mes de Mayo – Ministerio F- 223 CARTAGENA DEL CHAIRA, 3 folios
7. Informe mensual del mes de Mayo – Ministerio F- 222 ALBANIA , 3 folios
8. Informe mensual del mes de Mayo – Ministerio F- 210 SALDAÑA, 3 folios
- 9.

### RELACION MES DE JUNIO:

1. Informe mensual del mes de Junio – Ministerio F- 208 COELLO , 4 folios
2. Informe mensual del mes de Junio – Ministerio F- 247 PALOCABILDO , 4 folios
3. Informe mensual del mes de Junio – Ministerio F- 212 SAN JOSE DE FRAGUA , 4 folios
4. Informe mensual del mes de Junio – Ministerio F- 218 SAN LUIS , 4 folios
5. Informe mensual del mes de Junio – Ministerio F- 232 SAN VICENTE DEL CAGUAN , 4 folios
6. Informe mensual del mes de Junio – Ministerio F- 223 CARTAGENA DEL CHAIRA, 4 folios
7. Informe mensual del mes de Junio – Ministerio F- 222 ALBANIA , 4 folios
8. Informe mensual del mes de Junio – Ministerio F- 210 SALDAÑA , 4 folios
9. Informe mensual del mes de Junio – Ministerio F- 204 ICONONZO , 4 folios

- 10. Informe mensual del mes de Junio – Ministerio F- 185 MURILLO , 4 folios
- 11. Informe mensual del mes de Junio – Ministerio F- 214 ARMERO - GUAYABAL , 5 folios
- 12. Informe mensual del mes de Junio – Ministerio F- 211 SOLITA , 5 folios

Cordialmente


  
**ARQ. JUAN JOSÉ BLANCO OVIEDO**

~~Apoya la supervisión~~

Elaboró: Juan José Blanco Oviedo  
Revisó: Harry Salamanca  
Aprobó: Harry Salamanca

TRD: 4022 de 2015.




 <b>MinInterior</b> Ministerio del Interior	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	<b>Código:</b> GC-P-03-F-02
		<b>Versión:</b> 04
		<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2013
		<b>Vigente Desde:</b> 26/08/2013

**INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FONSECON**  
**CONTRATO F -212 de 2015 - INFORME MES DE MAYO DEL AÑO 2015.**

**1. GENERALIDADES CONVENIO**

<b>OBJETO:</b>	<i>"Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros entre las partes para promover la gobernabilidad y la seguridad ciudadana a través de la construcción de infraestructura, mediante la ejecución del proyecto denominado "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA en el Municipio de SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA"</i>		
<b>BENEFICIARIO:</b>	<b>SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA</b>		
<b>VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO</b>	<b>TOTAL DEL CONVENIO</b>	<b>\$ 735.000.000,00</b>	
	<b>APORTES MIN - FONSECON</b>	<b>\$ 735.000.000,00</b>	
	<b>APORTES MUNICIPIO</b>	<b>\$ 00</b>	
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	Hasta el 30 DE Noviembre de 2015		
<b>PRODUCTOS</b>	<b>PRESUPUESTO VIABILIZADO</b>	<b>PRESUPUESTO ADJUDICADO</b>	<b>DIFERENCIA</b>
Estudios y diseños	\$ ,00	\$ ,00	\$,00
Interventoría de estudios y diseños	\$ ,00	\$ ,00	\$,00
Obra	\$ ,00	\$ ,00	\$,00
Interventoria de obra	\$ ,00	\$ ,00	\$,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 735.000.000,00</b>	<b>\$ 735.000.000,00</b>	<b>\$,00</b>
<b>FECHA SUSCRIPCION</b>	<b>06/05/2015</b>		
<b>SUPERVISOR DEL CONVENIO</b>	Harry Salamanca	20/05/2015	
<b>SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL MI</b>	Nº 62115	<b>VALOR</b>	<b>\$ 735.000.000,00</b>
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL</b>	N/A	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>APROBACIÓN DE POLIZA</b>	No. 630-47-994000006141	<b>FECHA</b>	<b>07-MAY-15</b>
<b>FECHA INICIO EJECUCION DEL CONVENIO</b>	<b>07-MAY-15</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS</b>	<b>SOLICITUD 1:</b>		
	<b>SOLICITUD 2:</b>		
<b>FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS</b>	N/A	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

 <b>MinInterior</b> Ministerio del Interior	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	<b>Código:</b> GC-P-03-F-02
		<b>Versión:</b> 04
		<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2013
		<b>Vigente Desde:</b> 26/08/2013

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

### ➤ Convenio interadministrativo

CONCEPTO	FECHA DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO		0.00%		\$,00
SEGUNDO DESEMBOLSO		0.0%		\$,00
TERCER DESEMBOLSO		70.0%		\$,00
ULTIMO DESEMBOLSO		100.0%		\$,00
<b>TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME</b>				\$,00

## 3. POLIZAS CONVENIO


PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
Nº 630-47-994000006141	Cumplimiento	\$ 147.000.000	07-MAY-15	31-MAY-16
	Calidad de servicio	N/A	N/A	N/A
	Pagos y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
	Buen manejo y correcta inversión	N/A	N/A	N/A

## • BALANCES FINANCIEROS DEL PROYECTO

### ➤ Contrato de Ejecución de obra

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR		
Contrato No					
Adicional (recursos de:)					
Nombre contratista					
Fecha De Inicio Del Proyecto					
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ ,00		
CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO D/M/A
ANTICIPO OBRA	ANTICIPO	30%			
PRIMER DESEMBOLSO	100%	60%			
PAGO CONTRA LIQUIDACION	Firma acta	10%			
PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS		
			FECHA INICIO	FECHA FINAL	





**MinInterior**  
 Ministerio del Interior



**FORMATO  
 INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA  
 CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -  
 FONSECON  
 ANEXO 2**

Código: GC-P-03-F-02  
 Versión: 04  
 Fecha Elaboración:  
 25/07/2013  
 Vigente Desde:  
 26/08/2013

Cumplimiento	\$,00		
Estabilidad y calidad de la obra	\$,00		
Pagos y prestaciones sociales	\$,00		
Responsabilidad civil	\$,00		
Calidad del bien	\$,80		
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA		100%	
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA		100%	
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)		100%	
% RECURSOS EJECUTADOS		100%	

➤ *Contrato de Ejecución de Interventoría de obra*

DESCRIPCIÓN		OBJETO		VALOR		
Contrato No						
Adicional (recursos de:)						
Nombre contratista						
Fecha De Inicio Del Proyecto						
VALOR TOTAL CONTRATADO:				\$,00		
CONCEPTO		% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO D/M/A
ANTICIPO OBRA		ANTICIPO	30%			
PRIMER DESEMBOLSO		100%	60%			
PAGO CONTRA LIQUIDACION		Firma acta	10%			
PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS			
			FECHA INICIO	FECHA FINAL		
	Cumplimiento del contrato	\$,00				
	Calidad del servicio	\$,00				
	Pagos y prestaciones sociales	\$,00				
	Responsabilidad civil	N/A	N/A	N/A		
	riesgo	N/A	N/A	N/A		
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA				100%		
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA				100%		
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)				100%		
% RECURSOS EJECUTADOS				100%		

 	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	<b>Código:</b> GC-P-03-F-02
		<b>Versión:</b> 04
		<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2013
		<b>Vigente Desde:</b> 26/08/2013

• **DEL MUNICIPIO:**

FECHA DE ULTIMO INFORME: 03-06-15

• **INFORME DEL SUPERVISOR:**

**DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:**

**INFORME:** MAYO DE 2015

**AVANCE:** 10%

**ESTADO:** ACTIVO

**RECURSOS GIRADOS:** 0%

**Pendiente por recibir**

- **A la fecha se puede decir que el municipio va acorde con lo estipulado en cronograma**

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

- Día 22/05/15
- - Recibí documentación de este convenio por parte de la Ing. Martha Villareal el día 22 de este mes de 2015 ; descritos así :
- 1- Designación del supervisor por parte del municipio Ing. Diego Fernández Bolaños
- 2- Copia de su tarjeta profesional
- 3- Copia de su cedula
- 4- Cronograma de actividades
- NOTA : Cabe anotar que no se había podido actualizar el sipi debido a que aun no tenia usuario para ingresar además de la carga de los proyectos designados . activaron vienes 22 de mayo de 2015 horas de la tarde.
- - Día 25/05/15
- - Se le envió correo al supervisor colocándolo en contexto y solicitándole los documentos requeridos en esta etapa para lograr los objetivos del convenio
- 
- - En el día de ayer recibí por parte de la arquitecta maria carolina avena los siguientes documentos del presente convenio descritos así :
- 
- 1- Formato acta de inicio de contrato o convenio
- 2- Carta de compromiso (firmada por el sr alcalde )
- 3- Copia de póliza ( radicada 08/05/15)
- 4- Copia del cronograma de actividades correspondientes a las actividades precontractuales- contractuales y post contractual
- Por otro lado ayer al final de la tarde se pudo rescatar la aprobación de póliza del presente convenio ..
- 
- Día 26/05/15
- - Se le tomo la firma al arquitecto Harry ( Acta de inicio de contrato )
- 
- - Hoy llego por parte del municipio acto administrativo por medio del cual se incorporan los recursos suministrados por parte del ministerio al presupuesto del municipio .. se adjunta documento
-





MinInterior  
Ministerio del Interior

FORMATO  
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA  
CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -  
FONSECON  
ANEXO 2

Código: GC-P-03-F-02

Versión: 04

Fecha Elaboración:  
25/07/2013

Vigente Desde:  
26/08/2013


192

Cumplimiento	\$,00		
Estabilidad y calidad de la obra	\$,00		
Pagos y prestaciones sociales	\$,00		
Responsabilidad civil	\$,00		
Calidad del bien	\$,80		
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA		100%	
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA		100%	
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)		100%	
% RECURSOS EJECUTADOS		100%	

➤ Contrato de Ejecución de Interventoría de obra

DESCRIPCIÓN		OBJETO		VALOR		
Contrato No						
Adicional (recursos de:)						
Nombre contratista						
Fecha De Inicio Del Proyecto						
VALOR TOTAL CONTRATADO:				\$,00		
CONCEPTO		% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO D/M/A
ANTICIPO OBRA		ANTICIPO	30%			
PRIMER DESEMBOLSO		100%	60%			
PAGO CONTRA LIQUIDACION		Firma acta	10%			
PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS			
			FECHA INICIO	FECHA FINAL		
	Cumplimiento del contrato	\$,00				
	Calidad del servicio	\$,00				
	Pagos y prestaciones sociales	\$,00				
	Responsabilidad civil	N/A	N/A	N/A		
	riesgo	N/A	N/A	N/A		
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA				100%		
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA				100%		
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)				100%		
% RECURSOS EJECUTADOS				100%		



 <div> MinInterior  Ministerio del Interior </div>	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	<b>Código:</b> GC-P-03-F-02
		<b>Versión:</b> 04
		<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2013
		<b>Vigente Desde:</b> 26/08/2013

• **DEL MUNICIPIO:**

FECHA DE ULTIMO INFORME: 03-06-15

• **INFORME DEL SUPERVISOR:**

<b>DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:</b> <b>INFORME:</b> MAYO DE 2015 <b>AVANCE:</b> 10% <b>ESTADO:</b> ACTIVO <b>RECURSOS GIRADOS:</b> 0%  <b>Pendiente por recibir</b> - <b>A la fecha se puede decir que el municipio va acorde con lo estipulado en cronograma</b>  <b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b> - Día 22/05/15 - - Recibí documentación de este convenio por parte de la Ing. Martha Villareal el día 22 de este mes de 2015 ; descritos así : - 1- Designación del supervisor por parte del municipio Ing. Diego Fernández Bolaños - 2- Copia de su tarjeta profesional - 3- Copia de su cedula - 4- Cronograma de actividades - NOTA : Cabe anotar que no se habia podido actualizar el sipi debido a que aun no tenia usuario para ingresar además de la carga de los proyectos designados . activaron viernes 22 de mayo de 2015 horas de la tarde. - - Día 25/05/15  - - Se le envió correo al supervisor colocándolo en contexto y solicitándole los documentos requeridos en esta etapa para lograr los objetivos del convenio - - - En el día de ayer recibí por parte de la arquitecta maria carolina avena los siguientes documentos del presente convenio descritos así : - - 1- Formato acta de inicio de contrato o convenio - 2- Carta de compromiso (firmada por el sr alcalde ) - 3- Copia de póliza ( radicada 08/05/15) - 4- Copia del cronograma de actividades correspondientes a las actividades precontractuales- contractuales y post contractual - Por otro lado ayer al final de la tarde se pudo rescatar la aprobación de póliza del presente convenio .. - - Día 26/05/15 - - Se le tomo la firma al arquitecto Harry ( Acta de inicio de contrato ) - - - Hoy llego por parte del municipio acto administrativo por medio del cual se incorporan los recursos suministrados por parte del ministerio al presupuesto del municipio .. se adjunta documento -
---





**MinInterior**  
Ministerio del Interior

**FORMATO  
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA  
CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -  
FONSECON  
ANEXO 2**

**Código: GC-P-03-F-02**

**Versión: 04**

**Fecha Elaboración:  
25/07/2013**

**Vigente Desde:  
26/08/2013**

- Hoy se envió correo electrónico notificándole a los respectivos supervisores de convenio la importancia del cumplimiento dentro de todas las etapas del mismo, haciendo énfasis y recordándoles la CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ; NUMERALES : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,17,18,23

**CONCLUSIÓN**

**Seguir adelantando toda la gestión para el buen funcionamiento entre las partes para con el convenio**



**ACTAS DE OBRA e INTERVENTORIA**

Acta de cantidades de Ejecución de Obra	
Acta de Recibo y Entrega de Bienes	
Informes final del municipio	

**• VISITAS DE OBRA**


SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA	RECIBO Y ENTREGA DEL BIENE			

**• SUPERVISORES**

SUPERVISOR	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
 <b>ARQ. HARRY SALAMANCA</b> Subdirección de Infraestructura Ministerio - Fonsecon	 <b>ARQ. JUAN JOSE BLANCO</b> Subdirección de Infraestructura Ministerio - Fonsecon





 <b>MinInterior</b> Ministerio del Interior	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	<b>Código:</b> GC-P-03-F-02
		<b>Versión:</b> 04
		<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2013
		<b>Vigente Desde:</b> 26/08/2013

- Hoy se envió correo electrónico notificándole a los respectivos supervisores de convenio la importancia del cumplimiento dentro de todas las etapas del mismo, haciendo énfasis y recordándoles la **CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ; NUMERALES : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,17,18,23**

#### CONCLUSIÓN



**Seguir adelantando toda la gestión para el buen funcionamiento entre las partes para con el convenio**


ACTAS DE OBRA e INTERVENTORIA	
Acta de cantidades de Ejecución de Obra	
Acta de Recibo y Entrega de Bienes	
Informes final del municipio	

#### • VISITAS DE OBRA

SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA	RECIBO Y ENTREGA DEL BIENE			

#### • SUPERVISORES

SUPERVISOR	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
 <b>ARO. HARRY SALAMANCA</b> Subdirección de Infraestructura Ministerio – Fonsecon	 <b>ARO. JUAN JOSE BLANCO</b> Subdirección de Infraestructura Ministerio - Fonsecon

 <b>MinInterior</b> Ministerio del Interior	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	<b>Código:</b> GC-P-03-F-02
		<b>Versión:</b> 04
		<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2013
		<b>Vigente Desde:</b> 26/08/2013


**INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FONSECON**  
**CONTRATO F - 212 de 2015 - INFORME MES DE JUNIO DEL AÑO 2015.**

**1. GENERALIDADES CONVENIO**

<b>OBJETO:</b>	<i>"Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros entre las partes para promover la gobernabilidad y la seguridad ciudadana a través de la construcción de infraestructura, mediante la ejecución del proyecto denominado "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA en el Municipio de SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA"</i>		
<b>BENEFICIARIO:</b>	<b>SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA</b>		
<b>VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO</b>	<b>TOTAL DEL CONVENIO</b>	<b>\$ 735.000.000,00</b>	
	<b>APORTES MIN - FONSECON</b>	<b>\$ 735.000.000,00</b>	
	<b>APORTES MUNICIPIO</b>	<b>\$ 00</b>	
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	Hasta el 30 DE Noviembre de 2015		
<b>PRODUCTOS</b>	<b>PRESUPUESTO VIABILIZADO</b>	<b>PRESUPUESTO ADJUDICADO</b>	<b>DIFERENCIA</b>
Estudios y diseños	\$ ,00	\$ ,00	\$,00
Interventoría de estudios y diseños	\$ ,00	\$ ,00	\$,00
Obra	\$ ,00	\$ ,00	\$,00
Interventoria de obra	\$ ,00	\$ ,00	\$,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 735.000.000,00</b>	<b>\$ 735.000.000,00</b>	<b>\$,00</b>
<b>FECHA SUSCRIPCION</b>	<b>06/05/2015</b>		
<b>SUPERVISOR DEL CONVENIO</b>	Harry Salamanca	20/05/2015	
<b>SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL MI</b>	Nº 62115	<b>VALOR</b>	<b>\$ 735.000.000,00</b>
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL</b>	N/A	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>APROBACIÓN DE POLIZA</b>	No. 630-47-994000006141	<b>FECHA</b>	<b>07-MAY-15</b>
<b>FECHA INICIO EJECUCION DEL CONVENIO</b>	<b>07-MAY-15</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS</b>	<b>SOLICITUD 1:</b>		
	<b>SOLICITUD 2:</b>		
<b>FECHA DE SUSENSIONES Y REINICIOS</b>	N/A	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>







 <b>MinInterior</b> Ministerio del Interior	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	Código: GC-P-03-F-02
		Versión: 04
		Fecha Elaboración: 25/07/2013
		Vigente Desde: 26/08/2013

	Cumplimiento	\$,00		
	Estabilidad y calidad de la obra	\$,00		
	Pagos y prestaciones sociales	\$,00		
	Responsabilidad civil	\$,00		
	Calidad del bien	\$,80		
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA			100%	
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA			100%	
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)			100%	
% RECURSOS EJECUTADOS			100%	

➤ **Contrato de Ejecución de Interventoría de obra**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR			
Contrato No					
Adicional (recursos de:)					
Nombre contratista					
Fecha De Inicio Del Proyecto					
VALOR TOTAL CONTRATADO:		\$,00			
CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO D/M/A
ANTICIPO OBRA	ANTICIPO	30%			
PRIMER DESEMBOLSO	100%	60%			
PAGO CONTRA LIQUIDACION	Firma acta	10%			
PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS		
			FECHA INICIO	FECHA FINAL	
	Cumplimiento del contrato	\$,00			
	Calidad del servicio	\$,00			
	Pagos y prestaciones sociales	\$,00			
	Responsabilidad civil	N/A	N/A	N/A	
	riesgo	N/A	N/A	N/A	
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA			100%		
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA			100%		
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)			100%		
% RECURSOS EJECUTADOS			100%		



 	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	<b>Código:</b> GC-P-03-F-02
		<b>Versión:</b> 04
		<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2013
		<b>Vigente Desde:</b> 26/08/2013

• **DEL MUNICIPIO:**

FECHA DE ULTIMO INFORME: NO HA ENVIADO A LA FECHA

• **INFORME DEL SUPERVISOR:**

**DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:**

**INFORME:** MAYO DE 2015

**AVANCE:** 10%

**ESTADO:** ACTIVO

**RECURSOS GIRADOS:** 0%

**Pendiente por recibir**

- **A la fecha se puede decir que el municipio va acorde con lo estipulado en cronograma**
- **Estudios y Diseños – están trabajando en eso ..**

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

**Se enviaron correos – se charlo con los distintos municipios para verificar la gestión individual con respecto a cada convenio – Se copian archivos del presente mes.**

- **CORREO ENVIADO EL 1 JUNIO**  
Buenas tardes.  
Srs. supervisores

Por medio del presente les reitero a todos aquellos supervisores que aun no están al día con la documentación requerida para esta etapa del convenio por favor prestarle atención a las clausulas consagradas en el mismo y de manera inmediata hacer llegar a esta supervisión lo requerido y comprometidos dentro de la carta de compromiso firmada por los respectivos alcaldes.

**1-** Aprovecho para recordarles adjuntar también la **certificación bancaria** del municipio para que repose en nuestras manos a lo hora de los respectivos desembolsos



**2-Numeral 2** Presentar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del convenio, un cronograma detallado de las actividades precontractuales, contractuales y post contractuales para el cumplimiento del objeto del convenio, que contenga hitos de control y seguimiento, el tiempo estimado de contratación y ejecución de los contratos con terceros, el cual será revisado y aprobado por el supervisor del Ministerio del Interior

**3-Numeral 3** Dar estricto cumplimiento al cronograma presentado y aprobado por el Ministerio / FONSECON.

**4- Numeral 6,** Adelantar de manera simultánea todas las gestiones administrativas, contractuales y financieras necesarias para la contratación de la consultoría con su respectiva interventoría (externa), la cual deberá contener como mínimo, el estudio de suelos, cálculo y diseño de cimentación y estructura, ajustes a diseños hidráulicos, sanitarios, arquitectónicos, eléctricos y al presupuesto soportados con los análisis de precios unitarios "APU", de acuerdo con los precios del mercado de la región y cronograma de obra, ajustados, en todo caso a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios vigentes.

**Por último recordar que la clausula cuarta determina que el plazo para la ejecución del convenio es hasta el 30 de Noviembre de 2015.**

Para todos los efectos relacionados con la supervisión del convenio de la referencia se podrán contactar con mi persona Arq. Juan José Blanco Oviedo al 300 689 90 02 y a este correo electrónico.

 	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	<b>Código: GC-P-03-F-02</b>
		<b>Versión: 04</b>
		<b>Fecha Elaboración:</b> <b>25/07/2013</b>
		<b>Vigente Desde:</b> <b>26/08/2013</b>

- **CORREO ENVIADO EL 2 DE JUNIO**

Buenas noches.  
Sr. supervisor.

Por medio del presente adjunto lo aquí descrito así:

- 1- Acta de inicio convenio
- 2- Carta de compromiso firmada por el Sr alcalde
- 3- Aprobación de póliza

Teniendo en cuenta que los documentos requeridos y aquí descritos se encuentran al día les recuerdo gestionar y a adelantar los procesos contractuales con el objeto de realizar Estudios - Diseños e Interventoría del respectivo CIC - Centro de Integración Ciudadana; Les reitero por favor hacer llegar a esta supervisión todos los documentos para cumplir con el objeto y supervisión de dicho convenio.

Por último recordar que la cláusula cuarta determina que el plazo para la ejecución del convenio es hasta el 30 de Noviembre de 2015.

- **CORREO ENVIADO 19 DE JUNIO**

Buen día.

Por medio del presente adjunto valla informativa del convenio entre el Municipio y Ministerio del Interior con el objeto de "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana — CIC.

**CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:**

**Numeral 37.** Dentro de los 20 días calendario siguientes a la firma del Convenio, deberá instalar una valla informativa, con una dimensión mínima de **2.00 m x 4.00 m**, visible para toda la comunidad, que señale el nombre del proyecto, el valor, el plazo previsto para su terminación y el señalamiento de que la obra está siendo financiada por el **MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON**

Cordialmente

- **CORREO ENVIADO EL 24 DE JUNIO**

Buenas Tardes.  
Srs. Supervisores



Me permito informarles a través de este medio la importancia que hay que darle al convenio firmado y ver que los faltantes en cuanto a documentación, gestión e información de ustedes hacia esta supervisión arrojan posibles incumplimientos. Por tal motivo les agradezco aquellos municipios que están debiendo documentación al respecto ponerse al día lo antes posible.

Teniendo en cuenta todas las cláusulas suscritas en el presente y en especial las contenidas en la **CLÁUSULA SEGUNDA -OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO**, y los numerales:

**Numeral 1,** Designar un supervisor para el Convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o Ingeniería civil.

**Numeral 2,** Presentar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del convenio, un cronograma detallado de las actividades precontractuales, contractuales y post contractuales para el cumplimiento del objeto del convenio, que contenga hitos de control y seguimiento, el tiempo estimado de



 	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	<b>Código:</b> GC-P-03-F-02
		<b>Versión:</b> 04
		<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2013
		<b>Vigente Desde:</b> 26/08/2013

contratación y ejecución de los contratos con terceros, el cual será revisado y aprobado por el supervisor del Ministerio del Interior

**Numeral 3,** Dar estricto cumplimiento al cronograma presentado y aprobado por el Ministerio / FONSECON.

**Numeral 5,** Entregar el lote descapotado, nivelado, libre de construcciones y cualquier limitante física o legal, previo a la suscripción del acta de inicio de la obra, asumiendo los costos.

**Numeral 6,** Adelantar de manera simultánea todas las gestiones administrativas, contractuales y financieras necesarias para la contratación de la consultoría con su respectiva interventoría (externa), la cual deberá contener como mínimo, el estudio de suelos, cálculo y diseño de cimentación y estructura, ajustes a diseños hidráulicos, sanitarios, arquitectónicos, eléctricos y al presupuesto soportados con los análisis de precios unitarios "APU", de acuerdo con los precios del mercado de la región y cronograma de obra, ajustados, en todo caso a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios vigentes.

**Numeral 7,** Adelantar de manera simultánea, todas las gestiones administrativas, Contractuales y financieras necesarias para la contratación de la obra y de la Interventoría, ajustados, *en todo caso* a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y su decretos reglamentarios vigentes.

**Numeral 8,** Aprobar a través del supervisor del convenio designado por el MUNICIPIO, el estudio de suelos, cálculo y diseño de cimentación y estructura, ajustes a diseños hidráulicos, sanitarios, arquitectónicos, eléctricos y al presupuesto que resulten de la consultoría, previamente aprobado por el interventor.

**Numeral 9,** Presentar al supervisor designado por el Ministerio 1 FONSECON, los documentos producto de la consultoría e interventoría, debidamente aprobados por el interventor y el supervisor designado por el municipio. El supervisor por parte del Ministerio, deberá recibir a satisfacción, lo cual es requisito indispensable para el inicio de las gestiones para la contratación de la obra e interventoría.

**Numeral 17,** Comunicar al Ministerio- FONSECON la fecha de recibo de los recursos girados para la ejecución del objeto del Convenio.

**Numeral 18,** Incorporar al presupuesto del MUNICIPIO la totalidad de los recursos que gire el MINISTERIO- FONSECON.

**Numeral 23,** Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros Cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, indicando los porcentajes de avance y ejecución de acuerdo con el cronograma presentado y previamente aprobado por la Interventoría, al informe se deberán adjuntar los soportes respectivos.


Por todo lo anterior solicito el estado actual de los procesos contractuales la gestión de los contractuales; Esta supervisión le exige el cumplimiento de los mismos para poder continuar con el objeto del presente convenio. Así como los correspondientes soportes de toda la gestión adelantada y los correspondientes informes vencidos sin entregar.

Para todos los efectos relacionados con la supervisión del convenio de la referencia se podrán contactar con mi persona Arq. Juan José Blanco Oviedo al 300 689 90 02 y a este correo electrónico.

**NOTA:** Por favor aquellos municipios que estén al día hacer caso omiso, pero no bajen la guardia y continúen en ese camino es la única forma de cumplir los objetivos trazados

#### **CONCLUSIÓN**

**Seguir adelantando toda la gestión para el buen funcionamiento entre las partes para con el convenio**



 <b>MinInterior</b> Ministerio del Interior	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	<b>Código:</b> GC-P-03-F-02
		<b>Versión:</b> 04
		<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2013
		<b>Vigente Desde:</b> 26/08/2013

ACTAS DE OBRA e INTERVENTORIA	
Acta de cantidades de Ejecución de Obra	
Acta de Recibo y Entrega de Bienes	
Informes final del municipio	

• **VISITAS DE OBRA**

<b>SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA</b>	<b>RECIBO Y ENTREGA DEL BIENE</b>		

• **SUPERVISORES**

<b>SUPERVISOR</b>	<b>PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN</b>
 <b>ARQ. HARRY SALAMANCA</b> Subdirección de Infraestructura Ministerio – Fonsecon	 <b>ARQ. JUAN JOSE BLANCO O</b> Subdirección de Infraestructura Ministerio - Fonsecon



**MEMORANDO**

**MEM15-000031993-SIN-4020**

Bogotá, D.C. Jueves, 10 de Septiembre de 2015

**PARA:** Doctora Luz Mary Rincón Romero, Subdirectora de Gestión Contractual

**DE:** Subdirección de Infraestructura

**ASUNTO:** Entrega de documentos de supervisión del convenio F- 212 - 2015 del municipio de SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA. (Colocar No. de radicado que se responde)

Adjunto envió documentación de soporte del convenio F- 212 – 2015 celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA

1. Acta inicio del convenio , 1 folios
2. Carta de Compromiso Convenio, 1 folios
3. Designación de supervisor del Municipio, 3 folios
4. Certificación Bancaria, 1 folios
5. Incorporación de recursos del Ministerio al presupuesto del Municipio, 1 folios
6. Cronograma de actividades , 3 folios
7. Contrato de interventoria de Estudios y Diseños , 1 folios
8. Contrato de consultoria de Estudios y Diseños , 2 folios
9. Informe mensual del mes de Julio – Ministerio , 4 folios
10. Informe mensual del mes de Mayo –Municipio , 2 folios
11. Informe mensual del mes de Junio –Municipio , 3 folios
12. Informe mensual del mes de Julio –Municipio , 2 folios
13. Copia de acta de aprobación de Estudios y diseños
- 14.3 – AZ proyecto Estudios y Diseños planos y documentos. 460 folios

Cordialmente

**ARO. JUAN JOSE BLANCO OVIEDO**

Apoyo a la supervisión del convenio F-212 -2015

**HARRY SALAMANCA LUCAS**

Supervisor Convenio F-212 de 2015

Elaboró: Juan José Blanco Oviedo



Revisó: Harry Salamanca

Aprobó: Harry Salamanca

TRD: 4022 F- 212 de 2015.





 	<b>FORMATO</b> <b>ACTA DE INICIO DE CONTRATO O</b> <b>CONVENIO</b> <b>ANEXO 3</b>	Código: GC-P-03-F-03
		Versión: 04
		Fecha Elaboración: 25/07/2013
		Vigente Desde: 26/08/2013

En Bogotá, a los 8 días del mes de Mayo de 2015, se reunieron en Subdirección de Infraestructura del Ministerio del Interior, el señor(a) CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 17 651 020 Representante Legal del Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA, identificado con el NIT No 800 095 782-0, y el Arquitecto HARRY SALAMANCA LUCAS identificado con cedula de ciudadanía No. 79.988.325 expedida en Bogotá en su calidad de supervisor del convenio F- 212 de 2015, con el fin de dar inicio a la ejecución del mismo.

El supervisor del convenio por parte del Ministerio del Interior manifiesta que ha verificado el cumplimiento de los requisitos que permiten dar inicio a la ejecución del convenio, de acuerdo con lo establecido en la cláusula Vigésima Tercera.- Requisitos de Perfeccionamiento, Ejecución y Legalización del mismo.

El objeto del convenio es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la seguridad ciudadana, a través denominado "CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC, en el Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA".

El plazo pactado en el convenio es hasta el 30 NOVIEMBRE DE 2015.


El valor total del convenio es SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$735.000.000,00) **MONEDA LEGAL**.

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

Supervisor

  
 Firma Supervisor  
 HARRY SALAMANCA LUCAS

Contratista

  
 Firma Alcalde(sa)

Copia: Dra. Luz Mary Rincón, Subdirectora de Gestión Contractual, para su información y fines pertinentes (Archivar carpeta ConvenioF-\_\_\_ de 2014)

Elaboró: Harry Salamanca  
 Revisó: Harry Salamanca  
 Aprobó: María Fernanda Álvarez

## CARTA DE COMPROMISO


Yo, CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR en mi calidad de Alcalde Municipal del municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA me comprometo a presentar de acuerdo a los plazos establecidos para cumplir el presente instructivo el cual se basa en el convenio suscrito para el proyecto de Centro de Integración Ciudadana así:

- El municipio deberá constituir dentro de los cinco (05) primeros días hábiles a la firma del convenio a favor del Ministerio del Interior o de los Fondos a su cargo, garantía de cumplimiento, por una cuantía equivalente al diez (10%) del valor total del contrato y una duración igual al plazo del mismo y cuatro (04) meses más.
- Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil, dentro de los dos días hábiles siguientes a la firma del convenio.
- Presentar dentro de los cinco (05) primeros días hábiles a la firma del convenio un cronograma detallado de las actividades precontractuales, contractuales y post contractuales para el cumplimiento del objeto del convenio que contenga hitos de control y seguimiento, el tiempo estimado de contratación y ejecución de los contratos con terceros, el cual será revisado y aprobado por el supervisor del Ministerio del Interior.
- Dar estricto cumplimiento al cronograma presentado y aprobado por el Ministerio- FONSECON.
- Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución contractual.
- Incorporar al presupuesto del Municipio la totalidad de los recursos que gire el MINISTERIO- FONSECON.
- Entregar el lote, descapotado, nivelado, libre de construcciones y cualquier limitante física o legal, previo a la suscripción del acta de inicio de obra.
- Adelantar de manera simultánea todas las gestiones administrativas, contractuales y financieras necesarias para la contratación de la consultoría con su respectiva interventoría (externa), la cual deberá contener como mínimo, el estudio de suelos, cálculo y diseño de cimentación y estructura, ajustes a diseños hidráulicos, sanitarios, arquitectónicos, eléctricos y el presupuesto soportado por los análisis de precios unitarios A.P.U.'s de acuerdo con los precios de mercado de la región y cronograma de obra, ajustado en todo caso a las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios vigentes.
- Adelantar de manera simultánea todas las gestiones administrativas, contractuales y financieras necesarias para la contratación de la obra y de la interventoría, ajustado en todo caso a las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios vigentes.

Hago constar que recibo un CD que contiene:

- Planos arquitectónicos.
- Planos de estructura metálica.
- Plano eléctrico, voz y datos.
- Planos hidrosanitarios.
- Planos estructuras en concreto.
- Modelo presupuesto.
- Especificaciones.

De no aportarse por parte del municipio la documentación relacionada en el plazo indicado, se entenderá que el Municipio no está interesado en la ejecución del convenio y el Ministerio del Interior podrá disponer de los recursos aprobados por FONSECON para el proyecto e iniciar la liquidación del mismo.



Alcalde Municipal





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA  
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA  
NIT: 800 095 782 0



## DESPACHO ALCALDE

San José del Fragua, 11 Mayo de 2015

Señores  
**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
Subdirección de Infraestructura  
Bogotá D.C.

Martha Ce  
1515/15

D.A. 0552

Honorable  
Mayo 13/15  
MFD

Ref: Convenio Interadministrativo de Cofinanciación N° F. 212 de 2015

Asunto: Designación de Supervisor.

Respetados señores,

Por medio de la presente me permito designar ante ustedes al Ingeniero Civil **DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ BOLAÑOS**, Secretario de Planeación Municipal; identificado con Cedula de Ciudadanía No. 6'805.394 expedida en Florencia – Caquetá y matrícula profesional N° 25202198462CND como Supervisor del convenio de la referencia y para los contratos que se deriven del mismo.

Cordialmente,

  
**CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR**

C.C. 17.651.020 de Florencia Caquetá

Alcalde Municipal

San José de Fragua- Caquetá

Ministerio del Interior

República de Colombia

Teléfono PBX: +(57)1 2427400

Radicado Externo: EXTM15-0021018

Fecha y hora de radicado: 11-may-2015 15:54:56

Cantidad de anexos: 2

Funcionario Radicador: Vázquez Español, Ana María

Área destinataria: Subdirección de Infraestructura

Funcionario responsable: Corchuelo Maldonado, Flora Stella

**REGISTRANDO EL CAMBIO**

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia

CODIGO POSTAL: 186070

[www.sanjose-caqueta.gov.co](http://www.sanjose-caqueta.gov.co)

E - Mail: [alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co](mailto:alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co)

[contactenos@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co)

Stella  
12 Mayo 15  
10<sup>45</sup> Am.

Juan José

## INGENIERO CIVIL



Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.


En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.

**DIEGO ALEJANDRO FERNÁNDEZ B.**



# INGENIERO CIVIL





**ESTE ES SU BANCO**

www.bancopopular.com.co

**OFICINA (620) FLORENCIA**

## **EL BANCO POPULAR OFICINA FLORENCIA**

### **HACE CONSTAR:**

Que el(a) señor(a) (entidad) **MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA** identificado(a) con **NIT. No. 800.095.782-0**, es titular de la cuenta **ahorros No.220-620-28051-1** denominada **CONSTRUCCION CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA (CIC) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETÁ**, la cual se encuentra en estado **NUEVA** a la fecha, y genera rendimientos financieros.

La presente se expide por solicitud del interesado, con destino a **MINISTERIO DEL INTERIOR**

Dada en Florencia Caquetá, el día 05 de Mayo de 2015.

  
**ERIC GIOVANNI PAREDES SCARPETA**  
Asesor Comercial 1º

**OFICINA FLORENCIA**  
**SECCION AHORROS**



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ  
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA  
NIT. 800 095 782 - 0



DESPACHO DEL ALCALDE

DECRETO No. 065 DE 2015

(Mayo 12)

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA UNOS RECURSOS AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA"

El Alcalde Municipal en uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las que le confiere el literal G del Artículo 91 de Ley 136 de 1994 (Adicionado por el Artículo 29 de la Ley 1551 de 2012) y

CONSIDERANDO

a. El Artículo 91 de Ley 136 de 1994 (Adicionado por el Artículo 29 de la Ley 1551 de 2012) establece:

"Artículo 91. Funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo.

Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes:

g) Incorporar dentro del presupuesto municipal, mediante decreto, los recursos que haya recibido el tesoro municipal como cofinanciación de proyectos provenientes de las entidades nacionales o departamentales, o de cooperación internacional y adelantar su respectiva ejecución. Los recursos aquí previstos así como los correspondientes a seguridad ciudadana provenientes de los fondos territoriales de seguridad serán contratados y ejecutados en los términos previstos por el régimen presupuestal.

Una vez el ejecutivo incorpore estos recursos deberá informar al Concejo Municipal dentro de los diez (10) días siguientes."

b. Que el Alcalde suscribió el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F 212 del 07 de Mayo de 2015 con el Ministerio del Interior - cuyo objeto corresponde a "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CUIDADANA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA" por valor de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$735.000.000=)

d. Que se hace necesario realizar la respectiva adición presupuestal a fin de dar cumplimiento al estatuto orgánico de presupuesto y ejecutar los recursos asignados.

e. Que en merito de lo anterior,

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Créese y adiciónese en el presupuesto de Ingresos el rubro que a continuación se describe, con el monto señalado:

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	TOTAL
01	INGRESOS TOTALES	735,000,000.00
0102	INGRESOS DE CAPITAL	735,000,000.00
010201	Cofinanciación	735,000,000.00
01020101	Cofinanciación nacional - nivel central	735,000,000.00
0102010305	Programas otros sectores	735,000,000.00
010201030502	Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F 212 del 07 de Mayo de 2015 con el Ministerio del Interior	735,000,000.00

ARTICULO SEGUNDO: Créese y adiciónese en el presupuesto de Gastos\*el rubro que a continuación se describe, con el monto señalado:

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	TOTAL
----------	----------------------	-------

REGISTRANDO EL CAMBIO

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San Jose del Fragua - Caquetá - Colombia

www.sanjose-caqueta.gov.co

E-Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co





REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ  
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA  
NIT. 800 095 782 - 0



DESPACHO DEL ALCALDE

02	PRESUPUESTO DE GASTOS	735,000,000.00
0202	TOTAL INVERSIÓN	735,000,000.00
020204	INVERSIÓN CON INGRESOS DE CAPITAL	735,000,000.00
02020401	Cofinanciación	735,000,000.00
0202040101	Cofinanciación nacional - nivel central	735,000,000.00
020204010105	Programas otros sectores	735,000,000.00
02020401010502	Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F 212 del 07 de Mayo de 2015 con el Ministerio del Interior	735,000,000.00

ARTICULO TERCERO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en el Despacho del Alcalde Municipal de San José del Fragua - Caquetá, a los doce ( 12 ) días del mes de Mayo del año Dos Mil Quince (2015).


  
CARLOS ENRIQUE DÍAZ SALAZAR  
Alcalde Municipal

PROYECTO.  
BERTULIO CABRERA PLAZAS  
REVISÓ.  
HERMES GAITAN

REGISTRANDO EL CAMBIO  
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San Jose del Fragua – Caquetá – Colombia  
[www.sanjose-caqueta.gov.co](http://www.sanjose-caqueta.gov.co)  
E-Mail: [alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co](mailto:alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co)



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA  
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA  
NIT: 800 095 782 0



**DESPACHO ALCALDE**

San José del Fragua, 14 de Mayo de 2015

D-A-M – 458

señores

**MINISTERIO DEL INTERIOR**

Subdirección de Infraestructura

Bogotá D.C.

ASUNTO: Adjunto Cronograma Actividades CIC convenio interadministrativo de cofinanciación No F 212 - 2015

Respetados Señores:

Con gusto me permito remitir el cronograma correspondiente a las actividades precontractuales, contractuales y post contractual aprobado por el supervisor designado, ingeniero civil Diego Alejandro Fernández Bolaños, el cual se expone para su correspondiente aprobación.

Cordial Saludo,

**CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR**

Alcalde Municipal

**REGISTRANDO EL CAMBIO**

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia

CODIGO POSTAL: 186070

[www.sanjose-caqueta.gov.co](http://www.sanjose-caqueta.gov.co)

E - Mail: [alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co](mailto:alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co)







REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA  
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA  
NIT: 800 095 782 O. S.  
DESPACHO DE ALCALDE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1.1	DESIGNAR SUPERVISOR DE CONVENIO	2 DIAS
1.2	PRESENTAR PROYECTO DE DISEÑO DE OBRAS	5 DIAS
1.3	PREPARACION DEL TERRENO (NOTA)	6 DIAS
1.4	PERMITIR EL PASEO DE CONDUCTORES	15 DIAS
1.5	PERMISOS PARA EL PASO DE CONDUCTORES	30 DIAS
1.6	CONTRATACION DE TRABAJADORES	5 DIAS
1.7	SELECCION DE CONTRATISTA PARA OBRAS EXTERNAS	5 DIAS
1.8	SELECCION DE CONTRATISTA PARA OBRAS EXTERNAS	10 DIAS
1.9	SELECCION DE CONTRATISTA PARA OBRAS EXTERNAS	7 DIAS
2.1	SELECCION DE OBRAS	2 DIAS
2.2	SELECCION DE OBRAS	4 DIAS
2.3	SELECCION DE OBRAS	2 DIAS
2.4	SELECCION DE OBRAS	2 DIAS
2.5	SELECCION DE OBRAS	2 DIAS
2.6	SELECCION DE OBRAS	2 DIAS
2.7	SELECCION DE OBRAS	2 DIAS
2.8	SELECCION DE OBRAS	2 DIAS
2.9	SELECCION DE OBRAS	4 DIAS
2.10	SELECCION DE OBRAS	10 DIAS
2.11	SELECCION DE OBRAS	15 DIAS
2.12	SELECCION DE OBRAS	30 DIAS
2.13	SELECCION DE OBRAS	15 DIAS
2.14	SELECCION DE OBRAS	15 DIAS
2.15	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.16	SELECCION DE OBRAS	10 DIAS
2.17	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.18	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.19	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.20	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.21	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.22	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.23	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.24	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.25	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.26	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.27	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.28	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.29	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.30	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.31	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.32	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.33	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.34	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.35	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.36	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.37	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.38	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.39	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.40	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.41	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.42	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.43	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.44	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.45	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.46	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.47	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.48	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.49	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.50	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.51	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.52	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.53	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.54	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.55	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.56	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.57	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.58	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.59	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.60	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.61	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.62	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.63	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.64	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.65	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.66	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.67	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.68	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.69	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.70	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.71	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.72	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.73	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.74	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.75	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.76	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.77	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.78	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.79	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.80	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.81	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.82	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.83	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.84	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.85	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.86	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.87	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.88	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.89	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.90	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.91	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.92	SELECCION DE OBRAS	5 DIAS
2.93	SELECCION DE OBRAS	


PIEGO ALBA FERRER FERNANDEZ  
C.C. 6.805.994 DE FLORENCIA  
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

## REGISTRANDO EL CAMBIO

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua -- Caquetá -- Colombia

[www.sanjose-caqueta.gov.co](http://www.sanjose-caqueta.gov.co)

E-Mail: [alcaldia@sanjosedelfruga-caqueta.gov.co](mailto:alcaldia@sanjosedelfruga-caqueta.gov.co)

[illegible]

## REGISTRANDO EL CAMBIO


Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia

[www.sanjose-caqueta.gov.co](http://www.sanjose-caqueta.gov.co)

E-Mail: [alcaldia@sanjosedelfruga-caqueta.gov.co](mailto:alcaldia@sanjosedelfruga-caqueta.gov.co)



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA  
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA  
NIT: 800 095 782 0  
DESPACHO DE ALCALDE



LA

**REGISTRANDO EL CAMBIO**  
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua -- Caquetá -- Colombia  
[www.san jose-caqueta.gov.co](http://www.san jose-caqueta.gov.co)  
E-Mail: [alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co](mailto:alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co)





Interventoria E y Z



República de Colombia  
Departamento del Caquetá  
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA  
NIT. 800.095.782-0

ACEPTACIÓN OFERTA

Código: MC - 053

Versión: 2

Fecha: 09 - Junio -2015

Página 1 de 2

MINIMA CUANTÍA DE INTERVENTORIA No 053

San José del Fragua, 09 de Junio de 2015.

Señor:

LUIS ANGEL AVILES MURCIA

C.C No 1.118.816.667 de Riohacha - Guajira

Calle 15 No 14 - 34

Florencia - Caquetá

REF: ACEPTACIÓN DE OFERTA DE INTERVENTORIA - PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA - MC - 053 DE 2015.

Respetado Señor:

Me es grato comunicarle que por reunir los requisitos señalados en la Invitación Publica para presentar oferta y enmarcarse los precios ofrecidos en los precios de mercado, la oferta presentada por usted el Tres (03) de Junio de 2015, para el objeto contractual CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA cuyo objeto es CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA; ha sido aceptada.

ESPECIALIDAD	UTILIZACIÓN (%)	TIEMPO	SUELDO BÁSICO	COSTO PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL				
INGENIERO CIVIL CONSULTOR	100%	15.0	91.120,00	1.366.800
				0
PERSONAL ADMINISTRATIVO				
TOTAL COSTOS DE PERSONAL				1.366.800
COSTO DE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR (A)			2.195	3.000.000
VALOR TOTAL				3.000.000

REGISTRANDO EL CAMBIO

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua - Caquetá - Colombia

Código Postal 18 60 70

[www.sanjose-caqueta.gov.co](http://www.sanjose-caqueta.gov.co)

E-mail: [ciudadia@sanjosedelfragua.gov.co](mailto:ciudadia@sanjosedelfragua.gov.co)



República de Colombia  
Departamento del Caquetá  
**MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA**  
NIT. 800.095.782-0

**ACEPTACIÓN OFERTA**

Código: MC - 053

Versión: 2 Fecha: 09 - Junio -2015

Página 2 de 2

**MINIMA CUANTÍA DE INTERVENTORIA No 053**

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo previsto para la ejecución del contrato que se derive del presente proceso es de Quince (15) Días, los cuales se contará a partir del levantamiento del Acta De Inicio de las actividades suscriptas entre el Supervisor y el contratista. Una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.

**VALOR:** El valor del presente contrato es por la suma de **TRES MILLONES DE PESOS (\$ 3.000.000), M/CTE.**

**FORMA DE PAGO:** El municipio realizará un solo pago final previa presentación de los siguientes documentos: 1. Informe expedido por el Interventor. 2. Informe de actividades ejecutadas. 3. Presentación de cuenta y/o factura de cobro por parte del contratista. 4. Acreditación del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007. El supervisor que no verifique el pago al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales incurrirá en causal de mala conducta y estará sujeto a las sanciones establecidas en el Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002).

**GARANTÍAS:** En atención a la forma de pago definida para el presente proceso y para respaldar el cumplimiento se las obligaciones que adquiere en virtud del contrato que se celebre, en atención al análisis efectuado se los riesgos atribuidos a las partes, el contratista deberá constituir a favor del MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA, una garantía de conformidad con lo establecido en el artículo 111 de fecha 06 de febrero de 2014.

**Cumplimiento del Contrato:** Cuantía equivalente al Diez (10%) por Ciento, del valor total del contrato y vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más.

**Calidad del Servicio:** Cuantía equivalente al Diez (10%) por Ciento, del valor total del contrato y vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más.

**Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales:** Cuantía equivalente al Cinco (5%) por Ciento, del valor total del contrato y vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más.

**SUPERVISION:** Será ejercida por quien ejerza por la Secretaría de Planeación del Municipio de San José del Fragua.

En consecuencia, le solicito el desarrollo del objeto contractual bajo las condiciones señaladas en el Estudio Previo y la Invitación Publica.

Atentamente,

  
**CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR**  
Alcalde Municipal

**REGISTRANDO EL CAMBIO**

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua - Caquetá - Colombia

Código Postal 18 60 70


[www.saniose-caqueta.gov.co](http://www.saniose-caqueta.gov.co)

E-Mail: [alcaldia@saniosedelfracua-caqueta.gov.co](mailto:alcaldia@saniosedelfracua-caqueta.gov.co)



Consultoría E y L

100

	República de Colombia	<b>ACEPTACIÓN OFERTA</b>	
	Departamento del Caquetá	Código: MC - 052	
	<b>MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA</b>	Versión: 2	Fecha: 09 - Junio -2015
	NIT. 800.095.782-0	Página 1 de 3	
<b>MÍNIMA CUANTÍA DE CONSULTORIA No 052</b>			

San José del Fragua, 09 de Junio de 2015.

Señor:  
**CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
C.C No 80.233.290 de Bogotá – D.C  
Carrera 5 No 19B - 17  
Florencia - Caquetá

REF: ACEPTACIÓN DE OFERTA DE CONSULTORIA - PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA - MC - 052 DE 2015.

Respetado Señor:

Me es grato comunicarle que por reunir los requisitos señalados en la Invitación Publica para presentar oferta y enmarcarse los precios ofrecidos en los precios de mercado, la oferta presentada por usted el Tres (03) de Junio de 2015, para el objeto contractual CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA; ha sido aceptada.

ESPECIALIDAD	EFECTIVACIÓN (%)	TIEMPO	SUELDO BASICO	COSTO PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL				
INGENIERO CIVIL MAGISTER CONSULTOR	100%	0.5	2,000,000	1,000,000
				0
PERSONAL ADMINISTRATIVO				
TOTAL COSTOS DE PERSONAL				1,000,000
COSTO DE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR (A)			2,195	2,195,300
OTROS COSTOS DIRECTOS				
ESPECIALIDAD	CUN	TARIFA	OCCUPACION TOTAL	COSTO TOTAL

**REGISTRANDO EL CAMBIO**  
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia  
Código Postal 18 60 70  
[www.san jose-caqueta.gov.co](http://www.san jose-caqueta.gov.co)  
E-Mail: [atencion@sanjosedelfragua.gov.co](mailto:atencion@sanjosedelfragua.gov.co)



República de Colombia  
Departamento del Caquetá  
**MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA**  
NIT. 800.095.782-0

#### ACEPTACIÓN OFERTA

Código: MC - 052

Versión: 2 Fecha: 09 - Junio -2015

Página 2 de 3

### MÍNIMA CUANTÍA DE CONSULTORIA No 052

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPO				
Estudio de suelos (incluye equipo y recurso humano)	un	3,600,000	1	3,600,000
OTROS COSTOS				
Ajuste a los diseños	glb	5,000,000	1	5,000,000
Presupuesto y Analisis precios Unitarios	un	1,204,700	1	1,204,700
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS				9,804,700
SUB TOTAL				12,000,000
VALOR TOTAL				12,000,000

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo previsto para la ejecución del contrato que se derive del presente proceso es de Quince (15) Días, los cuales se contará a partir del levantamiento del Acta De Inicio de las actividades suscriptas entre el Supervisor y el contratista. Una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.

**VALOR:** El valor del presente contrato es por la suma de DOCE MILLONES DE PESOS (\$ 12.000.000), M/CTE.

**FORMA DE PAGO:** El municipio realizará un solo pago final previa presentación de los siguientes documentos: 1. Informe expedido por el Interventor. 2. Informe de actividades ejecutadas. 3. Presentación de cuenta y/o factura de cobro por parte del contratista. 4. Acreditación del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007. El supervisor que no verifique el pago al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales incurrirá en causal de mala conducta y estará sujeto a las sanciones establecidas en el Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002).

**GARANTÍAS:** En atención a la forma de pago definida para el presente proceso y para respaldar el cumplimiento se las obligaciones que adquiere en virtud del contrato que se celebre, en atención al análisis efectuado se los riesgos atribuidos a las partes, el contratista deberá constituir a favor del MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA, una garantía de conformidad con lo establecido en el artículo 111 de fecha 06 de febrero de 2014.

**Cumplimiento del Contrato:** Cuantía equivalente al Diez (10%) por Ciento, del valor total del contrato y vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más.

**Calidad del Servicio:** Cuantía equivalente al Diez (10%) por Ciento, del valor total del contrato y vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más.

**Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales:** Cuantía equivalente al Cinco (5%) por Ciento, del valor total del contrato y vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más.

**SUPERVISION:** Será ejercida por quien ejerza por la Secretaria de Planeación del Municipio de San José del Fragua.

### REGISTRANDO EL CAMBIO

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua - Caquetá - Colombia

Código Postal 18 60 70

[www.san jose-caqueta.gov.co](http://www.san jose-caqueta.gov.co)

E-Mail: [alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co](mailto:alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co)



República de Colombia  
Departamento del Caquetá  
**MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA**  
NIT. 800.095.782-0

**ACEPTACIÓN OFERTA**

Código: MC - 052  
Versión: 2      Fecha: 09 - Junio -2015  
Página 3 de 3

**MÍNIMA CUANTÍA DE CONSULTORIA No 052**

En consecuencia, le solicito el desarrollo del objeto contractual bajo las condiciones señaladas en el Estudio Previo y la Invitación Pública.

Atentamente,

  
**CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR**  
Alcalde Municipal

**REGISTRANDO EL CAMBIO**


Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua - Caquetá - Colombia

Código Postal 10 00 70

[www.san jose-caqueta.gov.co](http://www.san jose-caqueta.gov.co)

E-Mail: [alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co](mailto:alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co)




Código: GC-P-03-F-02	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	Código: GC-P-03-F-02
		<b>Versión: 04</b>
		<b>Fecha Elaboración:</b> <b>25/07/2013</b>
		<b>Vigente Desde:</b> <b>26/08/2013</b>

**INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FONSECON**  
**CONTRATO F - 212 de 2015 - INFORME MES DE JULIO DEL AÑO 2015.**

**1. GENERALIDADES CONVENIO**

OBJETO:	<i>"Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros entre las partes para promover la gobernabilidad y la seguridad ciudadana a través de la construcción de infraestructura, mediante la ejecución del proyecto denominado "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA en el Municipio de SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA"</i>		
BENEFICIARIO:	<b>SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA</b>		
VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO	<b>TOTAL DEL CONVENIO</b>	<b>\$ 735.000.000,00</b>	
	<b>APORTES MIN - FONSECON</b>	<b>\$ 735.000.000,00</b>	
	<b>APORTES MUNICIPIO</b>	<b>\$ 00</b>	
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 30 DE Noviembre de 2015		
PRODUCTOS	<b>PRESUPUESTO VIABILIZADO</b>	<b>PRESUPUESTO ADJUDICADO</b>	<b>DIFERENCIA</b>
Estudios y diseños	\$ 12.000.000,00	\$ ,00	\$,00
Interventoría de estudios y diseños	\$ 3.000.000.,00	\$ ,00	\$,00
Obra	\$ ,00	\$ ,00	\$,00
Interventoria de obra	\$ ,00	\$ ,00	\$,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 735.000.000,00</b>	<b>\$ 735.000.000,00</b>	<b>\$,00</b>
FECHA SUSCRIPCION	<b>06/05/2015</b>		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	Harry Salamanca	20/05/2015	
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	NOMBRE	DESDE	HASTA
REGISTRO PRESUPUESTAL MI	Nº 62115	VALOR	\$ 735.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N/A	N/A	N/A
APROBACIÓN DE POLIZA	No. 630-47-994000006141	FECHA	<b>07-MAY-15</b>
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONVENIO	<b>07-MAY-15</b>	N/A	N/A
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	SOLICITUD 1:		
	SOLICITUD 2:		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A	N/A	N/A



 <div>MinInterior</div>	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	<b>Código:</b> GC-P-03-F-02
		<b>Versión:</b> 04
		<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2013
		<b>Vigente Desde:</b> 26/08/2013

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

### ➤ Convenio interadministrativo

CONCEPTO	FECHA DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO		0.00%		\$,00
SEGUNDO DESEMBOLSO		0.0%		\$,00
TERCER DESEMBOLSO		70.0%		\$,00
ULTIMO DESEMBOLSO		100.0%		\$,00
<b>TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME</b>				\$,00

## 3. POLIZAS CONVENIO

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
Nº 630-47-994000006141	Cumplimiento	\$ 147.000.000	07-MAY-15	31-MAY-16
	Calidad de servicio	N/A	N/A	N/A
	Pagos y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
	Buen manejo y correcta inversión	N/A	N/A	N/A

## • BALANCES FINANCIEROS DEL PROYECTO

### ➤ Contrato de Ejecución de obra

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR		
Contrato No					
Adicional (recursos de:)					
Nombre contratista					
Fecha De Inicio Del Proyecto					
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ ,00		
CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO D/M/A
ANTICIPO OBRA	ANTICIPO	30%			
PRIMER DESEMBOLSO	100%	60%			
PAGO CONTRA LIQUIDACION	Firma acta	10%			
PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS		
			FECHA INICIO	FECHA FINAL	

	Código: GC-P-03-02 <b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	Código: GC-P-03-02 <b>Versión: 04</b> <b>Fecha Elaboración:</b> <b>25/07/2013</b> <b>Vigente Desde:</b> <b>26/08/2013</b>
--	---	--

	Cumplimiento	\$,00		
	Estabilidad y calidad de la obra	\$,00		
	Pagos y prestaciones sociales	\$,00		
	Responsabilidad civil	\$,00		
	Calidad del bien	\$,80		
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA			100%	
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA			100%	
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)			100%	
% RECURSOS EJECUTADOS			100%	

➤ *Contrato de Ejecución de Interventoría de obra*

Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra						
DESCRIPCIÓN	OBJETO			VALOR		
Contrato No						
Adicional (recursos de:)						
Nombre contratista						
Fecha De Inicio Del Proyecto						
VALOR TOTAL CONTRATADO:				\$,00		
CONCEPTO		% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO D/M/A
ANTICIPO OBRA		ANTICIPO	30%			
PRIMER DESEMBOLSO		100%	60%			
PAGO CONTRA LIQUIDACION		Firma acta	10%			
PÓLIZA No.	AMPAROS		VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS		
				FECHA INICIO	FECHA FINAL	
	Cumplimiento del contrato		\$,00			
	Calidad del servicio		\$,00			
	Pagos y prestaciones sociales		\$,00			
	Responsabilidad civil		N/A	N/A	N/A	
riesgo		N/A	N/A	N/A		
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA				100%		
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA				100%		
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)				100%		
% RECURSOS EJECUTADOS				100%		





MinInterior  
Ministerio del Interior

**FORMATO**  
**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA**  
**CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -**  
**FONSECON**  
**ANEXO 2**

Código: GC-P-03-F-02

Versión: 04

Fecha Elaboración:  
25/07/2013

Vigente Desde:  
26/08/2013

• **DEL MUNICIPIO:**

FECHA DE ULTIMO INFORME: AL DIA A JULIO

• **INFORME DEL SUPERVISOR:**

**DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:**

**INFORME:** JULIO DE 2015

**AVANCE:** 20%

**ESTADO:** ACTIVO

**RECURSOS GIRADOS:** 0%

**Pendiente por recibir**

- **A la fecha el municipio se encuentra en subsanar los pendientes en cuanto a Estudios y Diseños**
- **Colgados en el cronograma**

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

**Se enviaron correos – se charlo con los distintos municipios para verificar la gestión individual con respecto a cada convenio – Se copian archivos del presente mes.**

• **CORREO ENVIADO POR EL MINISTERIO**

Buenas Tardes.  
Srs. Supervisores

Me permito informarles a través de este medio la importancia que hay que darle al convenio firmado y ver que los faltantes en cuanto a documentación, gestión e información de ustedes hacia esta supervisión arrojan posibles incumplimientos. Por tal motivo les agradezco aquellos municipios que están debiendo documentación al respecto ponerse al día lo antes posible.

Teniendo en cuenta todas las clausulas suscritas en el presente y en especial las contenidas en la **CLAUSULA SEGUNDA -OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO**, y los numerales:

**Numeral 1**, Designar un supervisor para el Convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o Ingeniería civil.


**Numeral 2**, Presentar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del convenio, un cronograma detallado de las actividades precontractuales, contractuales y post contractuales para el cumplimiento del objeto del convenio, que contenga hitos de control y seguimiento, el tiempo estimado de contratación y ejecución de los contratos con terceros, el cual será revisado y aprobado por el supervisor del Ministerio del Interior

**Numeral 3**, Dar estricto cumplimiento al cronograma presentado y aprobado por el Ministerio / FONSECON.

**Numeral 5**, Entregar el lote descapotado, nivelado, libre de construcciones y cualquier limitante física o legal, previo a la suscripción del acta de inicio de la obra, asumiendo los costos.

**Numeral 6**, Adelantar de manera simultánea todas las gestiones administrativas, contractuales y financieras necesarias para la contratación de la consultoría con su respectiva interventoría (externa), la cual deberá



 <b>MinInterior</b>	Código: GC-P-03-F-02 <b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	Código: GC-P-03-F-02 <b>Versión: 04</b> <b>Fecha Elaboración:</b> <b>25/07/2015</b> <b>Vigente Desde:</b> <b>26/08/2013</b>
--	---	--

contener como mínimo, el estudio de suelos, cálculo y diseño de cimentación y estructura, ajustes a diseños hidráulicos, sanitarios, arquitectónicos, eléctricos y al presupuesto soportados con los análisis de precios unitarios "APU", de acuerdo con los precios del mercado de la región y cronograma de obra, ajustados, en todo caso a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios vigentes.

**Numeral 7,** Adelantar de manera simultánea, todas las gestiones administrativas, Contractuales y financieras necesarias para la contratación de la obra y de la Interventoría, ajustados, en todo caso a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y su decretos reglamentarios vigentes.

**Numeral 8,** Aprobar a través del supervisor del convenio designado por el MUNICIPIO, el estudio de suelos, cálculo y diseño de cimentación y estructura, ajustes a diseños hidráulicos, sanitarios, arquitectónicos, eléctricos y al presupuesto que resulten de la consultoría, previamente aprobado por el interventor.

**Numeral 9,** Presentar al supervisor designado por el Ministerio 1 FONSECON, los documentos producto de la consultoría e interventoría, debidamente aprobados por el interventor y el supervisor designado por el municipio. El supervisor por parte del Ministerio, deberá recibir a satisfacción, lo cual es requisito indispensable para el inicio de las gestiones para la contratación de la obra e interventoría.

**Numeral 17,** Comunicar al Ministerio- FONSECON la fecha de recibo de los recursos girados para la ejecución del objeto del Convenio.

**Numeral 18,** Incorporar al presupuesto del MUNICIPIO la totalidad de los recursos que gire el MINISTERIO-FONSECON.

**Numeral 23,** Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros Cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, indicando los porcentajes de avance y ejecución de acuerdo con el cronograma presentado y previamente aprobado por la Interventoría, al informe se deberán adjuntar los soportes respectivos.

Por todo lo anterior solicito el estado actual de los procesos contractuales la gestión de los contractuales; Esta supervisión le exige el cumplimiento de los mismos para poder continuar con el objeto del presente convenio. Así como los correspondientes soportes de toda la gestión adelantada y los correspondientes informes vencidos sin entregar.

Para todos los efectos relacionados con la supervisión del convenio de la referencia se podrán contactar con mi persona Arq. Juan José Blanco Oviedo al 300 689 90 02 y a este correo electrónico.

**NOTA: Por favor aquellos municipios que estén al día hacer caso omiso, pero no bajen la guardia y continúen en ese camino es la única forma de cumplir los objetivos trazados**

Cordialmente

- **CORREO ENVIADO POR EL MUNICIPIO**

Arquitecto Juan,

Reciba un cordial saludo.

De acuerdo a las obligaciones adquiridas por el municipio de San Jose del fragua, anexo soporte de los contratos para Consultoría e interventoría de acuerdo al Numeral 6 y 7.


Atento a sus comentarios.

- **OFICIO ENVIADO POR EL MINISTERIO**

Con el objeto de solicitar y atender los llamados en los correos anteriormente enviados por esta supervisión. OFI15-0000252-SIN-4020

- **REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.**

Con el objeto de realizar revisión a la Consultoría de los Estudios y Diseños del convenio en referencia el día 27 de julio de 2015 en las oficinas del ministerio del interior se adelanto la 1era

 <b>MinInterior</b> Ministerio del Interior	7-00-P-03-1-00 <b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	<b>Código: CC-F-03-F-01</b>
		<b>Versión: 04</b>
		<b>Fecha Elaboración:</b> <b>25/07/2013</b>
		<b>Vigente Desde:</b> <b>26/08/2013</b>

revisión de dichos estudios , los cuales dejaron temas por subsanar y próxima revisión y adición presupuestal por parte del Municipio .

#### CONCLUSIÓN



Seguir adelantando toda la gestión para el buen funcionamiento entre las partes para con el convenio F – 212 DE 2015

ACTAS DE OBRA e INTERVENTORIA	
Acta de cantidades de Ejecución de Obra	
Acta de Recibo y Entrega de Bienes	
Informes final del municipio	

#### • VISITAS DE OBRA

SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA	RECIBO Y ENTREGA DEL BIENE			

#### • SUPERVISORES

SUPERVISOR	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
 <b>ARQ. HARRY SALAMANCA</b> Subdirección de Infraestructura Ministerio – Fonsecon	 <b>ARQ. JUAN JOSE BLANCO</b> Subdirección de Infraestructura Ministerio - Fonsecon

INFORME EJECUTIVO MENSUAL N									
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO									
CONVENIO Nº F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)									
Objeto del Convenio: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C/C EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)									
Valor del Convenio:		\$ 735.000.000,00		Aporte de Mininterior:		\$ 735.000.000,00		Aportes del Municipio:	
Valor Adición:		\$ 0,00							
Valor Total:		\$ 735.000.000,00							
Plazo de Ejecución:		7 MESES		Suspensión 1		Reinicio:		Prorroga Nº 1	
Fecha de Inicio:		08 DE MAYO DEL 2015		Suspensión 2		Reinicio:		Prorroga Nº 2	
Vencimiento:		30 DE NOVIEMBRE DE 2015						Plazo Actualizado	
Póliza de garantía única:		Vigencia póliza (Fechas)		Valor		Modificación fecha		Modificación Valor	
Aseguradora Solidaria de Colombia		Desde 07/05/2015		Hasta 31/05/2016		\$ 73.500.000,00		Hasta	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO									
Informe Nº		1		Periodo comprendido entre el 08 DE MAYO DE 2015		y el		03 DE JUNIO DEL 2015	
Proyecto		ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C/C EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)							
Localización		MUNICIPIO SAN JOSE DEL FRAGUA							
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS					CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS				
Objeto:					Objeto:				
Contrato Nº:					Contrato Nº:				
Contratista:					Contratista:				
Plazo Inicial:					Plazo Inicial:				
Fecha de Inicio:					Fecha de Inicio:				
* Fecha de Suspensión:					* Fecha de Suspensión:				
* Fecha de Reinicio:					* Fecha de Reinicio:				
Fecha de Terminación:					Fecha de Terminación:				
Prórrogas:					Prórrogas:				
Plazo Actualizado:					Plazo Actualizado:				
Valor Inicial:					Valor Inicial:				
Valor Adiciones:					Valor Adiciones:				
Valor Actualizado:					Valor Actualizado:				
Valor pagado:					Valor pagado:				
Valor por pagar:					Valor por pagar:				
Nombre Supervisor:					Nombre interventor:				
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprime las casillas innecesarias					* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprime las casillas innecesarias				
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA					CONTRATO DE OBRA				
Objeto:					Objeto:				
Contrato Nº:					Contrato Nº:				
Contratista:					Contratista:				
Plazo Inicial:					Plazo Inicial:				
Fecha de Inicio:					Fecha de Inicio:				
* Fecha de Suspensión:					* Fecha de Suspensión:				
* Fecha de Reinicio:					* Fecha de Reinicio:				
Fecha de Terminación:					Fecha de Terminación:				
Prórrogas:					Prórrogas:				
Plazo Actualizado:					Plazo Actualizado:				
Valor Inicial:					Valor Inicial:				
Valor Adiciones:					Valor Adiciones:				
Valor Actualizado:					Valor Actualizado:				
Valor pagado:					Valor pagado:				
Valor por pagar:					Valor por pagar:				
Nombre Supervisor:					Nombre interventor:				
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprime las casillas innecesarias					* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprime las casillas innecesarias				



INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 001

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº de 2014				CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº de 2014			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato				Cumplimiento del contrato			
Salarios y prestaciones sociales				Estabilidad de la obra			
Calidad del servicio				Calidad del servicio			
Responsabilidad civil				Salarios y prestaciones sociales			
				Responsabilidad civil			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº de 2014				CONTRATO DE OBRA Nº de 2014			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato				Cumplimiento del contrato			
Salarios y prestaciones sociales				Estabilidad de la obra			
Calidad del servicio				Calidad del servicio			
Responsabilidad civil				Salarios y prestaciones sociales			
				Responsabilidad civil			

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº de 2014				CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº de 2014			
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR		CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	
Primer pago							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº de 2014				CONTRATO DE OBRA Nº de 2014			
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR		CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	
Primer pago							

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado			0,00%	% Programado			0,00%
% Ejecutado			0,00%	% Ejecutado			0,00%
Diferencia			0,00%	Diferencia			0,00%

## DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Descripción detallada de las actividades del convenio interadministrativo de cofinanciación No. F212, de acuerdo al cronograma de obra. Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa precontractual.

- A. Acta de Inicio: se firma Acta de Inicio al convenio mediante el formato anexo 3, el día 08 de mayo del año 2015.
- B. Garantía de Cumplimiento: Una vez firmado el convenio No. F312, se expide la póliza No. 630-47-994000086131 Garantía Única de Cumplimiento. (Anexo 01).
- C. Designación de Supervisor: El día 11 de mayo del año 2015, mediante oficio del señor Carlos Enrique Díaz Salazar, Alcalde Municipal del municipio de San José del Fuerte designa como supervisor del convenio interadministrativo de cofinanciación No. F312 al Ingeniero Diego Alejandro Fernández Bolaños, secretario de Planeación. (Anexo 02). Avance de ejecución al 100%, de acuerdo a lo establecido en el cronograma de obra.
- D. Adición de recursos: Mediante el decreto No. 065 del 2015, se adiciona unos recursos al presupuesto de la actual vigencia. (Anexo 03)
- E. Cronograma de Obras: Se elabora el cronograma de obra de acuerdo a las obligaciones adquiridas por el municipio y al proyecto a desarrollar, se envía mediante correo electrónico el día 14 de mayo de 2015 para aprobación por parte de la supervisión del Ministerio Interior. (Anexo 04). Avance de ejecución al 100%, de acuerdo a lo establecido en el cronograma de obra.
- F. Formulación Y Plegio de Condiciones SECOP: De acuerdo al cronograma de obra, se realiza la formulación plegio de condiciones para la contratación de la consultoría e interventoría Externa para la Realización Del Estudio De Suelos, Cálculo Y Diseño De Cimentación Y Estructura, Ajuste A Los Diseños Hidráulicos, Sanitarios, Arquitectónicos, Eléctricos Y El Presupuesto Soportado Con Los Análisis De Precios Unitarios Apu. Para La Construcción Del Centro De Integración Ciudadana – Cíc. Avance de ejecución al 100%, de acuerdo a lo establecido en el cronograma de obra.
- G. Publicación de Plegios de Condiciones SECOP: Se publican los plegios de condiciones para los objetos contractuales mencionados el día 01 de junio de 2015 (Anexo 05). Avance de ejecución al 100%, de acuerdo a lo establecido en el cronograma de obra.


## 2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

[illegible]

### 3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTOR(A)

INFORME EJECUTIVO MENSUAL N° 001

4. RELACION DE ANEXOS					
DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/A	Nº Folios	DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/A	Nº Folios
1. Balance Presupuestal de la obra	N	0	9. Control diario de tiempo	N	0
2. Registro Fotográfico	N	0	10. Control de personal	N	0
3. Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta crítica	N	0	11. Control de equipo	N	0
4. Copia último informe de interventoría	N	0	12. Control de seguridad industrial	N	0
5. Copia actas de comité de obra	N	0	13. Relación de menores y mayores cantidades	N	0
6. Copia libro de obra/bitácora	N	0			
7. Copia certificado de pago a contratistas	N	0			
8. Seguimiento plan de manejo ambiental	N	0			

Elaborado por: 	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ Cargo: Supervisor del convenio F-212	Nombre: Cargo:	Nombre: Cargo:
		Elaborado: 31/01/2014 Pag. 1 de 4

## INFORME EJECUTIVO MENSUAL N°

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO									
CONVENIO N° F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)									
Objeto del Convenio: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)									
Valor del Convenio:	\$ 735.000.000,00	Aporte de Mininterior:	\$ 735.000.000,00	Aportes del Municipio:					
Valor Adición:	\$ 0,00								
Valor Total:	\$ 735.000.000,00								
Plazo de Ejecución:	7 MESES	Suspensión 1		Reinicio:		Prórroga N° 1	NA		
Fecha de Inicio:	08 DE MAYO DEL 2015	Suspensión 2	NA	Reinicio:	NA	Prórroga N° 2	NA		
Vencimiento:	30 DE NOVIEMBRE DE 2015								
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (fechas)	Desde	31/05/2016	Hasta		Valor	Modificación fecha	Modificación Valor	
Aseguradora Solidaria de Colombia	Desde	07/05/2015		Hasta		\$ 73.500.000,00	Hasta		
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO									
Informe N°	1	Periodo comprendido entre el 08 DE MAYO DE 2015 y el 03 DE JUNIO DEL 2015							
Proyecto	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)								
Localización	MUNICIPIO SAN JOSE DEL FRAGUA								
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS									
Objeto:	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICO AL CONTRATO DE CONSULTORIA cuyo objeto es CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA".								
Contrato N°:	MC-053 DEL 2015								
Contratista:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA								
Plazo Inicial:	15 días								
Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015								
*Fecha de Suspensión:	19 de Junio de 2015								
*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015								
Fecha de Terminación:	13 de Julio de 2015								
Prórrogas:									
Plazo Actualizado:									
Valor Inicial:	\$ 3.000.000,00								
Valor Adiciones:	\$ -								
Valor Actualizado:	\$ -								
Valor pagado:	\$ -								
Valor por pagar:	\$ 3.000.000,00								
Póliza Seguro de cumplimiento	N° 630-47- 994000006429	VIGENCIA: 09/06/2015 - 15/01/2016	VALOR: 750.000	VIGENCIA: 09/06/2015 - 31/12/2015 VALOR: 3.000.000					
Nombre Supervisor:	DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ								
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias									
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA									
Objeto:									
Contrato N°:									
Contratista:									
Plazo Inicial:									
Fecha de Inicio:									
*Fecha de Suspensión:									
*Fecha de Reinicio:									
Fecha de Terminación:									
Prórrogas:									
Plazo Actualizado:									
Valor Inicial:									
Valor Adiciones:									
Valor Actualizado:									
Valor pagado:									
Valor por pagar:									
Nombre Supervisor:									
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias									



INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 002


ESTADO DE LAS GARANTÍAS									
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015					CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052de 2015				
CONCEPTO	VIGENTE (fechas)		VALOR		CONCEPTO	VIGENTE (fechas)		VALOR	
	DESDE	HASTA				DESDE	HASTA		
Cumplimiento del contrato	09/06/2015	29/12/2015	\$ 300.000,00		Cumplimiento del contrato	09/06/2015	31/12/2015	\$ 1.200.000,00	
Salarios y prestaciones sociales	09/06/2015	29/12/2015	\$ 150.000,00		Estabilidad de la obra	09/06/2015	31/12/2015	\$ 1.200.000,00	
Calidad del servicio	25/06/2015	15/01/2016	\$ 300.000,00		Salarios y prestaciones sociales	09/06/2015	31/12/2015	\$ 600.000,00	
Responsabilidad civil					Responsabilidad civil				
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA Nº de 2014					CONTRATO DE OBRA Nº de 2014				
CONCEPTO	VIGENTE (fechas)		VALOR		CONCEPTO	VIGENTE (fechas)		VALOR	
	DESDE	HASTA				DESDE	HASTA		
Cumplimiento del contrato					Cumplimiento del contrato				
Salarios y prestaciones sociales					Estabilidad de la obra				
Calidad del servicio					Calidad del servicio				
Responsabilidad civil					Salarios y prestaciones sociales				
					Responsabilidad civil				
RESUMEN DE PAGOS									
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015					CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052de 2015				
CONCEPTO	FECHA DE PAGO		VALOR		CONCEPTO	FECHA DE PAGO		VALOR	
Primer pago			\$					\$	
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA Nº de 2014					CONTRATO DE OBRA Nº de 2014				
CONCEPTO	FECHA DE PAGO		VALOR		CONCEPTO	FECHA DE PAGO		VALOR	
Primer pago									

INFORME EJECUTIVO MENSUAL N°

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

1. Se realiza una suspensión del contrato de consultoría N° 052, debido a que la ola invernal que presenta nuestro departamento ha limitado la realización del estudio de suelos.
2. Se realiza una suspensión del contrato de interventoría N° 053, debido al oficio radicado por la consultoría en donde solicita la suspensión lo cual es procedente ya que las causas son aceptables.
3. Se dio cumplimiento a la obligación N° 37 del convenio, instalar valla informativa el día 27 de junio de 2015, del cual se adjunta registro fotográfico.
4. Con respecto a la obligación N° 5, me permito informarle que no se ha realizado debido al estado del tiempo ya que en nuestro municipio se han presentado tiempo de lluvia lo que ha impedido la realización del escape y nivelado del lote.


2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

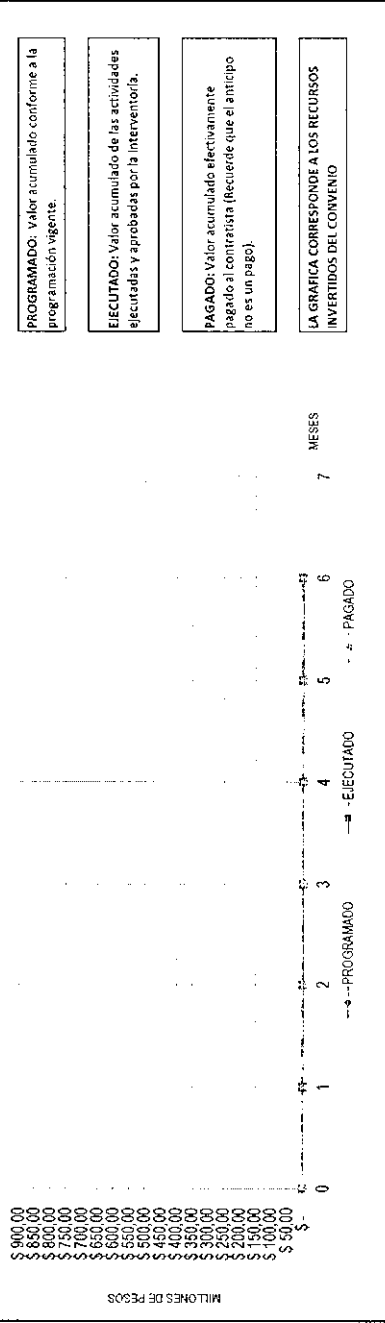

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 002

4. RELACION DE ANEXOS				
DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/A.	Nº Folios	DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/A. Nº Folios
1. Balance Presupuestal de la obra	N	0	9. Control diario de tiempo	N 0
2. Registro Fotográfico	N	0	10. Control de personal	N 0
3. Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica	N	0	11. Control de equipo	N 0
4. Copia último informe de inventoria	N	0	12. Control de seguridad Industrial	N 0
5. Copia actas de comité de obra	N	0	13. Relación de menores y mayores cantidades	N 0
6. Copia libro de obra/bitácora	N	0		
7. Copia certificado de pago a contratistas	N	0		
8. Seguimiento plan de manejo ambiental	N	0		

Elaborado por	Revisador por:	Aprobado por:	Elaborado: 31/01/2014
 Nombre: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ Cargo: Supervisor del convento F-212		Nombre: Cargo:	Pag. 1 de 4

# INFORME MENSUAL Nº 2 ANEXO 2

CONVENIO Nº F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

REGISTRO FOTOGRAFICO - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

Proyecto

Localización

Contratista:

Director de obra:

Interventor:


Director Interventoria:

Fecha del registro fotográfico:

FOTOGRAFIA Nº 1

FOTOGRAFIA Nº 2


FOTOGRAFIA Nº 3



Instalacion de la valla Barrio Ciudadela Sumawasy dia 27 de Junio de 2015



Instalacion de la valla Barrio Ciudadela Sumawasy dia 27 de Junio de 2015



Instalacion de la valla Barrio Ciudadela Sumawasy dia 27 de Junio de 2015

FOTOGRAFIA Nº 4

FOTOGRAFIA Nº 5

FOTOGRAFIA Nº 6





INFORME EJECUTIVO MENSUAL N

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO									
CONVENIO Nº F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)									
Objeto del Convenio: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)									
Valor del Convenio:	\$ 735.000.000,00	Aporte de Mininterior:	\$ 735.000.000,00	Aportes del Municipio:					
Valor Adición:	\$ 0,00								
Valor Total:	\$ 735.000.000,00								
Plazo de Ejecución:	7 MESES	Suspensión 1	NA	Reinicio:	NA	Priorroga Nº 1	NA		
Fecha de Inicio:	08 DE MAYO DEL 2015	Suspensión 2	NA	Reinicio:	NA	Priorroga Nº 2	NA		
Vencimiento:	30 DE NOVIEMBRE DE 2015	Plazo Actualizado							
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)	Desde	31/05/2016	Valor	Modificación fecha	Modificación Valor			
Aseguradora Solidaria de Colombia	Desde	07/05/2015	Hasta	\$ 73.500.000,00	Hasta				

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO									
Informe Nº 3 Período comprendido entre el 03 de Julio del 2015 y el 03 de Agosto del 2015									
Proyecto: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)									
Localización: MUNICIPIO SAN JOSE DEL FRAGUA									
<b>CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>									
*CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICO AL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ELECTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA.									
Objeto:									
Contrato Nº:	MC-053 DEL 2015	Contratista:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES	Plazo Inicial:	15 días				
Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015	*Fecha de Suspensión	19 de Junio de 2015	*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015	Fecha de Terminación:	13 de Julio de 2015	Prórrogas:	
Plazo Actualizado:	\$ 3.000.000,00	Valor Inicial:	\$	Valor Adiciones:	\$	Valor Actualizado:	\$	Valor pagado:	\$
Valor por pagar:	\$ 3.000.000,00	Poliza Seguro de cumplimiento	Nº 630-47-994000006429	VIGENCIA: 09/06/2015 - 15/01/2016	VALOR: 750.000				
Nombre Supervisor:	DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ	Nombre interventor:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA	VIGENCIA: 09/06/2015 - 31/12/2015 VALOR: 3.000.000					
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias									
<b>CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA</b>									
Objeto:									
Contrato Nº:									
Contratista:									
Plazo Inicial:									
Fecha de Inicio:									
*Fecha de Suspensión									
*Fecha de Reinicio:									
Fecha de Terminación:									
Prórrogas:									
Plazo Actualizado:									
Valor Inicial:									
Valor Adiciones:									
Valor Actualizado:									
Valor pagado:									
Valor por pagar:									
Poliza Seguro de cumplimiento									
Nombre Supervisor:									
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias									
<b>CONTRATO DE OBRA</b>									
Objeto:									
Contrato Nº:									
Contratista:									
Plazo Inicial:									
Fecha de Inicio:									
*Fecha de Suspensión									
*Fecha de Reinicio:									
Fecha de Terminación:									
Prórrogas:									
Plazo Actualizado:									
Valor Inicial:									
Valor Adiciones:									
Valor Actualizado:									
Valor pagado:									
Valor por pagar:									
Nombre Supervisor:									
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias									

## INFORME EJECUTIVO MENSUAL N° 003

INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 003									
ESTADO DE LAS GARANTÍAS									
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015					CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052 de 2015				
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)	DE	HASTA	VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)	DE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato	09/06/2015	29/12/2015	\$	300.000,00	Cumplimiento del contrato	09/06/2015	31/12/2015	\$	1.200.000,00
Salarios y prestaciones sociales	09/06/2015	29/12/2015	\$	150.000,00	Estabilidad de la obra	09/06/2015	31/12/2015	\$	1.200.000,00
Calidad del servicio	25/06/2015	15/01/2016	\$	300.000,00	Salarios y prestaciones sociales	09/06/2015	31/12/2015	\$	600.000,00
Responsabilidad civil					Responsabilidad civil				
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA Nº de 2014					CONTRATO DE OBRA Nº de 2014				
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)	DE	HASTA	VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)	DE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato					Cumplimiento del contrato				
Salarios y prestaciones sociales					Estabilidad de la obra				
Calidad del servicio					Calidad del servicio				
Responsabilidad civil					Salarios y prestaciones sociales				
					Responsabilidad civil				
RESUMEN DE PAGOS									
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015					CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052 de 2015				
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR			CONCEPTO	FECHA DE PAGO			
Primer pago		\$							
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA Nº de 2014					CONTRATO DE OBRA Nº de 2014				
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR			CONCEPTO	FECHA DE PAGO			
Primer pago									
SEGUIMIENTO AL AVANCE									
AVANCE FÍSICO (%)					AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO		CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL		TOTAL ACUMULADO
% Programado			0,00%		% Programado				0,00%
% Ejecutado			0,00%		% Ejecutado				0,00%
Diferencia			0,00%		Diferencia				0,00%


INFORME EJECUTIVO MENSUAL N

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

A la fecha de corte del presente informe el contratista de consultoria ejecutó las siguientes actividades:

1. El estudio de suelos contiene: Plano de localización de sondeos, Perfiles estratigráficos o registro de los exploraciones y nivel freático, Resultados de los ensayos de laboratorio del material de las perforaciones (sondeos), Capacidad portante o resistencia del suelo, Cota de fundación de cimientos, tipo, profundidad y capacidad de soporte del suelo de fundación, Recomendaciones de la cimentación y excavación más conveniente, Asentamientos probables, Clasificación del suelo según la Norma N38-1), Recomendaciones para posibles obras de drenaje, Especificaciones para obras de contención y/o canalizaciones (cuando sean requeridas), Certificación expedida por el geotecnista encargado donde conste que realizó estudio de suelos y demás documentos que se presenten. Firmada con número de cédula y matrícula profesional, Copia de la cédula de ciudadanía del geotecnista, Copia de la matrícula profesional del geotecnista.
2. Redibujo de la arquitectura en estricto cumplimiento de los reglamentos citados en los requerimientos planteados por la entidad.
3. Ajuste de diseño estructural de la cubierta, enmarcado en el ajuste de los elementos metálicos componentes de los arcos estructurales (pórticos principales) y de las corras de soporte, las cuales se encargan de conformar el sistema de cubierta.
4. Ajuste de diseño estructural del sistema de cimentación de pórticos, gradeles y tarina de tal forma que se ajusta al suelo existente, y se convierte en una solución factible de implantar, considerando el equipamiento disponible en el sitio de construcción de la obra.
5. Se anota que tanto los ajustes estructurales plasmados en las estructuras metálicas y de concreto no afectan la arquitectura, geometría y desarrollo conceptual del conjunto.
6. Se realizaron ajustes de dibujo, definición de cotas y aclaración de notas en los planos hidrosanitarios.
7. Se realizaron ajustes en el diseño eléctrico de tal forma que se enmarca en las normas colombianas vigentes y las consideraciones solicitadas y requeridas por la entidad contratante.
8. Se anota que el documento entregado por el contratista de consultoría se enmarca en las exigencias planteadas por la entidad contratante, desarrolladas de acuerdo a los lineamientos arquitectónicos definidos por ellos y basados en un desarrollo técnico ajustado a las Normativas Colombianas Vigentes.
9. Para el día 27 de julio se programó reunión en Bogotá en las instalaciones del Ministerio del Interior Con el Arquitecto Juan Blanco y El contratista de la Consultoría para hacer revisión de los estudios y diseños para la construcción del Centro de Integración Ciudadana, quedando como compromisos realizar ajustes a los diseños y, adición al presupuesto por obras complementarias de acuerdo a las observaciones del Arquitecto Juan Blanco.

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

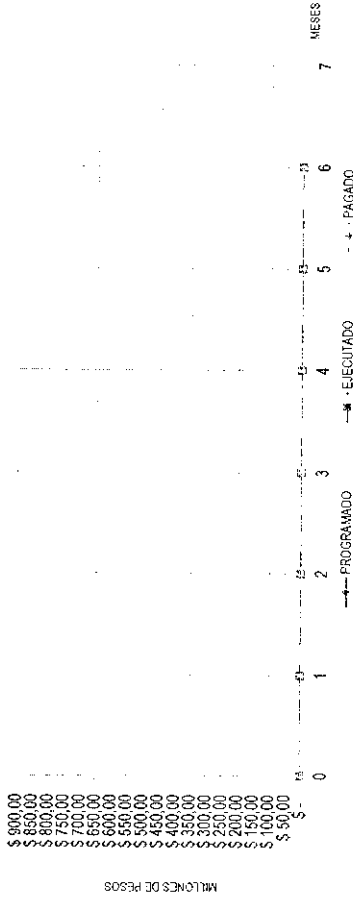


3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA



INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 003

4. RELACION DE ANEXOS			
DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/A	Nº Folios	DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO
1. Balance Presupuestal de la obra	N	0	9. Control diario de tiempo
2. Registro Fotográfico	N	0	10. Control de personal
3. Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta crítica	N	0	11. Control de equipo
4. Copia último informe de interventoría	N	0	12. Control de seguridad industrial
5. Copia actas de comité de obra	N	0	13. Relación de menores y mayores cantidades
6. Copia libro de obra/bitácora	N	0	
7. Copia certificado de pago a contratistas	N	0	
8. Seguimiento plan de manejo ambiental	N	0	

Elaborado por: 	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ Cargo: Supervisor del convenio F-212	Nombre: Cargo:	Nombre: Cargo:



Ministerio

**FORMATO  
ACTA DE RECIBO DE ESTUDIOS Y  
DISEÑOS**

Código: GC-P-03-F-04

Versión: 03

Fecha Elaboración:  
25/07/2013

Vigente Desde:  
26/08/2013

En Bogotá D.C., a los 04 días del mes de Agosto de 2015, se reunieron en el Ministerio del Interior, para la entrega y recibo formal de la totalidad de los estudios y diseños del convenio No F212 - 2015, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la seguridad ciudadana, a través de la ejecución del proyecto denominado "CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA - CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA, CAQUETÁ.

Mediante la presente acta se deja constancia de la aprobación realizada por el interventor contratista y el supervisor del municipio de SAN JOSÉ DEL FRAGUA, de los estudios y ajustes a los diseños del proyecto CIC, anexando los respectivos certificados de responsabilidad de cada uno de los profesionales involucrados en el proyecto. Se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del supervisor del Ministerio del Interior - FONSECON.

**Estudio de suelos**

Quien elabora el estudio: ING. GERMAN GARCÍA DIAZ

Matricula profesional: 13202163752 BLV

Quien lo revisa y aprueba: ING. Luis Ángel Murcia Aviles M.P:08202213505 - ATL. ING. Celso Rojas Cleves MP: 25202-096642 CND, Diego Alejandro Fernandez (Secretario de Planeación, MP: 25202198462 CND

**Estudio Estructural**

Quien elabora el estudio: ING. CELSO ANDRÉS ROJAS CLEVES

Matricula profesional: 25202-096642 CND

Quien lo revisa y aprueba: ING. Luis Ángel Murcia Aviles M.P:08202213505 - ATL. ING. Celso Rojas Cleves MP: 25202-096642 CND, Diego Alejandro Fernández (Secretario de Planeación, MP: 25202198462 CND

Quien elabora el estudio: ING. CELSO ANDRÉS ROJAS CLEVES



Matricula profesional: 25202-096642 CND

Quien lo revisa y aprueba: ING. Luis Ángel Murcia Aviles M.P:08202213505 - ATL. ING. Celso Rojas Cleves MP: 25202-096642 CND, Diego Alejandro Fernández (Secretario de Planeación, MP: 25202198462 CND

**Estudio Hidrosanitario**

Quien elabora el estudio: ING. CELSO ANDRÉS ROJAS CLEVES

Matricula profesional: 25202-096642 CND

 	<b>FORMATO</b> <b>ACTA DE RECIBO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	Código: GC-P-03-F-04
		Versión: 03
		Fecha Elaboración: 25/07/2013
		Vigente Desde: 26/08/2013

Quien lo revisa y aprueba: ING. Luis Ángel Murcia Avilés M.P.08202213505 - ATL. ING. Celso Rojas Cleves MP: 25202-096642 CND, Diego Alejandro Fernández (Secretario de Planeación, MP: 25202198462 CND

#### Estudio Arquitectónico.

Quien elabora el estudio: ING. CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
Matrícula profesional: 25202-096642 CND

Quien lo revisa y aprueba: ING. Luis Ángel Murcia Avilés M.P.08202213505 - ATL. ING. Celso Rojas Cleves MP: 25202-096642 CND, Diego Alejandro Fernández (Secretario de Planeación, MP: 25202198462 CND

#### Presupuesto

Quien elabora el estudio: ING. CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
Matrícula profesional: 25202-096642 CND



Quien lo revisa y aprueba: ING. Luis Ángel Murcia Avilés M.P.08202213505 - ATL. ING. Celso Rojas Cleves MP: 25202-096642 CND, Diego Alejandro Fernández (Secretario de Planeación, MP: 25202198462 CND

Se acompaña de las cartas de responsabilidad fotocopia de la cedula y matrícula profesional de cada uno de los integrantes de equipo de diseño del Contratista de Estudios y Diseños y aprobados por su respectiva Interventoría Y el acta de aprobación de estudios y diseños de fecha 15 de Julio de 2015 por parte del municipio.

El costo total de la interventoría y de la Obra concertado en convenio es de: \$735.000.000

DETALLE	CONVENIO	CONSULTORIA
Valor presupuesto de Obra	\$720.900.000	
Valor Presupuesto de interventoría	\$ 47.100.000	
<b>TOTAL CONVENIO</b>	<b>\$768.000.000</b>	
Total aporte ministerio	\$735.000.000	
Adicional del Municipio	\$48.000.000	
<b>TOTAL=</b>	<b>\$ 783.000.000</b>	
<b>DIFERENCIA =</b>	<b>\$15.000.000</b>	<b>= \$15.000.000 INTV - EyD</b>

El consultor se compromete a coordinar los diseños con el contratista de Obra una vez adjudicado el proceso de contratación


 	<b>FORMATO</b> <b>ACTA DE RECIBO DE ESTUDIOS Y</b> <b>DISEÑOS</b>	Código: GC-P-03-F-04
		Versión: 03
		Fecha Elaboración: 25/07/2013
		Vigente Desde: 26/06/2013

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales.

<p>Va.Bo. Por parte de: <b>MINISTERIO DEL INTERIOR</b></p>  <p>Nombre y firma: <b>ARQ. JUAN JOSE BLANCO OVIEDO</b>  Cargos: <b>APOYO SUPERVISOR CONVENIO</b>  Email: <b>Juan.Blanco@mininterior.gov.co</b>  Celular: <b>3006899002</b></p>	<p>Por parte de: <b>MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA</b></p>  <p>Nombre y firma: <b>DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ BOLAÑOS</b>  Cargos: <b>Supervisor Municipal Designado Convenio F-212 -15</b>  Email: <b>planeacionmunicipal@sanjosedelfraguacaqueta.gov.co</b>  Celular: <b>3208817425</b></p>
<p>Por parte de: <b>Contratista de Interventoría Estudios y Diseños contrato No. 053 de 2015</b></p>  <p>Nombre y firma: <b>LUIS ANGEL AVILES MURCIA</b>  Cargos: <b>INTERVENTOR EXTERNO</b>  Email: <b>luisaviles17@gmail.com</b>  Celular: <b>3205711564</b></p>	<p>Por parte de: <b>Contratista de Estudios y Diseños contrato No. 052 de 2015</b></p>  <p>Nombre y firma: <b>CELSO ANDRES ROJAS CIVES</b>  Cargos: <b>CONSULTORIA</b>  Email: <b>celso Rojas500@yahoo.com</b>  Celular: <b>3132528581</b></p>
<p>Por parte de: <b>MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA</b></p>  <p>Nombre y firma: <b>CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR</b>  Cargos: <b>Alcalde Municipal</b>  Email: <b>alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co</b>  Celular: <b>3115227507</b></p>	<p>Va.Bo. Por parte de: <b>MINISTERIO DEL INTERIOR</b></p> <p>Nombre y firma: <b>HARRY SALAMANCA</b>  Cargos: <b>SUPERVISOR CONVENIO</b>  Email: <b>Harry.salamanca@mininterior.gov.co</b>  Celular: <b>3115127563</b></p>





	
<b>FORMATO</b> <b>ACTA DE RECIBO DE ESTUDIOS Y</b> <b>DISEÑOS</b>	
Código: GC-P-03-F-04	Versión: 03
Fecha Elaboración:	25/07/2013
Vigente Desde:	25/05/2013

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales.

<b>Por parte del MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL INTERIOR</b> <b>Nombre y firma: ROJO JUAN JOSÉ SALAS GUERO</b> <b>Cargo: APOYO SUPERVISOR CONVENIO</b> <b>Email: Juan.Blanco@mininterior.gov.co</b> <b>Celular: 3006599002</b>	<b>Por parte del MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL INTERIOR</b> <b>Nombre y firma: CELSO ANDRÉS ROJAS O FRES</b> <b>Cargo: CONSULTORIA</b> <b>Email: celso.rosas500@yahoo.com</b> <b>Celular: 3132528531</b>
<b>Por parte del Contraloría de Interventoría Estudios y Diseños contrato No. 053 de 2015</b>	<b>Por parte del Contraloría de Interventoría Estudios y Diseños contrato No. 052 de 2015</b>
<b>Nombre y firma: HARRY SALAMANCA</b> <b>Cargo: SUPERVISOR CONVENIO</b> <b>Email: Harry.salamanca@mininterior.gov.co</b> <b>Celular: 3115227807</b>	<b>Nombre y firma: ALCAIDIA@sanjosedetratagusa-caqueta.gov.co</b> <b>Celular: 3115227807</b>



TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
POR LA EQUIDAD EDUCATIVA



MININTERIOR

FORMATO  
ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO  
A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL  
ANEXO 4

Código: GC-P-03-F-04

Versión: 03

Fecha Elaboración:  
25/07/2013

Vigente Desde:  
26/08/2013

ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Departamento:	CAQUETA
Municipio:	SAN JOSE DEL FRAGUA
Proyecto:	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADA - CIC
Valor:	\$735.000.000
Firma Convenio:	07 DE MAYO DE 2015
Vencimiento:	30 DE NOVIEMBRE DE 2015
Acta de Inicio:	8 DE MAYO DE 2015
Póliza:	630-47994000006141

ASISTENTES			
No.	NOMBRE	CARGO	REPRESENTA A
1	MIGUEL TURMEQUE BUSTOS	SUPERVISOR MINISTERIO DEL INTERIOR	MININTERIOR
2	JUAN JOSE BLANCO OVIEDO	APOYO A LA SUPERVISION DEL MINISTERIO	MININTERIOR
3			
4			

INVITADOS			
1			
2			

AUSENTES			JUSTIFICADO SÍ NO
1			
2			

1	ORDEN DEL DIA
Verificación de cumplimiento de los compromisos del municipio de acuerdo al convenio F- 212	

OBJETO:

Convenio Interadministrativo F-212 de 2015, cuyo objeto es la "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la seguridad ciudadana, a través de la ejecución del proyecto denominado "CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC, SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA"

2	<p><b>DESARROLLO</b></p> <p>Se realiza seguimiento de las obligaciones contractuales del municipio teniendo en cuenta el objeto contractual de la referencia dentro del respectivo convenio.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>El municipio debe informe mensual del mes de septiembre</li><li>Documentos solicitud de segundo desembolso</li><li>Cronograma actualizado</li><li>Compromiso en la etapa de ejecución de obra para cumplir al mes de diciembre con 70% de avance de la misma.</li><li>Apoyo en toda la gestión contractual por parte del municipio</li></ol> <p><i>Proyecto modificado (Municipal) se adjudica 20/10/15</i> <i>Inicio 23/10/15 a el</i></p>	
<p><b>COMPROMISOS</b></p>		
RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LIMITE CUMPLIMIENTO
	<i>Solicitud 2º Desembolso</i>	
	<i>Informe septiembre.</i>	<i>9/10/15</i>
	<i>Cronograma.</i>	

**FORMATO**  
**ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO**  
**A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**  
**ANEXO 4**

**Código:** GC-P-03-F-04

**Versión:** 03

**Fecha Elaboración:**  
25/07/2013

**Vigente Desde:**  
26/08/2013

	Contrato y Actas de inicio	
	Radicar prórroga a 28/2/16 Demostrar avance 70% a 30/12/15 y 50% al 25 Nov	

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en original,

<div>Por parte de: MINISTERIO DEL INTERIOR</div> <div></div> <div>Nombre y firma: Cargo: SUPERVISOR CONVENIO Email: Celular:</div>	<div>Por parte de:</div> <div></div> <div>Nombre y firma: Cargo: Email: Celular:</div>
	<div>Contrato y Actas de inicio</div> <div>Radicar prórroga a 28/2/16</div> <div>Demostrar avance 70% a 30/12/15</div> <div>y 50% al 25 Nov</div>

0 Anexo Copia: Subdirección de Gestión Contractual



Bogotá, D.C., Miércoles, 09 de Diciembre de 2015.

SEÑOR:  
Carlos Enrique Díaz Salazar  
ALCALDE MUNICIPAL  
Carrera 4 No 3-25  
SAN JOSE DEL FRAGUA – CAQUETA.

Asunto: SOLICITUD DE EJECUCION 50% DE OBRA CONVENIO  
INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. F- 212 de 2015.

Cordial saludo:

Como es de su conocimiento su Municipio suscribió el 07 de mayo de 2015 con el Ministerio de Interior – Fonsecon, el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F- 212 de 2015, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana — CIC, en el municipio de San Jose del Fragua - Caquetá”, que de acuerdo con las diferentes reuniones celebradas entre el municipio y el ministerio en el cual se recordó la obligación de ejecutar el 50% de obra del CIC durante la vigencia 2015, y en la cuales el municipio suscribió compromisos al cumplimiento del mismo.

Es importante señalar, que la supervisión de este Ministerio, ve con gran preocupación que el Municipio no está cumpliendo con las obligaciones contractuales adquiridas, poniendo en riesgo el 50% de ejecución de obra en desarrollo del objeto del convenio en el asunto, que se requiere para la ejecución total de los recursos vigencia 2015.

De acuerdo a lo anterior, me permito comunicarle, que antes del 28 de diciembre de 2015, se deben presentar los documentos para el trámite del tercer desembolso de acuerdo con las contenidas en el primer modificatorio al convenio **CLAUSULA SEPTIMA, DESEMBOLSOS:**

**Numeral “3) Un Tercer desembolso**, por la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MIL (\$294.000.000,00)**, cuando la ejecución de la obra se encuentre en un avance mínimo del 50%, previa presentación de la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 50% de ejecución de obra, la cual debe incluir: a) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance y b) La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. Con fundamento en la documentación enviada por el Municipio, el supervisor del Convenio designado por el Ministerio del Interior certificará el cumplimiento de los requisitos por parte del Municipio para proceder al desembolso”.

Por lo anterior solicito para el trámite del tercer desembolso los siguientes documentos:

- Cuenta de cobro o factura, firmada por el representante legal del municipio, con numero consecutivo, fecha, valor en letras y números, concepto tercer desembolso, indicar los NIT tanto del ministerio (830.114.475-6) como del municipio. (original)
- Certificado firmado por el representante legal que se encuentra al día en la seguridad social y parafiscales.
- Certificación del supervisor designado por el municipio en la cual acredita el avance del 50% de obra ejecutada.

- Informe de interventoría firmado, técnico, administrativo, financiero de la obra, con registro fotográfico de cada uno de los ítems pagados en el acta parcial.
- Acta parcial de obra que indique el porcentaje de avance, y este firmada por el contratista, interventor y supervisor del municipio como mínimo.

Estos documentos se deben entregar en medio físicos.

Solicito se haga entrega igualmente de la documentación correspondiente a copia de los extractos bancarios, certificación de recibido de los recursos desembolsados por el ministerio, comprobantes de egreso, órdenes de pago, informes mensuales, informes semanales de interventoría, licencia de construcción, acta de recibo y liquidación contratos de consultoría de estudios y diseños, interventoría de estudios y diseños. Así como los demás soportes de la gestión adelantada


Para la entrega de la anterior documentación ante este Ministerio, se concederá un plazo, de tres (03) días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación, de lo contrario se dará traslado a la Subdirección de Gestión Contractual de este Ministerio, para que adelante trámite de verificación de cumplimiento de obligaciones de conformidad con el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, con las consecuencias jurídicas que tal actuación acarren.

Sin otro particular, agradezco su pronta gestión.

Cordialmente,

**MARÍA FERNANDA ÁLVAREZ CARREÑO**  
Subdirectora de Infraestructura

Elaboró: Juan Jose Blanco O.  
Revisó: Miguel Ángel Turmequé  
Aprobó: María Fernanda Álvarez Carreño  
TRD: 4022.28.06. F-212 - 2015



**MinInterior**  
Ministerio del Interior

FORMATO ANEXO  
ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE  
VISITA DE SEGUIMIENTO A LA  
EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA  
(CIC)

Código:

Versión:

Fecha Elaboración:  
20/01/2014

Vigente Desde:

LOS MUNICIPIO	San José Pura.	Nº CONVENIO	212.
TIPOLOGIA	TIPO	FECHA DE ACTA INICIO	
ELABORO		FECHA DE VISITA:	26/11/15.

CROQUIS DETALLADO DEL LOTE (se debe identificar linderos respecto a lo expuesto en la escritura e identificar accesos y vías circundantes)

Lote.

Boite.

Construcción  
CIC

Viviendas

Viviendas


Calle Sta Sur

El secretario de planeación manifiesta que el predio cuenta con uso del suelo que permite la expedición de licencia de construcción

DATOS DEL PREDIO			
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
¿Ya inicio el proceso de contratación?:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tenencia:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Implantación dentro del predio:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Limitante física y/o jurídica:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Accesibilidad directa vía publica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Acta de socialización del proyecto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se encuentra en zona de riesgo geológico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Presenta registro fotográfico en digital	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Requiere adecuación del predio (demoliciones-movimiento de tierras-estabilización-etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Retiro de pila, se quitó Red Eléctrica
Servicios públicos:	Agua	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Energía	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Otros	<input type="checkbox"/>	
Nombre del Propietario:	Antonio de San José Pura.		Registro fotográfico:
Matrícula inmobiliaria No.			
Cédula catastral			
Uso del suelo			





PRESENTACION DOCUMENTOS 2ª. FASE					
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		DESCRIPCIÓN	CUMPLE	
	SI	NO		SI	NO
Aprobación póliza del convenio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Presupuesto preliminar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Descripción del problema o necesidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Levantamiento topográfico actualizado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Justificación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Concepto de la Oficina de Planeación del municipio o de la que haga sus veces	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Descripción del proyecto - Programa Arquitectónico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Certificación disponibilidad de Servicio Acueducto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cronograma de actividades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Certificación disponibilidad de Servicio Alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copia de la ficha catastral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Certificación de disponibilidad del servicio de Energía	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de compromiso de mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	copia del proyecto en medio digital	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificación de Prevención y Atención de Desastres	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

DESARROLLO DE LA VISITA


 <b>MinInterior</b> Ministerio del Interior	<b>FORMATO ANEXO</b> <b>ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>Código:</b>
	<b>CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA (CIC)</b>	<b>Versión:</b>
		<b>Fecha Elaboración:</b> 20/01/2014
		<b>Vigente Desde:</b>

--

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LIMITE CUMPLIMIENTO
William Ardunovich (Representante Legal)	• Compromiso de implementar programas para tener 4 puntos de trabajo e ir mejorando.	30/11/15
	• Entrenamiento para agilizar trámites de EXCAVACIÓN DE CIMENTACIONES	28/11/15.
Diego Fernandez (SP)	• Gestionar Cambio de Posición de los electores	04/12/15.

<b>ASISTENTES</b>	
Por parte de: <b>MINISTERIO DEL INTERIOR</b>   <b>Nombre y firma:</b> JUAN JOSE BLANCO OVIEDO <b>Cargo:</b> APOYO SUPERVISION <b>Email:</b> Juan.Blanco@mininterior.gov.co <b>Celular:</b> 3006899002	Por parte de: <b>MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FORTALECIMIENTO</b>   <b>Nombre y firma:</b> Diego Alejandro Fernandez <b>Cargo:</b> Secretario Planeación <b>Email:</b> diegoalejandrofernandez20@hotmail.com <b>Celular:</b> 3203017423
Por parte de: <b>CONTRATISTA</b>   <b>Nombre y firma:</b> WILLIAM ARDUNOVICH <b>Cargo:</b> REPRESENTANTE LEGAL <b>Email:</b> ardy.williamov@ymail.com <b>Celular:</b> 310 5694446	Por parte de: <b>INTERVENIENTE</b>   <b>Nombre y firma:</b> Celso de la Cruz <b>Cargo:</b> Interventor <b>Email:</b> Celso de la Cruz 50262100 <b>Celular:</b> 3132526501

Bajo la gravedad del juramento, el MUNICIPIO certifica que los documentos en medio físico y magnético anexos son auténticos y la información es veraz y asume todas las responsabilidades de índole fiscal, penal y disciplinaria, en el evento de demostrarse que la información o parte de ella o de los estudios, no corresponden a la realidad.



**MEMORANDO**

**MEM15-000040190-SIN-4020**

Bogotá, D. Martes, 3 de noviembre de 2015

**PARA:** Doctora María Eugenia Areiza F, Subdirectora de Gestión Contractual

**DE:** Subdirección de Infraestructura

**ASUNTO:** Entrega de documentos de supervisión del Ministerio del convenio F-212-2015 del municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA. (Colocar No. de radicado que se responde)

Adjunto envió documentación de soporte del convenio F- 212 – 2015 celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA – TOLIMA.

1. Informe del Municipio mes de Agosto ,2 folios
2. Informe del Municipio mes de Septiembre ,3 folios
3. Informe del Ministerio mes de Agosto Municipio ,4 folios
4. Informe del Ministerio mes de Agosto Municipio ,3 folios
5. Copia Contrato de Obra ,7 folios

**ARQ. JUAN JOSE BLANCO OVIEDO**

Apoyo a la supervisión del convenio F-212 -2015

Elaboró: Juan José Blanco Oviedo

Revisó: Miguel Turmequé

Aprobó: Miguel Turmequé

TRD: 4022 F- 212 de 2015.

**MIGUEL ANGEL TURMEQUE**

Supervisor Convenio F-212 de 2015

4115  
930 ew.



Alcaldía

INFORME EJECUTIVO MENSUAL N

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO									
CONVENIO N° F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)									
Objeto del Convenio: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)									
Valor del Convenio:	\$ 735.000.000,00	Aporte de Mininterior:	\$ 735.000.000,00	Aportes del Municipio:	\$ 48.000.000,00				
Valor Adición:	\$ 48.000.000,00								
Valor Total:	\$ 783.000.000,00								
Plazo de Ejecución:	7 MESES	Suspensión 1	NA	Reinicio:	NA	Prórroga N° 1	NA		
Fecha de Inicio:	08 DE MAYO DEL 2015	Suspensión 2	NA	Reinicio:	NA	Prórroga N° 2	NA		
Vencimiento:	30 DE NOVIEMBRE DE 2015								
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (fechas)	Desde	07/05/2015	Hasta	31/05/2016	Valor	Modificación fecha	Modificación Valor	
Aseguradora Solidaria de Colombia									
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO									
Informe N°	4	Periodo comprendido entre el 03 de Agosto del 2015	Y el 03 de Septiembre del 2015						
Proyecto	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)								
Localización	MUNICIPIO SAN JOSE DEL FRAGUA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS									
Objeto:	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICO AL CONTRATO DE CONSULTORIA cuyo objeto es CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA".								
Contrato N°:	MC-053 DEL 2015								
Contratista:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA								
Plazo Inicial:	15 días								
Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015								
*Fecha de Suspensión	19 de Junio de 2015								
*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015								
Fecha de Terminación:	13 de Julio de 2015								
Prórrogas:									
Plazo Actualizado:									
Valor Inicial:	\$	3.000.000,00	Valor Inicial:	\$	12.000.000,00				
Valor Adiciones:	\$		Valor Adiciones:	\$					
Valor Actualizado:	\$		Valor Actualizado:	\$					
Valor pagado:	\$		Valor pagado:	\$					
Valor por pagar:	\$	3.000.000,00	Valor por pagar:	\$	12.000.000,00				
Póliza Seguro de cumplimiento	N° 630-47-994000006429	VIGENCIA: 09/06/2015 - 15/01/2016	Póliza Seguro de cumplimiento	N° AA023400	VIGENCIA: 09/06/2015 - 31/12/2015	VALOR: 3.000.000			
Nombre Supervisor:	DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ								
* Inserte las filas que regular según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA									
Objeto:									
Contrato N°:									
Contratista:									
Plazo Inicial:									
Fecha de Inicio:									
*Fecha de Suspensión									
*Fecha de Reinicio:									
Fecha de Terminación:									
Prórrogas:									
Plazo Actualizado:									
Valor Inicial:									
Valor Adiciones:									
Valor Actualizado:									
Valor pagado:									
Valor por pagar:									
Nombre Supervisor:									
* Inserte las filas que regular según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias									

INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 004

INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 004									
ESTADO DE LAS GARANTÍAS									
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015					CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052 de 2015				
CONCEPTO	VIGENTE (fechas)	DESDE	HASTA	VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (fechas)	DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato	09/06/2015	29/12/2015		\$ 300.000,00	Cumplimiento del contrato	09/06/2015	31/12/2015		\$ 1.200.000,00
Salarios y prestaciones sociales	09/06/2015	29/12/2015		\$ 150.000,00	Estabilidad de la obra	09/06/2015	31/12/2015		\$ 1.200.000,00
Calidad del servicio	25/06/2015	15/01/2016		\$ 300.000,00	Calidad del servicio	09/06/2015	31/12/2015		\$ 600.000,00
Responsabilidad civil					Salarios y prestaciones sociales	09/06/2015	31/12/2015		\$ 600.000,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA Nº de 2014					CONTRATO DE OBRA Nº de 2014				
CONCEPTO	VIGENTE (fechas)	DESDE	HASTA	VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (fechas)	DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato					Cumplimiento del contrato				
Salarios y prestaciones sociales					Estabilidad de la obra				
Calidad del servicio					Calidad del servicio				
Responsabilidad civil					Salarios y prestaciones sociales				
CONTRATO DE OBRA Nº de 2014					CONTRATO DE OBRA Nº de 2014				
CONCEPTO					CONCEPTO				
Primer pago					Primer pago				

# INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 004

## DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

De acuerdo a las observaciones realizadas en la revisión de los estudios y diseños para la Construcción del Centro de Integración Ciudadana se hace necesario incluir Obras complementarias para garantizar su funcionalidad.

1. Elaboración del presupuesto para las obras complementarias por un valor de \$ 48,000.000, el cual es aporte del Municipio de acuerdo a las cláusulas del Convenio interadministrativo F - 212 del 2015, este se hace necesario solicitar facultades al honorable Consejo Municipal. Debido a la negativa de la Comisión de presupuesto encargada de dar el primer debate al proyecto de acuerdo, se vio la necesidad de presentarse en tres oportunidades. Se presenta primer proyecto de acuerdo No. 023 del 03 de Agosto y fue negado. Se presenta por segunda vez mediante proyecto de acuerdo No.025 y teniendo el mismo resultado. Se presenta por tercera vez Mediante proyecto de acuerdo No. 026 del 24 de agosto del 2015 siendo aprobado mediante acuerdo municipal No. 018 del 2015.

2. Se realiza ajuste a los planos Arquitectónicos y eléctricos de acuerdo a las obras complementarias del proyecto.

3. Se expide el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 540.

4. El día 04 de septiembre se hace entrega por segunda vez los estudios y diseños el cual fue aprobado por el Supervisor Arq. Juan Jose Blanco del Ministerio del Interior.


5. El día 07 de septiembre se hace publicación en página Secop de Prepliegos para el contrato de obra

6. El día 10 de Septiembre se envía acta de aprobación de estudios y diseños del proyecto con sus respectivas firmas

7. El día 26 de Agosto se envía Folia Técnica diligenciada del proyecto por solicitud del supervisor Arq. Juan Blanco.

8. Se radican los documentos solicitados por el supervisor Arq. Juan Blanco. Para el trámite del pago de la primera cuenta concerniente a Consultoría e Interventoría de los estudios y diseños para la construcción del centro de Integración Ciudadana

## 2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

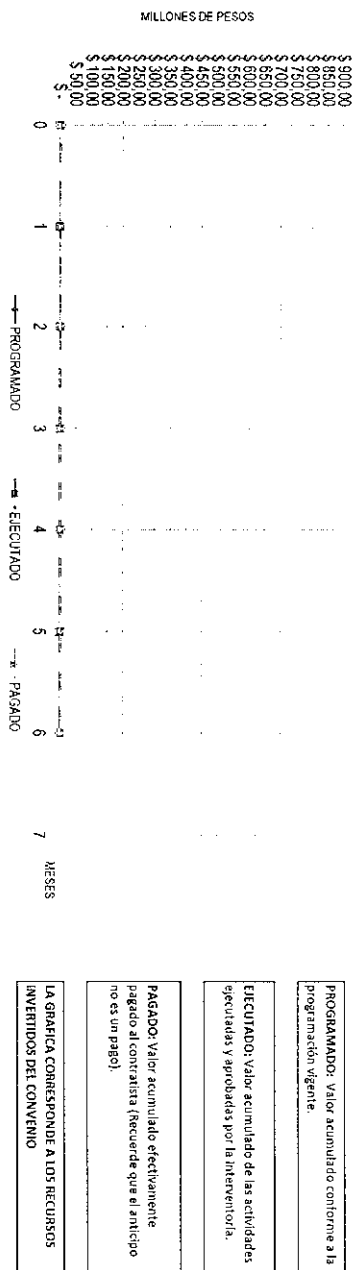

## 3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTENTORIA

INFORME LUTIVO MENSUAL N° 004

4. RELACION DE ANEXOS					
DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO			S/N/A.	Nº Folios	
1.	Balance Presupuestal de la obra	N	0		
2.	Registro Fotográfico	N	0		
3.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica	N	0		
4.	Copia último informe de interventoría	N	0		
5.	Copia actas de comité de obra	N	0		
6.	Copia libro de obra/bitácora	N	0		
7.	Copia certificado de pago a contratistas	N	0		
8.	Seguimiento plan de manejo ambiental	N	0		

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Elaborador:	31/01/2014
<div> <div></div> <div>Diego Alejandro Fernandez</div> </div>			Pag. 1 de 4	
Nombre: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ	Nombre:	Nombre:		
Cargo: Cargo: Supervisor del convenio F-212	Cargo:	Cargo:		

Seguros

21

INFORME EJECUTIVO MENSUAL N°									
ESTADO DE LAS GARANTÍAS									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015					CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052de 2015				
CONCEPTO	VIGENTE (fechas)	DE	HASTA	VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (fechas)	DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato	09/06/2015	29/12/2015		300.000,00	Cumplimiento del contrato	09/06/2015	31/12/2015		1.200.000,00
Salarios y prestaciones sociales	09/06/2015	29/12/2015		150.000,00	Estabilidad de la obra	09/06/2015	31/12/2015		1.200.000,00
Calidad del servicio	25/06/2015	15/01/2016		300.000,00	Salarios y prestaciones sociales	09/06/2015	31/12/2015		600.000,00
Responsabilidad civil					Responsabilidad civil	09/06/2015	31/12/2015		600.000,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº de 2014					CONTRATO DE OBRA Nº de 2014				
CONCEPTO	VIGENTE (fechas)	DE	HASTA	VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (fechas)	DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato					Cumplimiento del contrato				
Salarios y prestaciones sociales					Estabilidad de la obra				
Calidad del servicio					Calidad del servicio				
Responsabilidad civil					Salarios y prestaciones sociales				
					Responsabilidad civil				
RESUMEN DE PAGOS									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015					CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052de 2015				
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR			CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR		
Primer pago		\$					\$		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº de 2014					CONTRATO DE OBRA Nº de 2014				
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR			CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR		
Primer pago									



INFORME EJECUTIVO MENSUAL N° 005


DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

1. El día 07 de septiembre se hace publicación en página Secop de Pliegos para el contrato de obra. De acuerdo al cronograma de los pliegos definitivos, el día 06 de octubre se deben realizar entregas de las propuestas por parte de los oferentes. Para el día 08 de Octubre se realizará la evaluación a las propuestas. Para el día 20 de Octubre se tiene previsto la adjudicación del contrato a la mejor propuesta.

2. Elaboración de estudios previos y pliegos de condiciones para el contrato de Interventoría de obra para publicación en la página SECOP el día 06 de septiembre de 2015

3.

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"



3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA


INFORME EJECUTIVO MENSUAL N°



CONVENIO N° F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)	
Objeto del Convenio:	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)
Valor del Convenio:	\$ 735.000.000,00
Valor Adición:	\$ 48.000.000,00
Valor Total:	\$ 783.000.000,00
Plazo de Ejecución:	7 MESES
Fecha de Inicio:	08 DE MAYO DEL 2015
Vencimiento:	30 DE NOVIEMBRE DE 2015
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fecha)
Aseguradora Solidaria de Colombia	Desde 07/05/2015 Hasta 31/05/2016
Valor	Modificación fecha
Modificación Valor	Hasta
1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO	
Informe N°	5
Proyecto	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)
Localización	MUNICIPIO SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS	
Objeto:	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICO AL CONTRATO DE CONSULTORIA cuyo objeto es CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA"
Contrato N°:	MC-053 DEL 2015
Contratista:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA
Plazo Inicial:	15 días
Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015
*Fecha de Suspensión:	19 de Junio de 2015
*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015
Fecha de Terminación:	13 de Julio de 2015
Prórrogas:	
Plazo Actualizado:	
Valor Inicial:	\$ 3.000.000,00
Valor Adiciones:	\$ -
Valor Actualizado:	\$ -
Valor pagado:	\$ -
Valor por pagar:	\$ 3.000.000,00
Póliza Seguro de cumplimiento	N° 630-47- 994000006429 VIGENCIA: 09/06/2015 - 15/01/2016 VALOR: 750.000
Nombre Supervisor:	DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ
* Inserta las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias	
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA	
Objeto:	
Contrato N°:	
Contratista:	
Plazo Inicial:	
Fecha de Inicio:	
*Fecha de Suspensión:	
*Fecha de Reinicio:	
Fecha de Terminación:	
Prórrogas:	
Plazo Actualizado:	
Valor Inicial:	
Valor Adiciones:	
Valor Actualizado:	
Valor pagado:	
Valor por pagar:	
Nombre Supervisor:	
CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS	
Objeto:	"CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA"
Contrato N°:	MC-052 DEL 2015
Contratista:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
Plazo Inicial:	15 días
Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015
*Fecha de Suspensión:	19 de Junio de 2015
*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015
Fecha de Terminación:	13 de Julio de 2015
Prórrogas:	
Plazo Actualizado:	
Valor Inicial:	\$ 12.000.000,00
Valor Adiciones:	\$ -
Valor Actualizado:	\$ -
Valor pagado:	\$ -
Valor por pagar:	\$ 12.000.000,00
Póliza Seguro de cumplimiento	N° AAQ23400 VIGENCIA: 09/06/2015 - 31/12/2015 VALOR: 3.000.000
Nombre interventor:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA
CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	
Contrato N°:	
Contratista:	
Plazo Inicial:	
Fecha de Inicio:	
*Fecha de Suspensión:	
*Fecha de Reinicio:	
Fecha de Terminación:	
Prórrogas:	
Plazo Actualizado:	
Valor Inicial:	
Valor Adiciones:	
Valor Actualizado:	
Valor pagado:	
Valor por pagar:	
Nombre Supervisor:	

INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 005
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

INFORME EJECUTIVO MENSUAL N

4. RELACION DE ANEXOS			
DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/A	Nº Folios	Nº Folios
1. Balance Presupuestal de la obra	N	0	0
2. Registro Fotográfico	N	0	0
3. Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta crítica	N	0	0
4. Copia último informe de interventoría	N	0	0
5. Copia actas de comité de obra	N	0	0
6. Copia libro de obra/bitácora	N	0	0
7. Copia certificado de pago a contratistas	N	0	0
8. Seguimiento plan de manejo ambiental	N	0	0

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Elaborado:
			31/01/2014
Nombre: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ	Nombre:	Nombre:	Pag. 1 de 4
Cargo: Supervisor del convenio F-212	Cargo:	Cargo:	


 	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DE LOS</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>		<b>Código:</b> GC-P-03-F-01
			<b>Versión:</b> 01
			<b>Fecha Elaboración:</b> <b>25/07/2013</b>
			<b>Vigente Desde:</b> <b>26/08/2013</b>

**INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FONSECON**  
**CONTRATO F - 212 de 2015 - INFORME MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015.**

**1. GENERALIDADES CONVENIO**

OBJETO:	"Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros entre las partes para promover la gobernabilidad y la seguridad ciudadana a través de la construcción de infraestructura, mediante la ejecución del proyecto denominado "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA en el Municipio de SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA"		
BENEFICIARIO:	SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA		
VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO	TOTAL DEL CONVENIO		\$ 735.000.000,00
	APORTES MIN - FONSECON		\$ 735.000.000,00
	APORTES MUNICIPIO		\$ 00
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 30 DE Noviembre de 2015		
PRODUCTOS	PRESUPUESTO VIABILIZADO	PRESUPUESTO ADJUDICADO	DIFERENCIA
Estudios y diseños	\$ 12.000.000,00	\$ ,00	\$,00
Interventoría de estudios y diseños	\$ 3.000.000,00	\$ ,00	\$,00
Obra	\$ 687.900.000,00	\$ ,00	\$,00
Interventoria de obra	\$ 47.100.000,00	\$ ,00	\$,00
TOTAL	\$ 735.000.000,00	\$ 735.000.000,00	\$,00
FECHA SUSCRIPCION	06/05/2015		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	Harry Salamanca	20/05/2015	
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	NOMBRE	DESDE	HASTA
REGISTRO PRESUPUESTAL MI	Nº 62115	VALOR	\$ 735.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N/A	N/A	N/A
APROBACIÓN DE POLIZA	No. 630-47-994000006141	FECHA	07-MAY-15
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONVENIO	07-MAY-15	N/A	N/A
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	SOLICITUD 1:		
	SOLICITUD 2:		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A	N/A	N/A



 <b>MinInterior</b> Ministerio del Interior	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	<b>Código:</b> GC-P-03-F-02
		<b>Versión:</b> 04
		<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2013
		<b>Vigente Desde:</b> 26/08/2013

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

### ➤ Convenio interadministrativo

CONCEPTO	FECHA DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO		0.00%		\$,00
SEGUNDO DESEMBOLSO		0.0%		\$,00
TERCER DESEMBOLSO		70.0%		\$,00
ULTIMO DESEMBOLSO		100.0%		\$,00
<b>TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME</b>				\$,00


## 3. POLIZAS CONVENIO

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
N° 630-47-994000006141	Cumplimiento	\$ 147.000.000	07-MAY-15	31-MAY-16
	Calidad de servicio	N/A	N/A	N/A
	Pagos y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
	Buen manejo y correcta inversión	N/A	N/A	N/A

## • BALANCES FINANCIEROS DEL PROYECTO

### ➤ Contrato de Ejecución de obra

DESCRIPCIÓN		OBJETO		VALOR		
Contrato No						
Adicional (recursos de:)						
Nombre contratista						
Fecha De Inicio Del Proyecto						
VALOR TOTAL CONTRATADO:				\$ ,00		
CONCEPTO		% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO D/M/A
ANTICIPO OBRA		ANTICIPO	30%			
PRIMER DESEMBOLSO		100%	60%			
PAGO CONTRA LIQUIDACION		Firma acta	10%			
PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS			
			FECHA INICIO	FECHA FINAL		



**FORMATO**  
**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA**  
**CONTRATISTAS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO**  
**FONSECON**  
**ANEXO 2**

Código: GO-P-01-A-01

Versión: 04


Fecha Elaboración:  
25/07/2013

Vigente Desde:  
26/08/2013

	Cumplimiento	\$,00		
	Estabilidad y calidad de la obra	\$,00		
	Pagos y prestaciones sociales	\$,00		
	Responsabilidad civil	\$,00		
	Calidad del bien	\$,80		
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA			100%	
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA			100%	
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)			100%	
% RECURSOS EJECUTADOS			100%	

➤ **Contrato de Ejecución de Interventoría de obra**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR				
Contrato No						
Adicional (recursos de:)						
Nombre contratista						
Fecha De Inicio Del Proyecto						
VALOR TOTAL CONTRATADO:		\$,00				
CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO D/M/A	
ANTICIPO OBRA	ANTICIPO	30%				
PRIMER DESEMBOLSO	100%	60%				
PAGO CONTRA LIQUIDACION	Firma acta	10%				
PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS			
			FECHA INICIO	FECHA FINAL		
			Cumplimiento del contrato	\$,00		
			Calidad del servicio	\$,00		
			Pagos y prestaciones sociales	\$,00		
			Responsabilidad civil	N/A	N/A	N/A
	riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A	
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA			100%			
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA			100%			
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)			100%			
% RECURSOS EJECUTADOS			100%			

	<p align="center"><b>FORMATO</b>  <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b>  <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b>  <b>FONSECON</b>  <b>ANEXO 2</b></p>	<b>Código:</b> GC-P-03-F-02
		<b>Versión:</b> 04
		<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2013
		<b>Vigente Desde:</b> 26/08/2013

• **DEL MUNICIPIO:**

FECHA DE ULTIMO INFORME: NO HA ENVIADO A LA FECHA

• **INFORME DEL SUPERVISOR:**

**DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:**

**INFORME:** AGOSTO DE 2015

**AVANCE:** 10%

**ESTADO:** ACTIVO

**RECURSOS GIRADOS:** 0%

**Pendiente por recibir**

- **A la fecha se puede decir que el municipio va acorde con lo estipulado en cronograma**
- **Estudios y Diseños se aprobaron este mes.**
- **Publicación de obra e interventoria.**

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

**Se enviaron correos – se charlo con los distintos municipios para verificar la gestión individual con respecto a cada convenio – Se copian archivos del presente mes.**

• **CORREO ENVIADO POR EL MUNICIPIO**

Arquitecto Juan Blanco,

Cordial saludo.

Envío Informe No. 03 del Centro de Integración Ciudadana del Municipio de San Jose del Fragua, Caquetá.

Atento a sus comentarios.

Diego Fernández

• **CORREO ENVIADO POR EL MINISTERIO**

Por medio del presente Solicito **cancelar** la comisión aprobada para realizar visita al departamento de Caquetá y los municipios de Cartagena del chaira , san Vicente del caguan, Albania , curillo , san José del fragua Florencia . Como seguimiento a la gestión contractual de los convenios CIC firmados con el Ministerio .

**NOMBRE DEL COMISIONADO :** Juan Jose Blanco Oviedo

**CÉDULA DE CIUDADANÍA :** 92.544.660

• **CORREO ENVIADO POR EL MUNICIPIO**

Arquitecto,

Cordial saludo.

Por medio del presente remito formato diligenciado con los soportes correspondientes en cuanto a :

1. **PUBLICACIÓN DE EYD - CONSULTORIA E INTERVENTORIA**

A la fecha está pendiente la publicación del contrato de obra y de interventoria

Atento a sus comentarios.

Cordialmente

**DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ**



Secretario de Planeación

San Jose del Fragua, Caquetá.

• **CORREO ENVIADO POR EL MINISTERIO**

Buenos días.

**Srs. Secretarios de Planeación y Supervisores**

 	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	Código: 00-P-03-877
		Versión: 0
		Fecha Emisión: 25/07/2013
		Vigente Desde: 26/08/2013

Por medio del presente les envío un cordial saludo , felicitar a los municipios que van al día en cuanto a documentación y gestión contractual frente a sus respectivos convenios , a los otros decirles e invitarlos a que se unan para poder llevar de la mejor forma y cumplir con los objetivos trazados en lo respectivo .

Este mes además de todos los compromisos individuales y correspondientes por Municipio y su respectivo Convenio les solicito para la próxima semana la siguiente documentación para tramitar el primer desembolso referente a el costo de la Consultoria e Interventoria de Estudios y Diseños para los ajustes del Centro de Integración Ciudadana - CIC.

- 1- Copia de contratos de Consultoria e Interventoria , con sus respectivas ofertas por parte del contratista asignado
- 2- Pago aportes parafiscales del Municipio con VªBª del Señor Alcalde
- 3- Certificación por parte de secretaria de hacienda o quien haga las veces corroborando que el Municipio se encuentra al día en esos pagos y aportes # 2 , firmada por la secretaria(o) y VªBª del Señor Alcalde
- 4- Cuenta de cobro en Original que lleve : ( Formato no predeterminado )
  - Nit del Ministerio
  - Nit del Municipio
  - Fecha
  - Consecutivo numeral tipo factura, para este efecto y siendo la primera será ( 001 )
  - Respectiva cuenta sujeta al primer pago correspondiente al convenio , revisar Minuta \$
  - Firmada por el alcalde en original
  - Hoja con membretada del municipio

Nota : Toda esta documentación debe hacerse llegar a esta Supervisión en medio físico y entrar por correspondencia oficial del Ministerio

Para todos los efectos relacionados con la supervisión del convenio de la referencia se podrán contactar con mi persona Arq. Juan José Blanco Oviedo al 300 689 90 02 y a este correo electrónico.

- CORREO ENVIADO POR EL MINISTERIO

Buenas tardes.

Srs. Supervisores

Por medio del presente me permito enviarles un cordial saludo y recordarles los compromisos correspondientes y pendientes INDIVIDUALMENTE POR CONVENIO.

Teniendo en cuenta todas las cláusulas suscritas en el presente y en especial las contenidas en la CLAUSULA SEGUNDA -OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO, y los numerales:

Numeral 5, Entregar el lote descapotado, nivelado, libre de construcciones y cualquier limitante física o legal, previo a la suscripción del acta de inicio de la obra, asumiendo los costos.

Numeral 6, Adelantar de manera simultánea todas las gestiones administrativas, contractuales y financieras necesarias para la contratación de la consultoría con su respectiva interventoria (externa), la cual deberá contener como mínimo, el estudio de suelos, cálculo y diseño de cimentación y estructura, ajustes a diseños hidráulicos, sanitarios, arquitectónicos, eléctricos y al presupuesto soportados con los análisis de precios unitarios "APU", de acuerdo con los precios del mercado de la región y cronograma de obra, ajustados, en todo caso a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios vigentes.

Numeral 7, Adelantar de manera simultánea, todas las gestiones administrativas, Contractuales y financieras necesarias para la contratación de la obra y de la Interventoria, ajustados, en todo caso a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y su decretos reglamentarios vigentes.

Numeral 8, Aprobar a través del supervisor del convenio designado por el MUNICIPIO, el estudio de suelos, cálculo y diseño de cimentación y estructura, ajustes a diseños hidráulicos, sanitarios, arquitectónicos, eléctricos y al presupuesto que resulten de la consultoría, previamente aprobado por el interventor.



MinInterior  
Ministerio del Interior

FORMATO  
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA  
CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -  
FONSECON  
ANEXO 2

Código: GC-P-03-F-02

Versión: 04

Fecha Elaboración:  
25/07/2013

Vigente Desde:  
26/08/2013

Numeral 9, Presentar al supervisor designado por el Ministerio 1 FONSECON, los documentos producto de la consultoría e interventoría, debidamente aprobados por el interventor y el supervisor designado por el municipio. El supervisor por parte del Ministerio, deberá recibir a satisfacción, lo cual es requisito indispensable para el inicio de las gestiones para la contratación de la obra e interventoría.

Numeral 23, Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros Cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, indicando los porcentajes de avance y ejecución de acuerdo con el cronograma presentado y previamente aprobado por la Interventoría, al informe se deberán adjuntar los soportes respectivos.

Por todo lo anterior solicito el estado actual de los procesos contractuales la gestión de los contractuales; Esta supervisión le exige el cumplimiento de los mismos para poder continuar con el objeto del presente convenio. Así como los correspondientes soportes de toda la gestión adelantada y los correspondientes informes vencidos sin entregar.

Para todos los efectos relacionados con la supervisión del convenio de la referencia se podrán contactar con mi persona Arq. Juan José Blanco Oviedo al 300 689 90 02 y a este correo electrónico.

Por último recordar que la cláusula cuarta determina que el plazo para la ejecución del convenio es hasta el 30 de Noviembre de 2015.

NOTA: Por favor aquellos municipios que estén al día hacer caso omiso, pero no bajen la guardia y continúen en ese camino es la única forma de cumplir los objetivos trazados

- **CORREO ENVIADO POR EL MINISTERIO**

Buenas tardes ..

Srs. Supervisores de Convenios CIC - Ministerio del Interior

Por medio del presente quisiera saludarles, y recordarles la importancia en el cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos a través de la firma del respectivo convenio suscrito entre el Ministerio del Interior y sus Municipios.

Les reitero que en la minuta del convenio en la cláusula segunda aparecen enumeradas todas sus obligaciones en cuanto a gestión contractual y como supervisores por parte del municipio ustedes deben adelantar frente a esta supervisión y que obvio recae positiva o negativamente en los Srs. Alcaldes como ordenadores del gasto municipal.

Por todo lo anterior solicito el estado actual de los procesos contractuales la gestión de los contractuales; Esta supervisión le exige el cumplimiento de los mismos para poder continuar con el objeto del presente convenio. Así como los correspondientes soportes de toda la gestión adelantada y los correspondientes informes vencidos sin entregar.



NOTA : ( Aquellos Municipios que deben )

- Estudios Y Diseños
- Informes Mensuales
- Cronograma de Actividades
- Adecuación de Lotes
- Incorporación de Recursos

- Toda la documentación requerida acorde a la gestión contractual adelantada por el supervisor correspondiente y su convenio respectivo

Para todos los efectos relacionados con la supervisión del convenio de la referencia se podrán contactar con mi persona Arq. Juan José Blanco Oviedo al 300 689 90 02 y a este correo electrónico.



 	<p align="center"><b>FORMATO</b>  <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b>  <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO</b>  <b>FONSECON</b>  <b>ANEXO 2</b></p>	Código: GOF-03-P-01
		Versión: 0
		Fecha Emisión: 25/07/2013
		Vigente Desde: 26/08/2013

Por medio del presente les envío un cordial saludo , felicitar a los municipios que van al día en cuanto a documentación y gestión contractual frente a sus respectivos convenios , a los otros decirles e invitarlos a que se unan para poder llevar de la mejor forma y cumplir con los objetivos trazados en lo respectivo .

Este mes además de todos los compromisos individuales y correspondientes por Municipio y su respectivo Convenio les solicito para la próxima semana la siguiente documentación para tramitar el primer desembolso referente a el costo de la Consultoria e Interventoria de Estudios y Diseños para los ajustes del Centro de Integración Ciudadana - CIC.

- 1- Copia de contratos de Consultoria e Interventoria , con sus respectivas ofertas por parte del contratista asignado
- 2- Pago aportes parafiscales del Municipio con VªBª del Señor Alcalde
- 3- Certificación por parte de secretaria de hacienda o quien haga las veces corroborando que el Municipio se encuentra al día en esos pagos y aportes # 2 , firmada por la secretaria(o) y VªBª del Señor Alcalde
- 4- Cuenta de cobro en Original que lleve : ( Formato no predeterminado )
  - Nit del Ministerio
  - Nit del Municipio
  - Fecha
  - Consecutivo numeral tipo factura, para este efecto y siendo la primera será ( 001 )
  - Respectiva cuenta sujeta al primer pago correspondiente al convenio , revisar Minuta \$
  - Firmada por el alcalde en original
  - Hoja con membretada del municipio

**Nota :** Toda esta documentación debe hacerse llegar a esta Supervisión en medio físico y entrar por correspondencia oficial del Ministerio

Para todos los efectos relacionados con la supervisión del convenio de la referencia se podrán contactar con mi persona Arq. Juan José Blanco Oviedo al 300 689 90 02 y a este correo electrónico.

- CORREO ENVIADO POR EL MINISTERIO

Buenas tardes.

Srs. Supervisores

Por medio del presente me permito enviarles un cordial saludo y recordarles los compromisos correspondientes y pendientes INDIVIDUALMENTE POR CONVENIO.

Teniendo en cuenta todas las clausulas suscritas en el presente y en especial las contenidas en la CLAUSULA SEGUNDA -OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO, y los numerales:

**Numeral 5,** Entregar el lote descapotado, nivelado, libre de construcciones y cualquier limitante física o legal, previo a la suscripción del acta de inicio de la obra, asumiendo los costos.

**Numeral 6,** Adelantar de manera simultánea todas las gestiones administrativas, contractuales y financieras necesarias para la contratación de la consultoría con su respectiva interventoria (externa), la cual deberá contener como mínimo, el estudio de suelos, cálculo y diseño de cimentación y estructura, ajustes a diseños hidráulicos, sanitarios, arquitectónicos, eléctricos y al presupuesto soportados con los análisis de precios unitarios "APU", de acuerdo con los precios del mercado de la región y cronograma de obra, ajustados, en todo caso a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios vigentes.

**Numeral 7,** Adelantar de manera simultánea, todas las gestiones administrativas, Contractuales y financieras necesarias para la contratación de la obra y de la Interventoria, ajustados, en todo caso a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y su decretos reglamentarios vigentes.

**Numeral 8,** Aprobar a través del supervisor del convenio designado por el MUNICIPIO, el estudio de suelos, cálculo y diseño de cimentación y estructura, ajustes a diseños hidráulicos, sanitarios, arquitectónicos, eléctricos y al presupuesto que resulten de la consultoria, previamente aprobado por el interventor.



Ministerio del Interior

FORMATO  
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA  
CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -  
FONSECON  
ANEXO 2

Código: GC-P-03-F-02

Versión: 04

Fecha Elaboración:  
25/07/2013

Vigente Desde:  
26/08/2013

Numeral 9, Presentar al supervisor designado por el Ministerio 1 FONSECON, los documentos producto de la consultoría e interventoría, debidamente aprobados por el interventor y el supervisor designado por el municipio. El supervisor por parte del Ministerio, deberá recibir a satisfacción, lo cual es requisito indispensable para el inicio de las gestiones para la contratación de la obra e interventoría.

Numeral 23, Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros Cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, indicando los porcentajes de avance y ejecución de acuerdo con el cronograma presentado y previamente aprobado por la Interventoría, al informe se deberán adjuntar los soportes respectivos.

Por todo lo anterior solicito el estado actual de los procesos contractuales la gestión de los contractuales; Esta supervisión le exige el cumplimiento de los mismos para poder continuar con el objeto del presente convenio. Así como los correspondientes soportes de toda la gestión adelantada y los correspondientes informes vencidos sin entregar.

Para todos los efectos relacionados con la supervisión del convenio de la referencia se podrán contactar con mi persona Arq. Juan José Blanco Oviedo al 300 689 90 02 y a este correo electrónico.

Por último recordar que la cláusula cuarta determina que el plazo para la ejecución del convenio es hasta el 30 de Noviembre de 2015.

NOTA: Por favor aquellos municipios que estén al día hacer caso omiso, pero no bajen la guardia y continúen en ese camino es la única forma de cumplir los objetivos trazados

- CORREO ENVIADO POR EL MINISTERIO

Buenas tardes ..

Srs. Supervisores de Convenios CIC - Ministerio del Interior

Por medio del presente quisiera saludarles, y recordarles la importancia en el cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos a través de la firma del respectivo convenio suscrito entre el Ministerio del Interior y sus Municipios.

Les reitero que en la minuta del convenio en la cláusula segunda aparecen enumeradas todas sus obligaciones en cuanto a gestión contractual y como supervisores por parte del municipio ustedes deben adelantar frente a esta supervisión y que obvio recae positiva o negativamente en los Srs. Alcaldes como ordenadores del gasto municipal.


Por todo lo anterior solicito el estado actual de los procesos contractuales la gestión de los contractuales; Esta supervisión le exige el cumplimiento de los mismos para poder continuar con el objeto del presente convenio. Así como los correspondientes soportes de toda la gestión adelantada y los correspondientes informes vencidos sin entregar.

NOTA : ( Aquellos Municipios que deben )

- Estudios Y Diseños
- Informes Mensuales
- Cronograma de Actividades
- Adecuación de Lotes
- Incorporación de Recursos

- Toda la documentación requerida acorde a la gestión contractual adelantada por el supervisor correspondiente y su convenio respectivo

Para todos los efectos relacionados con la supervisión del convenio de la referencia se podrán contactar con mi persona Arq. Juan José Blanco Oviedo al 300 689 90 02 y a este correo electrónico.

	Código: CC-P-01-P-02 <b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO</b> FONSECON <b>ANEXO 2</b>	Código: G-P-01-P-02 Versión: 04 Fecha de elaboración: <b>25/07/2013</b> Vigente Desde: <b>26/08/2013</b>
---	--	---

**NOTA:** Por favor aquellos municipios que estén al día hacer caso omiso, pero no bajen la guardia y continúen en ese camino es la única forma de cumplir los objetivos trazados

**CONCLUSIÓN**



Seguir adelantando toda la gestión para el buen funcionamiento entre las partes para con el convenio

ACTAS DE OBRA e INTERVENTORIA	
Acta de cantidades de Ejecución de Obra	
Acta de Recibo y Entrega de Bienes	
Informes final del municipio	

• **VISITAS DE OBRA**

SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA	RECIBO Y ENTREGA DEL BIENE			



• **SUPERVISORES**

SUPERVISOR	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
 <b>ARQ. HARRY SALAMANCA</b> Subdirección de Infraestructura Ministerio - Fonseca	 <b>ARQ. JUAN JOSE BLANCO</b> Subdirección de Infraestructura Ministerio - Fonseca

EMISION PARA 004

EL MINISTERIO - PARA EL EJERCICIO

CONVENIOS SUSCRITOS CON



 	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>		Código: 161-100-001
			Versión: 04
			Fecha actualización: <b>25/07/2013</b>
			Vigente Desde: <b>26/08/2013</b>

**INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FONSECON**  
**CONTRATO F - 212 de 2015 - INFORME MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015.**

**1. GENERALIDADES CONVENIO**

OBJETO:	"Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros entre las partes para promover la gobernabilidad y la seguridad ciudadana a través de la construcción de infraestructura, mediante la ejecución del proyecto denominado "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA en el Municipio de SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA"		
BENEFICIARIO:	SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA		
VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO	TOTAL DEL CONVENIO	\$ 735.000.000,00	
	APORTES MIN - FONSECON	\$ 735.000.000,00	
	APORTES MUNICIPIO	\$ 00	
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 30 DE Noviembre de 2015		
PRODUCTOS	PRESUPUESTO VIABILIZADO	PRESUPUESTO ADJUDICADO	DIFERENCIA
Estudios y diseños	\$ 12.000.000,00	\$ ,00	\$,00
Interventoría de estudios y diseños	\$ 3.000.000,00	\$ ,00	\$,00
Obra	\$ 687.900.000,00	\$ ,00	\$,00
Interventoria de obra	\$ 47.100.000,00	\$ ,00	\$,00
TOTAL	\$ 735.000.000,00	\$ 735.000.000,00	\$,00
FECHA SUSCRIPCION	06/05/2015		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	MIGUEL TURMEQUE	14/09/2015	
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	Harry Salamanca	20/05/2015	14/09/2015
REGISTRO PRESUPUESTAL MI	Nº 62115	VALOR	\$ 735.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N/A	N/A	N/A
APROBACIÓN DE POLIZA	No. 630-47-994000006141	FECHA	07-MAY-15
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONVENIO	07-MAY-15	N/A	N/A
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	SOLICITUD 1:		
	SOLICITUD 2:		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A	N/A	N/A



 	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	<b>Código:</b> GC-P-03-F-02
		<b>Versión:</b> 04
		<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2013
		<b>Vigente Desde:</b> 26/08/2013

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

### ➤ Convenio interadministrativo

CONCEPTO	FECHA DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO		0.00%		\$,00
SEGUNDO DESEMBOLSO		0.0%		\$,00
TERCER DESEMBOLSO		70.0%		\$,00
ULTIMO DESEMBOLSO		100.0%		\$,00
<b>TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME</b>				\$,00



## 3. POLIZAS CONVENIO

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
N° 630-47-994000006141	Cumplimiento	\$ 147.000.000	07-MAY-15	31-MAY-16
	Calidad de servicio	N/A	N/A	N/A
	Pagos y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
	Buen manejo y correcta inversión	N/A	N/A	N/A

## • BALANCES FINANCIEROS DEL PROYECTO

### ➤ Contrato de Ejecución de obra



DESCRIPCIÓN		OBJETO		VALOR		
Contrato No						
Adicional (recursos de:)						
Nombre contratista						
Fecha De Inicio Del Proyecto						
VALOR TOTAL CONTRATADO:				\$ ,00		
CONCEPTO		% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO D/M/A
ANTICIPO OBRA		ANTICIPO	30%			
PRIMER DESEMBOLSO		100%	60%			
PAGO CONTRA LIQUIDACION		Firma acta	10%			
PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS			
			FECHA INICIO	FECHA FINAL		

 	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	Código: GC-P-03-F-01
		Versión: 01
		Fecha Elaboración: 25/07/2013
		Vigente Desde: 26/08/2013

	Cumplimiento	\$,00		
	Estabilidad y calidad de la obra	\$,00		
	Pagos y prestaciones sociales	\$,00		
	Responsabilidad civil	\$,00		
	Calidad del bien	\$,80		
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA			100%	
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA			100%	
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)			100%	
% RECURSOS EJECUTADOS			100%	

➤ **Contrato de Ejecución de Interventoría de obra**

Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra						
DESCRIPCIÓN		OBJETO			VALOR	
Contrato No						
Adicional (recursos de:)						
Nombre contratista						
Fecha De Inicio Del Proyecto						
VALOR TOTAL CONTRATADO:					\$,00	
CONCEPTO		% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO D/M/A
ANTICIPO OBRA		ANTICIPO	30%			
PRIMER DESEMBOLSO		100%	60%			
PAGO CONTRA LIQUIDACION		Firma acta	10%			
PÓLIZA No.	AMPAROS		VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS		
				FECHA INICIO	FECHA FINAL	
	Cumplimiento del contrato		\$,00			
	Calidad del servicio		\$,00			
	Pagos y prestaciones sociales		\$,00			
	Responsabilidad civil		N/A	N/A	N/A	
riesgo		N/A	N/A	N/A		
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA					100%	
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA					100%	
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)					100%	
% RECURSOS EJECUTADOS					100%	



 	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	<b>Código:</b> GC-P-03-F-02
		<b>Versión:</b> 04
		<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2013
		<b>Vigente Desde:</b> 26/08/2013

• **DEL MUNICIPIO:**

<b>FECHA DE ULTIMO INFORME:</b> NO HA ENVIADO A LA FECHA

• **INFORME DEL SUPERVISOR:**

<b>DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:</b> <b>INFORME: SEPTIEMBRE DE 2015</b> <b>AVANCE: 10%</b> <b>ESTADO: ACTIVO</b> <b>RECURSOS GIRADOS: 0%</b>  <b>Pendiente por recibir</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ya existe contrato de obra , falta legalizar interventoria</li> <li>- Pendiente Incluir 5 frentes de trabajo en contrato de obra</li> <li>- Documentación 2 desembolso</li> </ul> <b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b> Se enviaron correos – se charlo con los distintos municipios para verificar la gestión individual con respecto a cada convenio – Se copian archivos del presente mes. <ul style="list-style-type: none"> <li>• CORREO ENVIADO POR EL MINISTERIO Buenas Noches.</li> </ul> <p>Srs. Supervisores</p> <p>Por medio del presente les envió un cordial saludo dándole cierre a este mes de Agosto el cual fue bastante flojo en gestión por parte de algunos municipios y la bienvenida a Septiembre que para algunos convenios será el comienzo de sus obras , para otros apenas entrega de Estudios y Diseños , para otros publicación de los mismos . En fin cada convenio sabe en qué va en cuanto a su gestión contractual y en que está pendiente con esta supervisión.</p> <p>La supervisión del Ministerio del Interior, ha adelantado las gestiones tendientes a exhortar a los municipios al cumplimiento de las obligaciones de los respectivos convenios firmados en 2015 y teniendo en cuenta que no se han atendido las solicitudes realizadas por algunos municipios, se considera que no existe la voluntad por parte de estos por cumplir adecuadamente con el objeto del convenio en el término pactado para ello. (CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS)</p> <p>Por lo anterior se solicita enviar los pendientes de cada convenio a más tardar el día viernes 04 de Septiembre de 2015 con el fin de poder hacer una revisión por parte de la supervisión del Ministerio del Interior. Recuerden que él no acato al convenio y no colaboración ante la Gestión Contractual por parte de los</p>
--

 	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO</b> <b>FONDECAN</b> <b>ANEXO 2</b>		Código: GC-P-03-F-01
			Versión: 01
			Fecha Elaboración: 25/07/2013
			Vigente Desde: 26/08/2013

	Cumplimiento	\$,00		
	Estabilidad y calidad de la obra	\$,00		
	Pagos y prestaciones sociales	\$,00		
	Responsabilidad civil	\$,00		
	Calidad del bien	\$,80		
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA			100%	
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA			100%	
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)			100%	
% RECURSOS EJECUTADOS			100%	

➤ **Contrato de Ejecución de Interventoría de obra**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR			
Contrato No					
Adicional (recursos de:)					
Nombre contratista					
Fecha De Inicio Del Proyecto					
VALOR TOTAL CONTRATADO:		\$,00			
CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO D/M/A
ANTICIPO OBRA	ANTICIPO	30%			
PRIMER DESEMBOLSO	100%	60%			
PAGO CONTRA LIQUIDACION	Firma acta	10%			
PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS		
			FECHA INICIO	FECHA FINAL	
	Cumplimiento del contrato	\$,00			
	Calidad del servicio	\$,00			
	Pagos y prestaciones sociales	\$,00			
	Responsabilidad civil	N/A	N/A	N/A	
	riesgo	N/A	N/A	N/A	
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA			100%		
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA			100%		
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)			100%		
% RECURSOS EJECUTADOS			100%		



FORMATO  
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA  
CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -  
FONSECÓN  
ANEXO 2

Código: GC-P-03-F-02

Versión: 04

Fecha Elaboración:  
25/07/2013

Vigente Desde:  
26/08/2013

• DEL MUNICIPIO:

FECHA DE ULTIMO INFORME: NO HA ENVIADO A LA FECHA

• INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

INFORME: SEPTIEMBRE DE 2015

AVANCE: 10%

ESTADO: ACTIVO

RECURSOS GIRADOS: 0%

Pendiente por recibir

- Ya existe contrato de obra , falta legalizar interventoria
- Pendiente Incluir 5 frentes de trabajo en contrato de obra
- Documentación 2 desembolso

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se enviaron correos – se charlo con los distintos municipios para verificar la gestión individual con respecto a cada convenio – Se copian archivos del presente mes.


- CORREO ENVIADO POR EL MINISTERIO  
Buenas Noches.

Srs. Supervisores

Por medio del presente les envió un cordial saludo dándole cierre a este mes de Agosto el cual fue bastante flojo en gestión por parte de algunos municipios y la bienvenida a Septiembre que para algunos convenios será el comienzo de sus obras , para otros apenas entrega de Estudios y Diseños , para otros publicación de los mismos . En fin cada convenio sabe en qué va en cuanto a su gestión contractual y en que está pendiente con esta supervisión.

La supervisión del Ministerio del Interior, ha adelantado las gestiones tendientes a exhortar a los municipios al cumplimiento de las obligaciones de los respectivos convenios firmados en 2015 y teniendo en cuenta que no se han atendido las solicitudes realizadas por algunos municipios, se considera que no existe la voluntad por parte de estos por cumplir adecuadamente con el objeto del convenio en el término pactado para ello. (CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS)

Por lo anterior se solicita enviar los pendientes de cada convenio a más tardar el día viernes 04 de Septiembre de 2015 con el fin de poder hacer una revisión por parte de la supervisión del Ministerio del Interior. Recuerden que él no acato al convenio y no colaboración ante la Gestión Contractual por parte de los

	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	Código: CC-P-03-F-02
		Versión: 04
		Fecha Elaboración: 25/07/2013
		Vigente Desde: 26/08/2013

Municipios acarrea trámites por posibles incumplimientos.

Para todos los efectos relacionados con la supervisión del convenio de la referencia se podrán contactar con mi persona Arq. Juan José Blanco Oviedo al 300 689 90 02 y a este correo electrónico.

• **CORREO ENVIADO POR EL MINISTERIO**

Buenas Noches.  
Srs. Supervisores

Por medio del presente les envié un cordial saludo dándole cierre a este mes de Septiembre, espero este próximo mes sea un poco más activo por parte de algunos supervisores que no están cumpliendo con las obligaciones suscritas dentro de los respectivos convenios y que estas recaen, recuerden sobre el ordenador del gasto. (Señores alcaldes). Será el comienzo de sus obras, para otros apenas entrega de Estudios y Diseños, para otros publicación de los mismos. En fin cada convenio sabe en qué va en cuanto a su gestión contractual y en que está pendiente con esta supervisión.

La supervisión del Ministerio del Interior, ha adelantado las gestiones tendientes a exhortar a los municipios al cumplimiento de las obligaciones de los respectivos convenios firmados en 2015. Se reitera cumplir adecuadamente con el objeto del convenio en el término pactado para ello. (CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS). Y LOS NUMERALES CORRESPONDIENTES DENTRO DE SUS RESPECTIVOS CONVENIOS.

Por lo anterior se solicita enviar los pendientes de cada convenio con el fin de poder hacer una revisión por parte de la supervisión del Ministerio del Interior. Recuerden que el no acato al convenio y no colaboración ante la Gestión Contractual por parte de los Municipios acarrea trámites por posibles incumplimientos.

Para todos los efectos relacionados con la supervisión del convenio de la referencia se podrán contactar con mi persona Arq. Juan José Blanco Oviedo al 300 689 90 02 y a este correo electrónico.

Feliz comienzo de mes y espero con su ayuda poder sacar estos convenios adelante; Éxitos!!!

Cordialmente

**NOTA:** Por favor aquellos municipios que estén al día hacer caso omiso, pero no bajen la guardia y continúen en ese camino es la única forma de cumplir los objetivos trazados

**CONCLUSIÓN**



Seguir adelantando toda la gestión para el buen funcionamiento entre las partes para con el convenio

ACTAS DE OBRA e INTERVENTORIA	
Acta de cantidades de Ejecución de Obra	
Acta de Recibo y Entrega de Bienes	
Informes final del municipio	



• **VISITAS DE OBRA**

SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA	RECIBO Y ENTREGA DEL BIENE			



 	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	<b>Código:</b> GC-P-03-F-02
		<b>Versión:</b> 04
		<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2013
		<b>Vigente Desde:</b> 26/08/2013

• **SUPERVISORES**

<p><b>SUPERVISOR</b></p>  <p><b>ARQ. MIGUEL TURMEQUE BUITOS</b>  Subdirección de Infraestructura Ministerio -  Fonsecon</p>	<p><b>PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN</b></p>  <p><b>ARQ. JUAN JOSE BLANCO O</b>  Subdirección de Infraestructura Ministerio -  Fonsecon</p>
--	--



República de Colombia

Departamento del Caquetá  
**MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL  
FRAGUA**

NIT. 800.095.782-0

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**  
No 028

Código: L.P - 006

Versión: 1.0 Fecha: 23 de Octubre de  
2015

Página 1 de 14

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 028**  
(23 de Octubre de 2015)

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA NIT: 800.095.782-0

**CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL SAN JOSE DEL FRAGUA C.I.C 2015 NIT 900.901.022

**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA- CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ).

**VALOR:** SETECIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$720.900.000) M/CTE.

**DURACION:** DOS (02) MESES.

Los aquí firmantes **CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR**, mayor de edad, vecino y domiciliado en San José del Fragua, identificado con la cédula de ciudadanía N° 17.651.020 expedida en Florencia, en su calidad de Alcalde Popular del Municipio de San José del Fragua, elegido legalmente de acuerdo con la credencial expedida por la Comisión Escrutadora Municipal el día 31 de Octubre de 2011, según consta en el acta de posesión N° 003 de fecha 29 de Diciembre de 2011, autorizado Por el Honorable Concejo Municipal para celebrar el presente contrato, según el Acuerdo Municipal N° 019 del Dieciocho (18) de Septiembre de 2015, en ejercicio de la competencia otorgada por el art. 11, literal b) de la Ley 80 de 1993, y quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE; y por la otra el Señor **WILIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO** también mayor de edad, identificado (a) con la Cedula de Ciudadanía No 17.648.625 de Florencia - Caquetá, actuando en calidad de Representante Legal de la **UNION TEMPORAL SAN JOSE DEL FRAGUA C.I.C 2015** identificada con el Nit 900.901.022 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de OBRA PUBLICA consignado en las siguientes cláusulas, previo el procedimiento de LICITACION PUBLICA, mediante las siguientes consideraciones: 1). Que se adelantó el proceso de LICITACION PUBLICA No. 006 DE 2015. 2). Que el proyecto de pliego de condiciones estuvo publicado desde el Nueve (09) de Septiembre del 2015 en la página Web: [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co). 3). Que de acuerdo a la resolución No. 514 del Veintitrés (23) de Septiembre de 2015, se ordenó la apertura de la LICITACION PUBLICA No. 006 DE 2015, para la CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA- CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ). 4) Que el pliego de condiciones definitivo estuvo disponible y publicado en la página Web: [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co), desde el Veintitrés (23) de Septiembre de 2015. 5) Que mediante Resolución No. 538 del Catorce (14) de Octubre de 2015, se adjudicó el contrato de obra por obtener el mayor puntaje y por ende calificada en primer lugar, toda vez que cumple con los intereses del Municipio de acuerdo con el informe de evaluación preparado por el

**REGISTRANDO EL CAMBIO**

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia

[www.san jose-caqueta.gov.co](http://www.san jose-caqueta.gov.co)

E-Mail: [alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co](mailto:alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co)

Código Postal 18 60 70



comité de evaluación, el cual resulta de la aplicación del pliego de condiciones de la LICITACION PUBLICA No. 006 DE 2015. 6) Que la evaluación jurídica, financiera, técnica y económica hacen parte integral del presente contrato. 7) Que con fundamento en lo anteriormente expuesto, en ejercicio de la autonomía de la voluntad las partes convienen celebrar el presente contrato, el cual se celebra en cumplimiento de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, decretos reglamentarios, manual de contratación municipal y demás normas complementarias, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OBJETO:** EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el CONTRATANTE la obra consistente en la CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA- CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ), según lo establecido en los pliegos de condiciones, a los precios unitarios y en los términos que se convienen en este contrato y de conformidad con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, todos los cuales forman parte integrante del presente contrato. **CLAUSULA SEGUNDA: CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS:** El CONTRATISTA ejecutará para el CONTRATANTE las obras objeto del contrato a los precios unitarios y en las cantidades aproximadas que se convienen así:

#### CANTIDADES ESTIMADAS Y PRESUPUESTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	V. UNITARIO	VR. TOTAL
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
1.1	1.1 Localización y Replanteo	M2	1148.87	2,998	3,444,312
	<b>SUB TOTAL PRELIMINARES</b>				<b>3,444,312</b>
<b>2</b>	<b>EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>				
2.1	2.1 Excavación en Material Común.	M3	244.06	30,601	7,468,451
2.2	2.2 Relleno con material de excavación	M3	56.63	22,038	1,248,012
2.3	2.3 Cargue y transporte de Material sobrante	M3	218.40	27,313	5,965,159
2.4	2.4 Relleno con Sub base granular compactada.	M3	120.63	45,363	5,474,551
	<b>SUB TOTAL EXCAVACION, RELLENO Y RETIRO</b>				<b>20,156,173</b>
<b>3</b>	<b>BASES, CIMIENTOS Y ANCLAJES</b>				
3.1	3.1 Concreto para zapatas F'c 24 Mpa	M3	57.63	444,059	25,591,120
3.2	3.2 Concreto para pedestales F'c 24 Mpa	M3	7.94	506,959	4,025,254
3.3	3.3 Concreto para viga de cimentación F'c 24 Mpa	M3	38.70	449,003	17,376,416
3.4	3.4 Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	KG	12645.62	4,630	58,549,217
3.5	3.5 Concreto para Solado F'c 14 Mpa	M3	6.18	346,737	2,142,835
3.6	3.6 Placa en concreto Mpa 240 kg/cm2	M2	532.00	59,594	31,704,008
3.7	3.7 Platinas de Soporte perforadas	UN	14.00	197,609	2,769,326
3.8	3.8 Perno Anclaje	UN	112.00	41,633	4,662,896
	<b>SUB TOTAL BASES</b>				<b>146,821,073</b>

#### REGISTRANDO EL CAMBIO

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal. San José del Fragua – Caquetá – Colombia

[www.sanjose-caqueta.gov.co](http://www.sanjose-caqueta.gov.co)

E-Mail: [alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co](mailto:alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co)

Código Postal 18 60 70



República de Colombia  
Departamento del Caquetá  
**MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL  
FRAGUA**  
NIT. 800.095.782-0

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**  
**No 028**

Código: L.P - 006

Versión: 1.0 Fecha: 23 de Octubre de  
2015

Página 3 de 14

<b>4</b>	<b>ESTRUCTURA METALICA</b>				
4.1	4.1 Sum. E Inst. Cercha metalica - según diseño	KG	9566.07	8,377	80,134,968
4.2	4.2 Sum. E Inst. Correa metálica - según diseño	KG	9,072.04	7,869	71,387,883
4.3	4.3 Sum. E Inst. Templete	KG	134.40	7,202	967,949
4.4	4.4 Sum. E Inst. Contravientos	KG	499.20	7,784	3,885,773
	<b>SUB TOTAL ESTRUCTURA METALICA</b>				<b>156,376,573</b>
<b>5</b>	<b>CUBIERTA</b>				
5.1	5.1 Suministro e instalación teja arquitectonica cal. 26	M2	1247.574	30,813	38,441,498
	<b>SUB TOTAL CUBIERTA</b>				<b>38,441,498</b>
<b>6</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				
6.1	Suministro e Instalación de Obras Electricas de acuerdo a diseño - Ver detalle de presupuesto en detalle de presupuesto electrico	GL	1.00	37,295,585	37,295,585
	<b>SUB TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				<b>37,295,585</b>
<b>7</b>	<b>DESAGUES AGUAS LLUVIAS</b>				
7.1	7.1 Cuneta de 0.50 x 0.10	ML	78.00	42,623	3,324,559
7.2	7.2 Sumidero de 0.90 x 0.90	UN	3.00	490,024	1,470,072
	<b>SUB TOTAL CUBIERTA</b>				<b>4,794,631</b>
<b>8</b>	<b>CERRAMIENTO</b>				
8.1	8.1 Cerramiento en malla eslabonada - Panel de 3 metros de alto con modulacion de 4 metros de ancho. En tuberia de 2" galvanizada. Incluye cimiento y columnas de confinamiento y muro de 60 cm.	ML	81.70	277,500	22,671,750
8.2	8.2 Cerramiento en Muro en bloque de concreto a la vista - Panel de 3 metros de alto con modulacion de 4 metros de ancho. Incluye cimiento y columnas de confinamiento.	ML	33.20	375,000	12,450,000
8.3	8.3 Porton en lamina galvanizada. Incluye suministro y montaje de estructura. Altura del elemento 3 ml.	ML	5.00	660,000	3,300,000
	<b>SUB TOTAL CERRAMIENTO</b>				<b>38,421,750</b>
<b>9</b>	<b>GRADERIAS Y BATERIA SANITARIA</b>				
9.1	3.1 Concreto para zapatas F'c 24 Mpa	M3	7.88	444,059	3,499,185
9.2	3.2 Concreto para pedestales F'c 24 Mpa	M3	4.66	506,959	2,362,429
9.3	3.3 Concreto para viga de cimentación F'c 24 Mpa	M3	9.86	449,003	4,427,170
9.4	3.4 Acero de Refuerzo F'y 420 Mpa	KG	2044.733	4,630	9,467,114
9.5	3.6 Placa en concreto Mpa 240 kg/cm2	M2	153	59,594	9,117,882
9.6	3.9 Concreto para vigas aereas F'c 24 Mpa	M3	9.86	476,432	4,697,620

**REGISTRANDO EL CAMBIO**

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia

[www.sanjose-caqueta.gov.co](http://www.sanjose-caqueta.gov.co)

E-Mail: [alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co](mailto:alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co)

Código Postal 18 60 70



9.7	9.7 Losas prefabricadas para gradería - No Incluye Refuerzo (4 No. 5 L= 6.00 + 10 No. 3 L= 0.60). Concreto de 3000 psi . Espesor e =10 cm / Ancho 0.80	ML	182	57,525	10,469,550
9.8	9.8 Losas prefabricadas para contrahuella de gradería - No Incluye Refuerzo (4 No. 4 L=6.00 + 10 No. 3 L=0.60). Concreto de 3000 psi . Espesor e =10 cm / Ancho 0.80	ML	182	57,525	10,469,550
9.9	9.9 Sanitario institucional Blanco	Und	5.00	175,000	875,000
9.10	9.10 Lavamanos institucional Blanco	Und	7.00	139,060	973,420
9.11	9.11 Orinal institucional Blanco	Und	3.00	318,760	956,280
9.12	9.12 Enchape de Pared Blanco	M2	74.10	29,918	2,216,924
9.13	9.13 Enchape de Piso Blanco. Tipo Ceramica trafico pesado.	M2	150.50	38,718	5,827,059
9.14	9.14 Muro en mampostería.	M2	150.50	29,428	4,428,914
9.15	9.15 Pañete sobre muro 1:4	M2	358.00	17,813	6,377,054
9.16	9.16 Estuco y Pintura base agua a dos manos blanco.	M2	358.00	9,196	3,292,168
9.17	9.17 Punto Hidraulico 1/2", incluye accesorios, terminales, curvas y hasta 3.00 metros de red en tubería de 1/2"	Und	20.00	16,529	330,580
9.18	9.18 Punto Sanitario 2" incluye accesorios, terminales, curvas y hasta 3.00 metros de red en tubería de 2"	Und	11.00	21,899	240,889
9.19	9.19 Punto Sanitario 4" incluye accesorios, terminales, curvas y hasta 3.00 metros de red en tubería de 4"	Und	4.00	37,658	150,630
9.20	9.20 Cajilla de inspección de aguas negras de dimensiones 0.80 x 0.80 hasta 1.00 x 1.00, incluye tapa en concreto y malla de refuerzo en varilla No. 3 @ 10 cm en ambos sentidos.	UN	3.00	357,342	1,072,026
9.21	9.21 Baranda Metalica de acuerdo diseño, incluye suministro e instalacion de baranda en tres (03) tubos horizontales de 1 1/2" cal. 18. y parales en 2" cada 1.50 metros	ML	60.00	151,732	9,103,920
9.22	9.22 Sanitario Blanco institucional para discapacitados, incluye barras y soportes para persona correcto uso de persona discapacitada.	Und	2.00	675,300	1,350,600
<b>SUBTOTAL GRADERIAS Y BATERIA SANITARIA</b>					<b>91,705,962</b>
<b>10</b>	<b>TARIMA</b>				
10.1	3.1 Concreto para zapatas F'c 24 Mpa	M3	1.8	444,059	799,306
10.2	3.2 Concreto para pedestales F'c 24 Mpa	M3	1.3	506,959	659,047
10.3	3.3 Concreto para viga de cimentación F'c 24 Mpa	M3	3.19	449,003	1,432,320
10.4	3.4 Acero de Refuerzo F'y 420 Mpa	KG	350	4,630	1,620,500
10.5	3.6 Placa en concreto Mpa 240 kg/cm2	M2	46.8	59,594	2,788,999
10.6	3.9 Concreto para vigas aéreas F'c 24 Mpa	M3	3.186	476,432	1,517,912
10.7	10.7 Losa Entrepiso - No vigas y viguetas en sistema steel deck / espesor e = 12 cm / incluye acero y mallas de refuerzo	M2	46.8	176,556	8,262,821

## REGISTRANDO EL CAMBIO

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia

[www.sanjose-caqueta.gov.co](http://www.sanjose-caqueta.gov.co)

E-Mail: [alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co](mailto:alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co)

Código Postal 18 60 70



República de Colombia  
Departamento del Caquetá  
**MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL  
FRAGUA**  
NIT. 800.095.782-0

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**

Nº 028

Código: L.P - 006

Versión: 1.0 Fecha: 23 de Octubre de  
2015

Página 5 de 14

SUBTOTAL TARIMA			17,080,905
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS			554,538,462
COSTOS INDIRECTOS			
Administración	20%		110,907,692
Imprevistos	3%		16,636,154
Utilidad	7%		38,817,692
SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS			166,361,539
TOTAL OBRA			720,900,000
COSTO TOTAL PROYECTO			720,900,000

PARAGRAFO: 1: EL CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a ejecutar a los precios acordados en esta cláusula, todos los trabajos y obras necesarios para la correcta ejecución, estabilidad, seguridad y adecuación, conforme al objeto de la obra contratada, los cuales sólo serán revisables cuando por dilaciones no imputables a aquel se demore la iniciación de la obra y con ello se afecte el equilibrio de la ecuación contractual. PARAGRAFO 2: En caso de trabajos complementarios o adicionales ordenados por el CONTRATANTE, se reconocerá al CONTRATISTA el costo de los mismos. Para los efectos de este contrato se entiende por trabajos u obras complementarias aquellas no previstas en este contrato y cuya ejecución es indispensable para dar mayor estabilidad, buen funcionamiento y/o adecuada terminación a las obras contratadas. Se entiende por trabajos u obras adicionales la cantidad de obra resultante del incremento del área de construcción. Los precios de las obras complementarias o adicionales no previstos en este contrato se acordarán por el Supervisor y el CONTRATISTA y la Oficina de Planeación del Municipio de San José del Fragua, previamente a la elaboración y firma del respectivo contrato adicional, teniendo en cuenta los precios estimados vigentes. PARÁGRAFO 3: EL CONTRATISTA no podrá apartarse de los planos y especificaciones, que hacen parte del presente contrato, sin autorización escrita de EL CONTRATANTE y concepto previo del interventor; en caso contrario, perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra adicional que resulte de la modificación de los planos y especificaciones y responderá por los daños que cause a EL CONTRATANTE, en razón de su incumplimiento. PARAGRAFO 4: EL CONTRATANTE sólo reconocerá al CONTRATISTA, el pago de las obras ejecutadas a su entera satisfacción. **CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO:** El presente contrato es a precios unitarios. En consecuencia, el valor del mismo será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfacción por el CONTRATANTE, por los precios unitarios estipulados en la cláusula segunda, más el valor de los demás pagos a que tenga derecho EL CONTRATISTA en virtud de este contrato. El valor básico de referencia del presente contrato es la suma de SETECIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$720.900.000) M/CTE. incluido el IVA. **CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO:** La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera precios unitarios sin formula de reajuste. Con pagos parciales, dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible de acuerdo a lo pactado en la cláusula séptima del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ)**, Para efectos de

**REGISTRANDO EL CAMBIO**

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia

[www.sanjose-caqueta.gov.co](http://www.sanjose-caqueta.gov.co)

E-Mail: [alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co](mailto:alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co)

Código Postal 18 60 70





los PAGOS, el contratista, deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, de conformidad con el artículo 182 de la Ley 100 de 1993, la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la ley. EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA cancelará el valor del contrato que resulte del presente proceso de selección de la siguiente manera: El MUNICIPIO hará pagos al CONTRATISTA mediante actas de pagos parciales y acta de recibo final, según los siguientes requerimientos: las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el Interventor del Contrato y del pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Que se hallen cumplidos los requisitos de eficacia del contrato, Que el Interventor del contrato haya verificado y recibido a satisfacción el avance en los trabajos ejecutados por el contratista y que el contratista haya radicado la cuenta para cobro con todos los soportes necesarios para proceder al pago. Para el pago de la última acta se debe presentar el Acta de Recibo definitivo del Contrato, que las coberturas de las garantías se encuentren vigentes y acordes a lo pactado, que se haya suscrito el acta de recibo final de los trabajos a cargo del contratista y que se haya constatado el estado de paz y salvo por concepto de aportes a la seguridad social y parafiscales a cargo del contratista y por concepto de salarios y prestaciones frente al personal que trabaja en la obra. De igual manera también se puede realizar un pago único total cumpliendo con los mismos requisitos. Las actas de pago parciales deberán presentarse dentro de los dos (2) días calendario siguiente a la ejecución de las actividades. EL CONTRATISTA deberá radicar en la Oficina de Planeación e Infraestructura del MUNICIPIO las correspondientes facturas de pago, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas por EL MUNICIPIO, y el MUNICIPIO las pagará dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que formule. Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del Municipio según el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). **CLAUSULA QUINTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL:** El CONTRATANTE pagará el gasto que ocasione el Futuro contrato con cargo al: Del presupuesto de Rentas y Gastos correspondiente a la vigencia fiscal de 2015, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 540 de Fechas primero (01) de Septiembre de 2015. **CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.** El plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar y entregar a entera satisfacción de El CONTRATANTE el total de las obras objeto del presente contrato, será de Dos (02) Meses, contados a partir de su perfeccionamiento, contabilizado el plazo de ejecución. **CLAUSULA SEPTIMA: PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS.** Dentro de los Cinco (05) días calendario siguientes al perfeccionamiento del contrato, EL CONTRATISTA presentará al interventor, para su aprobación, el programa de trabajo para la ejecución de las obras contratadas. El programa se elaborará teniendo en cuenta el plazo de ejecución convenida y las condiciones reales de ejecución de las labores; el incumplimiento del mismo acarreará al CONTRATISTA las sanciones que se convienen en este contrato. **PARÁGRAFO:** Las modificaciones o alteraciones del programa de ejecución serán acordadas por las partes y constarán por escrito, sin perjuicio de la suscripción del contrato modificatorio a que haya lugar. **CLAUSULA OCTAVA: SUSPENSION TEMPORAL.** Sólo en eventos de fuerza mayor o caso fortuito las partes podrán suspender la ejecución del contrato. Este hecho, previo concepto del interventor, se hará constar en acta que suscribirán el CONTRATISTA y el interventor con el visto bueno de ALCALDE POPULAR. En la misma se consignarán clara y detalladamente las razones de la suspensión y el plazo de

## **REGISTRANDO EL CAMBIO**

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia

[www.sanjose-caqueta.gov.co](http://www.sanjose-caqueta.gov.co)

E-Mail: [alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co](mailto:alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co)

Código Postal 18 60 70



República de Colombia  
Departamento del Caquetá  
**MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL  
FRAGUA**  
NIT. 800.095.782-0

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**  
No 028

Código: L.P - 006

Versión: 1.0 Fecha: 23 de Octubre de  
2015

Página 7 de 14

la misma, así como la obligación de EL CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión. El término de suspensión no se computará para efectos del plazo extintivo. Expirado el término de la suspensión, las obras se reiniciarán dejando constancia del hecho en el acta correspondiente, la cual se diligenciará en la misma forma que el acta de suspensión. **CLAUSULA NOVENA: CUIDADO Y ENTREGA DE LAS OBRAS:** Desde la suscripción del Acta de Iniciación de las obras hasta la entrega final de las mismas, EL CONTRATISTA asumirá a entera responsabilidad su cuidado. En caso de que se produzca daño o pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas EL CONTRATISTA deberá repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva al CONTRATANTE, las obras estén en buenas condiciones y estado, de conformidad con las condiciones del presente contrato y con las instrucciones del interventor. Dentro del mismo término la señalización y mantenimiento del tránsito en el sector contratado son obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, quien será responsable por los perjuicios causados a terceros o a EL CONTRATANTE por falta de señalización o por deficiencia de la misma. Al finalizar los trabajos EL CONTRATISTA, hará entrega material de las obras ejecutadas al CONTRATANTE, por conducto del interventor, para lo cual informará a éste con antelación de DOS (02) días calendario a la fecha en que las obras se encuentren listas para su aprobación y recibo final. El recibo de las obras a satisfacción se hará constar en acta suscrita por el interventor y el CONTRATISTA. **CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Además de la ejecución de las obras en la forma pactada en este contrato y del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley, el CONTRATISTA se compromete especialmente a: 1. Cumplir con el objeto del presente Contrato. 2. Suministrar al supervisor del presente Contrato la programación de obra. 3. Suministrar al supervisor del presente Contrato un informe Mensual y semanal con registros fotográficos, planillas de asistencia de todas las actividades y clases realizadas durante la ejecución del contrato en medio físico y magnético. 4. Cumplir el Contrato conforme a la propuesta presentada la cual hace parte integral del presente contrato. 5. Actuar con eficacia y responsabilidad en la ejecución de las tareas objeto del contrato y conexas al mismo. 6. Responder por los elementos, bienes, información, que se pongan a su disposición para la ejecución del presente contrato, propendiendo, en todo caso, por su conservación y uso adecuado. 7. Acatar las órdenes, instrucciones e indicaciones que el Supervisor del presente Contrato le imparta. 8. Informar oportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato. 9. Las demás que de conformidad con la naturaleza del objeto contractual se requieran para el cumplimiento del mismo. 10. El proponente deberá inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse por su cuenta acerca de la naturaleza del terreno y del subsuelo, la forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y, de manera especial, las fuentes de materiales, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta. 11. Mantener durante toda la ejecución de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos. 12. Los trabajos objeto del Proceso deberán ejecutarse de conformidad con los estudios, diseños y planos del proyecto, aprobados por la entidad. 13. Desarrollar el proyecto de acuerdo al presupuesto y cantidades de obra establecido por la entidad, con base a los cuales deberá cotizar la propuesta, hasta su total terminación y aceptación final. Estas cantidades están calculadas según la evaluación realizada mediante visita de obra por el secretario de planeación Municipal. Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades obras establecidas, el contratista estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar de acuerdo con la respectiva acta de modificación. 14. Una vez suscrito el contrato, acatar las recomendaciones del supervisor designado, el cual estará facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, ambientales, económicas, jurídicas o de otra índole, el contratista solicite cambios o

## **REGISTRANDO EL CAMBIO**

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia

[www.sanjose-caqueta.gov.co](http://www.sanjose-caqueta.gov.co)

E-Mail: [alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co](mailto:alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co)

Código Postal 18 60 70



modificaciones. 15. Las cantidades de obra se verán reflejadas en el ítem 4 numeral a) Variables consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación. 16. Cumplir con sus obligaciones parafiscales y de seguridad social. 17. Informar oportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato. 18. Acatar las órdenes, instrucciones e indicaciones que le imparta el Supervisor del contrato. 19. En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del Contrato, para lo cual EL CONTRATISTA deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales. 20. Cuando se trate de estructuras en concretos se deben realizar las respectivas muestras de acuerdo a la Norma NSR-2010, y entregar los respectivos resultados aprobados y avalados por una persona idónea en la materia. 21. Disponer Bitácora de obra, la cual se debe diligenciar a diario y se debe anexar en el informe final que será requisito para la liquidación del contrato. 22. Para la liquidación del contrato se debe hacer entrega del Plano inicial y plano Record en medio físico y magnético. 23. Disponer de la mano de obra necesaria durante toda la ejecución del objeto contractual. 24. Garantizar la calidad de los trabajos realizados. 25. Las demás que surjan en el desarrollo del objeto contractual.

**CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.** Además de pagar oportunamente las obras objeto de este contrato y de cumplir las demás obligaciones previstas en la ley, El CONTRATANTE se obliga especialmente: a: 1. Realizar oportunamente las gestiones necesarias y a su cargo para la legalización y ejecución del contrato. 2. Pagar al contratista de acuerdo a la forma pactada en el contrato. 3. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del cooperante para con el Sistema General de Seguridad Social y/o parafiscales cuando a ello hubiere lugar, para tramitar las certificaciones de cumplimiento y los pagos al contratista. 4. Suministrar al contratista la información y/o documentación necesaria para lograr la eficaz ejecución del contrato. 5. Exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, y si se requiere, del garante. Para tal fin, se designará un supervisor del contrato que vigile y controle la ejecución contractual. 6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 7. Exigir que la calidad de los servicios adquiridos se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales obras cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscrito por Colombia. 8. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 9. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetir contra los servidores públicos, contra el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. 10. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del contrato. 11. Actuar de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirá los desajustes que pudieren presentarse y acordará los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. 12. Respetar el orden de presentación de los pagos por parte del contratista. 13. Suministrar al CONTRATISTA la información, documentación y demás elementos necesarios para el cabal cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad. 14. Controlar la calidad de los servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y condiciones convenidas. Expedir la certificación de cumplimiento al finalizar la ejecución, cuando el contratista hubiere cumplido a satisfacción con el objeto contratado. 15. Las demás que se deriven del objeto contractual. **CLÁUSULA DÉCIMA**

## REGISTRANDO EL CAMBIO

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia

[www.sanjose-caqueta.gov.co](http://www.sanjose-caqueta.gov.co)

E-Mail: [alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co](mailto:alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co)

Código Postal 18 60 70



República de Colombia

Departamento del Caquetá

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL

FRAGUA

NIT. 800.095.782-0

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Nº 028

Código: L.P - 006

Versión: 1.0

Fecha: 23 de Octubre de

2015

Página 9 de 14

**SEGUNDA: VINCULACIÓN DE PERSONAL Y PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES:** EL CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación del personal necesario para la ejecución del contrato, la cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que El CONTRATANTE adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto corresponde al CONTRATISTA el pago oportuno de los salarios, cesantías, prestaciones sociales, indemnizaciones a que haya lugar y las cotizaciones patronales a los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones durante la vigencia del contrato. Asimismo, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante el mismo lapso, cuando a ello hubiere lugar de conformidad con las normas pertinentes aplicables. En caso contrario, el CONTRATANTE adoptará las medidas e impondrá las sanciones establecidas por el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas pertinentes. **PARÁGRAFO:** El CONTRATANTE se reserva el derecho de solicitar a EL CONTRATISTA los cambios de personal que considere convenientes y éste se obliga a realizarlos a satisfacción. **CLAUSULA DECIMA TERCERA: INTERVENTORIA.** La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución y cumplimiento del presente contrato será contratado por el Municipio y ejercido Externamente, quien podrá impartir al CONTRATISTA las instrucciones, órdenes e indicaciones necesarias para la cabal ejecución del objeto contratado y desarrollará las demás actividades previstas en este contrato y las que se pacten en el respectivo contrato de interventoría (o en el acto de designación). En todo caso, el interventor responderá por el recibo a satisfacción de las obras objeto de este contrato. El interventor no podrá exonerar a EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales; tampoco podrá sin autorización escrita previa de El CONTRATANTE ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del diseño de las obras contratadas, salvo situaciones de urgencia o emergencia debidamente comprobadas, sin perjuicio de la celebración de los contratos modificatorios a que haya lugar. El interventor rechazará todos aquellos trabajos o materiales que no reúnan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en este documento. Si el CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el interventor, el CONTRATANTE podrá ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen a EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. **PARÁGRAFO 1.-** El control de los trabajos por el interventor no exonera ni disminuye la responsabilidad del CONTRATISTA, así como tampoco limitan su autoridad y dirección de la obra. **PARÁGRAFO 2.-** El interventor rendirá al CONTRATANTE los informes que se pacten en el respectivo contrato de interventoría (o se establezcan en el acto de designación). **PARÁGRAFO 3.-** Toda orden o sugerencia del interventor al CONTRATISTA será escrita excepto en situaciones de urgencia en las cuales podrá dadas verbalmente, ratificándolas por escrito en los tres (3) días hábiles siguientes. **CLAUSULA DECIMA CUARTA: SUPERVISION:** la supervisión del contrato será ejercida por la Secretaria de Planeación del Municipio de San José del Fragua. **CLAUSULA DECIMA QUINTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS:** EL CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente contrato mediante contrato de cesión celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y escrita del CONTRATANTE, la cual requerirá concepto previo del interventor y se impartirá con base en la promesa de contrato de cesión, mediante acto administrativo motivado que se comunicará a la compañía de seguros garante del contrato, una vez ejecutoriado. El CONTRATISTA y el cesionario autorizado celebrarán el contrato de cesión dentro de los CINCO (05) días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto que autorice la cesión y allegarán al CONTRATANTE copia del mismo dentro de los DOS (02) días hábiles siguientes a su perfeccionamiento. El CONTRATISTA sólo podrá subcontratar lo que no implique la ejecución de todo el objeto contractual, con autorización previa y escrita del CONTRATANTE. Los subcontratos se celebrarán

## REGISTRANDO EL CAMBIO

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia

[www.sanjose-caqueta.gov.co](http://www.sanjose-caqueta.gov.co)

E-Mail: [alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co](mailto:alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co)

Código Postal 18 60 70



bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y en ellos se hará constar que se entienden celebrados dentro de los términos del presente contrato. EL CONTRATANTE podrá ordenar la terminación del subcontrato sin que el CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a la indemnización de perjuicios o a incoar acciones contra el CONTRATANTE por esta causa. **CLAUSULA DECIMA SEXTA: MATERIALES Y CALIDAD DE LA OBRA:** a) Los materiales y elementos utilizados en la obra deben ser de óptima calidad y acordes con el objeto del contrato. Toda obra rechazada por deficiencia en los materiales o elementos deberá ser corregida por cuenta y riesgo del CONTRATISTA dentro del término que se fije para tal fin. b) Los equipos a utilizar por EL CONTRATISTA deben ser adecuados para el desarrollo de la obra; EL CONTRATANTE, sustentadamente, por conducto del interventor, podrá solicitar su cambio o reparación si ellos son inadecuados o ponen en peligro al personal o constituyen obstáculo para la ejecución del contrato.; c) Si el CONTRATISTA no acata las solicitudes a que se refieren los literales anteriores, el CONTRATANTE efectuará los cambios y reparaciones necesarias, cuyos costos serán asumidos por el CONTRATISTA, sin que tenga derecho a objetarlos ni a reclamación alguna. d) Si con posterioridad al recibo final de la obra resultaren deficiencias imputables al CONTRATISTA, éste se obliga a efectuar las reparaciones por su cuenta y riesgo durante el periodo de la garantía de estabilidad; e) En ninguno de los eventos previstos en esta cláusula habrá lugar a pagos adicionales, reajustes o modificaciones de precios. **PARAGRAFO:** EL CONTRATISTA se obliga a mantener los materiales, maquinaria y obras provisionales que hayan sido colocados para la ejecución de las obras, durante todo el tiempo que sea necesario y no podrán ser retirados sin autorización del CONTRATANTE, por conducto del interventor, a menos que la obra se encuentre debidamente terminada, aprobada y entregada. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: GARANTIAS** EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del CONTRATANTE y presentar a éste, la garantía única otorgada a través de una entidad bancaria o compañía aseguradora, cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, que ampare los siguientes riesgos: 1. **Cumplimiento del contrato,** Cuantía equivalente al Diez (10%) por ciento del valor total del contrato y vigencia igual al plazo del mismo y Seis (06) meses más. Tiempo durante el cual se debe producir la liquidación del contrato, de lo contrario el contratista se obliga a ampliar la póliza hasta la fecha en se logre la liquidación, a la cual podrá imputarse tanto el valor de la cláusula penal pecuniaria como las multas o los perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad. 2. **Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal:** Cuantía equivalente al Cinco (5%) por ciento del valor total del contrato y su vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. 3. **Estabilidad y calidad de la obra:** Cuantía equivalente al Veinte (20%) por ciento del valor final contrato y una vigencia de Cinco (05) año contado a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo definitivo del contrato por parte del Interventor. 4. **Responsabilidad civil extracontractual:** Equivalente a una Cuantía de 200 SMMLV y una vigencia igual al plazo de Ejecución del Contrato y Dos (02) Meses Más. **PARAGRAFO 1.-** Sin necesidad de requerimiento previo del CONTRATANTE, el CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. En caso contrario, el CONTRATANTE podrá aplicar la multa por incumplimiento y hará efectivo el amparo de cumplimiento. De igual manera, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones, el CONTRATISTA deberá ampliar o prorrogar las garantías. **PARAGRAFO 2 –** El contrista Posee Cinco (05) Días para hacer llegar las pólizas a la Alcaldía Municipal. **CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MULTAS.** En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se indican, EL CONTRATANTE impondrá al CONTRATISTA multas sucesivas del UNO por CIENTO (1%) del valor del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del contrato, para conminarlo a cumplir las obligaciones incumplidas. Las multas sólo podrán imponerse mientras se halle pendiente la ejecución de la obligación u obligaciones a cargo del CONTRATISTA. Las multas se impondrán mediante resolución motivada susceptible de impugnar

## **REGISTRANDO EL CAMBIO**

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Cauquetá – Colombia

[www.sanjose-caqueta.gov.co](http://www.sanjose-caqueta.gov.co)

E-Mail: [alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co](mailto:alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co)

Código Postal 18 60 70



República de Colombia  
**Departamento del Caquetá**  
**MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL**  
**FRAGUA**  
NIT. 800.095.732-0

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**  
No 028

Código: L.P - 006

Versión: 1.0 Fecha: 23 de Octubre de 2015

Página 11 de 14

mediante el recurso de reposición, de conformidad con el art. 77 de la ley 80 de 1993. Previamente a la imposición de la multa, EL CONTRATANTE requerirá al CONTRATISTA para que explique el incumplimiento dentro del término que le señale y aporte las pruebas pertinentes. Si la explicación fuere infundada o no fuere satisfactoria, EL CONTRATANTE impondrá la sanción, la cual se hará efectiva mediante la aplicación de mecanismos de compensación de las sumas que EL CONTRATANTE adeude al CONTRATISTA, haciendo efectiva la garantía única y, si ello no fuere posible, mediante la jurisdicción coactiva. De las multas y demás sanciones se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la Nación. Los hechos generadores de sanción son: **PARAGRAFO.-** La causación o exigibilidad de las multas no exonerará al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del contrato **CLÁUSULA DECIMA NOVENA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o de declaratoria de caducidad, éste deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, incluidos los reajustes de precios previo agotamiento del procedimiento garantista descrito en la cláusula precedente. EL CONTRATANTE hará efectiva la pena pecuniaria mediante la aplicación de mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, haciendo efectiva la garantía única y, si ello no fuere posible, mediante la jurisdicción coactiva. Contra el acto que declare el incumplimiento y haga efectiva la cláusula penal pecuniaria procede el recurso de reposición, de acuerdo con el art. 77 de la ley 80 de 1993. **CLAUSULA VIGESIMA: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO:** Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA sobre la interpretación de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el contrato y no se logra acuerdo sobre su entendimiento, el CONTRATANTE lo interpretará unilateralmente en acto debidamente motivado, el cual será susceptible del recurso de reposición. En estos eventos, el CONTRATANTE reconocerá las compensaciones e indemnizaciones a que tenga derecho el CONTRATISTA, si hubiere lugar a ellas. En todo caso, la interpretación del contrato requerirá el concepto técnico previo no vinculante del interventor. **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:** Si durante la ejecución y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones al contrato y las partes no llegaren a un acuerdo, LA ALCALDÍA MUNICIPAL, lo modificará unilateralmente mediante acto debidamente motivado susceptible del recurso de reposición, pudiendo adicionar o suprimir obras. En todo caso, la modificación se sujetará a las siguientes reglas: no podrá modificarse el objeto del contrato ni prorrogarse su plazo, si estuviere vencido, so pretexto de la modificación; ésta sólo procede por cambio de las circunstancias existentes al momento de celebrar el contrato; la naturaleza y el fin del contrato no pueden modificarse y tampoco los aspectos que influyeron en el orden de elegibilidad resultante del procedimiento de selección del contratista; los elementos esenciales del contrato no pueden ser variados. El CONTRATANTE reconocerá y ordenará pagar las compensaciones e indemnizaciones a que tenga derecho el CONTRATISTA por causa de la modificación, si hubiere lugar a ellas. **PARÁGRAFO 1.-** En los eventos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado, el plazo de este contrato podrá prorrogarse por el término indispensable. **PARÁGRAFO 2.-** El valor total de las adiciones en valor que se convengan por razones plenamente justificadas, no podrán exceder el cincuenta por ciento (50%) de la cuantía originalmente pactada, expresada en salarios mínimos legales mensuales vigentes. **PARÁGRAFO 3.-** Los contratos adicionales quedarán perfeccionados una vez suscritos. Será requisito indispensable para que pueda iniciarse la ejecución del contrato modificatorio, además de su perfeccionamiento, la aprobación de la adición y/o prórroga de la garantía única y el registro presupuestal, si se requiriere. Así mismo, el CONTRATISTA deberá acreditar el pago del impuesto de timbre<sup>3</sup> y demás impuestos, tasas o contribuciones ordenados por las normas pertinentes aplicables, y ordenar la publicación

**REGISTRANDO EL CAMBIO**

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia

[www.sanjose-caqueta.gov.co](http://www.sanjose-caqueta.gov.co)

E-Mail: [alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co](mailto:alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co)

Código Postal 18 60 70





del contrato adicional en LA PAGINA WEB Y LA CARTELERIA MUNICIPAL. Cualquier otra modificación del contrato que no afecte su valor o su plazo también deberá acordarse por las partes en el contrato modificatorio correspondiente quedando su perfeccionamiento, ejecución y demás requisitos sujetos a lo pactado en esta cláusula. PARÁGRAFO 4.- Toda adición o modificación del contrato requerirá concepto previo no vinculante del interventor. PARÁGRAFO 5.- El CONTRATISTA acreditará al CONTRATANTE el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta cláusula en el término que éste señale. PARÁGRAFO 6.- Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, el CONTRATISTA podrá renunciar a su ejecución y se procederá a su liquidación. **CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.** Además de los eventos previstos por el artículo 17 de la ley 80 de 1993, el CONTRATANTE dispondrá la terminación anticipada del contrato, mediante acto debidamente motivado susceptible del recurso de reposición, en caso de incumplimiento de los requisitos de celebración del contrato cuando la ley no disponga otra medida, en los contemplados por los numerales 1, 2 y 4 del artículo 44 de la ley 80 de 1883 y en todo otro evento establecido por la ley. El CONTRATANTE reconocerá al CONTRATISTA las compensaciones e indemnizaciones a que tenga derecho cuando hubiere lugar a ellas. PARÁGRAFO.- Cuando la terminación del contrato sea resultado del acuerdo de las partes, requerirá el concepto previo no vinculante del interventor y no dará lugar al reconocimiento de compensaciones e indemnizaciones. **CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CADUCIDAD.** Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el CONTRATANTE, previo concepto no vinculante del interventor, requerirá al CONTRATISTA para que cese el incumplimiento y le señalará un plazo perentorio. Expirado el mismo sin que el CONTRATISTA haya cesado el incumplimiento o lo haya justificado debidamente, el CONTRATANTE podrá declarar la caducidad mediante resolución motivada y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. La caducidad se registrará por lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. El CONTRATANTE también declarará la caducidad en presencia de cualquiera de las causales establecidas en el art. 90 de la ley 418 de 1997, en las circunstancias previstas en el último inciso del art. 5º de la ley 80 de 1993, en el art. 61 de la ley 610 de 2000, en el art. 1 de la ley 828 de 2003, en la ley 64 de 1978 (protección ingeniería nacional); o en los casos de incumplimiento de la obligación de prorrogar la garantía constituida por etapas (contratos de obra, concesión), y en todo otro evento en que la ley lo disponga. Ejecutoriada la resolución de caducidad conforme a la Ley, el CONTRATANTE hará efectiva la garantía única de cumplimiento, las multas impuestas pendientes de pago y la cláusula penal pecuniaria estipulada. La declaratoria de caducidad no impedirá que el CONTRATANTE continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la caducidad no dará lugar a la indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación y sólo tendrá derecho a que se le reconozcan y paguen las obras ejecutadas a satisfacción del CONTRATANTE y los elementos fabricados o en proceso de fabricación aceptables para el CONTRATANTE o indispensables para que éste pueda culminar la obra, de acuerdo con los precios pactados en el contrato, todos los cuales se relacionarán y recibirán mediante acta que suscribirán el interventor y el CONTRATISTA con el visto bueno de ALCALDE MUNICIPAL. **CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: RECLAMOS.** Los reclamos que el CONTRATISTA considere pertinente hacer seguirán el siguiente procedimiento: a) Deberán elevarse por escrito, sustentadamente, por conducto del interventor, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a los hechos que los generan; b) Mientras se tramita y decide la reclamación no podrá suspenderse la ejecución del contrato, por causa de la misma, a menos que el CONTRATANTE lo ordene; c) La oportunidad para elevar reclamaciones se extingue con la

## REGISTRANDO EL CAMBIO

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia

[www.san jose-caqueta.gov.co](http://www.san jose-caqueta.gov.co)

E-Mail: [alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co](mailto:alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co)

Código Postal 18 60 70



República de Colombia  
Departamento del Caquetá  
**MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL  
FRAGUA**  
NIT. 800.095.782-0

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**  
No 028

Código: L.P - 006

Versión: 1.0 Fecha: 25 de Octubre de  
2015

Página 13 de 14

liquidación del contrato; por consiguiente, con posterioridad a ella no se aceptará ni tramitará reclamación alguna distinta de los pagos pendientes por realizar; d) Recibida la reclamación el CONTRATANTE se pronunciará dentro de los CINCO (05) días HÁBILES siguientes; si guardare silencio, se entenderá que la reclamación fue aceptada y aprobada. PARAGRAFO: La falta de cualquiera de los requisitos a que se refieren los literales a) y c) ocasionará el rechazo de la solicitud. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en la ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: CLÁUSULA COMPROMISORIA:** Cuando no fuere posible solucionar las controversias en la forma prevista, las partes se comprometen a someter la decisión a árbitros en la forma establecida en el artículo 70 de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. Los costos de los árbitros serán asumidos por igual tanto por el CONTRATANTE como por EL CONTRATISTA. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato se liquidará según la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y decretos reglamentarios. En el acta de liquidación constarán, además, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. PARÁGRAFO.- El interventor del contrato verificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 50 de la ley 789 de 2002 durante la vigencia del contrato por parte del CONTRATISTA y adoptará las medidas en él previstas o solicitará la aplicación de las sanciones establecidas por el artículo 1º de la ley 828 de 2003. **CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: LIQUIDACIÓN UNILATERAL:** Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma dentro del plazo establecido en la cláusula anterior, la liquidación será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. **CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** Para la liquidación deberá disponerse, cuando menos, de los siguientes documentos: 1. Copia del contrato y sus modificaciones. 2. Copia de las actas que hacen parte del contrato. 3. Relación de los pagos hechos al CONTRATISTA. 4. Vigencia de la garantía única de cumplimiento. En el acta de liquidación se dejará constancia de: 1. Entrega de las obras por parte de EL CONTRATISTA y del recibo a satisfacción por parte del CONTRATANTE. 2. Las reformas en el plazo y precios si las hubiere. 3. Las cantidades de obra ejecutada y sus valores, con indicación de las actas parciales de recibo de obra. **CLÁUSULA TRIGESIMA: ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL:** El CONTRATISTA y sus subcontratistas se obligan a cumplir las normas y aplicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas, las cosas y el ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen y le sean imputables y se responsabilizará por cualquier daño del medio ambiente que se ocasione por la realización de las obras durante el proceso constructivo. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: VEEDURÍA CIUDADANA:** El CONTRATISTA se obliga a permitir la vigilancia de las veedurías ciudadanas de conformidad con lo dispuesto en la ley 850 de 2003 y a suministrar a éstas la información y documentación que soliciten en relación con el presente contrato y su ejecución. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la Constitución Política, en la ley 80 de 1993, artículo 8º y demás disposiciones aplicables y que, de sobrevenir durante la ejecución del contrato, se dará aplicación al artículo 9º de la misma ley. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN:** Para

**REGISTRANDO EL CAMBIO**

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia

[www.sanjosedelfragua-caqueta.gov.co](http://www.sanjosedelfragua-caqueta.gov.co)

E-Mail: [alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co](mailto:alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co)

Código Postal 18 60 70




celebrar el presente contrato, deberá acreditarse la inexistencia de antecedentes de responsabilidad fiscal. Para el efecto, el Municipio consultará el Boletín emitido por la Contraloría General de la República o la base de datos de dicha entidad y dejará constancia escrita de la consulta y su resultado. **CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato se perfecciona con su suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere: 1. El registro presupuestal 2. La aprobación de la garantía única de cumplimiento que el CONTRATANTE. 3. La acreditación de que el CONTRATISTA se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. El CONTRATANTE informará al CONTRATISTA la fecha en que el contrato podrá empezar a ejecutarse. **PARAGRAFO.-** Las partes convienen que si EL CONTRATISTA no presenta los documentos pactados en los plazos indicados, el contrato se terminará, pudiendo el CONTRATANTE adjudicar y suscribirlo con el proponente que siguiera en el orden de elegibilidad. **CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: DOCUMENTOS:** Hace parte integral del presente contrato los Estudios y Documentos Previos, Los Pliegos de Definitivos y demás documentos inherentes al proceso. **CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA: INDEMNIDAD:** El contratista se obliga a mantener libre al Municipio de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se derivan de sus actuaciones, de los subcontratistas o dependientes. **CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA: OTROS REQUISITOS DEL CONTRATO:** Este contrato requiere, además, su publicación en Cartelera Municipal y la cancelación del impuesto de timbre<sup>13</sup> y demás impuestos, tasas y contribuciones ordenados por las normas pertinentes aplicables, requisitos que se entenderán cumplidos con la entrega de las constancias de pago respectivas, lo cual deberá efectuar el CONTRATISTA dentro de los DOS (02) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato. El incumplimiento de estos requisitos no impedirá la ejecución del contrato pero ocasionará la imposición de sanciones por el CONTRATANTE. **CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA: DOMICILIO CONTRACTUAL:** Las partes acuerdan como domicilio contractual el Municipio de San José del Fragua.

Para constancia se firma en el Despacho Alcalde, a los Veintitrés (23) Días del mes de Octubre de Dos Mil Quince (2015).

CONTRATANTE

CONTRATISTA

  
**CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR**  
Alcalde Municipal

  
**WILLIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO**

Rep. Legal UNIÓN TEMPORAL SAN JOSÉ DEL FRAGUA C.I.C 2015

Revisó: FARID QUINTERO SALDAÑA – Asesor Contratación

**REGISTRANDO EL CAMBIO**

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia

[www.sanjose-caqueta.gov.co](http://www.sanjose-caqueta.gov.co)

E-Mail: [alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co](mailto:alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co)

Código Postal 18 60 70

MEMORANDO

MEM16-000020666-SIN-4020

Bogotá, D.C., martes, 24 de mayo de 2016

**PARA:** MARIA EUGENIA AREIZA FRIERI,

**DE:** Subdirección de Infraestructura

**ASUNTO:** Entrega de documentos de supervisión del convenio F- 212 - 2015 del municipio de SAN JOSE DE FRAGUA.

Adjunto envió documentación de soporte del convenio F- 212 – 2015 celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de SAN JOSE DE FRAGUA – CAQUETA

1. Informe Interventoria 01 Noviembre, 76 folios
2. Informe Interventoria 01 Diciembre, 122 folios
3. Informe Interventoria 01 Enero, 121 folios
4. Informe Municipio septiembre ,3 folios
5. Informe Municipio octubre, 3 folios
6. Fichas de Interventoria Diciembre, 4 folios
7. Oficio cumplimiento al convenio – Interventoria , 2 folios




**ARQ. JUAN JOSE BLANCO OVIEDO**

Apoyo a la supervisión del convenio F-212-2015



**MIGUEL TURMEQUE BUSTOS**

Supervisor Convenio F-212 de 2015



Elaboró: Juan José Blanco Oviedo  
Revisó: Miguel Turmeque  
Aprobó: Miguel Turmeque  
TRD: 4022 F- 212 de 2015.

FORMATO

ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO  
A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ANEXO 4

Código: GC-P-03-F-04

Versión: 03

Fecha Elaboración:  
25/07/2013

Vigente Desde:  
26/08/2013

ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Departamento:	CAQUETA
Municipio:	SAN JOSE DEL FRAGUA
Proyecto:	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADA - CIC
Valor:	\$735.000.000
Firma Convenio:	07 DE MAYO DE 2015
Vencimiento:	30 DE NOVIEMBRE DE 2015
Acta de Inicio:	8 DE MAYO DE 2015
Póliza:	630-47994000006141

ASISTENTES

No.	NOMBRE	CARGO	REPRESENTA A
1	MIGUEL TURMEQUE BUSTOS	SUPERVISOR MINISTERIO DEL INTERIOR	MININTERIOR
2	JUAN JOSE BLANCO OVIEDO	APOYO A LA SUPERVISION DEL MINISTERIO	MININTERIOR
3			
4			

INVITADOS

1		
2		

AUSENTES

	JUSTIFICADO SI	NO
1		
2		



1 ORDEN DEL DIA

Verificación de cumplimiento de los compromisos del municipio de acuerdo al convenio F- 212
---

OBJETO:



Convenio Interadministrativo F-212 de 2015, cuyo objeto es la "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la seguridad ciudadana, a través de la ejecución del proyecto denominado "CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC, SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA"

2	DESARROLLO	
Se realiza seguimiento de las obligaciones contractuales del municipio teniendo en cuenta el objeto contractual de la referencia dentro del respectivo convenio.		
COMPROMISOS		
RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LIMITE CUMPLIMIENTO
	1. Documentos solicitud de segundo desembolso 2. Cronograma actualizado 3. Compromiso en la etapa de ejecución de obra para cumplir al mes de diciembre con 70% de avance de la misma. Incluyendo 5 frentes de trabajo 4. Apoyo en toda la gestión contractual por parte del municipio	29/10/15  OK  OK

 	<b>FORMATO</b> <b>ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO</b> <b>A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> <b>ANEXO 4</b>	Código: GC-P-03-F-04
		Versión: 03
		Fecha Elaboración: 25/07/2013
		Vigente Desde: 26/08/2013



--	--	--

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en original,

<p>Por parte de: MINISTERIO DEL INTERIOR</p>  <p>Nombre y firma: Miguel A. Turmeque Cargo: SUPERVISOR CONVENIO Email: Celular:</p>	<p>Por parte de: ALCALDIA SAN JOSE DEL FRAGUAS</p>  <p>Nombre y firma: Diego Fernando Riquelme Cargo: SEC. Planeación Email: planeacionmunicipal@sanjosedelfraguas.gov.co Celular: 3208017425</p>

0 Anexo Copia: Subdirección de Gestión Contractual



 	<b>Ficha Proyectos</b> <b>Subdirección de Infraestructura</b>	
--	--	--

<b>Departamento:</b>	CAQUETÁ
<b>Municipio:</b>	SAN JOSÉ DEL FRAGUA
<b>Proyecto:</b>	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC)
<b>Valor:</b>	\$ 735.000.000
<b>Firma Convenio:</b>	07 DE MAYO DE 2015
<b>Vencimiento:</b>	30 DE NOVIEMBRE DE 2015
<b>Acta de Inicio:</b>	08 DE MAYO DE 2015
<b>Póliza:</b>	630-47-994000006141

Estudios y diseños	Publicación	Inicio	Plazo de ejecución	Aprobación
	01/06/2015	16/06/2015	15 Días	10 DE JUNIO 2015
Obra	Publicación	Adjudicación	Inicio	Plazo de ejecución
	9 /09/2015	20/10/2015	<del>10/11/2015</del>	30/11/2016

<b>Observaciones:</b>	

P/zn D.C. 4090 obra

**MEMORANDO**

**MEM15-000052851-SIN-4020**

Bogotá, D.C., Miércoles, 30 de Diciembre de 2015

**PARA:** Doctora María Eugenia Areiza Frieri, Subdirectora de Gestión Contractual

**DE:** Subdirección de Infraestructura

**ASUNTO:** Entrega de documentos de supervisión del convenio F- 212 - 2015 del municipio de SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA y remisión Informes convenio (Colocar No. de radicado que se responde)

Adjunto envió documentación de soporte del convenio F- 212 – 2015 celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA

1. Solicitud de desembolsos 1 – 2 y 3er , 4 folios
2. Informe mensual del mes de Septiembre – Ministerio , 5 folios ✓
3. Informe mensual del mes de Octubre – Ministerio , 7 folios ✓
4. Informe mensual del mes de Noviembre – Ministerio , 4 folios ✓
5. Informe mensual del mes de Diciembre – Ministerio , 4 folios
6. Informe mensual del mes de Noviembre – Municipio , 3 folios
7. Soportes de reuniones de seguimiento al convenio , 9 folios
8. OFI enviado solicitud de % avance de obra , 2 folios
9. Acta de visita de lote y seguimiento convenio , 2 folios

**ARQ. JUAN JOSE BLANCO OVIEDO**

Apoyo a la supervisión del convenio F-212-2015

Elaboró: Juan José Blanco Oviedo  
Revisó: Miguel Turmequé  
Aprobó: Miguel Turmequé  
TRD: 4022 F- 212 de 2015.

**MIGUEL TURMEQUE BUSTOS**

Supervisor Convenio F-212 de 2015



MEMORANDO

MEM15-00003

SIN-4020

Bogotá, D.C. Lunes 31 de Agosto de 2015

**PARA:** Doctor ALFONSO SANTOS ARIAS, Coordinador Grupo de Gestión Financiera y Contable

**DE:** SUPERVISOR DEL CONTRATO

**ASUNTO:** Solicitud Primer Desembolso Convenio No. F- 212 de 2015.

Cordial saludo.

De la manera más atenta me permito solicitar se adelanten los procesos necesarios para realizar el pago del primer desembolso, de acuerdo a la cláusula séptima del convenio F-212 de 2015, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA, con registro presupuestal N° 63315 del 07 de Mayo de 2015, rubro de afectación presupuestal A-3-2-1-21 Fondo de Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-FONSECON. Con un valor a cobrar de QUINCE MILLONES DE PESOS (15.000.000) MONEDA LEGAL.

**OBJETO:** "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre los municipios para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana- CIC, en el municipio de San José del Fragua - Caquetá.

En atención a lo anterior anexo los siguientes documentos

1. Copia Convenio F- 212 de 2015.
2. Copia aprobación de la póliza
3. Copia Registro presupuestal.
4. Cuenta de Cobro.
5. Certificación Expedida por el Supervisor.
6. Certificación expedida de Paz y Salvo de aportes y parafiscales, emitida por la Alcaldía Municipal de San José del Fragua - Caquetá.
7. Copia Contrato de Interventoría N° 053 de 2015- Interventoría para realización de estudios y diseños para la construcción del Centro de Integración Ciudadana (CIC) en el municipio de San José del Fragua Caquetá.
8. Copia Contrato de Consultoría N° 052 de 2015- Estudios y Diseños para realización de estudios y diseños para la construcción del Centro de Integración Ciudadana (CIC) en el municipio de San José del Fragua Caquetá.
9. Cronograma
10. Copia Cedula del Alcalde.

Atentamente

**HARRY SALAMANCA LUCAS**

Coordinador

Grupo de Control de Proyectos de Infraestructura

Elaboró: Juan José Blanco Oviedo - Apoyo a la Supervisión



Revisó: Harry Salamanca Lucas

Aprobó: Harry Salamanca Lucas

4022. 04. F- 212 - 2015

01 SEP 2015  
10:55 AM



 	<b>FORMATO</b> <b>CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE</b> <b>OBLIGACIONES EN EL MARCO DE UN</b> <b>CONVENIO INTERADMINISTRATIVO</b> <b>ANEXO 9</b>	Código: GC-P-03-F-09
		Versión: 05
		Fecha Elaboración: 24/09/2013
		Vigente Desde: 09/10/2013

## CERTIFICACION

El suscrito, en calidad de Supervisor del convenio interadministrativo No. F- 212/15 de 2015 y cuyo objeto es la *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana- CIC, en el municipio de San José de Fragua - Caquetá"* me permito certificar que el Municipio de San José de Fragua, con NIT. 800095782-0 Representado legalmente, **CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR** con cédula de ciudadanía N° 17.651.020, cumplió a satisfacción con las obligaciones señaladas en la **CLÁUSULA SÉPTIMA.- DESEMBOLSOS**. **"EL MINISTERIO desembolsará a EL MUNICIPIO los recursos para el desarrollo del proyecto objeto del presente Convenio, de la siguiente forma: 1) Un primer desembolso, por la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000,00) MIL., previa presentación de cronograma, contratos de estudios y diseños e interventoría contemplado en el numeral primero de la cláusula séptima del Convenio aprobado por el supervisor del Ministerio; documentos de certificación del supervisor del Convenio por parte del Ministerio, acreditando el cumplimiento del municipio para proceder al desembolso"**.


VALOR TOTAL DE APORTES: \$ 735.000.000.

VALOR DEL DESEMBOLSO: \$ 15.000.000.

Bogotá, D.C., 31 de Agosto de 2015.

  
**HARRY SALAMANCA LUCAS**

Coordinador  
 Grupo de Control de Proyectos de Infraestructura

 Elaboro: Juan José Bianco Oviedo - Apoyo a la Supervisión  
 Revisó y aprobó: Harry Salamanca Lucas  
 4022\_04, F- 212 - 2015





**MININTERIOR**

**MEMORANDO**

**MEM15-000042993-SIN-4020**

Bogotá, D.C. Miércoles 25 de Octubre de 2015

**PARA:** Doctor **ALFONSO SANTOS ARIAS**, Coordinador Grupo de Gestión Financiera y Contable

**DE:** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**ASUNTO:** Solicitud Segundo Desembolso Convenio No. F- 212 de 2015.

Cordial saludo,

De la manera más atenta me permito solicitar se adelanten los procesos necesarios para realizar el pago del segundo desembolso, de acuerdo a la cláusula séptima del Convenio F-212 de 2015, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de **SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA**, con registro presupuestal N° 63315 del 07 de Mayo de 2015, con rubro de afectación presupuestal A-3-2-1-21 Fondo de Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-FONSECON. Con un valor a cobrar de DOSCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS **(\$205.500.000) MONEDA LEGAL**.

**OBJETO:** *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana- CIC, en el municipio de San Jose del Fragua - Caquetá."*

En atención a lo anterior anexo los siguientes documentos

Anexos:

1. Cuenta de cobro
2. Certificación expedida por el supervisor del Ministerio
3. Paz y sale de aportes y parafiscales emitido por la alcaldía Municipal de San Jose del Fragua - Caquetá
4. Copia de la apertura de los procesos de obra e interventoria y Pliegos de condiciones de los mismos.
5. Copia de MEM 15000040190 -SIN -4020 Informe de Supervisión

**MIGUEL ANGEL TURMEQUE**


**Supervisor Convenio F-212 de 2015**

Elaboró: JUAN JOSE BLANCO OVIEDO

Revisó: MIGUEL ANGEL TURMEQUE

Aprobó: MIGUEL ANGEL TURMEQUE

TRD: 4022.04.F-212 de 2015

  
25/10/15  
11:49



## MEMORANDO

**MEM15-000051892-SIN-4020**

Bogotá, D.C. Martes 29 de Diciembre de 2015

**PARA:** Doctor **ALFONSO SANTOS ARIAS**, Coordinador Grupo de Gestión Financiera y Contable

**DE:** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**ASUNTO:** Solicitud tercer Desembolso Convenio No. F- 212 de 2015.

Cordial saludo,

De la manera más atenta me permito solicitar se adelanten los procesos necesarios para realizar el pago del tercer desembolso, de acuerdo a la cláusula séptima del Convenio F-212 de 2015, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de **SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA**, con registro presupuestal N° 63315 del 07 de Mayo de 2015, con rubro de afectación presupuestal A-3-2-1-21 Fondo de Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-FONSECON. Con un valor a cobrar de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS **(\$294.000.000)** MONEDA LEGAL.

**OBJETO:** *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana- CIC, en el municipio de San Jose del Fragua - Caquetá."*

En atención a lo anterior anexo los siguientes documentos

Anexos:

1. Cuenta de cobro
2. Certificación expedida por el supervisor del Ministerio
3. Paz y salvo de aportes y parafiscales emitido por la alcaldía Municipal de San Jose del Fragua - Caquetá
4. Informe de Interventoria y acta parcial, certificación del supervisión del municipio.
5. Copia de MEM 15000040190 -SIN -4020 Informe de Supervisión

**MIGUEL ANGEL TURMEQUE**

**Supervisor Convenio F-212 de 2015**


Elaboró: JUAN JOSE BLANCO OVIEDO

Revisó: MIGUEL ANGEL TURMEQUE

Aprobó: MIGUEL ANGEL TURMEQUE

TRD: 4022.04.F-212 de 2015





MinInterior  
Ministerio del Interior

FORMATO  
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA  
CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -  
FONSECON  
ANEXO 2

Código: GC-P-03-F-02

Versión: 04

Fecha Elaboración:  
25/07/2013

Vigente Desde:  
26/08/2013

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FONSECON  
CONTRATO F - 212 de 2015 - INFORME MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015.

1. GENERALIDADES CONVENIO

OBJETO:	<i>"Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros entre las partes para promover la gobernabilidad y la seguridad ciudadana a través de la construcción de infraestructura, mediante la ejecución del proyecto denominado "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA en el Municipio de SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA"</i>		
BENEFICIARIO:	SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA		
VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO	TOTAL DEL CONVENIO	\$ 735.000.000,00	
	APORTES MIN - FONSECON	\$ 735.000.000,00	
	APORTES MUNICIPIO	\$ 00	
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 30 DE Noviembre de 2015		
PRODUCTOS	PRESUPUESTO VIABILIZADO	PRESUPUESTO ADJUDICADO	DIFERENCIA
Estudios y diseños	\$ 12.000.000,00	\$ ,00	\$,00
Interventoria de estudios y diseños	\$ 3.000.000,00	\$ ,00	\$,00
Obra	\$ 687.900.000,00	\$ ,00	\$,00
Interventoria de obra	\$ 47.100.000,00	\$ ,00	\$,00
TOTAL	\$ 735.000.000,00	\$ 735.000.000,00	\$,00
FECHA SUSCRIPCION	06/05/2015		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	MIGUEL TURMEQUE	14/09/2015	
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	Harry Salamanca	20/05/2015	14/09/2015
REGISTRO PRESUPUESTAL MI	Nº 62115	VALOR	\$ 735.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N/A	N/A	N/A
APROBACIÓN DE POLIZA	No. 630-47-994000006141	FECHA	07-MAY-15
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONVENIO	07-MAY-15	N/A	N/A
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	SOLICITUD 1:		
	SOLICITUD 2:		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A	N/A	N/A

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO


➤ Convenio interadministrativo

CONCEPTO	FECHA DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	PORCENTA JE DE OBRA REQUERID O	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO		0.00%		\$,00
SEGUNDO DESEMBOLSO		0.0%		\$,00





210

 <div><b>MinInterior</b> Ministerio del Interior</div>	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	<b>Código:</b> GC-P-03-F-02
		<b>Versión:</b> 04
		<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2013
		<b>Vigente Desde:</b> 26/08/2013

TERCER DESEMBOLSO	70.0%	\$,00
ULTIMO DESEMBOLSO	100.0%	\$,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME		\$,00

3. POLIZAS CONVENIO

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
N° 630-47-994000006141	Cumplimiento	\$ 147.000.000	07-MAY-15	31-MAY-16
	Calidad de servicio	N/A	N/A	N/A
	Pagos y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
	Buen manejo y correcta inversión	N/A	N/A	N/A

• BALANCES FINANCIEROS DEL PROYECTO


➤ Contrato de Ejecución de obra

DESCRIPCIÓN		OBJETO		VALOR		
Contrato No						
Adicional (recursos de:)						
Nombre contratista						
Fecha De Inicio Del Proyecto						
VALOR TOTAL CONTRATADO:				\$ ,00		
CONCEPTO		% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO D/M/A
ANTICIPO OBRA		ANTICIPO	30%			
PRIMER DESEMBOLSO		100%	60%			
PAGO CONTRA LIQUIDACION		Firma acta	10%			
PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS			
			FECHA INICIO	FECHA FINAL		
	Cumplimiento	\$,00				
	Estabilidad y calidad de la obra	\$,00				
	Pagos y prestaciones sociales	\$,00				
	Responsabilidad civil	\$,00				
	Calidad del bien	\$,80				
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA				100%		
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA				100%		
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)				100%		
% RECURSOS EJECUTADOS				100%		

➤ Contrato de Ejecución de Interventoría de obra

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
Contrato No		
Adicional (recursos de:)		
Nombre contratista		
Fecha De Inicio Del Proyecto		
VALOR TOTAL CONTRATADO:		\$,00





**MinInterior**  
Ministerio del Interior

FORMATO  
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA  
CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -  
FONSECON  
ANEXO 2

Código: GC-P-03-F-02

Versión: 04

Fecha Elaboración:  
25/07/2013

Vigente Desde:  
26/08/2013

CONCEPTO		% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO D/M/A
ANTICIPO OBRA		ANTICIPO	30%			
PRIMER DESEMBOLSO		100%	60%			
PAGO CONTRA LIQUIDACION		Firma acta	10%			
PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS			
			FECHA INICIO	FECHA FINAL		
		Cumplimiento del contrato	\$,00			
		Calidad del servicio	\$,00			
		Pagos y prestaciones sociales	\$,00			
		Responsabilidad civil	N/A	N/A	N/A	
		riesgo	N/A	N/A	N/A	
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA				100%		
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA				100%		
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)				100%		
% RECURSOS EJECUTADOS				100%		


• DEL MUNICIPIO:

FECHA DE ULTIMO INFORME: NO HA ENVIADO A LA FECHA

• INFORME DEL SUPERVISOR:

<b>DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:</b>
INFORME: SEPTIEMBRE DE 2015
AVANCE: 10%
ESTADO: ACTIVO
RECURSOS GIRADOS: 0%
 Pendiente por recibir
<ul style="list-style-type: none"><li>- Ya existe contrato de obra , falta legalizar interventoria</li><li>- Pendiente Incluir 5 frentes de trabajo en contrato de obra</li><li>- Documentación 2 desembolso</li></ul>
 ACTIVIDADES EJECUTADAS
Se enviaron correos – se charlo con los distintos municipios para verificar la gestión individual con respecto a cada convenio – Se copian archivos del presente mes.
 <ul style="list-style-type: none"><li>• CORREO ENVIADO POR EL MINISTERIO</li></ul> Buenas Noches.
 Srs. Supervisores
 Por medio del presente les envió un cordial saludo dándole cierre a este mes de Agosto el cual fue bastante flojo en gestión por parte de algunos municipios y la bienvenida a Septiembre que para algunos convenios será el comienzo de sus obras , para otros apenas entrega de Estudios y Diseños , para otros publicación de los mismos . En fin cada convenio sabe en qué va en cuanto a su gestión contractual y en que está pendiente con esta supervisión.





MinInterior  
Ministerio del Interior

FORMATO  
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA  
CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -  
FONSECON  
ANEXO 2

Código: GC-P-03-F-02

Versión: 04

Fecha Elaboración: 25/07/2013

Vigente Desde: 26/08/2013

La supervisión del Ministerio del Interior, ha adelantado las gestiones tendientes a exhortar a los municipios al cumplimiento de las obligaciones de los respectivos convenios firmados en 2015 y teniendo en cuenta que no se han atendido las solicitudes realizadas por algunos municipios, se considera que no existe la voluntad por parte de estos por cumplir adecuadamente con el objeto del convenio en el término pactado para ello. (CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS)

Por lo anterior se solicita enviar los pendientes de cada convenio a más tardar el día viernes 04 de Septiembre de 2015 con el fin de poder hacer una revisión por parte de la supervisión del Ministerio del Interior. Recuerden que el no acato al convenio y no colaboración ante la Gestión Contractual por parte de los Municipios acarrea trámites por posibles incumplimientos.

Para todos los efectos relacionados con la supervisión del convenio de la referencia se podrán contactar con mi persona Arq. Juan José Blanco Oviedo al 300 689 90 02 y a este correo electrónico.

- CORREO ENVIADO POR EL MINISTERIO  
Buenas Noches.  
Srs. Supervisores

Por medio del presente les envió un cordial saludo dándole cierre a este mes de Septiembre, espero este próximo mes sea un poco más activo por parte de algunos supervisores que no están cumplimiento con las obligaciones suscritas dentro de los respectivos convenios y que estas recaen , recuerden sobre el ordenador del gasto .(Señores alcaldes ).Sera el comienzo de sus obras , para otros apenas entrega de Estudios y Diseños , para otros publicación de los mismos . En fin cada convenio sabe en qué va en cuanto a su gestión contractual y en que está pendiente con esta supervisión.

La supervisión del Ministerio del Interior, ha adelantado las gestiones tendientes a exhortar a los municipios al cumplimiento de las obligaciones de los respectivos convenios firmados en 2015. Se reitera cumplir adecuadamente con el objeto del convenio en el término pactado para ello. (CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS). Y LOS NUMERALES CORRESPONDIENTES DENTRO DE SUS RESPECTIVOS CONVENIOS.

Por lo anterior se solicita enviar los pendientes de cada convenio con el fin de poder hacer una revisión por parte de la supervisión del Ministerio del Interior. Recuerden que el no acato al convenio y no colaboración ante la Gestión Contractual por parte de los Municipios acarrea trámites por posibles incumplimientos.

Para todos los efectos relacionados con la supervisión del convenio de la referencia se podrán contactar con mi persona Arq. Juan José Blanco Oviedo al 300 689 90 02 y a este correo electrónico.

Feliz comienzo de mes y espero con su ayuda poder sacar estos convenios adelante; Éxitos!!!

Cordialmente

NOTA: Por favor aquellos municipios que estén al dia hacer caso omiso, pero no bajen la guardia y continúen en ese camino es la única forma de cumplir los objetivos trazados

CONCLUSIÓN  
Seguir adelantando toda la gestión para el buen funcionamiento entre las partes para con el convenio


ACTAS DE OBRA e INTERVENTORIA	
Acta de cantidades de Ejecución de Obra	
Acta de Recibo y Entrega de Bienes	
Informes final del municipio	

- VISITAS DE OBRA







213


 <b>MinInterior</b> Ministerio del Interior	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	<b>Código:</b> GC-P-03-F-02
		<b>Versión:</b> 04
		<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2013
		<b>Vigente Desde:</b> 26/08/2013

<b>SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA</b>	<b>RECIBO Y ENTREGA DEL BIENE</b>			

• **SUPERVISORES**

<b>SUPERVISOR</b>  <b>ARQ. MIGUEL TURMEQUE BSUTOS</b> Subdirección de Infraestructura Ministerio - Fonsecon	<b>PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN</b>  <b>ARQ. JUAN JOSE BLANCO O</b> Subdirección de Infraestructura Ministerio - Fonsecon
--	--

215  
214

 <b>MinInterior</b> Ministerio del Interior	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	<b>Código: GC-P-03-F-02</b>
		<b>Versión: 04</b>
		<b>Fecha Elaboración:</b> <b>25/07/2013</b>
		<b>Vigente Desde:</b> <b>26/08/2013</b>

**INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FONSECON**  
**CONTRATO F - 212 de 2015 - INFORME MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015.**



**1. GENERALIDADES CONVENIO**

OBJETO:	"Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros entre las partes para promover la gobernabilidad y la seguridad ciudadana a través de la construcción de infraestructura, mediante la ejecución del proyecto denominado "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA en el Municipio de SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA"		
BENEFICIARIO:	SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA		
VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO	TOTAL DEL CONVENIO	\$ 735.000.000,00	
	APORTES MIN - FONSECON	\$ 735.000.000,00	
	APORTES MUNICIPIO	\$ 00	
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 30 DE Noviembre de 2015		
PRODUCTOS	PRESUPUESTO VIABILIZADO	PRESUPUESTO ADJUDICADO	DIFERENCIA
Estudios y diseños	\$ 12.000.000,00	\$ ,00	\$,00
Interventoría de estudios y diseños	\$ 3.000.000,00	\$ ,00	\$,00
Obra	\$ 687.900.000,00	\$ ,00	\$,00
Interventoria de obra	\$ 47.100.000,00	\$ ,00	\$,00
TOTAL	\$ 735.000.000,00	\$ 735.000.000,00	\$,00
FECHA SUSCRIPCION	06/05/2015		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	MIGUEL TURMEQUE	14/09/2015	
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	Harry Salamanca	20/05/2015	14/09/2015
REGISTRO PRESUPUESTAL MI	Nº 62115	VALOR	\$ 735.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N/A	N/A	N/A
APROBACIÓN DE POLIZA	No. 630-47-994000006141	FECHA	07-MAY-15
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONVENIO	07-MAY-15	N/A	N/A
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	SOLICITUD 1:		
	SOLICITUD 2:		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A	N/A	N/A

**2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO**

➤ Convenio interadministrativo

CONCEPTO	FECHA DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	PORCENTA JE DE OBRA REQUERID O	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO		0.00%		\$,00
SEGUNDO DESEMBOLSO		0.0%		\$,00

 	<b>FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 2</b>	<b>Código:</b> GC-P-03-F-02
		<b>Versión:</b> 04
		<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2013
		<b>Vigente Desde:</b> 26/08/2013


CONCEPTO		% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO D/M/A
ANTICIPO OBRA		ANTICIPO	30%			
PRIMER DESEMBOLSO		100%	60%			
PAGO CONTRA LIQUIDACION		Firma acta	10%			
PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS			
			FECHA INICIO	FECHA FINAL		
	Cumplimiento del contrato	\$,00				
	Calidad del servicio	\$,00				
	Pagos y prestaciones sociales	\$,00				
	Responsabilidad civil	N/A	N/A		N/A	
	riesgo	N/A	N/A		N/A	
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA				100%		
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA				100%		
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)				100%		
% RECURSOS EJECUTADOS				100%		

• DEL MUNICIPIO:

FECHA DE ULTIMO INFORME: NO HA ENVIADO A LA FECHA

• INFORME DEL SUPERVISOR:

<b>DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:</b>
INFORME: OCTUBRE DE 2015
AVANCE: 10%
ESTADO: ACTIVO
RECURSOS GIRADOS: 0%
 Pendiente por recibir
<ul style="list-style-type: none"><li>- Ya existe contrato de obra , falta legalizar interventoria</li><li>- Pendiente Incluir 5 frentes de trabajo en contrato de obra</li><li>- Documentación 2 desembolso</li><li>- Soportes de 1er desembolso</li><li>- Adecuación de lote ( registro )</li></ul>
 ACTIVIDADES EJECUTADAS
Se enviaron correos – se charlo con los distintos municipios para verificar la gestión individual con respecto a cada convenio – Se copian archivos del presente mes.
 <ul style="list-style-type: none"><li>• Correo Ministerio del Interior Buenos días.</li></ul>
 Por medio del presente les envió Formatos para hacer seguimiento de obra por parte del Interventor, como por el Supervisor del Municipio, les explico cómo sería la dinámica aunque todos ya lo deben saber por cuanto en las reuniones realizadas la semana pasada en el DPTO de Tolima la Secretaria General y el Coordinador lo explicaron, y el en DPTO de Caquetá mi persona y el Supervisor también se dio a conocer. Sin embargo lo describo aquí :
 1. Formato de Interventoria. Debe ser diligenciado por el Interventor semanalmente de acuerdos a los respectivos

 <b>MinInterior</b> Ministerio del Interior	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	<b>Código:</b> GC-P-03-F-02
		<b>Versión:</b> 04
		<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2013
		<b>Vigente Desde:</b> 26/08/2013

Interventor, como por el Supervisor del Municipio, les explico cómo sería la dinámica aunque todos ya lo deben saber por cuanto en las reuniones realizadas la semana pasada en el DPTO de Tolima la Secretaría General y el Coordinador lo explicaron, y el en DPTO de Caquetá mi persona y el Supervisor también se dio a conocer. Sin embargo lo describo aquí :

1. Formato de Interventoria.  
Debe ser diligenciado por el Interventor semanalmente de acuerdos a los respectivos avances de obra y a los distintos frentes de trabajo y debe ser entregado y conciliado en cantidades con el Supervisor del Municipio quien corrobora lo allí descrito, las 4 semanas se entregan en un solo compilado al final de cada mes.

2. Formato de avance de obra.  
Debe ser diligenciado por el Supervisor del Municipio de acuerdo los respectivos avances de obra, teniendo en cuenta lo certificado por el interventor y corroborado en sitio verificado por frentes de trabajo, registro fotográfico se entrega dependiendo la solicitud por esta supervisión; Deben ir llevándolo día a día. Este formato además debe ir con videos realizado por usted para corroborar lo allí descrito. Enviar a esta supervisión para seguimiento a la ejecución.

3. Formato de Informe mensual.  
Debe ser diligenciado por el Supervisor del Municipio de acuerdo al seguimiento de toda la gestión contractual del convenio, registro fotográfico, balances financieros con soportes, se entrega los primeros 5 días de del mes siguiente al informado junto con los 2 anteriores y cualquier otra solicitud que haya a lugar por esta Supervisión.



Por todo lo anterior esta Supervisión le exige el Cumplimiento en el diligenciamiento de estos para poder llevar un control en el avance de la obra técnica como financieramente, Cualquier inquietud presto a resolver.

ACTAS DE OBRA e INTERVENTORIA	
Acta de cantidades de Ejecución de Obra	
Acta de Recibo y Entrega de Bienes	
Informes final del municipio	


• VISITAS DE OBRA

SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA	RECIBO Y ENTREGA DEL BIENE		

• SUPERVISORES

<b>SUPERVISOR</b>  <b>ARQ. MIGUEL TURMEQUE BSUTOS</b> Subdirección de Infraestructura Ministerio – Fonsecon	<b>PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN</b>  <b>ARQ. JUAN JOSE BLANCO</b> Subdirección de Infraestructura Ministerio - Fonsecon
--	--


221

 <b>MinInterior</b> Ministerio del Interior	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	Código: GC-P-03-F-02
		Versión: 04
		Fecha Elaboración: 25/07/2013
		Vigente Desde: 26/08/2013

**INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FONSECON**  
**CONTRATO F - 212 de 2015 - INFORME MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015.**

**1. GENERALIDADES CONVENIO**

OBJETO:	"Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros entre las partes para promover la gobernabilidad y la seguridad ciudadana a través de la construcción de infraestructura, mediante la ejecución del proyecto denominado "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA en el Municipio de SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA"		
BENEFICIARIO:	SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA		
VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO	TOTAL DEL CONVENIO		\$ 735.000.000,00
	APORTES MIN - FONSECON		\$ 735.000.000,00
	APORTES MUNICIPIO		\$ 00
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 30 DE Noviembre de 2015		
PRODUCTOS	PRESUPUESTO VIABILIZADO	PRESUPUESTO ADJUDICADO	DIFERENCIA
Estudios y diseños	\$ 12.000.000,00	\$ ,00	\$,00
Interventoría de estudios y diseños	\$ 3.000.000,00	\$ ,00	\$,00
Obra	\$ 687.900.000,00	\$ ,00	\$,00
Interventoria de obra	\$ 47.100.000,00	\$ ,00	\$,00
TOTAL	\$ 735.000.000,00	\$ 735.000.000,00	\$,00
FECHA SUSCRIPCION	06/05/2015		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	MIGUEL TURMEQUE	14/09/2015	
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	Harry Salamanca	20/05/2015	14/09/2015
REGISTRO PRESUPUESTAL MI	Nº 62115	VALOR	\$ 735.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N/A	N/A	N/A
APROBACIÓN DE POLIZA	No. 630-47-994000006141	FECHA	07-MAY-15
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONVENIO	07-MAY-15	N/A	N/A
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	SOLICITUD 1:		
	SOLICITUD 2:		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A	N/A	N/A

 <div> <b>MinInterior</b>  Ministerio del Interior </div>	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	<b>Código:</b> GC-P-03-F-02
		<b>Versión:</b> 04
		<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2013
		<b>Vigente Desde:</b> 26/08/2013

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

### ➤ Convenio interadministrativo

CONCEPTO	FECHA DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO		0.00%		\$,00
SEGUNDO DESEMBOLSO		0.0%		\$,00
TERCER DESEMBOLSO		70.0%		\$,00
ULTIMO DESEMBOLSO		100.0%		\$,00
<b>TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME</b>				\$,00

## 3. POLIZAS CONVENIO



PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
Nº 630-47-994000006141	Cumplimiento	\$ 147.000.000	07-MAY-15	31-MAY-16
	Calidad de servicio	N/A	N/A	N/A
	Pagos y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
	Buen manejo y correcta inversión	N/A	N/A	N/A

## • BALANCES FINANCIEROS DEL PROYECTO

### ➤ Contrato de Ejecución de obra

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR			
Contrato No - 028	Construcción de un centro de integración ciudadana – cic , en el municipio de san Jose del fragua en cumplimiento del convenio interadministrativo de cofinanciación No 212 del 07 de mayo de 2015 suscrito entre la nación – ministerio del interior – fondo nacional de seguridad y convivencia ciudadana – fonsecon y el municipio de san Jose del fragua (Caquetá) .	\$720.900.000.00			
Adicional (recursos de:)					
Nombre contratista	UNION TEMPORAL SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015 NIT 900.901.022				
Fecha De Inicio Del Proyecto	23/10/2016				
VALOR TOTAL CONTRATADO:		\$720.900.000.00			
CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO D/M/A
ANTICIPO OBRA	ANTICIPO	30%			
PRIMER DESEMBOLSO	100%	60%			



 	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>		Código: GC-P-03-F-02	
			Versión: 04	
			Fecha Elaboración: 25/07/2013	
			Vigente Desde: 26/08/2013	

PAGO CONTRA LIQUIDACION		Firma acta	10%		
PÓLIZA No.36-44-101033033	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS		
			FECHA INICIO	FECHA FINAL	
# 36-44-101033033	Cumplimiento	\$72.090.000,00	23/10/2015	28/08/2016	
	Estabilidad y calidad de la obra	\$144.180.000,00	23/10/2015	07/06/2021	
	Pagos y prestaciones sociales	\$36.045.000,00	23/10/2015	28/02/2016	
	Responsabilidad civil	\$,00			
	Calidad del bien	\$,80			
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA			100%		
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA			100%		
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)			100%		
% RECURSOS EJECUTADOS			100%		

➤ **Contrato de Ejecución de Interventoría de obra**

Contrato de Ejecución de Interventoría de obra						
DESCRIPCIÓN		OBJETO		VALOR		
Contrato No - 001		INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ANUAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA- DEPARTAMENTO DEL CAQUETA .		\$47.100.000.00		
Adicional (recursos de:)						
Nombre contratista						
Fecha De Inicio Del Proyecto						
		CELSO ANDRES ROJAS CLEVES CC No 80.223.290 DE BOGOTA -DC				
VALOR TOTAL CONTRATADO:				\$47.100.000,00		
CONCEPTO		% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO D/M/A
ANTICIPO OBRA		ANTICIPO	30%			
PRIMER DESEMBOLSO		100%	60%			
PAGO CONTRA LIQUIDACION		Firma acta	10%			
PÓLIZA No.		AMPAROS		VALORES	VIGENCIAS	



**MinInterior**  
Ministerio del Interior

**FORMATO  
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA  
CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -  
FONSECON  
ANEXO 2**

**Código:** GC-P-03-F-02

**Versión:** 04

**Fecha Elaboración:**  
25/07/2013

**Vigente Desde:**  
26/08/2013

		ASEGURADOS		FECHA FINAL
# 630-47-994000008007	Cumplimiento del contrato	\$4.710.000,00	04/11/2015	23/08/2016
	Calidad del servicio	\$9.420.000,00	04/11/2015	23/02/2016
	Pagos y prestaciones sociales	\$9.420.000,00	04/11/2015	23/02/2016
	Responsabilidad civil	N/A	N/A	N/A
	riesgo	N/A	N/A	N/A
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA				100%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA				100%
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)				100%
% RECURSOS EJECUTADOS				100%

• **DEL MUNICIPIO:**

FECHA DE ULTIMO INFORME: NO HA ENVIADO A LA FECHA

• **INFORME DEL SUPERVISOR:**

**DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:**

**INFORME:** NOVIEMBRE DE 2015

**AVANCE:** 10%

**ESTADO:** ACTIVO

**RECURSOS GIRADOS:** 0%

**Pendiente por recibir**

- **Pendiente Incluir 5 frentes de trabajo en contrato de obra**
- **Documentación 2 desembolso**
- **Soportes de 1er desembolso**

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**


Se enviaron correos – se charlo con los distintos municipios para verificar la gestión individual con respecto a cada convenio – Se copian archivos del presente mes.

- **Correo Ministerio del Interior**  
Buenas tardes.  
Srs. Supervisores.

Por medio del presente les quiero reiterar la importancia en la colaboración para con esta supervisión, y el cumplimiento en sus obligaciones como Supervisores de los presentes convenios. **CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: Y ESPECÍFICAMENTE LOS NUMERALES "Correspondientes dentro de cada Convenio - Revisar Minuta"**

14. Dar inicio al contrato de interventoría de obra antes de dar inicio al contrato de obra.

222

 <b>MinInterior</b> Ministerio del Interior	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	Código: GC-P-03-F-02
		Versión: 04
		Fecha Elaboración: 25/07/2013
		Vigente Desde: 26/08/2013

15. Adelantar las acciones necesarias para garantizar que el interventor de los contratos, cumplan sus obligaciones durante toda la ejecución y hasta la terminación del contrato objeto de Interventoría.

19. Mantener un control contable y financiero independiente para el manejo de los recursos girados por el MINISTERIO-FONSECON, con sus respectivos documentos soportes. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos.

20. Prestar toda la colaboración requerida por el supervisor del Convenio, designado por el MINISTERIO-FONSECON, en todas las etapas del Convenio, para lo cual, entre otras actividades, suministrará oportunamente la información solicitada y acompañará el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen.

24. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del Convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del Convenio, indicando los porcentajes de avance y ejecución conforme a lo establecido en el cronograma previamente presentado y aprobado, y adjuntando los informes de ejecución de los contratos de consultoría y de obra, según corresponda.

25. Entregar, junto con los informes mensuales, un registro fotográfico donde se evidencie el inicio y ejecución de obra objeto del Convenio, discriminado por etapas, según el cronograma aportado por el Ente Territorial y aprobado por el supervisor.

26. participar en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del proyecto objeto del Convenio, los cuales se realizarán mensualmente, o cuando las partes así lo estimen pertinente.

27. Garantizar, cuando el Ministerio del Interior así lo requiera, la participación de los contratistas de obra e Interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta.

28. Solicitar por escrito al Ministerio- FONSECON, previa a su ejecución, la aprobación de las modificaciones de tipo técnico al proyecto, en caso de Requerirse, aún cuando se trate de adiciones de recursos por parte de la ENTIDAD TERRITORIAL.

29. Presentar los reportes periódicos que le solicite el supervisor del MINISTERIO-FONSECON sobre el uso de los recursos consignados en la cuenta que se abra para el manejo de los recursos del Convenio.


30. Incorporar como obligación contractual y exigir en los contratos que celebre para la ejecución del proyecto objeto el Convenio, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Teniendo en cuenta lo anterior y lo charlado en las reuniones impartidas para los departamentos de Tolima - Caqueta, y los compromisos adquiridos en esas ocasiones por los Srs. Alcaldes - Supervisores; En lo que tiene que ver con " porcentajes de avances de obra descritos así y por cumplir a 25 de diciembre de 2015."

#### DEPARTAMENTO DE CAQUETA :

- Cartagena del Chaira - 70% Avance de obra.
- Albania - 70% Avance de obra.
- Curillo - 50% Avance de obra.
- San Jose del Fragua - 50% Avance de obra. ✓
- San Vicente del Caguán - 40% Avance de obra.

- Correo Ministerio del Interior

 <div> MinInterior  Ministerio del Interior </div>	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	<b>Código:</b> GC-P-03-F-02
		<b>Versión:</b> 04
		<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2013
		<b>Vigente Desde:</b> 26/08/2013

Buenos días.

Por medio del presente les reitero mis saludos y de manera muy atenta solicitarle al Supervisor del Municipio, darle importancia y gestionar para encaminar ahora que estamos a tiempo los requerimientos realizados por la Interventoría según OFI - 003-004.

Es de vital importancia para los objetivos del Convenio tomar las recomendaciones emitidas en reuniones anteriores por esta Supervisión y ahora en campo por la Interventoría - trazar los planes de acción que haya lugar y transmitirle a todo el equipo interdisciplinario y técnico las condiciones y los objetivos a cumplir durante esta vigencia.

Para todos los efectos, les solicitó por parte de esta Supervisión acatar los requerimientos y para la visita que se realizará esta semana estar todo subsanado y los avances programados ejecutados.

**Nota: ( VISITA DE OBRA )**

- Cronograma de Obra actualizado
- Fichas de Avance de Obra ( Para corroborar con los avances en campo )
- Requerimientos de Avance de Obras y Valla - Cumplidos.

Buenas Tardes .( Visitas del 25-29/11/2015 )

Por medio de la presente les envío un cordial saludo y les confirmo visita a los distintos Municipios para realizar Seguimiento a los avances de las Obras y Seguimiento a toda la Gestión Contractual por parte de los Municipios

**Visita del día Jueves Municipios :**

- 1- Curillo
- 2- Albania
- 3- San Jose del Fragua

**Visita del día Viernes Municipios :**

- 1- Cartagena del Chaira
- 2- San Vicente del Caguán

**Visita del día Sábado Municipios :**

- 1- Florencia - CIC
- 2- Florencia - Entrega de Camionetas



Cabe decir que este horario está sujeto a modificaciones por cualquier retraso u evento que se presente en el transcurso de dichas visitas, se necesita tener al día todo los soportes necesarios para corroborar lo expuesto en reuniones anteriores y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones del Municipio referente al convenio en mención. Deben asistir a la visita de obra Contratistas e Interventores (Representantes Legales + Residentes).

ACTAS DE OBRA e INTERVENTORIA	
Acta de cantidades de Ejecución de Obra	
Acta de Recibo y Entrega de Bienes	
Informes final del municipio	



• **VISITAS DE OBRA**

SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA	RECIBO Y ENTREGA DEL BIENE			

224


 	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	<b>Código:</b> GC-P-03-F-02
		<b>Versión:</b> 04
		<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2013
		<b>Vigente Desde:</b> 26/08/2013

• **SUPERVISORES**

<p><b>SUPERVISOR</b></p>  <p><b>ARQ. MIGUEL TURMEQUE BUITOS</b>          Subdirección de Infraestructura Ministerio -          Fonsecon</p>	<p><b>PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN</b></p>  <p><b>ARQ. JUAN JOSE BLANCO</b>          Subdirección de Infraestructura Ministerio -          Fonsecon</p>
--	--



225


 <b>MinInterior</b> Ministerio del Interior	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	<b>Código:</b> GC-P-03-F-02
		<b>Versión:</b> 04
		<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2013
		<b>Vigente Desde:</b> 26/08/2013

**INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FONSECON**  
**CONTRATO F - 212 de 2015 - INFORME MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.**

**1. GENERALIDADES CONVENIO**

OBJETO:	"Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros entre las partes para promover la gobernabilidad y la seguridad ciudadana a través de la construcción de infraestructura, mediante la ejecución del proyecto denominado "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA en el Municipio de SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA"		
BENEFICIARIO:	SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA		
VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO	TOTAL DEL CONVENIO	\$ 735.000.000,00	
	APORTES MIN - FONSECON	\$ 735.000.000,00	
	APORTES MUNICIPIO	\$ 00	
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 30 DE Noviembre de 2015		
PRODUCTOS	PRESUPUESTO VIABILIZADO	PRESUPUESTO ADJUDICADO	DIFERENCIA
Estudios y diseños	\$ 12.000.000,00	\$ ,00	\$,00
Interventoría de estudios y diseños	\$ 3.000.000,00	\$ ,00	\$,00
Obra	\$ 687.900.000,00	\$ ,00	\$,00
Interventoria de obra	\$ 47.100.000,00	\$ ,00	\$,00
TOTAL	\$ 735.000.000,00	\$ 735.000.000,00	\$,00
FECHA SUSCRIPCION	06/05/2015		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	MIGUEL TURMEQUE	14/09/2015	
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	Harry Salamanca	20/05/2015	14/09/2015
REGISTRO PRESUPUESTAL MI	Nº 62115	VALOR	\$ 735.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N/A	N/A	N/A
APROBACIÓN DE POLIZA	No. 630-47-994000006141	FECHA	07-MAY-15
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONVENIO	07-MAY-15	N/A	N/A
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	SOLICITUD 1:		
	SOLICITUD 2:		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A	N/A	N/A



 <b>MinInterior</b> Ministerio del Interior	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	<b>Código:</b> GC-P-03-F-02
		<b>Versión:</b> 04
		<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2013
		<b>Vigente Desde:</b> 26/08/2013

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

### ➤ Convenio interadministrativo

CONCEPTO	FECHA DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	PORCENTA JE DE OBRA REQUERID O	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO		0.00%		\$,00
SEGUNDO DESEMBOLSO		0.0%		\$,00
TERCER DESEMBOLSO		70.0%		\$,00
ULTIMO DESEMBOLSO		100.0%		\$,00
<b>TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME</b>				\$,00

## 3. POLIZAS CONVENIO


PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
Nº 630-47-994000006141	Cumplimiento	\$ 147.000.000	07-MAY-15	31-MAY-16
	Calidad de servicio	N/A	N/A	N/A
	Pagos y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
	Buen manejo y correcta inversión	N/A	N/A	N/A

## • BALANCES FINANCIEROS DEL PROYECTO

### ➤ Contrato de Ejecución de obra

DESCRIPCIÓN		OBJETO		VALOR		
Contrato No - 028		Construcción de un centro de integración ciudadana – cic , en el municipio de san Jose del fragua en cumplimiento del convenio interadministrativo de cofinanciación No 212 del 07 de mayo de 2015 suscrito entre la nación – ministerio del interior – fondo nacional de seguridad y convivencia ciudadana – fonsecon y el municipio de san Jose del fragua (Caquetá) .		\$720.900.000.00		
Adicional (recursos de:)						
Nombre contratista		UNION TEMPORAL SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015 NIT 900.901.022				
Fecha De Inicio Del Proyecto		23/10/2016				
VALOR TOTAL CONTRATADO:				\$720.900.000,00		
CONCEPTO		% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO D/M/A
ANTICIPO OBRA		ANTICIPO	30%			
PRIMER DESEMBOLSO		100%	60%			


226

 <b>MinInterior</b> Ministerio del Interior	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	<b>Código:</b> GC-P-03-F-02
		<b>Versión:</b> 04
		<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2013
		<b>Vigente Desde:</b> 26/08/2013

PAGO CONTRA LIQUIDACION		Firma acta	10%		
PÓLIZA No.36-44-101033033	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS		
			FECHA INICIO	FECHA FINAL	
	Cumplimiento	\$72.090.000,00	23/10/2015	28/08/2016	
	Estabilidad y calidad de la obra	\$144.180.000,00	23/10/2015	07/06/2021	
	Pagos y prestaciones sociales	\$36.045.000,00	23/10/2015	28/02/2016	
# 36-44-101033033	Responsabilidad civil	\$,00			
	Calidad del bien	\$,80			
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA			100%		
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA			100%		
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)			100%		
% RECURSOS EJECUTADOS			100%		

➤ **Contrato de Ejecución de Interventoría de obra**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR			
Contrato No - 001	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ANUAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA- DEPARTAMENTO DEL CAQUETA .	\$47.100.000,00			
Adicional (recursos de:)					
Nombre contratista	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES CC No 80.223.290 DE BOGOTA -DC				
Fecha De Inicio Del Proyecto					
VALOR TOTAL CONTRATADO:		\$47.100.000,00			
CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO D/M/A
ANTICIPO OBRA	ANTICIPO	30%			
PRIMER DESEMBOLSO	100%	60%			
PAGO CONTRA LIQUIDACION	Firma acta	10%			
PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES	VIGENCIAS		

 <div> <b>MinInterior</b>  Ministerio del Interior </div>	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	<b>Código:</b> GC-P-03-F-02
		<b>Versión:</b> 04
		<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2013
		<b>Vigente Desde:</b> 26/08/2013

		ASEGURADOS		FECHA FINAL
# 630-47-994000008007	Cumplimiento del contrato	\$4.710.000,00	04/11/2015	23/08/2016
	Calidad del servicio	\$9.420.000,00	04/11/2015	23/02/2016
	Pagos y prestaciones sociales	\$9.420.000,00	04/11/2015	23/02/2016
	Responsabilidad civil	N/A	N/A	N/A
	riesgo	N/A	N/A	N/A
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA			100%	
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA			100%	
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)			100%	
% RECURSOS EJECUTADOS			100%	

• **DEL MUNICIPIO:**

FECHA DE ULTIMO INFORME: NO HA ENVIADO A LA FECHA

• **INFORME DEL SUPERVISOR:**

**DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:**

**INFORME:** DICIEMBRE DE 2015

**AVANCE:** 15%

**ESTADO:** ACTIVO

**RECURSOS GIRADOS:** 0%

Pendiente por recibir

- Pendiente Incluir 5 frentes de trabajo en contrato de obra
- Documentación 2 desembolso
- Soportes de 1er desembolso



**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

Se enviaron correos – se charlo con los distintos municipios para verificar la gestión individual con respecto a cada convenio – Se copian archivos del presente mes.

- Correo Ministerio del Interior  
Buenas tardes.  
Srs. Supervisores.

Por medio del presente les quiero reiterar la importancia en la colaboración para con esta supervisión, y el cumplimiento en sus obligaciones como Supervisores de los presentes convenios. **CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: Y ESPECÍFICAMENTE LOS NUMERALES "Correspondientes dentro de cada Convenio - Revisar Minuta"**

**Y LOS NUMERALES: 14-15-19-20-24-25-26-27-28-29-30.**

 	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	<b>Código:</b> GC-P-03-F-02
		<b>Versión:</b> 04
		<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2013
		<b>Vigente Desde:</b> 26/08/2013

Teniendo en cuenta lo anterior y lo charlado en las reuniones impartidas para los departamentos de Caqueta, y los compromisos adquiridos en esas ocasiones por los Srs. Alcaldes - Supervisores; y en visita de obras realizada la semana anterior por el Supervisor del Ministerio, en lo que tiene que ver con " porcentajes de avances de obra descritos así y por cumplir a 25 de diciembre de 2015."

**DEPARTAMENTO DE CAQUETA :**

- Cartagena del Chaira - 70% Avance de obra.
- Albania - 70% Avance de obra.
- Curillo - 40% Avance de obra.
- San Jose del Fragua - 40% Avance de obra.
- San Vicente del Caguán - 40% Avance de obra.
- Florencia - 20% Avance de obra.
- Correo Ministerio del Interior

Blanco Oviedo, Juan Jose <juan.blanco@mininterior.gov.co>  
22:08 (hace 16 horas)

para Planeación, Planeación, planeación, Alcaldía, planeacion, planeacion, Miguel  
Buenas Noches.

Por medio del presente esta supervision les solicita para el Viernes 11/12/15 de carácter obligatorio asistir a una reunión en la Subdirección de Infraestructura del Ministerio del Interior - Bogotá.

Tema a tratar toda la gestión contractual Convenios CIC en referencia - Centros de Integración Ciudadana, % de avances de obra y estado de los mismos.

Por favor asistencia de carácter obligatorio para los Srs. Alcaldes y/o Srs. Supervisores - Contratistas por parte del Municipio de los respectivos convenios.

Dirección del encuentro : Cra 8 -No 12b31- Ed. Bancol piso 10  
Ciudad: Bogotá - D.C.  
Hora: 9:00 am.

NOTA: Tener claro toda la gestión contractual de sus respectivos convenios, los alcances y logros reales de los mismos a ejecutar en la presente anualidad.  
(Fichas actualizadas de avance de obra, de publicación y adjudicación de contratos, Informes pendientes, cuentas de cobro etc.)



Para todos los efectos relacionados con la supervisión del convenio de la referencia se podrán contactar con mi persona Arq. Juan José Blanco Oviedo al 300 689 90 02 y a este correo electrónico.

- Correo Ministerio del Interior

Buenas Tardes.

Por medio del presente les saludo nuevamente y les reitero la preocupación que tiene esta supervision con respecto al convenio del asunto referido por no ir en tiempos para cumplir con los compromisos adquiridos con anterioridad respecto a los % de avances de obra requeridos para acreditar el 3 desembolso del presente.

Adjunto para su conocimiento y gestión en replantear las actividades y turnos para poder lograr los

 	<p align="center"><b>FORMATO</b>  <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b>  <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b>  <b>FONSECON</b>  <b>ANEXO 2</b></p>	Código: GC-P-03-F-02
		Versión: 04
		Fecha Elaboración: 25/07/2013
		Vigente Desde: 26/08/2013

objetivos pactados.

- Correo Ministerio del Interior

Buenos días.

Por medio del presente adjunto póliza para corrección suministrada por el municipio como soporte a la ampliación concedida en tiempo para continuar con el objeto del presente convenio , por favor agilizar tramite debido a que con esto se puede legalizar dicha prorroga y así poder proceder al desembolso pendiente por esta vigencia ..

Cordialmente

- Correo Ministerio del Interior

Buenas Tardes.

Srs. Alcaldes - Srs. Supervisores de Convenio

Por medio del presente les quiero solicitar nuevamente los documentos pendientes para poder realizar los respectivos desembolsos, les recuerdo que esos dineros son de vigencia 2015 que el trámite no es solo traer la cuenta; a mí me toca tramitarla y si la traen a última hora no voy a tener tiempo para poder realizar además el cierre financiero es el día lunes 28/12/15 , como se los había anunciado en las diferentes reuniones y visitas a sus municipios y en reuniones departamentales .

Por favor de verdad les pido leer la minuta del convenio o modificatorio y hacer llegar a esta supervision la documentación requerida dependiendo el estado de cada convenio para evitar sanciones

Nota : Cualquier inquietud presto a resolver , aquí se trabajará el fin de semana de corrido estos días recibo las cuentas de los municipios para poder radicar el día lunes 28/12/15, quedo atento ..

**PENDIENTES :**

- 1- Informes mensuales
- 2- informes semanales de interventorias
- 3- fichas de municipios que no aun iniciado obra
- 4- documentos para desembolsos
- 5- documentos de soporte de toda la gestión contractual de los municipios

- Correo Ministerio del Interior

Buenas Noches.



Srs. Alcaldes y Srs. Supervisores.

Como es de su conocimiento el Municipio al cual ustedes representan ante el Ministerio del Interior en el asunto, Convenio Interadministrativo Ministerio del Interior y su Municipio. Se adelanta la construcción de un Centro de Integración Ciudadana el cual necesita manejarse en comunicación para poder conocer los avances o distintas situaciones que se puedan presentar durante la vigencia y ejecución del mismo.

Hace ya algunos días esta supervision envió un oficio solicitando algunos documentos y apoyo para poder restablecer el diálogo con las nuevas administraciones y continuar con los objetivos trazados durante la firma del presente convenio.

A la fecha esto se ha podido solo restablecer con algunas alcaldías , por tal motivo esta supervision

22

 	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b> <b>CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO -</b> <b>FONSECON</b> <b>ANEXO 2</b>	<b>Código:</b> GC-P-03-F-02
		<b>Versión:</b> 04
		<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2013
		<b>Vigente Desde:</b> 26/08/2013

le exige a los nuevos secretarios - alcaldes y a los contratistas colaboración para poder entablar una comunicación fluida con todos los participantes de los presentes y así poder retomar el rumbo y trazar los nuevos objetivos para cumplir con los compromisos adquiridos.

Para todos los efectos relacionados con la supervisión del convenio de la referencia se podrán contactar con mi persona Arq. Juan José Blanco Oviedo al 300 689 90 02 y a este correo electrónico



**NOTA :** Se realizaron todos los desembolsos pendientes por realizar en esta vigencia 2015 .

ACTAS DE OBRA e INTERVENTORIA	
Acta de cantidades de Ejecución de Obra	
Acta de Recibo y Entrega de Bienes	
Informes final del municipio	

• **VISITAS DE OBRA**

SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA	RECIBO Y ENTREGA DEL BIENE			

• **SUPERVISORES**

SUPERVISOR	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
 <b>ARQ. MIGUEL TURMEQUE BSUTOS</b> Subdirección de Infraestructura Ministerio – Fonsecon	 <b>ARQ. JUAN JOSE BLANCO O</b> Subdirección de Infraestructura Ministerio – Fonsecon





non

INFORME EJECUTIVO MENSUAL

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO											
CONVENIO Nº F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)											
Objeto del Convenio: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C/C EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)											
Valor del Convenio:		\$ 735.000.000,00		Aporte de Mininterior:		\$ 735.000.000,00		Aportes del Municipio:		\$ 48.000.000,00	
Valor Adición:		\$ 48.000.000,00									
Valor Total:		\$ 783.000.000,00									
Plazo de Ejecución:		7 MESES		Suspensión 1		Reinicio:		Priorroga Nº 1		NA	
Fecha de Inicio:		08 DE MAYO DEL 2015		Suspensión 2		Reinicio:		Priorroga Nº 2		NA	
Vencimiento:		30 DE NOVIEMBRE DE 2015						Plazo Actualizado			
Póliza de garantía única:		Vigencia póliza (Fechas)		Desde		Hasta		Valor		Modificación fecha	
Aseguradora Solidaria de Colombia		07/05/2015		31/05/2016		\$ 78.300.000,00		Hasta		Modificación Valor	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO											
Informe Nº		5		Periodo comprendido entre el 03 de OCTUBRE del 2015		y el		03 de NOVIEMBRE del 2015			
Proyecto		ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C/C EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)									
Localización		MUNICIPIO SAN JOSE DEL FRAGUA									
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS											
*CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICO AL CONTRATO DE CONSULTORIA cuyo objeto es CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELECTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - C/C EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA.											
Objeto:		CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS									
		*CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELECTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - C/C EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA.									
Contrato Nº:		MC-053 DEL 2015									
Contratista:		CELSO ANDRES ROJAS CLEVES									
Plazo Inicial:		15 días									
Fecha de Inicio:		16 de Junio de 2015									
*Fecha de Suspensión:		19 de Junio de 2015									
*Fecha de Reinicio:		02 de Julio de 2015									
Fecha de Terminación:		13 de Julio de 2015									
Prórrogas:											
Plazo Actualizado:											
Valor Inicial:		\$ 3.000.000,00									
Valor Adiciones:		\$									
Valor Actualizado:		\$									
Valor pagado:		\$									
Valor por pagar:		\$ 3.000.000,00									
Póliza Seguro de cumplimiento		Nº 630-47-994000006429		VIGENCIA: 09/06/2015 - 15/03/2016		VALOR: 750.000		VIGENCIA: 09/06/2015 - 31/12/2015		VALOR: 3.000.000	
Nombre Supervisor:		DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ									
* Inserte las filas que regulará según el número de suspensiones y reinicios - Suprime las casillas innecesarias											
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA											
CONTRATO DE OBRA											
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - C/C EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION Nº 212 DE 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.											
Objeto:		CONTRATO DE OBRA									
		CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - C/C EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION Nº 212 DE 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.									
Contrato Nº:		028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015									
Contratista:		UNION TEMPORAL C/C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015									
Plazo Inicial:		50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015									
Fecha de Inicio:											
*Fecha de Suspensión:											
*Fecha de Reinicio:											
Fecha de Terminación:											
Prórrogas:											
Plazo Actualizado:											
Valor Inicial:											
Valor Adiciones:											
Valor Actualizado:											
Valor pagado:											
Valor por pagar:											

INFORME EJECUTIVO MENSUAL N° 006

Nombre Supervisor:

Nombre Interventor:

\* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suplirna las casillas innecesarias

INFORME EJECUTIVO MENSUAL


ESTADO DE LAS GARANTÍAS									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015					CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052 de 2015				
CONCEPTO	DESGR.	DESGR.	HASTA	VALOR	CONCEPTO	DESGR.	HASTA	VALOR	
Cumplimiento del contrato	09/06/2015	29/12/2015	\$	300.000,00	Cumplimiento del contrato	09/06/2015	31/12/2015	\$	1.200.000,00
Salarios y prestaciones sociales	09/06/2015	29/12/2015	\$	150.000,00	Estabilidad de la obra	09/06/2015	31/12/2015	\$	1.200.000,00
Calidad del servicio	25/06/2015	15/01/2016	\$	300.000,00	Salarios y prestaciones sociales	09/06/2015	31/12/2015	\$	600.000,00
Responsabilidad civil					Responsabilidad civil				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº de 2014					CONTRATO DE OBRA Nº 028 de 2015				
CONCEPTO	DESGR.	DESGR.	HASTA	VALOR	CONCEPTO	DESGR.	HASTA	VALOR	
Cumplimiento del contrato					Cumplimiento del contrato				
Salarios y prestaciones sociales					Estabilidad de la obra				
Calidad del servicio					Calidad del servicio				
Responsabilidad civil					Salarios y prestaciones sociales				
					Responsabilidad civil				
RESUMEN DE PAGOS									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015					CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052 de 2015				
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR			CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR		
Primer pago		\$					\$		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº de 2014					CONTRATO DE OBRA Nº de 2014				
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR			CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR		
Primer pago									
SEGUIMIENTO AL AVANCE									
AVANCE FÍSICO (%)					AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO		CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado			0,00%		% Programado			0,00%	
% Ejecutado			0,00%		% Ejecutado			0,00%	
Diferencia			0,00%		Diferencia			0,00%	

INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 006

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

1. El día 28 de Octubre del año en curso se firma el contrato de obra No. 028 cuyo contratista es UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015.
2. El día 29 de octubre se realiza publicación Resolución de Adjudicación del contrato de interventoría. Se tiene programado para el día 04 de Noviembre de 2015 firma del contrato.
3. Se asiste a la reunión programada para el día 22 de octubre de 2015 por parte del Ministerio del Interior con el fin verificar el estado contractual del proyecto Centro de Integración Ciudadana.


2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

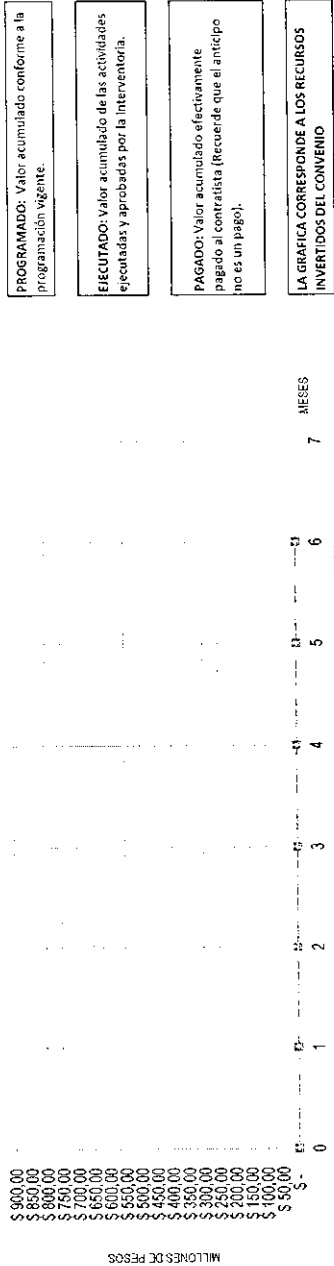

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

INFORME EJECUTIVO MENSUAL

DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO		S/N/A	Nº Folios	DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO		S/N/A	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra	N	0	9.	Control diario de tiempo	N	0
2.	Registro Fotográfico	N	0	10.	Control de personal	N	0
3.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica	N	0	11.	Control de equipo	N	0
4.	Copia ultimo informe de interventoría	N	0	12.	Control de seguridad industrial	N	0
5.	Copia actas de comité de obra	N	0	13.	Relación de menores y mayores cantidades	N	0
6.	Copia libro de obra/bitácora	N	0				
7.	Copia certificado de pago a contratistas	N	0				
8.	Seguimiento plan de manejo ambiental	N	0				

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Elaborado:
			31/01/2014
Nombre: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ	Nombre:	Nombre:	Pag. 1 de 4
Cargo: Cargo: Supervisor del convenio F-212	Cargo:	Cargo:	



## CRONOGRAMA PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA

OBRA .

SAN JOSE FRAGUA .

ACTIVIDAD	FECHA	
Publicación del proyecto de pliego de condiciones. (10 días hábiles de publicación)	09/09/2015	18/09/2015
Publicación de la Resolución que ordena la apertura del proceso y la Resolución mediante la cual se conforma el comité evaluador.	23/09/2015	
Publicación del pliego de condiciones definitivo. (10 días hábiles de publicación)	23/09/2015	30/09/2015
Plazo máximo para expedir adendas. (Dentro de los 3 días hábiles anteriores al cierre del proceso)	30/09/2015	
Cierre del procesos - Plazo máximo para presentar oferta	06/10/2015	
Evaluación por parte de la entidad de las propuestas presentadas en el cierre del proceso. (Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de cierre del proceso)	06/10/2015	08/10/2015
Publicación informe de evaluación preliminar de las propuestas. (Dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para evaluar)	08/10/2015	
Plazo Para dar respuesta a las observaciones presentadas al informe de evaluación preliminar y publicación del informe de evaluación definitivo. (Dentro de los 2 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de publicación de la evaluación preliminar)	13/10/2015	
Audiencia de Adjudicación. (Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la publicación del informe de evaluación definitivo)	14/10/2015	
Publicación Resolución de Adjudicación. (Dentro de los tres días hábiles siguientes a la audiencia de adjudicación)	14/10/2015	
Suscripción del contrato y cumplimiento requisitos de ejecución  (Dentro de los tres días hábiles siguientes a la audiencia de adjudicación)	Esta en proceso, actualmente el contratista esta realizando el tramite del RUT de la union temporal	
TOTAL DE DIAS DEL PROCESO	32 DIAS	





## CRONOGRAMA PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA

INTERVENTORIA

SAN JUAN DE LOS RIOS.

ACTIVIDAD	FECHA	
Publicación del proyecto de pliego de condiciones. (10 días hábiles de publicación)	06-10-15	15-10-15
Publicación de la Resolución que ordena la apertura del proceso y la Resolución mediante la cual se conforma el comité evaluador.	N° 542 16 de octubre 2015	
Publicación del pliego de condiciones definitivo. (10 días hábiles de publicación)	16-10-15	23-10-15
Plazo máximo para expedir adendas. (Dentro de los 3 días hábiles anteriores al cierre del proceso)	21-10-15	
Cierre del procesos - Plazo máximo para presentar oferta	23-10-15	
Evaluación por parte de la entidad de las propuestas presentadas en el cierre del proceso. (Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de cierre del proceso)	23-10-15	26-10-15
Publicación informe de evaluación preliminar de las propuestas. (Dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para evaluar)	26-10-15	
Plazo Para dar respuesta a las observaciones presentadas al informe de evaluación preliminar y publicación del informe de evaluación definitivo. (Dentro de los 2 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de publicación de la evaluación preliminar)	28-10-15	
Audiencia de Adjudicación. (Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la publicación del informe de evaluación definitivo)	29-10-15	
Publicación Resolución de Adjudicación. (Dentro de los tres días hábiles siguientes a la audiencia de adjudicación)	29-10-15	
Suscripción del contrato y cumplimiento requisitos de ejecución (Dentro de los tres días hábiles siguientes a la audiencia de adjudicación)	03-11-15	
TOTAL DE DIAS DEL PROCESO	27 DÍAS.	





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

122  
2  
3-2

## INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA.

**Proyecto:** CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENITO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA).

Contrato: 028 de 2015

Contratista: Unión Temporal CIC San José del Fragua  
2015. Arq. William Artunduaga.  
Representante Legal.

Interventoría: Ing. Celso Andrés Rojas Cleves.

**Diciembre de 2015 – Mes 02.**





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

539

## 1. INFORMACION DESCRIPTIVA.








CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

340

## 1.1 Descripción del Proyecto.

El proyecto objeto del contrato No. 028, denominado "CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENITO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)", en proceso de desarrollo por la Unión Temporal CIC San José del Fragua 2015, cuyo representante Legal es el Arquitecto William Artunduaga ha llegado al primer corte de obra mensual, con la ejecución y presentación del presente informe.

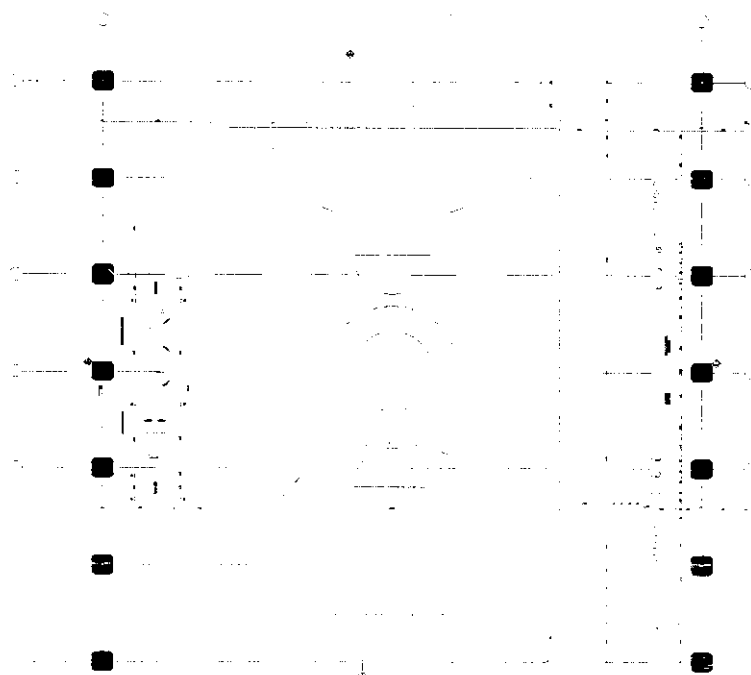

PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL






CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

341

El proyecto hace referencia a la construcción de un escenario deportivo con cancha múltiple, sus respectivos elementos de dotación, cubierta sobre todo el escenario y el área de desarrollo del proyecto. Dentro del espacio construido se encuentra graderías y bajo de ellas servicios sanitarios, un escenario para presentaciones y bajo de este una oficina administrativa con un área desarrollada de (50 m<sup>2</sup>) aproximados. Se anota que todo el proyecto tiene un cerramiento perimetral desarrollado a una altura de tres (03) metros y una fachada en ladrillo a la vista.

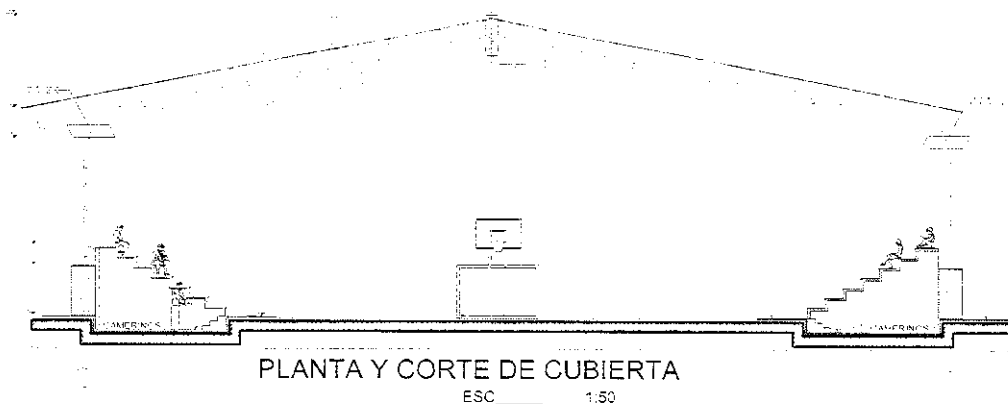





## 1.2 Resumen General de Actividades en Periodo Informado.

Durante el periodo informado se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se da termino al proceso de excavaciones de las estructura de cimiento y de estructuras auxiliares.
- Se muestran importantes avances en el proceso de fabricación de estructura metálica.
- Se da término a la construcción de las columnas para la estructura metálica (obra construida en taller).
- Se muestra avance en el proceso de construcción de las correas para la estructura metálica.
- Se funden zapatas y se da inicio al proceso de construcción de las vigas de cimiento.
- Se presentan avances en el proceso de corte y figurado de aceros para elementos tipo pedestal y complementos de vigas y elementos de estructura.



**CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND

**NIT 80.233.290**

503

### **1.3 Resumen Fotográfico de Actividades**







CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

344

## DOCUMENTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO INFORMADO

- Formato de Control de Clima.
- Formato de Control de Personal en Obra.
- Formato de Reporte de Maquinaria y Equipo.
- Informe Diario de Actividades.
- Fichas de Informe Semanal.
- Programación de Obra / Corte de Obra.





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

525

## FORMATO DE CONTROL DE CLIMA.





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

2015

## INFORME DE CLIMA

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA						
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015						
INTERVENIENTE	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES						
DIA	ESTADO DEL CLIMA	ANOTACION	DIA	ESTADO DEL CLIMA	ANOTACION	ESTADO DEL CLIMA	
1	LI, F	Llueve a las 1:30 termino 3:30 pm	11	S		21	S
2	S		12	S		22	S
3	S		13			23	
4	LI, S	Lluviznas de 07:30-07:50 am	14	S		24	
5	S		15	N-LI	llovió a las 3:41 pm	25	
6	S		16	S		26	
7	S		17	F, LI	llovió de 9:39 a 10:20	27	
8	Nublado		18	N-S	toda la mañana nublado, soleado a	28	
9	S		19	S		29	
10	Nublado		20	S		30	

SOLEADO : S  
LLUVIZNAS: LI  
FUERTES LLUVIAS: F

REGISTRO \_\_\_\_\_ APROBO \_\_\_\_\_

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

542

## FORMATO DE CONTROL DE PERONAL.







CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

5/18

## INFORME DE PERSONAL DIARIO



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
INTERVENIENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES					
FECHA DE REGISTRO:	01/12/2015					

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS				
2	MAESTRO	ROBERTO PIZO	7,711,903			
3	OBREIRO	GILBERTO CADENA	17,640,176			
4	OBREIRO	ARBINSON CAPERA	1,118,468,999			
5	OBREIRO	ROYER PEREZ	1,118,472,635			
6	OBREIRO	SALVADOR RODRIGUEZ	17,616,550			
7	OBREIRO	JORGUE GAITAN	4,166,319			
8	OBREIRO	JUAN MANUEL DIAZ	1,117,794,723			
9	OBREIRO	ALEXANDER BARAHONA	17,648,542			
10	OBREIRO	FREDY ALEXIS MORA RIVERA	1,118,472,268			
11	OBREIRO	SALOMON POVEDALUZADA	1,117,543,949			
12	OBREIRO	ALFONSO ORTIZ ORTIZ	17,615,757			
13			4,961,285			
14						

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

349

## INFORME DE PERSONAL DIARIO

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES					
FECHA DE REGISTRO:	02/12/2015					

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903			
2	MAESTRO	ROBERTO PIZO	17,640,176			
3	OBRO	GILBERTO CADENA	1,118,468,999			
4	OBRO	ARBINSON CAPERA	1,118,472,635			
5	OBRO	ROYER PEREZ	17,616,550			
6	OBRO	SALVADOR RODRIGUEZ	4,166,319			
7	OBRO	JORGUE GAITAN	1,117,794,723			
8	OBRO	JUAN MANUEL DIAZ	17,648,542			
9	OBRO	ALEXANDER BARAHONA	1,118,472,268			
10	OBRO	FREDY ALEXIS MORA RIVERA	1,117,543,949			
11	OBRO	SALOMON POVEDALAZADA	17,615,757			
12	OBRO	ALFONSO ORTIZ ORTIZ	4,961,285			
13						
14						

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

500

## INFORME DE PERSONAL DIARIO

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C. - SAN JOSE DEL FRAGUA						
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015						
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES						
FECHA DE REGISTRO:	03/12/2015						

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903			
2	MAESTRO	ROBERTO PIZO	17,640,176			
3	OBTERO	GILBERTO CADENA	1,118,468,999			
4	OBTERO	ARBINSON CAPERA	1,118,472,635			
5	OBTERO	ROYER PEREZ	17,616,550			
6	OBTERO	SALVADOR RODRIGUEZ	4,166,319			
7	OBTERO	JORGUE GAITAN	1,117,794,723			
8	OBTERO	JUAN MANUEL DIAZ	17,648,542			
9	OBTERO	ALEXANDER BARAHONA	1,118,472,268			
10	OBTERO	FREDY ALEXIS MORA RIVERA	1,117,543,949			
11	OBTERO	SALOMON POVEDALLOZADA	17,615,757			
12	OBTERO	ALFONSO ORTIZ ORTIZ	4,961,285			
13	OBTERO	JOSE LIZARDO CORDOBA	1,006,549,808			
14	OBTERO	PEDRO TORRADO TORRADO	1,003,260,436			

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com  
Florencia - Caquetá



# **INFORME DE PERSONAL DIARIO**

**CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
**T.P.: 25202-096642CND**

<b>PROYECTO:</b>		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA			
<b>CONTRATISTA:</b>		UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015			
<b>INTERVENTORIA:</b>		CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES			
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>		03/12/2015			

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	OBROERO	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ ROJAS	16,550,994			
2	OBROERO	JARVINTON GUILLERMO CANO	1,117,486,866			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE





# INFORME DE PERSONAL DIARIO

 **CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
<b>INTERVENTORIA:</b>	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES					
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	04/12/2015					

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903			
2	MAESTRO	ROBERTO PIZO	17,640,176			
3	OBRERO	GILBERTO CADENA	1,118,468,999			
4	OBRERO	ARBINSON CAPERA	1,118,472,635			
5	OBRERO	ROYER PEREZ	17,616,550			
6	OBRERO	SALVADOR RODRIGUEZ	4,166,319			
7	OBRERO	JORGUE GAITAN	1,117,794,723			
8	OBRERO	JUAN MANUEL DIAZ	17,648,542			
9	OBRERO	ALEXANDER BARAHONA	1,118,472,268			
10	OBRERO	FREDY ALEXIS MORA RIVERA	1,117,543,949			
11	OBRERO	SALOMON POVEDALAZADA	17,615,757			
12	OBRERO	ALFONSO ORTIZ ORTIZ	4,961,285			
13	OBRERO	JOSE LIZARDO CORDOBA	1,006,549,808			
14	OBRERO	PEDRO TORRADO TORRADO	1,003,260,436			

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE



# INFORME DE PERSONAL DIARIO

 **CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
<b>INTERVENTORIA:</b>	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES					
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	03/12/2015					

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	OBRERO	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ ROJAS	16.550.994			
2	OBRERO	JARVINTON GUILLERMO CAÑO	1.117.486.866			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

237

## INFORME DE PERSONAL DIARIO

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL, MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA						
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015						
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES						
FECHA DE REGISTRO:	05/12/2015						
ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC.	IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS		7,711,903			
2	MAESTRO	ROBERTO PIZO		17,640,176			
3	OBREO	GILBERTO CADENA		1,118,468,999			
4	OBREO	ARBINSON CAPEA		1,118,472,635			
5	OBREO	ROYER PEREZ		17,616,550			
6	OBREO	SALVADOR RODRIGUEZ		4,166,319			
7	OBREO	JORGE GAITAN		1,117,794,723			
8	OBREO	ALEXANDER BARAHONA		1,118,472,268			
9	OBREO	FREDY ALEXIS MORA RIVERA		1,117,543,949			
10	OBREO	SALOMON POVEDA LOZADA		17,615,757			
11	OBREO	JOSE LIZARDO CORDOBA		1,006,549,808			
12	OBREO	ALFONSO ORTIZ ORTIZ		4,961,285			
13	OBREO	PEDRO TORRADO TORRADO		1,003,260,436			
14	OBREO	JUAN MANUEL DIAZ		17,472,268			

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

05

## INFORME DE PERSONAL DIARIO

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL, MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA						
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015						
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES						
FECHA DE REGISTRO:	05/12/2015						

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	OBRAERO	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ ROJAS	16,550,994			
2	OBRAERO	JARVINTON GUILLERMO CANO	1,117,486,866			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celso Rojas500@yahoo.com](mailto:celso Rojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá







CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

255

## INFORME DE PERSONAL DIARIO

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL. MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA						
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015						
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES						
FECHA DE REGISTRO:	07/12/2015						

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903			
2	MAESTRO	ROBERTO PIZO	17,640,176			
3	OBROERO	GILBERTO CADENA	1,118,468,999			
4	OBROERO	ARBINSON CAPERA	1,118,472,635			
5	OBROERO	ROYER PEREZ	17,616,550			
6	OBROERO	SALVADOR RODRIGUEZ	4,166,319			
7	OBROERO	JORGE GAITAN	1,117,794,723			
8	OBROERO	ALEXANDER BARAHONA	1,118,472,268			
9	OBROERO	FREDY ALEXIS MORA RIVERA	1,117,543,949			
10	OBROERO	SALOMON POVEDA LOZADA	17,615,757			
11	OBROERO	JOSE LIZARDO CORDOBA	1,006,549,808			
12	OBROERO	ALFONSO ORTIZ ORTIZ	4,961,285			
13	OBROERO	PEDRO TORRADO TORRADO	1,003,260,436			
14	OBROERO	JUAN MANUEL DIAZ	17,472,268			

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

2017

## INFORME DE PERSONAL DIARIO

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES					
FECHA DE REGISTRO:	07/12/2015					

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	OBRO	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ ROJAS	16,550,994			
2	OBRO	JARVINTON GUILLERMO CANO	1,117,486,866			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

358

## INFORME DE PERSONAL DIARIO

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL, MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA						
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015						
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES						
FECHA DE REGISTRO:	08/12/2015						

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903			
2	MAESTRO	ROBERTO PIZO	17,640,176			
3	OBTERO	GILBERTO CADENA	1,118,468,999			
4	OBTERO	HARRISON CAPERA	1,118,472,635			
5	OBTERO	ROYER PEREZ	17,616,550			
6	OBTERO	SALVADOR RODRIGUEZ	4,166,319			
7	OBTERO	JORGE GAITAN	1,117,794,723			
8	OBTERO	ALEXANDER BARAHONA	1,118,472,268			
9	OBTERO	FREDY ALEXIS MORA RIVERA	1,117,543,949			
10	OBTERO	SALOMON POVEDA LOZADA	17,615,757			
11	OBTERO	JOSE LIZARDO CORDOBA	1,006,549,808			
12	OBTERO	ALFONSO ORTIZ ORTIZ	4,961,285			
13	OBTERO	PEDRO TORRADO TORRADO	1,003,260,436			
14	OBTERO	JUAN MANUEL DIAZ	17,472,268			

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florescia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

5009

## INFORME DE PERSONAL DIARIO

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES					
FECHA DE REGISTRO:	08/12/2015					
ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	OBREIRO	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ ROJAS	16,550,994			
2	OBREIRO	JARVINTON GUILLERMO CANO	1,117,486,866			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

REGISTRO	APROBO
	HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com  
Florencia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

361

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE PERSONAL DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA						
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015						
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES						
FECHA DE REGISTRO:	09/12/2015						

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	OBTERO	JARVINTON GUILLERMO CANO	1,117,486,866			
2	OBTERO	JOSE NECEN ESPINOSA MARTINEZ	1,118,472,184			
3	OBTERO	DAVID FELIPE ALVERES	1,118,473,910			
4	OBTERO	HERNAN DARIO PEREZ	1,118,471,300			
5	OBTERO	LUIS EDUARDO CADENA GUTIERREZ	1,117,533,930			
6	OBTERO	GIL RAMIREZ CAVIEDES	17,616,871			
7	OBTERO	YUDIER SNEYDER SIERRA TARRENTES	1,117,531,977			
8	OBTERO	EDGAR SABADRA RUIZ	17,652,746			
9						
10						
11						
12						
13						
14						

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá







CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

T.P.: 25202-096642CND

# INFORME DE PERSONAL DIARIO



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA						
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015						
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES						
FECHA DE REGISTRO:	10/12/2015						
ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC.	IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS		7,711,903			
2	MAESTRO	ROBERTO PIZO		17,640,176			
3	OBRAERO	GILBERTO CADENA		1,118,468,999			
4	OBRAERO	HARRISON CAPERA		1,118,472,635			
5	OBRAERO	ROYER PEREZ		17,616,550			
6	OBRAERO	SALVADOR RODRIGUEZ		4,166,319			
7	OBRAERO	JORGE GAITAN		1,117,794,723			
8	OBRAERO	ALEXANDER BARAHONA		1,118,472,268			
9	OBRAERO	FREDY ALEXIS MORA RIVERA		1,117,543,949			
10	OBRAERO	SALOMON POVEDA LOZADA		17,615,757			
11	OBRAERO	JOSE LIZARDO CORDOBA		1,006,549,808			
12	OBRAERO	ALFONSO ORTIZ ORTIZ		4,961,285			
13	OBRAERO	JUAN MANUEL DIAZ		17,472,268			
14	OBRAERO	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ ROJAS		16,550,994			
REGISTRO							APROBO
							HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florescia - Caqueta



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

503

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE PERSONAL DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA						
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015						
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES						
FECHA DE REGISTRO:	10/12/2015						

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	OBROERO	JARVINTON GUILLERMO CANO	1,117,486,866			
2	OBROERO	JOSE NECEN ESPINOSA MARTINEZ	1,118,472,184			
3	OBROERO	DAVID FELIPE ALVERES	1,118,473,910			
4	OBROERO	HERNAN DARIO PEREZ	1,118,471,300			
5	OBROERO	LUIS EDUARDO CADENA GUTIERREZ	1,117,533,930			
6	OBROERO	GIL RAMIREZ CAVIEDES	17,616,871			
7	OBROERO	YUDIER SNEYDER SIERRO TARRENTES	1,117,531,977			
8	OBROERO	EDGAR SABADRA RUIZ	17,652,746			
9						
10						
11						
12						
13						
14						

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

584

## INFORME DE PERSONAL DIARIO



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA						
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015						
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES						
FECHA DE REGISTRO:	11/12/2015						
ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS	
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903				
2	MAESTRO	ROBERTO PIZO	17,640,176				
3	OBREO	GILBERTO CADENA	1,118,468,999				
4	OBREO	HARRISON CAPERA	1,118,472,635				
5	OBREO	ROYER PEREZ	17,616,550				
6	OBREO	SALVADOR RODRIGUEZ	4,166,319				
7	OBREO	JORGE GAITAN	1,117,794,723				
8	OBREO	ALEXANDER BARAHONA	1,118,472,268				
9	OBREO	FREDY ALEXIS MORA RIVERA	1,117,543,949				
10	OBREO	SALOMON POVEDA LOZADA	17,615,757				
11	OBREO	JOSE LIZARDO CORDOBA	1,006,549,808				
12	OBREO	ALFONSO ORTIZ ORTIZ	4,961,285				
13	OBREO	JUAN MANUEL DIAZ	17,472,268				
14	OBREO	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ ROJAS	16,550,994				
REGISTRO							HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com  
Florescia - Caquetá



**CELSO ANDRES ROJAS CLEVÉS**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

000

**CELSO ANDRES ROJAS CLEVÉS**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE PERSONAL DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA						
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015						
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVÉS						
FECHA DE REGISTRO:	12/12/2015						

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC.	IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS		7,711,903			
2	MAESTRO	ROBERTO PIZO		17,640,176			
3	OBRERO	GILBERTO CADENA		1,118,468,999			
4	OBRERO	HARRISON CAPERA		1,118,472,635			
5	OBRERO	ROYER PEREZ		17,616,550			
6	OBRERO	SALVADOR RODRIGUEZ		4,166,319			
7	OBRERO	JORGE GAITAN		1,117,794,723			
8	OBRERO	ALEXANDER BARAHONA		1,118,472,268			
9	OBRERO	FREDY ALEXIS MORA RIVERA		1,117,543,949			
10	OBRERO	SALOMON POVEDA LOZADA		17,615,757			
11	OBRERO	JOSE LIZARDO CORDOBA		1,006,549,808			
12	OBRERO	ALFONSO ORTIZ ORTIZ		4,961,285			
13	OBRERO	JUAN MANUEL DIAZ		17,472,268			
14	OBRERO	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ ROJAS		16,550,994			

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

2017

## INFORME DE PERSONAL DIARIO



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES					
FECHA DE REGISTRO:	12/12/2015					

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	OBROERO	JARVINTON GUILLERMO CANO	1,117,486,866			
2	OBROERO	JOSE NECEN ESPINOSA MARTINEZ	1,118,472,184			
3	OBROERO	DAVID FELIPE ALVERES	1,118,473,910			
4	OBROERO	HERNAN DARIO PEREZ	1,118,471,300			
5	OBROERO	LUIS EDUARDO CADENA GUTIERREZ	1,117,533,930			
6	OBROERO	GIL RAMIREZ CAVIEDES	17,616,871			
7	OBROERO	YUDIER SNEYDER SIERRA TARRENTES	1,117,531,977			
8	OBROERO	EDGAR SABADRA RUIZ	17,652,746			
9						
10						
11						
12						
13						
14						

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

2068

## INFORME DE PERSONAL DIARIO

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA						
UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015						
CELSO ANDRES ROJAS CLEVES						
14/12/2015						
ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903			
2	MAESTRO	ROBERTO PIZO	17,640,176			
3	OBRERO	GILBERTO CADENA	1,118,468,999			
4	OBRERO	HARRISON CAPERA	1,118,472,635			
5	OBRERO	ROYER PEREZ	17,616,550			
6	OBRERO	SALVADOR RODRIGUEZ	4,166,319			
7	OBRERO	JORGE GAITAN	1,117,794,723			
8	OBRERO	ALEXANDER BARAHONA	1,118,472,268			
9	OBRERO	FREDY ALEXIS MORA RIVERA	1,117,543,949			
10	OBRERO	SALOMON POVEDA LOZADA	17,615,757			
11	OBRERO	JOSE LIZARDO CORDOBA	1,006,549,808			
12	OBRERO	ALFONSO ORTIZ ORTIZ	4,961,285			
13	OBRERO	JUAN MANUEL DIAZ	17,472,268			
14	OBRERO	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ ROJAS	16,550,994			

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

5067

## INFORME DE PERSONAL DIARIO

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES					
FECHA DE REGISTRO:	14/12/2015					

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	OBrero	JARVINTON GUILLERMO CANO	1,117,486,866			
2	OBrero	JOSE NECEN ESPINOSA MARTINEZ	1,118,472,184			
3	OBrero	DAVID FELIPE ALVERES	1,118,473,910			
4	OBrero	HERNAN DARIO PEREZ	1,118,471,300			
5	OBrero	LUIS EDUARDO CADENA GUTIERREZ	1,117,533,930			
6	OBrero	GIL RAMIREZ CAVIEDES	17,616,871			
7	OBrero	YUDIER SNEYDER SIERRO TARRENTES	1,117,531,977			
8	OBrero	EDGAR SABADRA RUIZ	17,652,746			
9						
10						
11						
12						
13						
14						

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

576

## INFORME DE PERSONAL DIARIO



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL, MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES					
FECHA DE REGISTRO:	15/12/2015					

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903			
2	MAESTRO	ROBERTO PIZO	17,640,176			
3	OBTERO	GILBERTO CADENA	1,118,468,999			
4	OBTERO	HARRISON CAPERA	1,118,472,635			
5	OBTERO	ROYER PEREZ	17,616,550			
6	OBTERO	SALVADOR RODRIGUEZ	4,166,319			
7	OBTERO	JORGE GAITAN	1,117,794,723			
8	OBTERO	ALEXANDER BARAHONA	1,138,472,268			
9	OBTERO	FREDY ALEXIS MORA RIVERA	1,117,543,949			
10	OBTERO	SALOMON POVEDA LOZADA	17,615,757			
11	OBTERO	JOSE IZARDO CORDOBA	1,006,549,808			
12	OBTERO	ALFONSO ORTIZ ORTIZ	4,961,285			
13	OBTERO	JUAN MANUEL DIAZ	17,472,268			
14	OBTERO	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ ROJAS	16,550,994			

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florescia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

579

## INFORME DE PERSONAL DIARIO



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA						
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015						
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES						
FECHA DE REGISTRO:	15/12/2015						
ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS	
1	OBrero	JARVINTON GUILLERMO CANO	1,117,486,866				
2	OBrero	JOSE NECEN ESPINOSA MARTINEZ	1,118,472,184				
3	OBrero	DAVID FELIPE ALVERES	1,118,473,910				
4	OBrero	HERNAN DARIO PEREZ	1,118,471,300				
5	OBrero	LUIS EDUARDO CADENA GUTIERREZ	1,117,533,930				
6	OBrero	GIL RAMIREZ CAVIEDES	17,616,871				
7	OBrero	YUDIER SNEYDER SIERRA TARRENTES	1,117,531,977				
8	OBrero	EDGAR SABADIA RUIZ	17,652,746				
9							
10							
11							
12							
13							
14							

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



CELSON ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

572

## INFORME DE PERSONAL DIARIO



CELSON ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL, MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
INTERVENTORIA:	CELSON ANDRES ROJAS CLEVES					
FECHA DE REGISTRO:	16/12/2015					

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903			
2	MAESTRO	ROBERTO PIZO	17,640,176			
3	OBREO	GILBERTO CADENA	1,118,488,999			
4	OBREO	HARRISON CAPERA	1,118,472,635			
5	OBREO	ROYER PEREZ	17,616,550			
6	OBREO	SALVADOR RODRIGUEZ	4,166,319			
7	OBREO	JORGE GAITAN	1,117,794,723			
8	OBREO	FREDY ALEXIS MORA RIVERA	1,117,543,949			
9	OBREO	SALOMON POVEDA LOZADA	17,615,757			
10	OBREO	JOSE LIZARDO CORDOBA	1,006,549,808			
11	OBREO	ALFONSO ORTIZ ORTIZ	4,961,285			
12	OBREO	JUAN MANUEL DIAZ	17,472,268			
13	OBREO	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ ROJAS	16,550,994			
14	OBREO	JARVINTON GUILLERMO CANO	1,117,486,866			

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

07/3

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE PERSONAL DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA						
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015						
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES						
FECHA DE REGISTRO:	16/12/2015						

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	OBRAERO	JOSE NECEN ESPINOSA MARTINEZ	1,118,472,184			
2	OBRAERO	DAVID FELIPE ALVERES	1,118,473,910			
3	OBRAERO	HERNAN DARIO PEREZ	1,118,471,300			
4	OBRAERO	LUIS EDUARDO CADENA GUTIERREZ	1,117,533,930			
5	OBRAERO	GIL RAMIREZ CAVIEDES	17,616,871			
6	OBRAERO	YUDIER SNEYDER SIERRO TARRENTES	1,117,531,977			
7	OBRAERO	EDGAR SABADRA RUIZ	17,652,746			
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NTT 80.233.290

5/14

## INFORME DE PERSONAL DIARIO



CEL SO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
INTERVENTORIA:	CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES					
FECHA DE REGISTRO:	17/12/2015					
ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903			
2	MAESTRO	ROBERTO PIZO	17,640,176			
3	OBREIRO	GILBERTO CADENA	1,118,468,999			
4	OBREIRO	HARRISON CAPERA	1,118,472,635			
5	OBREIRO	ROYER PEREZ	17,616,550			
6	OBREIRO	SALVADOR RODRIGUEZ	4,166,319			
7	OBREIRO	JORGE GAITAN	1,117,794,723			
8	OBREIRO	FREDY ALEXIS MORA RIVERA	1,117,543,949			
9	OBREIRO	SALOMON POVEDA LOZADA	17,615,757			
10	OBREIRO	JOSE LIZARDO CORDOBA	1,006,549,808			
11	OBREIRO	ALFONSO ORTIZ ORTIZ	4,961,285			
12	OBREIRO	JUAN MANUEL DIAZ	17,472,268			
13	OBREIRO	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ ROJAS	16,550,994			
14	OBREIRO	JARVINTON GUILLERMO CANO	1,117,486,866			

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celso Rojas500@yahoo.com](mailto:celso Rojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

2015

# INFORME DE PERSONAL DIARIO



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES					
FECHA DE REGISTRO:	17/12/2015					

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	OBrero	JOSE NECEN ESPINOSA MARTINEZ	1,118,472,184			
2	OBrero	DAVID FELIPE ALVERES	1,118,473,910			
3	OBrero	HERNAN DARIO PEREZ	1,118,471,300			
4	OBrero	LUIS EDUARDO CADENA GUTIERREZ	1,117,533,930			
5	OBrero	GIL RAMIREZ CAVIEDES	17,616,871			
6	OBrero	YUDIER SNEYDER SIERRO TARRENTES	1,117,531,977			
7	OBrero	EDGAR SABADRA RUIZ	17,652,746			
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



**CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND

NTT 80.233.290

07/5

## INFORME DE PERSONAL DIARIO



**CELSO ANDRES ROJAS**  
**CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA						
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015						
INTERVENTORIA: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES						
FECHA DE REGISTRO:		18/12/2015				
ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903			
2	MAESTRO	ROBERTO PIZO	17,640,176			
3	OBRAERO	GILBERTO CADENA	1,118,468,999			
4	OBRAERO	HARRISON CAPERA	1,118,472,635			
5	OBRAERO	ROYER PEREZ	17,616,550			
6	OBRAERO	SALVADOR RODRIGUEZ	4,166,319			
7	OBRAERO	JORGE GAITAN	1,117,794,723			
8	OBRAERO	FREDY ALEXIS MORA RIVERA	1,117,543,949			
9	OBRAERO	SALOMON POVEDA LOZADA	17,615,757			
10	OBRAERO	JOSE LIZARDO CORDOBA	1,006,549,808			
11	OBRAERO	ALFONSO ORTIZ ORTIZ	4,961,285			
12	OBRAERO	JUAN MANUEL DIAZ	17,472,268			
13	OBRAERO	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ ROJAS	16,550,994			
14	OBRAERO	JARVINTON GUILLERMO CANO	1,117,486,866			

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

2014

# INFORME DE PERSONAL DIARIO



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL, MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES					
FECHA DE REGISTRO:	18/12/2015					

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	OBRERO	DAVID FELIPE ALVERES	1,118,473,910			
2	OBRERO	HERNAN DARIO PEREZ	1,118,471,300			
3	OBRERO	LUIS EDUARDO CADENA GUTIERREZ	1,117,533,930			
4	OBRERO	GIL RAMIREZ CAVIEDES	17,616,871			
5	OBRERO	YUDIER SNEYDER SIERRO TARRENTES	1,117,531,977			
6	OBRERO	EDGAR SABADRA RUIZ	17,652,746			
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

572

## INFORME DE PERSONAL DIARIO

CEL SO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
INTERVENTORIA:	CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES					
FECHA DE REGISTRO:	19/12/2015					
ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903			
2	MAESTRO	ROBERTO PIZO	17,640,176			
3	OBRERO	GILBERTO CADENA	1,118,468,999			
4	OBRERO	HARRISON CAPERA	1,118,472,635			
5	OBRERO	ROYER PEREZ	17,616,550			
6	OBRERO	SALVADOR RODRIGUEZ	4,166,319			
7	OBRERO	JORGE GAITAN	1,117,794,723			
8	OBRERO	FREDY ALEXIS MORA RIVERA	1,117,543,949			
9	OBRERO	SALOMON POVEDA LOZADA	17,615,757			
10	OBRERO	JOSE LIZARDO CORDOBA	1,006,549,808			
11	OBRERO	ALFONSO ORTIZ ORTIZ	4,961,285			
12	OBRERO	JUAN MANUEL DIAZ	17,472,268			
13	OBRERO	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ ROJAS	16,550,994			
14	OBRERO	JARVINTON GUILLERMO CANO	1,117,486,866			

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com  
Florencia - Caquetá



**CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80,233,290

579

## INFORME DE PERSONAL DIARIO



**CELSO ANDRES ROJAS**  
**CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES					
FECHA DE REGISTRO:	19/12/2015					
ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	OBRAERO	DAVID FELIPE ALVERES	1,118,473,910			
2	OBRAERO	HERNAN DARIO PEREZ	1,118,471,300			
3	OBRAERO	LUIS EDUARDO CADENA GUTIERREZ	1,117,533,930			
4	OBRAERO	GIL RAMIREZ CAVIEDES	17,616,871			
5	OBRAERO	YUDIER SNEYDER SIERRO TARRENTES	1,117,531,977			
6	OBRAERO	EDGAR SABADRA RUIZ	17,652,746			
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

0000

## INFORME DE PERSONAL DIARIO

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES					
FECHA DE REGISTRO:	21/12/2015					

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903			
2	MAESTRO	ROBERTO PIZO	17,640,176			
3	OBREO	GILBERTO CADENA	1,118,468,999			
4	OBREO	HARRISON CAPERA	1,118,472,635			
5	OBREO	ROYER PEREZ	17,616,550			
6	OBREO	SALVADOR RODRIGUEZ	4,166,319			
7	OBREO	JORGE GAITAN	1,117,794,723			
8	OBREO	FREDY ALEXIS MORA RIVERA	1,117,543,949			
9	OBREO	SALOMON POVEDA LOZADA	17,615,757			
10	OBREO	JOSE LIZARDO CORDOBA	1,006,549,808			
11	OBREO	ALFONSO ORTIZ ORTIZ	4,961,285			
12	OBREO	JUAN MANUEL DIAZ	17,472,268			
13	OBREO	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ ROJAS	16,550,994			
14	OBREO	JARVINTON GUILLERMO CANO	1,117,486,866			

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

287

## INFORME DE PERSONAL DIARIO



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL, MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES					
FECHA DE REGISTRO:	21/12/2015					

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	OBROERO	DAVID FELIPE ALVERES	1,118,473,910			
2	OBROERO	HERNAN DARIO PEREZ	1,118,471,300			
3	OBROERO	LUIS EDUARDO CADENA GUTIERREZ	1,117,533,930			
4	OBROERO	GIL RAMIREZ CAVIEDES	17,616,871			
5	OBROERO	YUDIER SNEYDER SIERRO TARRENTES	1,117,531,977			
6	OBROERO	EDGAR SABADRA RUIZ	17,652,746			
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

5382

## INFORME DE PERSONAL DIARIO



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL, MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES					
FECHA DE REGISTRO:	22/12/2015					

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903			
2	MAESTRO	ROBERTO PIZO	17,640,176			
3	OBREO	GILBERTO CADENA	1,118,468,999			
4	OBREO	HARRISON CAPERA	1,118,472,635			
5	OBREO	ROYER PEREZ	17,616,550			
6	OBREO	JORGE GAITAN	1,117,794,723			
7	OBREO	FREDY ALEXIS MORA RIVERA	1,117,543,949			
8	OBREO	SALOMON POVEDA LOZADA	17,615,757			
9	OBREO	JOSE LIZARDO CORDOBA	1,006,549,808			
10	OBREO	HERNAN DARIO PEREZ	1,118,471,300			
11	OBREO	LUIS EDUARDO CADENA GUTIERREZ	1,117,533,930			
12	OBREO	GIL RAMIREZ CAVIEDES	17,616,871			
13	OBREO					
14	OBREO					

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE PERSONAL DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES					
FECHA DE REGISTRO:	23/12/2015					

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903			
2	MAESTRO	ROBERTO PIZO	17,640,176			
3	OBrero	GILBERTO CADENA	1,118,468,999			
4	OBrero	HARRISON CAPERA	1,118,472,635			
5	OBrero	ROYER PEREZ	17,616,550			
6	OBrero	JORGE GAITAN	1,117,794,723			
7	OBrero	FREDY ALEXIS MORA RIVERA	1,117,543,949			
8	OBrero	SALOMON POVEDA LOZADA	17,615,757			
9	OBrero	JOSE LIZARDO CORDOBA	1,006,549,808			
10	OBrero	HERNAN DARIO PEREZ	1,118,471,300			
11	OBrero	LUIS EDUARDO CADENA GUTIERREZ	1,117,533,930			
12	OBrero	GIL RAMIREZ CAVIEDES	17,616,871			
13	OBrero					
14	OBrero					

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

524

## FORMATO DE REPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO.



## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

<b>PROYECTO:</b>		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA			
<b>CONTRATISTA:</b>		UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015			
<b>INTERVENTORIA:</b>		CELSO ANDRES ROJAS CLEVES			
<b>FECHA DE REGISTRO</b>		01/12/2015			
ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1		MEZCLADORA			D
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotación se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

5286

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

529

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	02/12/2015

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	1117543949	PULIDORA	7:00 a. m.	5:00 p. m.	O
2		MEZCLADORA			D
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotacion se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florenia - Caquetá

1588



## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	03/12/2015

D	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE CERRADA	ANOTACION
1	1117543949	PULIDORA	7:00 a. m.	5:00 p. m.	O
2		MEZCLADORA			D
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotacion se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

2019

## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	04/12/2015

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1		PULIDORA			D
2	17472268	MEZCLADORA	2:00 p. m.	5:00 p. m.	O
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotacion se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

590

## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	05/12/2015

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	17472268	MEZCLADORA	7:00 p. m.	12:00 M	O
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotacion se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o inoperante (I) o en Reparación ( R ).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florescia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

590

INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO					CELSO ANDRES ROJAS CLEVES INGENIERO CIVIL MSC T.P.: 25202-096642CND	
PROYECTO:					CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA	
CONTRATISTA:					UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015	
INTERVENIENTORIA:					CELSO ANDRES ROJAS CLEVES	
FECHA DE REGISTRO					05/12/2015	
ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION	
1	17472268	MEZCLADORA	7:00 p. m.	12:00 M	O	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

NOTA: En la casilla anotacion se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florenceia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

397

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	07/12/2015

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	1033880969	RETROEXCAVADORA	2:00 p. m.	6:30 p. m.	O
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotación se debe anotar si el equipo está disponible (D), operando (O) o inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

2392

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	08/12/2015

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	108380969	RETROEXCAVADORA	7:00 a. m.	5:00 p. m.	O
2	17472268	MEZCLADORA	1:00 p. m.	5:00 p. m.	O
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotacion se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





**CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

25/2

**CELSO ANDRES ROJAS**  
**CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	09/12/2015

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	1083890969	RETROEXCAVADORA	7:00 a. m.	5:00 p. m.	O
2	17472268	MEZCLADORA	7:00 a. m.	5:00 p. m.	O
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotación se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá







CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

2014

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	10/12/2015

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	1083890969	RETROEXCAVADORA	7:00 a. m.	12:00 M	O
2	17472268	MEZCLADORA	7:00 a. m.	5:00 p. m.	O
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotación se debe anotar si el equipo está disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

2020

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA				
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015				
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES				
FECHA DE REGISTRO	11/12/2015				

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	1083890969	RETROEXCAVADORA	7:00 a. m.	10:00 a. m.	O
2	17472268	MEZCLADORA	7:00 a. m.	5:00 p. m.	O
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotacion se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

2016

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	12/12/2015

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	1083890969	RETROEXCAVADORA	7:00 a. m.	5:00 p. m.	O
2	17472268	MEZCLADORA	7:00 a. m.	12:00:00 m	O
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotación se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florenceia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

5597

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	14/12/2015

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	1118473986	MEZCLADORA	9:00 a. m.	11:00 a. m.	O
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotación se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá







CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

098

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	15/12/2015

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	1118473986	MEZCLADORA	10:00 a. m.	11:00 a. m.	O
2	1083890969	RETROEXCAVADORA	10:00 a. m.	11:00 a. m.	O
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotacion se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



579



## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C - SAN JOSE DEL FRAGUA
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
<b>INTERVENTORIA:</b>	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
<b>FECHA DE REGISTRO</b>	16/12/2015

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	17616871	PULIDORA	7:00 a. m.	5:00 p. m.	O
2	17652746	MEZCLADORA	2:00 p. m.	3:00 p. m.	O
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotación se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------





CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

028

CEL SO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	17/12/2015

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	17652746	MEZCLADORA	2:00 p. m.	5:00 p. m.	O
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotacion se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

507

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	18/12/2015

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	17652746	MEZCLADORA	9:00 a. m.	5:00 p. m.	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotacion se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá







CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

602

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	19/12/2015

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	17652746	MEZCLADORA	7:00 a. m.	12:00 M	O
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotación se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o inoperante (I) o en reparación (R).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

T.P.: 25202-096642CND

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	21/12/2015

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	17652746	MEZCLADORA	1:00 p. m.	5:00 p. m.	O
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotación se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

614

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	22/12/2015

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	17652746	MEZCLADORA	1:00 p. m.	3:00 p. m.	O
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotacion se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celso Rojas500@yahoo.com](mailto:celso Rojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSON ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

028

CELSON ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSON ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	23/12/2015

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	17652746	MEZCLADORA	1:00 p. m.	5:00 p. m.	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotacion se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá







**CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND

**NIT 80.233.290**

## **INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES**





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



NIT 80.233.290

1307

## INFORME DIARIO DE OBRA

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C. SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015		
INTERVENTORIA:	CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES		
FECHA DE REGISTRO:	01/12/2015		
DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA:			
RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:			
EN HORAS DE LA MAÑANA SE ADELANTARON EXCAVACIONES MANUALES EN LAS ZAPATAS B6, B7 Y B2			
SE CORTO ACERO			
EN HORAS DE LA TARDE SE SUSPENDIO LAS EXCAVACIONES A CAUSA DE LAS INTENSAS LLUVIAS			
SE REANUDO LAS EXCAVACIONES UNA VEZ PASARON LAS LLUVIAS			
PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR:			
ADELANTAR EXCAVACIONES			
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
EXCAVACIONES MANUALES			
REGISTRO		APROBO	
REGISTRO		APROBO	
		HOJA 1 DE	

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

978

## INFORME DIARIO DE OBRA



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	01/12/2015

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	EXCAVACION DE ZAPATAS B2, B7 Y B8				UNIDAD DE PAGO:	
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		ANOTACION
2.5	2.5	1.25	M3	7.81		
2.5	2.5	2	M3	12.5		
2.5	2.5	1.2	M3	7.5		

ITEM					UNIDAD DE PAGO:	
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		ANOTACION

ITEM					UNIDAD DE PAGO:	
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		ANOTACION

ITEM					UNIDAD DE PAGO:	
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		ANOTACION

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de adarlon y diligenciar formato de esquema

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celso Rojas00@yahoo.com](mailto:celso Rojas00@yahoo.com)

Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

889

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá







CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

670

## INFORME DIARIO DE OBRA

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015		
INTERVENIENTOR:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES		
FECHA DE REGISTRO:	02/12/2015		
DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA:			
RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:	HUBO VISITA POR PARTE DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA		
EN EL TRANSURSO DE LA MAÑANA SE PROCEDIO A SACAR EL AGUA QUE SE HABIA RETENIDO EN LAS EXCAVACIONES, SE CONTINUARON CON EXCAVACIONES MANUALES EN LAS ZAPATAS B6, B7 Y B2, DEBIDO A LA HUMEDAD DEL SUELO SE DIFICULTA EL AVANCE NORMAL DE LAS EXCAVACIONES			
SE CORTARON ACEROS PARA LAS PARRILLAS			
A LAS 12 DEL MEDIO DIA LLEGO MATERIAL (ACERO) Y SE PROCEDIO A DESCARGARLO			
SE CONCLUYERON LAS EXCAVACIONES B6, B7 Y B2, SE PERDIO LA EXCAVACION DE LA ZAPATA F3.			
PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR			
FUNDIR SOLADOS, CORTAR ACERO PARA LAS PARRILLAS DE LAS ZAPATAS			
TERMINAR EXCAVACIONES DE LA ZAPATA F3			
REGISTRO FOTOGRAFICO			
LIMPIEZA DE AGUAS RETENIDAS			CONTINUAN EXCAVACIONES MANUALES
REGISTRO	APROBO		
REGISTRO	APROBO		
HOJA 1 DE			

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florescia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

677

## INFORME DIARIO DE OBRA



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	02/12/2015

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	EXCAV. MANUAL ZAPATAS B6, B7 Y B2				UNIDAD DE PAGO:	
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		ANOTACION
2.5	2.5	1.6	M3	1.03		
2.5	2.5	2.15	M3	13.43		
2.5	2.5	2.15	M3	13.43		

ITEM	EXCAV. MANUAL ZAPATA F3				UNIDAD DE PAGO:	
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		ANOTACION
2.5	1.2	0.8	M3	2.4		

ITEM	EXCAV. MANUAL ZAPATA F3				UNIDAD DE PAGO:	
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		ANOTACION

ITEM	EXCAV. MANUAL ZAPATA F3				UNIDAD DE PAGO:	
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		ANOTACION

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligendar formato de esquema

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: celso@celso.com

Florencia - Caquetá








CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

5912

<b>INFORME DIARIO DE OBRA</b>		<b>CELSO ANDRES ROJAS CLEVES</b> INGENIERO CIVIL MSC T.P.: 25202-096642CND
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C. - SAN JOSE DEL FRAGUA	
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015	
<b>INTERVENTORIA:</b>	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES	
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	03/12/2015	
<b>DÍAS DESDE EL INICIO DE OBRA:</b>		
<b>RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:</b>	EXCAVACIONES MANUALES EN ZAPATAS B6 Y F3 RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE MANUALMENTE SE CORTO ACERO #6 PARA AMARRE DE PARRILLAS DE LAS ZAPATAS SE AMARRARON PARRILLAS CON VARILLA #6 PARA ZAPATAS SUPERIORES SE EMPEZO A AMARRAR PEDESTALES <b>PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR</b>  AMARRE DE PEDESTALES Y PARRILLAS FUNDIR SOLAOS EXCAVACIONES CON RETROEXCAVADORA	
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>		
		
EXCAVACIONES MANUALES PARA ZAPATAS	CORTE DE ACERO	AMARRE DE PARRILLAS
REGISTRO	APROBO	APROBO
REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

## INFORME DIARIO DE OBRA



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	03/12/2015

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	EXCAVACION ZAPATAS B6 Y F3				UNIDAD DE PAGO:	
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	ANOTACION	
2.5	2.5	2.15	M3	13.43		
2.5	2.5	1.7	M3	10.62		

ITEM	PARRILLA INFERIOR ZAPATA CORTE F				UNIDAD DE PAGO:	
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	ANOTACION	
2.4	2.4	X46 UNID/VARILLA	KG	248.4KG C/U	SON 5 PARRILLAS VARILLA #6 INCLUYE ESQUEMA	
2.4	2.4	X58 UNID/VARILLA	KG	217.1KG C/U	SON 2 PARRILLAS #5 INCLUYE ESQUEMA	

ITEM					UNIDAD DE PAGO:	
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	ANOTACION	

ITEM					UNIDAD DE PAGO:	
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	ANOTACION	

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: celso Rojas00@yahoo.com

Florencia - Caquetá







CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



NIT 80.233.290

574

## INFORME DIARIO DE OBRA



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015		
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES		
FECHA DE REGISTRO:	04/12/2015		
DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA:			
RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:			
SE AMARRAN PEDESTALES			
SE ARMARON LAS ZAPATAS F1 Y F7 SE FUNDIERON			
SE TERMINO LA EXCAVACION MANUAL DE LA ZAPATA F3			
SE DESCARGO ACERO NUMERO 3 (ENTRADA DE MATERIAL)			
PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR			
ARMAR PEDESTALES Y PARRILLAS			
FUNDIR SOLAO ZAPATA F3			
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
REGISTRO		APROBADO	
REGISTRO		APROBADO	
HOJA 1 DE		HOJA 1 DE	

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

345

## INFORME DIARIO DE OBRA

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C - SAN JOSE	LAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015	
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES	
FECHA DE REGISTRO:	04/12/2015	

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	PEDESTALES			UNIDAD DE PAGO:			KG	ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN				
4		18 VARILLAS X PEDESTAL	KG	162				VARILLA #6 PARA LOS PEDESTALES. VER ESQUEMA
4		18 VARILLAS X PEDESTAL	KG	162				VARILLA #6 PARA LOS PEDESTALES. VER ESQUEMA

ITEM	FLEJES			UNIDAD DE PAGO:			KG	ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN				
6.1		VARILLA #3	KG	3.41				PESO TOTAL DE LOS FLEJES PARA CADA PEDESTAL. VER ESQUEMA

ITEM	ZAPATAS F1 Y F7 SUPERIOR			UNIDAD DE PAGO:			KG	ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN				
2.4	2.4	VARILLA #5		114.8				PARRILLA SUPERIOR F1. VER ESQUEMA
2.4	2.4	VARILLA #5		114.8				PARRILLA SUPERIOR F1. VER ESQUEMA

ITEM	FUNDICION DE ZAPATAS F1 Y F7			UNIDAD DE PAGO:			M3	ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN				
2.5	2.5	0.4		2.5				
2.5	2.5	0.4		2.5				

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas00@yahoo.com

Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

646

INFORME DIARIO DE OBRA			CELSO ANDRES ROJAS CLEVES INGENIERO CIVIL MSC T.P.: 25202-096642CND
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015		
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES		
FECHA DE REGISTRO:	05/12/2015		
DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA:			
RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:			
SE FUNDIERON SOLAOS B1, B6, B7 Y F3			
SE FUNDIO BASE DEL PEDESTAL F1			
SE AMARRO PEDESTAL CON FIELES			
PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR			
AMARRAR PEDESTALES Y FUNDIR ZAPATAS			
REGISTRO FOTOGRAFICO			
FUNDICION DE SOLAOS			
REGISTRO		APROBO	
REGISTRO		APROBO	
			HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celso Rojas500@yahoo.com](mailto:celso Rojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



# INFORME DIARIO DE OBRA



<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
<b>INTERVENTORIA:</b>	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	05/12/2015

## CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD DE PAGO:	M3	ANOTACION
	2.5	2.5	0.15		0.93			
	2.5	2.5	0.15		0.93			
	2.5	2.5	0.15		0.93			

ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD DE PAGO:	M3	ANOTACION
	2.5	2.5	0.15		0.93			
	2.5	2.5	0.15		0.93			

ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD DE PAGO:	KG	ANOTACION
	4			18 VARILLAS X PEDESTAL	162	VARILLA #6 PARA PEDESTAL		

ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD DE PAGO:	KG	ANOTACION
	1.9			X18 FLEJES	19.1	VER ESQUEMA		
	2.3			X19 FLEJES	24.4	VER ESQUEMA		
	1.9			X18 FLEJES	19.1	VER ESQUEMA		

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema







CELSO ANDRÉS ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

678

## INFORME DIARIO DE OBRA

CELSO ANDRÉS ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015		
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRÉS ROJAS CLEVES		
FECHA DE REGISTRO:	07/12/2015		
DÍAS DESDE EL INICIO DE OBRA:			
RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:			
CORTE DE ACERO #6, #5 Y #3 AMARRE DE PEDESTALES FIGURADO DE FLEJES CON ACERO #3 EN HORAS DE LA TARDE SIENDO LAS 2 p.m. LLEGO EL OPERARIO DE LA RETROEXCAVADORA, MOVIO MATERIAL SOBRIANTE DE LAS ZAPATAS, ADELANTANDO EXCAVACIONES EN EL AREA DEL CAMERINO			
PRÓXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR			
EXCAVACIONES EN EL EJE B, FUNDICION DE ZAPATAS			
REGISTRO FOTOGRAFICO			
REMOCION DE MATERIAL SOBRIANTE			
REGISTRO	APROBO		
REGISTRO	APROBO		
			HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

677

## INFORME DIARIO DE OBRA



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	07/12/2015

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	excavacion camarin			UNIDAD DE PAGO	in3	ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
22.7	4.7	0.9	M3	96M3		

ITEM	PEDESTALES CON FLEJES			UNIDAD DE PAGO:		ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
4		224.6 KG/C/UX 2		449.2 KG		PEDESTAL CON FLEJES PESO TOTAL

ITEM				UNIDAD DE PAGO:		ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		

ITEM				UNIDAD DE PAGO:		ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema

REGISTRO





APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celso Rojas00@yahoo.com](mailto:celso Rojas00@yahoo.com)

Florencia - Caquetá



<b>INFORME DIARIO DE OBRA</b>		<b>CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES</b> <b>INGENIERO CIVIL MSC</b> T.P.: 25202-096642CND	
<b>PROYECTO:</b> CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C. - SAN JOSE DEL FRAGUA			
<b>CONTRATISTA:</b> UNION TEMPORAL C.I.C. SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015			
<b>INTERVENTORIA:</b> CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES			
<b>FECHA DE REGISTRO:</b> 08/12/2015			
<b>DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA:</b>			
<b>RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:</b>			
SE CORRIE DESCUADRE DE LAS ZAPATA B7 Y B6 CON RESPECTO A LAS ZAPATAS B1 Y B2 UNA VEZ ALINEADAS SE PROCEDE A REALIZAR LA EXCAVACION DE LA ZAPATA B3, B4 Y B5 SE INSTALA Y FUNDE B1 Y B7 CON SUS RESPECTIVOS PEDESTALES CORTE Y FIGURADO DE ACERO #6, #5 Y #3.			
<b>PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR</b>			
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>			
			
<b>TRAZAMIENTO DE EJES</b>	<b>INSTALACION DE PARRILLAS Y PEDESTALES PARA FUNDICION</b>	<b>FUNDICION DE PARRILLAS</b>	
<b>REGISTRO</b>	<b>APROBO</b>		
<b>REGISTRO</b>	<b>APROBO</b>		
			<b>HOJA 1 DE</b>



# INFORME DIARIO DE OBRA



<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C - SAN JOSE DEL FRAGUA
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
<b>INTERVENTORIA:</b>	CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	08/12/2015

## CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	PEDESTALES Y FLEJES				UNIDAD DE PAGO	KG	ANOTACION
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
4			224.6 KG C/U	KG	224.6 KG		VER ESQUEMA
4			224.6 KG C/U	KG	224.6 KG		VER ESQUEMA

ITEM	FUNDICION PEDESTALES PARRILLA				UNIDAD DE PAGO	M3	ANOTACION
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
2.5			0.4	M3	2.5		
2.5			0.4	M3	2.5		

ITEM	PARRILLA INFERIOR				UNIDAD DE PAGO	KG	ANOTACION
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
2.4		2.4	259.2 KG C/U	KG	259.2 KG		VER ESQUEMA
2.4		2.4	259.2 KG C/U	KG	259.2 KG		VER ESQUEMA

ITEM	PARRILLA SUPERIOR				UNIDAD DE PAGO	KG	ANOTACION
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
2.3		2.3	114.8 KG C/U	KG	114.8 KG		VER ESQUEMA
2.3		2.3	114.8 KG C/U	KG	114.8 KG		VER ESQUEMA

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de adlaracion y diligendar formato de esquema

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: celso Rojas@yaho.com

Florencia - Caquetá










CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

622

<b>INFORME DIARIO DE OBRA</b>		<b>CELSO ANDRES ROJAS CLEVES</b> INGENIERO CIVIL MSC T.P.: 25202-096642CND
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C - SAN JOSE DEL FRAGUA	
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015	
<b>INTERVENTORIA:</b>	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES	
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	09/12/2015	
<b>DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA:</b>		
<b>RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:</b>	SE FUNDIERON SOLAOS B4 Y B5 SE MONTARON PEDESTALES Y ZAPATAS EN EL EJE F3 Y F5 SE AMARRARON PEDESTALES CORTE DE ACERO #6 Y #3 FIGURADO DE FIELES EXCAVACION RETROEXCAVADORA AREA DE OFICINAS PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR	
<b>EXCAVACIONES</b>		
<b>FUNDIR PEDESTALES</b>		
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>		
		
<b>REGISTRO</b>	<b>APROBO</b>	<b>APROBO</b>
<b>REGISTRO</b>	<b>APROBO</b>	<b>HOJA 1 DE</b>

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



# INFORME DIARIO DE OBRA



<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
<b>INTERVENTORIA:</b>	CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	09/12/2015

## CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	FUNDICION DE SOLAOS B4 Y B5				UNIDAD DE PAGO	M3	ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN			
2.5	2.5	0.15	M3	0.93			
2.5	2.5	0.15	M3	0.93			

ITEM	FUNDICION DE ZAPATAS F3 Y F5				UNIDAD DE PAGO	M3	ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN			
2.5	2.5	0.4	M3	2.5			
2.5	2.5	0.4	M3	2.5			

ITEM	PEDESTALES Y FLEJES				UNIDAD DE PAGO	KG	ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN			
4		224.6 KG C/U	KG	224.6 KG			INCLUYEN PEDESTALES Y FLEJES PESO TOTAL
4		224.6 KG C/U	KG	224.6 KG			INCLUYEN PEDESTALES Y FLEJES PESO TOTAL

ITEM	PARRILLA SUPERIOR				UNIDAD DE PAGO	KG	ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN			
2.3	2.3	114.8 KG C/U	KG	114.8 KG			
2.3	2.3	114.8 KG C/U	KG	114.8 KG			

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema




REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Florencia - Caquetá



		<b>CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES</b> <b>INGENIERO CIVIL MSC</b> T.P.: 25202-096642CND	
<h2>INFORME DIARIO DE OBRA</h2>			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA		
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA, 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015		
<b>INTERVENTORIA:</b>	CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES		
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	10/12/2015		
<b>DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA:</b>			
<b>RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:</b>			
SE FUNDE BASE DE PEDESTAL B1 ZAPATA Y PEDESTAL F4, F6 EXCAVACION AREA DE OFICINAS Y FUNDEN ZAPATA Y PEDESTAL F2 CORTE Y FIGURADO DE ACERO			
<b>PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR</b>			
FUNDIR ZAPATAS Y PEDESTALES			
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>			
			
FUNDICION DE PEDESTALES B1		EXCAVACIONES EN AREA DE OFICINAS	
REGISTRO		APROBO	
REGISTRO		APROBO	
			HOJA 1 DE 1





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

## INFORME DIARIO DE OBRA

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	10/12/2015

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

PEDESTALES Y FLEJES				UNIDAD DE PAGO		ANOTACION
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
	4		224.6 KG C/U	KG	224.6 KG	
	4		224.6 KG C/U	KG	224.6 KG	
	4		224.6 KG C/U	KG	224.6 KG	

FUNDICION PEDESTALES Y PARRILLA				UNIDAD DE PAGO		ANOTACION
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
	2.5	2.5	0.4	M3	2.5	
	2.5	2.5	0.4	M3	2.5	
	2.5	2.5	0.4	M3	2.5	

PARRILLA INFERIOR				UNIDAD DE PAGO		ANOTACION
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
	2.4	2.4	259.2 KG C/U	KG	259.2 KG	
	2.4	2.4	259.2 KG C/U	KG	259.2 KG	
	2.4	2.4	259.2 KG C/U	KG	259.2 KG	

PARRILLA SUPERIOR				UNIDAD DE PAGO		ANOTACION
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
	2.3	2.3	114.8 KG C/U	KG	114.8 KG	
	2.3	2.3	114.8 KG C/U	KG	114.8 KG	
	2.3	2.3	114.8 KG C/U	KG	114.8 KG	

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema

REGISTRO

APROBO


HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: celso Rojas500@yahoo.com

Florencia - Caquetá







**T.P.: 25202-096642CND**



<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA	
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015	
<b>INTERVENTORIA:</b>	CELSO ANDRES ROJAS CIEVES	
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	10/12/2015	

ITEM	FUNCION DE BASE DE PEDESTALES B1			UNIDAD DE PAGO	KG	ANOTACION
	LARGO	ANCHO	ALTO			
	0.6	0.7	0.95	M3	0.39	

[illegible][illegible][illegible]

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema




APROBO

HOJA 1 DE 1

Cellular: 313 252 6581 E-mail: [celsorajassou@yahoo.com](mailto:celsorajassou@yahoo.com)

## Florencia - Caquetá



 <b>INFORME DIARIO DE OBRA</b>		<b>CELSO ANDRES ROJAS CLEVES</b> <b>INGENIERO CIVIL MSC</b> T.P.: 25202-096642CND	
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C. - SAN JOSE DEL FRAGUA		
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015		
<b>INTERVENTORIA:</b>	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES		
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	11/12/2015		
<b>DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA:</b>			
<b>RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:</b>	SE FUNDIO PARRILLA Y PEDESTAL DEL EJE B ZAPATAS # 3, H2 Y H6 SE ARMAN SUS RESPECTIVAS PARRILLAS Y PEDESALES FUNDICION DE SOLAOS DEL EJE B H5 Y H4		
<b>PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR:</b>	FUNDIR Y ARMAR PARRILLAS DEL EJE B ZAPATAS # 5 Y H4 MOVIMIENTO DE MATERIAL SOBRIANTE		
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>			
			
FUNDICION DE PARRILLA Y PEDESTAL DEL EJE B ZAPATA 2, 3 Y 6	PARRILLAS PARA PEDESTALES		
REGISTRO	APROBO		
REGISTRO	APROBO		
			HOJA 1 DE





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DIARIO DE OBRA

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	11/12/2015

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

PEDESTALES Y FLEJES				UNIDAD DE PAGO	KG	ANOTACION
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
	4		224.6 KG C/U	KG	224.6 KG	INCLUYE EL PESO DE PEDESTAL Y FLEJES
	4		224.6 KG C/U	KG	224.6 KG	INCLUYE EL PESO DE PEDESTAL Y FLEJES
	4		224.6 KG C/U	KG	224.6 KG	INCLUYE EL PESO DE PEDESTAL Y FLEJES

FUNDICION PEDESTAL Y PARRILLA				UNIDAD DE PAGO	M3	ANOTACION
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
	2.5	2.5	0.4	M3	2.5	
	2.5	2.5	0.4	M3	2.5	
	2.5	2.5	0.4	M3	2.5	

PARRILLA INFERIOR				UNIDAD DE PAGO	KG	ANOTACION
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
	2.4	2.4	259.2 KG C/U	KG	259.2 KG	
	2.4	2.4	259.2 KG C/U	KG	259.2 KG	
	2.4	2.4	259.2 KG C/U	KG	259.2 KG	

PARRILLA SUPERIOR				UNIDAD DE PAGO	KG	ANOTACION
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
	2.3	2.3	114.8 KG C/U	KG	114.8 KG	
	2.3	2.3	114.8 KG C/U	KG	114.8 KG	
	2.3	2.3	114.8 KG C/U	KG	114.8 KG	

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celso Rojas500@yahoo.com](mailto:celso Rojas500@yahoo.com)

Florencia - Caquetá



**CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

<b>INFORME DIARIO DE OBRA</b>			<b>CELSO ANDRES ROJAS CLEVES</b> <b>INGENIERO CIVIL MSC</b> T.P.: 25202-096642CND
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA		
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015		
<b>INTERVENTORIA:</b>	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES		
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	11/12/2015		
<b>DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA:</b>			
<b>RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:</b>	SE FUNDEN PARRILLAS Y PEDESTALES DEL EJE B ZAPATAS B5 Y B6 SE INICIA TOMA DE NIVELES PARA EJE Y D MOVIMIENTO DE MATERIAL CON RETROEXCAVADORA		
<b>PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR</b>	EXCAVACION Y FUNDICION DE SOLAOS		
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>			
<b>FUNDICION DE PARRILLAS Y PEDESTALES EJE B ZAPATAS B5 Y B6</b>			
<b>REGISTRO</b>	<b>APROBO</b>		
<b>REGISTRO</b>	<b>APROBO</b>		
			<b>HOJA 1 DE</b>

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

## INFORME DIARIO DE OBRA



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	12/12/2015

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	FUNDICION DE ZAPATAS B4 Y B5				UNIDAD DE PAGO
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN
	2.5	2.5	0.4	M3	2.5
	2.5	2.5	0.4	M3	2.5

ITEM	PARRILLA INFERIOR				UNIDAD DE PAGO
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN
	2.4	2.4	259.2 KG C/U	KG	259.2 KG
	2.4	2.4	217.1 KG C/U	KG	217.1 KG

ITEM	PARRILLA SUPERIOR				UNIDAD DE PAGO
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN
	2.3	2.3	114.8 KG C/U	KG	114.8 KG
	2.3	2.3	114.8 KG C/U	KG	114.8 KG

ITEM					UNIDAD DE PAGO
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 0381 E-mail: celso Rojas00@yahoo.com

Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEYES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

## INFORME DIARIO DE OBRA

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEYES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C - SAN JOSE DEL FRAGUA		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015		
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEYES		
FECHA DE REGISTRO:	14/12/2015		
DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA:			
RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:			
SE HICIERON ACTIVIDADES DE EXCAVACION MANUAL EN VIGAS DE CIMENTACION EN EL EJE F			
FIGURADO DE ACERO #5 PARA LAS VIGAS DE CIMENTACION EJE F			
SE FUNDIO BASE DE PEDESTAL B2			
SE ARMARON PARRILLAS INFERIORES PARA ZAPATAS DEL EJE E			
PRÓXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR			
INSTALACION DE VIGAS			
EXCAVACIONES			
CORTE DE ACERO FIGURADO			
FUNDIR SOLAOS			
REGISTRO FOTOGRAFICO			
EXCAVACION MANUAL DE VIGAS DE CIMENTACION EN EL EJE F		PARRILLAS INFERIORES PARA ZAPATAS EJE E	
REGISTRO		APROBO	
REGISTRO		APROBO	
		HOJA 1 DE	

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



# INFORME DIARIO DE OBRA

<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
<b>INTERVENTORIA:</b>	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	14/12/2015

## CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	PARRILSEJE E Y C			UNIDAD DE PAGO KG		ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	VER ESQUEMA	
1.5	1.5	61.1 KG C/UX 7	KG	427.7 KG		


ITEM	VIGA DE CIMENTACION CON FLEJES			UNIDAD DE PAGO KG		ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	VER ESQUEMA	
6		110.6 KG C/UX 4	KG	443.4 KG		

ITEM	PARRILLA INFERIOR			UNIDAD DE PAGO KG		ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
0.7	0.06	0.95 MTS	M3	0.39 M3		

ITEM	PARRILLA SUPERIOR			UNIDAD DE PAGO KG		ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
18.4	0.4	0.6	M3	4.4 M3		

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema





**T.P.: 25202-096642CND**



**PROYECTO:** CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA

**CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015

**INTERVENTORIA:** CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

SEGRETO	15/12/2015	FÉCHA DE REGISTRO:
---------	------------	--------------------

DÍAS DESDE EL INICIO DE OBRA:

## RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

SE ARMAN PARRILLAS INFERIORES DE LEJE Y C

EXCAVACION MANUAL

SE FUNDEN SOLAOS DE VIGA DE CIMENTACION FIE E.

**FIGURADO Y CORTE DE ACERO**

DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS SE CANCELA EL TRABAJO EN EL FRONTE DE OBRA Y SE DEDICA A CORTE DE ACERO DENTRO DE LA CAUSA

## PRÓXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

## EXCAVACIONES DE VIGAS

## MONTAJE DE VIGAS

**CORTE Y FIGURADO DE ACERO**

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

## REGISTRO

APROBO

## REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celso Rojas500@yahoo.com](mailto:celso Rojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

## INFORME DIARIO DE OBRA



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL, MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	15/12/2015

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	PARRILLAS EJE F Y C			UNIDAD DE PAGO	KG	ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		

1,5	1,5	61.1 KG C/U X2	KG	122.2 KG	VER ESQUEMA	
-----	-----	----------------	----	----------	-------------	--

ITEM	SOLAOS VIGA DE CIMENTACION EJE F			UNIDAD DE PAGO	M3	ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		

18.4	0.4	0.1	M3	0.73 M3	FUNDICION DE SOLAO EJE F VIGA CIMENTACION	
------	-----	-----	----	---------	---	--

ITEM	PARRILLA INFERIOR			UNIDAD DE PAGO	M3	ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		

22.2	0.4	0.6	KG	5.3 M3	EXCAV. MANUAL VIGA CIMENTACION EJE D	
------	-----	-----	----	--------	--------------------------------------	--

ITEM	PARRILLA SUPERIOR			UNIDAD DE PAGO	KG	ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		

2.3	2.3	114.8 KG C/U	KG	114.8 KG		
-----	-----	--------------	----	----------	--	--

2.3	2.3	114.8 KG C/U	KG	114.8 KG		
-----	-----	--------------	----	----------	--	--

2.3	2.3	114.8 KG C/U	KG	114.8 KG		
-----	-----	--------------	----	----------	--	--

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de adaracion y diligenciar formato de esquema

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 0581 E-mail: celso Rojas500@yahoo.com

Florencia - Caquetá

## INFORME DIARIO DE OBRA

CEL SO ANDRES ROJAS  
 CLEVES  
 INGENIERO CIVIL MSC  
 T.P.: 25202-096642CND



<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA								
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015								
<b>INTERVENTORIA:</b>	CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES								
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	16/12/2015								
<b>DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA:</b>									
<b>RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:</b>	EXCAVACION MANUAL DE LAS ZAPATAS DE F1 F EXCAVACION MANUAL DE VIGAS PARA CIMENTACION DEL EJE E SE FUNDO BASE DE PEDESTAL DEL EJE B FUNDICION DE SOLAOS DE VIGAS DE CIMENTACION DEL EJE B RELLENO DE ZAPATAS CON MATERIAL SOBREGANTE B1, B2, B6 Y B7 AMARRADO DE PARRILLAS PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EXCAVACIONES MANUAL FUNDICION DE SOLAOS DE ZAPATAS								
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">REGISTRO</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">APROBO</td> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td style="height: 30px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">REGISTRO</td> <td style="text-align: center;">APROBO</td> </tr> </table>				REGISTRO	APROBO			REGISTRO	APROBO
REGISTRO	APROBO								
REGISTRO	APROBO								
			HOJA 1 DE						







**T.P.: 25202-096642CND**

**CELSO ANDRÉS ROJAS  
CUEVES  
INGENIERO CIVIL, MSC  
T.P.: 25202-096642CND**



# INFORME DIARIO DE OBRA

<h1 style="margin: 0;">INFORME DIARIO DE OBRA</h1>			<p><b>CELSO ANDRES ROJAS</b>  <b>CLEYES</b>  <b>INGENIERO CIVIL MSC</b>  <b>T.P.: 25202-096642CND</b></p>
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA		
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015		
<b>INTERVENTORIA:</b>	CELSO ANDRES ROJAS CLEYES		
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	16/12/2015		
<b>DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA:</b>			
<b>RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:</b>			
EXCAVACION MANUAL DE LAS ZAPATAS DE EJE			
EXCAVACION MANUAL DE VIGAS PARA CIMENTACION DEL EJE			
SE FUNDO BASE DE PEDESTAL DEL EJE B5			
FUNDICION DE SOLAOS DE VIGAS DE CIMENTACION DEL EJE B			
RELLENO DE ZAPATAS CON MATERIAL SOBREPORTE B1, B2, B6 Y B7			
AMARRADO DE PARRILLAS			
<b>PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR</b>			
EXCAVACIONES MANUAL			
FUNDICION DE SOLAOS DE ZAPATAS			
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>			
<b>REGISTRO</b>		<b>APROBO</b>	
<b>REGISTRO</b>		<b>APROBO</b>	

Cellular: 313 252 6581 E-mail: [celso Rojas500@yahoo.com](mailto:celso Rojas500@yahoo.com)  
 Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

## INFORME DIARIO DE OBRA



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015		
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES		
FECHA DE REGISTRO:	16/12/2015		

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	EXCAVACION MANUAL EJE E ZAPATAS			UNIDAD DE PAGO	KG	ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
1.5	1.5	1.0C/U X 5	M3	11.25		SON 5 ZAPATAS EXCAVADAS, M3 TOTALES

ITEM	EXCAV MANUAL VIGAS DE CIMEN EJE E			UNIDAD DE PAGO	M3	ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
0.4	4	0.60NC/U X 4	M3	3.84		SON 4 VIGAS EXCAVADAS M3 TOTALES

ITEM	PARRILLA INFERIOR			UNIDAD DE PAGO	M3	ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
3.8	0.4	0.1	M3	0.15		
3.8	0.4	0.1	M3	0.15		

ITEM	PARRILLA SUPERIOR			UNIDAD DE PAGO	KG	ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
2.4	1.4	104.8 KG C/U X 4	KG	419.3		PESO TOTAL DE LAS 4 PARRILLAS ... VER ESQUEMA
0.9	0.9	25.2 KG C/U	KG	25.2		
2.4	1.4	104.8 KG C/U X 4	KG	104.8		

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: celso Rojas001@yahoo.com

Florencia - Caquetá





**CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND



NIT 80.233.290

6/13

## INFORME DIARIO DE OBRA

**CELSO ANDRES ROJAS**  
**CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL, MSC**  
T.P.: 25202-096642CND



<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA		
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015		
<b>INTERVENTORIA:</b>	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES		
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	17/12/2015		
<b>DÍAS DESDE EL INICIO DE OBRA:</b>			
<b>RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:</b>			
EXCAVACIONES MANUALES EN EL D DE VIGAS Y ZAPATAS			
EXCAVACIONES EN EL AREA DE CERRAMIENTO			
EXCAVACION MANUAL EN EL EJE C VIGAS Y ZAPATAS CORRESPONDIENTE			
FUNDICION DE SOLAOS, VIGAS Y ZAPATAS EN EL EJE E			
CORTE DE ACERO Y FIGURADO			
<b>PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR</b>			
EXCAVACIONES EN EL EJE D			
MONTAJE DE PEDESTALES Y PARRILLAS EN EL EJE F			
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>			
			
FUNDICION DE SOLAOS DE VIGA DE CIMENTACION EJE E		CORTE Y FIGURADO DE ACERO	
REGISTRO		APROBO	
REGISTRO		APROBO	
		HOJA 1 DE	

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

## INFORME DIARIO DE OBRA



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	17/12/2015

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	SOLAOS DEL EJE E VIGAS Y ZAPATAS			UNIDAD DE PAGO	ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
4	0.4	0.10 C/UX 4	M3	0.64	SON 4 VIGAS VOLUMEN TOTAL 0.64M3
1.5	1.5	0.10 C/UX 5	M3	1.12	SON 5 ZAPATAS VOLUMEN TOTAL 1.12 M3

ITEM	EXCAVACION DEL EJE C VIGAS Y ZAPATAS			UNIDAD DE PAGO	ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
3.57	0.35	0.35 C/UX2	M3	0.87	SON 2 VIGAS VOLUMEN TOTAL 0.87 M3
1.5	1.5	1.0 C/UX3	M3	6.75	SON 3 ZAPATAS VOLUMEN TOTAL 6.75 M3

ITEM	PARRILLA INFERIOR			UNIDAD DE PAGO	ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
34	0.2	0.2	M3	2.25 M3	

ITEM				UNIDAD DE PAGO	ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema

REGISTRO

APROBO


HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celso Rojas001@yahoo.com](mailto:celso Rojas001@yahoo.com)

Florencia - Caquetá







**T.P.: 25202-096642CND**

[illegible]

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
 Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

579

## INFORME DIARIO DE OBRA



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL, MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	18/12/2015

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	PEDESTAL, FLEJE Y GANCHOS EJE E		UNIDAD DE PAGO		KG	ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
2.9		8 VARILLAS X 2.90 MTS = 23.2MTS	KG	224.6 KG	36.1 KG	
1.3		27 FLEJES X 1.30 MTS = 35.1	KG	224.6 KG	INCLUYE EL PESO DE PEDESTAL Y FLEJES	
0.4		27 GANCHOS X 0.40 MTS = 10.8	KG	224.6 KG	INCLUYE EL PESO DE PEDESTAL Y FLEJES	
ITEM	FUNDICION DE SOLAOS EJE D ZAPATAS		UNIDAD DE PAGO		M3	ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
2.5	1.5	0.15 MTS	M3	0.56	0.56 M3 X 5 ZAPATAS = 2.8 M3	
ITEM	FUNDICION DE SOLAO EJE E VIGA DE CIMEN		UNIDAD DE PAGO		M3	ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
4	0.4	0.15	M3	0.24	0.24M3 X 4 VIGAS DE CIMENTACION = 0.94 M3 TOTALES	
ITEM	PARRILLA DE SOLAO EJE E VIGAS CIMENTACION		UNIDAD DE PAGO		KG	ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
1.4	1.4	18 PARRILLAS = 39.3 C/U	KG	39.3	39.3 KG X 5 PARRILLAS = 196.5 KG	
					VER ESQUEMA	

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: celso Rojas00@yahoo.com  
Florescia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

977

## INFORME DIARIO DE OBRA

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	18/12/2015

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	TRAMO ENTRE EJE F Y E EXCAV.			UNIDAD DE PAGO M3		ANOTACION
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
	0.8	0.4	0.9	M3	0.28 C/U	0.28 M3 X 5 TRAMOS = 1.44 M3

ITEM	TRAMO ENTRE F Y E SOLAOS			UNIDAD DE PAGO:		ANOTACION
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
	0.8	0.4	0.15	M3	0.048 C/U	0.048M3 X 5 TRAMOS = 0.24 M3

ITEM	TRAMO ENTRE F Y E SOLAOS			UNIDAD DE PAGO:		ANOTACION
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	

ITEM	PARRILLA DE SOLAO EJE E VIGAS CIMENTACION			UNIDAD DE PAGO:		ANOTACION
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6381 E-mail: celsorojas500@yahoo.com

Florencia - Caquetá







CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DIARIO DE OBRA

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C - SAN JOSE DEL FRAGUA		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015		
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES		
FECHA DE REGISTRO:	20/12/2015		
DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA:			
RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:			
SE FUNDIERON SOLAOS DE ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION DEL EJE C			
SE MONTARON LAS VIGAS DE CIMENTACION DEL EJE E			
SE FUNDEN PEDESTALES Y PARRILLAS DEL EJE D4, D5 Y D6 EL D3 Y D2 SOLO SE INSTALARON			
PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR			
FUNDIR PEDESTALES Y ZAPATAS D3 Y D2			
CORTE Y FIGURADO DE ACERO			
REGISTRO FOTOGRAFICO			
		FUNDICION BASE DE PEDESTAL Y PARRILLAS EJE D4, 5 Y 6	
FUNDICION DE SOLAOS DE VIGAS DE CIMENTACION DEL EJE C			
REGISTRO		APROBO	
REGISTRO		APROBO	
		HOJA 1 DE	

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá







CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

## INFORME DIARIO DE OBRA



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	20/12/2015

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD DE PAGO	KG	ANOTACION
	17		310.3 KG VIGA CON FLEJES	KG	310.3 KG	EJE E TRAMOS 5 A 6, 4 A 5 Y 3 A 4		

ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD DE PAGO	KG	ANOTACION
	2.9		8 VARILLAS X 290 MTS = 23.2 MTS	KG	36.1 KG			36.1 KG X 5 PEDESTALES = 180.5 KG
	1.3		27 FLEJES X 1.30 MTS = 35.1	KG	19.6 KG			19.6 KG X 5 = 98 KG
	0.4		27 GANCIOS X 0.40 MTS = 10.8	KG	6.04 KG			6.04 KG X 5 = 30.2 KG

ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD DE PAGO	KG	ANOTACION
	1.4	2.3	26 VARILLAS	KG	70.7 KG C/U	70.7 KG C/U X 5 PARRILLAS SUPERIORES = 353.5		
						VER ESQUEMA		

ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD DE PAGO	M3	ANOTACION
	1.5	2.5	0.4	M3	1.5			
	1.5	2.5	0.4	M3	1.5			
	1.5	2.5	0.4	M3	1.5			

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: celso Rojas@yahoo.com

Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

## INFORME DIARIO DE OBRA

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	20/12/2015

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	FUNDICION DE VIGA DE CIMENTACION: SOLAO EJE C			UNIDAD DE PAGO	ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
1.2	0.4	0.1	M3	0.048	
4.3	0.4	0.1	M3	0.172	
2.2	0.4	0.1	M3	0.08	

ITEM	FUNDICION DE SOLAOS ZAPATA EJE C			UNIDAD DE PAGO	ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
1.5	1.5	0.15	M3	0.33	
1.5	1.5	0.15	M3	0.33	

ITEM	PARRILLA SUPERIOR EJE D			UNIDAD DE PAGO	ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	

ITEM	FUNDICION DE PEDESTALES EJE D4, D5, Y D6			UNIDAD DE PAGO	ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: celso Rojas00@yahoo.com

Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEYES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

240

## INFORME DIARIO DE OBRA

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEYES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C - SAN JOSE DEL FRAGUA		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015		
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEYES		
FECHA DE REGISTRO:	21/12/2015		
DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA:			
RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:			
SE FUNDIERON 2 PEDESTALES CON SUS CORRESPONDIENTES ZAPATAS EN EL EJE D TERMINARON DE AMARRAR LA VIGA DEL EJE E FUNDEN PEDESTALES DEL EJE C CON SUS CORRESPONDIENTES PARRILLAS			
PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR			
SOLAJOS DE VIGAS DE CIMENTACION CERRAMIENTO BRECHAS ENTRE EL EJE B Y C			
REGISTRO FOTOGRAFICO			
REGISTRO		APROBO	
REGISTRO		APROBO	
		HOJA 1 DE	

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

## INFORME DIARIO DE OBRA



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	21/12/2015

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD DE PAGO	ANOTACION
	1.5	2.5	0.4	M3	1.5		
	1.5	2.5	0.4	M3	1.5		

ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD DE PAGO	ANOTACION
	5.5			KG	101.3		LA VIGA DE 8 VARILLAS Y 45 FLEJES = 101.3KG PESO TOTAL

ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD DE PAGO	ANOTACION
	1.5	1.5	0.4	M3	0.9		
	1.5	1.5	0.4	M3	0.9		
	1.5	1.5	0.4	M3	0.9		

ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD DE PAGO	ANOTACION
	2.9			KG	36.1 KG		36.1 KG X 3 PEDES = 108.3 KG
	1.3			KG	19.6 KG		19.6 KG X 3 = 58.8 KG
	0.4			KG	6.04 KG		6.04 KG X 3 = 18.1 KG

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 315 252 6581 E-mail: [celso Rojas50@yahoo.com](mailto:celso Rojas50@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá







CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



NIT 80.233.290

348

## INFORME DIARIO DE OBRA

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C - SAN JOSE DEL FRAGUA		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015		
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES		
FECHA DE REGISTRO:	22/12/2015		
DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA:			
RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:			
SE AMARRA ACERO PARA VIGA DE CERRAMIENTO FUNDICION DE SOLAO EN VIGA DE CERRAMIENTO EXCAVACION MANUAL DE BRECHAS ENTRE EJE B Y C			
PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR	EXCAVACION DE VIGA DE CERRAMIENTO Y FUNDICION DE SOLAOS		
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FUNDICION DE SOLAOS EN VIGA DE CERRAMIENTO	EXCAVACION MANUAL DE BRECHAS ENTRE EJE B Y C		
REGISTRO	APROBO		
REGISTRO	APROBO		
			HOJA IDE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DIARIO DE OBRA

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	22/12/2015

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD DE PAGO	ANOTACION
	24			KG	95.04 KG	LONGITUD TOTAL DE ACERO DE LA VIGA DE CERRAMIENTO	
				KG	59.4 KG	118 FLEJES TOTALES DE LA VIGA	

ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD DE PAGO	ANOTACION
	28	0.25	0.08	M3	0.56	SON 7 TRAMOS	
	1.1	0.25	0.08 X 7 TRAMOS	M3	0.15		

ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD DE PAGO	ANOTACION
	2	0.35	0.7	M3	0.49	0.49 M3 X TRAMOS ENTRE EJE B Y C	

ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD DE PAGO	ANOTACION
	1.5	1.5	1	M3	2.25		

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE



Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com

Florencia - Caquetá

## INFORME DIARIO DE OBRA

CEL SO ANDRES ROJAS  
 CLEVES  
 INGENIERO CIVIL MSC  
 T.P.: 25202-096642CND



<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA		
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015		
<b>INTERVENTORIA:</b>	CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES		
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	23/12/2015		
<b>DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA:</b>			
<b>RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:</b>	EXCAVACION MANUAL DE VIGA DE CERRAMIENTO ENTRE EL B7 Y F7 AMARRE DE ACEROS CON FLEJES EN VIGA DE CERRAMIENTO AMARRE DE ACEROS CON FLEJES EN VIGA DE CERRAMIENTO B7 Y F7 EXCAVACION MANUAL Y FUNDICION DE SOLAOS EN TRAMOS ELES D Y E, Y B Y C		
<b>PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR:</b>	FUNDIR VIGAS DE CERRAMIENTO		
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>			
			
<b>REGISTRO</b>		<b>APROBO</b>	
<b>REGISTRO</b>		<b>APROBO</b>	
		HOJA 1 DE 1	



CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

## INFORME DIARIO DE OBRA



CEL SO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL, MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	23/12/2015

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	SOLAOS ENTRE EJE B Y C			UNIDAD DE PAGO		ANOTACION
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
	2	0.35	0.1	M3	0.07	0.07 M3 X 2 TRAMOS = 0.14M3
	3.7	0.35	0.1	M3	0.12	
	3.7	0.35	0.1	M3	0.12	

ITEM	EXCAVACION MANUAL CERRAMIENTO ENTRE F7 Y B7			UNIDAD DE PAGO		ANOTACION
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
	33.2	0.4	0.3	M3	3.98	0.132 X 7 TRAMOS = 0.99
	1.1	0.4	0.3	M3	0.132 C/U	

ITEM	AMARRE DE ACERO Y FLEJES CERRAMIENTO			UNIDAD DE PAGO		ANOTACION
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
	4		4 VARILLAS X 4 MTS = 16 MTS	KG	15.8 KG	15.8 KG PESO TOTAL DE 16 MTS DE VAR # 4
			20 FLEJES X 0.90 MTS = 18 MTS	KG	10 KG	

ITEM				UNIDAD DE PAGO		ANOTACION
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
	48		4 VARILLAS X 12 MTS = 48 MTS	KG	47.5	47.5 KG PESO TOTAL DE 48 MTS DE VAR # 4
			62 FLEJES X 0.90 MTS = 55.8 MTS	KG	31.2	

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de adaracion y diligenciar formato de esquema

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6587 E-mail: celso Rojas50@yahoo.com  
Florencia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

62

## FICHAS DE INFORME SEMANAL.



**CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND

**NIT 80.233.290**

6-43

	Formato	Subdirección de Infraestructura
	<b>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 1</b>	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA			
<b>Contratista:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015	<b>Objeto:</b>	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA).
<b>Contrato No.:</b>	CONTRATO No. 028 DE 2015		
<b>Valor Inicial:</b>	\$ 720,900,000.00		
<b>Valor Actualizado:</b>	\$ 720,900,000.00		
<b>Plazo Inicial:</b>	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015		
<b>Plazo Actualizado:</b>	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015		
<b>Fecha de Inicio:</b>	10 DE NOV DE 2015		
<b>Fecha de Vencimiento:</b>	30 DE DIC DE 2015		
<b>Semana Número:</b>	5	<b>Del:</b> 07/12/2015 <b>Al:</b> 13/12/2015	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 34 días
<b>Nombre del Supervisor:</b>	DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ BOLAÑOS		

AVANCE DEL CONVENIO			
	<b>SEMANAL</b>	<b>ACUMULADO</b>	
<b>Obra programada (%)</b>	10.33%	51.78%	
<b>Valor de la Obra</b>	\$ 74,496,473.00	\$ 373,275,970.00	
	<b>SEMANAL</b>	<b>ACUMULADO</b>	
<b>Obra Física Ejecutada (%)</b>	2.65%	18.79%	
<b>Valor de la Obra</b>	\$ 19,132,092.00	\$ 135,449,396.00	

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO			
	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFFERENCIA
Acumulado anterior	34.13%	16.14%	-17.99%
Durante el periodo	10.33%	2.65%	-7.68%
Acumulado actual	51.78%	18.79%	-32.99%

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
EXCAVACIONES PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION	

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

Continua el proceso de armado de aceros para parillas y aceros para construcción de pedestales de estructura. Se avanza en el proceso de armado de estructura metálica en taller. Se instalan concretos en los primeros elementos tipo zapata.

**ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

Se planea avanzar en el proceso de construcción de los elementos metálicos componentes de la estructura de cubierta. Se planea avanzar en el proceso de construcción de los elementos de cimentación.


  

**RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO**

SE REGISTRAN AVANCES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA CIMENTACIÓN. SE TIENEN CONSIDERABLES AVANCES EN LAS EXCAVACIONES Y EN EL CORTE Y FIGURADO DE ACEROS. CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TALLER PARA ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA. SE CUENTA EN OBRA CON TRES FRENTES MARCADOS DE TRABAJO (EXCAVACIONES Y FIGURADO DE ACERO (2 FRENTES) Y ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA EN TALLER.

OBSERVACIONES	FIRMAS
NUEVAMENTE SE INSISTE EN: AUNQUE SE HAN AUMENTADO LOS TRABAJADORES EN OBRA, EL FRENTE DE TRABAJO DEBE SER EQUILIBRADO CON UNA CUANTIA DE TRABAJADORES NO INFERIOR A LOS 20 HOMBRES EN ARMADO, CORTE Y FIGURADO DE ACEROS ASI COMO EN EXCAVACIONES.	Residente Director de Interventoría Nombre: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES cc 80.233.290
	Supervisor Municipio Nombre: Diego Alejandro Fernandez Bolaños cc 6.805.394 de Florencia - Caquetá



654

CONTRATO DE OBRA	
<b>Contratista:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015
<b>Contrato No.</b>	CONTRATO No. 028 DE 2015
<b>Valor Inicial:</b>	\$ 720.900.000,00
<b>Valor Actualizado:</b>	\$ 720.900.000,00
<b>Plazo Inicial:</b>	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE OCTUBRE DE 2015
<b>Plazo Actualizado:</b>	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015
<b>Fecha de Iniciación:</b>	10 DE NOV DE 2015
<b>Fecha de Vencimiento:</b>	30 DE DIC DE 2015
<b>Semana Número:</b>	6
<b>Nombre del Supervisor:</b>	Diego Alejandro Fernandez Bolaños
<b>Objeto</b>	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA).
<b>Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato</b>	41 días

**GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO**

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	51.78%	18.79%	-35.12%
Durante el periodo	7.37%	4.79%	
Acumulado actual	59.15%	24.02%	

**% PROGRAMADO**

51.78%

18.79%

7.37%

59.15%

24.02%

4.79%

Acumulado anterior      Durante el periodo      Acumulado actual

**% EJECUTADO**

18.79%

4.79%

24.02%

Acumulado anterior      Durante el periodo      Acumulado actual

10

— *Journal of the American Medical Association*, 1997

Continúa proceso de construcción de estructura metálica en taller. Se programa continuar con el proceso de construcción de cimientos para estructura de graderías.

Circumstance	Justified (%)	Not justified (%)
If someone is attacking you	85	15
If someone is threatening you	75	25
If someone is harassing you	65	35
If someone is insulting you	55	45
If someone is annoying you	15	85

## RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

SE REGISTRAN AVANCES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION. SE TIENEN CONSIDERABLES AVANCES EN LAS  
EXCAVACIONES Y EN EL CORTE Y FIGURADO DE ACEROS. CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TALLER PARA ARMADO DE ESTRUCTURA  
METALICA. SE CUENTA EN OBRA CON TRES FRENTE MARCADOS DE TRABAJO (EXCAVACIONES Y FIGURADO DE ACERO (2 FRENTE) Y  
ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA EN TALLER. SE AVANZA EN EL PROCESO DE INSTALACION DE CONCRETOS PARA FUNDIR ELEMENTOS  
DE CIMENTACION.

OBSERVACIONES	FIRMAS
SE RECOMIENDA ADELANTAR PROCEDIMIENTO DE INCLUSION DE TRABAJADORES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES QUE ATAQUEN LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO DE ARMADO DE ESTRUCTURA EN TALLER.	
	Residente Director de Interventoria
	Nombre: CELS OANDRES ROJAS CLEVES cc: 80.233.290
	Supervisor Municipio
	Nombre : Diego Alejandro Fernandez Bolaños cc 6.805.394 de Fierrenza - Caqueta



655

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
 Florencia - Caquetá





**CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND


**NIT 80.233.290**

656

	Formato	Subdirección de Infraestructura
	<b>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 1</b>	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA	
<b>Contratista:</b> UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015	<b>Objeto:</b> CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE
<b>Contrato No.:</b> CONTRATO No. 028 DE 2015	
<b>Valor Inicial:</b> \$ 720.900.000,00	
<b>Valor Actualizado:</b> \$ 720.900.000,00	
<b>Plazo Inicial:</b> 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL
<b>Plazo Actualizado:</b> 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA).
<b>Fecha de Inicio:</b> 10 DE NOV DE 2015	
<b>Fecha de Vencimiento:</b> 30 DE DIC DE 2015	
<b>Semana Número:</b> 8 Del: 28/12/2015 Al: 03/01/2015 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 55 días	
<b>Nombre del Supervisor:</b> DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ BOLAÑOS	

AVANCE DEL CONVENIO			
	SEMANAL	ACUMULADO	
Obra programada (%)	6,23%	70,75%	Obra Física Ejecutada (%)
Valor de la Obra	\$ 44.923.272,00	\$ 510.002.336,00	0,00%
			38,85%
			Valor de la Obra \$ 280.094.886,00

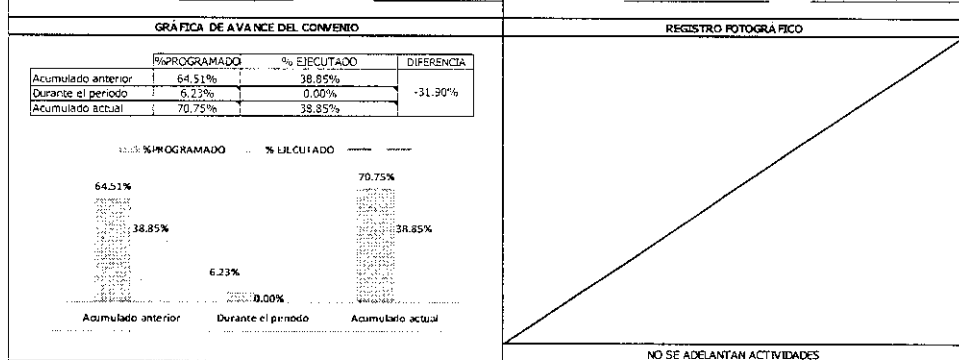

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
No se adelantan actividades

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
Se programa retomar actividades el día lunes 04 de enero. Se programa retomar fundida de concretos para cimientos. Se programa continuar con armado de aceros para estructura y continuar con los trabajos en taller.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO	
SE REGISTRAN AVANCES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA CIMENTACIÓN. SE TIENEN CONSIDERABLES AVANCES EN LAS EXCAVACIONES Y EN EL CORTE Y FIGURADO DE ACEROS. CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TALLER PARA ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA. SE CUENTA EN OBRA CON TRES FRENTES MARCADOS DE TRABAJO (EXCAVACIONES Y FIGURADO DE ACERO (2 FRENTES) Y ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA EN TALLER. SE AVANZA EN EL PROCESO DE INSTALACION DE CONCRETOS PARA FUNDIR ELEMENTOS DE CIMENTACION	
OBSERVACIONES	FIRMAS
SE SUSPENDEN ACTIVIDADES EN EL CIERRE DE AÑO.	
	Residente Director de Interventoría Nombre: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES cc: 80.233.290
	Supervisor Municipio Nombre: Diego Alejandro Fernandez Bolarin cc: 6.805.394 de Florencia - Caquetá




CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

657

## PROGRAMACION DE OBRA / CORTE DE OBRA



**T.P.: 25202-096642CND**

Cellular: 313 252 6581 E-mail: [celsoarojas500@yahoo.com](mailto:celsoarojas500@yahoo.com)  
 Florencia - Caquetá



**CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

659

Florencia, Diciembre 2015

El suscrito Ingeniero Civil, **CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**, identificado con cédula de ciudadanía No. **80.233.290** de Bogotá, y matrícula profesional **25202 – 096642** CND de Bogotá, en calidad de INTERVENTOR del proyecto “CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENITO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)”, enmarcado en el contrato No. 028 de 2015,

**CERTIFICA,**

Que el CONTRAISTA, UNION TEMPORAL SAN JOSE DEL FRAGUA C.I.C 2015, representado legalmente por el Arquitecto William Artunduaga, realizo, los pagos de seguridad social para el proyecto citado de acuerdo a los requerimientos legales de la normativa colombiana.

**CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
C.C. 80.233.290  
INGENIERO CIVIL MSc.  
Interventor de Proyecto.



**CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

660



Florencia, Diciembre 2015

El suscrito Ingeniero Civil, **CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**, identificado con cédula de ciudadanía No. **80.233.290** de Bogotá, y matricula profesional **25202 - 096642** CND de Bogotá, en calidad de INTERVENTOR del proyecto "CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENITO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)", enmarcado en el contrato No. 028 de 2015,

**CERTIFICA,**

Que el CONTRAISTA, UNION TEMPORAL SAN JOSE DEL FRAGUA C.I.C 2015, representado legalmente por el Arquitecto William Artunduaga, presenta un avance de obra equivalente al 38.85 % de la inversión contratada y ejecutada a la fecha de corte del presente informe.

  
**CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
INGENIERO CIVIL MSc.  
Interventor de Proyecto.

  
 MININTERIOR

FORMATO  
ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO  
A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL  
ANEXO 4

Código: GC-P-03-F-04

Versión: 03

Fecha Elaboración:  
25/07/2013

Vigente Desde:  
26/08/2013

ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Departamento:	CAQUETA
Municipio:	SAN JOSE DEL FRAGUA
Proyecto:	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADA - CIC
Valor:	\$735.000.000
Firma Convenio:	07 DE MAYO DE 2015
Vencimiento:	30 DE NOVIEMBRE DE 2015
Acta de Inicio:	8 DE MAYO DE 2015
Póliza:	630-47994000006141

ASISTENTES

No.	NOMBRE	CARGO	REPRESENTA A
1	MIGUEL TURMEQUE BUSTOS	SUPERVISOR MINISTERIO DEL INTERIOR	MININTERIOR
2	JUAN JOSE BLANCO OVIEDO	APOYO A LA SUPERVISION DEL MINISTERIO	MININTERIOR
3			
4			

INVITADOS

1		
2		

AUSENTES

1		JUSTIFICADO SI NO
2		

1 ORDEN DEL DIA

Verificación de cumplimiento de los compromisos del municipio de acuerdo al convenio F- 212
---


OBJETO:

Convenio Interadministrativo F-212 de 2015, cuyo objeto es la "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la seguridad ciudadana, a través de la ejecución del proyecto denominado "CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC, SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA"

2 DESARROLLO



Se realiza seguimiento de las obligaciones contractuales del municipio teniendo en cuenta el objeto contractual de la referencia dentro del respectivo convenio.		
COMPROMISOS		
RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LIMITE CUMPLIMIENTO
	1. Cronograma actualizado ✓	→ 20 NOV
	2. Compromiso en la etapa de ejecución de obra para cumplir al mes de diciembre con 50% de avance de la misma. Incluyendo 5 frentes de trabajo	→ 27 NOV
	3. Apoyo en toda la gestión contractual por parte del municipio	
	4. Soportes de desembolso ✓	→ 23 NOV
	5. Informes de avance de obras,(FICHAS – VIDEOS – REGISTRO FOTOGRAFICO)	
	6. Informes de Interventoria ✓	→ 23 NOV
	Informe mensual municipio	20 NOV

737

 MININTERIOR	<b>FORMATO</b> <b>ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO</b> <b>A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> <b>ANEXO 4</b>	Código: GC-P-03-F-04
		Versión: 03
		Fecha Elaboración: 25/07/2013
		Vigente Desde: 26/08/2013

Reportar avance de obra al 40% a 20 Dic


En constancia de lo anterior, firman el presente documento en original,

<p>Por parte de: <b>MINISTERIO DEL INTERIOR</b></p>  <p>Nombre y firma: Cargo: SUPERVISOR CONVENIO Email: Celular:</p>	<p>Por parte de:</p>  <p>Nombre y firma: Cargo: Secretario planeación Email: planeacion@munipal.gov.co Celular: 3208017425</p>

0 Anexo Copia: Subdirección de Gestión Contractual



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

*NIT 80.233.290*

*121*

## INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA.

**Proyecto:** CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENITO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA).

Contrato: 028 de 2015

Contratista: Unión Temporal CIC San José del Fragua  
2015. Arq. William Artunduaga.  
Representante Legal.

Interventoría: Ing. Celso Andrés Rojas Cleves.

**Enero de 2016 – Mes 03.**







CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

112

## 1. INFORMACION DESCRIPTIVA.




CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

## 1.1 Descripción del Proyecto.

El proyecto objeto del contrato No. 028, denominado "CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENITO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)", en proceso de desarrollo por la Unión Temporal CIC San José del Fragua 2015, cuyo representante Legal es el Arquitecto William Artunduaga ha llegado al primer corte de obra mensual, con la ejecución y presentación del presente informe.

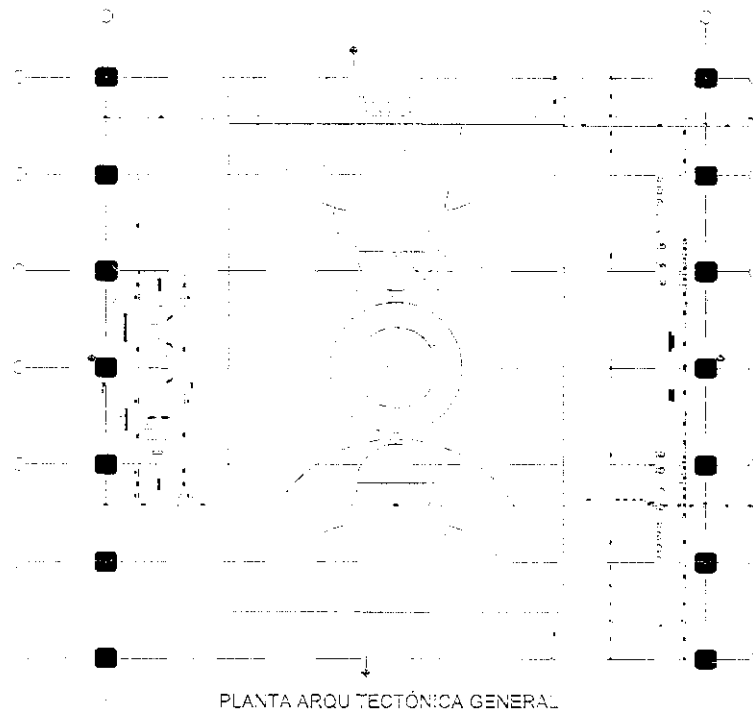




**CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

470

El proyecto hace referencia a la construcción de un escenario deportivo con cancha múltiple, sus respectivos elementos de dotación, cubierta sobre todo el escenario y el área de desarrollo del proyecto. Dentro del espacio construido se encuentra graderías y bajo de ellas servicios sanitarios, un escenario para presentaciones y bajo de este una oficina administrativa con un área desarrollada de (50 m<sup>2</sup>) aproximados. Se anota que todo el proyecto tiene un cerramiento perimetral desarrollado a una altura de tres (03) metros y una fachada en ladrillo a la vista.

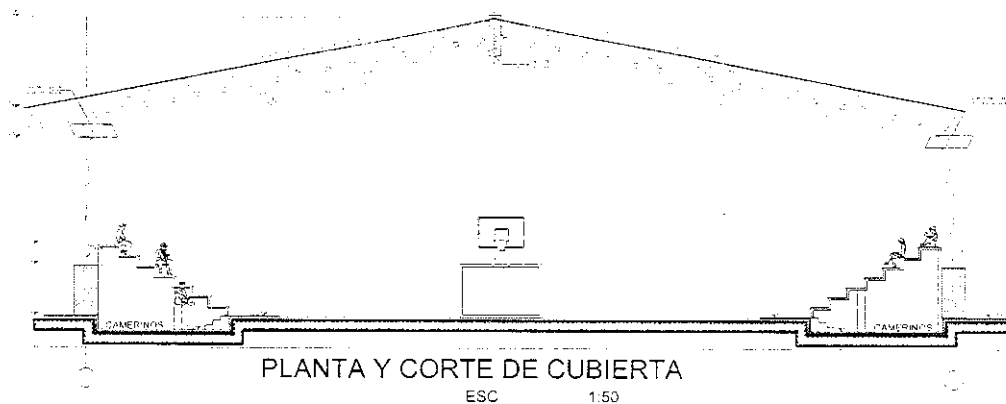



## **1.2 Resumen General de Actividades en Periodo Informado.**

Durante el periodo informado se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se da término al proceso de construcción de la estructura de cimiento.
- Se da término al proceso de construcción de todas las columnetas.
- Se da término al proceso de construcción de todos los pedestales.
- Se avanza en el proceso de construcción de estructura metálica en taller. Se registra avance a término de construcción de elementos tipo columna y se tiene un avance del 80% de la estructura de cubierta (vigas y correas).
- Se registra avance en el proceso de construcción de la estructura de cerramiento.
- Se registra avances importantes en el proceso de construcción de la estructura de la tarima.



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

### 1.3 Resumen Fotográfico de Actividades.




**Excavaciones para acometidas sanitaria.**



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

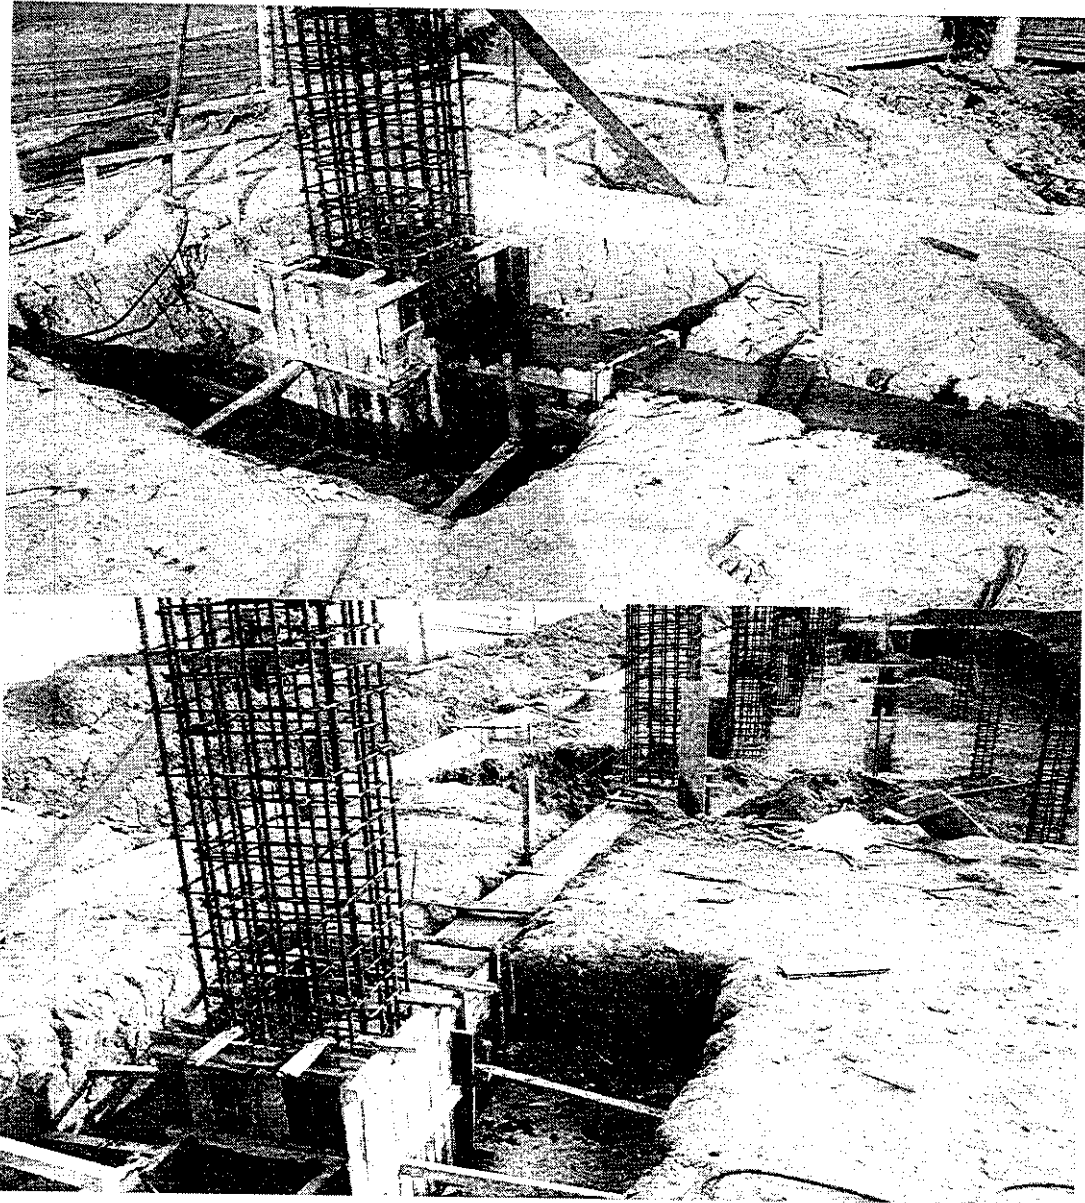

**Proceso de construcción de elementos de cimiento.**

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá







**CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290



**Amarre de acero y elementos de cimiento.**


Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND


NIT 80.233.290

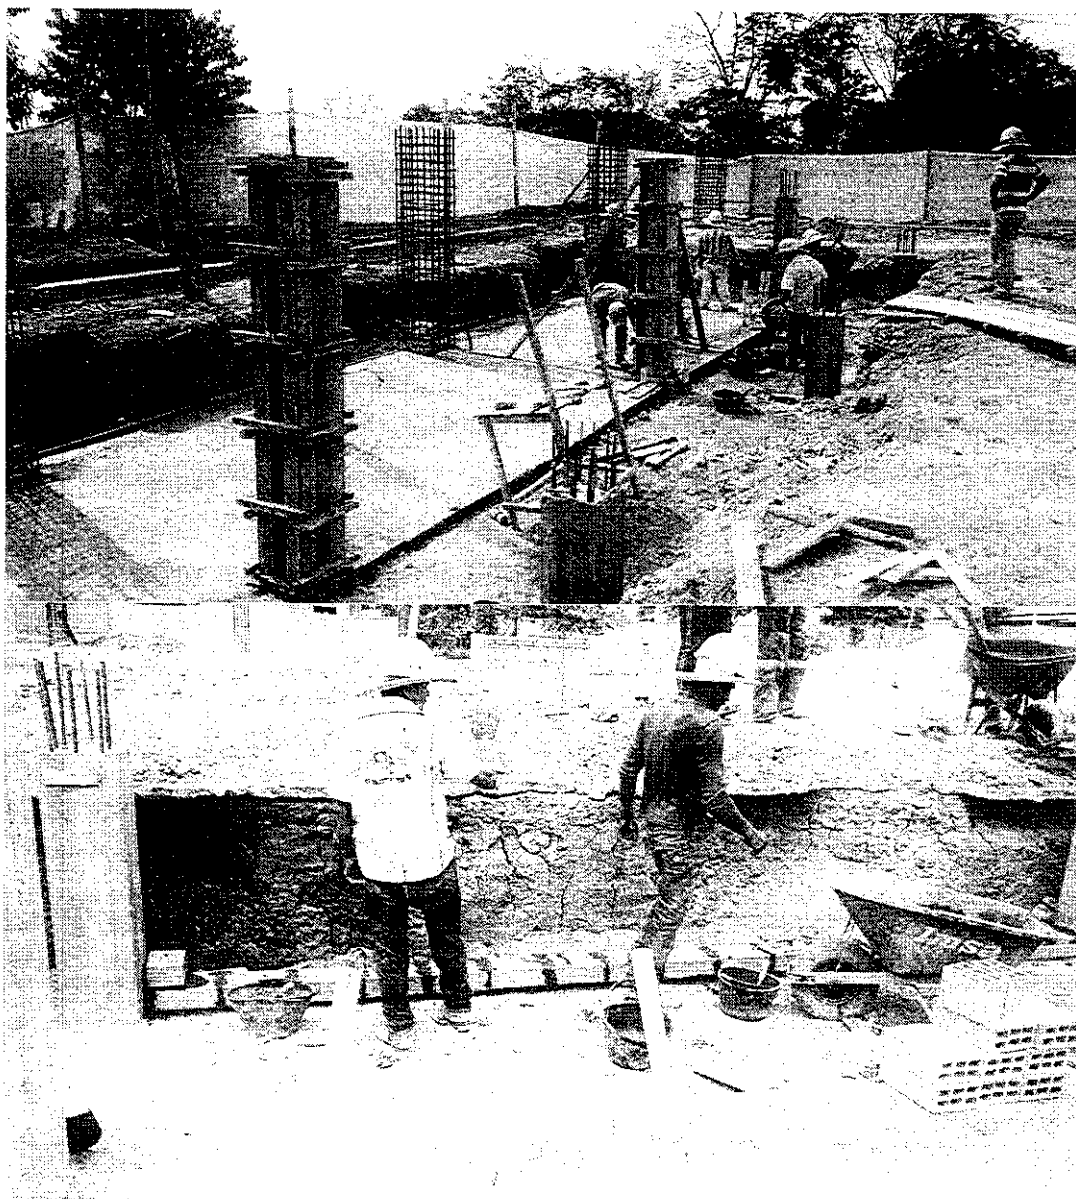

**Construcción de muros y elementos de concreto tipo columnetas.**

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



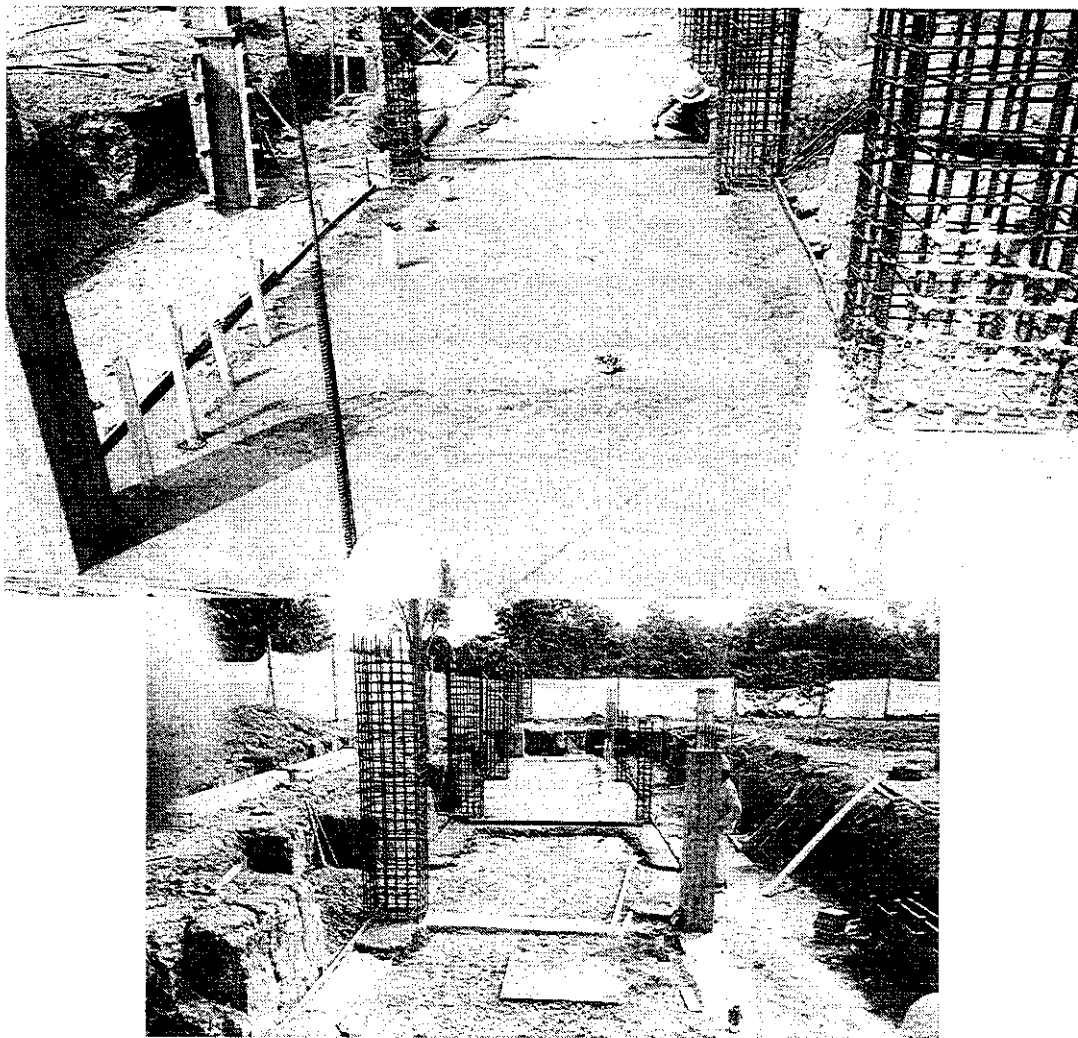

**Construcción de losa de contrapiso – Sector Batería Sanitaria.**





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

## DOCUMENTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO INFORMADO

- Formato de Control de Clima.
- Formato de Control de Personal en Obra.
- Formato de Reporte de Maquinaria y Equipo.
- Informe Diario de Actividades.
- Fichas de Informe Semanal.
- Programación de Obra / Corte de Obra.



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

## FORMATO DE CONTROL DE CLIMA.





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

## INFORME DE CLIMA



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA  
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015  
INTERVENTORIA: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

DIA	ESTADO DEL CLIMA	ANOTACION	DIA	ESTADO DEL CLIMA	ANOTACION	DIA	ESTADO DEL CLIMA	ANOTACION
1			11	S	mañana nublada, tarde soleada.	21	S	
2			12	S		22	S	
3			13	S		23	S	
4			14	S		24		
5			15	S		25	S	
6			16	S		26	S	
7	S		17			27	S	
8	S, LI	llovio a las 4:46 pm	18	S		28	S	
9	S		19	S		29	S	
10			20	S		30	S	

SOLEADO : S  
LLUVIZNAS: LI  
FUERTES LLUVIAS: F

REGISTRO

APROBO

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

## FORMATO DE CONTROL DE PERSONAL.

# INFORME DE PERSONAL DIARIO

**CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND

<b>PROYECTO:</b>		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA				
<b>CONTRATISTA:</b>		UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015				
<b>INTERVENTORIA:</b>		CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES				
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>		07/01/2016				

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903			
2	MAESTRO	BENARDINO BETANCUR	17,638,864			
3	OBRE RO	ALFONSO ORTIZ ORTIZ	4,961,285			
4	OBRE RO	ROYER PEREZ	17,616,550			
5	OBRE RO	FREDY ALEXIS MORA RIVERA	1,117,543,949			
6	OBRE RO	ALEXANDER GUTIERREZ CADENA	1,118,772,635			
7	OBRE RO	PEDRO TORRADOS TORRADOS	1,003,260,436			
8	OBRE RO	GIL RAMIREZ CAVIEDES	17,616,871			
9	OBRE RO	JOSE LIZARDO CORDOBA	1,006,549,808			
10	OBRE RO	JARVINTON GUILLERMO CANO	1,117,486,866			
11						
12						
13						
14						

**REGISTRO**

**APROBO**

HOJA 1 DE



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL, MSC  
T.P.: 25202-096642CND

## INFORME DE PERSONAL DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES					
FECHA DE REGISTRO:	08/01/2016					

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903			
2	MAESTRO	BENARDINO BETANCUR	17,638,864			
3	OBREO	ALFONSO ORTIZ ORTIZ	4,961,285			
4	OBREO	ROYER PEREZ	17,616,550			
5	OBREO	FREDY ALEXIS MORA RIVERA	1,117,543,949			
6	OBREO	ALEXANDER GUTIERREZ CADENA	1,118,772,635			
7	OBREO	PEDRO TORRADOS TORRADOS	1,003,260,436			
8	OBREO	GIL RAMIREZ CAVIEDES	17,616,871			
9	OBREO	JOSE LIZARDO CORDOBA	1,006,549,808			
10	OBREO	JARVINTON GUILLERMO CANO	1,117,486,866			
11						
12						
13						
14						

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florescia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

9/21

## INFORME DE PERSONAL DIARIO

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES					
FECHA DE REGISTRO:	11/01/2016					

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903			
2	MAESTRO	BENARDINO BETANCUR	17,638,864			
3	OBROERO	ALFONSO ORTIZ ORTIZ	4,961,285			
4	OBROERO	ROYER PEREZ	17,616,550			
5	OBROERO	FREDY ALEXIS MORA RIVERA	1,117,543,949			
6	OBROERO	ALEXANDER GUTIERREZ CADENA	1,118,772,635			
7	OBROERO	PEDRO TORRADOS TORRADOS	1,003,260,436			
8	OBROERO	GIL RAMIREZ CAVIEDES	17,616,871			
9	OBROERO	JOSE LIZARDO CORDOBA	1,006,549,808			
10	OBROERO	JARVINTON GUILLERMO CANO	1,117,486,866			
11	OBROERO	HARVINSON CAPERA	1,118,472,635			
12	OBROERO	GILBERTO CADENA	1,118,468,999			
13	OBROERO	SALVADOR GUTIERREZ	4,166,318			
14	OBROERO	JORGE GAITAN	1,117,794,723			

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

425

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE PERSONAL DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES					
FECHA DE REGISTRO:	11/01/2016					

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	OBREIRO	SALOMON POVEDA LOZADA	17,615,757			
2	OBREIRO	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ	16,550,904			
3	OBREIRO	LUIS EDUARDO CADENA	1,117,533,930			
4	OBREIRO	ALEX FABIAN MARTINEZ	1,115,794,132			
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá







CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

44

## INFORME DE PERSONAL DIARIO



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES					
FECHA DE REGISTRO:	12/01/2016					

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903			
2	MAESTRO	BENARDINO BETANCUR	17,638,864			
3	OBrero	ALFONSO ORTIZ ORTIZ	4,961,285			
4	OBrero	ROYER PEREZ	17,616,550			
5	OBrero	FREDY ALEXIS MORA RIVERA	1,117,543,949			
6	OBrero	ALEXANDER GUTIERREZ CADENA	1,118,772,635			
7	OBrero	PEDRO TORRADOS TORRADOS	1,003,260,436			
8	OBrero	GIL RAMIREZ CAVIEDES	17,616,871			
9	OBrero	JOSE LIZARDO CORDOBA	1,006,549,808			
10	OBrero	JARVINTON GUILLERMO CANO	1,117,486,866			
11	OBrero	HARVINSON CAPERA	1,118,472,635			
12	OBrero	GILBERTO CADENA	1,118,468,999			
13	OBrero	SALVADOR GUTIERREZ	4,166,318			
14	OBrero	JORGE GAITAN	1,117,794,723			

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NTT 80.233.290

1/23

<b>INFORME DE PERSONAL DIARIO</b>		<b>CELSO ANDRES ROJAS CLEVES</b> INGENIERO CIVIL MSC T.P.: 25202-096642CND				
<b>PROYECTO:</b>		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA				
<b>CONTRATISTA:</b>		UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015				
<b>INTERVENTORIA:</b>		CELSO ANDRES ROJAS CLEVES				
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>		12/01/2016				
<b>ID</b>	<b>RANGO</b>	<b>NOMBRE COMPLETO</b>	<b>DOC. IDENTIDAD</b>	<b>SALUD</b>	<b>PENSION</b>	<b>RIESGOS</b>
1	OBRERO	SALOMON POVEDA LOZADA	17,615,757			
2	OBRERO	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ	16,550,904			
3	OBRERO	LUIS EDUARDO CADENA	1,117,533,930			
4	OBRERO	ALEX FABIAN MARTINEZ	1,115,794,132			
5	OBRERO	JULIO CESAR SANCHEZ ALTURO	93,121,657			
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
<b>REGISTRO</b>		<b>APROBO</b>		<b>HOJA 1 DE</b>		

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

1.2

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

## INFORME DE PERSONAL DIARIO



CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA						
UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015						
CELSO ANDRES ROJAS CLEVES						
13/01/2016						
PROYECTO:						
CONTRATISTA:						
INTERVENTORIA:						
FECHA DE REGISTRO:						
ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903			
2	MAESTRO	BENARDINO BETANCUR	17,638,864			
3	OBREO	ALFONSO ORTIZ ORTIZ	4,961,285			
4	OBREO	ROYER PEREZ	17,616,550			
5	OBREO	FREDY ALEXIS MORA RIVERA	1,117,543,949			
6	OBREO	ALEXANDER GUTIERREZ CADENA	1,118,772,635			
7	OBREO	PEDRO TORRADOS TORRADOS	1,003,260,436			
8	OBREO	GIL RAMIREZ CAVIEDES	17,616,871			
9	OBREO	JOSE LIZARDO CORDOBA	1,006,549,808			
10	OBREO	JARVINTON GUILLERMO CANO	1,117,486,866			
11	OBREO	HARVINSON CAPERA	1,118,472,635			
12	OBREO	GILBERTO CADENA	1,118,468,999			
13	OBREO	SALVADOR GUTIERREZ	4,166,318			
14	OBREO	JORGE GAITAN	1,117,794,723			

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

## INFORME DE PERSONAL DIARIO

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES					
FECHA DE REGISTRO:	13/01/2016					

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	OBrero	SALOMON POVEDA LOZADA	17,615,757			
2	OBrero	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ	16,550,904			
3	OBrero	LUIS EDUARDO CADENA	1,117,533,930			
4	OBrero	ALEX FABIAN MARTINEZ	1,115,794,132			
5	OBrero	JULIO CESAR SANCHEZ ALTURO	93,121,657			
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

4/10

## INFORME DE PERSONAL DIARIO

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES					
FECHA DE REGISTRO:	14/01/2016					

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903			
2	MAESTRO	BENARDINO BETANCUR	17,638,864			
3	OBREO	ALFONSO ORTIZ ORTIZ	4,961,285			
4	OBREO	ROYER PEREZ	17,616,550			
5	OBREO	FREDY ALEXIS MORA RIVERA	1,117,543,949			
6	OBREO	ALEXANDER GUTIERREZ CADENA	1,118,772,635			
7	OBREO	PEDRO TORRADOS TORRADOS	1,003,260,436			
8	OBREO	GIL RAMIREZ CAVIEDES	17,616,871			
9	OBREO	JOSE LIZARDO CORDOBA	1,006,549,808			
10	OBREO	JARVINTON GUILLERMO CANO	1,117,486,866			
11	OBREO	HARVINSON CAPERA	1,118,472,635			
12	OBREO	GILBERTO CADENA	1,118,468,999			
13	OBREO	SALVADOR GUTIERREZ	4,166,318			
14	OBREO	JORGE GAITAN	1,117,794,723			

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florescia - Caquetá





# INFORME DE PERSONAL DIARIO

<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
<b>INTERVENTORIA:</b>	CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES					
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	14/01/2016					

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	OBROERO	SALOMON POVEDA LOZADA	17,615,757			
2	OBROERO	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ	16,550,904			
3	OBROERO	LUIS EDUARDO CADENA	1,117,533,930			
4	OBROERO	ALEX FABIAN MARTINEZ	1,115,794,132			
5	OBROERO	JULIO CESAR SANCHEZ ALTURO	93,121,657			
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

**REGISTRO**

**APROBO**

HOJA 1 DE



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

442



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

## INFORME DE PERSONAL DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES					
FECHA DE REGISTRO:	15/01/2016					

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903			
2	MAESTRO	BENARDINO BETANCUR	17,638,864			
3	OBRAERO	ALFONSO ORTIZ ORTIZ	4,961,285			
4	OBRAERO	ROYER PEREZ	17,616,550			
5	OBRAERO	FREDY ALEXIS MORA RIVERA	1,117,543,949			
6	OBRAERO	ALEXANDER GUTIERREZ CADENA	1,118,772,635			
7	OBRAERO	PEDRO TORRADOS TORRADOS	1,003,260,436			
8	OBRAERO	GIL RAMIREZ CAVIEDES	17,616,871			
9	OBRAERO	JOSE LIZARDO CORDOBA	1,006,549,808			
10	OBRAERO	JARVINTON GUILLERMO CANO	1,117,486,866			
11	OBRAERO	HARVINSON CAPERA	1,118,472,635			
12	OBRAERO	GILBERTO CADENA	1,118,468,999			
13	OBRAERO	SALVADOR GUTIERREZ	4,166,318			
14	OBRAERO	JORGE GAITAN	1,117,794,723			

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

103

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE PERSONAL DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES					
FECHA DE REGISTRO:	15/01/2016					

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	OBrero	SALOMON POVEDA LOZADA	17.615.757			
2	OBrero	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ	16.550.904			
3	OBrero	LUIS EDUARDO CADENA	1.117.533.930			
4	OBrero	ALEX FABIAN MARTINEZ	1.115.794.132			
5	OBrero	JULIO CESAR SANCHEZ ALTURO	93.121.657			
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

REGISTRO	APPROBO	HOJA 1 DE
----------	---------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celso Rojas500@yahoo.com](mailto:celso Rojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

## INFORME DE PERSONAL DIARIO



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA						
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015						
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES						
FECHA DE REGISTRO:	16/01/2016						

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903			
2	MAESTRO	BENARDINO BETANCUR	17,638,864			
3	OBRAERO	ALFONSO ORTIZ ORTIZ	4,961,285			
4	OBRAERO	ROYER PEREZ	17,616,550			
5	OBRAERO	FREDY ALEXIS MORA RIVERA	1,117,543,949			
6	OBRAERO	ALEXANDER GUTIERREZ CADENA	1,118,772,635			
7	OBRAERO	PEDRO TORRADOS TORRADOS	1,003,260,436			
8	OBRAERO	GIL RAMIREZ CAVIEDES	17,616,871			
9	OBRAERO	JOSE LIZARDO CORDOBA	1,006,549,808			
10	OBRAERO	JARVINTON GUILLERMO CANO	1,117,486,866			
11	OBRAERO	HARVINSON CAPERA	1,118,472,635			
12	OBRAERO	GILBERTO CADENA	1,118,468,959			
13	OBRAERO	SALVADOR GUTIERREZ	4,166,318			
14	OBRAERO	JORGE GAITAN	1,117,794,723			

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

443

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

INFORME DE PERSONAL DIARIO

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015

INTERVENTORIA: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

FECHA DE REGISTRO: 27/11/2015

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	OBRAERO	SALOMON POVEDA LOZADA	17,615,757			
2	OBRAERO	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ	16,550,904			
3	OBRAERO	LUIS EDUARDO CADENA	1,117,533,930			
4	OBRAERO	ALEX FABIAN MARTINEZ	1,115,794,132			
5	OBRAERO	JULIO CESAR SANCHEZ ALTURO	93,121,657			
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

16

<b>PROYECTO:</b>		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA				
<b>CONTRATISTA:</b>		UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015				
<b>INTERVENTORIA:</b>		CELSO ANDRES ROJAS CLEVES				
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>		18/01/2016				

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903			
2	MAESTRO	BENARDINO BETANCUR	17,638,864			
3	OBrero	JARVINTON GUILLERMO CANO	1,117,486,866			
4	OBrero	JORGE GAITAN	1,117,794,723			
5	OBrero	ROYER PEREZ	17,616,550			
6	OBrero	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ	16,550,904			
7	OBrero	PEDRO TORRADOS TORRADOS	1,003,260,436			
8	OBrero	SALVADOR GUTIERREZ	4,166,318			
9	OBrero	JULIO CESAR SANCHEZ	9,312,657			
10	OBrero	LUIS EDUARDO CADENA	1,117,533,930			
11	OBrero	GILBERTO CADENA	1,118,468,999			
12	OBrero	ALEX FABIAN MARTINEZ	1,115,794,132			
13	OBrero	ALFONSO ORTIZ ORTIZ	4,961,285			
14						

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

T.P.: 25202-096642CND

## INFORME DE PERSONAL DIARIO



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES					
FECHA DE REGISTRO:	19/01/2016					

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903			
2	MAESTRO	BENARDINO BETANCUR	17,638,864			
3	OBTERO	JARVINTON GUILLERMO CANO	1,117,486,866			
4	OBTERO	JORGE GAITAN	1,117,794,723			
5	OBTERO	ROYER PEREZ	17,616,550			
6	OBTERO	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ	16,550,904			
7	OBTERO	PEDRO TORRADOS TORRADOS	1,003,260,436			
8	OBTERO	SALVADOR GUTIERREZ	4,166,318			
9	OBTERO	JULIO CESAR SANCHEZ	9,312,657			
10	OBTERO	LUIS EDUARDO CADENA	1,117,533,930			
11	OBTERO	GILBERTO CADENA	1,118,468,999			
12	OBTERO	ALEX FABIAN MARTINEZ	1,115,794,132			
13						
14						

REGISTRO	APROBO
	HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florenca - Caqueta







CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

142

## INFORME DE PERSONAL DIARIO



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES					
FECHA DE REGISTRO:	20/01/2016					

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903			
2	MAESTRO	BENARDINO BETANCUR	17,638,864			
3	OBREO	JARVINTON GUILLERMO CANO	1,117,486,866			
4	OBREO	JORGE GAITAN	1,117,794,723			
5	OBREO	ROYER PEREZ	17,616,550			
6	OBREO	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ	16,550,904			
7	OBREO	PEDRO TORRADOS TORRADOS	1,003,260,436			
8	OBREO	SALVADOR GUTIERREZ	4,166,318			
9	OBREO	JULIO CESAR SANCHEZ	9,312,657			
10	OBREO	LUIS EDUARDO CADENA	1,117,533,930			
11	OBREO	GILBERTO CADENA	1,118,468,999			
12	OBREO	ALEX FABIAN MARTINEZ	1,115,794,132			
13						
14						

REGISTRO	APROBO
	HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

4/19

## INFORME DE PERSONAL DIARIO



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL. MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C. SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	21/01/2016

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903			
2	MAESTRO	BENARDINO BETANCUR	17,638,864			
3	OBREO	JARVINTON GUILLERMO CANO	1,117,486,866			
4	OBREO	JORGE GAITAN	1,117,794,723			
5	OBREO	ROYER PEREZ	17,616,550			
6	OBREO	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ	16,550,904			
7	OBREO	PEDRO TORRADOS TORRADOS	1,003,260,436			
8	OBREO	SALVADOR GUTIERREZ	4,166,318			
9	OBREO	JULIO CESAR SANCHEZ	9,312,657			
10	OBREO	LUIS EDUARDO CADENA	1,117,533,930			
11	OBREO	GILBERTO CADENA	1,118,468,999			
12	OBREO	ALEX FABIAN MARTINEZ	1,115,794,132			
13						
14						

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

127

## INFORME DE PERSONAL DIARIO

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA						
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015						
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES						
FECHA DE REGISTRO:	22/01/2016						

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC.	IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS		7,711,903			
2	MAESTRO	BENARDINO BETANCUR		17,638,864			
3	OBTERO	JARVINTON GUILLERMO CANO		1,117,486,866			
4	OBTERO	JORGE GAITAN		1,117,794,723			
5	OBTERO	ROYER PEREZ		17,616,550			
6	OBTERO	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ		16,550,904			
7	OBTERO	PEDRO TORRADOS TORRADOS		1,003,260,436			
8	OBTERO	SALVADOR GUTIERREZ		4,166,318			
9	OBTERO	JULIO CESAR SANCHEZ		9,312,657			
10	OBTERO	LUIS EDUARDO CADENA		1,117,533,930			
11	OBTERO	GILBERTO CADENA		1,118,468,999			
12	OBTERO	ALEX FABIAN MARTINEZ		1,115,794,132			
13	OBTERO	ALFONSO ORTIZ ORTIZ		4,961,285			
14							

REGISTRO	APROBO
	HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



**CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

757

**CELSO ANDRES ROJAS**  
**CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE PERSONAL DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA						
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015						
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES						
FECHA DE REGISTRO:	23/01/2016						

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903			
2	MAESTRO	BENARDINO BETANCUR	17,638,864			
3	OBrero	JARVINTON GUILLERMO CANO	1,117,486,866			
4	OBrero	JORGE GAITAN	1,117,794,723			
5	OBrero	ROYER PEREZ	17,616,550			
6	OBrero	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ	16,550,904			
7	OBrero	PEDRO TORRADOS TORRADOS	1,003,260,436			
8	OBrero	SALVADOR GUTIERREZ	4,166,318			
9	OBrero	JULIO CESAR SANCHEZ	9,312,657			
10	OBrero	LUIS EDUARDO CAENA	1,117,533,930			
11	OBrero	GILBERTO CADENA	1,118,468,999			
12	OBrero	ALEX FABIAN MARTINEZ	1,115,794,132			
13	OBrero	ALFONSO ORTIZ ORTIZ	4,961,285			
14	OBrero	GIL RAMIREZ CAVIEDES	17,549,808			

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

25/1

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE PERSONAL DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA						
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015						
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES						
FECHA DE REGISTRO:	25/01/2016						

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903			
2	MAESTRO	BENARDINO BETANCUR	17,638,864			
3	OBROERO	JARVINTON GUILLERMO CANO	1,117,486,866			
4	OBROERO	JORGE GAITAN	1,117,794,723			
5	OBROERO	ROYER PEREZ	17,616,550			
6	OBROERO	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ	16,550,904			
7	OBROERO	PEDRO TORRADOS TORRADOS	1,003,260,436			
8	OBROERO	SALVADOR GUTIERREZ	4,166,318			
9	OBROERO	JULIO CESAR SANCHEZ	9,312,657			
10	OBROERO	LUIS EDUARDO CADENA	1,117,533,930			
11	OBROERO	GILBERTO CADENA	1,118,468,959			
12	OBROERO	ALEX FABIAN MARTINEZ	1,115,794,132			
13	OBROERO	ALFONSO ORTIZ ORTIZ	4,961,285			
14	OBROERO	GIL RAMIREZ CAVIEDES	17,549,808			

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

453

## INFORME DE PERSONAL DIARIO



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA						
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015						
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES						
FECHA DE REGISTRO:	25/01/2016						

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	OBRAERO	JOSE LIZARDO CARDONA	1,006,549,808			
2	OBRAERO	ALEX FABIAN MARTINEZ	1,115,533,930			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá







CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

453

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

## INFORME DE PERSONAL DIARIO



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES					
FECHA DE REGISTRO:	25/01/2016					

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	OBREIRO	JOSE LIZARDO CARDONA	1,006,549,808			
2	OBREIRO	ALEX FABIAN MARTINEZ	1,115,533,930			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVÉS  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

124

## INFORME DE PERSONAL DIARIO



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVÉS  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVÉS					
FECHA DE REGISTRO:	26/01/2016					

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903			
2	MAESTRO	BENARDINO BETANCUR	17,638,864			
3	OBRAERO	JARVINTON GUILLERMO CANO	1,117,486,866			
4	OBRAERO	ROYER PEREZ	17,616,550			
5	OBRAERO	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ	16,550,904			
6	OBRAERO	PEDRO TORRADOS TORRADOS	1,003,260,436			
7	OBRAERO	SALVADOR GUTIERREZ	4,166,318			
8	OBRAERO	JULIO CESAR SANCHEZ	9,312,657			
9	OBRAERO	LUIS EDUARDO CADENA	1,117,533,930			
10	OBRAERO	GILBERTO CADENA	1,118,468,999			
11	OBRAERO	ALEX FABIAN MARTINEZ	1,115,794,132			
12	OBRAERO	ALFONSO ORTIZ ORTIZ	4,961,285			
13	OBRAERO	GIL RAMIREZ CAVIEDES	17,549,808			
14	OBRAERO	JOSE LIZARDO CARDONA	1,006,549,808			

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE PERSONAL DIARIO

PROYECTO:		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA						
CONTRATISTA:		UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015						
INTERVENTORIA:		CELSO ANDRES ROJAS CLEVES						
FECHA DE REGISTRO:		27/01/2016						
ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC.	IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS	
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS		7,711,903				
2	MAESTRO	BENARDINO BETANCUR		17,638,864				
3	OBRERO	JARVINION GUILLERMO CANO		1,117,486,866				
4	OBRERO	ROYER PEREZ		17,616,550				
5	OBRERO	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ		16,550,904				
6	OBRERO	PEDRO TORRADOS TORRADOS		1,003,260,436				
7	OBRERO	SALVADOR GUTIERREZ		4,166,318				
8	OBRERO	JULIO CESAR SANCHEZ		9,312,657				
9	OBRERO	LUIS EDUARDO CADENA		1,117,533,930				
10	OBRERO	GILBERTO CADENA		1,118,468,999				
11	OBRERO	ALEX FABIAN MARTINEZ		1,115,794,132				
12	OBRERO	ALFONSO ORTIZ ORTIZ		4,961,285				
13	OBRERO	GIL RAMIREZ CAVIEDES		17,549,808				
14	OBRERO	JOSE LIZARDO CARDONA		1,006,549,808				
REGISTRO		APROBO						
		HOJA 1 DE						

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florescia - Caquetá





CELSON ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

## INFORME DE PERSONAL DIARIO



CELSON ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSON ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	28/01/2016

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903			
2	MAESTRO	BENARDINO BETANCUR	17,638,864			
3	OBREO	JARVINTON GUILLERMO CANO	1,117,486,866			
4	OBREO	ROYER PEREZ	17,616,550			
5	OBREO	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ	16,550,904			
6	OBREO	PEDRO TORRADOS TORRADOS	1,003,260,436			
7	OBREO	SALVADOR GUTIERREZ	4,166,318			
8	OBREO	JULIO CESAR SANCHEZ	9,312,657			
9	OBREO	LUIS EDUARDO CADENA	1,117,533,930			
10	OBREO	GILBERTO CADENA	1,118,468,999			
11	OBREO	ALEX FABIAN MARTINEZ	1,115,794,132			
12	OBREO	ALFONSO ORTIZ ORTIZ	4,961,285			
13	OBREO	GIL RAMIREZ CAVIEDES	17,549,808			
14	OBREO	JOSE IZARDO CARDONA	1,006,549,808			

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá







CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

957

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE PERSONAL DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA				
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015				
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES				
FECHA DE REGISTRO:	28/01/2016				

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	OBrero	HARVINSON CAPERA	1,118,468,999			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

152

## INFORME DE PERSONAL DIARIO



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL. MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA				
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015				
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES				
FECHA DE REGISTRO:	29/01/2016				

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,903			
2	MAESTRO	BENARDINO BETANCUR	17,638,864			
3	OBREIRO	JARVINTON GUILLERMO CANO	1,117,486,866			
4	OBREIRO	ROYER PEREZ	17,616,550			
5	OBREIRO	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ	16,550,904			
6	OBREIRO	PEDRO TORRADOS TORRADOS	1,003,260,436			
7	OBREIRO	SALVADOR GUTIERREZ	4,166,318			
8	OBREIRO	JULIO CESAR SANCHEZ	9,312,657			
9	OBREIRO	LUIS EDUARDO CADENA	1,117,533,930			
10	OBREIRO	GILBERTO CADENA	1,118,468,999			
11	OBREIRO	ALEX FABIAN MARTINEZ	1,115,794,132			
12	OBREIRO	ALFONSO ORTIZ ORTIZ	4,961,285			
13	OBREIRO	GIL RAMIREZ CAVIEDES	17,549,808			
14	OBREIRO	JOSE LIZARDO CARDONA	1,006,549,808			

REGISTRO	APROBO
	HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

29

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE PERSONAL DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA				
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015				
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES				
FECHA DE REGISTRO:	29/01/2016				

ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	OBROERO	HARVINSON CAPERA	1,118,468,999			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

REGISTRO	APROBO
	HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

9)

## INFORME DE PERSONAL DIARIO

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015					
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES					
FECHA DE REGISTRO:	30/01/2016					
ID	RANGO	NOMBRE COMPLETO	DOC. IDENTIDAD	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	ING. RESIDENTE	EDWIN ENRIQUE VARGAS	7,711,907			
2	MAESTRO	BENARDINO BETANCUR	17,638,868			
3	OBREO	ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ	16,550,997			
4	OBREO	ROYER PEREZ	17,616,550			
5	OBREO	PEDRO TORRADOS TORRADOS	1,003,260,436			
6	OBREO	GILBERTO CADENA	1,118,468,999			
7	OBREO	LUIS EDUARDO CADENA	1,118,471,505			
8	OBREO	JARVINTON CANO	1,117,486,866			
9	OBREO	HARVINSON CAPEA	1,118,472,635			
10	OBREO	JULIO CESAR SANCHEZ	93,121,657			
11	OBREO	GIL RAMIREZ CAVIEDES	17,616,871			
12	OBREO	SALVADOR GOMEZ	4,116,319			
13	OBREO	ALFONSO ORTIZ ORTIZ	4,961,285			
14	OBREO	ALEX FABIAN MARTINEZ	1,115,794,132			
REGISTRO						
APROBO				HOJA 1 DE		

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá







CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

051

## FORMATO DE REPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO.





# INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	07/01/2016

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1		MEZCLADORA			D
2		PULIDORA			D
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotación se debe anotar si el equipo está disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

463



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	08/01/2016

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1		MEZCLADORA			D
2		PULIDORA			D
3		CORTADORA			D
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotacion se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



# INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

**CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	09/01/2016

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1		MEZCLADORA			D
2		PULIDORA			D
3		CORTADORA			D
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotacion se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO
APROBO







CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

465

## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA				
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015				
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES				
FECHA DE REGISTRO	11/01/2016				
ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1		MEZCLADORA			D
2		PULIDORA			D
3		CIZALLA			D
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotación se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celso Rojas500@yahoo.com](mailto:celso Rojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

466

## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	12/01/2016

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1		MEZCLADORA			D
2		PULIDORA			D
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotación se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

167

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	13/01/2016

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	1118472635	MEZCLADORA	8:00 a. m.	5:00 p. m.	0
2	1117794723	PULIDORA	8:00 a. m.	11:00 a. m.	0
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotacion se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
<b>INTERVENTORIA:</b>	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
<b>FECHA DE REGISTRO</b>	14/12/2015

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	1118472635	MEZCLADORA	1:00 p. m.	5:00 p. m.	O
2		PULIDORA			D
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotacion se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación ( R ).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE







CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

4677

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL, MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	15/01/2016

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	1118472635	MEZCLADORA	8:00 a. m.	5:00 p. m.	O
2		PULIDORA			D
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotación se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com  
Florencia - Caquetá





**CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

470

**CELSO ANDRES ROJAS**  
**CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA				
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015				
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES				
FECHA DE REGISTRO	16/01/2016				

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	1118472635	MEZCLADORA	8:00 a. m.	12:00 p. m.	O
2		PULIDORA			D
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotacion se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florenceia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

4.7

## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	18/01/2016

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	1118468999	MEZCLADORA	2:00 p. m.	5:00 p. m.	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotación se debe anotar si el equipo está disponible (D), operando (O) o inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	19/01/2016

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	1118468999	MEZCLADORA	9:00 a. m.	12:00 p. m.	O
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotacion se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá







# **INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO**

<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
<b>INTERVENTORIA:</b>	CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES
<b>FECHA DE REGISTRO</b>	19/01/2016

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	1118468999	MEZCLADORA	9:00 a. m.	12:00 p. m.	O
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotacion se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

173

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA				
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015				
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES				
FECHA DE REGISTRO	20/01/2016				
ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	1118468999	MEZCLADORA	2:00 p. m.	5:00 p. m.	O
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotacion se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



477



## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	21/01/2016

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	1118468999	MEZCLADORA	3:48 p. m.	4:48 p. m.	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotacion se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	22/01/2016

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	1118468999	MEZCLADORA	1:00 p. m.	5:00 p. m.	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotación se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá







CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	22/01/2016

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	1118468999	MEZCLADORA	1:00 p. m.	5:00 p. m.	O
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotación se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



# INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	23/01/2016

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	1118468999	MEZCLADORA	8:00 a. m.	12:00 p. m.	O
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotacion se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

477

**CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES**  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	25/01/2016

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	1118468999	MEZCLADORA	4:00 p. m.	5:00 p. m.	O
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotacion se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------



## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	27/01/2016

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	1118468999	MEZCLADORA	2:00 p. m.	5:00 p. m.	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotacion se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (!) o en Reparación (R).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

(82)

CEL SO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	28/01/2016

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	1118468999	MEZCLADORA	2.00 p. m.	5.00 p. m.	O
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotacion se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	30/01/2016

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	1118472635	MEZCLADORA	8:00 a. m.	12:00 p. m.	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotacion se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá

182



## INFORME DE EQUIPO Y MAQUINARIA DIARIO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO	29/01/2016

ID	OPERADOR	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	HORA DE INICIO	HORA DE PARADA	ANOTACION
1	1118468999	MEZCLADORA	1:00 p. m.	5:00 p. m.	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

NOTA: En la casilla anotacion se debe anotar si el equipo esta disponible (D), operando (O) o Inoperante (I) o en Reparación (R).

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

V93




## INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES




CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

1/27

INFORME DIARIO DE OBRA		CELSO ANDRES ROJAS CLEVES INGENIERO CIVIL MSC T.P.: 25202-096642CND
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA	
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C I C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015	
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES	
FECHA DE REGISTRO:	07/07/2016	
DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA:		
RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:		
INICIA LABORES EL NUEVO MAESTRO DE OBRA BERNARDINO BETANCUR EXCAVACION MANUAL DE POZO PARA SOLUCIONAR LA EXCASES DE AGUA EN LA OBRA AMARRE DE FLETES, VIGA DE CERRAMIENTO ENTRE PTDI STALES F7 Y B7 CORTE DE MADERA PARA FORMALETA FIGURADO DE ACERO #3 PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR		
CORTE DE ACERO PAÑETADO DE POZO TOMA DE NIVELES EN EL FRENTE DE OBRA		
REGISTRO FOTOGRAFICO		
		
POZO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	AMARRE DE FLEJES VIGA DE CERRAMIENTO	CORTE DE MADERA PARA FORMALETA
REGISTRO	APROBO	
REGISTRO	APROBO	
		HOJA 1 DE 1

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



NIT 80.233.290

# INFORME DIARIO DE OBRA



**CELISO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL, MSC  
T.P.: 25202-096642CND**

<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA	
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015	
<b>INTERVENTORIA:</b>	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES	
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	07/01/2016	

**CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO**

[illegible]

ITEM	LARGO	ANCHO	AMARRE DE FLEJES DE CERRAMIENTO		VOLUMEN	UNIDAD DE PAGO	KG	ANOTACION
			ALTO	AREA				
	8		4 VARILLAS X 8 MTS = 32 MTS	KG	31.6			31.6 KG PESO TOTAL DE 32 MTS VARILLA #4
			50 FLEJES X 0.90 MTS = 45 MTS	KG	25.2			25.2 KG PESO TOTAL DE 50 FLEJES

[illegible][illegible]

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema


## REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com

## Florencia - Caquetá




**T.P.: 25202-096642CND**



# INFORME DIARIO DE OBRA

# INFORME DIARIO DE OBRA

CELSO ANDRES ROJAS  
CIEVES  
INGENIERO CIVIL - MSC  
T.P.: 85202-096642CND



<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C. - SAN JOSE DEL FRAGUA
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
<b>INTERVENTORIA:</b>	CELSO ANDRES ROJAS CIEVES
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	08/01/2016

**DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA:** \_\_\_\_\_

**RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

ENTRADA DE MATERIAL EN HORAS DE LA MAÑANA. EL PERSONAL AYUDO A DESCARGAR EL MATERIAL EN HORAS DE LA TARDE SE PAÑETO LA POCHTA


CORTE DE ACERO Y FIGURADO

AMARRE DE FLEJES EN VIGAS DE AMARRE


SE SUSPENDEN LABORES POR INTENSAS LLUVIAS

**PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR**

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



POZO PAÑETADO



LIMPIEZA DE OBRA POR LLUVIAS

**REGISTRO**

**APROBO**

**REGISTRO**

**APROBO**

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celso Rojas500@yahoo.com](mailto:celso Rojas500@yahoo.com)  
 Florencia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

## INFORME DIARIO DE OBRA



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	08/01/2016

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD DE PAGO	ANOTACION
3				VARILLA + FLEJE = 54.8 KG	54.8 KG	KG	VIGA DE 8 VARILLA DE 3 MTS Y 24 FLEJES = 54.8 KG PESO TOTAL

ITEM	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD DE PAGO	ANOTACION
	0.04		1	M3	0.00013	M3	

ITEM	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD DE PAGO	ANOTACION

ITEM	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD DE PAGO	ANOTACION

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com

Florencia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND


NTT 80.233.290

0077

## INFORME DIARIO DE OBRA

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA		
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015		
<b>INTERVENTORIA:</b>	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES		
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	09/12/2015		
<b>DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA:</b>			
<b>RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:</b>	<p>SE TERMINO DE AMARRAR LOS FLEJES EN LA VIGA DEL EJE D SECCION 6 Y 5</p> <p>SE AMARRO FLEJES EN LA VIGA DE CIMENTACION DEL EJE D SECCION 5 Y 4</p> <p>SE REALIZO EXCAVACIONES MANUALES PARA FACILITAR LA INSTALACION DE FLEJES F, E Y D SECCION 6</p> <p>SE TOMAN NIVELES PARA REPLANTEAMIENTO</p> <p>SE ORGANIZA LETRERO DE OBRA</p>		
<b>PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR</b>			
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>			
			
INSTALACION DE FLEJES EN VIGA DE CIMENTACION			
REGISTRO	APROBO		
REGISTRO	APROBO		
			HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá

107

# INFORME DIARIO DE OBRA

**CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
INGENIERO CIVIL, MSC  
T.P.: 25202-096642CND



<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
<b>INTERVENTORIA:</b>	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	09/01/2016

## CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	VIGA DE CIMENTACION EJE D SECCION 6 Y 5				UNIDAD DE PAGO	KG	ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN			
2.5		VARILLA + FLEJE = 46.4	KG	46.4			VIGA DE CIMENTACION DE 2.5 MTS Y 21 FLEJES = 46.4 KG PESO TOTAL

ITEM	VIGAS DE CIMENTACION EJE D SECCION 5 Y 4				UNIDAD DE PAGO	KG	ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN			
5.5		VARILLA + FLEJE = 101.3	KG	101.3			VIGA DE CIMENTACION 5.5 MTS Y 45 FLEJES = 101.3 PESO TOTAL

ITEM	UNIDAD DE PAGO:				ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	

ITEM	UNIDAD DE PAGO:				ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com

Florencia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND




NIT 80.233.290

Y/D

## INFORME DIARIO DE OBRA

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015		
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES		
FECHA DE REGISTRO:	11/01/2016		
DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA:			
RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:			
SE REALIZARON EXCAVACIONES MANUALES PARA FACILITAR LA INSTALACION DEL ACERO DE LAS VIGAS TRANSVERSALES DE CIMENTACION			
SE ARMARON FLEJES EN VIGAS DE CIMENTACION			
CORTE DE MADERA PARA FORMALETAS DE VIGAS DE CIMENTACION			
PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR			
REPLANTEO, AMARRE DE FLEJES EN VIGAS DE CIMENTACION			
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
INSTALACION DE ACEROS EN VIGAS TRANSVERSALES	AMARRE DE VIGAS	CORTE DE MADERA PARA FORMALETA	
REGISTRO	APROBO	APROBO	
REGISTRO	APROBO	APROBO	
			HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

4/14

## INFORME DIARIO DE OBRA

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	11/01/2016

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	VIGA DE CIMENTACION V - 004			UNIDAD DE PAGO KG		ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
6		8 VARILLAS X 6.0 MTS = 48	KG	74.8 KG		VER ESQUEMA
		36 FLEJES X 1.50 MTS = 54 MTS	KG	30.2 KG		VER ESQUEMA

ITEM	VIGA DE CIMENTACION V - 004			UNIDAD DE PAGO KG		ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
6		8 VARILLAS X 6.0 MTS = 48	KG	74.8 KG		
		36 FLEJES X 1.50 MTS = 54 MTS	KG	30.2 KG		

ITEM	VIGA DE CIMENTACION V - 005 TRAMO 2 AL 4			UNIDAD DE PAGO KG		ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
19		8 VARILLAS X 19 MTS = 152	KG	237 KG		VER ESQUEMA
		90 FLEJES X 1.50 MTS = 135 MTS	KG	75.6 KG		VER ESQUEMA

ITEM	VIGA DE CIMENTACION V - 005 TRAMO 2 AL 4			UNIDAD DE PAGO KG		ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com

Florencia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVÉS  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



NIT 80.233.290

443

## INFORME DIARIO DE OBRA

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVÉS  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C - SAN JOSE DEL FRAGUA		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015		
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVÉS		
FECHA DE REGISTRO:	12/01/2016		
DÍAS DESDE EL INICIO DE OBRA:			
RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:			
SE AMARRARON VIGAS DE CIMENTACION (V 004) SECCION 3, 4, 5, Y 6.			
CORTE DE MADERA PARA FORMALETAS			
SE HIZO MANTENIMIENTO A LA MEZCLADORA			
SE REALIZO REPLANTEAMIENTO DE LA OBRA GENERAL			
PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR			
FUNDICION DE VIGAS DE CIMENTACION (V-004)			
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
AMARRAR DE VIGA DE CIMENTACION	CORTE DE MADERA PARA FORMALETA		
REGISTRO	APROBO		
REGISTRO	APROBO		
			HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

## INFORME DIARIO DE OBRA



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL, MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	12/01/2016

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

VIGA DE CIMENTACION V-004				UNIDAD DE PAGO KG		ANOTACION
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
	6		8 VARILLAS X 6 MTS = 48	KG	74.8 KG	
	6		8 VARILLAS X 6 MTS = 48	KG	74.8 KG	
	6		8 VARILLAS X 6 MTS = 48	KG	74.8 KG	
PARRILLA INFERIOR						
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	ANOTACION
			36 FLEJES X 1.5 MTS = 54	KG	30.2	VARILLA #6
			36 FLEJES X 1.5 MTS = 54	KG	31.2	VARILLA #5
UNIDAD DE PAGO KG						
UNIDAD DE PAGO:						
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	ANOTACION
UNIDAD DE PAGO:						
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	ANOTACION
UNIDAD DE PAGO:						

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com  
Florencia - Caquetá

## INFORME DIARIO DE OBRA

CEL SO ANDRES ROJAS  
 CLEVES  
 INGENIERO CIVIL MSC  
 T.P.: 25202-096642CND



**PROYECTO:** CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA  
**CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015  
**INTERVENTORIA:** CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
**FECHA DE REGISTRO:** 13/01/2016

**DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA:**  
**RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS**

FUNDICION DE VIGAS DE CIMENTACION (V-004 SECCION 2, 3, 4) Y (V-005 SECCION F2 F4 ; E2 F4 ; D4 D6)

**PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR**

FUNDIR VIGAS DE CIMENTACION (V-004 SECCION 4,6) Y (V-005 SECCION F4 F6 ; E4 F6 ; D4 D6)

### REGISTRO FOTOGRAFICO



FUNDICION VIGAS DE CIMENTACION

FUNDICION VIGAS DE CIMENTACION

REGISTRO

APROBO

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



## INFORME DIARIO DE OBRA

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	13/01/2016

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

FUNDICION VIGAS DE CIMENTACION V-004 Y V-005						UNIDAD DE PAGO	M3	ANOTACION
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN			
	58.5	0.4	0.5	M3	11.7			
UNIDAD DE PAGO:								
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN			ANOTACION
UNIDAD DE PAGO:								
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN			ANOTACION
UNIDAD DE PAGO:								
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN			ANOTACION
UNIDAD DE PAGO:								

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema

REGISTRO

APROBO



HOJA 1 DE


Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com

Florencia - Caquetá

## INFORME DIARIO DE OBRA

**CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES**  
 INGENIERO CIVIL MSC  
 T.P.: 25202-096642CND

<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA		
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C. SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015		
<b>INTERVENTORIA:</b>	CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES		
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	14/01/2016		
<b>DÍAS DESDE EL INICIO DE OBRA:</b>			
<b>RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	<p>SE DESMONTA FORMALETA DE LA PRIMERA PARTE DE LAS VIGAS DE CIMENTACION DEL AREA DE CAMERINO</p> <p>SE MONTAN FORMALETAS PARA LA FUNDICION DE VIGAS DE CIMENTACION EN LA SEGUNDA PARTE DEL AREA DE CAMERINOS V.004 SECCION 4.6 Y V.005 F4-6, D4-6, E4-6</p> <p>SE ARMAN ACEROS Y FLETES PARA VIGAS DE CIMENTACION PARA EL AREA DE OFICINAS, SE MONTAN FORMALETAS</p>		
<b>PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR</b>	FUNDICION DE VIGAS DE CIMENTACION AREA CAMERINO Y OFICINAS		
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>			
		SF ARMA FORMALETA SEGUNDA SECCION DE FUNDICION ZONA CAMERINOS	
<b>DESMONTE DE FORMALETA</b>			
REGISTRO		APROBO	
REGISTRO		APROBO	
			HOJA 1 DE



T.P.: 25202-096642CND



**CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND**

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	FLEJES VIGA DE CIMENTACION V-002				UNIDAD DE PAGO	KG
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	ANOTACION	
		31 FLEJES X 1.54 MTS = 47.7	KG	26.73	VER ESQUEMA	
		31 FLEJES X 1.54 MTS = 47.7	KG	26.73		

[illegible]

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaración y diligenciar formato de esquema

APROBO



HOJA 1 DE

Cellular: 313 252 6581 E-mail: [celsozorlas500@yahoo.com](mailto:celsozorlas500@yahoo.com)

Florencia - Caquetá





<b>INFORME DIARIO DE OBRA</b>		 CELSO ANDRES ROJAS CLEVES INGENIERO CIVIL MSC T.P.: 25202-096642CND	
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA		
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C. SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015		
<b>INTERVENTORIA:</b>	CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES		
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	15/01/2016		
<b>DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA:</b>			
<b>RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:</b>	SE FUNDE LA SEGUNDA PARTE DEL AREA DE CAMERINO Y AREA CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS EN VIGAS DE CIMENTACION SE REALIZO EXCAVACION MANUAL ENTRE LA SECCION B5 Y B4 PARA VIGA DE CIMENTACION		
<b>PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR</b>			
<b>FUNDICION DE SECCION B5 - B4</b>			
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>			
			
FUNDICION DE CIMENTACION SEGUNDA PARTE DE CAMERINO			
REGISTRO	APROBO		
REGISTRO	APROBO		
			HOJA 1 DE

# INFORME DIARIO DE OBRA



<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
<b>INTERVENTORIA:</b>	CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	15/01/2016

## CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD DE PAGO	ANOTACION
	42.2	0.4	0.5		8.44	M3	

ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD DE PAGO	ANOTACION
	24.8	0.4	0.5	M3	4.97	M3	AREA TOTAL EN M3 DE V-002, V-003 Y V-001 (3-4) ; 2 PEDESTAL.

ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD DE PAGO	ANOTACION

ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD DE PAGO	ANOTACION

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com

Florencia - Caqueta



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND


NIT 80.233.290

000

## INFORME DIARIO DE OBRA

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015		
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES		
FECHA DE REGISTRO:	16/01/2016		
DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA:			
RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:			
FUNDICION DE SOLAOS B1-B2; B2-B3; B4-B5; B5-B6 SOLAJO A LA VIGA DE CERRAMIENTO ENTRE F1-F7			
PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR			
FORMA LETA Y FUNDICION			
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FUNDICION DE SOLAOS VIGA DE CERRAMIENTO			
REGISTRO	APROBO		
REGISTRO	APROBO		
			HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá

## INFORME DIARIO DE OBRA

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	16/01/2016

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

SOLAO B1-B2 : B3-B2 - B5-B4				UNIDAD DE PAGO	M3	ANOTACION
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
	5	0.4	0.15	M3	0.3	
	4.95	0.4	0.15	M3	0.29	
	4.95	0.4	0.15	M3	0.29	

SOLAO B5-B6				UNIDAD DE PAGO		ANOTACION
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
	4.95	0.4	0.15	M3	2.9	

VIGA DE CERRAMIENTO SOLAO F1 - F7				UNIDAD DE PAGO	M3	ANOTACION
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
	33.4	0.35	0.15	M3	1.75	

				UNIDAD DE PAGO		ANOTACION
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema



REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com

Florencia - Caquetá

INFORME DIARIO DE OBRA		CELSO ANDRES ROJAS CLEVES INGENIERO CIVIL MSC T.P.: 25202-096642CND	
<b>PROYECTO:</b> CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA <b>CONTRATISTA:</b> UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015 <b>INTERVENTORIA:</b> CELSO ANDRES ROJAS CLEVES <b>FECHA DE REGISTRO:</b> 18/01/2016			
<b>DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA:</b> <b>RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:</b> SE FORMALITO LA VIGA DE CERRAMIENTO Y SE FUNDIO LA MISMA T1 - F7 SE FUNDE SOLAO DE CERRAMIENTO B7-F7 SE REDUCE EL PERSONAL A 10 OBREROS Y 1 OFICIAL			
<b>PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR:</b> FORMALITA VIGA DE CERRAMIENTO Y FUNDICION DE LA MISMA			
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>			
			
ARMALJE DE FORMALITA DE VIGA DE CERRAMIENTO	FUNDICION DE VIGA DE CERRAMIENTO		
REGISTRO	APROBO		
REGISTRO	APROBO		
		HOJA 1 DE	



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

## INFORME DIARIO DE OBRA



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	18/01/2016

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	VIGA DE CERRAMIENTO F1-F7			UNIDAD DE PAGO: M3		ANOTACION
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
	33.4	0.25	0.2	M3	1.67	

ITEM	SOLAO VIGA DE CERRAMIENTO B7-F7			UNIDAD DE PAGO: M3		ANOTACION
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
37		0.35	0.15	M3	1.94	

ITEM				UNIDAD DE PAGO:		ANOTACION
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	

ITEM				UNIDAD DE PAGO:		ANOTACION
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com  
Florencia - Caquetá



**CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MISC**  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

204

INFORME DIARIO DE OBRA		CELSO ANDRES ROJAS CLEVES INGENIERO CIVIL MISC T.P.: 25202-096642CND	
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C I C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015		
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES		
FECHA DE REGISTRO:	19/01/2016		
DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA:			
RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:			
SE ARMA FORMALETA PARA VIGA DE CERRAMIENTO ENTRE B7 Y F7 Y SE FUNDE VIGA NIVELACION Y EXTRACCION DE MATERIAL SOBRIANTE EN EL AREA DE OFICINAS			
PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR			
EXCAVACION DE CAJAS SANITARIAS			
REGISTRO FOTOGRAFICO			
SE CONTINUA CON VIGA DE CERRAMIENTO			
REGISTRO		APROBO	

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

## INFORME DIARIO DE OBRA

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	19/01/2016

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

VIGA DE CERRAMIENTO B7/F7				UNIDAD DE PAGO:	
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN
	37	0.25	0.2	M3	1.85
UNIDAD DE PAGO:				ANOTACION	
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN
UNIDAD DE PAGO:				ANOTACION	
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN
UNIDAD DE PAGO:				ANOTACION	
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN
UNIDAD DE PAGO:				ANOTACION	

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas509@yahoo.com

Florencia - Caquetá



<p><b>INFORME DIARIO DE OBRA</b></p> <p>CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES                  INGENIERO CIVIL MSC                  T.P.: 25202-096642CND</p>	
<p><b>PROYECTO:</b></p> <p>CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA</p>	
<p><b>CONTRATISTA:</b></p> <p>UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015</p>	
<p><b>INTERVENTORIA:</b></p> <p>CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES</p>	
<p><b>FECHA DE REGISTRO:</b></p> <p>20/01/2016</p>	
<p><b>DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA:</b></p> <p><b>RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:</b></p> <p>EXCAVACION DE CAJAS SANITARIAS</p> <p>FUNDICION DE PEDESTAL F2</p> <p>EXCAVACION DE TUBERIA ENTRE CAJAS SANITARIAS</p> <p>SE FUNDE SOLAO EN CAJA SANITARIA</p> <p>EXCAVACION MANUAL DE CAJA SANITARIA PRINCIPAL A LA SEGUNDA CAJA</p> <p>INSTALACION DE TUBERIA</p> <p><b>PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR</b></p> <p>FUNDICION DE VIGA DE CIMENTACION</p>	
<p><b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b></p>	
<p>EXCAVACION CAJAS SANITARIAS</p>	<p>EXCAVACION PARA TUBERIA ENTRE CAJAS SANITARIAS</p>
<p>REGISTRO</p>	<p>APROBO</p>
<p>REGISTRO</p>	<p>APROBO</p>
<p>FUNDICION DE SOLAOS CAJA SANITARIA</p>	
<p>HOJA IDE</p>	



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

007

## INFORME DIARIO DE OBRA



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	20/01/2016

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

EXCAVACIONES MANUALES TUB. SANITARIAS				UNIDAD DE PAGO	ANOTACION
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN
	5.6	0.4	0.85	M3	1.9 M3
	3.3	1.2	1.45	M3	3.10 M3
	12.8	0.45	0.85	M3	4.8 M3

EXCAVACION CAJAS SANITARIAS				UNIDAD DE PAGO	ANOTACION
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN
	1	1	0.85	M3	0.85
	1	1	0.85	M3	0.85

FUNDICION PEDESTAL F2				UNIDAD DE PAGO	ANOTACION
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN
	0.6	0.7	0.5	M3	0.21
			4 VARILLAS X 0.90 = 3.6 MTS	KG	2.0 KG
			22 FLEJES X 1.10 = 22	KG	12.3 KG

SOLAO CAJA SANITARIA				UNIDAD DE PAGO	ANOTACION
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN
	1	1	0.15	M3	0.15

1  
NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema



REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com

Florencia - Caquetá

<b>INFORME DIARIO DE OBRA</b>		<b>CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES</b> <b>INGENIERO CIVIL MSC</b> T.P.: 25202-096642CND	
PROYECTO: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C. - SAN JOSE DEL FRAGUA CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015 INTERVENTORIA: CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES FECHA DE REGISTRO: 21/01/2016			
DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA: _____ RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE FUNDIERON VIGA DE CIMENTACION Y DE PRETALES F1 SE MONTO VIGA DE ACERO ENTRE F1, F2 Y F3 FORMATEO PARA FUNDIR SE ARMO VIGA DE CIMENTACION V-002 A Y SE FORMALETEO Y FUNDE. SE MONTO FIGA DE ACEROS EN LA SECCION B1-B2 NOTA: LOS ACEROS Y FLEJES DE LAS VIGAS B1-B2, B6-B7, F1-F2, F6-F7, YA SE HABIAN ARMADO CON ANTERIORIDAD			
PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR FUNDICION DE VIGAS			
			
REGISTRO FOTOGRAFICO			
ARMAJE DE VIGA		FORMALITA PARA FUNDIR VIGA DE CIMENTACION	
REGISTRO		APROBO	
REGISTRO		APROBO	
		HOJA 1 DE	

# INFORME DIARIO DE OBRA



<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
<b>INTERVENTORIA:</b>	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	21/01/2016

## CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	PEDESTALES F1-F2			UNIDAD DE PAGO M3		ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
0.6	0.7	0.5	M3	0.21		
0.6	0.7	0.5	M3	0.21		

ITEM	VIGA DE CIMENTACION V-001 F1-F2			UNIDAD DE PAGO M3		ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
5	0.4	0.5	M3	1		

ITEM	ACEROS VIGA DE CIMENTACION V-002-A			UNIDAD DE PAGO KG		ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
			8 VARILLAS X 4.6 MTS = 36.8	KG	57.4	
			29 FLEJES X 1.50 = 43.5	KG	24.36	

ITEM	PARRILLA SUPERIOR			UNIDAD DE PAGO M3		ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
3.98	0.4	0.5	M3	0.79		


NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema



**CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

570

<b>INFORME DIARIO DE OBRA</b>		<b>CELSO ANDRES ROJAS CLEVES</b> <b>INGENIERO CIVIL MSC</b> T.P.: 25202-096642CND
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C. - SAN JOSE DEL FRAGUA	
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015	
<b>INTERVENTORIA:</b>	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES	
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	22/01/2016	
<b>DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA:</b>		
<b>RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:</b>	EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA SANITARIA, MONTAJE DE VIGA DE CIMENTACION (ACEROS) ARMAZON DE FORMALETA PARA VIGA DE CIMENTACION Y PEDESTALES B1-B2 Y B3 SE FUNDE VIGA B2 Y B3	
<b>PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR</b>		
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>		
		
FUNDICION DE VIGA DE CIMENTACION Y PEDESTALES		
REGISTRO	APROBO	
REGISTRO	APROBO	
		HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá

# INFORME DIARIO DE OBRA



<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
<b>INTERVENTORIA:</b>	CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	22/12/2015

## CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	AMARRE DE ACERO VIGA DE CERRAMIENTO	UNIDAD DE PAGO	KG	ANOTACION
LARGO	ANCHO	AREA	VOLUMEN	
24		KG	95.04 KG	LONGITUD TOTAL DE ACERO DE LA VIGA DE CERRAMIENTO
		KG	59.4 KG	118 FLEJES TOTALES DE LA VIGA

ITEM	SOLAO DE VIGA DE CERRAMIENTO	UNIDAD DE PAGO	M3	ANOTACION
LARGO	ANCHO	AREA	VOLUMEN	
28	0.25	M3	0.56	
1.1	0.25	M3	0.15	SON 7 TRAMOS

ITEM	PARRILLA INFERIOR	UNIDAD DE PAGO	M3	ANOTACION
LARGO	ANCHO	AREA	VOLUMEN	
2	0.35	M3	0.49	0.49 M3 X TRAMOS ENTRE EJE B Y C

ITEM	ZAPATA EJE E EXCAVACION MANUAL	UNIDAD DE PAGO	M3	ANOTACION
LARGO	ANCHO	AREA	VOLUMEN	
1.5	1.5	M3	2.25	




NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de adaptacion y diligenciar formato de esquema



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

547

INFORME DIARIO DE OBRA		CELSO ANDRES ROJAS CLEVES INGENIERO CIVIL, MSC T.P.: 25202-096642CND
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C. - SAN JOSE DEL FRAGUA	
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015	
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES	
FECHA DE REGISTRO:	23/01/2016	
DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA:		
RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:		
SE ARMAN FORMALETAS PARA FUNDIR PEDESTALES F6, F7 Y VIGA DE CIMENTACION F6, F7 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA SANITARIA INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA NOTA: LA EXCAVACION FUE SOLAMENTE PERFILADA		
PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR		
FUNDICION DE VIGA DE CIMENTACION		
REGISTRO FOTOGRAFICO		
		
INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA	CONTINUA FUNDICION DE VIGA DE CIMENTACION	FUNDICION DE PEDESTALES
REGISTRO	APROBO	APROBO
REGISTRO	APROBO	APROBO
		HOJA 1 DE



Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá

2016

## INFORME DIARIO DE OBRA

CEL SO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA		
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015		
<b>INTERVENTORIA:</b>	CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES		
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	25/01/2016		
<b>DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA:</b>			
<b>RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:</b>	<p>SE ARMAN FORMALETAS PARA COLUMNAS C4, C3 Y SE FUNDEAN</p> <p>INSTALACION DE ACERO PARA VIGAS DE CIMENTACION TRAMO B6-B7</p> <p>ARMADO DE ACEROS TRAMO B5-B6</p> <p>EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA</p>		
<b>PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR</b>			
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>			
			
EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA SANITARIA	ARMAJE DE FORMALETAS PARA COLUMNAS C4 Y C3		
REGISTRO	APROBO		
REGISTRO	APROBO		
			HOLLA IDE





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

## INFORME DIARIO DE OBRA



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	25/01/2016

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	FUNDICION COLUMNAS C4-C3			UNIDAD DE PAGO		ANOTACION
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
	0.35	0.35	2.2	M3	0.26	COLUMNA C4
	0.35	0.35	2.2	M3	0.26	COLUMNA C3

ITEM	ACERO VIGA DE CIMENTACION B5-B6			UNIDAD DE PAGO		ANOTACION
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
			8 VARILLAS X 15 MTS = 120MTS	KG	187.2	
			42 FLEJES X 1.50 MTS = 63MTS	KG	35.2	

ITEM	ACERO VIGA DE CIMENTACION B5-B4			UNIDAD DE PAGO		ANOTACION
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
			8 VARILLAS X 15 MTS = 120MTS	KG	187.2	
			42 FLEJES X 1.50 MTS = 63MTS	KG	35.2	

ITEM				UNIDAD DE PAGO		ANOTACION
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celso Rojas500@yahoo.com](mailto:celso Rojas500@yahoo.com)

Florencia - Caquetá






**CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

## INFORME DIARIO DE OBRA

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C. - SAN JOSE DEL FRAGUA		
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C. SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015		
<b>INTERVENTORIA:</b>	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES		
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	26/01/2016		
<b>DÍAS DESDE EL INICIO DE OBRA:</b>			
<b>RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:</b>			
SE ARMA FORMALETA PARA COLUMNA C3 Y SE FUNDE. SE FUNDE CAJA SANITARIA. NIVELACION ZONA PLACA			
FUNDICION PEDESTALES B7, B6 Y B5			
FUNDICION DE VIGAS DE CIMENTACION TRAMOS B7-B6, B6-B5, B5-B4.			
PEGUE DE LADRILLO ENTRE COLUMNAS C3 Y C4			
FUNDICION CAJA SANITARIA			
<b>PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR</b>			
FUNDICION DE COLUMNAS D6, E6, D2 Y E2.			
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>			
			
PEGUE DE LADRILLO C3 Y C4	NIVELACION TERRENO PARA PLACA	FUNDICION DE CAJA SANITARIA	
REGISTRO	APROBO		
REGISTRO	APROBO		
			HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



# **INFORME DIARIO DE OBRA**

<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
<b>INTERVENTORIA:</b>	CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	26/01/2016

## **CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO**

ITEM	FUNDICION COLUMNAS C4			UNIDAD DE PAGO M3		ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	COLUMNA C4	
0.35	0.35	2.2	M3	0.26		

ITEM	FUNDICION PEDESTALES B7, B6 Y B5			UNIDAD DE PAGO M3		ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
0.7	0.6	0.5	M3	0.21	B5	
0.7	0.6	0.5	M3	0.21	B6	
0.7	0.6	0.5	M3	0.21	B7	

ITEM	FUNDICION VIGAS DE CIMENTACION			UNIDAD DE PAGO M3		ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
5	0.4	0.5	M3	1	B6-B7	
4.95	0.4	0.5	M3	0.99	B6-B5	
4.95	0.4	0.5	M3	0.99	B5-B4	

ITEM	PEGUE DE LADRILLO ENTRE C3 Y C4			UNIDAD DE PAGO M2		ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
5.44		0.2	M2	1.08		

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

## INFORME DIARIO DE OBRA



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	26/01/2016

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

FUNDICION CAJA SANITARIA 01				UNIDAD DE PAGO: M3	
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN
	3.96	0.13	0.72	M3	0.37
UNIDAD DE PAGO:					
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN
UNIDAD DE PAGO:					
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN
UNIDAD DE PAGO:					
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema


REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com

Florencia - Caquetá



**CELISO ANDRES ROJAS  
CLEVES**  
INGENIERO CIVIL, MSC  
T.P.: 3202-096642CND

---

HOIA 1 OF

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
 Florencia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

# INFORME DIARIO DE OBRA

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	27/01/2016

## CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	FUNDICION DE COLUMNAS D2, D6			UNIDAD DE PAGO M3	
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	ANOTACION
0.3	0.3	1.1	M3	0.1	D2
0.3	0.3	2	M3	0.18	D6

ITEM	FUNDICION DE COLUMNAS E6			UNIDAD DE PAGO M3	
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	ANOTACION
0.3	0.3	1.2	M3	0.108	E3

ITEM	EXCAVACION MANUAL TUBERIA SANITARIA			UNIDAD DE PAGO M3	
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	ANOTACION
14.8	0.2	0.195	M3	0.5	
16.8	0.2	0.2	M3	0.6	

ITEM	TUBERIA INSTALADA			TUBERIA INSTALADA MTS LINEALES	
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	ANOTACION
	2"	1.08 + 15.77 = 16.85	MTS		
	3"	3.12 + 8.20 = 11.32	MTS		
	6"	19.8	MTS		

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com

Florencia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVÉS  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

224

## INFORME DIARIO DE OBRA

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVÉS  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVÉS
FECHA DE REGISTRO:	27/01/2016

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	PEGUE DE LADRILLO ACOSTADO				UNIDAD DE PAGO M2	
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	ANOTACION	
5.44		1.23	M2	6.6	ENTRE COLUMNAS C3 - C4	

ITEM	SOLAS CAJA SANITARIA				UNIDAD DE PAGO M3	
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	ANOTACION	
1		0.15	M3	0.15	CAJA A	
1		0.15	M3	0.15	CAJA B	

ITEM					UNIDAD DE PAGO:	
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	ANOTACION	

ITEM					UNIDAD DE PAGO:	
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	ANOTACION	

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema

REGISTRO

APROBO



HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com

Florencia - Caquetá

## INFORME DIARIO DE OBRA

**CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL, MSC**  
 T.P.: 25202-096642CND

<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA		
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015		
<b>INTERVENTORIA:</b>	CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES		
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	26/01/2016		
<b>DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA:</b>			
<b>RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:</b>	PEGUE DE LADRILLO, FUNDICION DE COLUMNAS E2, E3, D4 Y D5 SE FUNDE TAPA PARA CAJA SANITARIA, NIVELACION Y RELLENO PARA ZONA DE PLACA ARMAZON DE FORNALETA PARA PEDESTAL INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA		
<b>PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR</b>			
<b>FUNDICION PLACA CAMERINO</b>			
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>			
CONTINUA PEGUE DE LADRILLO			
REGISTRO	APROBO		
REGISTRO	APROBO		
			HOJA 1 DE





CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

## INFORME DIARIO DE OBRA



CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	28/01/2016

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	PEQUE DE LADRILLO ACOSTADO			UNIDAD DE PAGO M2		ANOTACION
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
	3.53		0.7	M2	2.47	
	5.44		0.69	M2	3.75	
ITEM	FUNDICION DE TAPA DE CAJA SANITARIA			UNIDAD DE PAGO M3		ANOTACION
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
1			0.05	M3	0.05	
ITEM	FUNDICION DE COLUMNAS			UNIDAD DE PAGO M3		ANOTACION
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
0.3	0.3		1.9	M3	0.171	E2
0.3	0.3		1.9	M3	0.171	E3
0.3	0.3		1.1	M3	0.099	D4
ITEM				UNIDAD DE PAGO M3		ANOTACION
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	
0.3	0.3		1.01	M3	0.09	0.5

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE


Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com

Florencia - Caquetá

## INFORME DIARIO DE OBRA

**CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
 T.P.: 25202-096642CND



<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C. - SAN JOSE DEL FRAGUA		
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C. SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015		
<b>INTERVENTORIA:</b>	CEL SO ANDRES ROJAS CLEVES		
<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	29/01/2016		
<b>DIAS DESDE EL INICIO DE OBRA:</b>			
<b>RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	NIVELACION Y MOVIMIENTO DE MATERIAL RELLENO DE AREA DE TUBERIA SANITARIA PEGUJE DE LADRILLO ACOSTADO FUNDICION DE PLACA AREA DE CAMERINO		
<b>PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR</b>	FUNDICION DE COLUMNAS		
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>			
			
FUNDICION PLACA CAMERINO			
REGISTRO		APROBO	
REGISTRO		APROBO	
			HOJA 1 DE



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

## INFORME DIARIO DE OBRA

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	29/01/2016

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM		FUNDICION PLACA CAMERINO		UNIDAD DE PAGO M3		ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
22	3.6	0.1	M3	7.9		
ITEM		PEGUE DE LADRILLO ENTRE 4C - 4E		UNIDAD DE PAGO M2		ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
3.53		1.3		4.5	ENTRE C4 Y C4'	
ITEM		AREA DE RELLENO TUBERIA SANITARIA		UNIDAD DE PAGO M3		ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
				7.05	EL CALCULO SE HIZO CON LA FORMULA HERON RESTANDO ESTE VOLUMEN AL AREA	
					TOTAL DE EXCAVACION EN TUBERIA 2", 3", 4" Y 6"	
ITEM		NIVELACION Y MOVIMIENTO DE TIERRA		UNIDAD DE PAGO:		ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
7.9	5		M2	323	39.5	395
43	9.5		M2	39.5	323	134.3
1.3	2.9		M2	3.7	3.77	

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema


REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com

Florencia - Caquetá



NIT 80.233.290

# INFORME DIARIO DE OBRA

**CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL, MSC  
T.P.: 25202-096642CND**



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA	
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015	
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES	
FECHA DE REGISTRO:	29/01/2016	

**CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO**

[illegible]

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaración y diligenciar formato de esquema

REGISTRO

APROBO

HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [ce.soroja500@yahoo.com](mailto:ce.soroja500@yahoo.com)

**Florencia - Caquetá**




CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

## INFORME DIARIO DE OBRA

CELSO ANDRES ROJAS  
CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND



PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015		
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES		
FECHA DE REGISTRO:	30/01/2016		
DÍAS DESDE EL INICIO DE OBRA:			
RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:			
SE FUNDEN COLUMNAS D2, E4 Y E5. PEGUE DE LADRILLO.			
PROXIMAS ACTIVIDADES A EJECUTAR			
PEGUE DE LADRILLO, CORTE DE ACERO, NIVELACION Y RELLENO			
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>			
			
FUNDICION COLUMNAS D2, E4 Y E5			
REGISTRO	APROBO		
REGISTRO	APROBO		
			HOJA 1 DE

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá



## INFORME DIARIO DE OBRA

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - SAN JOSE DEL FRAGUA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 - CONTRATO No. 028 DE 2015
INTERVENTORIA:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
FECHA DE REGISTRO:	30/01/2016

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL DIA EVALUADO

ITEM	FUNDICION DE COLUMNAS			UNIDAD DE PAGO: M3		ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
0.3	0.3	1.03	M3	0.092	D3	
0.3	0.3	1.97	M3	0.177	E4	
0.3	0.3	1.97	M3	0.177	E5	

ITEM	UNIDAD DE PAGO:			ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	

ITEM	UNIDAD DE PAGO:			ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	

ITEM	UNIDAD DE PAGO:			ANOTACION
LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	

NOTA: Si se requiere esquema se debe anotar que se incluye esquema de aclaracion y diligenciar formato de esquema

REGISTRO	APROBO	HOJA 1 DE
----------	--------	-----------

Celular: 313 252 6581 E-mail: ccslorojas500@yahoo.com

Florencia - Caquetá



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND


NIT 80.233.290

529

## FICHAS DE INFORME SEMANAL.




20

	Formato	Subdirección de Infraestructura
	<b>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 1</b>	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA	
<b>Contratista:</b>	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015
<b>Contrato No.</b>	CONTRATO No. 028 DE 2015
<b>Valor Inicial:</b>	\$ 720,900,000.00
<b>Valor Actualizado:</b>	\$ 720,900,000.00
<b>Plazo Inicial:</b>	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015
<b>Plazo Actualizado:</b>	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015
<b>Fecha de Iniciación:</b>	10 DE NOV DE 2015
<b>Fecha de Vencimiento:</b>	30 DE DIC DE 2015
<b>Semana Número:</b>	9
<b>Nombre del Supervisor</b>	Oet 04/01/2015 Al: 10/01/2015 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 62 días DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ BOLAÑOS

AVANCE DEL CONVENIO					
	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5.10%	75.80%	Obra Física Ejecutada (%)	4.04%	45.90%
Valor de la Obra	\$ 38.812.201.00	\$ 546.674.578.00	Valor de la Obra	\$ 29.143.294.00	\$ 331.003.764.00

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	70.75%	38.85%	
Durante el periodo	5.10%	4.04%	
Acumulado actual	75.80%	45.90%	-29.90%



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se retoman actividades y se adelanta construcción de elementos de cimientó. Se realiza suspensión de actividades esta semana debido al cambio de equipo de trabajo. No se registra trabajos en taller debido a que no se registra llegada de materiales a sitio de taller por despacho desde fabrica.

### ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se programa retomar actividades el día lunes 04 de enero. Se programa retomar fundida de concretos para cimientos. Se programa continuar con armado de aceros para estructura y continuar con los trabajos en taller.

## RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

SE REGISTRAN AVANCES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA CIMENTACIÓN. SE TIENEN CONSIDERABLES AVANCES EN LAS EXCAVACIONES Y EN EL CORTE Y FIGURADO DE ACEROS. CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TALLER PARA ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA. SE CUENTA EN OBRA CON TRES FRENTE MARCADOS DE TRABAJO (EXCAVACIONES Y FIGURADO DE ACERO (2 FRENTE) Y ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA EN TALLER. SE AVANZA EN EL PROCESO DE INSTALACION DE CONCRETOS PARA FUNDIR ELEMENTOS DE CIMENTACION

[illegible]





**CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND

**NIT 80.233.290**

	Formato	Subdirección de Infraestructura
	<b>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 1</b>	Código Formato:
	Página 1 de 1	

<b>CONTRATO DE OBRA</b>			
Contratista:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015	Objeto:	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA).
Contrato No:	CONTRATO No. 028 DE 2015		
Valor Inicial:	\$ 720,900,000.00		
Valor Actualizado:	\$ 720,900,000.00		
Plazo Inicial:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015		
Plazo Actualizado:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015		
Fecha de Iniciación:	10 DE NOV DE 2015		
Fecha de Vencimiento:	30 DE DIC DE 2015		
Semana Número:	10	Del: 11/01/2016 Al: 17/01/2016	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 89 días
Nombre del Supervisor:	DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ BOLAÑOS		

<b>AVANCE DEL CONVENIO</b>			
Obra programada (%)	SEMANAL 6.62%	ACUMULADO 82.42%	Obra Física Ejecutada (%) SEMANAL 3.96% ACUMULADO 49.86%
Valor de la Obra	\$ 47,721,710.00	\$ 594,396,289.00	Valor de la Obra \$ 28,542,852.00 \$ 359,346,516.00

<b>GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO</b>			
	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	75.80%	45.90%	-45.90%
Durante el periodo	6.62%	3.96%	-32.56%
Acumulado actual	82.42%	49.86%	

<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>	

<b>ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA</b>
Se retoman actividades de obra. Se tienen avances considerables en la construcción de elementos de cimentación. Se funden elementos tipo viga y se alistan aceros para elementos tipo pedestal en estructura de almineto. Se registra salida de bodega de material para construcción de estructura metálica.

<b>ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA</b>
Se programa continuar con la construcción de elementos de cimentación. Se programa continuar con trabajos en taller.

<b>RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO</b>	
SE REGISTRAN AVANCES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION. SE TIENEN CONSIDERABLES AVANCES EN LAS EXCAVACIONES Y EN EL CORTE Y FIGURADO DE ACEROS. CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TALLER PARA ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA. SE CUENTA EN OBRA CON TRES FRENTES MARCADOS DE TRABAJO (EXCAVACIONES Y FIGURADO DE ACERO (2 FRENTES) Y ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA EN TALLER. SE AVANZA EN EL PROCESO DE INSTALACION DE CONCRETOS PARA FUNDIR ELEMENTOS DE CIMENTACION	

<b>OBSERVACIONES</b>	<b>FIRMAS</b>
	Residente Director de Interventoría Nombre: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES cc: 80.233.290
	Supervisor Municipio Nombre: Diego Alejandro Fernandez Bolaños cc: 6.805.794 de Florencia - Caquetá



**CELSONDRES ROJAS CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND

**NIT 80.233.290**

332

Formato		Subdirección de Infraestructura
<b>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 1</b>		Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA			
Contratista:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015		
Contrato No.	CONTRATO No. 028 DE 2015		
Valor Inicial:	\$	720.900.000.00	Objeto
Valor Actualizado:	\$	720.900.000.00	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA).
Plazo Inicial:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015		
Plazo Actualizado:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015		
Fecha de Inicio:	10 DE NOV DE 2015		
Fecha de Vencimiento:	30 DE DIC DE 2015		
Semana Número:	11	Del:	18/01/2016 Al: 24/01/2015
Nombre del Supervisor	DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ BOLAÑOS		

AVANCE DEL CONVENIO			
Obra programada (%)	SEMANAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)
Valor de la Obra	\$ 21,528,029.00	\$ 615,924,318.00	SEMANAL
			ACUMULADO
			\$ 8,527,269.00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO			
%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA	
Acumulado anterior	82.42%	49.86%	-34.37%
Durante el periodo	2.99%	1.18%	
Acumulado actual	85.41%	51.04%	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

Se avanza en el proceso de construcción de la cimentación. Se da inicio al proceso de pega de ladrillo acostado para la construcción de los muros de contención de tierras en la zona de camerinos y graderías. Se retoman trabajos en taller de estructura metálica.

**ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

Se programa avanzar con el proceso de pega de ladrillo para muros acostados. Se programa avanzar en el proceso de término de construcción de vigas de cemento. Se programa avanzar en los trabajos de taller.

**RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO**

SE REGISTRAN AVANCES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA CIMENTACIÓN. SE TIENEN CONSIDERABLES AVANCES EN LAS EXCAVACIONES Y EN EL CORTE Y FIGURADO DE ACEROS. CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TALLER PARA ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA. SE CUENTA EN OBRA CON TRES FRENTES MARCADOS DE TRABAJO (EXCAVACIONES Y FIGURADO DE ACERO (2 FRENTES) Y ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA EN TALLER. SE AVANZA EN EL PROCESO DE INSTALACION DE CONCRETOS PARA FUNDIR ELEMENTOS DE CIMENTACION

OBSERVACIONES	FIRMAS
	Residente Director de Interventoría
	Nombre: CELSONDRES ROJAS CLEVES cc: 80.233.290
	Supervisor Municipio
	Nombre: Diego Alejandro Fernandez Bolaños cc: 6.805.394 de Florencia - Caquetá



**CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND

**NIT 80.233.290**

Formato		Subdirección de Infraestructura
<b>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 1</b>		Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA	
<b>Contratista:</b> UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015	<b>Objeto:</b> CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA).
<b>Contrato No.:</b> 029 DE 2015	
<b>Valor Inicial:</b> \$ 720,900,000.00	
<b>Valor Actualizado:</b> \$ 720,900,000.00	
<b>Plazo Inicial:</b> 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015	
<b>Plazo Actualizado:</b> 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015	
<b>Fecha de Inicio:</b> 10 DE NOV DE 2015	
<b>Fecha de Vencimiento:</b> 30 DE DIC DE 2015	
<b>Semana Número:</b> 12	<b>Del:</b> 25/01/2016 <b>Al:</b> 31/01/2016 <b>Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:</b> 83 días
<b>Nombre del Supervisor:</b> DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ BOLAÑOS	

AVANCE DEL CONVENIO					
<b>Obra programada (%)</b>	<b>SEMANAL</b> 3.98%	<b>ACUMULADO</b> 89.39%	<b>Obra Física Ejecutada (%)</b>	<b>SEMANAL</b> 2.85%	<b>ACUMULADO</b> 53.89%
<b>Valor de la Obra</b>	\$ 28,715,321.00	\$ 644,639,539.00	<b>Valor de la Obra</b>	\$ 20,569,449.00	\$ 386,643,235.00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO			
	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	89.39%	51.04%	
Durante el periodo	3.98%	2.85%	-18.50%
Acumulado actual	89.39%	53.89%	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
Se registra termino de proceso de excavación, armado de aceros y fundida de concretos de cimiento. Se registra avance en el armado de estructura metálica de cubierta. Se registra avance en la pega de bloque para muro de contención. Se registra avance en la construcción de cerramiento perimetral.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
Se programa avanzar con el proceso de pega de ladrillo para muros acostados. Se programa avanzar en el proceso de construcción de elementos de concreto tipo pedestal. Se programa avanzar en los trabajos de taller.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO	
SE REGISTRAN AVANCES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA CIMENTACIÓN. SE TIENEN CONSIDERABLES AVANCES EN LAS EXCAVACIONES Y EN EL CORTE Y FIGURADO DE ACEROS. CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TALLER PARA ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA. SE CUENTA EN OBRA CON TRES FRENTES MARCADOS DE TRABAJO (EXCAVACIONES Y FIGURADO DE ACERO (2 FRENTES) Y ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA EN TALLER. SE AVANZA EN EL PROCESO DE INSTALACION DE CONCRETOS PARA ELEVACIONES.	

OBSERVACIONES	FIRMAS
	<b>Residente Director de Interventoría</b> Nombre: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES cc: 80.233.290
	<b>Supervisor Municipio</b> Nombre: Diego Alejandro Fernandez Bolaños cc: 8.805.394 de Florencia - Caquetá




CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

27

## PROGRAMACION DE OBRA / CORTE DE OBRA



**T.P.: 25202-096642CND**

[illegible]

Cellular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
 Florencia - Caquetá



**CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND

**NIT 80.233.290**

536

Florencia, Enero 2016

El suscrito Ingeniero Civil, **CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**, identificado con cédula de ciudadanía No. **80.233.290** de Bogotá, y matrícula profesional **25202 – 096642** CND de Bogotá, en calidad de INTERVENTOR del proyecto “CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENITO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)”, enmarcado en el contrato No. 028 de 2015,

**CERTIFICA,**

Que el CONTRAISTA, UNION TEMPORAL SAN JOSE DEL FRAGUA C.I.C 2015, representado legalmente por el Arquitecto William Artunduaga, realizo, los pagos de seguridad social para el proyecto citado de acuerdo a los requerimientos legales de la normativa colombiana.

**CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
C.C. 80.233.290  
INGENIERO CIVIL MSc.  
Interventor de Proyecto.



**CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND

**NIT 80.233.290**

522

Florencia, Diciembre 2015

El suscrito Ingeniero Civil, **CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**, identificado con cédula de ciudadanía No. **80.233.290** de Bogotá, y matrícula profesional **25202 - 096642** CND de Bogotá, en calidad de INTERVENTOR del proyecto "CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENITO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)", enmarcado en el contrato No. 028 de 2015,

**CERTIFICA,**

Que el CONTRAISTA, UNION TEMPORAL SAN JOSE DEL FRAGUA C.I.C 2015, representado legalmente por el Arquitecto William Artunduaga, presenta un avance de obra equivalente al 53.89 % de la inversión contratada y ejecutada a la fecha de corte del presente informe.

**CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
INGENIERO CIVIL MSc.  
Interventor de Proyecto.



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES  
INGENIERO CIVIL MSC  
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

405

016 – FL-CIC -SJF

Florencia, Febrero de 2016

Doctor.

MAXIMINO SANDOVAL AMADO.

**Supervisor de Convenio F-212.**

Construcción de Centro de Integración Ciudadana C.I.C San José del Fragua.

**Referencia:** CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENITO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA).

**Asunto:** Retrasos de Obra.

Cordial saludo

En vista del notable retraso de las obras en el contrato de la referencia, esta interventoría informa de manera oportuna a usted como representante de la entidad contratante, y en calidad de supervisor del proyecto, que se han presentado retrasos debido a los siguientes factores:

- Se dio inicio al proyecto en fechas cercanas a las festividades de fin de año, y a las festividades municipales (04-07 de Diciembre), fechas en las que fue imposible contar con mano de obra no calificadas.
- La deserción de personal que se presentó como fenómeno masivo para la fecha de cambio de año (salida de personal desde el 24 de diciembre), sin reintegro a la obra.
- Fuerte verano en el sector, que llevo a declarar al municipio en calamidad pública y emergencia sanitaria (noticia nacional), desde inicio de enero hasta los primeros días del mes de febrero (tres (03) semanas a partir del 11 de enero hasta el 2 de febrero del 2016).
- La administración de la empresa de agua potable determino el no suministro de agua al proyecto y a todos los proyectos de construcción en el municipio, con el fin de priorizar el uso del recurso para el destino doméstico.

Celular: 313 252 6581 E-mail: [celsorojas500@yahoo.com](mailto:celsorojas500@yahoo.com)  
Florencia - Caquetá





**CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
**INGENIERO CIVIL MSC**  
T.P.: 25202-096642CND

**NIT 80.233.290**

- Se presentó inconvenientes con el suministro oportuno de material para la construcción de la estructura metálica y para el figurado de los pernos y el maquinado de los elementos en taller. Lo anterior justificado por el cierre de año de las compañías que produce el acero en Colombia y sus distribuidores.


Se suscribe muy atentamente,

**CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**  
C.C. 80.233.290  
INGENIERO CIVIL MSc.

c.c. Arq. William Artunduaga. Representante Legal Unión Temporal CIC San José del Fragua  
2015. Contratista Constructor.  
c.c. Juan José Blanco Oviedo. Subdirección de infraestructura. Ministerio del interior

Fichas info. NOV-1016-2015

407

 <b>MININTERIOR</b>	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	
	FECHA	12/10/2015


CONTRATO DE OBRA			
<b>Contratista:</b> UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 <b>Contrato No.:</b> CONTRATO No. 028 DE 2015 <b>Valor Inicial:</b> \$ 720.900.000,00 <b>Valor Actualizado:</b> \$ 720.900.000,00 <b>Plazo Inicial:</b> 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 <b>Plazo Actualizado:</b> 28 DE FEBRERO DE 2016 <b>Fecha de Iniciación:</b> 10 DE NOV DE 2015 <b>Fecha de Vencimiento:</b> 30 DE DIC DE 2015 <b>Semana Número:</b> 5 Del: 07/12/2015 Al: 13/12/2015 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 34 días <b>Nombre del Supervisor:</b> DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ BOLAÑOS	<b>Objeto:</b> CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA).		


  

AVANCE DEL CONVENIO					
Obra programada (%)	SEMANAL 10,33%	ACUMULADO 51,78%	Obra Física Ejecutada (%)	SEMANAL 2,65%	ACUMULADO 18,79%
Valor de la Obra	\$ 74.496.473,00	\$ 373.275.970,00	Valor de la Obra	\$ 19.132.092,00	\$ 135.449.396,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO			
	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	34,13%	16,14%	-32,99%
Durante el periodo	10,33%	2,65%	
Acumulado actual	51,78%	18,79%	

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL	
	
PROCESO CONSTRUCTIVO DE CIMENTACIONES	



FRENTE 1 CERRAMIENTO
SE CONTINUA CON EL PROCESO DE EXCAVACION Y ARMADO DE ACERO PARA LA VIGA DE CIMIENTO DEL LADO POSTERIOR DEL PROYECTO Y LADO IZQUIERDO.
FRENTE 2 GRADERIAS
SE CONTINUA EL PROCESO DE EXCAVACION PARA CIMIENTOS. SE INICIA COLOCACION DE CONCRETO PARA MEJORAMIENTO EN LAS CIMENTACIONES PARA LA GRADERIAS. SE TIENE CORTADO Y FIGURADO ACERO DE REFUERZO PARA TODAS LAS ZAPATAS.
FRENTE 3 TARIMA
SE INICIAN EXCAVACIONES PARA CIMENTACIONES. SE ADEANTA EN EL CORTADE Y FIGURADO DEL ACERO DE REFUERZO.
FRENTE 4 PLACA CANCHA DEPORTIVA
NO SE ADELTAN LABORES EN ESTE FRENTE DE TRABAJO.
FRENTE 5 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA
SE CONTINUA EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN TALLER. SE ADELANTA EN CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO Y VACIADO DE CONCRETO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES.





OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	<b>ALCALDE MUNICIPAL</b> Nombre: Carlos Enrique Diaz Salazar. cc 17.651.000 de Florencia.
	<b>INTERVENTOR</b> Nombre : Celso Andes Rojas Cleves cc 80.233.290 de Bogota
	<b>SUPERVISOR MUNICIPAL</b> Nombre : Diego Alejandro Fernandez Bolaños cc 6.805.394 de Florencia - Caqueta





908

 	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	
	FECHA 12/10/2015	


CONTRATO DE OBRA																						
<b>Contratista:</b> Contrato No. Valor Inicial: Valor Actualizado: Plazo Inicial: Plazo Actualizado: Fecha de Iniciación: Fecha de Vencimiento: Semana Número: Nombre del Supervisor	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 CONTRATO No. 028 DE 2015 \$ 720.900.000,00 \$ 720.900.000,00 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 28 DE FEBRERO DE 2016 10 DE NOV DE 2015 30 DE DIC DE 2015 6 Del: 14/12/2015 Al: 20/12/2015 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 41 días DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ BOLAÑOS	<b>Objeto</b> CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENITO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA).																				
	AVANCE DEL CONVENIO																					
	Obra programada (%) Valor de la Obra	<b>SEMANAL</b> 7,37% \$ 53.100.841,00	<b>ACUMULADO</b> 59,15% \$ 426.376.811,00	Obra Física Ejecutada (%) Valor de la Obra	<b>SEMANAL</b> 4,79% \$ 34.552.056,00	<b>ACUMULADO</b> 24,02% \$ 173.177.520,00																
	GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO			REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>%PROGRAMADO</th> <th>% EJECUTADO</th> <th>DIFERENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acumulado anterior</td> <td>51,78%</td> <td>18,79%</td> <td>-35,13%</td> </tr> <tr> <td>Durante el periodo</td> <td>7,37%</td> <td>4,79%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acumulado actual</td> <td>59,15%</td> <td>24,02%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 				%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	Acumulado anterior	51,78%	18,79%	-35,13%	Durante el periodo	7,37%	4,79%		Acumulado actual	59,15%	24,02%		 PROCESO CONSTRUCTIVO DE CIMENTACIONES		
		%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA																		
Acumulado anterior	51,78%	18,79%	-35,13%																			
Durante el periodo	7,37%	4,79%																				
Acumulado actual	59,15%	24,02%																				
FRENTE 1 CERRAMIENTO																						
SE CONTINUA CON EL PROCESO DE EXCAVACION Y ARMADO DE ACERO PARA LA VIGA DE CIMIENTO DEL LADO POSTERIOR DEL PROYECTO Y LADO IZQUIERDO. SE INICIA VACIADO DE CONCRETOS																						
FRENTE 2 GRADERIAS																						
SE CONTINUA EL PROCESO DE EXCAVACION PARA CIMIENTOS. SE CONTINUA COLOCACION DE CONCRETO PARA LAS CIMENTACIONES DE LA GRADERIAS.																						
FRENTE 3 TARIMA																						
SE CONTINUA EXCAVACIONES PARA CIMENTACIONES. SE ADEANTA EN EL CORTADE Y FIGURADO DEL ACERO DE REFUERZO.																						
FRENTE 4 PLACA CANCHA DEPORTIVA																						
NO SE ADELANTAN LABORES EN ESTE FRENTE DE TRABAJO.																						
FRENTE 5 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA																						
SE CONTINUA EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN TALLER. SE CONTINUA EN CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO Y VACIADO DE CONCRETO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES.																						
OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR			FIRMAS																			
			ALCALDE MUNICIPAL	Nombre: Carlos Enrique Diaz Salazar. cc 17.651.000 de Florencia																		
			INTERVENTOR	 Nombre: Celso Andes Rojas Clevet cc 80.233.290 de Bogotá																		
			SUPERVISOR MUNICIPAL	 Nombre: Diego Alejandro Fernandez Bolaños cc 6.805.394 de Florencia - Caqueta																		



 	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	
	FECHA	
		12/10/2015

CONTRATO DE OBRA	
<b>Contratista:</b> UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 <b>Contrato No.:</b> CONTRATO No. 028 DE 2015 <b>Valor Inicial:</b> \$ 720.900.000,00 <b>Valor Actualizado:</b> \$ 720.900.000,00 <b>Plazo Inicial:</b> 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 <b>Plazo Actualizado:</b> 28 DE FEBRERO DE 2016 <b>Fecha de Iniciación:</b> 10 DE NOV DE 2015 <b>Fecha de Vencimiento:</b> 30 DE DIC DE 2015 <b>Semana Número:</b> 7 Del: 21/12/2015 Al: 31/12/2015 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 51 días <b>Nombre del Supervisor:</b> DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ BOLAÑOS	<b>Objeto:</b> CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENITO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA).

AVANCE DEL CONVENIO			
Obra programada (%)	SEMANAL 5,37%	ACUMULADO 64,51%	Obra Física Ejecutada (%)
Valor de la Obra	\$ 38.702.253,00	\$ 465.079.064,00	SEMANAL 14,83%
			ACUMULADO 38,85%
			Valor de la Obra \$ 106.917.365,00 \$ 280.094.886,00

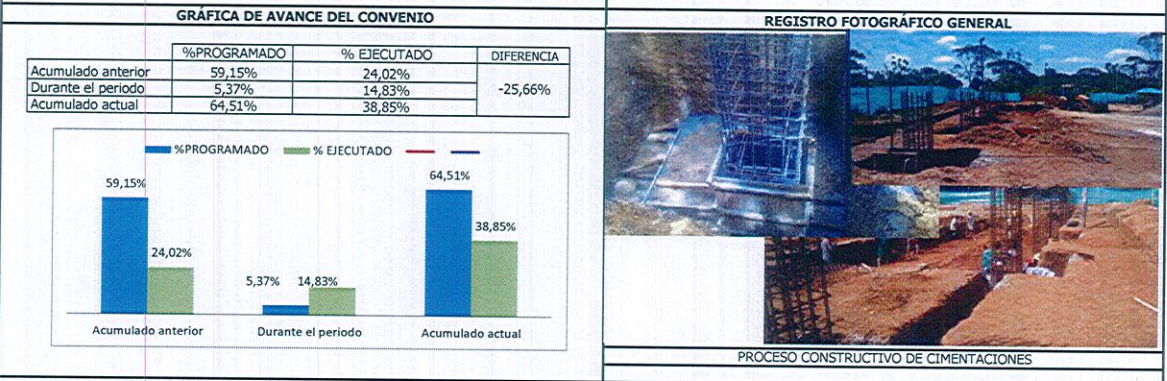

**FRENTE 1 CERRAMIENTO**

SE CONTINUA CON EL VACIADO DE CONCRETOS PARA LOS CIMIENTOS DEL LADO POSTERIOR DEL PROYECTO Y LADO IZQUIERDO. A PARTIR DEL DIA 23 DE DICIEMBRE SE SUSPENDEN ACTIVIDADES POR FIESTAS NAVIDEÑAS.

**FRENTE 2 GRADERIAS**

SE CONTINUA EL PROCESO DE EXCAVACION PARA CIMIENTOS. SE CONTINUA COLOCACION DE CONCRETO PARA LAS CIMENTACIONES DE LA GRADERIAS. A PARTIR DEL DIA 23 DE DICIEMBRE SE SUSPENDEN ACTIVIDADES POR FIESTAS NAVIDEÑAS.

**FRENTE 3 TARIMA**

SE CONTINUA EXCAVACIONES PARA CIMENTACIONES. SE ADEANTA EN EL CORTADE Y FIGURADO DEL ACERO DE REFUERZO. A PARTIR DEL DIA 23 DE DICIEMBRE SE SUSPENDEN ACTIVIDADES POR FIESTAS NAVIDEÑAS.

**FRENTE 4 PLACA CANCHA DEPORTIVA**



NO SE ADELTAN LABORES EN ESTE FRENTE DE TRABAJO.

**FRENTE 5 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA**

SE CONTINUA EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN TALLER. SE CONTINUA EN CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO Y VACIADO DE CONCRETO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES. A PARTIR DEL DIA 23 DE DICIEMBRE SE SUSPENDEN ACTIVIDADES POR FIESTAS NAVIDEÑAS.



OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	<b>ALCALDE MUNICIPAL</b> Nombre: Carlos Enrique Diaz Salazar. cc 17.651.000 de Florencia.
	<b>INTERVENTOR</b> Nombre : Celso Andes Rojas Cleves cc 80.233.290 de Bogota
	<b>SUPERVISOR MUNICIPAL</b> Nombre : Diego Alejandro Fernandez Bolaños cc 6.805.394 de Florencia - Caqueta



 	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	
	FECHA 12/10/2015	

CONTRATO DE OBRA	
<b>Contratista:</b> UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015 <b>Contrato No.:</b> CONTRATO No. 028 DE 2015 <b>Valor Inicial:</b> \$ 720.900.000,00 <b>Valor Actualizado:</b> \$ 720.900.000,00 <b>Plazo Inicial:</b> 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 <b>Plazo Actualizado:</b> 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 <b>Fecha de Iniciación:</b> 10 DE NOV DE 2015 <b>Fecha de Vencimiento:</b> 30 DE DIC DE 2015 <b>Semana Número:</b> 4 Del: 30/11/2015 Al: 06/12/2015 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 20 días <b>Nombre del Supervisor:</b> DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ BOLAÑOS	<b>Objeto:</b> CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENITO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA).

AVANCE DEL CONVENIO			
Obra programada (%)	SEMANAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)
	20,47%	34,13%	
Valor de la Obra	\$ 147.559.676,00	\$ 246.011.085,00	Valor de la Obra
			SEMANAL
			3,09%
			ACUMULADO
			16,14%
			\$ 22.283.689,00
			\$ 116.317.304,00

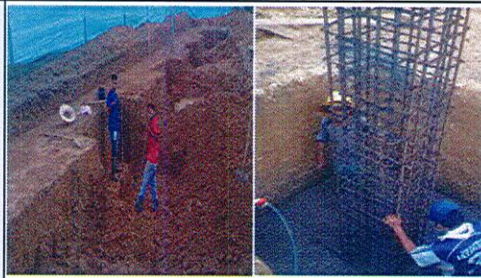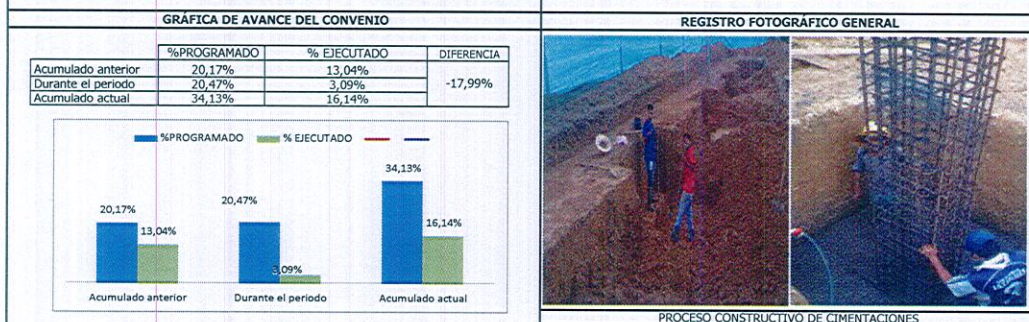

PROCESO CONSTRUCTIVO DE CIMENTACIONES

FRENTE 1 CERRAMIENTO	
SE CONTINUA CON EL PROCESO DE EXCAVACION PARA LA VIGA DE CIMIENTO DEL LADO POSTERIOR DEL PROYECTO.	
FRENTE 2 GRADERIAS	
SE CONTINUA EL PROCESO DE EXCAVACION PARA CIMIENTOS. SE ADELANTA DEMARCADO DE ZAPATAS PARA ESTRUCTURA PRINCIPAL E INICIO DE COLOCACION DE CONCRETO PARA MEJORAMIENTO. SE TIENE CORTADO Y FIGURADO ACERO DE REFUERZO PARA TODAS LAS ZAPATAS.	
FRENTE 3 TARIMA	
ACTIVIDADES PARALELAS CON EL FRENTE DE TRABAJO DE LAS GRADERIAS	
FRENTE 4 PLACA CANCHA DEPORTIVA	
NO SE ADELTAN LABORES EN ESTE FRENTE DE TRABAJO.	
FRENTE 5 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA	
SE CONTINUA EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN TALLER. SE ADELANTA EN CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	
OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	<b>ALCALDE MUNICIPAL</b> Nombre: Carlos Enrique Diaz Salazar. cc 17.651.079 de Florencia
	<b>INTERVENTOR</b> Nombre: Celso Andes Rojas Claves cc 80.233.290 de Bogota
	<b>SUPERVISOR MUNICIPAL</b> Nombre: Diego Alejandro Fernandez Bolaños cc 6.805.394 de Florencia - Caqueta



1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO												
CONVENIO N° F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)												
Objeto del Convenio:		ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)										
Valor del Convenio:	\$ 735.000.000,00	Aporte de Mininterior:		\$ 735.000.000,00								
Valor Adición:	\$ 48.000.000,00			Aportes del Municipio: \$ 48.000.000,00								
Valor Total:	\$ 783.000.000,00											
Plazo de Ejecución:	7 MESES	Suspensión 1		Prórroga N° 1 NA								
Fecha de Inicio:	08 DE MAYO DEL 2015	Suspensión 2		Reinicio: NA								
Vencimiento:	30 DE NOVIEMBRE DE 2015			Prórroga N° 2 NA								
Póliza de garantía única:		Valor										
Aseguradora Solidaria de Colombia	Desde	07/05/2015	Hasta	31/05/2016	\$ 78.300.000,00		Hasta					
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO												
Informe N°	5	Periodo comprendido entre el 03 de OCTUBRE del 2015 y el 03 de NOVIEMBRE del 2015										
Proyecto	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)											
Localización	MUNICIPIO SAN JOSE DEL FRAGUA											
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS												
Objeto:	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA".											
Contrato N°:	MC-053 DEL 2015											
Contratista:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA											
Plazo Inicial:	15 dias											
Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015											
*Fecha de Suspensión	19 de Junio de 2015											
*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015											
Fecha de Terminación:	13 de Julio de 2015											
Prórrogas:												
Plazo Actualizado:												
Valor Inicial:	\$ 3.000.000,00											
Valor Adiciones:	\$ -											
Valor Actualizado:	\$ -											
Valor pagado:	\$ -											
Valor por pagar:	\$ 3.000.000,00											
Póliza Seguro de cumplimiento	N° 630-47-994000006429	VIGENCIA: 09/06/2015 - 15/01/2015		VALOR: 750.000								
Nombre Supervisor:	DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ											
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias												
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA												
Objeto:	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN COMPLEMENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CORNAMENDACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.											
Contrato N°:	028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015											
Contratista:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015											
Plazo Inicial:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015											
Fecha de Inicio:												
*Fecha de Suspensión												
*Fecha de Reinicio:												
Fecha de Terminación:												
Prórrogas:												
Plazo Actualizado:												
Valor Inicial:												
Valor Adiciones:												
Valor Actualizado:												
Valor pagado:												
Valor por pagar:												

INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 006	
Nombre Supervisor:	Nombre Interventor:
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y retiros - Suprima las casillas innecesarias	

INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 006

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015					CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052de 2015				
CONCEPTO	VIGENTE (fechas)		VALOR		CONCEPTO	VIGENTE (fechas)		VALOR	
	DESDE	HASTA				DESDE	HASTA		
Cumplimiento del contrato	09/06/2015	29/12/2015	\$	300.000,00	Cumplimiento del contrato	09/06/2015	31/12/2015	\$	1.200.000,00
Salarios y prestaciones sociales	09/06/2015	29/12/2015	\$	150.000,00	Estabilidad de la obra	09/06/2015	31/12/2015	\$	1.200.000,00
Calidad del servicio	25/06/2015	15/01/2016	\$	300.000,00	Calidad del servicio	09/06/2015	31/12/2015	\$	600.000,00
Responsabilidad civil					Salarios y prestaciones sociales	09/06/2015	31/12/2015	\$	600.000,00
					Responsabilidad civil				
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA Nº de 2014					CONTRATO DE OBRA Nº 028 de 2015				
CONCEPTO	VIGENTE (fechas)		VALOR		CONCEPTO	VIGENTE (fechas)		VALOR	
	DESDE	HASTA				DESDE	HASTA		
Cumplimiento del contrato					Cumplimiento del contrato				
Salarios y prestaciones sociales					Estabilidad de la obra				
Calidad del servicio					Calidad del servicio				
Responsabilidad civil					Salarios y prestaciones sociales				
					Responsabilidad civil				
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015					CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052de 2015				
RESUMEN DE PAGOS									
CONCEPTO	FECHA DE PAGO		VALOR		CONCEPTO	FECHA DE PAGO		VALOR	
Primer pago			\$	-				\$	-
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA Nº de 2014					CONTRATO DE OBRA Nº de 2014				
CONCEPTO	FECHA DE PAGO		VALOR		CONCEPTO	FECHA DE PAGO		VALOR	
Primer pago									
SEGUIMIENTO AL AVANCE									
AVANCE FISICO (%)					AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO		CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado			0,00%		% Programado			0,00%	
% Ejecutado			0,00%		% Ejecutado			0,00%	
Diferencia			0,00%		Diferencia			0,00%	




INFORME EJECUTIVO MENSUAL N° 006

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

1. El día 28 de Octubre del año en curso se firma el contrato de obra No. 028 cuyo contratista es UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL HACUA 2015.
2. El día 29 de octubre se realiza publicación Resolución de Adjudicación del contrato de intervención, se tiene programado para el día 04 de Noviembre de 2015 firma del contrato.
3. Se asiste a la reunión programada para el día 22 de octubre de 2015 por parte del Ministerio del Interior con el fin verificar el estado contractual del proyecto Centro de Integración Ciudadana.


2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

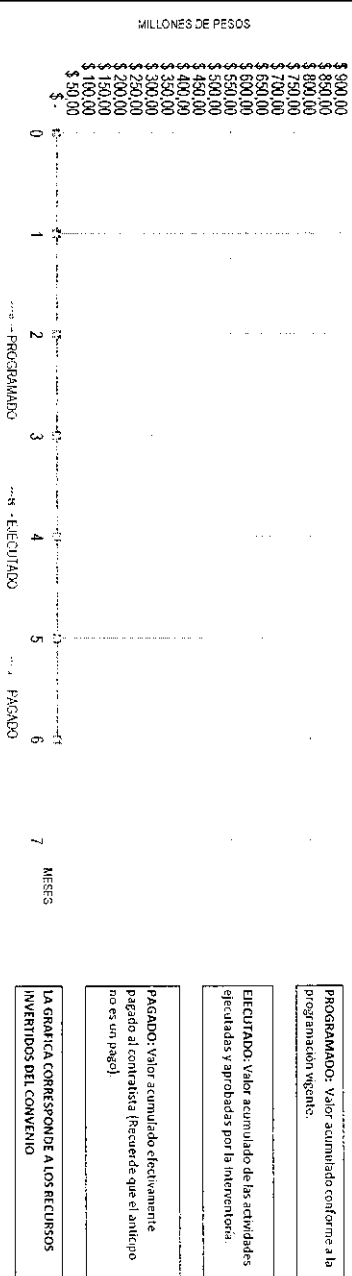

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENCIÓN

INFORME EJECUTIVO MENSUAL N° 006

4. RELACION DE ANEXOS					
DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/A.	Nº Folios	DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/A.	Nº Folios
1. Balance Presupuestal de la obra	N	0	9. Control diario de tiempo	N	0
2. Registro Fotográfico	N	0	10. Control de personal	N	0
3. Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica	N	0	11. Control de equipo	N	0
4. Copia ultimo informe de interventoria	N	0	12. Control de seguridad industrial	N	0
5. Copia actas de comité de obra	N	0	13. Relacion de menores y mayores cantidades	N	0
6. Copia libro de obra/bitácora	N	0			
7. Copia certificado de pago a contratistas	N	0			
8. Seguimiento plan de manejo ambiental	N	0			

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
			
Nombre: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ	Nombre:	Nombre:	Elaborado: 18/01/2018
Cargo: Cargo Supervisor del convenio F-212	Cargo:	Cargo:	Pag. 1 de 4

INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 005

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO									
CONVENIO Nº F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, IONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)									
Objeto del Convenio:		ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)							
Valor del Convenio:	\$ 735.000.000,00	Aporte de Municipio:		\$ 735.000.000,00		Aportes del Municipio:		\$ 48.000.000,00	
Valor Adición:	\$ 48.000.000,00								
Valor Total:	\$ 783.000.000,00								
Plazo de Ejecución:	7 MESES	Suspensión 1		Retiempo:		Prorroga Nº 1		NA	
Fecha de Inicio:	08 DE MAYO DEL 2015	Suspensión 2		Retiempo:		Prorroga Nº 2		NA	
Vencimiento:	30 DE NOVIEMBRE DE 2015					Plazo Actualizado			
Poliza de garantía única:	Vigencia póliza (fechas)		Valor		Modificación fecha		Modificación Valor		
Aseguradora Solidaria de Colombia	Desde	07/05/2015	Hasta	31/05/2016	\$ 78.300.000,00		Hasta		
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO									
Informe Nº	5	Periodo comprendido entre el 03 de Septiembre del 2015			Y el		03 de Octubre del 2015		
Proyecto	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)								
Localización	MUNICIPIO SAN JOSE DEL FRAGUA								
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS									
Objeto:	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICO AL CONTRATO DE CONSULTORIA, cuyo objeto es CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE SIUOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APV, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA."								
Contrato Nº:	MC-053 DEL 2015								
Contratista:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA								
Plazo Inicial:	15 dias								
Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015								
*Fecha de Suspensión	19 de Junio de 2015								
*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015								
Fecha de Terminación:	13 de Julio de 2015								
Prórrogas:									
Plazo Actualizado:									
Valor Inicial:	\$ 3.000.000,00								
Valor Adiciones:	\$ -								
Valor Actualizado:	\$ -								
Valor pagado:	\$ -								
Valor por pagar:	\$ 3.000.000,00								
Poliza Seguro de cumplimiento	Nº 630-47-99400006429	VIGENCIA: 09/06/2015 - 15/01/2016		VALOR: 750.000					
Nombre Supervisor:	DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ								
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias									
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA					CONTRATO DE OBRA				
Objeto:	Objeto:								
Contrato Nº:	Contrato Nº:								
Contratista:	Contratista:								
Plazo Inicial:	Plazo Inicial:								
Fecha de Inicio:	Fecha de Inicio:								
*Fecha de Suspensión	*Fecha de Suspensión								
*Fecha de Reinicio:	*Fecha de Reinicio:								
Fecha de Terminación:	Fecha de Terminación:								
Prórrogas:	Prórrogas:								
Plazo Actualizado:	Plazo Actualizado:								
Valor Inicial:	Valor Inicial:								
Valor Adiciones:	Valor Adiciones:								
Valor Actualizado:	Valor Actualizado:								
Valor pagado:	Valor pagado:								
Valor por pagar:	Valor por pagar:								
Nombre Supervisor:	Nombre interventor:								

INFORME EJECUTIVO MENSUAL N° 005

\* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

INFORME EJECUTIVO MENSUAL N° 005


ESTADO DE LAS GARANTIAS									
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 053 de 2015					CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 052 de 2015				
CONCEPTO	VIGENTE (fechas) DESDE	HASTA	VALOR		CONCEPTO	VIGENTE (fechas) DESDE	HASTA	VALOR	
Cumplimiento del contrato	09/06/2015	29/12/2015	\$	300.000,00	Cumplimiento del contrato	09/06/2015	31/12/2015	\$	1.200.000,00
Salarios y prestaciones sociales	09/06/2015	29/12/2015	\$	150.000,00	Estabilidad de la obra				
Calidad del servicio	25/06/2015	15/01/2016	\$	300.000,00	Calidad del servicio	09/06/2015	31/12/2015	\$	1.200.000,00
Responsabilidad civil					Salarios y prestaciones sociales	09/06/2015	31/12/2015	\$	600.000,00
					Responsabilidad civil				
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N° de 2014					CONTRATO DE OBRA N° de 2014				
CONCEPTO	VIGENTE (fechas) DESDE	HASTA	VALOR		CONCEPTO	VIGENTE (fechas) DESDE	HASTA	VALOR	
Cumplimiento del contrato					Cumplimiento del contrato				
Salarios y prestaciones sociales					Estabilidad de la obra				
Calidad del servicio					Calidad del servicio				
Responsabilidad civil					Salarios y prestaciones sociales				
					Responsabilidad civil				
RESUMEN DE PAGOS									
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 053 de 2015					CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 052 de 2015				
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR			CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR		
Primer pago		\$					\$		
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N° de 2014					CONTRATO DE OBRA N° de 2014				
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR			CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR		
Primer pago									
SEGUIMIENTO AL AVANCE									
AVANCE FISICO (%)					AVANCE FINANCIERO (miles de pesos)				
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO		CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado			0,00%		% Programado			0,00%	
% Ejecutado			0,00%		% Ejecutado			0,00%	
Diferencia			0,00%		Diferencia			0,00%	

INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 005

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

1. El día 07 de septiembre se hace publicación en página Secop de Preglos para el contrato de obra De acuerdo al cronograma de los pliegos definitivos, el día 06 de octubre se deben realizar entregas de las propuestas por parte de los oferentes. Para el día 08 de Octubre se realizará la evaluación a las propuestas. Para el día 20 de Octubre se tiene previsto la adjudicación del contrato a la mejor propuesta.
2. Elaboración de estudios previos, y pliegos de condiciones para el contrato de interventoría de obra para publicación en la página SECOP el día 06 de septiembre de 2015.
3.

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

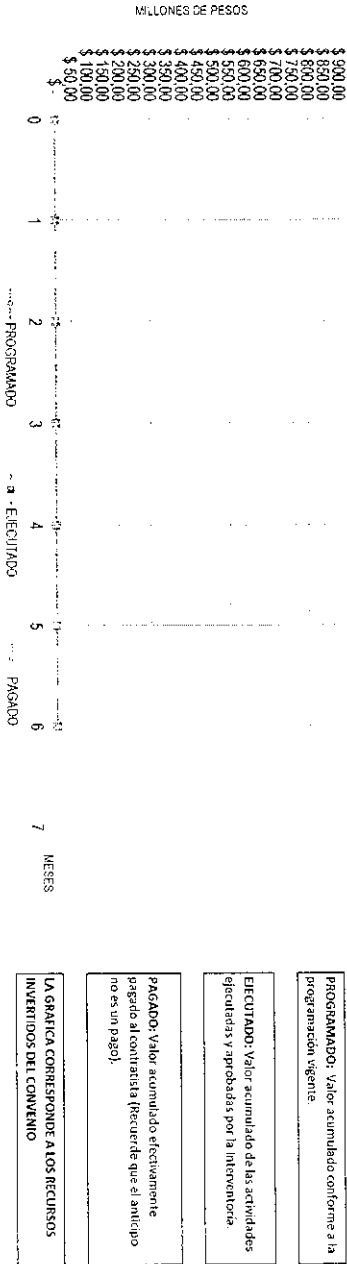

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA


INFORME EJECUTIVO MENSUAL N° 005

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

- 1. El día 07 de septiembre se hace publicación en página Scup de Pliegos para el contrato de obra. De acuerdo al cronograma de los pliegos definitivos, el día 06 de octubre se deben realizar entregas de las propuestas por parte de los oferentes. Para el día 08 de Octubre se realizará la evaluación a las propuestas. Para el día 20 de Octubre se tiene previsto la adjudicación del contrato a la mejor propuesta.
- 2. Liberación de estudios, previos y pliegos de condiciones para el contrato de Interventoría de obra para publicación en la página SCCOP el día 06 de septiembre de 2015

3.

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

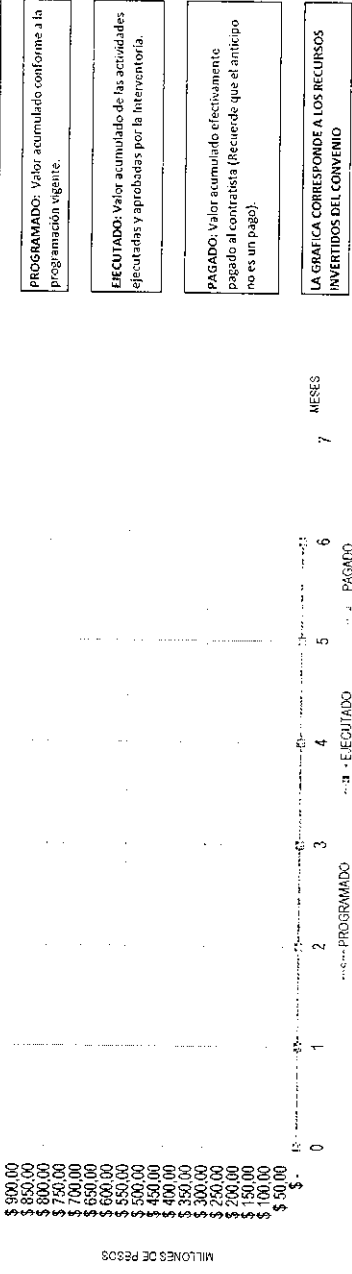

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

INFORME EJECUTIVO MENSUAL Nº 005									
ESTADO DE LAS GARANTÍAS									
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015					CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052 de 2015				
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE HASTA	VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE HASTA	VALOR				
Cumplimiento del contrato	09/06/2015 - 29/12/2015	\$ 300.000,00	Cumplimiento del contrato	09/06/2015 - 31/12/2015	\$ 1.200.000,00				
Salarios y prestaciones sociales	09/06/2015 - 29/12/2015	\$ 150.000,00	Estabilidad de la obra	09/06/2015 - 31/12/2015	\$ 1.200.000,00				
Calidad del servicio	25/06/2015 - 15/01/2016	\$ 300.000,00	Calidad del servicio	09/06/2015 - 31/12/2015	\$ 600.000,00				
Responsabilidad civil			Salarios y prestaciones sociales						
			Responsabilidad civil						
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA Nº de 2014					CONTRATO DE OBRA Nº de 2014				
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE HASTA	VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE HASTA	VALOR				
Cumplimiento del contrato			Cumplimiento del contrato						
Salarios y prestaciones sociales			Estabilidad de la obra						
Calidad del servicio			Calidad del servicio						
Responsabilidad civil			Salarios y prestaciones sociales						
			Responsabilidad civil						
RESUMEN DE PAGOS									
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015					CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052 de 2015				
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR				
Primer pago		\$			\$				
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA Nº de 2014					CONTRATO DE OBRA Nº de 2014				
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR				
Primer pago									
SEGUIMIENTO AL AVANCE									
AVANCE FÍSICO (%)					AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%	
% Programado			0,00%	% Programado			0,00%		
% Ejecutado			0,00%	% Ejecutado			0,00%		
Diferencia			0,00%	Diferencia			0,00%		



INFORME EJECUTIVO MENSUAL N° 005

4. RELACION DE ANEXOS			
DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/A.	Nº Folios	DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO
1. Balance Presupuestal de la obra	N	0	9. Control diario de tiempo
2. Registro Fotográfico	N	0	10. Control de personal
3. Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica	N	0	11. Control de equipo
4. Copia ultimo informe de interventoría	N	0	12. Control de seguridad industrial
5. Copia actas de comité de obra	N	0	13. Relación de menores y mayores cantidades
6. Copia libro de obra/bitácora	N	0	
7. Copia certificado de pago a contratistas	N	0	
8. Seguimiento plan de manejo ambiental	N	0	

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
			
Nombre: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ	Nombre:	Nombre:	Elaborado: 31/03/2014
Cargo: Supervisor del convenio F-212	Cargo:	Cargo:	Pag. 1 de 4
