

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO								
CONVENIO N° F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)								
Objeto del Convenio:	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)							
Valor del Convenio:	\$ 735.000.000,00	Aporte de Mininterior:	\$	735.000.000,00	PRORROGA			
Valor Total inicial:	\$ 735.000.000,00	Suspensión 1	DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR					
Primer Plazo de Ejecución:	2 MESES	Reinicio:	11 DE MARZO DE 2016					
Fecha de Inicio:	08 DE MAYO DEL 2015							
Vencimiento:	06 DE JULIO DE 2015							
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)			Valor	Modificación fecha		Modificación Valor	
Aseguradora Solidaria de Colombia	Desde	7/05/2015	Hasta	31/08/2016	\$ 147.000.000,00	Hasta	30/04/2016	\$ 783.000.000,00

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO							
Informe N°	11	Periodo comprendido entre el 01 de ENERO del 2016 y el 31 de ENERO del 2016					
Proyecto	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) Y LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ						
Localización	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS				CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS			
Objeto:	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA cuyo objeto es CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU,			Objeto:	"CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA".		
Contrato N°:	MC-053 DEL 2015			Contrato N°:	MC-052 DEL 2015		
Contratista:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA			Contratista:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES		
Plazo Inicial:	15 días			Plazo Inicial:	15 días		
Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015			Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015		
*Fecha de Suspensión	19 de Junio de 2015			*Fecha de Suspensión	19 de Junio de 2015		
*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015			*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015		
Fecha de Terminación:	13 de Julio de 2015			Fecha de Terminación:	13 de Julio de 2015		
Prórrogas:	NA			Prórrogas:	NA		
Plazo Actualizado:	NA			Plazo Actualizado:	NA		
Valor Inicial:	\$ 3.000.000,00			Valor Inicial:	\$ 12.000.000,00		
Valor Adiciones:	\$ -			Valor Adiciones:	\$ -		
Valor Actualizado:	\$ -			Valor Actualizado:	\$ -		
Valor pagado:	\$ 3.000.000,00			Valor pagado:	\$ 12.000.000,00		
Valor por pagar:				Valor por pagar:			
Poliza Seguro de cumplimiento	N° 630-47-994000006429	VIGENCIA: 09/06/2015 - 15/01/2016	VALOR: 750.000	Poliza Seguro de cumplimiento	N° AA023400	VIGENCIA: 09/06/2015 - 31/12/2015	VALOR: 3.000.000
Nombre Supervisor:	DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ			Nombre interventor:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA		
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias							

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

4. RELACION DE ANEXOS							
	DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	N° Folios		DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	N° Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra	N	0	9.	Control diario de tiempo	N	0
2.	Registro Fotográfico	N	0	10.	Control de personal	N	0
3.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica	N	0	11.	Control de equipo	N	0
4.	Copia último informe de interventoría	N	0	12.	Control de seguridad industrial	N	0
5.	Copia actas de comité de obra	N	0	13.	Relación de menores y mayores cantidades	N	0
6.	Copia libro de obra/bitácora	N	0				
7.	Copia certificado de pago a contratistas	N	0				
8.	Seguimiento plan de manejo ambiental	N	0				

Elaborado por:	Revisor por:	Aprobado por:	
Nombre: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ	Nombre: CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR	Nombre: CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR	Elaborado: 31/07/2015
Cargo: Supervisor por parte de la alcaldía del convenio F-212	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL	Pag.1 de 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO						
CONVENIO N° F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)						
Objeto del Convenio:	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)					
Valor del Convenio:	\$ 735.000.000,00	Aporte de Mininterior:	\$ 735.000.000,00	PRORROGA		
Valor Adición:	\$ 48.000.000,00	Aportes del Municipio:	\$ 48.000.000,00			
Valor Total Inicial:	\$ 783.000.000,00	Suspensión 1	DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR	Prorroga N° 1	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016	
Primer Plazo de Ejecución:	7 MESES	Reinicio:	11 DE MARZO DE 2016	Prorroga N° 2	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016	
Fecha de Inicio:	08 DE MAYO DEL 2015					
Vencimiento:	30 DE ABRIL DE 2016					
Nuevo plazo de ejecución:	11 MESES					
Fecha de terminación:	30 DE ABRIL DE 2016			Plazo Actualizado	30 DE ABRIL DE 2016	
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)		Valor	Modificación fecha		Modificación Valor
Aseguradora Solidaria de Colombia	Desde	7/05/2015	Hasta	31/08/2016	\$ 147.000.000,00	\$ 783.000.000,00

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO		
Informe N°	11	Periodo comprendido entre el 01 de ENERO del 2016 y el 31 de ENERO del 2016
Proyecto	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) Y LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	
Localización	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ	

CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS				CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS			
Objeto:	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA cuyo objeto es CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA".			Objeto:	CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA".		
Contrato N°:	MC-053 DEL 2015			Contrato N°:	MC-052 DEL 2015		
Contratista:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA			Contratista:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES		
Plazo Inicial:	15 días			Plazo Inicial:	15 días		
Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015			Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015		
*Fecha de Suspensión	19 de Junio de 2015			*Fecha de Suspensión	19 de Junio de 2015		
*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015			*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015		
Fecha de Terminación:	13 de Julio de 2015			Fecha de Terminación:	13 de Julio de 2015		
Prórrogas:	NA			Prórrogas:	NA		
Plazo Actualizado:	NA			Plazo Actualizado:	NA		
Valor Inicial:	\$ 3.000.000,00			Valor Inicial:	\$ 12.000.000,00		
Valor Adiciones:	\$ -			Valor Adiciones:	\$ -		
Valor Actualizado:	\$ -			Valor Actualizado:	\$ -		
Valor pagado:	\$ 3.000.000,00			Valor pagado:	\$ 12.000.000,00		
Valor por pagar:				Valor por pagar:			
Poliza Seguro de cumplimiento	N° 630-47-99400006429	VIGENCIA: 09/06/2015 - 15/01/2016	VALOR: 750.000	Poliza Seguro de cumplimiento	N° AA023400	VIGENCIA: 09/06/2015 - 31/12/2015	VALOR: 3.000.000
Nombre Supervisor:	DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ			Nombre interventor:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA		

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA				CONTRATO DE OBRA			
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.			Objeto:	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. F-212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.		
Contrato N°:	001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015			Contrato N°:	028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015		
Contratista:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES			Contratista:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015		
Plazo Inicial:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015			Plazo Inicial:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015		
Fecha de Inicio:	10 DE NOVIEMBRE DE 2015			Fecha de Inicio:	10 DE NOVIEMBRE DE 2015		
Fecha de Terminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2015			Fecha de Terminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2015		
Primera Prórroga y modificación del convenio:	28 DE FEBRERO DE 2016			Primera Prórroga y modificación del convenio:	28 DE FEBRERO DE 2016		
Segunda modificación del convenio:	17 DICIEMBRE DE 2016			Segunda modificación del convenio:	17 DICIEMBRE DE 2016		
Plazo Actualizado:	111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015			Plazo Actualizado:	111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015		
Primera suspensión:	26 DE FEBRERO DE 2016			Primera suspensión:	26 DE FEBRERO DE 2016		
Acta de reinicio:	11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016			Acta de reinicio:	11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016		
Plazo Actualizado:	125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016			Plazo Actualizado:	125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016		
Segunda Prórroga:	30 DE ABRIL DE 2016			Segunda Prórroga:	30 DE ABRIL DE 2016		
Plazo Actualizado:	173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016			Plazo Actualizado:	173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016		
Valor Inicial:	\$ 47.100.000,00			Valor Inicial:	\$ 720.900.000,00		
Valor Adiciones:	N/A			Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actualizado:	\$ 47.100.000,00			Valor Actualizado:	\$ 720.900.000,00		
Primer pago parcial:	\$ 9.221.280,00			Primer pago parcial:	\$ 180.568.603,00		
segundo pago parcial:	\$ 9.221.280,00			segundo pago parcial:	\$ 174.595.176,00		
Tercer pago parcial:	\$ 9.221.280,00						
Valor por pagar:	\$ 19.436.160,00			Valor por pagar:	\$ 365.736.221,00		
Nombre Supervisor:	BRIYTH GISELA REYES QUINTERO			Nombre interventor:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES		

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

ESTADO DE LAS GARANTÍAS						
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 053 de 2015				CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 052de 2015		
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)	
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	9/06/2015	29/12/2015	\$ 300.000,00	Cumplimiento del contrato	9/06/2015	31/12/2015
						\$ 1.200.000,00


INFORME EJECUTIVO MENSUAL N° 009

Salarios y prestaciones sociales	9/06/2015	29/12/2015	\$	150.000,00	Estabilidad de la obra			
Calidad del servicio	25/06/2015	15/01/2016	\$	300.000,00	Calidad del servicio	9/06/2015	31/12/2015	\$ 1.200.000,00

INFORME EJECUTIVO MENSUAL N° 009

Responsabilidad civil				Salarios y prestaciones sociales	9/06/2015	31/12/2015	\$	600.000,00
				Responsabilidad civil				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA N° 001 de 2015				CONTRATO DE OBRA N° 028 de 2015				
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA		
Cumplimiento del contrato	4/11/2015	23/08/2016	\$ 4.710.000,00	Cumplimiento del contrato	23/10/2015	28/08/2016	\$ 72.090.000,00	
Salarios y prestaciones sociales	4/11/2015	23/02/2019	\$ 9.420.000,00	Estabilidad de la obra				
Calidad del servicio	4/11/2015	4/01/2021	\$ 9.420.000,00	Calidad del servicio				
Responsabilidad civil				Salarios y prestaciones sociales	23/10/2015	28/02/2019	\$ 36.045.000,00	
				Responsabilidad civil	23/10/2015	28/04/2016	\$ 128.870.000,00	
RESUMEN DE PAGOS								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 053 de 2015				CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 052de 2015				
CONCEPTO	FECHA DE PAGO		VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO		VALOR	
PAGO CONTRATO No- 053	DICIEMBRE DE 2015		\$ 3.000.000,00	PAGO CONTRATO N° 052	DICIEMBRE DE 2015		\$ 12.000.000,00	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA N° 001 de 2015				CONTRATO DE OBRA N° 028 de 2015				
CONCEPTO	FECHA DE PAGO		VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO		VALOR	
PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N°001	22 DE DICIEMBRE DE 2015		\$ 9.221.280,00	PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	17 DE DICIEMBRE DE 2015		\$ 180.568.603,00	
SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N°002	07 DE MARZO DE 2016		\$ 9.221.280,00	SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	16 DE FEBRERO 2016		\$ 174.595.176,00	
TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N°003	07 DE MARZO DE 2016		\$ 9.221.280,00					
SEGUIMIENTO AL AVANCE								
AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	55,99%	37,33%	93,32%	% Programado	\$672.743.880,00	\$269.111.970,00	\$672.743.880,00	93,32%
% Ejecutado	68,68%	13,87%	82,55%	% Ejecutado	\$495.114.120,00	\$99.988.830,00	\$595.102.950,00	82,55%
Diferencia	12,69%	23,46%	36,15%	Diferencia	\$177.629.760,00	\$169.123.140,00	\$77.640.930,00	36%
DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO								

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

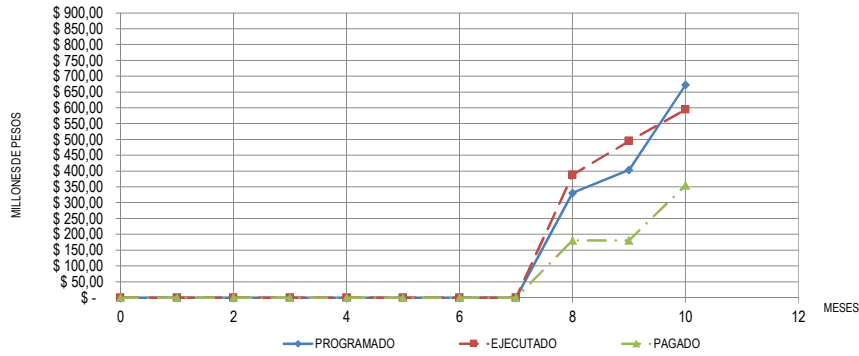

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONVENIO

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

4. RELACION DE ANEXOS

	DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra	N	0	9.	Control diario de tiempo	N	0
2.	Registro Fotográfico	N	0	10.	Control de personal	N	0
3.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica	N	0	11.	Control de equipo	N	0
4.	Copia último informe de interventoría	N	0	12.	Control de seguridad industrial	N	0
5.	Copia actas de comité de obra	N	0	13.	Relación de menores y mayores cantidades	N	0
6.	Copia libro de obra/bitácora	N	0				
7.	Copia certificado de pago a contratistas	N	0				
8.	Seguimiento plan de manejo ambiental	N	0				

Elaborado por:	Revisador por:	Aprobado por:	
Nombre:	Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA	Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA	Elaborado: 20/12/2016
Cargo: Supervisor por parte de la alcaldía del convenio F-212	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL	Pag.1 de 4

INFORME EJECUTIVO MENSUAL N° 010

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO						
CONVENIO N° F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)						
Objeto del Convenio:	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)					
Valor del Convenio:	\$ 735.000.000,00	Aporte de Mininterior:	\$ 735.000.000,00	PRORROGA		
Valor Adición:	\$ 48.000.000,00	Aportes del Municipio:	\$ 48.000.000,00			
Valor Total Inicial:	\$ 783.000.000,00	Suspensión 1	DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR	Prorroga N° 1	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016	
Primer Plazo de Ejecución:	7 MESES	Reinicio:	11 DE MARZO DE 2016	Prorroga N° 2	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016	
Fecha de Inicio:	08 DE MAYO DEL 2015					
Vencimiento:	30 DE ABRIL DE 2016					
Nuevo plazo de ejecución:	11 MESES					
Fecha de terminación:	30 DE ABRIL DE 2016					
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)			Valor	Modificación fecha	Modificación Valor
Aseguradora Solidaria de Colombia	Desde	7/05/2015	Hasta	31/08/2016	\$ 147.000.000,00	\$ 783.000.000,00

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO		
Informe N°	11	Periodo comprendido entre el 01 de FEBRERO del 2016 y el 29 de FEBRERO del 2016
Proyecto	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) Y LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	
Localización	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS				CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS			
Objeto:	*CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA cuyo objeto es CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU,			Objeto:	*CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA*.		
Contrato N°:	MC-053 DEL 2015			Contrato N°:	MC-052 DEL 2015		
Contratista:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA			Contratista:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES		
Plazo Inicial:	15 días			Plazo Inicial:	15 días		
Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015			Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015		
*Fecha de Suspensión	19 de Junio de 2015			*Fecha de Suspensión	19 de Junio de 2015		
*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015			*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015		
Fecha de Terminación:	13 de Julio de 2015			Fecha de Terminación:	13 de Julio de 2015		
Prórrogas:	NA			Prórrogas:	NA		
Plazo Actualizado:	NA			Plazo Actualizado:	NA		
Valor Inicial:	\$ 3.000.000,00			Valor Inicial:	\$ 12.000.000,00		
Valor Adiciones:	\$ -			Valor Adiciones:	\$ -		
Valor Actualizado:	\$ -			Valor Actualizado:	\$ -		
Valor pagado:	\$ 3.000.000,00			Valor pagado:	\$ 12.000.000,00		
Valor por pagar:				Valor por pagar:			
Poliza Seguro de cumplimiento	N° 630-47-994000006429	VIGENCIA: 09/06/2015 - 15/01/2016	VALOR: 750.000	Poliza Seguro de cumplimiento	N° AA023400	VIGENCIA: 09/06/2015 - 31/12/2015	VALOR: 3.000.000
Nombre Supervisor:	DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ			Nombre interventor:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA		

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA				CONTRATO DE OBRA			
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.			Objeto:	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. F-212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.		
Contrato N°:	001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015			Contrato N°:	028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015		
Contratista:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES			Contratista:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015		
Plazo Inicial:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015			Plazo Inicial:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015		
Fecha de Inicio:	10 DE NOVIEMBRE DE 2015			Fecha de Inicio:	10 DE NOVIEMBRE DE 2015		
Fecha de Terminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2015			Fecha de Terminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2015		
Primera Prórroga y modificación del convenio:	28 DE FEBRERO DE 2016			Primera Prórroga y modificación del convenio:	28 DE FEBRERO DE 2016		
Segunda modificación del convenio:	17 DICIEMBRE DE 2016			Segunda modificación del convenio:	17 DICIEMBRE DE 2016		
Plazo Actualizado:	111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015			Plazo Actualizado:	111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015		
Primera suspensión:	26 DE FEBRERO DE 2016			Primera suspensión:	26 DE FEBRERO DE 2016		
Acta de reinicio:	11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016			Acta de reinicio:	11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016		
Plazo Actualizado:	125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016			Plazo Actualizado:	125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016		
Segunda Prórroga:	30 DE ABRIL DE 2016			Segunda Prórroga:	30 DE ABRIL DE 2016		
Plazo Actualizado:	173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016			Plazo Actualizado:	173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016		
Valor Inicial:	\$ 47.100.000,00			Valor Inicial:	\$ 720.900.000,00		
Valor Adiciones:	N/A			Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actualizado:	\$ 47.100.000,00			Valor Actualizado:	\$ 720.900.000,00		
Primer pago parcial:	\$ 9.221.280,00			Primer pago parcial:	\$ 180.568.603,00		
segundo pago parcial:	\$ 9.221.280,00			segundo pago parcial:	\$ 174.595.176,00		
Tercer pago parcial:	\$ 9.221.280,00						
Valor por pagar:	\$ 19.436.160,00			Valor por pagar:	\$ 365.736.221,00		
Nombre Supervisor:	BRIYTH GISELA REYES QUINTERO			Nombre interventor:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES		

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

ESTADO DE LAS GARANTÍAS						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 053 de 2015				CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 052 de 2015		
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)	
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	9/06/2015	29/12/2015	\$ 300.000,00	Cumplimiento del contrato	9/06/2015	31/12/2015 \$ 1.200.000,00


INFORME EJECUTIVO MENSUAL N° 010

Salarios y prestaciones sociales	9/06/2015	29/12/2015	\$ 150.000,00	Estabilidad de la obra			
Calidad del servicio	25/06/2015	15/01/2016	\$ 300.000,00	Calidad del servicio	9/06/2015	31/12/2015	\$ 1.200.000,00

INFORME EJECUTIVO MENSUAL N° 010

Responsabilidad civil				Salarios y prestaciones sociales			9/06/2015	31/12/2015	\$	600.000,00
				Responsabilidad civil						
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N° 001 de 2015							CONTRATO DE OBRA N° 028 de 2015			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR			
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA				
Cumplimiento del contrato	4/11/2015	23/08/2016	\$ 4.710.000,00	Cumplimiento del contrato	23/10/2015	28/08/2016	\$ 72.090.000,00			
Salarios y prestaciones sociales	4/11/2015	23/02/2019	\$ 9.420.000,00	Estabilidad de la obra						
Calidad del servicio	4/11/2015	4/01/2021	\$ 9.420.000,00	Calidad del servicio						
Responsabilidad civil				Salarios y prestaciones sociales	23/10/2015	28/02/2019	\$ 36.045.000,00			
				Responsabilidad civil	23/10/2015	28/04/2016	\$ 128.870.000,00			
RESUMEN DE PAGOS										
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 053 de 2015				CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 052de 2015						
CONCEPTO	FECHA DE PAGO		VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO		VALOR			
PAGO CONTRATO No- 053	DICIEMBRE DE 2015		\$ 3.000.000,00	PAGO CONTRATO N° 052	DICIEMBRE DE 2015		\$ 12.000.000,00			
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N° 001 de 2015				CONTRATO DE OBRA N° 028 de 2015						
CONCEPTO	FECHA DE PAGO		VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO		VALOR			
PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N°001	22 DE DICIEMBRE DE 2015		\$ 9.221.280,00	PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	17 DE DICIEMBRE DE 2015		\$ 180.568.603,00			
SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N°002	07 DE MARZO DE 2016		\$ 9.221.280,00	SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	16 DE FEBRERO 2016		\$ 174.595.176,00			
TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N°003	07 DE MARZO DE 2016		\$ 9.221.280,00							
SEGUIMIENTO AL AVANCE										
AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)						
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO		%	
% Programado	55,99%	37,33%	93,32%	% Programado	\$672.743.880,00	\$269.111.970,00	\$672.743.880,00		93,32%	
% Ejecutado	68,68%	13,87%	82,55%	% Ejecutado	\$495.114.120,00	\$99.988.830,00	\$595.102.950,00		82,55%	
Diferencia	12,69%	23,46%	36,15%	Diferencia	\$177.629.760,00	\$169.123.140,00	\$77.640.930,00		36%	
DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO										

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

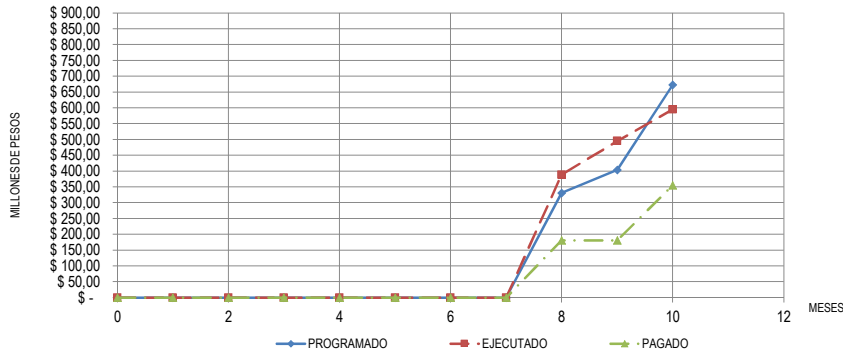

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONVENIO

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

4. RELACION DE ANEXOS

	DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra	N	0	9.	Control diario de tiempo	N	0
2.	Registro Fotográfico	N	0	10.	Control de personal	N	0
3.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica	N	0	11.	Control de equipo	N	0
4.	Copia último informe de interventoría	N	0	12.	Control de seguridad industrial	N	0
5.	Copia actas de comité de obra	N	0	13.	Relación de menores y mayores cantidades	N	0
6.	Copia libro de obra/bitácora	N	0				
7.	Copia certificado de pago a contratistas	N	0				
8.	Seguimiento plan de manejo ambiental	N	0				

Elaborado por:	Revisador por:	Aprobado por:	
Nombre: MAXIMINO SANDOVAL AMADO	Nombre: MAXIMINO SANDOVAL AMADO	Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA	Elaborado: 29/02/2016
Cargo: Supervisor por parte de la alcaldía del convenio F-212	Cargo: Supervisor por parte de la alcaldía del convenio F-212	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL	Pag.1 de 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO						
CONVENIO N° F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)						
Objeto del Convenio:	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)					
Valor del Convenio:	\$ 735.000.000,00	Aporte de Mininterior:	\$ 735.000.000,00	PRORROGA		
Valor Adición:	\$ 48.000.000,00	Aportes del Municipio:	\$ 48.000.000,00			
Valor Total inicial:	\$ 783.000.000,00	Suspensión 1	DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR	Prorroga N° 1	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016	
Primer Plazo de Ejecución:	7 MESES	Reinicio:	11 DE MARZO DE 2016	Prorroga N° 2	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016	
Fecha de Inicio:	08 DE MAYO DEL 2015					
Vencimiento:	30 DE ABRIL DE 2016					
Nuevo plazo de ejecución:	11 MESES					
Fecha de terminación:	30 DE ABRIL DE 2016				Plazo Actualizado	30 DE ABRIL DE 2016
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)		Valor	Modificación fecha		Modificación Valor
Aseguradora Solidaria de Colombia	Desde	7/05/2015	Hasta	31/08/2016	\$ 147.000.000,00	Hasta 30/04/2016 \$ 783.000.000,00

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO		
Informe N°	11	Periodo comprendido entre el 01 de MARZO del 2016 y el 31 de MARZO del 2016
Proyecto	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) Y LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	
Localización	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS				CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS			
Objeto:	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA cuyo objeto es CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU,			Objeto:	CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA”.		
Contrato N°:	MC-053 DEL 2015			Contrato N°:	MC-052 DEL 2015		
Contratista:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA			Contratista:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES		
Plazo Inicial:	15 días			Plazo Inicial:	15 días		
Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015			Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015		
*Fecha de Suspensión	19 de Junio de 2015			*Fecha de Suspensión	19 de Junio de 2015		
*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015			*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015		
Fecha de Terminación:	13 de Julio de 2015			Fecha de Terminación:	13 de Julio de 2015		
Prórrogas:	NA			Prórrogas:	NA		
Plazo Actualizado:	NA			Plazo Actualizado:	NA		
Valor Inicial:	\$ 3.000.000,00			Valor Inicial:	\$ 12.000.000,00		
Valor Adiciones:	\$ -			Valor Adiciones:	\$ -		
Valor Actualizado:	\$ -			Valor Actualizado:	\$ -		
Valor pagado:	\$ 3.000.000,00			Valor pagado:	\$ 12.000.000,00		
Valor por pagar:				Valor por pagar:			
Poliza Seguro de cumplimiento	N° 630-47-994000006429	VIGENCIA: 09/06/2015 - 15/01/2016	VALOR: 750.000	Poliza Seguro de cumplimiento	N° AA023400	VIGENCIA: 09/06/2015 - 31/12/2015	VALOR: 3.000.000
Nombre Supervisor:	DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ			Nombre interventor:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA		

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA				CONTRATO DE OBRA			
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.			Objeto:	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. F-212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.		
Contrato N°:	001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015			Contrato N°:	028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015		
Contratista:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES			Contratista:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015		
Plazo Inicial:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015			Plazo Inicial:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015		
Fecha de Inicio:	10 DE NOVIEMBRE DE 2015			Fecha de Inicio:	10 DE NOVIEMBRE DE 2015		
Fecha de Terminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2015			Fecha de Terminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2015		
Primera Prórroga y modificación del convenio:	28 DE FEBRERO DE 2016			Primera Prórroga y modificación del convenio:	28 DE FEBRERO DE 2016		
Segunda modificación del convenio:	17 DICIEMBRE DE 2016			Segunda modificación del convenio:	17 DICIEMBRE DE 2016		
Plazo Actualizado:	111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015			Plazo Actualizado:	111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015		
Primera suspensión:	26 DE FEBRERO DE 2016			Primera suspensión:	26 DE FEBRERO DE 2016		
Acta de reinicio:	11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016			Acta de reinicio:	11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016		
Plazo Actualizado:	125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016			Plazo Actualizado:	125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016		
Segunda Prórroga:	30 DE ABRIL DE 2016			Segunda Prórroga:	30 DE ABRIL DE 2016		
Plazo Actualizado:	173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016			Plazo Actualizado:	173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016		
Valor Inicial:	\$ 47.100.000,00			Valor Inicial:	\$ 720.900.000,00		
Valor Adiciones:	N/A			Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actualizado:	\$ 47.100.000,00			Valor Actualizado:	\$ 720.900.000,00		
Primer pago parcial:	\$ 9.221.280,00			Primer pago parcial:	\$ 180.568.603,00		
segundo pago parcial:	\$ 9.221.280,00			segundo pago parcial:	\$ 174.595.176,00		
Tercer pago parcial:	\$ 9.221.280,00						
Valor por pagar:	\$ 19.436.160,00			Valor por pagar:	\$ 365.736.221,00		
Nombre Supervisor:	BRIYTH GISELA REYES QUINTERO			Nombre interventor:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES		

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

ESTADO DE LAS GARANTÍAS						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 053 de 2015				CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 052 de 2015		
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)	
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	9/06/2015	29/12/2015	\$ 300.000,00	Cumplimiento del contrato	9/06/2015	31/12/2015 \$ 1.200.000,00


INFORME EJECUTIVO MENSUAL N° 011

Salarios y prestaciones sociales	9/06/2015	29/12/2015	\$ 150.000,00	Estabilidad de la obra			
Calidad del servicio	25/06/2015	15/01/2016	\$ 300.000,00	Calidad del servicio	9/06/2015	31/12/2015	\$ 1.200.000,00

INFORME EJECUTIVO MENSUAL N° 011

Responsabilidad civil				Salarios y prestaciones sociales			9/06/2015	31/12/2015	\$	600.000,00
				Responsabilidad civil						
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N° 001 de 2015							CONTRATO DE OBRA N° 028 de 2015			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR			
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA				
Cumplimiento del contrato	4/11/2015	23/08/2016	\$ 4.710.000,00	Cumplimiento del contrato	23/10/2015	28/08/2016	\$	72.090.000,00		
Salarios y prestaciones sociales	4/11/2015	23/02/2019	\$ 9.420.000,00	Estabilidad de la obra						
Calidad del servicio	4/11/2015	4/01/2021	\$ 9.420.000,00	Calidad del servicio						
Responsabilidad civil				Salarios y prestaciones sociales	23/10/2015	28/02/2019	\$	36.045.000,00		
				Responsabilidad civil	23/10/2015	28/04/2016	\$	128.870.000,00		
RESUMEN DE PAGOS										
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 053 de 2015					CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 052de 2015					
CONCEPTO	FECHA DE PAGO		VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO		VALOR			
PAGO CONTRATO No- 053	DICIEMBRE DE 2015		\$ 3.000.000,00	PAGO CONTRATO N° 052	DICIEMBRE DE 2015		\$ 12.000.000,00			
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N° 001 de 2015					CONTRATO DE OBRA N° 028 de 2015					
CONCEPTO	FECHA DE PAGO		VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO		VALOR			
PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N°001	22 DE DICIEMBRE DE 2015		\$ 9.221.280,00	PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	17 DE DICIEMBRE DE 2015		\$ 180.568.603,00			
SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N°002	07 DE MARZO DE 2016		\$ 9.221.280,00	SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	16 DE FEBRERO 2016		\$ 174.595.176,00			
TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N°003	07 DE MARZO DE 2016		\$ 9.221.280,00							
SEGUIMIENTO AL AVANCE										
AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)						
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%		
% Programado	55,99%	37,33%	93,32%	% Programado	\$672.743.880,00	\$269.111.970,00	\$672.743.880,00	93,32%		
% Ejecutado	68,68%	13,87%	82,55%	% Ejecutado	\$495.114.120,00	\$99.988.830,00	\$595.102.950,00	82,55%		
Diferencia	12,69%	23,46%	36,15%	Diferencia	\$177.629.760,00	\$169.123.140,00	\$77.640.930,00	36%		
DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO										
Se avanza en el proceso de construcción de las graderías. Se registra llegada de primera parte de la estrutura.										
Se destina la semana para realizar trabajos unica y exclusivamente en la prefabricacion de pasos para graderías. Se atiende construccion de zona de graderías con cuadrilla alterna.										
Se adelantan actividades de izado e instalación de losas de graderías. Se adelanta fijado de losas previa nivelación.										
Se avanza en actividades correspondiente a contrahuellas. Se avanza en proceso de construcción de zona de tarima.										

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

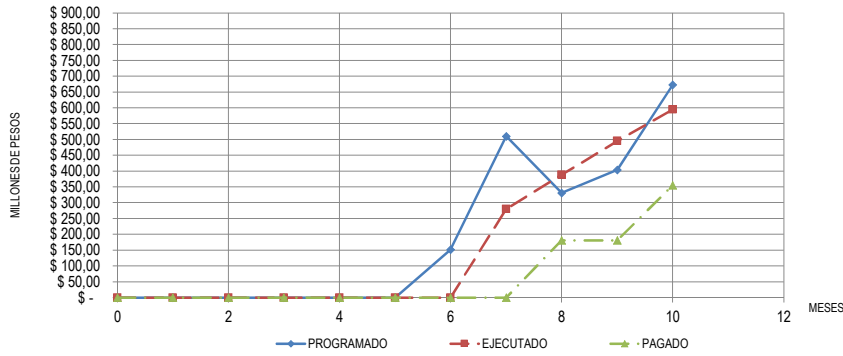

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONVENIO

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

4. RELACION DE ANEXOS

	DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra	N	0	9.	Control diario de tiempo	N	0
2.	Registro Fotográfico	N	0	10.	Control de personal	N	0
3.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica	N	0	11.	Control de equipo	N	0
4.	Copia último informe de interventoría	N	0	12.	Control de seguridad industrial	N	0
5.	Copia actas de comité de obra	N	0	13.	Relación de menores y mayores cantidades	N	0
6.	Copia libro de obra/bitácora	N	0				
7.	Copia certificado de pago a contratistas	N	0				
8.	Seguimiento plan de manejo ambiental	N	0				

Elaborado por:	Revisor por:	Aprobado por:	
Nombre: MAXIMINO SANDOVAL AMADO	Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA	Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA	Elaborado: 31/03/2016
Cargo: Supervisor por parte de la alcaldía del convenio F-212	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL	Pag.1 de 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO							
CONVENIO N° F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)							
Objeto del Convenio:	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)						
Valor del Convenio:	\$ 735.000.000,00	Aporte de Mininterior:	\$ 735.000.000,00	PRORROGA			
Valor Adición:	\$ 48.000.000,00	Aportes del Municipio:	\$ 48.000.000,00				
Valor Total inicial:	\$ 783.000.000,00	Suspensión 1	DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR	Prorroga N° 1	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016		
Primer Plazo de Ejecución:	7 MESES	Reinicio:	11 DE MARZO DE 2016	Prorroga N° 2	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016		
Fecha de Inicio:	08 DE MAYO DEL 2015			Prorroga N° 3	HASTA EL 15 DE JUNIO 2016		
Vencimiento:	15 DE JUNIO DE 2016						
Nuevo plazo de ejecución:	13 MESES						
Fecha de terminación:	15 DE JUNIO DE 2016			Plazo Actualizado	15 DE JUNIO DE 2016		
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)			Valor		Modificación fecha	
Aseguradora Solidaria de Colombia	Desde	7/05/2015	Hasta	31/10/2016	\$ 147.000.000,00	Hasta	15/06/2016
							\$ 783.000.000,00

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO							
Informe N°	12	Periodo comprendido entre el 01 de ABRIL del 2016 y el 30 de ABRIL del 2016					
Proyecto	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° F-212 de 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) Y LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ						
Localización	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ						
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS			CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS			
Objeto:	“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA cuyo objeto es CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA”.			“CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA”.			
Contrato N°:	MC-053 DEL 2015			Contrato N°:			
Contratista:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA			Contratista:			
Plazo Inicial:	15 dias			Plazo Inicial:			
Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015			Fecha de Inicio:			
*Fecha de Suspensión	19 de Junio de 2015			*Fecha de Suspensión			
*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015			*Fecha de Reinicio:			
Fecha de Teminación:	13 de Julio de 2015			Fecha de Teminación:			
Prórrogas:	NA			Prórrogas:			
Plazo Actualizado:	NA			Plazo Actualizado:			
Valor Inicial:	\$ 3.000.000,00			Valor Inicial:			
Valor Adiciones:	\$ -			Valor Adiciones:			
Valor Actualizado:	\$ -			Valor Actualizado:			
Valor pagado:	\$ 3.000.000,00			Valor pagado:			
Valor por pagar:				Valor por pagar:			
Poliza Seguro de cumplimiento	N° 630-47-994000006429	VIGENCIA: 09/06/2015 - 15/01/2016	VALOR: 750.000	Poliza Seguro de cumplimiento	N° AA023400	VIGENCIA: 09/06/2015 - 31/12/2015	VALOR: 3.000.000
Nombre Supervisor:	DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ			Nombre interventor:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA		

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA				CONTRATO DE OBRA			
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.			Objeto:	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. F-212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.		
Contrato N°:	001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015			Contrato N°:	028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015		
Contratista:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES			Contratista:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015		
Plazo Inicial:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015			Plazo Inicial:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015		
Fecha de Inicio:	10 DE NOVIEMBRE DE 2015			Fecha de Inicio:	10 DE NOVIEMBRE DE 2015		
Fecha de Terminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2015			Fecha de Terminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2015		
Primera Prórroga y modificación del convenio:	28 DE FEBRERO DE 2016			Primera Prórroga y modificación del convenio:	28 DE FEBRERO DE 2016		
Segunda modificación del convenio:	17 DICEMBRE DE 2016			Segunda modificación del convenio:	17 DICEMBRE DE 2016		
Plazo Actualizado:	111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015			Plazo Actualizado:	111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015		
Primera suspensión:	26 DE FEBRERO DE 2016			Primera suspensión:	26 DE FEBRERO DE 2016		
Acta de reinicio:	11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016			Acta de reinicio:	11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016		
Plazo Actualizado:	125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016			Plazo Actualizado:	125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016		
Segunda Prórroga:	30 DE ABRIL DE 2016			Segunda Prórroga:	30 DE ABRIL DE 2016		
Plazo Actualizado:	173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016			Plazo Actualizado:	173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016		
Tercera prórroga:	15 DE JUNIO DE 2016			Tercera prórroga:	15 DE JUNIO DE 2016		
Plazo Actualizado:	219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016			Plazo Actualizado:	219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016		
Valor Inicial:	\$ 47.100.000,00			Valor Inicial:	\$ 720.900.000,00		
Valor Adiciones:	N/A			Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actualizado:	\$ 47.100.000,00			Valor Actualizado:	\$ 720.900.000,00		
Primer pago parcial:	\$ 9.221.280,00			Primer pago parcial:	\$ 180.568.603,00		
segundo pago parcial:	\$ 9.221.280,00			segundo pago parcial:	\$ 174.595.176,00		
Tercer pago parcial:	\$ 9.221.280,00						
Valor por pagar:	\$ 19.436.160,00			Valor por pagar:	\$ 365.736.221,00		
Nombre Supervisor:	BRIYITH GISELA REYES QUINTERO			Nombre interventor:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES		


* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

ESTADO DE LAS GARANTÍAS			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 053 de 2015		CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 052de 2015	
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)
	VALOR		VALOR

INFORME EJECUTIVO MENSUAL N° 012

CONCEPTO	DESDE	HASTA	VALOR	CONCEPTO	DESDE	HASTA	VALOR	
Cumplimiento del contrato	9/06/2015	29/12/2015	\$ 300.000,00	Cumplimiento del contrato	9/06/2015	31/12/2015	\$ 1.200.000,00	
Salarios y prestaciones sociales	9/06/2015	29/12/2015	\$ 150.000,00	Estabilidad de la obra				
Calidad del servicio	25/06/2015	15/01/2016	\$ 300.000,00	Calidad del servicio	9/06/2015	31/12/2015	\$ 1.200.000,00	
Responsabilidad civil				Salarios y prestaciones sociales	9/06/2015	31/12/2015	\$ 600.000,00	
				Responsabilidad civil				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA N° 001 de 2015				CONTRATO DE OBRA N° 028 de 2015				
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA		
Cumplimiento del contrato	4/11/2015	23/08/2016	\$ 4.710.000,00	Cumplimiento del contrato	23/10/2015	28/08/2016	\$ 72.090.000,00	
Salarios y prestaciones sociales	4/11/2015	23/02/2019	\$ 9.420.000,00	Estabilidad de la obra				
Calidad del servicio	4/11/2015	4/01/2021	\$ 9.420.000,00	Calidad del servicio				
Responsabilidad civil				Salarios y prestaciones sociales	23/10/2015	28/02/2019	\$ 36.045.000,00	
				Responsabilidad civil	23/10/2015	23/10/2015	\$ 128.870.000,00	
RESUMEN DE PAGOS								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 053 de 2015				CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 052de 2015				
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR		CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR		
PAGO CONTRATO No- 053	DICIEMBRE DE 2015	\$ 3.000.000,00		PAGO CONTRATO N° 052	DICIEMBRE DE 2015	\$ 12.000.000,00		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA N° 001 de 2015				CONTRATO DE OBRA N° 028 de 2015				
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR		CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR		
PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N°001	22 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 9.221.280,00		PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	17 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 180.568.603,00		
SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N°002	07 DE MARZO DE 2016	\$ 9.221.280,00		SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	16 DE FEBRERO 2016	\$ 174.595.176,00		
TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N°003	07 DE MARZO DE 2016	\$ 9.221.280,00						
SEGUIMIENTO AL AVANCE								
AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	93,32%	5,9%	99,23%	% Programado	\$715.349.070,00	\$42.605.190,00	\$715.349.070,00	99,23%
% Ejecutado	82,55%	7,78%	90,33%	% Ejecutado	\$595.102.950,00	\$56.086.020,00	\$651.188.970,00	90,33%
Diferencia	36,15%	1,87%	8,90%	Diferencia	\$120.246.120,00	-\$13.480.830,00	\$64.160.100,00	-9%
DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO								
MAMPOSTERIA: en zona de batería sanitaria, se comienza mampostería en cerramiento								
CONCRETOS: Fundición de placa para cancha deportiva, fundición de huellas para graderías, construcción de placa de la tarima.								
HIERROS: figurado de hierros para vigas de graderías								
ESTRUCTURA METALICA: suministro y armado de cerchas metálicas para cubierta								

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

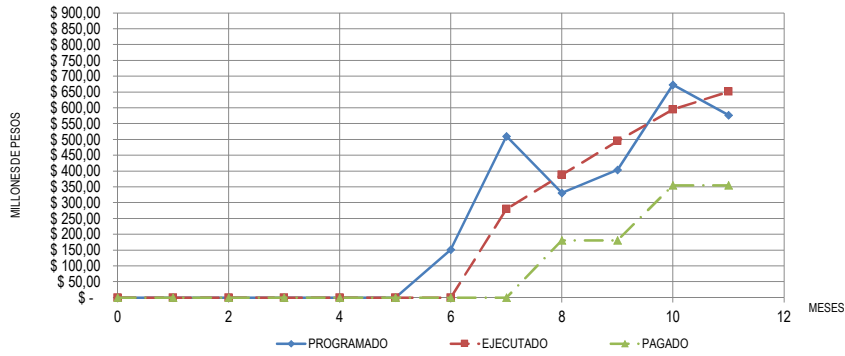

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONVENIO

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

4. RELACION DE ANEXOS

	DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra	N	0	9.	Control diario de tiempo	N	0
2.	Registro Fotográfico	N	0	10.	Control de personal	N	0
3.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica	N	0	11.	Control de equipo	N	0
4.	Copia último informe de interventoría	N	0	12.	Control de seguridad industrial	N	0
5.	Copia actas de comité de obra	N	0	13.	Relación de menores y mayores cantidades	N	0
6.	Copia libro de obra/bitácora	N	0				
7.	Copia certificado de pago a contratistas	N	0				
8.	Seguimiento plan de manejo ambiental	N	0				


Elaborado por:	Revisador por:	Aprobado por:	
Nombre: MAXIMINO SANDOVAL AMADO	Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA	Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA	Elaborado: 30/04/2016
Cargo: Supervisor por parte de la alcaldía del convenio F-212	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL	Pag.1 de 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO									
CONVENIO N° F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)									
Objeto del Convenio:		ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)							
Valor del Convenio:		\$ 735.000.000,00		Aporte de Mininterior:		\$ 735.000.000,00		PRORROGA	
Valor Adición:		\$ 48.000.000,00		Aportes del Municipio:		\$ 48.000.000,00			
Valor Total inicial:		\$ 783.000.000,00		Suspensión 1		DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR		Prorroga N° 1	
Primer Plazo de Ejecución:		7 MESES		Reinicio:		11 DE MARZO DE 2016		Prorroga N° 2	
Fecha de Inicio:		08 DE MAYO DEL 2015						Prorroga N° 3	
Vencimiento:		15 DE JUNIO DE 2016						HASTA EL 15 DE JUNIO 2016	
Nuevo plazo de ejecución:		13 MESES							
Fecha de terminación:		15 DE JUNIO DE 2016						Plazo Actualizado	
Póliza de garantía única:		Vigencia póliza (Fechas)			Valor			Modificación fecha	
Aseguradora Solidaria de Colombia		Desde		7/05/2015		Hasta		31/10/2016	
								\$ 147.000.000,00	
								Hasta	
								15/06/2016	
								\$ 783.000.000,00	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO									
Informe N°	13		Periodo comprendido entre el 01 de MAYO del 2016 y el 31 de MAYO del 2016						
Proyecto	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) Y LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ								
Localización	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS					CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS				
Objeto:	*CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA cuyo objeto es CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU,				Objeto:	*CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA”.			
Contrato N°:	MC-053 DEL 2015				Contrato N°:	MC-052 DEL 2015			
Contratista:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA				Contratista:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES			
Plazo Inicial:	15 días				Plazo Inicial:	15 días			
Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015				Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015			
*Fecha de Suspensión	19 de Junio de 2015				*Fecha de Suspensión	19 de Junio de 2015			
*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015				*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015			
Fecha de Terminación:	13 de Julio de 2015				Fecha de Terminación:	13 de Julio de 2015			
Prórrogas:	NA				Prórrogas:	NA			
Plazo Actualizado:	NA				Plazo Actualizado:	NA			
Valor Inicial:	\$ 3.000.000,00				Valor Inicial:	\$ 12.000.000,00			
Valor Adiciones:	\$ -				Valor Adiciones:	\$ -			
Valor Actualizado:	\$ -				Valor Actualizado:	\$ -			
Valor pagado:	\$ 3.000.000,00				Valor pagado:	\$ 12.000.000,00			
Valor por pagar:					Valor por pagar:				
Poliza Seguro de cumplimiento	N° 630-47-994000006429		VIGENCIA: 09/06/2015 - 15/01/2016		VALOR: 750.000	Poliza Seguro de cumplimiento	N° AA023400		VIGENCIA: 09/06/2015 - 31/12/2015
									VALOR: 3.000.000
Nombre Supervisor:	DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ				Nombre interventor:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA			
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA					CONTRATO DE OBRA				
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.				Objeto:	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. F-212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.			
Contrato N°:	001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015				Contrato N°:	028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015			
Contratista:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES				Contratista:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015			
Plazo Inicial:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015				Plazo Inicial:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015			
Fecha de Inicio:	10 DE NOVIEMBRE DE 2015				Fecha de Inicio:	10 DE NOVIEMBRE DE 2015			
Fecha de Terminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2015				Fecha de Terminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2015			
Primera Prórroga y modificación del convenio:	28 DE FEBRERO DE 2016				Primera Prórroga y modificación del convenio:	28 DE FEBRERO DE 2016			
Segunda modificación del convenio:	17 DICIMEBRE DE 2016				Segunda modificación del convenio:	17 DICIMEBRE DE 2016			
Plazo Actualizado:	111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015				Plazo Actualizado:	111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015			
Primera suspensión:	26 DE FEBRERO DE 2016				Primera suspensión:	26 DE FEBRERO DE 2016			
Acta de reinicio:	11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016				Acta de reinicio:	11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016			
Plazo Actualizado:	125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016				Plazo Actualizado:	125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016			
Segunda Prórroga:	30 DE ABRIL DE 2016				Segunda Prórroga:	30 DE ABRIL DE 2016			
Plazo Actualizado:	173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016				Plazo Actualizado:	173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016			
Tercera prórroga:	15 DE JUNIO DE 2016				Tercera prórroga:	15 DE JUNIO DE 2016			
Plazo Actualizado:	219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016				Plazo Actualizado:	219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016			
Valor Inicial:	\$		47.100.000,00		Valor Inicial:	\$		720.900.000,00	
Valor Adiciones:			N/A		Valor Adiciones:			N/A	
Valor Actualizado:	\$		47.100.000,00		Valor Actualizado:	\$		720.900.000,00	
Primer pago parcial:	\$		9.221.280,00		Primer pago parcial:	\$		180.568.603,00	
segundo pago parcial:	\$		9.221.280,00		segundo pago parcial:	\$		174.595.176,00	
Tercer pago parcial:	\$		9.221.280,00		tercer pago parcial:	\$		119.567.134,00	
Valor por pagar:	\$		19.436.160,00		Valor por pagar:	\$		246.169.087,00	
Nombre Supervisor:	BRIYITH GISELA REYES QUINTERO				Nombre interventor:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES			
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias									
ESTADO DE LAS GARANTÍAS									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 053 de 2015					CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 052de 2015				
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR		CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	

INFORME EJECUTIVO MENSUAL N° 013

CONCEPTO	DESDE	HASTA	VALOR	CONCEPTO	DESDE	HASTA	VALOR	
Cumplimiento del contrato	9/06/2015	29/12/2015	\$ 300.000,00	Cumplimiento del contrato	9/06/2015	31/12/2015	\$ 1.200.000,00	
Salarios y prestaciones sociales	9/06/2015	29/12/2015	\$ 150.000,00	Estabilidad de la obra				
Calidad del servicio	25/06/2015	15/01/2016	\$ 300.000,00	Calidad del servicio	9/06/2015	31/12/2015	\$ 1.200.000,00	
Responsabilidad civil				Salarios y prestaciones sociales	9/06/2015	31/12/2015	\$ 600.000,00	
				Responsabilidad civil				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA N° 001 de 2015				CONTRATO DE OBRA N° 028 de 2015				
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA		
Cumplimiento del contrato	4/11/2015	6/12/2016	\$ 4.710.000,00	Cumplimiento del contrato	23/10/2015	11/12/2016	\$ 72.090.000,00	
Salarios y prestaciones sociales	4/11/2015	8/06/2019	\$ 9.420.000,00	Estabilidad de la obra				
Calidad del servicio	4/11/2015	19/04/2021	\$ 9.420.000,00	Calidad del servicio				
Responsabilidad civil				Salarios y prestaciones sociales	23/10/2015	11/06/2019	\$ 36.045.000,00	
				Responsabilidad civil	23/10/2015	31/01/2017	\$ 252.315.000,00	
RESUMEN DE PAGOS								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 053 de 2015				CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 052de 2015				
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR		CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR		
PAGO CONTRATO No- 053	DICIEMBRE DE 2015	\$ 3.000.000,00		PAGO CONTRATO N° 052	DICIEMBRE DE 2015	\$ 12.000.000,00		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA N° 001 de 2015				CONTRATO DE OBRA N° 028 de 2015				
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR		CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR		
PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N°001	22 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 9.221.280,00		PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	17 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 180.568.603,00		
SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N°002	07 DE MARZO DE 2016	\$ 9.221.280,00		SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	16 DE FEBRERO 2016	\$ 174.595.176,00		
TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N°003	07 DE MARZO DE 2016	\$ 9.221.280,00		TERCER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	16 DE MAYO 2016	\$ 119.567.134,00		
SEGUIMIENTO AL AVANCE								
AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	99,23%	0,00%	99,23%	% Programado	\$715.349.070,00	\$0,00	\$715.349.070,00	99,23%
% Ejecutado	90,33%	1,00%	91,33%	% Ejecutado	\$651.188.970,00	\$7.209.000,00	\$658.397.970,00	91,33%
Diferencia	8,90%	0,20%	9,10%	Diferencia	\$64.160.100,00	-\$7.209.000,00	\$56.951.100,00	-8%
DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO								
CONCRETOS: fundición de sardines, rampa de acceso principal, pañete en fachada principal interna, externa, oficinas y tarima								
ESTRUCTURAS METALICAS: se continua la actividad de suministro e instalación de estructura metálica para cubierta, Instalacion de tubos metalicos galvanizado para malla de cerramiento								
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS: suministro e instalación de puntos hidráulicos en baterías sanitarias.								
MAMPOSTERIA: se adelantan labores en muros de cerramiento								

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

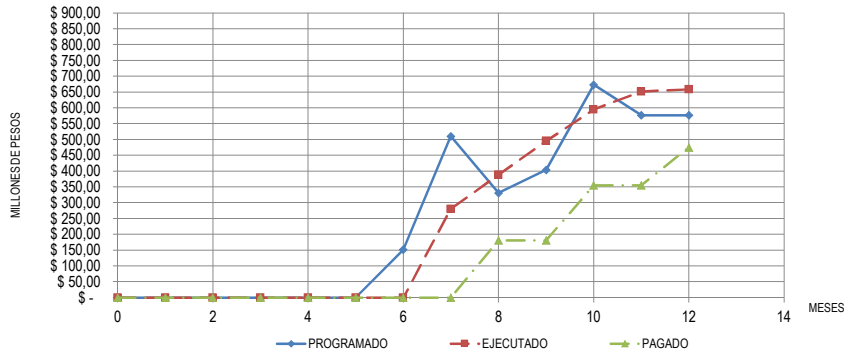

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONVENIO

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

4. RELACION DE ANEXOS


DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios	DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1. Balance Presupuestal de la obra	N	0	9. Control diario de tiempo	N	0
2. Registro Fotográfico	N	0	10. Control de personal	N	0
3. Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica	N	0	11. Control de equipo	N	0
4. Copia último informe de interventoría	N	0	12. Control de seguridad industrial	N	0
5. Copia actas de comité de obra	N	0	13. Relación de menores y mayores cantidades	N	0
6. Copia libro de obra/bitácora	N	0			
7. Copia certificado de pago a contratistas	N	0			
8. Seguimiento plan de manejo ambiental	N	0			

Elaborado por:	Revisador por:	Aprobado por:	
Nombre: MAXIMINO SANDOVAL AMADO	Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA	Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA	Elaborado: 31/05/2016
Cargo: Supervisor por parte de la alcaldía del convenio F-212	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL	Pag.1 de 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO									
CONVENIO N° F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)									
Objeto del Convenio:		ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)							
Valor del Convenio:	\$ 735.000.000,00	Aporte de Mininterior:		\$ 735.000.000,00		PRORROGA			
Valor Adición:	\$ 48.000.000,00	Aportes del Municipio:		\$ 48.000.000,00					
Valor Total inicial:	\$ 783.000.000,00	Suspensión 1		DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR		Prorroga N° 1		HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016	
Primer Plazo de Ejecución:	7 MESES	Reinicio:		11 DE MARZO DE 2016		Prorroga N° 2		HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016	
Fecha de Inicio:	08 DE MAYO DEL 2015	Suspensión 2		DESDE 14 JUN HASTA 12 JUL		Prorroga N° 3		HASTA EL 15 DE JUNIO 2016	
Vencimiento:	12 DE JULIO DE 2016								
Nuevo plazo de ejecución:	14 MESES								
Fecha de terminación:	12 DE JULIO DE 2016					Plazo Actualizado		12 DE JULIO DE 2016	
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)			Valor			Modificación fecha		
Aseguradora Solidaria de Colombia	Desde	7/05/2015	Hasta	15/12/2016	\$ 147.000.000,00		Hasta	12/07/2016	\$ 720.900.000,00
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO									
Informe N°	14	Periodo comprendido entre el 01 de JUNIO del 2016 y el 30 de JUNIO del 2016							
Proyecto	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) Y LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ								
Localización	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS					CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS				
Objeto:	*CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA cuyo objeto es CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA”.				Objeto:	*CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA”.			
Contrato N°:	MC-053 DEL 2015				Contrato N°:	MC-052 DEL 2015			
Contratista:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA				Contratista:	CELSE ANDRES ROJAS CLEVES			
Plazo Inicial:	15 dias				Plazo Inicial:	15 dias			
Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015				Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015			
*Fecha de Suspensión	19 de Junio de 2015				*Fecha de Suspensión	19 de Junio de 2015			
*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015				*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015			
Fecha de Teminación:	13 de Julio de 2015				Fecha de Teminación:	13 de Julio de 2015			
Prórrogas:	NA				Prórrogas:	NA			
Plazo Actualizado:	NA				Plazo Actualizado:	NA			
Valor Inicial:	\$ 3.000.000,00				Valor Inicial:	\$ 12.000.000,00			
Valor Adiciones:	\$ -				Valor Adiciones:	\$ -			
Valor Actualizado:	\$ -				Valor Actualizado:	\$ -			
Valor pagado:	\$ 3.000.000,00				Valor pagado:	\$ 12.000.000,00			
Valor por pagar:					Valor por pagar:				
Poliza Seguro de cumplimiento	N° 630-47-994000006429	VIGENCIA: 09/06/2015 - 15/01/2016	VALOR: 750.000		Poliza Seguro de cumplimiento	N° AA023400	VIGENCIA: 09/06/2015 - 31/12/2015	VALOR: 3.000.000	
Nombre Supervisor:	DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ				Nombre interventor:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA			
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA					CONTRATO DE OBRA				
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.				Objeto:	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. F-212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.			
Contrato N°:	001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015				Contrato N°:	028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015			
Contratista:	CELSE ANDRES ROJAS CLEVES				Contratista:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015			
Plazo Inicial:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015				Plazo Inicial:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015			
Fecha de Inicio:	10 DE NOVIEMBRE DE 2015				Fecha de Inicio:	10 DE NOVIEMBRE DE 2015			
Fecha de Teminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2015				Fecha de Teminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2015			
Primera Prórroga y modificación del convenio:	28 DE FEBRERO DE 2016				Primera Prórroga y modificación del convenio:	28 DE FEBRERO DE 2016			
Segunda modificación del convenio:	17 DICIMEBRE DE 2016				Segunda modificación del convenio:	17 DICIMEBRE DE 2016			
Plazo Actualizado:	111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015				Plazo Actualizado:	111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015			
Primera suspensión:	26 DE FEBRERO DE 2016				Primera suspensión:	26 DE FEBRERO DE 2016			
Acta de reinicio:	11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016				Acta de reinicio:	11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016			
Plazo Actualizado:	125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016				Plazo Actualizado:	125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016			
Segunda Prórroga:	30 DE ABRIL DE 2016				Segunda Prórroga:	30 DE ABRIL DE 2016			
Plazo Actualizado:	173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016				Plazo Actualizado:	173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016			
Tercera prórroga:	15 DE JUNIO DE 2016				Tercera prórroga:	15 DE JUNIO DE 2016			
Plazo Actualizado:	219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016				Plazo Actualizado:	219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016			
Segunda suspensión - solicitud de adición:	14 DE JUNIO DE 2016				Segunda suspensión - solicitud de adición:	14 DE JUNIO DE 2016			
Plazo Actualizado:	250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016				Plazo Actualizado:	250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016			
Valor Inicial:	\$ 47.100.000,00				Valor Inicial:	\$ 720.900.000,00			
Valor Adiciones:	N/A				Valor Adiciones:	N/A			
Valor Actualizado:	\$ 47.100.000,00				Valor Actualizado:	\$ 720.900.000,00			
Primer pago parcial:	\$ 9.221.280,00				Primer pago parcial:	\$ 180.568.603,00			
segundo pago parcial:	\$ 9.221.280,00				segundo pago parcial:	\$ 174.595.176,00			
Tercer pago parcial:	\$ 9.221.280,00				tercer pago parcial:	\$ 119.567.134,00			
Valor por pagar:	\$ 19.436.160,00				cuarto pago parcial:	\$ 120.340.034,00			
					Valor por pagar:	\$ 125.829.053,00			
Nombre Supervisor:	BRIYITH GISELA REYES QUINTERO				Nombre interventor:	CELSE ANDRES ROJAS CLEVES			
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias									

ESTADO DE LAS GARANTÍAS									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 053 de 2015					CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 052de 2015				
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR		CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	
	DESDE	HASTA				DESDE	HASTA		
Cumplimiento del contrato	9/06/2015	29/12/2015	\$	300.000,00	Cumplimiento del contrato	9/06/2015	31/12/2015	\$	1.200.000,00
Salarios y prestaciones sociales	9/06/2015	29/12/2015	\$	150.000,00	Estabilidad de la obra				
Calidad del servicio	25/06/2015	15/01/2016	\$	300.000,00	Calidad del servicio	9/06/2015	31/12/2015	\$	1.200.000,00
Responsabilidad civil					Salarios y prestaciones sociales	9/06/2015	31/12/2015	\$	600.000,00
					Responsabilidad civil				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA N° 001 de 2015					CONTRATO DE OBRA N° 028 de 2015				
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR		CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	
	DESDE	HASTA				DESDE	HASTA		
Cumplimiento del contrato	4/11/2015	6/12/2016	\$	4.710.000,00	Cumplimiento del contrato	23/10/2015	11/12/2016	\$	72.090.000,00
Salarios y prestaciones sociales	4/11/2015	8/06/2019	\$	9.420.000,00	Estabilidad de la obra				
Calidad del servicio	4/11/2015	19/04/2021	\$	9.420.000,00	Calidad del servicio				
Responsabilidad civil					Salarios y prestaciones sociales	23/10/2015	11/06/2019	\$	36.045.000,00
					Responsabilidad civil	23/10/2015	11/08/2016	\$	128.870.000,00
RESUMEN DE PAGOS									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 053 de 2015				CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 052de 2015					
CONCEPTO	FECHA DE PAGO		VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO		VALOR		
PAGO CONTRATO No- 053	DICIEMBRE DE 2015		\$ 3.000.000,00	PAGO CONTRATO N° 052	DICIEMBRE DE 2015		\$ 12.000.000,00		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA N° 001 de 2015				CONTRATO DE OBRA N° 028 de 2015					
CONCEPTO	FECHA DE PAGO		VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO		VALOR		
PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N°001	22 DE DICIEMBRE DE 2015		\$ 9.221.280,00	PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	17 DE DICIEMBRE DE 2015		\$ 180.568.603,00		
SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N°002	07 DE MARZO DE 2016		\$ 9.221.280,00	SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	16 DE FEBRERO 2016		\$ 174.595.176,00		
TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N°003	07 DE MARZO DE 2016		\$ 9.221.280,00	TERCER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	16 DE MAYO 2016		\$ 119.567.134,00		
				CUARTO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	21 DE JUNIO DE 2016		\$ 120.340.034,00		

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

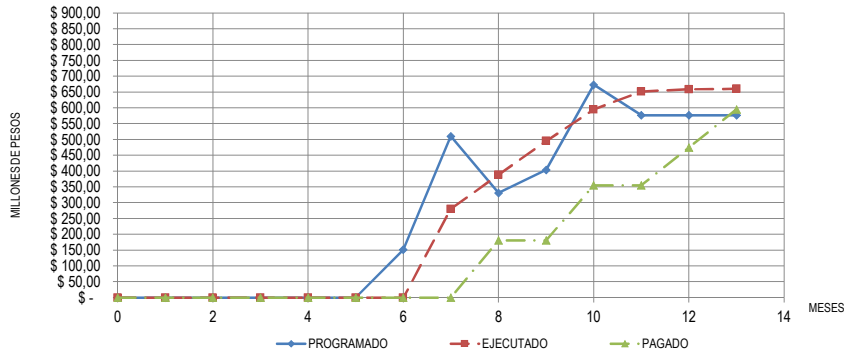

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONVENIO

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

4. RELACION DE ANEXOS


	DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra	N	0	9.	Control diario de tiempo	N	0
2.	Registro Fotográfico	N	0	10.	Control de personal	N	0
3.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica	N	0	11.	Control de equipo	N	0
4.	Copia último informe de interventoría	N	0	12.	Control de seguridad industrial	N	0
5.	Copia actas de comité de obra	N	0	13.	Relación de menores y mayores cantidades	N	0
6.	Copia libro de obra/bitácora	N	0				
7.	Copia certificado de pago a contratistas	N	0				
8.	Seguimiento plan de manejo ambiental	N	0				

Elaborado por:	Revisador por:	Aprobado por:	
Nombre: MAXIMINO SANDOVAL AMADO	Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA	Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA	Elaborado: 30/06/2016
Cargo: Supervisor por parte de la alcaldía del convenio F-212	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL	Pag.1 de 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO									
CONVENIO N° F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)									
Objeto del Convenio:		ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)							
Valor del Convenio:	\$ 735.000.000,00	Aporte de Mininterior:		\$ 735.000.000,00		PRORROGA			
Valor Adición:	\$ 48.000.000,00	Aportes del Municipio:		\$ 48.000.000,00					
Valor Total inicial:	\$ 783.000.000,00	Suspensión 1		DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR		Prorroga N° 1		HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016	
Primer Plazo de Ejecución:	7 MESES	Reinicio:		11 DE MARZO DE 2016		Prorroga N° 2		HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016	
Fecha de Inicio:	08 DE MAYO DEL 2015	Suspensión 2		DESDE 14 JUN HASTA 12 JUL		Prorroga N° 3		HASTA EL 15 DE JUNIO 2016	
Vencimiento:	31 DE AGOSTO DE 2016	1° Ampliación Suspensión 2		DESDE 12 JUL HASTA 29 AGO					
Nuevo plazo de ejecución:	15 MESES								
Fecha de terminación:	31 DE AGOSTO DE 2016					Plazo Actualizado		31 DE AGOSTO DE 2016	
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)			Valor		Modificación fecha		Modificación Valor	
Aseguradora Solidaria de Colombia	Desde	7/05/2015	Hasta	14/01/2017	\$ 147.000.000,00	Hasta	31/08/2016	\$ 720.900.000,00	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO									
Informe N°	15	Periodo comprendido entre el 01 de JULIO del 2016 y el 31 de JULIO del 2016							
Proyecto	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) Y LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ								
Localización	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ								
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS					CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS				
Objeto:	*CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA cuyo objeto es CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA*.				Objeto:	*CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA*.			
Contrato N°:	MC-053 DEL 2015				Contrato N°:	MC-052 DEL 2015			
Contratista:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA				Contratista:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES			
Plazo Inicial:	15 días				Plazo Inicial:	15 días			
Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015				Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015			
*Fecha de Suspensión	19 de Junio de 2015				*Fecha de Suspensión	19 de Junio de 2015			
*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015				*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015			
Fecha de Teminación:	13 de Julio de 2015				Fecha de Teminación:	13 de Julio de 2015			
Prórrogas:	NA				Prórrogas:	NA			
Plazo Actualizado:	NA				Plazo Actualizado:	NA			
Valor Inicial:	\$ 3.000.000,00				Valor Inicial:	\$ 12.000.000,00			
Valor Adiciones:	\$ -				Valor Adiciones:	\$ -			
Valor Actualizado:	\$ -				Valor Actualizado:	\$ -			
Valor pagado:	\$ 3.000.000,00				Valor pagado:	\$ 12.000.000,00			
Valor por pagar:					Valor por pagar:				
Poliza Seguro de cumplimiento	N° 630-47-994000006429	VIGENCIA: 09/06/2015 - 15/01/2016		VALOR: 750.000	Poliza Seguro de cumplimiento	N° AA023400	VIGENCIA: 09/06/2015 - 31/12/2015		VALOR: 3.000.000
Nombre Supervisor:	DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ				Nombre interventor:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA			
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias									
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA					CONTRATO DE OBRA				
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.				Objeto:	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. F-212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.			
Contrato N°:	001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015				Contrato N°:	028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015			
Contratista:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES				Contratista:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015			
Plazo Inicial:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015				Plazo Inicial:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015			
Fecha de Inicio:	10 DE NOVIEMBRE DE 2015				Fecha de Inicio:	10 DE NOVIEMBRE DE 2015			
Fecha de Teminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2015				Fecha de Teminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2015			
Primera Prórroga y modificación del convenio:	28 DE FEBRERO DE 2016				Primera Prórroga y modificación del convenio:	28 DE FEBRERO DE 2016			
Segunda modificación del convenio:	17 DICIMEBRE DE 2016				Segunda modificación del convenio:	17 DICIMEBRE DE 2016			
Plazo Actualizado:	111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015				Plazo Actualizado:	111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015			
Primera suspensión:	26 DE FEBRERO DE 2016				Primera suspensión:	26 DE FEBRERO DE 2016			
Acta de reinicio:	11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016				Acta de reinicio:	11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016			
Plazo Actualizado:	125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016				Plazo Actualizado:	125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016			
Segunda Prórroga:	30 DE ABRIL DE 2016				Segunda Prórroga:	30 DE ABRIL DE 2016			
Plazo Actualizado:	173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016				Plazo Actualizado:	173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016			
Tercera prórroga:	15 DE JUNIO DE 2016				Tercera prórroga:	15 DE JUNIO DE 2016			
Plazo Actualizado:	219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016				Plazo Actualizado:	219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016			
Segunda suspensión - solicitud de adición:	14 DE JUNIO DE 2016				Segunda suspensión - solicitud de adición:	14 DE JUNIO DE 2016			
Ampliación segunda suspensión:	12 DE JULIO DE 2016				Ampliación segunda suspensión:	12 DE JULIO DE 2016			
Plazo Actualizado:	250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016				Plazo Actualizado:	250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016			
Valor Inicial:	\$ 47.100.000,00				Valor Inicial:	\$ 720.900.000,00			
Valor Adiciones:	N/A				Valor Adiciones:	N/A			
Valor Actualizado:	\$ 47.100.000,00				Valor Actualizado:	\$ 720.900.000,00			
Primer pago parcial:	\$ 9.221.280,00				Primer pago parcial:	\$ 180.568.603,00			
segundo pago parcial:	\$ 9.221.280,00				segundo pago parcial:	\$ 174.595.176,00			
Tercer pago parcial:	\$ 9.221.280,00				tercer pago parcial:	\$ 119.567.134,00			
Valor por pagar:	\$ 19.436.160,00				cuarto pago parcial:	\$ 120.340.034,00			
					Valor por pagar:	\$ 125.829.053,00			
Nombre Supervisor:	BRIYITH GISELA REYES QUINTERO				Nombre interventor:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES			
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias									

[illegible]

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

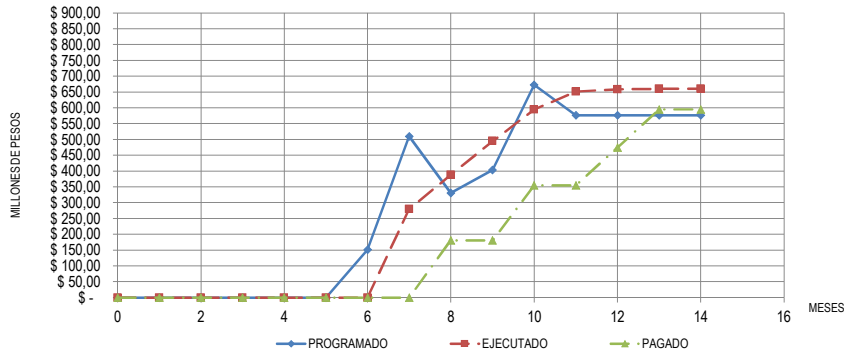

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONVENIO

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

4. RELACION DE ANEXOS

	DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra	N	0	9.	Control diario de tiempo	N	0
2.	Registro Fotográfico	N	0	10.	Control de personal	N	0
3.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica	N	0	11.	Control de equipo	N	0
4.	Copia último informe de interventoría	N	0	12.	Control de seguridad industrial	N	0
5.	Copia actas de comité de obra	N	0	13.	Relación de menores y mayores cantidades	N	0
6.	Copia libro de obra/bitácora	N	0				
7.	Copia certificado de pago a contratistas	N	0				
8.	Seguimiento plan de manejo ambiental	N	0				


Elaborado por:	Revisor por:	Aprobado por:	
Nombre: MAXIMINO SANDOVAL AMADO	Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA	Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA	Elaborado: 31/07/2016
Cargo: Supervisor por parte de la alcaldía del convenio F-212	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL	Pag.1 de 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO									
CONVENIO N° F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)									
Objeto del Convenio:		ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)							
Valor del Convenio:		\$ 735.000.000,00		Aporte de Mininterior:		\$ 735.000.000,00		PRORROGA	
Valor Adición:		\$ 48.000.000,00		Aportes del Municipio:		\$ 48.000.000,00			
Valor Total inicial:		\$ 783.000.000,00		Suspensión 1		DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR		Prorroga N° 1	
Primer Plazo de Ejecución:		7 MESES		Reinicio:		11 DE MARZO DE 2016		Prorroga N° 2	
Fecha de Inicio:		08 DE MAYO DEL 2015		Suspensión 2		DESDE 14 JUN HASTA 12 JUL		Prorroga N° 3	
Vencimiento:		15 DE SEPTIEMBRE DE 2016		1° Ampliación Suspensión 2		DESDE 12 JUL HASTA 29 AGO		HASTA EL 15 DE JUNIO 2016	
Nuevo plazo de ejecución:		16 MESES		2° ampliación Suspensión 2		DESDE 29 AGO HASTA 15 SEP			
Fecha de terminación:		15 DE SEPTIEMBRE DE 2016						Plazo Actualizado	
Póliza de garantía única:		Vigencia póliza (Fechas)				Valor		Modificación fecha	
Aseguradora Solidaria de Colombia		Desde		7/05/2015		Hasta		28/02/2017	
						\$ 147.000.000,00		Hasta	
								17/09/2016	
								\$ 720.900.000,00	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO									
Informe N°	16		Periodo comprendido entre el 01 de AGOSTO del 2016 y el 31 de AGOSTO del 2016						
Proyecto	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) Y LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ								
Localización	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS					CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS				
Objeto:	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA cuyo objeto es CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA".				Objeto:	"CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA".			
Contrato N°:	MC-053 DEL 2015				Contrato N°:	MC-052 DEL 2015			
Contratista:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA				Contratista:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES			
Plazo Inicial:	15 días				Plazo Inicial:	15 días			
Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015				Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015			
*Fecha de Suspensión	19 de Junio de 2015				*Fecha de Suspensión	19 de Junio de 2015			
*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015				*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015			
Fecha de Teminación:	13 de Julio de 2015				Fecha de Teminación:	13 de Julio de 2015			
Prórrogas:	NA				Prórrogas:	NA			
Plazo Actualizado:	NA				Plazo Actualizado:	NA			
Valor Inicial:	\$ 3.000.000,00				Valor Inicial:	\$ 12.000.000,00			
Valor Adiciones:	\$ -				Valor Adiciones:	\$ -			
Valor Actualizado:	\$ -				Valor Actualizado:	\$ -			
Valor pagado:	\$ 3.000.000,00				Valor pagado:	\$ 12.000.000,00			
Valor por pagar:					Valor por pagar:				
Poliza Seguro de cumplimiento	N° 630-47-994000006429	VIGENCIA: 09/06/2015 - 15/01/2016		VALOR: 750.000	Poliza Seguro de cumplimiento	N° AA023400	VIGENCIA: 09/06/2015 - 31/12/2015		VALOR: 3.000.000
Nombre Supervisor:	DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ				Nombre interventor:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA			
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA					CONTRATO DE OBRA				
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.				Objeto:	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. F-212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.			
Contrato N°:	001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015				Contrato N°:	028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015			
Contratista:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES				Contratista:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015			
Plazo Inicial:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015				Plazo Inicial:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015			
Fecha de Inicio:	10 DE NOVIEMBRE DE 2015				Fecha de Inicio:	10 DE NOVIEMBRE DE 2015			
Fecha de Teminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2015				Fecha de Teminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2015			
Primera Prórroga y modificación del convenio:	28 DE FEBRERO DE 2016				Primera Prórroga y modificación del convenio:	28 DE FEBRERO DE 2016			
Segunda modificación del convenio:	17 DICIMEBRE DE 2016				Segunda modificación del convenio:	17 DICIMEBRE DE 2016			
Plazo Actualizado:	111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015				Plazo Actualizado:	111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015			
Primera suspensión:	26 DE FEBRERO DE 2016				Primera suspensión:	26 DE FEBRERO DE 2016			
Acta de reinicio:	11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016				Acta de reinicio:	11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016			
Plazo Actualizado:	125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016				Plazo Actualizado:	125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016			
Segunda Prórroga:	30 DE ABRIL DE 2016				Segunda Prórroga:	30 DE ABRIL DE 2016			
Plazo Actualizado:	173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016				Plazo Actualizado:	173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016			
Tercera prórroga:	15 DE JUNIO DE 2016				Tercera prórroga:	15 DE JUNIO DE 2016			
Plazo Actualizado:	219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016				Plazo Actualizado:	219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016			
Segunda suspensión - solicitud de adición:	14 DE JUNIO DE 2016				Segunda suspensión - solicitud de adición:	14 DE JUNIO DE 2016			
Ampliación segunda suspensión:	12 DE JULIO DE 2016				Ampliación segunda suspensión:	12 DE JULIO DE 2016			
Segunda ampliación de la segunda suspesión:	27 DE AGOSTO DE 2016				Segunda ampliación de la segunda suspesión:	27 DE AGOSTO DE 2016			
Plazo Actualizado:	250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016				Plazo Actualizado:	250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016			
Valor Inicial:	\$ 47.100.000,00				Valor Inicial:	\$ 720.900.000,00			
Valor Adiciones:	N/A				Valor Adiciones:	N/A			
Valor Actualizado:	\$ 47.100.000,00				Valor Actualizado:	\$ 720.900.000,00			
Primer pago parcial:	\$ 9.221.280,00				Primer pago parcial:	\$ 180.568.603,00			
segundo pago parcial:	\$ 9.221.280,00				segundo pago parcial:	\$ 174.595.176,00			
Tercer pago parcial:	\$ 9.221.280,00				tercer pago parcial:	\$ 119.567.134,00			
Valor por pagar:	\$ 19.436.160,00				cuarto pago parcial:	\$ 120.340.034,00			
					Valor por pagar:	\$ 125.829.053,00			

INFORME EJECUTIVO MENSUAL N° 016

Nombre Supervisor:		BRIYITH GISELA REYES QUINTERO		Nombre interventor:		CELSO ANDRES ROJAS CLEVES		
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias								
ESTADO DE LAS GARANTÍAS								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 053 de 2015				CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 052de 2015				
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA		
Cumplimiento del contrato	9/06/2015	29/12/2015	\$ 300.000,00	Cumplimiento del contrato	9/06/2015	31/12/2015	\$ 1.200.000,00	
Salarios y prestaciones sociales	9/06/2015	29/12/2015	\$ 150.000,00	Estabilidad de la obra				
Calidad del servicio	25/06/2015	15/01/2016	\$ 300.000,00	Calidad del servicio	9/06/2015	31/12/2015	\$ 1.200.000,00	
Responsabilidad civil				Salarios y prestaciones sociales	9/06/2015	31/12/2015	\$ 600.000,00	
				Responsabilidad civil				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA N° 001 de 2015				CONTRATO DE OBRA N° 028 de 2015				
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA		
Cumplimiento del contrato	4/11/2015	25/02/2017	\$ 4.710.000,00	Cumplimiento del contrato	23/10/2015	31/01/2017	\$ 72.090.000,00	
Salarios y prestaciones sociales	4/11/2015	25/08/2019	\$ 9.420.000,00					
Calidad del servicio	4/11/2015	19/04/2021	\$ 9.420.000,00					
Responsabilidad civil				Salarios y prestaciones sociales	23/10/2015	30/07/2019	\$ 36.045.000,00	
				Responsabilidad civil	23/10/2015	11/08/2016	\$ 128.870.000,00	
RESUMEN DE PAGOS								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 053 de 2015				CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 052de 2015				
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR		CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR		
PAGO CONTRATO No- 053	DICIEMBRE DE 2015	\$ 3.000.000,00		PAGO CONTRATO N° 052	DICIEMBRE DE 2015	\$ 12.000.000,00		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA N° 001 de 2015				CONTRATO DE OBRA N° 028 de 2015				
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR		CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR		
PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N°001	22 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 9.221.280,00		PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	17 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 180.568.603,00		
SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N°002	07 DE MARZO DE 2016	\$ 9.221.280,00		SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	16 DE FEBRERO 2016	\$ 174.595.176,00		
TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N°003	07 DE MARZO DE 2016	\$ 9.221.280,00		TERCER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	16 DE MAYO 2016	\$ 119.567.134,00		
				CUARTO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	21 DE JUNIO DE 2016	\$ 120.340.034,00		
SEGUIMIENTO AL AVANCE								
AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	79,97%	0,00%	79,97%	% Programado	\$576.503.730,00	\$0,00	\$576.503.730,00	79,97%
% Ejecutado	91,58%	0,00%	91,58%	% Ejecutado	\$660.200.220,00	\$0,00	\$660.200.220,00	91,58%
Diferencia	11,61%	0,00%	11,61%	Diferencia	-\$83.696.490,00	\$0,00	-\$83.696.490,00	12%
DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO								
La obra se encuentra suspendida, ya que se presento ante la supervisión un balance de obra, donde se demuestra las cantidades de más, necesarias para la culminación del contrato, este balance es estudiado y evaluado por el MINISTERIO DEL INTERIOR, para la posible aprobación de la adición.								
</								

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

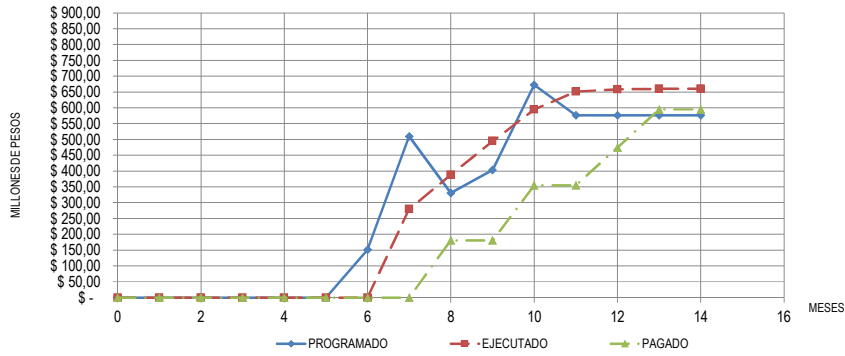

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONVENIO

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

4. RELACION DE ANEXOS

	DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra	N	0	9.	Control diario de tiempo	N	0
2.	Registro Fotográfico	N	0	10.	Control de personal	N	0
3.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica	N	0	11.	Control de equipo	N	0
4.	Copia último informe de interventoría	N	0	12.	Control de seguridad industrial	N	0
5.	Copia actas de comité de obra	N	0	13.	Relación de menores y mayores cantidades	N	0
6.	Copia libro de obra/bitácora	N	0				
7.	Copia certificado de pago a contratistas	N	0				
8.	Seguimiento plan de manejo ambiental	N	0				

Elaborado por:	Revisador por:	Aprobado por:	
Nombre: MAXIMINO SANDOVAL AMADO	Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA	Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA	Elaborado: 31/08/2016
Cargo: Supervisor por parte de la alcaldía del convenio F-212	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL	Pag.1 de 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO									
CONVENIO N° F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)									
Objeto del Convenio:		ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)							
Valor del Convenio:		\$ 735.000.000,00		Aporte de Mininterior:		\$ 735.000.000,00		PRORROGA	
Valor Adición:		\$ 48.000.000,00		Aportes del Municipio:		\$ 48.000.000,00			
Valor Total inicial:		\$ 783.000.000,00		Suspensión 1		DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR		Prorroga N° 1	
Primer Plazo de Ejecución:		7 MESES		Reinicio:		11 DE MARZO DE 2016		Prorroga N° 2	
Fecha de Inicio:		08 DE MAYO DEL 2015		Suspensión 2		DESDE 14 JUN HASTA 12 JUL		Prorroga N° 3	
Vencimiento:		31 DE OCTUBRE DE 2016		1° Ampliación Suspensión 2		DESDE 12 JUL HASTA 29 AGO		Prorroga N° 4	
Nuevo plazo de ejecución:		17 MESES		2° ampliación Suspensión 2		DESDE 29 AGO HASTA 15 SEP			
Fecha de terminación:		31 DE OCTUBRE DE 2016		Reinicio:		05 DE SEPTIEMBRE DE 2016		Plazo Actualizado	
Póliza de garantía única:		Vigencia póliza (Fechas)				Valor		Modificación fecha	
Aseguradora Solidaria de Colombia		Desde		7/05/2015		Hasta		19/05/2017	
						\$ 167.000.000,00		Hasta	
								31/10/2016	
								\$ 720.900.000,00	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO									
Informe N°	17		Periodo comprendido entre el 01 de SEPTIEMBRE del 2016 y el 30 de SEPTIEMBRE del 2016						
Proyecto	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) Y LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ								
Localización	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS					CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS				
Objeto:	*CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA cuyo objeto es CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU,				Objeto:	*CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA”.			
Contrato N°:	MC-053 DEL 2015				Contrato N°:	MC-052 DEL 2015			
Contratista:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA				Contratista:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES			
Plazo Inicial:	15 días				Plazo Inicial:	15 días			
Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015				Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015			
*Fecha de Suspensión	19 de Junio de 2015				*Fecha de Suspensión	19 de Junio de 2015			
*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015				*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015			
Fecha de Teminación:	13 de Julio de 2015				Fecha de Teminación:	13 de Julio de 2015			
Prórrogas:	NA				Prórrogas:	NA			
Plazo Actualizado:	NA				Plazo Actualizado:	NA			
Valor Inicial:	\$ 3.000.000,00				Valor Inicial:	\$ 12.000.000,00			
Valor Adiciones:	\$ -				Valor Adiciones:	\$ -			
Valor Actualizado:	\$ -				Valor Actualizado:	\$ -			
Valor pagado:	\$ 3.000.000,00				Valor pagado:	\$ 12.000.000,00			
Valor por pagar:					Valor por pagar:				
Poliza Seguro de cumplimiento	N° 630-47-994000006429		VIGENCIA: 09/06/2015 - 15/01/2016		VALOR: 750.000	Poliza Seguro de cumplimiento	N° AA023400		VIGENCIA: 09/06/2015 - 31/12/2015
						VALOR: 3.000.000			
Nombre Supervisor:	DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ				Nombre interventor:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA			
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA					CONTRATO DE OBRA				
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.				Objeto:	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. F-212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.			
Contrato N°:	001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015				Contrato N°:	028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015			
Contratista:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES				Contratista:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015			
Plazo Inicial:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015				Plazo Inicial:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015			
Fecha de Inicio:	10 DE NOVIEMBRE DE 2015				Fecha de Inicio:	10 DE NOVIEMBRE DE 2015			
Fecha de Teminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2015				Fecha de Teminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2015			
Primera Prórroga y modificación del convenio:	28 DE FEBRERO DE 2016				Primera Prórroga y modificación del convenio:	28 DE FEBRERO DE 2016			
Segunda modificación del convenio:	17 DICIEMBRE DE 2016				Segunda modificación del convenio:	17 DICIEMBRE DE 2016			
Plazo Actualizado:	111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015				Plazo Actualizado:	111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015			
Primera suspensión:	26 DE FEBRERO DE 2016				Primera suspensión:	26 DE FEBRERO DE 2016			
Acta de reinicio:	11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016				Acta de reinicio:	11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016			
Plazo Actualizado:	125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016				Plazo Actualizado:	125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016			
Segunda Prórroga:	30 DE ABRIL DE 2016				Segunda Prórroga:	30 DE ABRIL DE 2016			
Plazo Actualizado:	173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016				Plazo Actualizado:	173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016			
Tercera prórroga:	15 DE JUNIO DE 2016				Tercera prórroga:	15 DE JUNIO DE 2016			
Plazo Actualizado:	219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016				Plazo Actualizado:	219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016			
Segunda suspensión - solicitud de adición:	14 DE JUNIO DE 2016				Segunda suspensión - solicitud de adición:	14 DE JUNIO DE 2016			
Ampliación segunda suspensión:	12 DE JULIO DE 2016				Ampliación segunda suspensión:	12 DE JULIO DE 2016			
Segunda ampliación de la segunda suspensión:	27 DE AGOSTO DE 2016				Segunda ampliación de la segunda suspensión:	27 DE AGOSTO DE 2016			
Cuarta prórroga y primera adición de obra:	31 DE OCTUBRE DE 2016				Cuarta prórroga y primera adición de obra:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2016			
Plazo Actualizado:	250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016				Plazo Actualizado:	250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016			
Acta de reanudación N° 02:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2016				Acta de reanudación N° 02:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2016			
Firma de OTRO SI N°001 adición en tiempo:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2016				Firma de OTRO SI N°001 adición en valor:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2016			
Valor Inicial:	\$ 47.100.000,00				Valor Inicial:	\$ 720.900.000,00			
Valor Adiciones:	N/A				Valor Adiciones:	N/A			
Valor Actualizado:	\$ 47.100.000,00				Valor Actualizado:	\$ 720.900.000,00			
Primer pago parcial:	\$ 9.221.280,00				Primer pago parcial:	\$ 180.568.603,00			

INFORME EJECUTIVO MENSUAL N° 017

segundo pago parcial:	\$	9.221.280,00	segundo pago parcial:	\$	174.595.176,00
Tercer pago parcial:	\$	9.221.280,00	tercer pago parcial:	\$	119.567.134,00
Valor por pagar:	\$	19.436.160,00	cuarto pago parcial:	\$	120.340.034,00
			Valor por pagar:	\$	125.829.053,00

Nombre interventor:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
---------------------	---------------------------

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015				CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052de 2015			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	9/06/2015	29/12/2015	\$ 300.000,00	Cumplimiento del contrato	9/06/2015	31/12/2015	\$ 1.200.000,00
Salarios y prestaciones sociales	9/06/2015	29/12/2015	\$ 150.000,00	Estabilidad de la obra			
Calidad del servicio	25/06/2015	15/01/2016	\$ 300.000,00	Calidad del servicio	9/06/2015	31/12/2015	\$ 1.200.000,00
Responsabilidad civil				Salarios y prestaciones sociales	9/06/2015	31/12/2015	\$ 600.000,00
				Responsabilidad civil			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº 001 de 2015				CONTRATO DE OBRA Nº 028 de 2015			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	4/11/2015	25/02/2017	\$ 4.710.000,00	Cumplimiento del contrato	23/10/2015	31/01/2017	\$ 72.090.000,00
Salarios y prestaciones sociales	4/11/2015	25/08/2019	\$ 9.420.000,00				
Calidad del servicio	4/11/2015	19/04/2021	\$ 9.420.000,00				
Responsabilidad civil				Salarios y prestaciones sociales	23/10/2015	30/07/2019	\$ 36.045.000,00
				Responsabilidad civil	23/10/2015	11/08/2016	\$ 128.870.000,00

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 053 de 2015			CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Nº 052 de 2015		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
PAGO CONTRATO No- 053	DICIEMBRE DE 2015	\$ 3.000.000,00	PAGO CONTRATO Nº 052	DICIEMBRE DE 2015	\$ 12.000.000,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA Nº 001 de 2015			CONTRATO DE OBRA Nº 028 de 2015		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº001	22 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 9.221.280,00	PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	17 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 180.568.603,00
SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº002	07 DE MARZO DE 2016	\$ 9.221.280,00	SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	16 DE FEBRERO 2016	\$ 174.595.176,00
TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA Nº003	07 DE MARZO DE 2016	\$ 9.221.280,00	TERCER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	16 DE MAYO 2016	\$ 119.567.134,00
			CUARTO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	21 DE JUNIO DE 2016	\$ 120.340.034,00
			PRIMER PAGO ADICION N° 001	04 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 88.980.686,00

SEGUIMIENTO AL AVANCE

[illegible][illegible]

se reanudan labores en la obra se reinicio el 05 de septiembre de 2016


Las actividades elaboradas en el presente mes, incluyen:

Actividad de estuco en camerinos

Aplicación de cal sobre gradería

Aplicación de graniplast sobre fachada, muros de cerramiento, pedestales y tarima

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

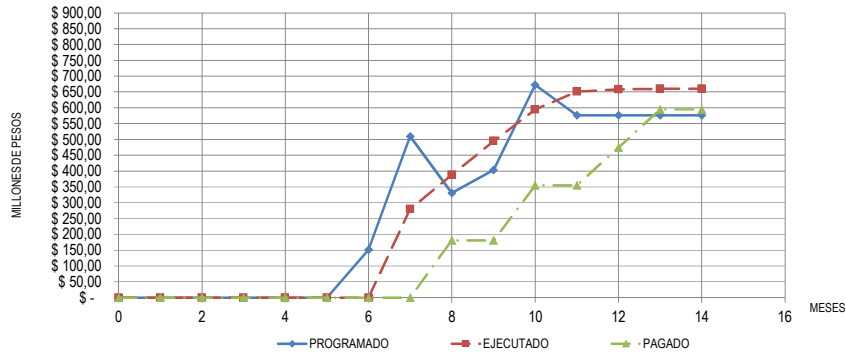

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONVENIO

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

4. RELACION DE ANEXOS

	DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra	N	0	9.	Control diario de tiempo	N	0
2.	Registro Fotográfico	N	0	10.	Control de personal	N	0
3.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica	N	0	11.	Control de equipo	N	0
4.	Copia último informe de interventoría	N	0	12.	Control de seguridad industrial	N	0
5.	Copia actas de comité de obra	N	0	13.	Relación de menores y mayores cantidades	N	0
6.	Copia libro de obra/bitácora	N	0				
7.	Copia certificado de pago a contratistas	N	0				
8.	Seguimiento plan de manejo ambiental	N	0				

Elaborado por:	Revisador por:	Aprobado por:	
Nombre: MAXIMINO SANDOVAL AMADO	Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA	Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA	Elaborado: 30/09/2016
Cargo: Supervisor por parte de la alcaldía del convenio F-212	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL	Pag.1 de 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO										
CONVENIO N° F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)										
Objeto del Convenio:		ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)								
Valor del Convenio:		\$ 735.000.000,00		Aporte de Mininterior:		\$ 735.000.000,00		PRORROGA		
Valor Adición:		\$ 48.000.000,00		Aporte de Mininterior:		\$ 100.000.000,00				
Valor Total inicial:		\$ 783.000.000,00		Aportes del Municipio:		\$ 48.000.000,00				
Valor Adición:		\$ 100.000.000,00		Aportes del Municipio:		\$ 88.980.686,00				
Valor Adición:		\$ 88.980.686,00						Prorroga N° 1		HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016
Valor Total final:		\$ 971.980.686,00		Suspensión 1		DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR		Prorroga N° 2		HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016
Primer Plazo de Ejecución:		7 MESES		Reinicio:		11 DE MARZO DE 2016		Prorroga N° 3		HASTA EL 15 DE JUNIO 2016
Fecha de Inicio:		08 DE MAYO DEL 2015		Suspensión 2		DESDE 14 JUN HASTA 12 JUL		Prorroga N° 4		HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016
Vencimiento:		30 DE NOVIEMBRE DE 2016		1° Ampliación Suspensión 2		DESDE 12 JUL HASTA 29 AGO		Prorroga N° 5		HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016
Nuevo plazo de ejecución:		18 MESES		2° ampliación Suspensión 2		DESDE 29 AGO HASTA 15 SEP				
Fecha de terminación:		30 DE NOVIEMBRE DE 2016		Reinicio:		05 DE SEPTIEMBRE DE 2016		Plazo Actualizado		HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016
Póliza de garantía única:		Vigencia póliza (Fechas)				Valor		Modificación fecha		Modificación Valor
Aseguradora Solidaria de Colombia		Desde	7/05/2015	Hasta	19/05/2017	\$ 167.000.000,00		Hasta	15/11/2016	\$ 909.880.868,00
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO										
Informe N°	18	Periodo comprendido entre el 01 de OCTUBRE del 2016 y el 31 de OCTUBRE del 2016								
Proyecto	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) Y LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ									
Localización	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS				CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS						
Objeto:	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA cuyo objeto es CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA".			Objeto:	"CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA".					
Contrato N°:	MC-053 DEL 2015			Contrato N°:	MC-052 DEL 2015					
Contratista:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA			Contratista:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES					
Plazo Inicial:	15 días			Plazo Inicial:	15 días					
Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015			Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015					
*Fecha de Suspensión	19 de Junio de 2015			*Fecha de Suspensión	19 de Junio de 2015					
*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015			*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015					
Fecha de Teminación:	13 de Julio de 2015			Fecha de Teminación:	13 de Julio de 2015					
Prórrogas:	NA			Prórrogas:	NA					
Plazo Actualizado:	NA			Plazo Actualizado:	NA					
Valor Inicial:	\$ 3.000.000,00			Valor Inicial:	\$ 12.000.000,00					
Valor Adiciones:	\$ -			Valor Adiciones:	\$ -					
Valor Actualizado:	\$ -			Valor Actualizado:	\$ -					
Valor pagado:	\$ 3.000.000,00			Valor pagado:	\$ 12.000.000,00					
Valor por pagar:				Valor por pagar:						
Poliza Seguro de cumplimiento	N° 630-47-994000006429	VIGENCIA: 09/06/2015 - 15/01/2016	VALOR: 750.000	Poliza Seguro de cumplimiento	N° AA023400	VIGENCIA: 09/06/2015 - 31/12/2015	VALOR: 3.000.000			
Nombre Supervisor:	DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ			Nombre interventor:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA					
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA				CONTRATO DE OBRA						
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.			Objeto:	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. F-212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.					
Contrato N°:	001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015			Contrato N°:	028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015					
Contratista:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES			Contratista:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015					
Plazo Inicial:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015			Plazo Inicial:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015					
Fecha de Inicio:	10 DE NOVIEMBRE DE 2015			Fecha de Inicio:	10 DE NOVIEMBRE DE 2015					
Fecha de Teminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2015			Fecha de Teminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2015					
Primera Prórroga y modificación del convenio:	28 DE FEBRERO DE 2016			Primera Prórroga y modificación del convenio:	28 DE FEBRERO DE 2016					
Segunda modificación del convenio:	17 DICIMEBRE DE 2016			Segunda modificación del convenio:	17 DICIMEBRE DE 2016					
Plazo Actualizado:	111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015			Plazo Actualizado:	111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015					
Primera suspensión:	26 DE FEBRERO DE 2016			Primera suspensión:	26 DE FEBRERO DE 2016					
Acta de reinicio:	11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016			Acta de reinicio:	11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016					
Plazo Actualizado:	125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016			Plazo Actualizado:	125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016					
Segunda Prórroga:	30 DE ABRIL DE 2016			Segunda Prórroga:	30 DE ABRIL DE 2016					
Plazo Actualizado:	173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016			Plazo Actualizado:	173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016					
Tercera prórroga:	15 DE JUNIO DE 2016			Tercera prórroga:	15 DE JUNIO DE 2016					
Plazo Actualizado:	219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016			Plazo Actualizado:	219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016					
Segunda suspensión - solicitud de adición:	14 DE JUNIO DE 2016			Segunda suspensión - solicitud de adición:	14 DE JUNIO DE 2016					
Ampliación segunda suspensión:	12 DE JULIO DE 2016			Ampliación segunda suspensión:	12 DE JULIO DE 2016					
Segunda ampliación de la segunda suspesión:	27 DE AGOSTO DE 2016			Segunda ampliación de la segunda suspesión:	27 DE AGOSTO DE 2016					
Cuarta prorroga y primera adición de obra:	31 DE OCTUBRE DE 2016			Cuarta prorroga y primera adición de obra:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2016					
Plazo Actualizado:	250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016			Plazo Actualizado:	250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016					
Acta de reanudación N° 02:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2016			Acta de reanudación N° 02:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2016					
Firma de OTRO SI N°001 adición en tiempo:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2016			Firma de OTRO SI N°001 adición en valor:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2016					
quinta prorroga:	19 DE OCTUBRE DE 2016			quinta prorroga:	19 DE OCTUBRE DE 2016					

INFORME EJECUTIVO MENSUAL N° 018

Firma de OTRO SI N°002 adición en tiempo:	28 DE OCTUBRE DE 2016	Firma de OTRO SI N°002 adición en tiempo:	28 DE OCTUBRE DE 2016
Valor Inicial:	\$ 47.100.000,00	Valor Inicial:	\$ 720.900.000,00
Valor Adiciones:	N/A	Valor Adiciones:	\$ 188.980.868,00
Valor Actualizado:	\$ 47.100.000,00	Valor Actualizado:	\$ 909.880.868,00
Primer pago parcial:	\$ 9.221.280,00	Primer pago parcial:	\$ 180.568.603,00
segundo pago parcial:	\$ 9.221.280,00	segundo pago parcial:	\$ 174.595.176,00
Tercer pago parcial:	\$ 9.221.280,00	tercer pago parcial:	\$ 119.567.134,00
Valor por pagar:	\$ 19.436.160,00	cuarto pago parcial:	\$ 120.340.034,00
		Valor por pagar:	\$ 125.829.053,00
		Quinto pago parcial anticipo OTRO SI N° 001:	\$ 88.980.686,00
		Valor por pagar anticipo OTRO SI N° 001:	\$ 100.000.000,00

Nombre Supervisor:	BRIYITH GISELA REYES QUINTERO	Nombre interventor:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias			

ESTADO DE LAS GARANTÍAS						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 053 de 2015				CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 052 de 2015		
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)	
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	9/06/2015	29/12/2015	\$ 300.000,00	Cumplimiento del contrato	9/06/2015	31/12/2015
Salarios y prestaciones sociales	9/06/2015	29/12/2015	\$ 150.000,00	Estabilidad de la obra		
Calidad del servicio	25/06/2015	15/01/2016	\$ 300.000,00	Calidad del servicio	9/06/2015	31/12/2015
Responsabilidad civil				Salarios y prestaciones sociales	9/06/2015	31/12/2015
				Responsabilidad civil		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA N° 001 de 2015				CONTRATO DE OBRA N° 028 de 2015		
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)	
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	4/11/2015	9/04/2017	\$ 4.710.000,00	Cumplimiento del contrato	23/10/2015	31/01/2017
Salarios y prestaciones sociales	4/11/2015	9/10/2019	\$ 9.420.000,00			
Calidad del servicio	4/11/2015	19/04/2021	\$ 9.420.000,00			
Responsabilidad civil				Salarios y prestaciones sociales	23/10/2015	30/07/2019
				Responsabilidad civil	23/10/2015	15/11/2016


RESUMEN DE PAGOS						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 053 de 2015				CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 052de 2015		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR		CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
PAGO CONTRATO No- 053	DICIEMBRE DE 2015	\$ 3.000.000,00		PAGO CONTRATO N° 052	DICIEMBRE DE 2015	\$ 12.000.000,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA N° 001 de 2015				CONTRATO DE OBRA N° 028 de 2015		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR		CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N°001	22 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 9.221.280,00		PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	17 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 180.568.603,00
SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N°002	07 DE MARZO DE 2016	\$ 9.221.280,00		SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	16 DE FEBRERO 2016	\$ 174.595.176,00
TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N°003	07 DE MARZO DE 2016	\$ 9.221.280,00		TERCER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	16 DE MAYO 2016	\$ 119.567.134,00
				CUARTO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	21 DE JUNIO DE 2016	\$ 120.340.034,00
				PRIMER PAGO ADICION N° 001	04 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 88.980.686,00

SEGUIMIENTO AL AVANCE								
AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	74,91%	11,71%	86,62%	% Programado	\$788.138.807,86	\$106.547.049,64	\$788.138.807,86	86,62%
% Ejecutado	72,95%	10,46%	83,41%	% Ejecutado	\$663.758.093,21	\$95.173.538,79	\$758.931.632,00	83,41%
Diferencia	-1,96%	1,25%	3,21%	Diferencia	\$124.380.714,66	\$11.373.510,85	\$29.207.175,86	3,21%

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO
Se realiza el quinto pago de obra, que consta del pago del Municipio del OTRO SI N° 001 por un valor de \$88.980.868 m/te
Para el convenio, obra e interventoria, se se realiza la quinta prorroga hasta el 15 de noviembre, ya que el MINISTERIO DEL INTERIOR no ha desembolsado los recursos para la culminación de la obra, siendo necesario la ampliación de tiempo, hasta el 10 de diciembre de 2016
Es necesario ampliar los terminos de ejecución de la obra y el acompañamiento por parte de la interventoria, siendo necesaria la adición en tiempo del OTRO SI N° 002, prorroga N° 05 donde es firmada por ambas partes el día 28 de octubre del año 2016

Las actividades elaboradas en el presente mes, incluyen:
Se inicia la actividad de pintura en camerinos a dos manos, se inicia el pintado con pintura trafico sobre graderías, se da inicio a la aplicacin de graniplast en fachada principal, pedestales y tarima
Pegue de enchape en guarda escobas, se inicia con el pegue de enchape para baños en los camerinos
suministro e instalacion de carpinteria metalica
suministro e instalación de cubierta.
Construcción de mesón en granito lavado y gradería para tarima

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

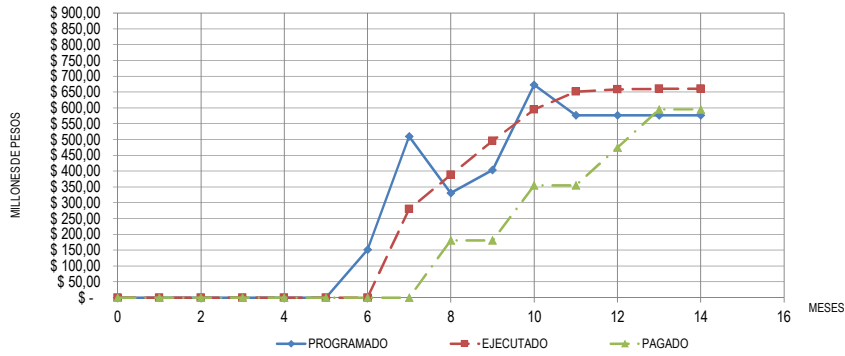

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONVENIO

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

4. RELACION DE ANEXOS

	DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra	N	0	9.	Control diario de tiempo	N	0
2.	Registro Fotográfico	N	0	10.	Control de personal	N	0
3.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica	N	0	11.	Control de equipo	N	0
4.	Copia último informe de interventoría	N	0	12.	Control de seguridad industrial	N	0
5.	Copia actas de comité de obra	N	0	13.	Relación de menores y mayores cantidades	N	0
6.	Copia libro de obra/bitácora	N	0				
7.	Copia certificado de pago a contratistas	N	0				
8.	Seguimiento plan de manejo ambiental	N	0				

Elaborado por:	Revisador por:	Aprobado por:	
Nombre: MAXIMINO SANDOVAL AMADO	Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA	Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA	Elaborado: 31/10/2016
Cargo: Supervisor por parte de la alcaldía del convenio F-212	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL	Pag.1 de 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO									
CONVENIO N° F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)									
Objeto del Convenio:		ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)							
Valor del Convenio:	\$ 735.000.000,00	Aporte de Mininterior:	\$ 735.000.000,00	PRORROGA					
Valor Adición:	\$ 48.000.000,00	Aporte de Mininterior:	\$ 100.000.000,00						
Valor Total inicial:	\$ 783.000.000,00	Aportes del Municipio:	\$ 48.000.000,00						
Valor Adición:	\$ 100.000.000,00	Aportes del Municipio:	\$ 88.980.686,00						
Valor Adición:	\$ 88.980.686,00			Prorroga N° 1	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016				
Valor Total final:	\$ 971.980.686,00	Suspensión 1	DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR	Prorroga N° 2	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016				
Primer Plazo de Ejecución:	7 MESES	Reinicio:	11 DE MARZO DE 2016	Prorroga N° 3	HASTA EL 15 DE JUNIO 2016				
Fecha de Inicio:	08 DE MAYO DEL 2015	Suspensión 2	DESDE 14 JUN HASTA 12 JUL	Prorroga N° 4	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016				
Vencimiento:	10 DE DICIEMBRE DE 2016	1° Ampliación Suspensión 2	DESDE 12 JUL HASTA 29 AGO	Prorroga N° 5	HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016				
Nuevo plazo de ejecución:	19 MESES	2° ampliación Suspensión 2	DESDE 29 AGO HASTA 15 SEP	Prorroga N° 6	HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2016				
Fecha de terminación:	10 DE DICIEMBRE DE 2016	Reinicio:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2016	Plazo Actualizado	HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2016				
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)		Valor	Modificación fecha		Modificación Valor			
Aseguradora Solidaria de Colombia	Desde	10/11/2016	Hasta	19/05/2017	\$ 167.000.000,00	Hasta	10/12/2016	\$ 909.880.686,00	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO									
Informe N°	19	Periodo comprendido entre el 01 de NOVIEMBRE del 2016 y el 30 de NOVIEMBRE del 2016							
Proyecto	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) Y LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ								
Localización	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS					CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS				
Objeto:	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICO AL CONTRATO DE CONSULTORIA cuyo objeto es CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA".				Objeto:	"CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA".			
Contrato N°:	MC-053 DEL 2015				Contrato N°:	MC-052 DEL 2015			
Contratista:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA				Contratista:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES			
Plazo Inicial:	15 días				Plazo Inicial:	15 días			
Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015				Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015			
*Fecha de Suspensión	19 de Junio de 2015				*Fecha de Suspensión	19 de Junio de 2015			
*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015				*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015			
Fecha de Terminación:	13 de Julio de 2015				Fecha de Terminación:	13 de Julio de 2015			
Prórrogas:	NA				Prórrogas:	NA			
Plazo Actualizado:	NA				Plazo Actualizado:	NA			
Valor Inicial:	\$ 3.000.000,00				Valor Inicial:	\$ 12.000.000,00			
Valor Adiciones:	\$ -				Valor Adiciones:	\$ -			
Valor Actualizado:	\$ -				Valor Actualizado:	\$ -			
Valor pagado:	\$ 3.000.000,00				Valor pagado:	\$ 12.000.000,00			
Valor por pagar:					Valor por pagar:				
Poliza Seguro de cumplimiento	N° 630-47-994000006429	VIGENCIA: 09/06/2015 - 15/01/2016	VALOR: 750.000		Poliza Seguro de cumplimiento	N° AA023400	VIGENCIA: 09/06/2015 - 31/12/2015	VALOR: 3.000.000	
Nombre Supervisor:	DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ				Nombre interventor:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA			
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA					CONTRATO DE OBRA				
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.				Objeto:	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. F-212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.			
Contrato N°:	001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015				Contrato N°:	028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015			
Contratista:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES				Contratista:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015			
Plazo Inicial:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015				Plazo Inicial:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015			
Fecha de Inicio:	10 DE NOVIEMBRE DE 2015				Fecha de Inicio:	10 DE NOVIEMBRE DE 2015			
Fecha de Terminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2015				Fecha de Terminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2015			
Primera Prórroga y modificación del convenio:	28 DE FEBRERO DE 2016				Primera Prórroga y modificación del convenio:	28 DE FEBRERO DE 2016			
Segunda modificación del convenio:	17 DICIEMBRE DE 2016				Segunda modificación del convenio:	17 DICIEMBRE DE 2016			
Plazo Actualizado:	111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015				Plazo Actualizado:	111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015			
Primera suspensión:	26 DE FEBRERO DE 2016				Primera suspensión:	26 DE FEBRERO DE 2016			
Acta de reinicio:	11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016				Acta de reinicio:	11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016			
Plazo Actualizado:	125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016				Plazo Actualizado:	125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016			
Segunda Prórroga:	30 DE ABRIL DE 2016				Segunda Prórroga:	30 DE ABRIL DE 2016			
Plazo Actualizado:	173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016				Plazo Actualizado:	173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016			
Tercera prórroga:	15 DE JUNIO DE 2016				Tercera prórroga:	15 DE JUNIO DE 2016			
Plazo Actualizado:	219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016				Plazo Actualizado:	219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016			
Segunda suspensión - solicitud de adición:	14 DE JUNIO DE 2016				Segunda suspensión - solicitud de adición:	14 DE JUNIO DE 2016			
Ampliación segunda suspensión:	12 DE JULIO DE 2016				Ampliación segunda suspensión:	12 DE JULIO DE 2016			
Segunda ampliación de la segunda suspensión:	27 DE AGOSTO DE 2016				Segunda ampliación de la segunda suspensión:	27 DE AGOSTO DE 2016			
Cuarta prórroga y primera adición de obra:	31 DE OCTUBRE DE 2016				Cuarta prórroga y primera adición de obra:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2016			
Plazo Actualizado:	250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016				Plazo Actualizado:	250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016			
Acta de reanudación N° 02:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2016				Acta de reanudación N° 02:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2016			
Firma de OTRO SI N°001 adición en tiempo:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2016				Firma de OTRO SI N°001 adición en valor:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2016			
quinta prórroga:	19 DE OCTUBRE DE 2016				quinta prórroga:	19 DE OCTUBRE DE 2016			

INFORME EJECUTIVO MENSUAL N° 019

Firma de OTRO SI N°002 adición en tiempo:	28 DE OCTUBRE DE 2016	Firma de OTRO SI N°002 adición en tiempo:	28 DE OCTUBRE DE 2016
Sexta prórroga:	10 DE NOVIEMBRE DE 2016	Sexta prórroga:	10 DE NOVIEMBRE DE 2016
Firma de OTRO SI N°003 adición en tiempo:	11 DE NOVIEMBRE DE 2016	Firma de OTRO SI N°003 adición en tiempo:	11 DE NOVIEMBRE DE 2016
Valor Inicial:	\$ 47.100.000,00	Valor Inicial:	\$ 720.900.000,00
Valor Adiciones:	N/A	Valor Adiciones:	\$ 188.980.868,00
Valor Actualizado:	\$ 47.100.000,00	Valor Actualizado:	\$ 909.880.868,00
Primer pago parcial:	\$ 9.221.280,00	Primer pago parcial:	\$ 180.568.603,00
segundo pago parcial:	\$ 9.221.280,00	segundo pago parcial:	\$ 174.595.176,00
Tercer pago parcial:	\$ 9.221.280,00	tercer pago parcial:	\$ 119.567.134,00
Valor por pagar:	\$ 19.436.160,00	cuarto pago parcial:	\$ 120.340.034,00
		Valor por pagar:	\$ 125.829.053,00
		Quinto pago parcial anticipo OTRO SI N° 001:	\$ 88.980.686,00
		Valor por pagar anticipo OTRO SI N° 001:	\$ 100.000.000,00

Nombre Supervisor:	BRIYITH GISELA REYES QUINTERO	Nombre interventor:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias			

ESTADO DE LAS GARANTÍAS							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 053 de 2015				CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 052de 2015			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	9/06/2015	29/12/2015	\$ 300.000,00	Cumplimiento del contrato	9/06/2015	31/12/2015	\$ 1.200.000,00
Salarios y prestaciones sociales	9/06/2015	29/12/2015	\$ 150.000,00	Estabilidad de la obra			
Calidad del servicio	25/06/2015	15/01/2016	\$ 300.000,00	Calidad del servicio	9/06/2015	31/12/2015	\$ 1.200.000,00
Responsabilidad civil				Salarios y prestaciones sociales	9/06/2015	31/12/2015	\$ 600.000,00
				Responsabilidad civil			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA N° 001 de 2015				CONTRATO DE OBRA N° 028 de 2015			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	4/11/2015	29/05/2017	\$ 4.710.000,00	Cumplimiento del contrato	23/10/2015	31/01/2017	\$ 90.988.086,80
Salarios y prestaciones sociales	4/11/2015	29/11/2019	\$ 9.420.000,00				
Calidad del servicio	4/11/2015	10/06/2021	\$ 9.420.000,00				
Responsabilidad civil				Salarios y prestaciones sociales	23/10/2015	30/07/2019	\$ 45.494.043,40
				Responsabilidad civil	23/10/2015	11/08/2016	\$ 128.870.000,00

RESUMEN DE PAGOS					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 053 de 2015			CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 052 de 2015		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
PAGO CONTRATO No- 053	DICIEMBRE DE 2015	\$ 3.000.000,00	PAGO CONTRATO N° 052	DICIEMBRE DE 2015	\$ 12.000.000,00


CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA N° 001 de 2015			CONTRATO DE OBRA N° 028 de 2015		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N°001	22 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 9.221.280,00	PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	17 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 180.568.603,00
SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N°002	07 DE MARZO DE 2016	\$ 9.221.280,00	SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	16 DE FEBRERO 2016	\$ 174.595.176,00
TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N°003	07 DE MARZO DE 2016	\$ 9.221.280,00	TERCER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	16 DE MAYO 2016	\$ 119.567.134,00
			CUARTO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	21 DE JUNIO DE 2016	\$ 120.340.034,00
			PRIMER PAGO ADICION N° 001	04 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 88.980.686,00

SEGUIMIENTO AL AVANCE								
AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	86,62%	49,06%	100,00%	% Programado	\$909.880.868,00	\$446.387.553,84	\$909.880.868,00	100%
% Ejecutado	83,41%	16,59%	100,00%	% Ejecutado	\$758.931.632,00	\$150.949.236,00	\$909.880.868,00	100%
Diferencia	3,21%	32,47%	0,00%	Diferencia	\$150.949.236,00	-\$295.438.317,84	\$0,00	0,00%

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO
Para el convenio, obra e interventoria, se se realiza la sexta prórroga, hasta el 10 de diciembre, ya que el MINISTERIO DEL INTERIOR no ha desembolsado los recursos para la culminación de la obra, siendo necesario la ampliación de tiempo, hasta el 10 de diciembre de 2016
Las actividades elaboradas en el presente mes, incluyen:

Se continua con la actividad de pintura a dos manos en baterías sanitarias y zona de oficinas.
Suministro e instalación de carpintería metálica para baterías sanitarias, instalación de accesorios para baños de discapacitados e instalación de las barandas metálicas en las escaleras.
Se realiza la demarcación y pintura del área de juego y la instalación de arcos.
Se realizan los trabajos del sistema eléctricos.
suministro e intalación de espejos, lavamanos, orinales y sanitarios en baños.
Instalacion de placas conmemorativas y se realiza limpieza general en la obra.
El día 23 de Noviembre se tiene reunión con el supervisor designado por el MINISTERIO DEL INTERIOR, donde se realizan las últimas observaciones para la entrega definitiva de la obra.
El contratista de la obra entrega a la supervision por parte de la alcaldia de San José del Fragua. La interventoria continua con la entrega de información pendiente por radicar.

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

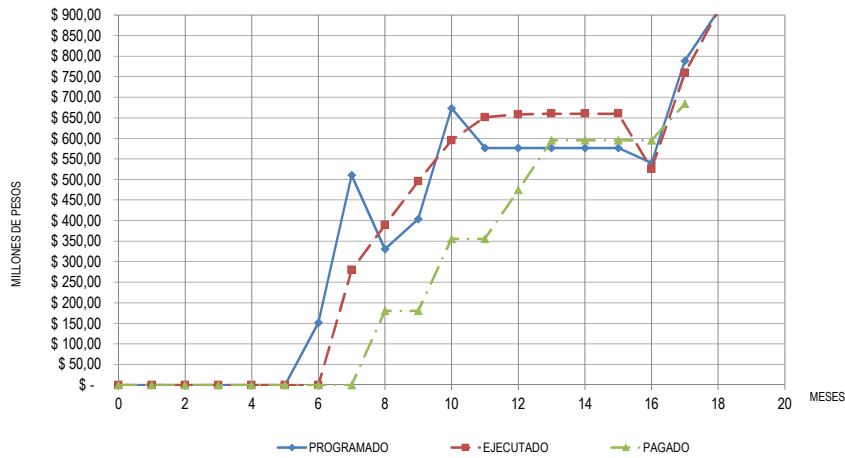

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONVENIO

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

4. RELACION DE ANEXOS

	DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra	N	0	9.	Control diario de tiempo	N	0
2.	Registro Fotográfico	N	0	10.	Control de personal	N	0
3.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta crítica	N	0	11.	Control de equipo	N	0
4.	Copia último informe de interventoría	N	0	12.	Control de seguridad industrial	N	0
5.	Copia actas de comité de obra	N	0	13.	Relación de menores y mayores cantidades	N	0
6.	Copia libro de obra/bitácora	N	0				
7.	Copia certificado de pago a contratistas	N	0				
8.	Seguimiento plan de manejo ambiental	N	0				

Elaborado por:	Revisor por:	Aprobado por:	
Nombre: BRIYITH GISELA REYES QUINTERO	Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA	Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA	Elaborado: 30/11/2016
Cargo: Supervisor por parte de la alcaldía del convenio F-212	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL	Pag.1 de 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO									
CONVENIO Nº F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)									
Objeto del Convenio:		ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)							
Valor del Convenio:	\$ 735.000.000,00	Aporte de Mininterior:	\$ 735.000.000,00	PRORROGA					
Valor Adición:	\$ 48.000.000,00	Aporte de Mininterior:	\$ 100.000.000,00						
Valor Total inicial:	\$ 783.000.000,00	Aportes del Municipio:	\$ 48.000.000,00						
Valor Adición:	\$ 100.000.000,00	Aportes del Municipio:	\$ 88.980.686,00						
Valor Adición:	\$ 88.980.868,00			Prorroga Nº 1	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016				
Valor Total final:	\$ 971.980.868,00	Suspensión 1	DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR	Prorroga Nº 2	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016				
Primer Plazo de Ejecución:	7 MESES	Reinicio:	11 DE MARZO DE 2016	Prorroga Nº 3	HASTA EL 15 DE JUNIO 2016				
Fecha de Inicio:	08 DE MAYO DEL 2015	Suspensión 2	DESDE 14 JUN HASTA 12 JUL	Prorroga Nº 4	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016				
Vencimiento:	10 DE DICIEMBRE DE 2016	1ª Ampliación Suspensión 2	DESDE 12 JUL HASTA 29 AGO	Prorroga Nº 5	HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016				
Nuevo plazo de ejecución:	19 MESES	2ª ampliación Suspensión 2	DESDE 29 AGO HASTA 15 SEP	Prorroga Nº 6	HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2016				
Fecha de terminación:	10 DE DICIEMBRE DE 2016	Reinicio:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2016	Plazo Actualizado	HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2016				
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)		Valor	Modificación fecha		Modificación Valor			
Aseguradora Solidaria de Colombia	Desde	10/11/2016	Hasta	19/05/2017	\$ 167.000.000,00	Hasta	10/12/2016	\$ 909.880.868,00	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO									
Informe Nº	19	Periodo comprendido entre el 01 de DICIEMBRE del 2016 y el 10 de DICIEMBRE del 2016							
Proyecto	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) Y LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ								
Localización	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS					CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS				
Objeto:	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICO AL CONTRATO DE CONSULTORIA cuyo objeto es CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU,				Objeto:	"CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA".			
Contrato Nº:	MC-053 DEL 2015				Contrato Nº:	MC-052 DEL 2015			
Contratista:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA				Contratista:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES			
Plazo Inicial:	15 días				Plazo Inicial:	15 días			
Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015				Fecha de Inicio:	16 de Junio de 2015			
*Fecha de Suspensión	19 de Junio de 2015				*Fecha de Suspensión	19 de Junio de 2015			
*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015				*Fecha de Reinicio:	02 de Julio de 2015			
Fecha de Terminación:	13 de Julio de 2015				Fecha de Terminación:	13 de Julio de 2015			
Prórrogas:	NA				Prórrogas:	NA			
Plazo Actualizado:	NA				Plazo Actualizado:	NA			
Valor Inicial:	\$ 3.000.000,00				Valor Inicial:	\$ 12.000.000,00			
Valor Adiciones:	\$ -				Valor Adiciones:	\$ -			
Valor Actualizado:	\$ -				Valor Actualizado:	\$ -			
Valor pagado:	\$ 3.000.000,00				Valor pagado:	\$ 12.000.000,00			
Valor por pagar:					Valor por pagar:				
Poliza Seguro de cumplimiento	Nº 630-47-994000006429	VIGENCIA: 09/06/2015 - 15/01/2016	VALOR: 750.000		Poliza Seguro de cumplimiento	Nº AA023400	VIGENCIA: 09/06/2015 - 31/12/2015	VALOR: 3.000.000	
Nombre Supervisor:	DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ				Nombre interventor:	LUIS ANGEL AVILES MURCIA			
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprime las casillas innecesarias									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA					CONTRATO DE OBRA				
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.				Objeto:	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. F-212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.			
Contrato Nº:	001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015				Contrato Nº:	028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015			
Contratista:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES				Contratista:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015			
Plazo Inicial:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015				Plazo Inicial:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015			
Fecha de Inicio:	10 DE NOVIEMBRE DE 2015				Fecha de Inicio:	10 DE NOVIEMBRE DE 2015			
Fecha de Terminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2015				Fecha de Terminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2015			
Primera Prórroga y modificación del convenio:	28 DE FEBRERO DE 2016				Primera Prórroga y modificación del convenio:	28 DE FEBRERO DE 2016			
Segunda modificación del convenio:	17 DICIEMBRE DE 2016				Segunda modificación del convenio:	17 DICIEMBRE DE 2016			
Plazo Actualizado:	111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015				Plazo Actualizado:	111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015			
Primera suspensión:	26 DE FEBRERO DE 2016				Primera suspensión:	26 DE FEBRERO DE 2016			
Acta de reinicio:	11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016				Acta de reinicio:	11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016			
Plazo Actualizado:	125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016				Plazo Actualizado:	125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016			
Segunda Prórroga:	30 DE ABRIL DE 2016				Segunda Prórroga:	30 DE ABRIL DE 2016			
Plazo Actualizado:	173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016				Plazo Actualizado:	173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016			
Tercera prórroga:	15 DE JUNIO DE 2016				Tercera prórroga:	15 DE JUNIO DE 2016			
Plazo Actualizado:	219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016				Plazo Actualizado:	219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016			
Segunda suspensión - solicitud de adición:	14 DE JUNIO DE 2016				Segunda suspensión - solicitud de adición:	14 DE JUNIO DE 2016			
Ampliación segunda suspensión:	12 DE JULIO DE 2016				Ampliación segunda suspensión:	12 DE JULIO DE 2016			
Segunda ampliación de la segunda suspensión:	27 DE AGOSTO DE 2016				Segunda ampliación de la segunda suspensión:	27 DE AGOSTO DE 2016			
Cuarta prórroga y primera adición de obra:	31 DE OCTUBRE DE 2016				Cuarta prórroga y primera adición de obra:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2016			
Plazo Actualizado:	250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016				Plazo Actualizado:	250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016			
Acta de reanudación N° 02:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2016				Acta de reanudación N° 02:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2016			
Firma de OTRO SI N°001 adición en tiempo:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2016				Firma de OTRO SI N°001 adición en valor:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2016			
quinta prórroga:	19 DE OCTUBRE DE 2016				quinta prórroga:	19 DE OCTUBRE DE 2016			

INFORME EJECUTIVO MENSUAL N° 020

Firma de OTRO SI N°002 adición en tiempo:	28 DE OCTUBRE DE 2016	Firma de OTRO SI N°002 adición en tiempo:	28 DE OCTUBRE DE 2016
Sexta prórroga:	10 DE NOVIEMBRE DE 2016	Sexta prórroga:	10 DE NOVIEMBRE DE 2016
Firma de OTRO SI N°003 adición en tiempo:	11 DE NOVIEMBRE DE 2016	Firma de OTRO SI N°003 adición en tiempo:	11 DE NOVIEMBRE DE 2016
Valor Inicial:	\$ 47.100.000,00	Valor Inicial:	\$ 720.900.000,00
Valor Adiciones:	N/A	Valor Adiciones:	\$ 188.980.868,00
Valor Actualizado:	\$ 47.100.000,00	Valor Actualizado:	\$ 909.880.868,00
Primer pago parcial:	\$ 9.221.280,00	Primer pago parcial:	\$ 180.568.603,00
segundo pago parcial:	\$ 9.221.280,00	segundo pago parcial:	\$ 174.595.176,00
Tercer pago parcial:	\$ 9.221.280,00	tercer pago parcial:	\$ 119.567.134,00
Valor por pagar:	\$ 19.436.160,00	cuarto pago parcial:	\$ 120.340.034,00
		Valor por pagar:	\$ 125.829.053,00
		Quinto pago parcial anticipo OTRO SI N° 001:	\$ 88.980.686,00
		Valor por pagar anticipo OTRO SI N° 001:	\$ 100.000.000,00
Nombre Supervisor:	BRIYITH GISELA REYES QUINTERO	Nombre interventor:	CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 053 de 2015				CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 052de 2015			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	9/06/2015	29/12/2015	\$ 300.000,00	Cumplimiento del contrato	9/06/2015	31/12/2015	\$ 1.200.000,00
Salarios y prestaciones sociales	9/06/2015	29/12/2015	\$ 150.000,00	Estabilidad de la obra			
Calidad del servicio	25/06/2015	15/01/2016	\$ 300.000,00	Calidad del servicio	9/06/2015	31/12/2015	\$ 1.200.000,00
Responsabilidad civil				Salarios y prestaciones sociales	9/06/2015	31/12/2015	\$ 600.000,00
				Responsabilidad civil			
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N° 001 de 2015				CONTRATO DE OBRA N° 028 de 2015			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	4/11/2015	29/05/2017	\$ 4.710.000,00	Cumplimiento del contrato	23/10/2015	31/01/2017	\$ 90.988.086,80
Salarios y prestaciones sociales	4/11/2015	29/11/2019	\$ 9.420.000,00				
Calidad del servicio	4/11/2015	10/06/2021	\$ 9.420.000,00				
Responsabilidad civil				Salarios y prestaciones sociales	23/10/2015	30/07/2019	\$ 45.494.043,40
				Responsabilidad civil	23/10/2015	11/08/2016	\$ 128.870.000,00

RESUMEN DE PAGOS

RESUMEN DE PAGOS					
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 053 de 2015			CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 052 de 2015		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
PAGO CONTRATO No- 053	DICIEMBRE DE 2015	\$ 3.000.000,00	PAGO CONTRATO N° 052	DICIEMBRE DE 2015	\$ 12.000.000,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N° 001 de 2015			CONTRATO DE OBRA N° 028 de 2015		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N°001	22 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 9.221.280,00	PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	17 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 180.568.603,00
SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N°002	07 DE MARZO DE 2016	\$ 9.221.280,00	SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	16 DE FEBRERO 2016	\$ 174.595.176,00
TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N°003	07 DE MARZO DE 2016	\$ 9.221.280,00	TERCER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	16 DE MAYO 2016	\$ 119.567.134,00
			CUARTO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028	21 DE JUNIO DE 2016	\$ 120.340.034,00
			PRIMER PAGO ADICION N° 001	04 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 88.980.686,00

SEGUIMIENTO AL AVANCE


AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	100,00%	0,00%	100,00%	% Programado	\$909.880.868,00	\$0,00	\$909.880.868,00	100%
% Ejecutado	100,00%	0,00%	100,00%	% Ejecutado	\$909.880.868,00	\$0,00	\$909.880.868,00	100%
Diferencia	100,00%	0,00%	0,00%	Diferencia	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%

[illegible]

Se comienzan los tramites y procesos para la liquidación de los contratos.

se procede a recibir la interventoria.

2. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

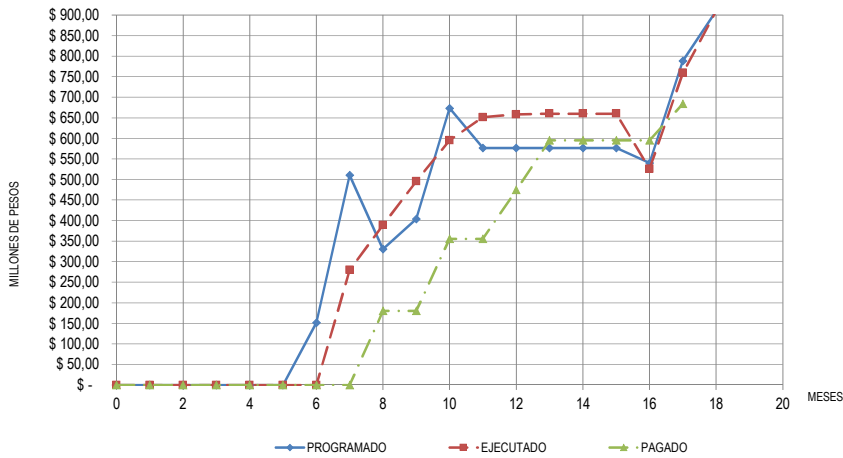

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONVENIO

3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

4. RELACION DE ANEXOS

	DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra	N	0	9.	Control diario de tiempo	N	0
2.	Registro Fotográfico	N	0	10.	Control de personal	N	0
3.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta crítica	N	0	11.	Control de equipo	N	0
4.	Copia último informe de interventoría	N	0	12.	Control de seguridad industrial	N	0
5.	Copia actas de comité de obra	N	0	13.	Relación de menores y mayores cantidades	N	0
6.	Copia libro de obra/bitácora	N	0				
7.	Copia certificado de pago a contratistas	N	0				
8.	Seguimiento plan de manejo ambiental	N	0				

Elaborado por:	Revisor por:	Aprobado por:	
Nombre: BRIYITH GISELA REYES QUINTERO	Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA	Nombre: ARNULFO PARRA PEÑA	Elaborado: 20/12/2016
Cargo: Supervisor por parte de la alcaldía del convenio F-212	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL	Pag.1 de 4
