




**FORMATO  
INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS  
CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON

Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **2057 de 2021**, MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY, CAUCA

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **MAYO**

**1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO**
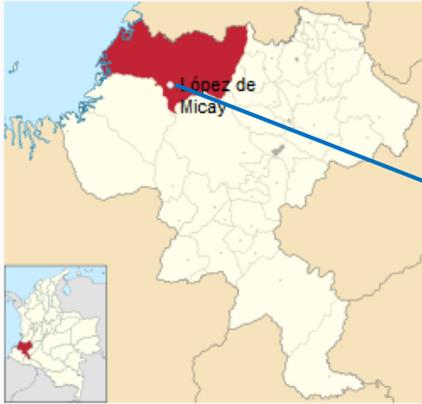
<b>OBJETO:</b>	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover los estudios, diseños y construcción (obra) de la sede administrativa de la alcaldía municipal de López de Micay–Cauca.		
<b>UBICACIÓN DEL PROYECTO:</b> Dirección: Cra 2 # 5-07, Calle las Flores – López de Micay (Urbano)	Departamento del Cauca, Municipio de López de Micay.   <p align="center"><b>Localización de López de Micay en Cauca</b></p>		
<b>BENEFICIARIO:</b>	Indirectos: Municipio de López de Micay, Departamento del Cauca – 12.950 Habitantes. Directos: Municipio de López de Micay– 12.950 Habitantes.		
<b>VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO</b>	<b>APORTES MIN – FONSECON</b>		
	<b>APORTES ENTIDADES PÚBLICAS</b>		
	Ministerio del Interior		\$2.888.377.985,00
	Alcaldía de López de Micay (Recursos propios)		\$849.522.937,00
	Vigencias futuras		\$1.925.585.324,00
	<b>TOTAL, APORTES DEL CONVENIO</b>		\$ 5.663.486.246,00
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	11 de Noviembre de 2021		
<b>FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO</b>	29 de noviembre del 2022	<b>FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO</b>	Hasta el 29 de Diciembre de 2022
<b>SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO</b>	Ing. JAIRO OCORO BONILLA	<b>DESDE:</b> 29 de noviembre del 2021	
<b>SUPERVISORES ANTERIORES</b> (adjuntar casillas si es necesario)	<b>NOMBRE</b>	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>
<b>APOYO A LA SUPERVISIÓN</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>
	Arq. _____	DD-MES-AAAA	DD-MES-AAAA
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO</b>	No. 254 del 03/03/2021.		
<b>RÉGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO</b>	No.		
<b>COMPROMISO VIGENCIA FUTURA</b> (si aplica)	No. 2-2021-009386	25/02/2021	
<b>RÉGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL (MINISTERIO DEL INTERIOR)</b>	No. 43521	19/08/2021	
<b>FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL</b>	12/11/2021	No. 435-74-994000011488	
<b>FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO</b>	29/11/2021		
	PRIMERA PRÓRROGA		<b>FECHA:</b> DD/MM/AAAA



**FORMATO  
INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS  
CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SEGUNDA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA
	PRIMERA MODIFICACIÓN	FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO 01	FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA	
	FECHA: DD/MM/AAAA	
	FECHA: DD/MM/AAAA	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$ 189.020.024,00
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$ 28.192.576,00
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)		N/A
VALOR DE OBRA		\$ 5.224.928.748,00
VALOR INTERVENTORÍA		\$ 256.615.155
VALOR ADICIONAL DE OBRA		\$ _____

**2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO**

- **Convenio interadministrativo/ Contrato** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	TOTAL GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR	51,00%	09/12/2021	\$ 2.888.377.985,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	VALOR APORTE MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY	15,00%	30/06/2022	\$ 849.522.937,00
TERCER DESEMBOLSO		%	DD/MM/AAA A	\$
ÚLTIMO DESEMBOLSO		%	DD/MM/AAA A	\$
<b>TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME</b>				\$ 3.737.900.922,00
<b>TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME</b> (según información de contratación derivada)				\$ 0,00

**3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO**

**Nombre Aseguradora:** Aseguradora Solidaria, NIT: 860.524.654-6

**Responsabilidad Civil**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
435-74-994000011488	Cumplimiento	\$ 389.508.302,30	12/11/2021	12/09/2023
	Calidad del servicio	\$ 1.947.541.511,50	12/11/2021	12/09/2023



**FORMATO  
INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS  
CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

**Cumplimiento**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
435-47-994000047251	Cumplimiento	\$ 962.792.661,80	11/11/2021	31/01/2023
	N.A.			

**4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA**

➤ *Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y de Obra*

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato: F2-F14-243-2022 del 23 de mayo del 2022	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY-CAUCA	\$5.406.871.091,00
Link de Consulta:	<a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-21-30535&amp;g-recaptcha-response=03AllukzgzKULJgbtTA1_zV67aQzJzK2EOBPakV0CyLTSgxiDLkdrWu7z_yuWB1JiAod3XTrZDIT7zY584k4-jdHo2-EMZk0oX47ZdY7byzhFVRN5yY1JggptZBSki4VuG5pC6vV5SdhPPIZr5Hn-tDihblxvPASY9gKqyYbNsczuvgdFO4081JLRW59IEFGDIX4haXFU-PAWT7vbXx74-aVLVjRzRQ-_h7UvuuudKCYvOzHoAG73C8KabRhMcqQbEqMqg49QBLEZRwlpfc5fhV4ScUIVGt6-qg4wkakZQorDp1SLgNx8nD1udOI_KrPmaxl56GmCgMtwD46A9GT8mxXPIh_4p4DmFzls_MqpAYjurW7mguRdXYU0IWntb7qrrbXrAQd_jeguF08UK0sSWeFDDt8Kixb16ekUiYE3KhChJJo6QqAyQO3rw561LwXmzdhhmXqMCIEVJuZcqtUV70uyHEpbmZFiZx1sBwkGmx0aijmsSqz3xp500Ps4dZHQI6PDVWHQeCb6itV5TspuLwkGnpeOAxwIM8JLaZWkKIKL21b-ytoH94h1Okb2lp4oN2FZxtUhlzr1nhvTTxZtURISHlebYOfw">https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-21-30535&amp;g-recaptcha-response=03AllukzgzKULJgbtTA1_zV67aQzJzK2EOBPakV0CyLTSgxiDLkdrWu7z_yuWB1JiAod3XTrZDIT7zY584k4-jdHo2-EMZk0oX47ZdY7byzhFVRN5yY1JggptZBSki4VuG5pC6vV5SdhPPIZr5Hn-tDihblxvPASY9gKqyYbNsczuvgdFO4081JLRW59IEFGDIX4haXFU-PAWT7vbXx74-aVLVjRzRQ-_h7UvuuudKCYvOzHoAG73C8KabRhMcqQbEqMqg49QBLEZRwlpfc5fhV4ScUIVGt6-qg4wkakZQorDp1SLgNx8nD1udOI_KrPmaxl56GmCgMtwD46A9GT8mxXPIh_4p4DmFzls_MqpAYjurW7mguRdXYU0IWntb7qrrbXrAQd_jeguF08UK0sSWeFDDt8Kixb16ekUiYE3KhChJJo6QqAyQO3rw561LwXmzdhhmXqMCIEVJuZcqtUV70uyHEpbmZFiZx1sBwkGmx0aijmsSqz3xp500Ps4dZHQI6PDVWHQeCb6itV5TspuLwkGnpeOAxwIM8JLaZWkKIKL21b-ytoH94h1Okb2lp4oN2FZxtUhlzr1nhvTTxZtURISHlebYOfw</a>	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
Nombre contratista		
Fecha de Acta de inicio del contrato		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA
	REINICIO	DD/MM/AAAA
Fecha Inicial de terminación del contrato	29/12/2022	Fecha Actual de terminación del contrato 29/12/2022
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO:</b>		\$ 5.406.693.215,00
COMPañÍA ASEGURADORA		
PÓLIZA No.		
FECHA DE LA PÓLIZA		

➤ *Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra*

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMIASTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LÓPEZ DE MICAY- CAUCA	\$ 256,615,155
Link de Consulta:	<a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12972268&amp;g-recaptcha-response=03AllukzgpK_g1sQzJdd9hlygtWa-8tMkTFGVfQExrg_y-qWh82y_bGSTsgF-7RrERpaYuaHa1qHcY8cxRgXiPC6iQRkpPAKSU_cysZJDXeW62RSK7Kh13Zwjdl60zGEHSSdguEz-d4IOeUssRaEPRcCG8Gt7xeTYC2_IYwazn9tKMzmxsb05WVx54wFk-">https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12972268&amp;g-recaptcha-response=03AllukzgpK_g1sQzJdd9hlygtWa-8tMkTFGVfQExrg_y-qWh82y_bGSTsgF-7RrERpaYuaHa1qHcY8cxRgXiPC6iQRkpPAKSU_cysZJDXeW62RSK7Kh13Zwjdl60zGEHSSdguEz-d4IOeUssRaEPRcCG8Gt7xeTYC2_IYwazn9tKMzmxsb05WVx54wFk-</a>	



**FORMATO  
INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS  
CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

	i3ifX4UYLdsqZvFh8hdiRcMGftSPQ7j02YeMiEEZYvjEQijZBQeSnLcemZTCXzAbjqh609e9aM9lqaRcouOQ88- BOrZCNFR-RLEVjBTiax3YmHcM2U6c3VRsDmqz6b_L_EoMzLZYLr058sy02YLS32ynnKON_dB80AAi- z9_AnKGj-kUFUJk6WzW- 6YpKk2OteHMwNRPh4T6XvBKO3m4o5ShKXBI9064_bM5QROZsQpJF9hb_Pnko3kqAxVloPMOsq83zztzNnUiz s6wRly6TF6SuqKCGPT4nLZTL4o4QOKfticZJft94nyET3JsV- iuv6_8EpiO8KLEVVZ89ks6CIE4CMGOByAgWdbeXtOUwmmGNyPUisc37eNWqAW2heLkoHOxcNHwYGqjmT WmZJAHjHTJFtDc19y1g	
<b>Adicional en valor</b> (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
<b>Nombre contratista</b>	CONSORCIO VALLECA Representante Legal: Tatiana Janeth Cerón Díaz	NIT. 901.602320-4 C.C. 1.143.832.729
<b>Fecha de Acta de inicio del contrato</b>	17/06/2022	
<b>Prórrogas, Suspensiones y Reinicios</b> (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA
	REINICIO	DD/MM/AAAA
<b>Fecha Inicial de terminación del contrato</b>	0	<b>Fecha Actual de terminación del contrato</b> 0
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO:</b>		\$ 256.444.130,00
<b>COMPAÑÍA ASEGURADORA</b>		
<b>PÓLIZA No.</b>		
<b>FECHA DE LA PÓLIZA</b>		

## 5. INFORME TECNICO

<b>INTRODUCCION</b>	<p>En el presente periodo se han realizado actividades como: Demoliciones de la estructura existente, al igual que desmonte de estructura de cubierta, retiro de cableado eléctrico y luminarias, desmonte de carpintería metálica, labores correspondientes a la construcción de la Alcaldía o Centro Administrativo Municipal – CAM, del municipio de López de Micay, Departamento del Cauca, Occidente.</p>  <p>Los procesos de contratación de los Estudios, Diseños y Obras; y de la Interventoría, durante este mes quedaron adjudicados, mediante Resoluciones de Adjudicación: Resolución No. 088-01 del 10 de mayo 2022 (Estudios, Diseños y Obras); Resolución No. 099-01 del 25 de mayo 2022 (Interventoría).</p> 
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY  
NIT. 800.051.168-9  
CONTRATACIÓN

Código: PCO-F-02  
Versión: 03  
Fecha: 18-07-2017



**FORMATO  
INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS  
CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY NIT. 800.051.168-9 CONTRATACIÓN	Código: PCO-F-02
		Versión: 03
		Fecha: 18-07-2017

**RESOLUCIÓN No. 099-01  
(25 DE MAYO 2022)**

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL CONCURSO DE MERITOS ABIERTO NO CM-002-LMICAY-CAU-2022 CUYO OBJETO ES: " REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LÓPEZ DE MICAY- CAUCA"

EL ALCALDE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY, en uso de sus facultades legales y en especial la consagrada en artículo 11 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 del 2015,

Como Supervisor designado por la Alcaldía de López de Micay, certifico el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas en el convenio de las actividades específicas correspondientes a los meses de Abril y Mayo de 2022, según lo pactado:

1. Construcción y publicación de la resolución del acto de apertura del proceso, RESOLUCIÓN No. 069-1 del 13 DE ABRIL DE 2022, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO NO CMA – 002-LMICAY-CAU-2022 CUYO OBJETO ES: " REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LÓPEZ DE MICAY- CAUCA".
2. Construcción y publicación de los pliegos definitivos del proceso CMSC-002-2022, CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No CMA – 002-LMICAY-CAU-2022
3. Se realizó el acta de ACTA DE RECIBO DE OFERTAS Y CIERRE, solo se presentó una oferente.
4. Se realizó el recibo del ACTA DE RECIBO Y CIERRE DEL PROCESO PS 004- LP – LMICAY – CAU-2022
5. Se realizó el ACTA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y ACLARACIONES DEL PROCESO PS 004- LP – LMICAY – CAU-2022
6. Se publicó el CDP con todos los recursos en marco del convenio
7. Se realizó el estudio previo del adicional de recursos de acuerdo al convenio con el Ministerio del Interior.

		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY NIT. 800.051.168-9 CONTRATACIÓN	Código: PCO-F-02 Versión: 03 Fecha: 18-07-2017		
<b>PLANILLA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS</b>					
LICITACIÓN PÚBLICA No. PS 004- LP – LMICAY – CAU-2022 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY-CAUCA"					
En López de Micay, Cauca el ocho (08) de abril de 2022, en la Secretaría de Planeación, a las 08:30 a.m., se recibieron las siguientes propuestas:					
<b>CONFORMACIÓN DE LA LISTA</b>					
ORDEN	PROPONENTE	DÍA ENTREGA	HORA ENTREGA	RADICADO	POLIZA DE SERIEDAD NO.
1	CONSORCIO MICAY 2022	08/04/2022	08:07 am	29 05481	25 de 10112/000 Registro del Estado S.A.
				Actual Windows de Confianza	
(Decreto 1082 de 2015).					
<b>1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN</b>					
Tipo de Presupuesto Asignado	Rubro				
Nombre de Proyecto	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY-CAUCA.				
Código SPIN No.	202120570-020				
<b>2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN</b>					
Fecha de elaboración del estudio previo: (dd/mm/aaaa)	25/ 01 / 2022				
Actualizado	10/03/2022				
Nombre del Funcionario que diligenció el estudio previo	JAIRO OSCAR GONZALEZ				
Dependencia solicitante:	Secretaría de Planeación				
Tipo de Contrato:	Ocupación de obra				
<b>3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015)</b>					

➤ **Avance de Estudios, Diseños y de Obra**

**Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y de Obra No: F2-F14-243-2022 del 23 de mayo del 2022**



**FORMATO  
INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS  
CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

AVANCE PROGRAMADO:	FISICO	45,00%
AVANCE FISICO EJECUTADO:		44,75%
AVANCE PROGRAMADO:	FINANCIERO	66,00%
AVANCE EJECUTADO	FINANCIERO	45,00%
OBSERVACIONES: El Centro Administrativo Municipal de López de Micay, será una construcción que constara de cuatro (4) pisos, los cuales contendrán espacios de trabajo de acuerdo al organigrama de la Entidad y a la planta de personal de la misma teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Estandarización para Entidades del Estado de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas.		

➤ **Avance de Interventoría Estudios, Diseños y Obra**

<b>CONTRATO DE OBRA N° XXX de 20XX</b>		
AVANCE PROGRAMADO:	FISICO	0,00%
AVANCE FISICO EJECUTADO:		0,00%
AVANCE PROGRAMADO:	FINANCIERO	0,00%
AVANCE EJECUTADO	FINANCIERO	0,00%
OBSERVACIONES: Solo hasta el 25 de mayo de 2022, se adjudicó el contrato de interventoría, por lo tanto las actividades realizadas hasta el momento se refieren y limitan a revisión de estudios y diseños. Hasta la fecha no se puede cuantificar el avance económico de las actividades realizadas por el contratista debido a que no se ha realizado una entrega formal del paquete contratado de los estudios y diseños. A pesar que ya se han realizado 2 desembolsos, uno por parte del Ministerio del Interior y otro como aporte de la Alcaldía de López Micay, aún no se le ha pagado un acta al contratista.		

➤ **Gestión técnica y documental.**

Oficios y documentos elaborados por la supervisión sobre el desarrollo de la interventoría, Comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

FECHA COMITÉ E INFORMES	ASUNTO	OBSERVACIONES / ACCIONES

FECHA OFICIO	REFERENCIA RADICADO	ASUNTO	CARGO QUIEN ENVIA	CARGO QUIEN RECIBE

➤ **Personal actual vigente aprobado por la Supervisión del Municipio.**

NOMBRE	CARGO
Ing. JAIRO OCORO BONILLA	Supervisor del Municipio de López de Micay y secretario de planeación municipal


➤ **Información Avance Físico – Avance Financiero**



**FORMATO  
INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS  
CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

ACTA N°	% EJECUCION	EGRESO N°	FECHA	VALOR OBRA	ANTICIPO		ACUMULADO
					AMORTIZADO	SALDO	
	%			\$ 5.406.693.215,00			\$ 5.406.693.215,00
TOTALES							

**GRAFICA AVANCE FISICO – AVANCE FINANCIERO DEL CONVENIO**

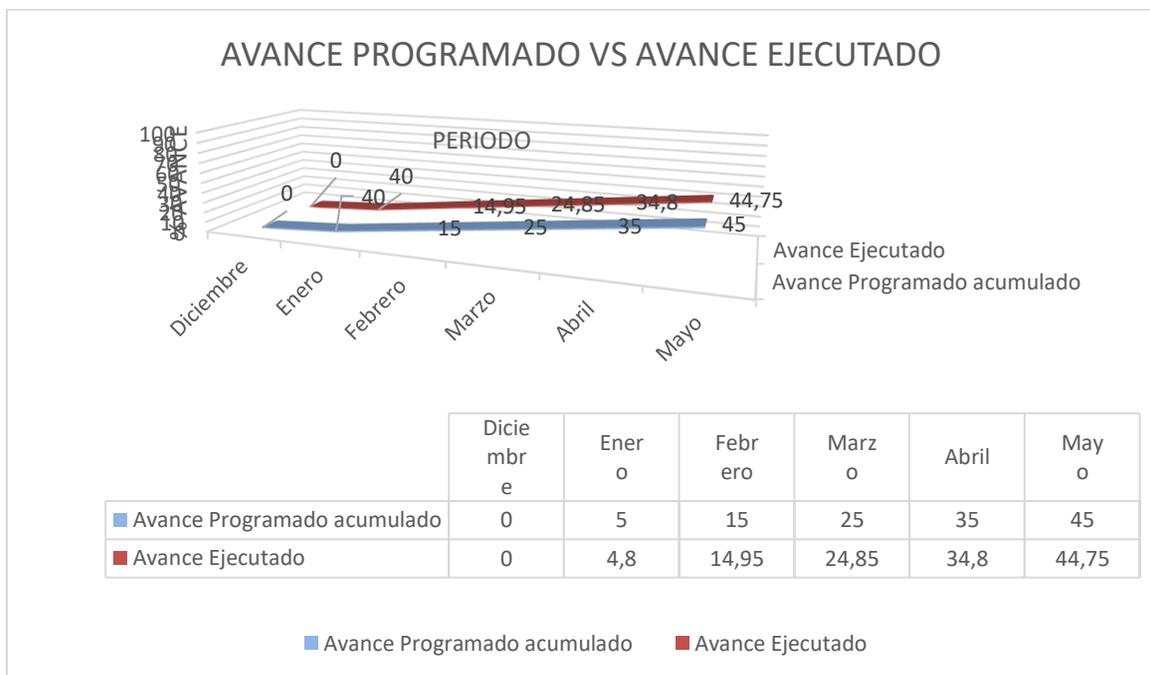

**6. REGISTRO FOTOGRAFICO**

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
		EJECUTADO	
1.1	<b>VISITAS TECNICAS</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>44,75%</b>
	<p><b>OBSERVACIONES:</b> Hasta el momento se han realizado actividades como: Demoliciones de la estructura existente, al igual que desmonte de estructura de cubierta, retiro cubierta en eternit, retiro de cableado eléctrico y luminarias, desmonte de carpintería metálica, demolición de alguno elementos estructurales (vigas de amare, columnas, etc).</p>		



**FORMATO  
INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS  
CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

--	--

<b>PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCION PROPUESTOS.</b>	Las actividades no se han visto afectados por ningún factor que retrase su avance.
-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

**7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)**

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

**8. SUPERVISOR**

 Ing. JAIRO OCORO BONILLA Supervisor del Convenio Secretaría de Planeación/Infraestructura	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Se Anexan ( ) Folios
