


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Duración real	Duración restante	Trimestres											
									2º trimestre			1er trimestre			4º trimestre			3er trimestre		
1		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES VIALES	663 días?	mié 18/05/22	vie 29/11/24	\$ 7,258,224,811.82	554.55 días	108.45 días?												
2	✓	CONSTRUCCION DE (3) ALCANTARILLA DE 36	244 días	mar 14/06/22	vie 19/05/23	\$ 209,862,235.09	244 días	0 días												
3	✓	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	45 días	mar 14/06/22	vie 19/05/23	\$ 5,321,101.66	45 días	0 días												
4	✓	RELENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	40 días	vie 24/06/22	vie 19/05/23	\$ 46,092,628.62	40 días	0 días												
5	✓	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	45 días	mar 26/07/22	vie 19/05/23	\$ 74,428,646.76	45 días	0 días												
6	✓	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA(F)	40 días	vie 8/07/22	mié 17/05/23	\$ 5,614,907.73	40 días	0 días												
7	✓	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	40 días	mar 14/06/22	vie 19/05/23	\$ 48,237,561.32	40 días	0 días												
8	✓	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 600 MM DIAMETRO INTERIOR	45 días	lun 20/06/22	mié 10/05/23	\$ 30,167,389.00	45 días	0 días												
9		CONSTRUCCION DE (1) FILTROS. Longitud aproximada 1121.6 metros	566.25 días	mar 5/07/22	mié 4/09/24	\$ 152,608,958.68	525.58 días	40.67 días												
10		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	130 días	mar 5/07/22	vie 9/08/24	\$ 9,499,276.92	118.3 días	11.7 días												
11		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	70 días	lun 11/07/22	mié 4/09/24	\$ 68,094,842.92	64.4 días	5.6 días												
12		GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	55 días	jue 21/07/22	mar 3/09/24	\$ 24,809,941.30	50.6 días	4.4 días												
13		TUBERIA DE PLASTICO TIPO_NORMA_DE DIAMETRO_MM (TUBERIA CORRUGADA DE 4")	55 días	mar 2/08/22	mar 3/09/24	\$ 22,701,437.00	52.25 días	2.75 días												
14		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	100 días	mié 10/08/22	mié 21/08/24	\$ 27,503,460.54	95 días	5 días												
15		CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO longitud aproximada 4876.2 metros	662.55 días	mié 18/05/22	vie 29/11/24	\$ 6,735,853,037.54	579.28 días	83.27 días												
16		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	217 días	mar 14/06/22	vie 29/11/24	\$ 29,026,434.22	195.3 días	21.7 días												
17	✓	SUBBASE GRANULAR CLASE C	60 días	vie 24/06/22	vie 3/03/23	\$ 1,494,451,359.27	60 días	0 días												
18		CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	346 días	lun 18/07/22	lun 25/11/24	\$ 2,859,224,118.30	294.1 días	51.9 días												
19		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA(G) (CICLOPEO)	343 días	mié 6/07/22	mié 27/11/24	\$ 586,875,673.23	291.55 días	51.45 días												
20		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	247 días	mié 18/05/22	mié 27/11/24	\$ 1,766,275,452.52	219.6 días	27.4 días												
21	✓	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES	15 días	lun 1/05/23	vie 19/05/23	\$ 125,904,960.00	15 días	0 días												
22	✓	DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO	15 días	lun 1/05/23	vie 19/05/23	\$ 125,904,960.00	15 días	0 días												
23	✓	CONSTRUCCIÓN (2) BOX COULVERT. 2.0 M X 2.0 M	1 día	lun 2/01/23	lun 2/01/23	\$ 0.00	1 día	0 días												
24	✓	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	1 día	lun 2/01/23	lun 2/01/23	\$ 0.00	1 día	0 días												
25	✓	AFIRMADO	1 día	lun 2/01/23	lun 2/01/23	\$ 0.00	1 día	0 días												
26	✓	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	1 día	lun 2/01/23	lun 2/01/23	\$ 0.00	1 día	0 días												
27	✓	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA(F)	1 día	lun 2/01/23	lun 2/01/23	\$ 0.00	1 día	0 días												
28	✓	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	1 día	lun 2/01/23	lun 2/01/23	\$ 0.00	1 día	0 días												
29		PAVIMENTO EN ADOQUIN 92 M		lun 2/01/23		\$ 12,577,315.50	0 días	1 día?												
30		PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	39 días	lun 7/10/24	jue 28/11/24	\$ 12,577,315.50	0 días	39 días												
31		SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	35 días	lun 14/10/24	vie 29/11/24	\$ 930,834.00	0 días	35 días												
32		POSTE DE REFERENCIA	35 días	lun 14/10/24	vie 29/11/24	\$ 930,834.00	0 días	35 días												
33		SECCIÓN 3 - ACTIVIDADES DE CONSULTORIA	39 días	lun 7/10/24	jue 28/11/24	\$ 12,002,520.00	0 días	39 días												
34		CARACTERIZACION DEL CORREDOR VIAL POSTULADO	39 días	lun 7/10/24	jue 28/11/24	\$ 12,002,520.00	0 días	39 días												
35		ITEMS NO PREVISTOS	22 días	lun 6/03/23	mar 4/04/23	\$ 8,484,951.01	7.22 días	14.78 días												
36	✓	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	15 días	jue 16/03/23	mié 5/04/23	\$ 5,518,425.51	15 días	0 días												
37	✓	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	7 días	mar 7/03/23	mié 15/03/23	\$ 377,482.00	7 días	0 días												
38		GEOMALLA BIAIXIAL ENTRE SUBRASANTE Y SUBBASE	45 días	lun 23/09/24	vie 22/11/24	\$ 2,589,043.50	0 días	45 días												
39		Trabajo administrativo CONTRATISTA	20 días	vie 2/02/24	jue 29/02/24	\$ 0.00	0 días	20 días												

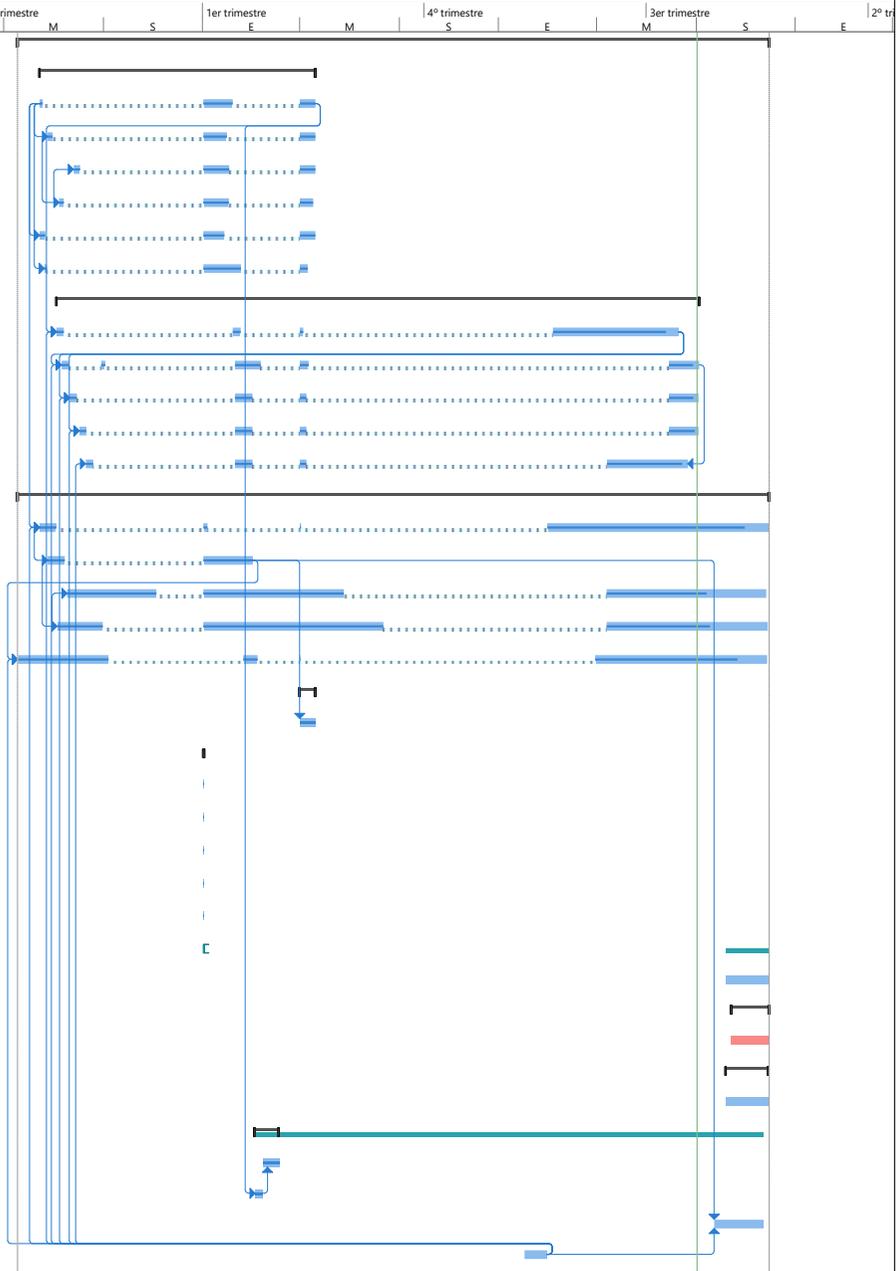

Proyecto: REPROGRAMACIÓN
 Tarea: Resumen
 División: Resumen del proyecto
 Hitos: Tarea inactiva

Hitos inactivos
 Resumen inactivo
 Tarea manual

solo duración
 Informe de resumen manual
 Resumen manual

solo el comienzo
 solo fin
 Tareas externas

Hitos externos
 Fecha límite
 Tareas críticas

División crítica
 Progreso
 Progreso manual
