

| | | | | |
|--|---------|--|-------------------|------------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | VERSIÓN | 4 |
| | FORMATO | ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20 | PÁGINA | 1 de 5 |
| | | | FECHA DE VIGENCIA | 31/08/2022 |

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MUNICIPIO: | Puerto Salgar - Cundinamarca | No. CONVENIO: | 1974-2021 |
| FECHA DE ACTA INICIO: | 30/11/2021 | FECHA DE TERMINACIÓN DE CONVENIO: | 20/11/2023 |
| ELABORÓ: | MAURICIO GUARNIZO LOPERA | FECHA DE VISITA: | 05-06/02/2025 |
| TIPO DE PROYECTO: (CIC, Sacúdete CAMs, Estaciones de Policía) | SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCION 1 | | |

| ASISTENTES | | | |
|------------|--------------------------|--|---|
| No | NOMBRE | CARGO | REPRESENTA A |
| 1 | ADRIÁN GUTIÉRREZ GÓMEZ | ALCALDE MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA |
| 2 | OSCAR GARCIA CARDOZO | SECRETARIO DE PLANEACIÓN – SUPERVISOR POR EL MUNICIPIO | MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA |
| 3 | JORGE GIRALDO RODRIGUEZ | APOYO A LA SUPERVISIÓN | MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR- CUNDINAMARCA |
| 4 | VITERBO GÓMEZ CARVAJAL | SUPERVISOR DEL CONVENIO | MINISTERIO DEL INTERIOR |
| 5 | MAURICIO GUARNIZO LOPERA | APOYO A LA SUPERVISIÓN | MINISTERIO DEL INTERIOR |
| 6 | ELIANA RAMIREZ GIL | REP. CONTRATISTA DE OBRA | CONTRATSTA DE OBRA |
| 7 | NATHALY SACRISTAN | REP. INTERVENTORIA | CONTRATISTA DE INTERVENTORIA |

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN: Casco urbano del municipio de Puerto Salgar - Cundinamarca

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

| No. contrato | Nombre del contratista | Fecha de inicio | Fecha de terminación |
|--|--|-----------------|----------------------|
| Contrato de obra No. 191-2022 | CONSORCIO SACUDETE PUERTO SALGAR 2022 Nit. 901.587.491 | 18/04/2022 | 13/11/2024 |
| Contrato de interventoría No. 190-2022 | INGENIERÍA CIVIL AGRÍCOLA Y GEOGRÁFICA SAS Nit. 900.088.489 | 18/04/2022 | 13/11/2024 |

Generalidades del Convenio

| Generalidades – Convenio 1974-2021 | |
|---|-------------------------|
| Suscripción del Convenio | 12 de noviembre de 2021 |
| Suscripción de acta de inicio del Convenio | 20 de noviembre de 2021 |
| Expedición de la Garantía | 20 de noviembre de 2021 |
| Suscripción de acta de inicio de los contratos de Estudios, diseños y obra e Interventoría | 19 de mayo de 2022 |
| Suscripción del Anexo 22 (Acta de entrega de estudios y diseños - Cierre financiero del proyecto e inicio del proyecto. | 04 de noviembre de 2022 |
| Acreditación Retie | 06 de noviembre de 2023 |
| Acreditación Retilap | 09 de noviembre de 2023 |
| Suscripción de acta terminación y recibo del municipio a los contratos derivados | 18 de julio 2023 |
| Plazo final del contrato derivado de Estudios, Diseños y Construcción e Interventoría | 31 de julio 2023 |
| Finalización del plazo del Convenio | 31 de diciembre de 2023 |
| Conexión eléctrica definitiva | 12 de diciembre 2024 |

Descripción de Contratos de obra e Interventoría y supervisión por parte del Municipio de Puerto Salgar - Cundinamarca

Supervisor del convenio: Oscar García Cardozo (Administración 2024-2027)

| | | | | |
|--|---------|--|-------------------|------------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | VERSIÓN | 4 |
| | FORMATO | ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20 | PÁGINA | 2 de 5 |
| | | | FECHA DE VIGENCIA | 31/08/2022 |

| | |
|---|---|
| Cargo: Secretario de Infraestructura y Obras Públicas | |
| Contrato de obra | Contrato de Interventoría |
| Contrato de obra No. 191-2022 CONSORCIO SACUDETE PUERTO SALGAR 2022 Nit. 901.587.491 | Contrato de interventoría No. 190-2022 INGENIERÍA CIVIL AGRÍCOLA Y GEOGRÁFICA SAS Nit. 900.088.489 |
| R/L. ELIANA MARITZA RAMÍREZ GIL | R/L. RODRIGO PEDROZA MEDINA |

COMPONENTE FINANCIERO

- El valor del Convenio 1974-2021 suscrito con el Municipio de Puerto Salgar-Cundinamarca, se pactó de la siguiente manera:

| VALOR DEL CONVENIO | | DISTRIBUCIÓN SEGÚN VIABILIDAD DEL PROYECTO | |
|----------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|
| DESCRIPCION | VALOR INICIAL DEL CONVENIO | DESCRIPCION | VALOR INICIAL DE LA FASE DE ESTUDIOS |
| APORTES MINISTERIOR DEL INTERIOR | \$ 1.250.000.000 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | \$ 83.333.000,00 |
| APORTES MUNICIPIO | \$ | OBRA Y CONSTRUCCION | \$ 1.041.667.000,00 |
| | | INTERVENTORIA | \$ 125.000.000,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | \$ 1.250.000.000 | VALOR TOTAL DEL CONVENIO | \$ 1.250.000.000 |

- Posterior a la suscripción del convenio, el municipio realizó la contratación derivada para la fase 1 (Estudios y diseños) y fase 2 (ejecución de obra), incluyendo la contratación de interventoría. De acuerdo con lo anterior y el resultado de la fase 1, se obtuvieron los siguientes valores:

| CONTRATO DERIVADO | DESCRIPCION | VALOR DE LOS CONTRATOS | RESULTADO FASE 1 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| OBRA- CONTRATO 191 de 2022 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | \$83.280.960 | \$83.280.960 |
| | EJECUCIÓN DE OBRA | \$1.041.656.832 | \$1.161.656.832,00 |
| | VALOR TOTAL CONTRATADO | \$1.124.937.792 | \$1.244.937.792 |
| INTERVENTORIA - CONTRATO 190 de 2022 | INTERVENTORIA ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRA | \$124.043.519,88 | \$124.043.519,88 |
| | VALOR TOTAL CONTRATADO | \$124.043.519,88 | \$124.043.519,88 |
| VALOR FINAL TOTAL DEL PROYECTO | | \$1.248.981.311,88 | \$1.368.981.311,88 |

Notas:

- De acuerdo con los valores contratados por el municipio: OBRA- CONTRATO – 191 de 2022 e INTERVENTORIA - CONTRATO – 190 de 2021, se presentó un saldo de contratación por valor de: \$1.018.688,12 respecto del valor inicial del convenio. Es importante destacar que dicho monto, deberá ser reintegrado a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.
 - Como resultado de la fase 1, se generó un mayor valor para el presupuesto de obra e interventoría. En atención a las obligaciones del Convenio, los recursos adicionales fueron aportados por el Municipio de Puerto Salgar-Cundinamarca con respaldo en el CDP No. 2022001269 de 11 de noviembre de 2022, por la suma de \$ 120.000.000,00 para obra, con lo cual concluyó el cierre financiero del proyecto e inicio de ejecución de las obras.
- Por lo anterior expuesto, el valor del convenio quedó de la siguiente manera:

| VALOR CONTRACTUAL DEL CONVENIO | |
|----------------------------------|----------------------------|
| DESCRIPCION | VALORES |
| APORTES MINISTERIOR DEL INTERIOR | \$ 1.250.000.000,00 |
| APORTES MUNICIPIO | \$ 120.000.000,00 |
| ADICIÓN MUNICIPIO | \$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | \$ 1.370.000.000,00 |

| | | | | |
|--|---------|--|-------------------|------------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | VERSIÓN | 4 |
| | FORMATO | ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20 | PÁGINA | 3 de 5 |
| | | | FECHA DE VIGENCIA | 31/08/2022 |

3. **Pagos del Convenio 1974-2021:** Por parte del Ministerio del Interior, se ha realizado los pagos por concepto de primer y, segundo desembolso para una suma total de \$1.045.000.000 M/L lo que equivale al 84% de los aportes del Ministerio.

| ESTADO FINANCIERO | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| DESEMBOLSO | VALOR | FECHA | ESTADO |
| Desembolso No. 1 | \$ 225.000.000 | 18/06/2021 | Pagado |
| Desembolso No. 2 | \$ 820.000.000 | 29/12/2021 | Pagado |
| Último desembolso | \$ 205.000.000 | Pte. Por pagar. | Vigencia expirada |

| PRIMER DESEMBOLSO | SEGUNDO DESEMBOLSO | TERCER DESEMBOLSO |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| Vigencia 2021 | Vigencia 2023 | Vigencia 2023 |
| \$225.000.000 | \$820.000.000 | \$205.000.000 |

Así las cosas, es importante indicar que finalizada la vigencia 2023, el recurso correspondiente al último desembolso trasgredió a reserva de apropiación, toda vez que, el municipio no garantizó el cumplimiento de requisitos para el pago del mencionado desembolso. Asu vez, finalizada la vigencia 2024 el municipio no fue posible el recibo formal del proyecto y el trámite de pago, teniendo en cuenta que solo hasta el 20 de diciembre de 2024, el municipio logro cumplir los requisitos de recibo, principalmente la entrega de la conexión eléctrica definitiva, no obstante, por ser una fecha próxima a la terminación de la vigencia, por cuanto el calendario logístico para realizar visita de verificación por parte de la supervisión y el calendario financiero, no fue posible realizar el trámite de pago.

Recurso en vigencia expirada: \$ VALOR 205.000.000,00 ML (Último desembolso)

COMPONENTE CONTRACTUAL

Durante la ejecución del convenio No. 1974-2021 se suscribieron las siguientes actuaciones contractuales:

| ACTOS ADMINISTRATIVOS CONVENIO 1974-2021 | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|
| Tipo de Actuación | Fecha de Suscripción | Fecha de Terminación | |
| Primera prórroga | 26/05/2022 | 30/11/2022 | |
| Segunda prórroga, primera adición y modificación | 30/11/2022 | 31/05/2023 | |
| Tercera prórroga | 31/05/2023 | 31/07/2023 | |
| Suspensión No. 1 | 27/07/2023 | 01/10/2023 | |
| Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 | 27/09/2023 | 02/12/2023 | |
| Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 | 29/11/2023 | 31/12/2023 | |

A la fecha se expidieron y aprobaron las siguientes garantías del convenio 1974-2021:

| POLIZAS CONVENIO NO. 1974-2021 | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| ASEGURADORA | ACTUACIÓN | POLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | | APROBACIÓN |
| | | | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL | |
| ASEGURADORA SOLIDARIA | Acta de inicio | 480-47-994000043199 | CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO | \$250.000.000 | 17/11/2021 | 30/11/2022 | 20/11/2021 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA | Prórroga No.1 | 480-47-994000043199 | CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO | \$250.000.000 | 17/11/2021 | 31/05/2023 | 01/12/2022 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA | Prórroga No.2 | 480-47-994000043199 | CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO | \$274.000.000 | 17/11/2021 | 01/12/2023 | 12/04/2023 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA | Recibo del proyecto | 480-47-994000043199 | CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO | \$274.000.000 | 17/11/2021 | 31/12/2024 | 15/11/2024 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA | Liquidación | 480-47-994000043199 | CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO | \$274.000.000 | 17/11/2021 | 30/06/2024 | Pdte aprobación por ministerio. |

- RECORRIDO DE OBRA:

Para el recorrido, se tomó como base de revisión los siguientes documentos:

1. Acta parcial final de obra No.004 – Julio 223.

| | | | | |
|--|---------|--|-------------------|------------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | VERSIÓN | 4 |
| | FORMATO | ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20 | PÁGINA | 4 de 5 |
| | | | FECHA DE VIGENCIA | 31/08/2022 |

Observaciones en el recorrido: una vez realizada el recorrido por el proyecto sacúdete se logró identificar que las actividades que fueron previamente verificadas y avaladas por la interventoría se ejecutaron en su totalidad, no obstante, se realizaron recomendación de carácter general, de acuerdo con algunos elementos que presentan desgaste y posible mal uso de las instalaciones, dicho esto se precisan las siguientes observaciones:

- Uno de los reflectores de la cancha sintética presenta intermitencia en la iluminación y otro se encuentra mal sujetado.
- En zona de las bombas de disparo de la cancha sintética, el tapete de la grama sintética se encuentra despegado entre tapetes y líneas de demarcación.
- Las mallas de los arcos de las canchas no se encuentran instaladas.
- Las señales informativas (instrucciones de uso) no se encuentran instaladas.

Por último, se recomienda realizar aseo general en toda la edificación, pues se evidencian manchas propias de la obra.

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Se evidencia que si bien es cierto la obra se encuentra ejecutada en su totalidad, están pendientes detalles menores de, documentos que deberán ser entregados como fecha máxima al **15 de febrero 2025. Es importante destacar que esta supervisión no realizara el recibo del proyecto hasta que se hayan subsanado la totalidad de las observaciones realizadas en la presente visita técnica.**

Conforme a lo señalado, se logra verificar que las actividades de obra se ejecutaron dentro del plazo del Convenio No. 1974-2021, sin embargo, a la fecha del vencimiento, no pudo perfeccionarse el recibo, por no contar con las formalidades documentales para poder proceder a la suscripción del documento de entrega al Ministerio del Interior, circunstancia que no impide el recibo por parte de la supervisión del Ministerio del Interior, por fuera del plazo de ejecución del Convenio.






En el presente caso estamos ante un Convenio, cuya exigibilidad del objeto se encuentra sujeta al vencimiento del plazo, esto es, su plazo tiene efectos suspensivos. Al respecto, tal como se señala en concepto de la Agencia Nacional de Contratación Pública, el vencimiento del plazo de ejecución de contratos o convenios con esta particularidad marca el momento en el que la prestación se hace exigible y por lo tanto no extingue al vencimiento la posibilidad de recibo del bien o prestación debida, máxime cuando se pretenda la satisfacción del interés general

Dicho lo anterior, el municipio de puerto Salgar se compromete a realizar las siguientes acciones:

1. Actualizar las garantías de cumplimiento del convenio, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula octava del convenio.
2. Entregar dentro del mes siguiente al recibo del proyecto, todos los documentos e información requerida para la suscripción del acta de liquidación.
3. Gestionar con sus propios recursos, la prestación de los servicios públicos, el mantenimiento, sostenibilidad, custodia, vigilancia, destinación, saneamiento físico y jurídico del inmueble objeto del proyecto.
4. Reintegrar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al pago último desembolso, los saldos por concepto de recursos no ejecutados, saldos de contratación y rendimientos financieros de los recursos aportados por el MINISTERIO-FONSECON al cierre de la cuenta maestra del convenio.
5. Exigir al contratista de estudios, diseños y obra (CONTRATO DE OBRA 191 DE 2022- CONSORCIO SACUDETE PUERTO SALGAR 2022) y al de interventoría (CONTRATO DE INTERVENTORIA 190 DE 2022 INGEGAC), la actualización de las garantías correspondientes, con el propósito de garantizar la estabilidad y calidad de la obra


| COMPROMISOS | | |
|-------------|--|---|
| RESPONSABLE | ACCIONES | FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO |
| Municipio | Subsanación de observaciones hechas por la Supervisión del Ministerio de Interior. – Enviar informe de conformidades y no conformidades, firmado por la interventoría. | 10/02/2024 |
| Municipio | Envío informe final a enero 2025 – incluye extracto y certificación bancarios | 15/05/2024 15/02/2024 |
| Municipio, | Actualización de documentación para tramite de desembolso (indicadas en la minuta del convenio) | 20 de noviembre 2024 15/02/2024 |

| | | | | |
|--|---------|---|-------------------|------------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | VERSIÓN | 4 |
| | FORMATO | ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20 | PÁGINA | 5 de 5 |
| | | | FECHA DE VIGENCIA | 31/08/2022 |





| | |
|--|---|
| <p>Por parte del Municipio de Puerto Salgar / Cmarca:</p>  <p>OSCAR GARCÍA CARDOZO SECRETARIO DE PLANEACIÓN – SUPERVISOR POR EL MUNICIPIO PTO SALGAR Correo: Teléfono:</p> | <p>Por parte del Ministerio del Interior:</p>  <p>VITERBO GÓMEZ CARVAJAL Supervisor del Convenio por el Ministerio Correo: Teléfono:</p> |
| <p>Por parte del Municipio de Puerto Salgar / Cmarca:</p>  <p>JORGE GIRALDO RODRIGUEZ Apoyo a la supervisión - Municipio de Puerto Salgar Correo: Teléfono:</p> | <p>Por parte del Ministerio del Interior:</p>  <p>MAURICIO GUARNIZO LOPERA Supervisor de Apoyo del Convenio por el Ministerio Correo: mauricio.guarnizo@mininterior.gov.co Teléfono: 3122443219</p> |
| <p>Por parte del Municipio de Puerto Salgar / Cmarca:</p>  <p>ADRIÁN GUTIÉRREZ GÓMEZ ALCALDE - MUNICIPIO PTO SALGAR Correo: Teléfono:</p> | <p>Por parte del Contratista de Obra:</p>  <p>ELIANA RAMÍREZ GIL Representante por parte de Obra- CONSORCIO SACUDETE PUERTO SALGAR 2022 Correo: Teléfono:</p> |
| | <p>Por parte del Contratista de Interventoría:</p>  <p>NATHALY SACRISTAN Representante por parte de Interventoría - INGENIERÍA CIVIL AGRÍCOLA Y GEOGRÁFICA SAS Correo: Teléfono:</p> |

X

**REGISTRO FOTOGRAFICO
JUEGOS INFANTILES**


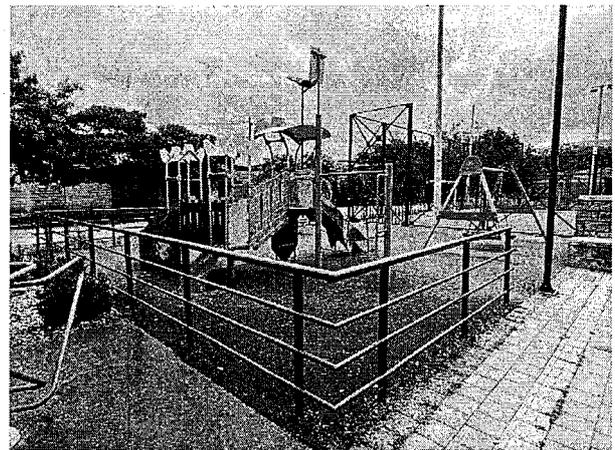


ZONA DE SERVICIOS (AUDITORIO – CAFETERIA- BAÑOS – SALON COMUNITARIO)

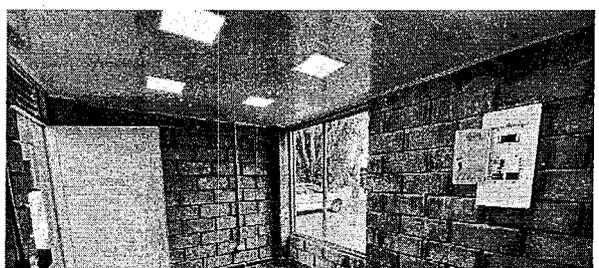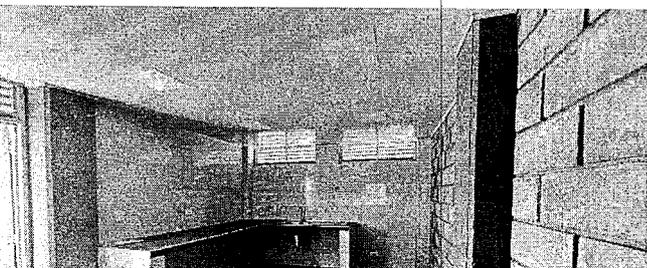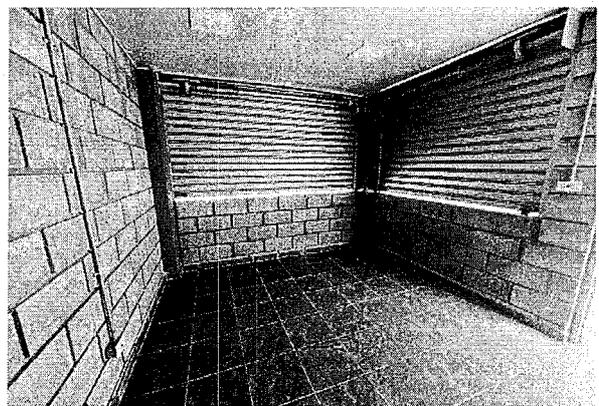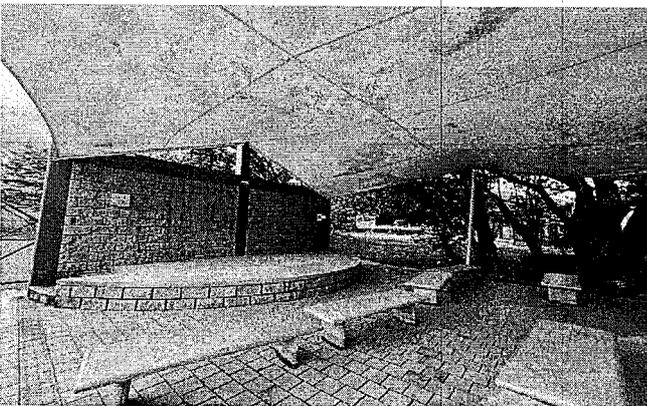

| | | | | |
|--|----------------|---|--------------------------|-------------------|
|  Interior | PROCESO | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | VERSIÓN | 4 |
| | FORMATO | ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20 | PÁGINA | 8 de 8 |
| | | | FECHA DE VIGENCIA | 31/08/2022 |

CANCHA / GRADERIAS / GYM VITAL

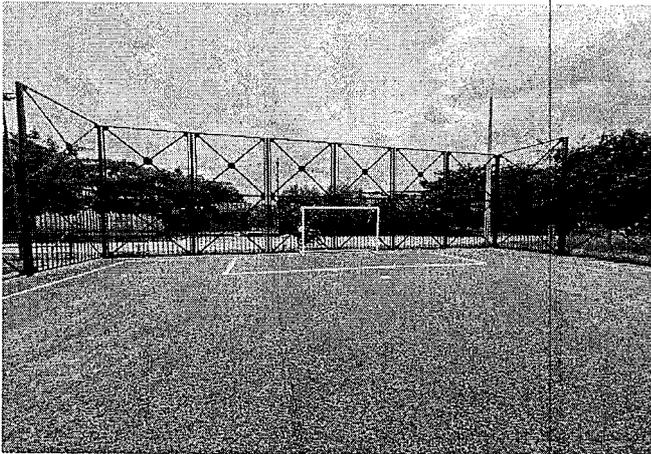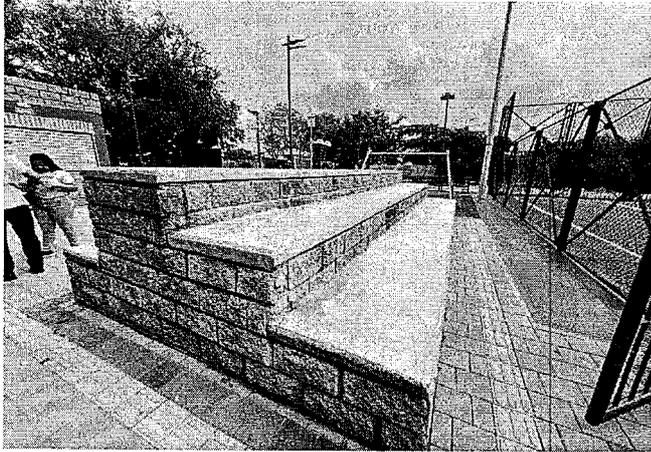

***CERTIFICADO DE CONEXION
ELECTRICA DEFINITIVA AL
PROYECTO SACUDETE EN EL
MARCO DEL CONVENIO
No.1974 - 2021***

ACTA REVISIÓN Y/O INSTALACIÓN MEDICIÓN DE ENERGÍA

Acta No. REV_295226_20241212072039

| CIUDAD | DPTO. | CODIGO CONTRATO |
|------------------------|----------------------------|-------------------|
| Puerto Salgar | Cundinamarca | JA10146236 |
| CÓDIGO SIC | NIU | |
| | | |
| NOMBRE USUARIO | DIRECCIÓN | TELÉFONO USUARIO |
| ELIANA RAMIREZ RAMIREZ | KR 15 CON CL 12 | 3113892750 |
| TIPO DE USUARIO | NIVEL TENSIÓN DE LA MEDIDA | TRANSFORMADOR No. |
| Oficial | 1 | 200373TR1 |
| CAPACIDAD (kVA) | NODO TRANSFORMADOR No. | NODO ACOMETIDA |
| 10 | 1 | 1 |
| RAZÓN SOCIAL | SUBESTACIÓN | CIRCUITO |
| ELIANA RAMIREZ RAMIREZ | AÉREA | 0 |

En Puerto Salgar a los 12 días del mes de 12 del año 2024 a las 07:11 horas se hicieron presente los Sres.: Alcibiades Leonel Alvarez Alvarez en representación de las empresas Enel Colombia S.A ESP y Alcibiades Leonel Alvarez Alvarez respectivamente, con el fin de realizar una revisión a los equipos que componen el sistema medida del inmueble. Se informa al suscriptor y/o usuario su derecho a solicitar la asesoría o participación de un técnico particular, al cual se le concede un término máximo de 15 Minutos, para hacerse presente en el sitio de la revisión. Cumplido este tiempo se procede a efectuar la revisión. El suscriptor hace uso de su derecho SI () NO(X). En las mediciones correspondientes a fronteras comerciales representadas por Enel Colombia S.A ESP se procede de conformidad con las Resoluciones emitidas por la CREG, en particular lo establecido en el Reglamento de Comercialización (Res. CREG 156 de 2011) y Código de Medida (Res. CREG 038 de 2014) ó aquellas que las modifiquen o sustituyan

| MEDIDOR INSTALADO | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| MEDIDOR | ACTIVA | REACTIVA |
| SERIE | 13574 | 13574 |
| MARCA | NINGBO | NINGBO |
| TIPO DE MEDIDOR | Directa - BIFÁSICO | Directa - BIFÁSICO |
| No. DE ELEMENTOS | ND | ND |
| LECTURA | 2.460 | 1.270 |
| kh ó kd | 2000.0 | 2000.0 |
| CLASE | 1 | 2 |
| FECHA FABRICACIÓN | 2024 | 2024 |
| CORRIENTE MÁXIMA | 100.0 | 100.0 |
| TENSIÓN MÁXIMA | 208.0 | 208.0 |

| MEDIDOR RETIRADO | | |
|-------------------|--------|----------|
| MEDIDOR | ACTIVA | REACTIVA |
| SERIE | | |
| MARCA | | |
| TIPO DE MEDIDOR | | |
| No. DE ELEMENTOS | | |
| LECTURA | | |
| kh ó kd | | |
| CLASE | | |
| FECHA FABRICACIÓN | | |
| CORRIENTE MÁXIMA | | |
| TENSIÓN MÁXIMA | | |

| SELLO MEDIDOR INSTALADO | | | | |
|-------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| UBICACIÓN | | INSTALADO | RETIRADO | OR-RF-LAB |
| CUBIERTA MEDIDOR | ACTIVA | | | |
| | REACTIVA | | | |
| BORNERA MEDIDOR | ACTIVA | | | |
| | REACTIVA | | | |
| BLOQUE DE PRUEBAS | | | | |

| SELLO MEDIDOR RETIRADO | | | | |
|------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| UBICACIÓN | | INSTALADO | RETIRADO | OR-RF-LAB |
| CUBIERTA MEDIDOR | ACTIVA | | | |
| | REACTIVA | | | |
| BORNERA MEDIDOR | ACTIVA | | | |
| | REACTIVA | | | |
| BLOQUE DE PRUEBAS | | | | |

| VERIFICACIÓN TELEMEDIDA | | |
|-------------------------|-----------|----------|
| Modem | Instalado | Retirado |
| MARCA | | |
| SERIE | | |
| TELEFONO o IP | | |
| IMEI | | |

Desfase del reloj del Medidor con respecto a la Hora Oficial de Colombia (segundos):

| CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE MEDIDA | | |
|--|-----------------|--------------------|
| PUNTO MEDICIÓN | MÚLTIPLO MEDIDA | TELEMEDIDA EXITOSA |
| 4 | 1 | |

| CARACTERÍSTICAS | TRAFOS DE CORRIENTE ENCONTRADOS | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| | TC1 | | | TC2 | | | TC3 | | |
| No.CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | | | | | | | | | |
| LABORATORIO QUE LO EMITE | | | | | | | | | |
| AÑO DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO | | | | | | | | | |
| MARCA | | | | | | | | | |
| TIPO | | | | | | | | | |
| MODELO | | | | | | | | | |
| RELACIONES (Todas) | | | | | | | | | |
| CARGABILIDAD | | | | | | | | | |
| CLASE | | | | | | | | | |
| RELACIÓN ACTUAL | | | | | | | | | |
| SERIE | | | | | | | | | |
| SELLOS INSTALADOS | OR-RF | | | | | | | | |
| SELLOS RETIRADOS | OR-RF | | | | | | | | |
| PRUEBAS | lp | ls | RTC | lp | ls | RTC | lp | ls | RTC |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| CARACTERÍSTICAS | TRAFOS DE TENSIÓN ENCONTRADOS | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| | TT1 | | | TT2 | | | TT3 | | |
| No.CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | | | | | | | | | |
| LABORATORIO QUE LO EMITE | | | | | | | | | |
| AÑO DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO | | | | | | | | | |
| MARCA | | | | | | | | | |
| TIPO | | | | | | | | | |
| MODELO | | | | | | | | | |
| RELACIONES (Todas) | | | | | | | | | |
| CARGABILIDAD | | | | | | | | | |
| CLASE | | | | | | | | | |
| RELACIÓN ACTUAL | | | | | | | | | |
| SERIE | | | | | | | | | |
| SELLOS INSTALADOS | OR-RF | | | | | | | | |
| SELLOS RETIRADOS | OR-RF | | | | | | | | |
| PRUEBAS | Vp | Vs | RTT | Vp | Vs | RTT | Vp | Vs | RTT |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| PORCENTAJE ERROR MEDIDOR SERIE | | | | | |
|--------------------------------|---------|-----------|-------|------|------|
| FASE | TENSION | CORRIENTE | FP | PRED | QRED |
| R | | | | | |
| S | | | | | |
| T | | | | | |
| SER% | | | TOTAL | | |
| PMED | | PER% | | QMED | |
| Q ER% | | SMED | | SRED | |

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|
| ¿INSTALACIÓN TIENE MEDIDOR DE RESPALDO? | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | N/A <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿SE EFECTÚA SINCRONIZACIÓN DE TIEMPO? | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | N/A <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿SE EFECTÚA REPROGRAMACIÓN DE MEDIDOR? | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | N/A <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿SE EFECTUÓ ENTREGA HOJA DE VIDA? | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | N/A <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿EL SISTEMA TIENE ELEMENTOS EN FALLA? | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | N/A <input checked="" type="checkbox"/> |

¿Cual(es)?

| | | |
|--|--|--|
| ¿SE ENCONTRÓ IRREGULARIDAD EN LA MEDIDA? | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿ASISTIÓ EL COMERCIALIZADOR A LA VISITA? | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿ASISTIÓ EL OPERADOR DE RED A LA VISITA? | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| ¿SE EFECTUÓ SUSPENSIÓN O CORTE SERVICIO? | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿SE EFECTUÓ RECONEXIÓN O REINSTALACION? | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿REGISTRA EL CONSUMO DE UN SOLO USUARIO? | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |

ESTADO DE INSTALACIÓN ANTES Y DESPUÉS DE LA REVISIÓN

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| DIAGRAMA FASORIAL | CÓMO SE ENCONTRO LA INSTALACIÓN |
| CÓMO SE DEJO LA INSTALACIÓN | DIAGRAMA UNIFILAR |



OBSERVACIONES Y/O IRREGULARIDADES ENCONTRADAS

Firma en Constancia de Aceptación

| USUARIO/TESTIGO | REPRESENTANTE DE LA FRONTERA | AGENTE OPERADOR DE RED |
|-----------------|------------------------------|------------------------|
|-----------------|------------------------------|------------------------|

Firma: *[Firma]* Firma: *[Firma]* Firma: *[Firma]*

Nombre: ELIANA MARITZA RAMIREZ Nombre: Alcibiades Leonel Alvarez Alvarez Nombre: Alcibiades Leonel Alvarez Alvarez
 C.C.No.: 40610190 C.C.No.: 80382171 C.C.No.: 80382171
 Cargo: Técnico Cargo: Técnico Cargo: Técnico

Nota: En caso de detectarse una(s) Irregularidad(es) esta acta y sus anexos constituyen plena prueba documental de lo encontrado en las instalaciones del suscriptor y/o usuario.



NUEVAS CONEXIONES
GERENCIA
ENEL GRIDS

Acta de Conexión del servicio: CON__295226_2024121207 **Clase del servicio:** Oficial
Actividad: CONEXION **Resultado de Actividad:** CREACION DE CUENTA
Motivo de la fallida:

INFORMACIÓN COMERCIAL

| | |
|---|--|
| Fecha de Conexión a la Red: 12/12/2024 | No Solicitud: 588836 |
| Hora de Conexión: 07:11 | Tipo Solicitud: 1210NC |
| Fecha de Desconexión a la Red: | No. Cliente Vecino: 5248020 |
| Hora de Desconexión: | Estrato: 0 |
| No. Cliente: 1127658030 | Cliente Pagador: ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO SALGAR |
| No. Medidor Vecino: 212071 | |
| Marca Medidor Vecino: OSAKI | |

DATOS CLIENTE

| | |
|---|-------------------------------------|
| Nombre Propietario: ELIANA RAMIREZ RAMIREZ | Nlt o CC: 1127658030 |
| Nombre de quien atiende: ELIANA MARITZA RAMIREZ GUIL | Nlt o CC: 40610190 |
| Dirección: KR 15 CON CL 12 | |
| Nomenclatura: KR 15 con CL 12 | Tipo: URBANO |
| Barrio: Divino Niño | En calidad de: Autorizado(a) |
| Municipio: Puerto Salgar | Localización Medidor: Poste |
| Telefono: 3113892750 | |

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-----------------------------------|--|
| Tipo de Instalación: Poste | Latitud: 5.461799 |
| Tipo de Red: Aerea | Longitud: -74.6523616 |
| Tipo de Acometida: Aérea | Longitud Acometida: 15 |
| Cargo Aforo: 6 | Calibre Acometida: BIFÁSICO |
| Tipo de Medida: DIRECTA | Punto fisico Conexión: 29476086 |
| Tipo Conductor: 2F | CD: |

Medidores Retirados

| No.Medidor | Tipo | Marca | Lectura | Ubica | Tipo Medidor | % Error Reg | % Error | % No. Reg |
|------------|------|-------|---------|-------|--------------|-------------|---------|-----------|
|------------|------|-------|---------|-------|--------------|-------------|---------|-----------|

Sellos Retirados

| No.Sello | Ubicacion | Color |
|----------|-----------|-------|
|----------|-----------|-------|

Medidores Instalados

| No.Medidor | Tipo | Marca | Lectura | Ubica | Tipo Medidor | % Error Reg | % Error | % No. Reg |
|------------|------|-------|---------|-------|--------------|-------------|---------|-----------|
| 13574 | M | 075 | 2.460 | Poste | | 1.2 | 1.2 | 1.2 |


Sellos Instalados

| No.Sello | Ubicacion | Color |
|----------|-----------|-------|
|----------|-----------|-------|

Otros Elementos Encontrados

| Elemento | Serial | Marca | Rel Arriba | Rel Abajo |
|----------|--------|-------|------------|-----------|
|----------|--------|-------|------------|-----------|

Diagrama Unifilar

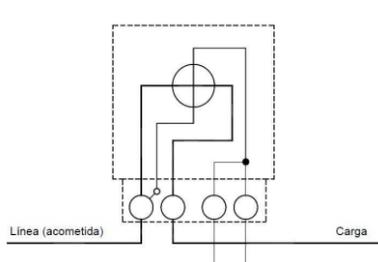

Tenga en cuenta que si usted es cliente de los estratos 1,2 y 3 tiene derecho a una financiación hasta 36 meses para los cargos por conexión (Artículo 97 Ley 142 de 1994). Si usted solicita un plazo inferior, estará renunciando al derecho.

Acta : CON__295226_20241212071256

Cuotas de ley: Acepta cuotas de ley

Número de cuotas : 01

Observaciones:

SE realiza visita a solicitud del usuario para creación cuenta nueva se instala medidor bifasico número 13574 se instalan sellos en cc 750612201-02 en CM 750612203-04-05

APRECIADO CLIENTE: El medidor instalado por ENEL/CONTRATISTA ha sido calibrado por CAM como laboratorio certificado según Resolución 10165 de mayo 18 de 2004, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. El medidor retirado relacionado e este documento podrá ser solicitado nuevamente (siempre y cuando el cliente lo hubiese pagado) en el laboratorio de (la) Compañía Americana de Multiservicios CAM ubicado en la Carrera 658 N. 13-78 presentando este comprobante. Si el cliente no se presenta en un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la fecha del retiro, ENEL no se hará responsable del medidor.

Yo, ELIANA MARITZA RAMIREZ GUIL identificado con cédula de ciudadanía No. 40610190, en calidad de Autorizado(a), autorizo a Enel Colombia S.A. ESP para realizar cargos por conexión indicados en esta acta. De igual manera solicito, sean financiados los valores correspondientes a través de la factura de energía de Enel Colombia S.A. ESP, de acuerdo a la forma de pago pactada y manifestando tener conocimiento que la falta de pago. oportuno de estos valores originará la suspensión del servicio de energía de acuerdo con lo contemplado en la cláusula 19.1.2 del Contrato de Servicio Público de Energía Eléctrica.

Atendido: ELIANA MARITZA RAMIREZ GUIL

Técnico: Alcibiades Leonel Alvarez Alvarez

Documento: 40610190

Documento: 80382171

En Calidad de: Autorizado(a)

CONEXIÓN DEL SERVICIO:

Enel Colombia S.A. ESP en cumplimiento de sus obligaciones como Operador de Red, autoriza y supervisa a la presenta empresa contratista para que realice la Conexión del Servicio de los Elementos que componen las instalaciones eléctricas del predio (cable, caja, interruptor, ductería, medidor y puesta a tierra). Lo anterior de acuerdo con lo estipulado en el CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES de Conexión del Servicio. La acometida eléctrica del predio, incluyendo el medidor, son de la propiedad del cliente por el cual y de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la resolución de la CREG. 108 de 1997, es responsable del cumplimiento de las condiciones técnicas adecuadas para la prestación del servicio. Estos elementos deben estar en condiciones óptimas de funcionamiento para la seguridad de su familia y de la comunidad. Los trabajos son realizados por un ingeniero, Técnico o Profesional Electricista con matrícula profesional vigente en el cumplimiento de las condiciones establecidas por la autoridad competente. Tenga en cuenta que al realizar las adecuaciones debe seguir los siguientes trámites ante Enel Colombia S.A. ESP con el fin de no incurrir en sanciones y/o multas por incumpliendo a las disposiciones establecidas en el CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES-Solicitud de retiro de Sellos Solicitud de Conexión del Servicio por Nuevo Suministro o Adecuación. Adicionalmente, para la adecuación de las instalaciones eléctricas externas debe tener en cuenta que El nuevo suministro o adecuación debe estar acorde con las normas técnicas vigentes, las cuales pueden ser consultadas en el centro de atención especializada al servicio al cliente más cercano a su residencia-Los materiales que se usen deben contar con un certificado de conformidad con el reglamento Técnico de Instalaciones, expedido por un ente acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio. El retiro o instalación de sellos del medidor y la desconexión, así como la posterior conexión del servicio, solo puede ser realizada por personal autorizado de Enel Colombia S.A. ESP *Para mayor información comunicarse al 115 o dirigirse a nuestros centros de Atención Especializada. Causal suspensión del servicio eléctrico por modificación de la conexión eléctrica sin autorización Conforme a lo dispuesto en el numeral 19.1.4 del contrato de condiciones uniformes para la prestación de servicio público domiciliario de energía eléctrica, en caso de evidenciar incumplimiento a las normas de seguridad en sus instalaciones y anomalías en (conexiones, medidores, sellos, cajas de medidores, pernos, chapas, líneas, et., se procederá con la suspensión del servicio. Para la reconexión del servicio será necesaria la normalización de las instalaciones, lo cual podrá gestionar mediante un tercero facultado o Enel Colombia S.A. ESP.

Autorizo a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P para que las comunicaciones relacionadas con mi cuenta de servicio de energía eléctrica así como las decisiones y respuestas a mis quejas y reclamos, me sean notificadas, y/o comunicadas al correo electrónico. En virtud de lo anterior, acepto que: a) Se entenderá que el cliente ha sido notificado y/o comunicado en la fecha y hora en que reciba el correo electrónico remitido por ENEL COLOMBIA S.A. ESP, en el buzón de la dirección electrónica indicada en el presente documento, b) El cliente se hace responsable de adoptar las medidas de uso, seguridad y capacidad idóneas para la recepción de las decisiones adoptadas inherentes a la cuenta del servicio de energía eléctrica, así como las medidas necesarias para la administración de la cuenta de correo electrónico.

Conforme a la Ley 1581 del 2012 y la política de tratamiento de datos personales, con la suscripción de este documento usted autoriza que sus datos sean tratados por las empresas del Grupo Enel en Colombia para todos los fines relacionados con la gestión de su solicitud, sus productos activos, la prestación del servicio público de energía eléctrica de acuerdo con el contrato de servicio público, y para la generación, almacenamiento, comercialización y distribución de recursos de energéticos.

Recuerde que tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar y cuando proceda, suprimir sus datos y revocar la autorización dada para su tratamiento, a través de los canales indicados en la política publicada en www.enel.com.co en la cual también encontrará la identificación de las empresas que pertenecen al Grupo Enel en Colombia.
