



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Con base en la información suministrada en los informes mensuales y/o semanales del contrato de interventoría, y actas de liquidación del proyecto objeto de seguimiento si es del caso, sobre el cumplimiento de las obligaciones del interventor, en mi calidad de supervisor del Contrato de Interventoría No. 410 FIP de 2021, me permito certificar que, para el pago de interventoría a los proyectos de infraestructura social provenientes de la Convocatoria 001 de 2020, incorporadas en el contrato de interventoría mediante el ANEXO No. 13 ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS al contrato, y de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Cuarta – Forma de pago del contrato, los proyectos que se relacionan han cumplido con lo estipulado en el numeral 2.1.4.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DE OBRA del Anexo Técnico del contrato de interventoría:

Factura No.	Convenio	Tipo de Proyecto	Dpto.	Municipio	PROYECTO	% HITO AVANCE DE OBRA	VALOR A PAGAR
FE497	536 - 2021	Plaza de Mercado	Cauca	Timbiquí	Construcción de la plaza de mercado "Así progresa Timbiquí" para la consolidación de la Paz en el corregimiento de Puerto Saija consejo comunitario parte Baja Rio Saija en el Municipio de Timbiquí - Departamento del Cauca	60%	\$ 75.330.671
FE498	623 - 2021	Vía Rural	Caldas	Chinchiná	Mejoramiento de vías terciarias, mediante la construcción de placa huellas, en la vereda Quebra del Naranjal, alto de la mina, en la zona rural del Municipio de Chinchiná, Departamento de Caldas	30%	\$ 20.019.960
FE505	656 - 2021	Vía Urbana	Caldas	Palestina	Construcción pavimento rígido de algunos tramos viales en el barrio La Colina y el Barrio los Nogales en la Zona Urbana del Municipio de Palestina Caldas	100%	\$ 8.014.279,00
FE506	298 - 2021	Vías y Transporte	Nariño	Puerres	Mejoramiento en placa huella de la vía Puerres, Monopamba sector desmontes Altos (Alisales) Tramo Punto de terminación de pavimento Rígido (K0+000) Hasta el (K1+500) del Municipio de Puerres - Nariño	15%	\$ 9.216.589
Total							\$ 112.581.499



La firma GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S., a través de su Representante Legal, certifica estar al día con sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a cajas de Compensación ICBF y Sena del personal que se encuentra vinculado a las actividades de la interventoría detalladas anteriormente.

Por lo anteriormente expuesto se procede a validar el pago de **\$ 112.581.499,00**, correspondiente a las **facturas electrónicas Nos. FE497, FE498, FE505 y FE506 (4 facturas)**, valor que incluye IVA, todos los costos directos e indirectos, impuestos, gravamen, tasas y retenciones a que haya lugar.

La presente se expide a los nueve (9) días del mes de mayo de 2023, para los trámites que correspondan por parte de la Entidad.

LUIS EDUARDO OBREGÓN ARDILA

Supervisor Contrato de Interventoría No. 410 FIP de 2021

**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS**

NIT: 900916608 - 4
Ciudad: BOGOTÁ, D.C., Bogotá
Teléfonos: 6215383
Dirección: CR 48 101 A 29

Responsable de IVA - No somos Autorretenedores Actividad ICA 7112 Tarifa 8.66 x 1000

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764043770121 del 2023-02-02 al 2024-02-02 autorizado del FE501 al FE700

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #		FE506
Fecha factura:	may. 08, 2023 15:57:33	
Vencimiento:	may. 09, 2023	
Tipo de pago:	Contado	
Medio de pago:	Transferencia Crédito Bancaria	
Moneda:	COP	

FACTURADO A:	Cliente:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	Tel:	5142060
	NIT:	900039533-8	Dirección:	CR 7 27 18
	Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C. / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
1	SERVICIO	Un primer pago correspondiente al 10% del valor de la interventoría del proyecto contra un avance físico del 15% de ejecución Unidad: 94	1	\$ 7,745,033.00	0%	IVA:19% INC:0%	\$ 7,745,033.00	\$ 9,216,589.00

Cantidad de líneas: 1

NOTAS

Observación
Nota 1: 41-01-01-003;410; luis.obregon@prosperidadsocial.gov.co
Nota 2: Contrato 410 FIP 2021 – Clausula Cuarta: Forma de pago
Nota 3: a) Un primer pago correspondiente al 10% del valor de la interventoría del proyecto contra un avance físico del 15% de ejecución de la obra.
Nota 4: Mejoramiento en placa huella de la vía Puerres, Monopamba sector desmontes Altos (Alísales) Tramo Punto de terminación de pavimento Rígido (K0+000) Hasta el (K1+500) del Municipio de Puerres - Nariño - CONV 298 FIP 2021


RESUMEN	
Subtotal:	\$ 7,745,033.00
Total impuestos:	\$ 1,471,556.00
Total IVA:	\$ 1,471,556.00
TOTAL	\$ 9,216,589.00


Valor en letras: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 M/CTE PESOS



CUFE: 6bc26366058ec5460d0853a0972bfd7cb04ec752ff191bd44e43959d438051631cb99fe5085cd26f1f5bb19749814c26

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.

 <div>La equidad es de todos</div> Prosperidad Social		FORMATO INFORME EJECUTIVO MENSUAL, TRIMESTRAL Y FINAL DE INTERVENTORÍA						Código: F-IP-220																					
PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos										Versión: 1																			
FECHA DE INFORME:	31/12/2022		TIPO DE INFORME:	MESUAL <input checked="" type="checkbox"/>	TRIMESTRAL <input type="checkbox"/>	FINAL <input type="checkbox"/>	INFORME N°:	5	PERIODO DEL AL	1/12/2022																			
N° Y AÑO DE CONVENIO:	298 FIP de 2021		ID DEL PROYECTO:	E-2020-2203-252562			ETAPA (s):	CONSTRUCCION	NARINÓ	31/12/2022																			
N° Y AÑO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	410FIP de 2021		SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO(DPS)			LUIS EDUARDO OBREGON		SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (DPS):			RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPO,																		
1. INFORMACIÓN GENERAL																													
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:												MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE PUERRES - MONOPAMBA del municipio de Puerres , Departamento de Nariño																	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:												Municipio de Puerres, Nariño,																	
PROYECTO DE INTERVENTORIA (PI)												N° DE BENEFICIARIOS:						829											
N° ACTA DE ASIGNACIÓN PROYECTO DE INTERVENTORIA (o su equivalente):												410FIP de 2021						N° Y AÑO DE CONTRATO:						298 FIP de 2021					
CONTRATANTE:												DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD						CONTRATANTE:						Municipio de puerres					
INTERVENTOR:												GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S						CONTRATISTA:						EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO					
PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:												N/A						PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:						N/A					
PLAZO CONSTRUCCIÓN:												5 Meses						PLAZO CONSTRUCCIÓN:						5 Meses					
PLAZO TOTAL INICIAL:												5 Meses						PLAZO TOTAL INICIAL:						5 Meses					
FECHA DE INICIO Y NO. ACTA DE INICIO												16 de agosto de 2022						FECHA DE INICIO Y NO. ACTA DE INICIO						16 de agosto de 2022					
FECHA DE TERMINACIÓN:												16 de enero de 2023						FECHA DE TERMINACIÓN:						16 de enero de 2023					
PLAZO ACTUALIZADO:												153						PLAZO ACTUALIZADO:						153					
PLAZO TRANSCURRIDO:												138 EQUIVALE AL 90,20%						PLAZO TRANSCURRIDO:						138 EQUIVALE AL 90,20%					
VALOR INICIAL :												\$ 92.165.895,00						VALOR INICIAL :						\$ 986.824.622,00					
*VALOR ADICIÓN N° :												\$						*VALOR ADICIÓN N° :						\$ 10.205.000,00					
VALOR ACTUALIZADO:												\$ 92.165.895,00						VALOR ACTUALIZADO:						\$ 997.029.622,00					
VALOR EJECUTADO :												\$ -						VALOR EJECUTADO:						\$ 28.546.455,00					
VALOR PAGADO:												\$ -						VALOR PAGADO:						\$ -					
VALOR POR EJECUTAR:												\$ 92.165.895,00						VALOR POR EJECUTAR:						\$ 968.483.167,00					
SUPERVISOR:												LUIS EDUARDO OBREGON						SUPERVISOR:						VICTOR HUGO CALVACHI REVELO					
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.																													
2. ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS PUBLICOS																													
LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS												DESCRIPCIÓN DEL ESTADO								FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN									
CERTIFICADO CRC NO LICENCIAS AMBIENTALES												No requiere iniciar el trámite de Licencia Ambiental																	
CERTIFICADO_ESCOMBRERA												Certificado suministrado por la alcaldía municipal de puerres								6/10/2021									
3. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO																													
ASPECTOS												SI		NO		OBSERVACIONES													
PÓLIZAS VIGENTES												X				A la fecha contratista de obra suministro pólizas actualizadas según acta de inicio y modificatorio 1, por parte del municipio esta pendiente la resolución de pólizas aprobadas interventoría en diferentes comunicaciones informo al respecto.													
TIENE RECLAMACIONES												X																	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES														X															
4. CONTROL DE PROGRAMACION																													
AVANCE FÍSICO																													
ASPECTO		% PROGRAMADO HASTA LA FECHA		% EJECUTADO HASTA LA FECHA		% AVANCE																							
Acumulado anterior		68,88%		16,83%		24,434%																							
Durante el periodo		31,12%		16,37%		52,603%																							
Acumulado Actual		100,00%		33,20%		33,200%																							
PROYECCIÓN																													
Proyección del periodo siguiente												66,80%																	
Acumulado del periodo siguiente												100,00%																	
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO																													
DURACIÓN CONTRATO (DÍAS)		DÍAS TRANSCURRIDOS		DÍAS QUE FALTAN		ATRASO EN DÍAS																							
153		138		15		-92,18																							
2.1 Avance Físico																													



La equidad es de todos

Prosperidad Social

FORMATO INFORME EJECUTIVO MENSUAL, TRIMESTRAL Y FINAL DE INTERVENTORÍA

Código: F-IP-220

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

Versión: 1


ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

El contratista obra en este periodo realiza actividades en este periodo de: Fundición de huellas en el tramo #1 (base) k0+100-k0+187 carril derecho, Fundición de placa huella tramo #2 desde la K0+553 al K0+478 una longitud de 75 metros lineales. Formaleta y Fundición de placa huella tramo #2 desde la K0+420 al K0+478 carril izquierdo, aseo y limpieza del tramo #2 y relleno de filos desde la K0+420 al K0+553 carril izquierdo se requiere al contratista para que presente plan de contingencia para superar el atraso presentado en la última semana del mes de diciembre. NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN PARALISIS TOTAL. La obra presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 33,20%, el retraso de la obra es del 66,80%, el contratista incurrió en presunto incumplimiento de la obra. En obra se tiene 262 metros lineales funcionales de placa huella

AVANCE CONTROL PRESUPUESTAL

MES	ACUMULADO PROGRAMADO (\$) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO (\$) MILLONES	INDICADOR (%)	PROYECTADO (\$) MILLONES
1	18.419.927,44	28.546.455,18	154,98%	10%
2	24.559.903,26	24.885.561,27	101%	30%
3	375.703.467,00	100.458.336,00	27%	50%
4	677.727.223,00	166.131.509,00	25%	70%
5	997.029.622,00	327.625.774,50	33%	100%
VR. TOTAL	997.029.622,00	327.625.774,50		
COSTO FINAL PROYECTADO	997.029.622,00	EJECUCION PROYECTADA (%)	100,00%	

2.2 EJECUCION PRESUPUESTAL

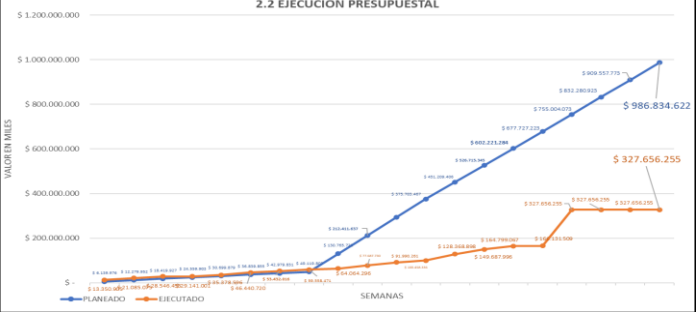

6. CONTROL DE CALIDAD

Control realizado	Cantidad	Cantidad Aprobada	% Cumplimiento	Observaciones
equipos de topografía	1	0	0%	No suministran PGIO mensual
equipos de medición	1	0	0%	No suministran PGIO mensual

7. PROGRAMACION DE AUDITORIAS VISIBLES E INTERMEDIAS

Tipo y N° de Auditoria	Fecha Programada	Fecha Real	N° Asistentes	Observaciones
Auditoria Visible No.1	10/10/2022	10/10/2022	35	Se realiza en alisales

8. ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS PENDIENTES DE IMPLEMENTAR O DE REPORTAR FINALIZACION

Acción	Estado	Responsable	Fecha Programada de Cierre (d/m/a)	Fecha Real de Cierre
Acta de mayores y menores cantidades	N/A	contratista de obra	N/A	A la fecha no se relacionan actas de mayores y menores

9. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Se requiere que al contratista implemente el PMT Y PGIO aprobado para el proyecto.

Se solicita la entrega del plan de contingencia ya que no se encuentran entregadas a la fecha, pese a los requerimientos antes mencionados, se reitera que dicho plan debe contar con los siguientes puntos:

- Evaluación - análisis de actividades en atraso - ruta crítica e hitos
- Planificación - reprogramación de actividades cronograma hasta el 31 de diciembre de 2022
- Pruebas de viabilidad - (consecución y adquisición de material y mano de obra - cantidad)
- Ejecución - implementación, metodología y seguimiento (cumplimiento de hitos dentro del plan)
- No se prorroga convenio por lo tanto contractualmente se terminó el 31 de diciembre de 2022
- La obra presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 33,20%, el retraso de la obra es del 66,80%, el contratista incurrió en presunto incumplimiento de la obra. por parte de interventoría se remite informe de posible incumplimiento con tasación de multas con copia a la aseguradora pendiente audiencia de indagatoria por el incumplimiento.
- En obra se tiene 262 metros lineales funcionales de placa huella

Por parte de interventoría, se presenta el siguiente personal que ha participado en el desarrollo del presente proyecto:

Director de Interventoría: Juan Pablo García


Residente de Interventoría: Giovani alexander loza rosero

Profesional PGIO: Harold Moreno

Profesional Social: Yamile Jojoa

Coordinador de Proyectos: Diana Muñoz Burgos

Firma:



Nombre: DIANA MUÑOZ BURGOS

COORDINADOR DE INTERVENTORÍA

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO


Con base en la información suministrada en los informes mensuales y/o semanales del contrato de interventoría, y actas de liquidación del proyecto objeto de seguimiento si es del caso, sobre el cumplimiento de las obligaciones del interventor, en mi calidad de supervisor del Contrato de Interventoría No. 410 FIP de 2021, me permito certificar que, para el pago de interventoría a los proyectos de infraestructura social provenientes de la Convocatoria 001 de 2020, incorporadas en el contrato de interventoría mediante el ANEXO No. 13 ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS al contrato, y de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Cuarta – Forma de pago del contrato, los proyectos que se relacionan han cumplido con lo estipulado en el numeral 2.1.4.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DE OBRA del Anexo Técnico del contrato de interventoría:

Factura No.	Convenio	Sector	Dpto.	Mpio.	Proyecto a ejecutar	% AVANCE DE OBRA	VALOR A PAGAR
FE643	580 FIP 2021	Infraestructura Social	Nariño	San Pablo	Centro de acopio y transformación de derivados de Achira - "Almachira" Orgullo y tradición	60%	\$ 81.493.108
FE644	380 FIP 2021	Infraestructura Social	Cauca	Corinto	Mejoramiento y adecuación de la plaza de mercado del Municipio de Corinto Cauca	30%	\$ 48.535.595
FE645	298 - 2021	Vías Rurales	Nariño	Puerres	Mejoramiento en placa huella de la vía Puerres, Monopamba sector desmontes Altos (Alísales) Tramo Punto de terminación de pavimento Rígido (K0+000) Hasta el (K1+500) del Municipio de Puerres - Nariño	30%	\$ 18.433.179
FE646	353 FIP 2017	Vías y Transporte	Nariño	Barbacoas	Construcción de vías urbanas en concreto rígido en el Municipio de Barbacoas - Nariño	100%	\$ 13.155.618
						Total	\$ 161.617.500

La firma GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S., a través de su Representante Legal, certifica estar al día con sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a cajas de Compensación ICBF y Sena del personal que se encuentra vinculado a las actividades de la interventoría detalladas anteriormente.

Por lo anteriormente expuesto se procede a validar el pago de **\$ 161.617.500,00**, correspondiente a las **facturas electrónicas Nos. FE-643, FE-644, FE-645 y FE-646 (4 facturas)**, valor que incluye IVA, todos los costos directos e indirectos, impuestos, gravamen, tasas y retenciones a que haya lugar.

La presente se expide a los doce (12) días del mes de diciembre de 2023, para los trámites que correspondan por parte de la Entidad.



LUIS EDUARDO OBREGÓN ARDILA

Supervisor Contrato de Interventoría No. 410 FIP de 2021



GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

NIT: 900916608 - 4
Ciudad: BOGOTÁ, D.C., Bogotá
Teléfonos: 6215383
Dirección: CR 48 101 A 29

Responsable de IVA - No somos Autorretenedores Actividad ICA 7112 Tarifa 8.66 x 1000

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764043770121 del 2023-02-02 al 2024-02-02 autorizado del FE501 al FE700

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #		FE645
Fecha factura:	dic. 06, 2023 11:52:26	
Vencimiento:	dic. 21, 2023	
Tipo de pago:	Contado	
Medio de pago:	Transferencia Crédito Bancaria	
Moneda:	COP	

FACTURADO A:	Cliente:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	Tel:	5142060
	NIT:	900039533-8	Dirección:	CR 7 27 18
	Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C. / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
1	Servicio	Un segundo pago correspondiente al 20% del valor de la interventoría del proyecto contra un avance físico del 30% de ejecución de la obra. CONVENIO 298 FIP 2021 Puerres Unidad: 94	1	\$ 15,490,066.39	0%	IVA:19% INC:0%	\$ 15,490,066.39	\$ 18,433,179.00

Cantidad de líneas: 1

NOTAS

Observación

CONTRATO 410 FIP 2021
Realizar la Interventoría a los proyectos de infraestructura social con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios y la generación de espacios comunitarios para la reintegración, estabilización y reconciliación social.
luis.obregon@prosperidadsocial.gov.co
Luis Eduardo Obregon Ardila
Nota 1: 41-01-01-003;410; luis.obregon@prosperidadsocial.gov.co
Nota 2: Contrato 410 FIP 2021 – Clausula Cuarta: Forma de pago
Nota 3: b) Un segundo pago correspondiente al 20% del valor de la Interventoría contra un avance físico del 30% de la ejecución de la obra
Nota 4: Mejoramiento en placa huella de la vía Puerres, Monopamba sector desmontes Altos (Alísales) Tramo Punto de terminación de pavimento Rígido (K0+000) Hasta el (K1+500) del Municipio de Puerres - Nariño, - CONV 298 FIP 2021


RESUMEN	
Subtotal:	\$ 15,490,066.39
Total impuestos:	\$ 2,943,112.61
Total IVA:	\$ 2,943,112.61
TOTAL	\$ 18,433,179.00


Valor en letras: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 00/100 M/CTE PESOS



CUFE: 80d8ec2e8550f52ffa46b4b479a381ced1414cd5be2f3c71b580398f0f9eb089a34081fa0fda9781eca9b0b49a6c8cc

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.

 <div>La equidad es de todos</div> Prosperidad Social		FORMATO INFORME EJECUTIVO MENSUAL, TRIMESTRAL Y FINAL DE INTERVENTORÍA						Código: F-IP-220																					
PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos										Versión: 1																			
FECHA DE INFORME:	31/12/2022		TIPO DE INFORME:	MESUAL <input checked="" type="checkbox"/>	TRIMESTRAL <input type="checkbox"/>	FINAL <input type="checkbox"/>	INFORME N°:	5	PERIODO DEL AL	1/12/2022																			
N° Y AÑO DE CONVENIO:	298 FIP de 2021		ID DEL PROYECTO:	E-2020-2203-252562			ETAPA (s):	CONSTRUCCION	NARIÑO	31/12/2022																			
N° Y AÑO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	410FIP de 2021		SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO(DPS)			LUIS EDUARDO OBREGON		SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (DPS):			RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPO,																		
1. INFORMACIÓN GENERAL																													
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:												MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE PUERRES - MONOPAMBA del municipio de Puerres , Departamento de Nariño																	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:												Municipio de Puerres, Nariño,																	
PROYECTO DE INTERVENTORIA (PI)												N° DE BENEFICIARIOS:						829											
N° ACTA DE ASIGNACIÓN PROYECTO DE INTERVENTORÍA (o su equivalente):												410FIP de 2021						N° Y AÑO DE CONTRATO:						298 FIP de 2021					
CONTRATANTE:												DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD						CONTRATANTE:						Municipio de puerres					
INTERVENTOR:												GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S						CONTRATISTA:						EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO					
PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:												N/A						PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:						N/A					
PLAZO CONSTRUCCIÓN:												5 Meses						PLAZO CONSTRUCCIÓN:						5 Meses					
PLAZO TOTAL INICIAL:												5 Meses						PLAZO TOTAL INICIAL:						5 Meses					
FECHA DE INICIO Y NO. ACTA DE INICIO												16 de agosto de 2022						FECHA DE INICIO Y NO. ACTA DE INICIO						16 de agosto de 2022					
FECHA DE TERMINACIÓN:												16 de enero de 2023						FECHA DE TERMINACIÓN:						15 de enero de 2023					
PLAZO ACTUALIZADO:												153						PLAZO ACTUALIZADO:						153					
PLAZO TRANSCURRIDO:												138 EQUIVALE AL 90,20%						PLAZO TRANSCURRIDO:						138 EQUIVALE AL 90,20%					
VALOR INICIAL :												\$ 92.165.895,00						VALOR INICIAL :						\$ 986.824.622,00					
*VALOR ADICIÓN N° :																		*VALOR ADICIÓN N° :						\$ 10.205.000,00					
VALOR ACTUALIZADO:												\$ 92.165.895,00						VALOR ACTUALIZADO:						\$ 997.029.622,00					
VALOR EJECUTADO :												\$ -						VALOR EJECUTADO:						\$ 28.546.455,00					
VALOR PAGADO:												\$ -						VALOR PAGADO:						\$ -					
VALOR POR EJECUTAR:												\$ 92.165.895,00						VALOR POR EJECUTAR:						\$ 968.483.167,00					
SUPERVISOR:												LUIS EDUARDO OBREGON						SUPERVISOR:						VICTOR HUGO CALVACHI REVELO					
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.																													
2.ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS PUBLICOS																													
LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS												DESCRIPCIÓN DEL ESTADO								FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN									
CERTIFICADO CRC NO LICENCIAS AMBIENTALES												No requiere iniciar el trámite de Licencia Ambiental																	
CERTIFICADO_ESCOMBRERA												Certificado suministrado por la alcaldía municipal de puerres								6/10/2021									
3. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO																													
ASPECTOS												SI		NO		OBSERVACIONES													
PÓLIZAS VIGENTES												X				A la fecha contratista de obra suministro pólizas actualizadas según acta de inicio y modificatorio 1, por parte del municipio esta pendiente la resolución de pólizas aprobadas interventoría en diferentes comunicaciones informo al respecto.													
TIENE RECLAMACIONES												X																	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES														X															
4.CONTROL DE PROGRAMACION																													
AVANCE FÍSICO																													
ASPECTO		% PROGRAMADO HASTA LA FECHA		% EJECUTADO HASTA LA FECHA		% AVANCE																							
Acumulado anterior		68,88%		16,83%		24,434%																							
Durante el periodo		31,12%		16,37%		52,603%																							
Acumulado Actual		100,00%		33,20%		33,200%																							
PROYECCIÓN																													
Proyección del periodo siguiente												66,80%																	
Acumulado del periodo siguiente												100,00%																	
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO																													
DURACIÓN CONTRATO (DÍAS)		DÍAS TRANSCURRIDOS		DÍAS QUE FALTAN		ATRASO EN DÍAS																							
153		138		15		-92,18																							
2.1 Avance Físico																													



La equidad es de todos

Prosperidad Social

FORMATO INFORME EJECUTIVO MENSUAL, TRIMESTRAL Y FINAL DE INTERVENTORÍA

Código: F-IP-220

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

Versión: 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

El contratista obra en este periodo realiza actividades en este periodo de: Fundición de huellas en el tramo #1 (base) k0+100-k0+187 carril derecho, Fundición de placa huella tramo #2 desde la K0+553 al K0+478 una longitud de 75 metros lineales. Formaleta y Fundición de placa huella tramo #2 desde la K0+420 al K0+478 carril izquierdo, aseo y limpieza del tramo #2 y relleno de filos desde la K0+420 al K0+553 carril izquierdo se requiere al contratista para que presente plan de contingencia para superar el atraso presentado en la última semana del mes de diciembre. NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN PARALISIS TOTAL. La obra presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 33,20%, el retraso de la obra es del 66,80%, el contratista incurrió en presunto incumplimiento de la obra. En obra se tiene 262 metros lineales funcionales de placa huella

AVANCE CONTROL PRESUPUESTAL

MES	ACUMULADO PROGRAMADO (\$) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO (\$) MILLONES	INDICADOR (%)	PROYECTADO (\$) MILLONES
1	18.419.927,44	28.546.455,18	154,98%	10%
2	24.559.903,26	24.885.561,27	101%	30%
3	375.703.467,00	100.458.336,00	27%	50%
4	677.727.223,00	166.131.509,00	25%	70%
5	997.029.622,00	327.625.774,50	33%	100%
VR. TOTAL	997.029.622,00	327.625.774,50		
COSTO FINAL PROYECTADO	997.029.622,00	EJECUCION PROYECTADA (%)	100,00%	

2.2 EJECUCION PRESUPUESTAL

6. CONTROL DE CALIDAD

Control realizado	Cantidad	Cantidad Aprobada	% Cumplimiento	Observaciones
equipos de topografía	1	0	0%	No suministran PGIO mensual
equipos de medición	1	0	0%	No suministran PGIO mensual

7. PROGRAMACION DE AUDITORIAS VISIBLES E INTERMEDIAS

Tipo y N° de Auditoria	Fecha Programada	Fecha Real	N° Asistentes	Observaciones
Auditoria Visible No.1	10/10/2022	10/10/2022	35	Se realiza en alisales

8. ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS PENDIENTES DE IMPLEMENTAR O DE REPORTAR FINALIZACION

Acción	Estado	Responsable	Fecha Programada de Cierre (d/m/a)	Fecha Real de Cierre
Acta de mayores y menores cantidades	N/A	contratista de obra	N/A	A la fecha no se relacionan actas de mayores y menores

9. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Se requiere que al contratista implemente el PMT Y PGIO aprobado para el proyecto.

Se solicita la entrega del plan de contingencia ya que no se encuentran entregadas a la fecha, pese a los requerimientos antes mencionados, se reitera que dicho plan debe contar con los siguientes puntos:

- Evaluación - análisis de actividades en atraso - ruta crítica e hitos
- Planificación - reprogramación de actividades cronograma hasta el 31 de diciembre de 2022
- Pruebas de viabilidad - (consecución y adquisición de material y mano de obra - cantidad)
- Ejecución - implementación, metodología y seguimiento (cumplimiento de hitos dentro del plan)
- No se prorroga convenio por lo tanto contractualmente se terminó el 31 de diciembre de 2022
- La obra presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 33,20%, el retraso de la obra es del 66,80%, el contratista incurrió en presunto incumplimiento de la obra. por parte de interventoría se remite informe de posible incumplimiento con tasación de multas con copia a la aseguradora pendiente audiencia de indagatoria por el incumplimiento.
- En obra se tiene 262 metros lineales funcionales de placa huella

Por parte de interventoría, se presenta el siguiente personal que ha participado en el desarrollo del presente proyecto:

Director de Interventoría: Juan Pablo García


Residente de Interventoría: Giovani alexander loza rosero

Profesional PGIO: Harold Moreno

Profesional Social: Yamile Jojoa


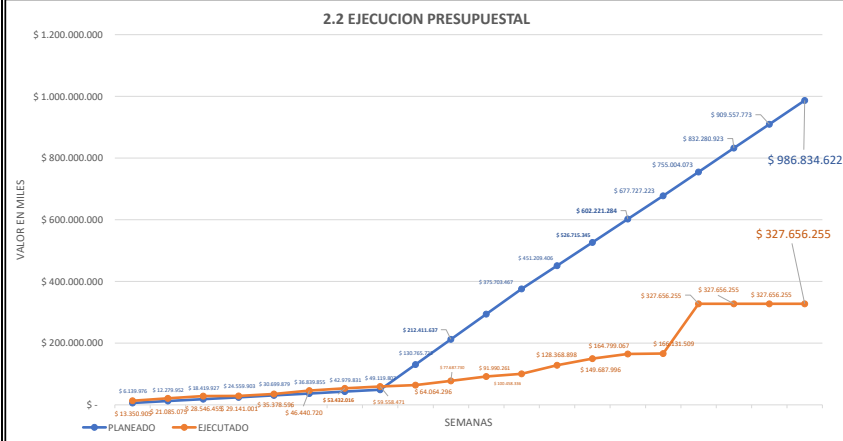
Coordinador de Proyectos: Diana Muñoz Burgos


Firma:







Nombre: DIANA MUÑOZ BURGOS

COORDINADOR DE INTERVENTORÍA

<div><div></div><div><div>La equidad es de todos</div><div>Prosperidad Social</div></div></div>		FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA				Código: F-IP-226	
		PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos				Versión: 4	
FECHA DE INFORME:		1-ene-23		INFORME N°:		20	
N° Y AÑO DE CONVENIO/CONTRATO (DPS):		298 FIP 2021		ETAPA:		CONSTRUCCION	
DEPARTAMENTO:		NARIÑO		ID DEL PROYECTO:		E-2020-2203-252562	
N° Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA:		410 FIP de 2021		MUNICIPIO:		PUERRES	
				SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO DE INTERVENTORIA (DPS):		RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPO	
1. INFORMACION GENERAL							
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:		MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE PUERRES - MONOPAMBA del municipio de Puerres , Departamento de Nariño					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		PUERRES - NARIÑO				No. Beneficiarios	
N° ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA (o su equivalente):		1		Nota: Verificar que el Acta se encuentra suscrita por todas las partes intervinientes			
		PROYECTO DE INTERVENTORIA (PI)		CONTRATO DE OBRA			
N° ACTA DE ASIGNACIÓN PROYECTO DE INTERVENTORIA (o su equivalente):		017 REGIÓN IV		N° Y AÑO DE CONTRATO:		20220145	
CONTRATANTE:		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL-FONDO DE INVERSIONES PARA LA PAZ-PROSPERIDAD SOCIAL-FIP		CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE PUERRES - NARIÑO	
INTERVENTOR:		GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		CONTRATISTA:		EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO	
PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:		N/A		PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:		N/A	
PLAZO CONSTRUCCIÓN:		5 MESES		PLAZO CONSTRUCCIÓN:		5 MESES	
PLAZO TOTAL INICIAL:		5 MESES		PLAZO TOTAL INICIAL:		5 MESES	
FECHA DE INICIO:		16 de agosto de 2022		FECHA DE INICIO:		16 de agosto de 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:		15 de enero de 2023		FECHA DE TERMINACIÓN:		15 de enero de 2023	
PLAZO ACTUALIZADO:		152		PLAZO ACTUALIZADO:		152	
PLAZO TRANSCURRIDO:		137		EQUIVALE AL		90,13%	
				EQUIVALE AL		90,13%	
VALOR INICIAL :		\$ 92.165.895		VALOR INICIAL :		\$ 986.834.622	
*VALOR ADICIÓN N° :		0		*VALOR ADICIÓN N° :		-	
VALOR ACTUALIZADO:		\$ 92.165.895		VALOR ACTUALIZADO:		\$ 986.834.622	
PORCENTAJE DE EJECUCION		0,00%		PORCENTAJE DE EJECUCION		33,20%	
VALOR EJECUTADO		\$ -		VALOR EJECUTADO:		\$ 327.658.034	
PORCENTAJE DE PAGO		0%		PORCENTAJE DE PAGO		0%	
VALOR PAGADO:		\$ -		VALOR PAGADO:		\$ -	
VALOR POR EJECUTAR:		\$ 92.165.895		VALOR POR EJECUTAR:		\$ 659.176.589	
SUPERVISOR DE CONVENIO O CONTRATO:		RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPO		SUPERVISOR DESIGNADO POR EL CONTRATANTE:		VICTOR HUGO CALVACHI REVELO	
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.							
2. PORCENTAJE DE AVANCE FISICO Y EJECUCION PRESUPUESTAL							
		Planeado		Ejecutado		Avance	
2.1 AVANCE FISICO (%)		100,00%		33,20%			
2.2 AVANCE - EJECUCION PRESUPUESTO (\$)		\$ 986.834.622		\$ 327.658.034		-66,80%	
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en \$)		-\$ 659.176.589					
2.2 EJECUCION PRESUPUESTAL							
							

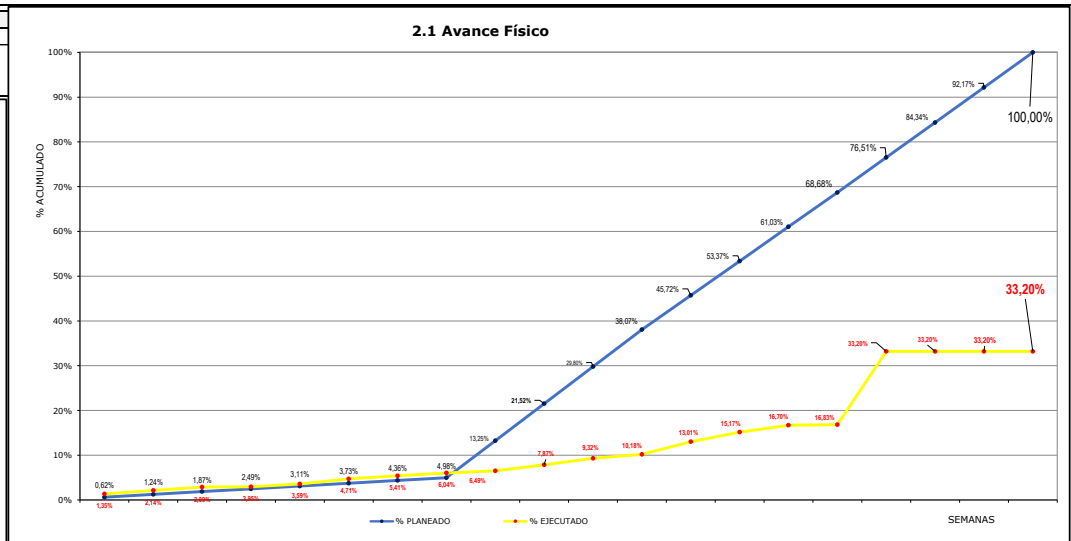2.1 Avance Físico	
	

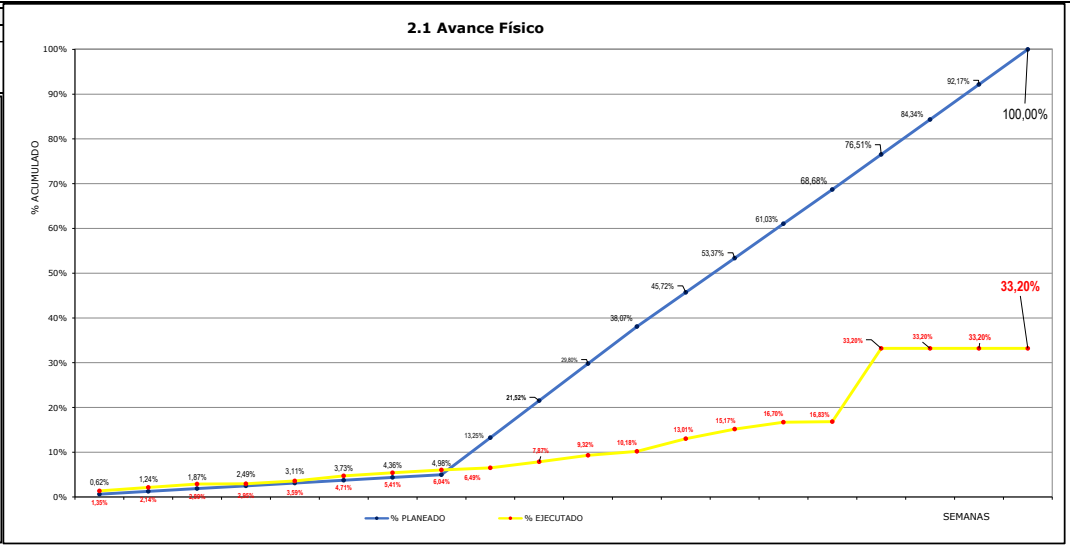

 <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div>		FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA			Código: F-IP-226
PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos					Versión: 4
3. PROGRAMACIÓN DE AUDITORIAS VISIBLES E INTERMEDIAS					
No.	FECHA PROGRAMADA	HORA INICIO/ HORA FIN	LUGAR	FECHA REAL	
1	10-oct-22	2:00 pm-4:00 pm	Desmontes Altos- Alisales	10-oct-22	
4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS					
4.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)					
<p>El contratista en este periodo NO realizo actividades</p> <p>NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN PARALISIS TOTAL</p> <p>La obra presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 33,20%, el retraso de la obra es del 66,80%, el contratista incurrio en presunto incumplimiento de la obra.</p> <p>En obra se tiene 262 metros lineales funcionales de placa huella,</p>					
4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL					
<p>El contrarista no cuenta con personal en obra</p> <p>El contratista no cuenta con materiales ni equipo en este periodo.</p>					
4.3. EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO					
<p>El contratista presenta acta de avance del 33,20%</p>					
4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS					
<p>Durante este periodo NO se realizan trabajos.</p>					
4.5. MANEJO AMBIENTAL					
<p>El contratista esta implementado PGIO parcialmente.</p>					
4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL					
<p>NO HAY PERSONAL EN OBRA</p>					
4.7 SALUD OCUPACIONAL					
<p>NO HAY PERSONAL EN OBRA</p>					
4.8 ASPECTOS SOCIALES					
<p>No se realizan actividades en este campo en este periodo</p>					
5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA					
ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE		FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA
6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES					
7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR					
4.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)					
<p>La obra presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 33,20%, el retraso de la obra es del 66,80%, el contratista incurrio en presunto incumplimiento de la obra. de contingencia para cumplir con el cronograma,</p>					
4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL					
<p>Durante este periodo NO se realizan trabajos.</p>					
4.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO					
<p>Se ha generado acta de cobro del 30% de la obra</p>					
4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS					
<p>Durante este periodo NO se realizan trabajos.</p>					
4.5. MANEJO AMBIENTAL					
<p>Durante este periodo NO se realizan trabajos.</p>					
4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL					
<p>Durante este periodo NO se realizan trabajos.</p>					
4.7 SALUD OCUPACIONAL					
<p>No se ha presentado inconvenientes en este aspecto.</p>					
4.8 ASPECTOS SOCIALES					
<p>Durante este periodo NO se realizan trabajos.</p>					
8. ANEXOS					
1. Reporte de Seguimiento F-IP-205					
2. Informe de Seguimiento al estado de Avance de las Intervenciones: F-IP-170					
3. Registro Fotográfico del avance durante la semana (F-GI-IH-112)					
4. Copia de la Bitácora de Obra correspondiente al periodo reportado					
5. Otros. Anexos que la Interventoria considere relevantes, por ejemplo: informes especiales (si aplica).					
FIRMA: 		FIRMA: 			
RESIDENTE DE INTERVENTORIA GIOVANI ALEXANDER LOZAROSERO TP N°: 52202089024nrñ		COORDINADOR DE INTERVENTORIA NOMBRE: DIANA MUÑOZ BURGOS TP N°: A13392006-45537706			



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhcalonso
Unidad ó Subunidad Ejecutora 41-01-01-003
Solicitante: Jeisson Camilo Alonso Triana
FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-22-11:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	459729023	Fecha Registro:	2023-12-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-01-01-003 FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	545423	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-12-22	Código de Referencia:	04500221500459729023			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	161.617.500,00	Valor Deducciones:	15.028.086,00			Valor Neto:	146.589.414,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	161,617,500.00	Valor Deducciones	15,028,086.00	Valor Neto	146,589,414.00	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS										
Números						No Recaudó:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00		Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00					Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00		Reintegrado Neto Moneda:	0.00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	900916608	Razón Social:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	03152522245	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CT NO. 410FP/2021	Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORI	Fecha:	2023-12-20
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
003 PS FIP / C-4103-1500-14-0-4103016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA FINANCIACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL - FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL - FIP NACIONAL												
	Nación	11	CSF	161,617,500.00	0.00	161,617,500.00				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	3,870,671.00	3,870,671.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891501283	MUNICIPIO DE CORINTO		0,500 %	203,931.00	203,931.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099061	MUNICIPIO DE BARBACOAS		0,800 %	88,441.00	88,441.00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		2,000 %	2,716,261.00	2,716,261.00	
2-01-04-01-31	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSULTORIA EN INGENIERIA DE PROYECTOS DE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6,000 %	8,148,782.00	8,148,782.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
41-01-01-003 - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-21	161,617,500.00	05 NINGUNO	Pagada

JUAN MANUEL VARGAS CARRASCO
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL VARGAS CARRASCO
Fecha: 2024.01.05 13:55:41 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
