


Organismos	0	0,0%
Acción Judicial	0	0,0%
Varios	79	18,1%

Cuadro No. 4 consolidado de las solicitudes por tipo de solicitante, período enero a septiembre de 2019

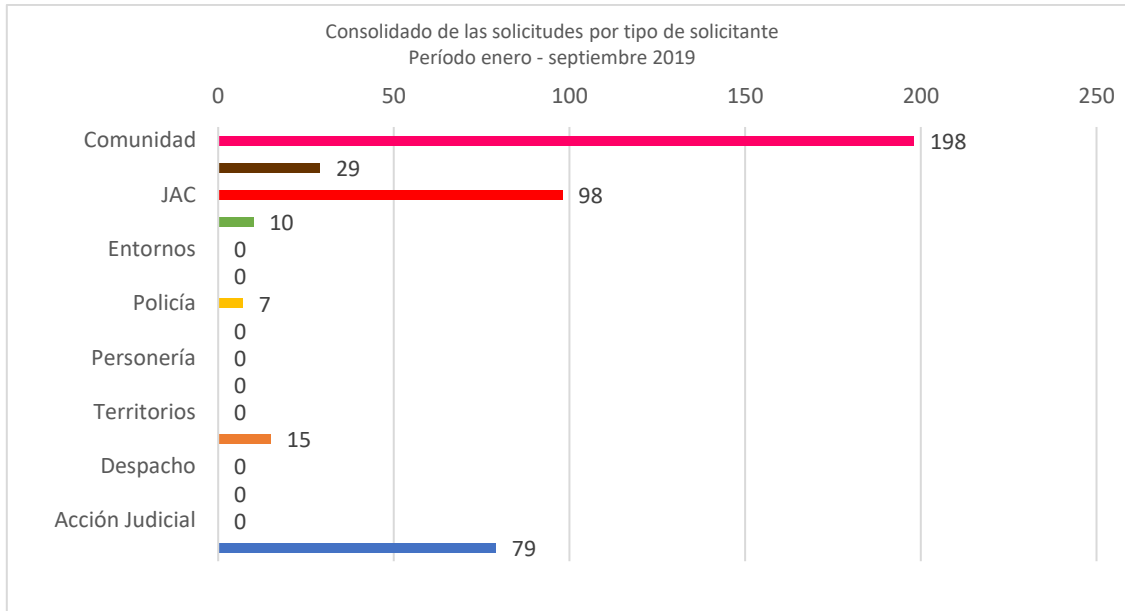

Gráfica No. 4 consolidado de las solicitudes por tipo de solicitante, período enero a septiembre de 2019

INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

La gestión social a través de este programa debe garantizar información completa, oportuna y veraz a la comunidad acerca de las actividades que se desarrollarán fortaleciendo la participación de la comunidad en la intervención ejecutada por la Secretaría de Infraestructura.

El consolidado de las actividades de información y divulgación durante los nueve (9) meses del año 2019, es el siguiente:

Tipo	No. de reuniones	No. Asistentes
Socialización	15	365
Mesas de Trabajo	51	412
Comité de Planeación	30	546
CALI, JAL, JAC o comunidad	64	997
Previa a Estrategia Los Territorios Progresan Contigo	2	37
Estrategia Los Territorios Progresan Contigo	6	284
TOTAL	168	2.641

Cuadro No. 5 actividades de Información y Divulgación atendidas por la Secretaría de Infraestructura, período enero a septiembre de 2019

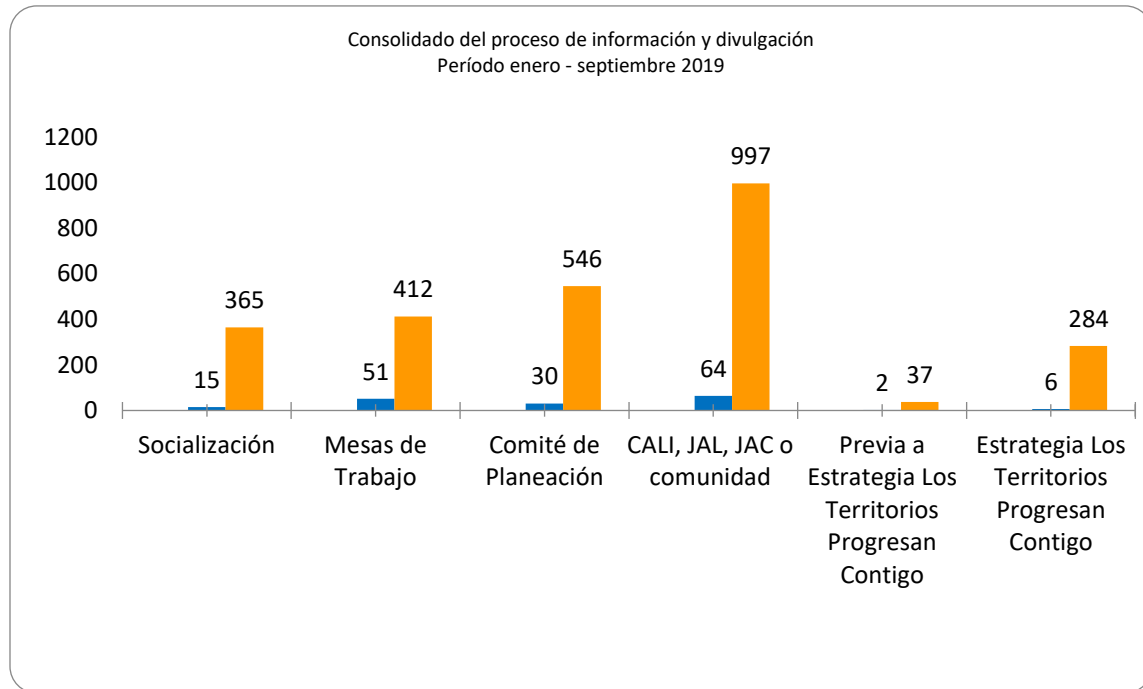


Gráfico No. 5 actividades de Información y Divulgación atendidas por la Secretaría de Infraestructura, período enero a septiembre de 2019

OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL

- Participar en las reuniones del Equipo de Calidad de la Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial donde se está realizando la articulación de las actividades de Gestión Social con el procedimiento de Mantenimiento Vial el cual cuenta con certificación ICONTEC. A la fecha se encuentran validados los siguientes guía, formatos e instructivos:
 - GUIA GESTION SOCIAL MMDI02.02.02.18.P04.G01
 - FORMATO ENCUESTA PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD MEDE01.05.09.18.P06.F14
 - FORMATO INFORME DE DIAGNÓSTICO SOCIAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA MMDI02.02.02.18.P04.F03
 - FORMATO SEGUIMIENTO ATENCIÓN A SOLICITUDES MMDI02.02.02.18.G01.F01
 - FORMATO SEGUIMIENTO A REUNIONES MMDI02.02.02.18.G01.F02
 - FORMATO SEGUIMIENTO A INTERVENCIONES MMDI02.02.02.18.G01.F03
 - FORMATO INFORME DE REUNION MMDI02.02.02.18.G01.F04

- FORMATO TABULACIÓN DIAGNOSTICO SOCIAL
MMDI02.02.02.18.G01.F05
 - FORMATO TABULACION DE ENCUESTAS MMDI02.02.02.18.G01.F06
 - FORMATO INFORME MESUAL DE GESTION SOCIAL EN EL TERRITORIO MMDI02.02.02.18.G01.F07
 - SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y O INTERVENCIÓN VIAL
MMDI02.02.02. P04.F01
 - INSTRUCTIVO DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO SOCIAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA MMDI02.02.02.18.P04.I03
 - INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO SEGUIMIENTO ATENCIÓN A SOLICITUDES MMDI02.02.02.18.G01.I01
 - INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO SEGUIMIENTO A REUNIONES
MMDI02.02.02.18.G01.I02
 - INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO SEGUIMIENTO A INTERVENCIONES MMDI02.02.02.18.G01.I03
 - INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO TABULACIÓN DIAGNÓSTICO SOCIAL MMDI02.02.02.18.G01.I05
 - INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO TABULACIÓN DE ENCUESTA
MMDI02.02.02.18.G01.I06
 - SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y O INTERVENCIÓN VIAL
MMDI02.02.02.P04.F01
- Participar en las reuniones del Equipo de Calidad de la Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial donde se lleva a cabo la revisión del cumplimiento al Plan de Mejoramiento del procedimiento de Mantenimiento Vial, el cual cuenta con certificación ICONTEC.
 - Participar en las reuniones del Equipo de Calidad de la Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial donde se están realizando las revisiones para la recertificación con ICONTEC del procedimiento de Mantenimiento Vial.
 - Participar en el Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana convocado por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.
 - Participar en el Comité Municipal “Entonos para la Vida” el cual hace parte del Consejo Territorial de Salud Ambiental – COTSA Municipal.
 - Participar en el Comité de Plazas de Mercado convocada por la Secretaría de Desarrollo Económico.

ÁREA DE TALLERES

En el mes de Julio se realizó el seguimiento y acompañamiento a la supervisión en la ejecución de los siguientes contratos: adquisición de repuesto 4151.010.26.1.1333.2019, compra de llantas 4151.010.26.1.1334 de 2019, y ,mantenimiento preventivo y correctivo incluida la mano de obra y el suministro de repuestos a los camiones, volquetas y maquinaria que utiliza el grupo operativo de la secretaria de infraestructura 4151.010.26.1.1567.2019, en lo referente a la entrega de los repuestos originales, la verificación de cada una de las actividades de reparación y mantenimiento en los camiones, volquetas, motoniveladoras, retroexcavadoras, cargadores y cilindros vibro compactadores del parque automotor de los talleres del Municipio, en donde se realizó el seguimiento contractual para optimizar las intervenciones realizadas a cada uno de los equipos diagnosticados.

Se acondiciono un nuevo espacio dentro del taller para la reubicación de los equipos a depreciar al tiempo se actualizo los registros individuales de cada uno de los equipos activos como también la inspección minuciosa a los bienes, maquinaria y equipos a depreciar y que se encuentran en talleres, la reubicación de los mismos, su ubicación y diagnóstico del estado real en que se encuentran para poder adelantar junto con la subsecretaria de apoyo técnico dar de baja los mismos puesto que el almacenamiento de estos se tenían sin ningún tipo de custodia ocasiono el desmantelamiento gradual prueba de ello es el actual informe solicitado y suministrado al subsecretario de apoyo técnico.

Se asistió a las diferentes reuniones de coordinación, programación del comité de mantenimiento vial que se realizan semanalmente al igual que se coordina con el grupo de calidad el proceso de preparación para la recertificación que se adelanta en el grupo operativo.

En el mes de agosto continuamos con el seguimiento de los contratos en ejecución revisando la reparación de cada uno de los equipos, también se realizó una revisión al proceso del almacén, iniciando con la actualización del inventario total, inventario que a su solicitud no se encontraba realizado, ni tampoco existía un histórico de los mismos, para esto se realizó la actualización del aplicativo del área del almacén y se pretende que en adelante se siga llevando el mismo actualizado y se pueda disponer en tiempo real de la información, se organizó los materiales del almacén dispuestos en diferentes bodegas a lo largo y ancho de talleres optando por concentrar todos estos en un sitio adecuado que permitiera el control y no hurto de los mismos, esto con el fin de tener una mejor custodia de estos elementos.

Se continuo con la realización del mejoramiento de las zonas verdes, corte y poda de las zonas verdes de talleres, ahora se hace posible el control de los materiales granulares, el continuo control por fumigación a eliminado bastante los vectores como ratas y zancudos. Razón por la cual hemos seguido realizando las intervenciones programadas cada fin de semana para la puesta a punto de todas

estas zonas, mejorando el aspecto de talleres y la salubridad para los trabajadores, de igual forma se está adelantando la gestión con Emcali para la recuperación y mantenimiento de la central eléctrica y cambio de las luminarias, diagnóstico realizado con nuestra profesional siso.

Se han realizado diferentes reuniones con el equipo de calidad en cabeza de la ING Sandra Milena Satizabal, con el fin de pulir y poner a punto el proceso de recertificación del proceso de mantenimiento vial y talleres, al mismo tiempo se ha acompañado el actual proceso de certificación de adoquines, se ha actualizado junto al equipo de calidad el diagrama de flujo de los procesos misionales de talleres y toda la gestión documental.

Se realizó la demarcación de las zonas para peatones, la demarcación vehicular, y también la demarcación de cada una de las zonas con importancia dentro de los talleres del Municipio.

El continuo seguimiento a la utilización de los EPP ha hecho que el personal opte conscientemente por la utilización de los elementos de protección del personal para garantizar la seguridad y bienestar de cada uno de nuestros trabajadores.

En el mes de septiembre se realizó el acompañamiento técnico a los otros si a los proyectos de mantenimiento y reparación, compra y adquisición de repuestos, esto consistió en el diagnóstico real mecánico de los automotores que son necesarios para la actividad de mantenimiento vial.

Se gestionó la dotación del sector de la vulcanizadora ya que se encuentra inactiva debido a la falta de elementos y se arregló el compresor que hace más de 4 años no funcionaba.

Se continúa la gestión de la mano del Ingeniero Ferney Camacho para la demarcación final de las áreas en talleres y con la ayuda del subsecretario de movilidad Henry Martin como líder de demarcación se logra dicha actividad para todo el área de talleres, punto de acceso y áreas comunes.

Se logra a través de la subsecretaria Ing Sandra Satizabal el curso técnico en laboratorio de suelos, técnico construcción en vías, para esto se realizaron las convocatorias a todo el personal y se logró solo la inscripción de 10 personas, en la actualidad dicho listado se entregó a la doctora Lina Mazuera contacto del SENA Salomia, a través del compañero Luber Orozco de la zona del Laboratorio se está adelantando la gestión para la consecución del curso de técnico en manejo de maquinaria amarilla dictado por el SENA, curso en el que ya hay registrados 35 personas.

Actualmente y por indicaciones de la subsecretaria se espera instrucción sobre esta nueva oferta de capacitación.

Se logró a través de los diagnósticos realizados a todos los equipos con la ayuda de empresas como Gecolsa e Ingemotores definir presupuesto necesario para la puesta en marcha de los equipos, generando un trabajo mancomunado con el secretario y la subsecretaria se asigna el presupuesto para iniciar el proceso de contratación de todos estos repuestos y reparación.

Se realizó por gestión propia el arreglo de 4 unidades de impregnación que se encontraban fuera de servicio por daños menores, se continuo con la capacitación para el personal operativo en la forma indicada para la aplicación, cargue, funcionamiento y mantenimiento de las unidades de impregnación, descripción de la emulsión asfáltica catiónica, tipos de emulsión, velocidad de rompimiento, viscosidad, resultados de los ensayos básicos de calidad.

Seguimos con los acercamiento con el personal de planta en el área de talleres, debido a los parámetros establecidos para la sana convivencia y aunar esfuerzos para sacar a talleres adelante y mostrarlo como un activo súper importante para la administración municipal, recobrando la confianza, evitando los robos, y generando mecanismos de control que posibilitaran el manejo adecuado de los recursos, bienes y servicios disponibles en los talleres del municipio.

Se siguieron atendiendo las diferentes y múltiples vicisitudes presentadas por parte del personal en lo referente a sus pagos, situación que se hace repetible con frecuencia y que genera malestar entre los trabajadores operativos del área de talleres. Esta atención consiste en escuchar primero a los compañeros, con el personal encargado de elaborar las cuentas, emitir fichas y RPC encontrar soluciones concertadas.

Con la implementación de normas como que El inspector recoge las planillas de su cuadrilla antes del 5 de cada mes, El inspector lleva registro y hace firmar a cada trabajador a su cargo a la entrega de la planilla, El inspector entrega el 6 de cada mes el registro firmado y las planillas del personal al área administrativa, El mismo día 6 todas las planillas son entregadas a los digitadores para la elaboración de las cuentas, Entre el 6 y el 10 deben ser elaboradas las cuentas, Del 10 al 14 de cada mes se deben firmar las cuentas por parte de los trabajadores, esta acción se realizara con la colaboración de los diferentes inspectores, El día 14 estas cuentas firmadas por los trabajadores deben de ser entregadas para la firma del secretario y posteriormente llevadas a hacienda.

Con estas sencillas normas se ha evitado la pérdida de tiempo de los trabajadores, el ausentismo laboral, efectividad en los pagos del personal y lógicamente se ha mejorado el ambiente laboral.

El trabajo de planificación, inicia con las proyecciones realizadas en las cuales se establecieron metas para intervenciones realizadas a lo largo de todo el año, este proceso de planificación incluyo cada uno de las diferentes variables a tenerse en

cuenta en el proceso de mantenimiento Vial, y en el mantenimiento de los equipos de talleres.

Se adelantó con los profesionales de calidad y la encargada de seguridad industrial un plan con actividades para adelantar el proceso de recertificación y actualmente de la mano del equipo se viene trabajando conforme a cronograma de trabajo.

Gestión Equipo de Laboratorio

El área total de los proyectos aprobados a los Urbanizadores particulares, en cumplimiento de las obligaciones Urbanísticas contraídas en las Licencias de Construcción y los conceptos técnicos permisos de rotura aprobados durante el periodo comprendido entre el 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2019.

URBANIZACIONES Y PARCELACIONES:

PROYECTOS	COSTO PROYECTO URBANIZADOR	INGRESOS AL MUNICIPIO POR SUPERVISION	AREA VIA FLEXIBLE M2	AREA VIA RIGIDO M2	AREA ANDEN MECEP ML
8	\$ 9.371.482.160	\$ 374.859.286	35.106,08	4.372,68	7.716,28

CONCEPTO TECNICOS PERMISO DE ROTURAS:

PERMISOS	ZONA ANDEN	AREA M2	ZONA VEHICULAR	AREA M2	PERFORADO
339	203	11.856,00	53	1.293,00	100

ENSAYOS Y ESTUDIOS LABORATORIO DE SUELOS:

ENSAYOS CONTROL	ESTUDIOS SUELOS	COSTO APROXIMADO
105	22	\$ 65.950.000

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION
PERMISOS TERCER TRIMESTRE AÑO 2019

COMUNAS	PERMISOS
COMUNA 1	0
COMUNA 2	53
COMUNA 3	2
COMUNA 4	7
COMUNA 5	22
COMUNA 6	6
COMUNA 7	0
COMUNA 8	0
COMUNA 9	12
COMUNA 10	33
COMUNA 11	10
COMUNA 12	4
COMUNA 13	11
COMUNA 14	0
COMUNA 15	0
COMUNA 16	1
COMUNA 17	10
COMUNA 18	20
COMUNA 19	78
COMUNA 20	3
COMUNA 21	9
COMUNA 22	7
OTROS PERMISOS	0
PERMISOS ROTURA DE ANDEN	203
PERMISOS ROTURA DE CALZADA	36
PERMISOS PERFORACION HORIZONTAL	100
EMCALI	7
GASES DE OCCIDENTE	10
VISITAS ROTURAS SIN PERMISO	7
COMUNIDAD Y OTROS OPERADORES	322
TOTAL PERMISOS	339

PROYECTO CORREDOR VERDE

CORREDOR VERDE FASE I - TRAMO 1 CRA 8 ENTRE CALLES 44 Y 70

CONTRATO N° 4151.0.26.1.785.2015**CONSORCIO CONSTRUCCIONES MJL**

Fecha terminación: 22 de septiembre de 2018 (con pendientes)

Valor Inicial	\$ 8.584'934.042
Adiciones	\$ 877'027.936
Valor Actualizado	\$ 9.461'961.978
Valor Acumulado a la fecha	\$ 8.071'438.899
Saldo contrato	\$ 1.390'523.079
Avance de ejecución de la obra	99%
Saldo por cancelar	\$ 800.000.000

El 1 % faltante hace referencia a:

Señalización fue ejecutada en acrílica, la zona de la cra 8 entre las cls 62 y 70 no ejecutada por el contratista fue ejecutada por la secretaria de movilidad.

EMCALI y el contratista están revisando y corrigiendo los defectos encontrados con la cámara de video con que se revisó, en los pases de alcantarillado construidos para el parque.

Compensaciones asignadas por el DAGMA, la entidad emitió el paz y salvo

Se firmó acta de recibo de manera unilateral.

CONTRATO N° 4151.0.26.1.823.2017**CONSORCIO CORREDOR VERDE IG 2017**

Valor Inicial	\$ 316'551.900
Adiciones	\$ 761'796.350
Valor Actualizado	\$ 1.078'348.250
Valor Acumulado a la fecha	\$ 892'922.450
Saldo por cancelar	\$ 8'734.600
Avance de ejecución de la obra	99%

CORREDOR VERDE FASE I - TRAMO 2 - CRA 8 ENTRE CALLES 26 Y 44

Contrato N° 4151.0.26.1.855.2015

Contratista: Consorcio Caliambiental

Saldo por cancelar: \$ 304'000.000

Contrato N° 4151.0.26.1.920.2015

Contratista: Medina y Rivera Ingenieros Asociados S.A.S

Saldo por cancelar: \$ 118.795.561

Consortio Cali ambiental contrato el estudio pendiente del que habla la resolución de compensación que trata sobre “árboles notables” de la ciudad, si el consorcio cumple con la documentación requerida (polizas del contrato y contrato por el valor de la resolución), el DAGMA entregara el paz y salvo a la secretaria de Infraestructura.

OBRAS COMPLEMENTARIAS CORREDOR VERDE - CRA 8 ENTRE CALLES 26 Y 70.

Contrato N.º 4151.010.26.1.1631.2019

Contratista: Héctor Jaime Ospina

Valor contrato: \$ 293.175.380

El contrato tiene por objeto realizar la instalación de juegos biosaludables frente al parque de la caña y en la plazoleta de la antigua planta de Bavaria. De igual forma se realizará la instalación de la madera plástica en las estructuras frente a la entrada principal del parque de la caña.

OTRAS ACTIVIDADES

INFORME CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS EMCALI EICE ESP Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI.

CONVENIO No.300-gaa-cic-297-2009

-OBJETO: aunar esfuerzos entre EMCALI EICE ESP Y el MUNICIPIO para realizar labores de rehabilitación de rehabilitación y el mantenimiento vial así como la reposición de redes de Alcantarillado y Acueducto que a juicio de EMCALI lo requiera, para los siguientes sectores: Calle 8 entre carreras 15 y 34, Calle 10 entre carreras 15 y 32; Calle 44 entre carreras 7 y 8 y Avenida 6ª entre calles 23N y 30N de la Ciudad de Santiago de Cali.

-VALOR DEL CONVENIO APORTADO POR EMCALI: \$3.856.000.000.

-VALOR APORTADO POR LA SI: \$12.072.482.315

-OTRO SI No. 1: OBJETO: Se incluye la carrera 38B entre calles 54 y 55ª de la Ciudad de Santiago de Cali dentro de las vías de redes que serán objeto de labores de rehabilitación y mantenimiento vial.

-VALOR OTRO SI APORTADO POR EMCALI: \$1.202.349.900.

-TOTAL VALOR APORTADO POR EMCALI: \$5.058.349.900.

En el expediente constan actas de liquidación de los contratos de obra de cada uno de los tramos pertenecientes al convenio, en las cuales se refleja un valor superior al establecido en el convenio, el total de las actas suman un valor de CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (5.727.745.289), para una diferencia a favor de la Secretaria por un valor de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (669.395.389).

Este valor no es reconocido por EMCALI dado que en oficio 300-GAA-406 dice que solo ha presentado soporte de obras por un valor de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (3.655.960.424), y se ha pedido que se envíen soportes por parte de la Secretaria que confirmen los valores establecidos en las actas.

En la cuenta No.165001843 de AV Villas correspondiente a este convenio hay un saldo a favor de \$ 96.789.390,40.

Se envió la información en digital de los contratos vía correo electrónico a la ingeniera Amparo Meléndez de Emcali, para hacer un cruce definitivo de cuentas, estos son los contratos 053-2009, 051 de 2009, 049 de 2009, 048 de 2009, 054 de 2009, 052 de 2009, 050 de 2009 y 001 de 2010. Igualmente en derecho de petición donde Emcali solicita la devolución de los saldos a favor se le enviara nuevamente la información para que se haga un nuevo cruce de cuentas y se establezca una conciliación en cuanto a los saldos.

CONVENIO 300-GAA-CIA-327-2010

-OBJETO: Aunar esfuerzos y recursos financieros por parte del MUNICIPIO y EMCALI para la ejecución de la REPOSICIÓN Y/O EXTENSIÓN DE REDES de servicios públicos domiciliarios que resulten comprometidas en la ejecución de varios proyectos de infraestructura que adelanta el MUNICIPIO en el área urbana de Santiago de Cali.

-OTROSI No. 1: donde se adiciono a la clausula segunda: DEL ALCANCE DEL OBJETO: adicionando al ítem 1 lo siguiente, Redes de servicios públicos: acueducto, alcantarillado, telecomunicaciones, energía, que serán utilizados para los proyectos de recuperación y mantenimiento vial que sean

acordados entre EMCALI EICE ESP Y MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
– SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y VALORIZACION.

-VALOR DEL CONVENIO APORTADO POR EMCALI: \$41.470.000.000.

-VALOR INICIAL PREVISTO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA:
29.670.000.000

-VALOR OTRO SI DEL CONVENIO POR EJECUTAR POR LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA: 11.889.447.000.

-VALOR DESEMBOLSADO A LA ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI:
27.000.000.

-VALOR EJECUTADO EN OBRAS CON CRUCE DE CUENTAS DATO
APORTADO POR EMCALI: 5.666.694.

De los 27.000.000 millones desembolsados se distribuyeron en tres secretarías, Deportes, Educación e Infraestructura, se enviarán mediante medio electrónico los contratos 003-10, 005-11 de obra y los de interventoría 295-11, 296-11 y 335-11, los cuales están relacionados a los dineros destinados a la Secretaría de Infraestructura, para realizar el cruce de cuentas correspondiente.

-CONVENIO No. 300-GAA-CONVENIO-755-2014

-OBJETO: Aunar esfuerzos entre EMCALI y el MUNICIPIO, para realizar labores de la expansión de redes de acueducto entre los tramos III y IV de la MEGA OBRA ampliación de la de la Carrera 80 y posterior pavimentación vial conforme a la competencia de cada entidad.

-VALOR DEL CONVENIO: \$395.043.291.

-VALOR EJECUTADO SEGÚN ACTA DE CRUCE DE CUENTAS:
\$252.167.319

-DIFERENCIA A DEVOLVER SEGÚN CLAUSULA 4, PARAGRAFO E:
\$142.875.972

-CONTRATISTA: CONCESIÓN VIAS DE CALI.

-INTERVENTOR: ALPHA S.A.S

Este convenio cuenta con un acta de terminación de obra, así como de cruce de cuentas del 6 de octubre de 2015 firmado por OMAR JESUS CANTILLO PERDONO Secretario de Infraestructura y Valorización Municipal y JULIÁN

LORA BORRERO Gerente UEN Acueducto y Alcantarillado EMCALI E.I.C.E-E.S.P. por un valor de \$252.167.319.

En la cuenta No. 95010023220 correspondiente a este convenio hay un saldo por valor de \$88.634.588.

Este convenio tiene un cruce de cuentas por parte de Emcali y la Secretaria, en conversaciones con Emcali se ha hablado de un contrato de transacción para este y otros convenios con los dineros que se encuentran en las cuentas de estos y los saldos a favor de Emcali.

CONVENIO 300-GAA-CONVENIO-0644-2014

-OBJETO: Aunar esfuerzos entre EMCALI y el MUNICIPIO, para realizar labores de rehabilitación y mantenimiento vial, al igual que la reposición de redes de Alcantarillado y acueducto de la carrera 2 A Oeste desde la calle 7 Oeste hasta el número 7-185.

-VALOR DEL CONVENIO: \$371.084.266.

-CONTRATO DE OBRA No. 4151.0.26.281.2014

-VALOR EJECUTADO SEGÚN ACTA DE CRUCE DE CUENTAS: \$339.619.505.

-DIFERENCIA A FAVOR DE EMCALI: \$31.464.761

-CONTRATISTA: ALVARO HERNAN HORMAZA SARRIA.

-SUPERVISORA: AMPARO CHAVEZ ZAPATA.

Este convenio cuenta con acta de recibo final de obra del 10 de diciembre de 2014 y acta de liquidación del 24 de abril del 2015, así como un cruce de cuentas suscrito por funcionarios de EMCALI donde hay una diferencia de \$31.464.761.

En la cuenta No. 95010022940 de GNB SUDAMERIS correspondiente a este convenio hay un saldo por valor de \$13.823.725

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.300-GAA-CIA-0712-2015

-OBJETO: Aunar esfuerzos entre EMCALI y el MUNICIPIO, para realizar labores de reposiciones de pavimento en la zona de ladera del Municipio de Santiago de Cali, comuna 20, en las siguientes direcciones: calle 11W entre 45W y carrera 47 W, barrio Siloé; calle 12W entre carreras 46W y 48W, barrio La Sultana; Calle 23W entre carreras 46A y 49 B Bis W, barrio Belén; carrera 46 BW entre calles 11W y 12 W, barrio Lleras Camargo; carrera 50 entre calle

4W y calle 6AW, barrio Siloé; carrera 51W entre calle 13AW y calle 13BW, Barrio Lleras Camargo; así como pavimentación vial.

-VALOR DEL CONVENIO: \$663.282.497

-VALOR EJECUTADO: \$544.240.267

-VALOR SALDO A FAVOR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA: \$119.042.230 SIN DEDUCCIONES.

-SALDO EN LA CUENTA DEL CONVENIO SEGÚN EMCALI: \$78.789.785 mas \$2.890.917 de rendimientos financieros.

EMCALI ha enviado comunicación pidiendo No. de cuenta para enviar el saldo a favor del la Secretaria, pero no se ha logrado firmar un acta de liquidación, aunque se encuentra un borrador de estas firmado por EMCALI pero donde no se define el traslado de los saldos a favor del Municipio.

En el informe que dejo la Abogada DIANA MARIA GONZALEZ ESCOBAR se encuentran unas deducciones por \$43.143.362 que en el expediente no se registran, además que fue incluida LA CALLE 23AW ENTRE AVENIDAS 6 Y 7, pero esta vía no estaba incluida en el objeto del convenio.

Este convenio será uno de los incluidos en la transacción para su liquidación.

CONVENIO No.300-GAA-CIA-606-2015

-OBJETO: Aunar esfuerzos entre EMCALI y el MUNICIPIO, para realizar labores de reposiciones del acueducto y alcantarillado así como la pavimentación vial en la Calle 72I entre Carreras 28D3 y 28E, Calle 72I entre Carreras 28D y 28D3 y Calle 72I entre Carreras 28ª y 28D del Barrio Comuneros en la Comuna 13; Carrera 28D2 entre Calles 83 y 96ª del barrio Mojica en la Comuna 15.

VALOR DEL CONVENIO: \$635.000.000

CONTRATO DE OBRA No. 4151.1.14.26.005.10

VALOR ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA: \$445.600.858

DIFERENCIA A FAVOR DE EMCALI: \$ 189.399.142.

El convenio tiene un acta de recibo final, firmada por los contratistas el supervisor por parte de EMCALI ingeniero JOSE HUMBERTO BEDOYA y el Ingeniero CARLOS ANDRES FERNANDEZ ILLERA como supervisor por parte de la Secretaria de Infraestructura, donde se verifica los valores antes señalados.

En la cuenta No. 484451836 del BANCO DE BOGOTA correspondiente a este convenio hay un saldo por valor de \$266.510.770.

Este convenio se pidió siguiera en ejecución por parte de los supervisores de EMCALI y la Secretaria de Infraestructura por lo tanto no se liquidara por el momento.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 300-GAA-CIA-607-2015

-OBJETO: Aunar esfuerzos entre EMCALI y el MUNICIPIO, para realizar labores de reposiciones del acueducto y alcantarillado en la Carrera 40 entre Calles 30 A y 31 del Barrio Ciudad Modelo; así como la posterior pavimentación vial conforme las competencias de cada entidad.

-VALOR DEL CONVENIO: 212.425.755

-CONTRATO DE OBRA No. 4151.0.26.554 de 2014

-VALOR EJECUTADO: 182.823.699

-DIFERENCIA A FAVOR DE EMCALI: 29.602.056

En el expediente se encuentra acta de recibo final de obra y acta de liquidación de contrato, igualmente un acta de liquidación del convenio firmada por los representantes de EMCALI y por parte de la secretaria OCTAVIO RAMIREZ CUARTAS como Subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial, con fecha del 14 de junio de 2017.

En la cuenta No. 95010023830 de GNB SUDAMERIS correspondiente a este convenio hay un saldo por valor de \$8.020.279.

Este convenio será uno de los incluidos en la transacción para su liquidación.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 300-GAA-CIA 608-2015

-OBJETO: Aunar esfuerzos entre EMCALI y el MUNICIPIO, para realizar labores de reposiciones del acueducto en la Carrera 8 entre Calles 26 y 73 de la Ciudad de Santiago de Cali; así como la posterior pavimentación vial conforme a las competencias de cada entidad.

-VALOR DEL CONVENIO: \$235.000.000

A EMCALI fueron enviadas las actas de recibo final de obra para que se haga un debido cruce de cuentas, pero según lo estimado por parte de EMCALI no hay saldo a favor.

En la cuenta No. 95010023820 de GNB SUDAMERIS correspondiente a este convenio hay un saldo por valor de \$37.178.171.

Este convenio será uno de los incluidos en la transacción para su liquidación.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 300 GAA-CONVENIO-760-2014

-OBJETO: Aunar esfuerzos entre EMCALI y el MUNICIPIO, para realizar labores de reposiciones de acueducto y alcantarillado en la Carrera 6 y 6ª del Barrio Jorge Isaac; Calle 11 entre Carreras 5/6 del Barrio San Pedro; carrera 36 entre calles 29/31; calle 30 entre carreras 36/36 A; Calle 31 entre Carreras 36/39 del Barrio San Carlos; Carrera 40ª entre Calle 29 y Diagonal 28C; Calle 32 Bis entre Carrera 40 /40ª del Barrio Ciudad Modelo y Calle 27B entre carrera 11G entre Calle 27/28 del Barrio Benjamín Herrera; así como la posterior pavimentación vial conforme las competencias de cada entidad.

-VALOR DEL CONVENIO: 2.257.307.159

A EMCALI fueron enviadas las actas de recibo final de obra para que se haga un debido cruce de cuentas hasta la fecha, para establecer la cantidad del dinero invertido en obras referentes al convenio, este convenio no se liquidara todavía por petición de los supervisores de EMCALI y la Secretaria, dado que hay obras de reposición las cuales todavía no se han realizado.

En la cuenta No. 95010023300 de GNB SUDAMERIS correspondiente a este convenio hay un saldo por valor de \$1.925.995.549.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4151.010.27.0.0001.2017

-OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EMCALI Y EL MUNICIPIO PARA LA REHABILITACIÓN VIAL DE LA CALLE 25 NORTE ENTRE AVENIDAS 7N Y 9N DEL BARRIO SANTA MÓNICA, INCLUYENDO LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CONFORME A LAS COMPETENCIAS Y RECURSOS DE CADA ENTIDAD.

VALOR DEL CONVENIO APORTADO POR EMCALI: 311.509.466

Tiene acta de suspensión hasta el 30 de noviembre de 2019, el supervisor del convenio el ingeniero HUGO ALONSO BOHORQUEZ NIÑO afirma que este ya se reanuda, pero no ha informada desde que fecha y las causas de la reanudación anticipada.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4151.010.27.0.0002.2017

-OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EMCALI Y EL MUNICIPIO, PARA REALIZAR LABORES DE REPOSICIONES DEL ALCANTARILLADO Y/O ACUEDUCTO Y LA POSTERIOR REHABILITACIÓN VIAL EN LAS VÍAS DESCRITAS EN EL CUADRO NO. 1 DE LA COMUNA 7 DEL BARRIO ALFONSO LÓPEZ. B). ALCANCE DEL OBJETO: EMCALI EJECUTARÁ LAS OBRAS DE REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y/O ACUEDUCTO Y ASÍ COMO TAMBIÉN LA REHABILITACIÓN VIAL EN LAS VÍAS DE LA COMUNA 7 BARRIO ALFONSO LÓPEZ, CONFORME A LAS VÍAS DESCRITAS EN EL CUADRO NO. 1.

VALOR DEL CONVENIO APORTADO POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA: 2.638.550.344

Tiene un acta de ampliación hasta el 31 de mayo de 2019, se hablo con los supervisores de EMCALI para que envíen la información para una posible prórroga dado que ellos son los encargados de la contratación de las obras, el encargado del convenio, el supervisor del convenio es el ING. FERNANDO PAZ MERA el cual es el encargado de tramitar los documentos con el supervisor de emcali.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4151.010.27.0.0003.2017

-OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EMCALI Y EL MUNICIPIO, PARA REALIZAR LABORES DE REPOSICIONES DEL ALCANTARILLADO Y/O ACUEDUCTO Y LA POSTERIOR PAVIMENTACIÓN VIAL EN LAS VÍAS DESCRITAS EN EL NUMERAL 2 - CUADRO NO. 1 DE LAS COMUNA 1 Y 20 DE SANTIAGO DE CALI. B). ALCANCE DEL OBJETO: EMCALI EJECUTARÁ LAS OBRAS DE REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y/O ACUEDUCTO Y ASÍ COMO TAMBIÉN LA REHABILITACIÓN VIAL EN LAS VÍAS DE LAS COMUNA 1 Y 20 DE SANTIAGO DE CALI, CONFORME A LAS VÍAS DESCRITAS EN EL CUADRO NO.1

VALOR DEL CONVENIO APORTADO POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA: 1.078.622.299

Tiene un acta de ampliación hasta el 14 de abril de 2019, se habló con los supervisores de EMCALI para que envíen la información para una posible prórroga dado que ellos son los encargados de la contratación de las obras. el supervisor del convenio es el ING. LEOPOLDO DIAZ GARCIA el cual es el encargado de tramitar los documentos con el supervisor de EMCALI.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4151.010.27.0.0004.2017

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EMCALI Y EL MUNICIPIO, PARA REALIZAR LABORES DE REPOSICIONES DEL ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LA POSTERIOR REHABILITACIÓN VIAL EN LA CALLE 14 ENTRE CARRERA 106 Y CALLE 15 DEL BARRIO CIUDAD JARDÍN COMUNA 22.

VALOR DEL CONVENIO APORTADO POR EMCALI:399.163.190

Según la información del supervisor el ING. CARLOS ANDRES FERNANDEZ ILLERA, las obras referentes al convenio están en proceso de entrega por lo tanto se espera mas información del supervisor para proceder con la liquidación de este.

ACTIVIDADES DE APOYO A LAS LABORES DE LIBERACIÓN DE TERRENOS EN PROCESOS DE REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS UBICADOS EN EL SECTOR DEL PLAN JARILLON RÍO CAUCA

VIGENCIA 2019

La Secretaria de Infraestructura realizó el apoyo a las labores de liberación de terrenos en procesos de reubicación de asentamientos humanos ubicados en el

sector del Plan Jarillón Rio Cauca, en el desarrollo de las actividades acorde a los términos contenidos en el Convenio Interadministrativo No.016 de 2.017 derivado del Convenio Marco interadministrativo de Cooperación y Apoyo Financiero No. 001 de 2.015. Suscrito entre el Municipio de Santiago de Cali y el Fondo de Adaptación".

La Secretaría de Infraestructura durante el tercer trimestre del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2019 ha brindado apoyo a la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres a través del Grupo Operativo, le correspondió en pleno realizar las actividades de demolición, recuperación, adecuación, y liberación de zonas ocupadas de las zonas objeto de reposición en los sectores Brisas del Cauca, Navarro, Nueva Florida, Polo, Puerto Nuevo, Samanes, Villa Uribe, La Florida y La Playita, actividades que fueron ejecutadas por el equipo operativo adscrito a la dependencia, conformado por 2 cuadrillas de trabajadores y operarios de maquinaria y equipo (aprox. 48 personas), se contó con 1 retroexcavadora de ruedas y dos camiones de 5.6 ton capacidad de carga, necesarios para la ejecución de los trabajos.

Es de tener en cuenta que la ejecución de los trabajos se realizaban una vez las condiciones legales y técnicas estuvieran dadas. Se realizó la demolición de ciento cincuenta y dos (152) techos y se contó con el apoyo de EMCALI Acueducto y Energía para el retiro de redes hidrosanitarias y eléctricas, es así como se logró ejecutar 24.699,40 m2 en techos demolidos en el tercer trimestre del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2019.

El siguiente cuadro contiene la información de No. de techo, lugar AHDI, sector, estado de techos, fecha de demolición, área demolida (m2) y metros lineales, de la base de datos del Plan Jarillón de Cali que se encuentran en el marco del proyecto, durante el tercer trimestre del año 2019:

TECHO	AHDI	SECTOR	ESTADO_TECHOS	FECHA DEMOLICIÓN	MES DE DEMOLICIÓN	AREA (mt^2)	METROS LINEALES(FRENTE)	OBSERVACION
2176	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	02/07/2019	7	343,11	8	VOLUNTARIO
2290	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	04/07/2019	7	304,19	8	VOLUNTARIO
2238	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	05/07/2019	7	143,40	5	VOLUNTARIO
2175	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	09/07/2019	7	380,90	9	VOLUNTARIO
2243	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	10/07/2019	7	110,20	4	VOLUNTARIO
2049	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	11/07/2019	7	217,44	0	VOLUNTARIO
2053	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	11/07/2019	7	59,44	4	VOLUNTARIO
2125	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	11/07/2019	7	146,37	7	VOLUNTARIO
2184	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	11/07/2019	7	38,81	0	VOLUNTARIO
2185	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	11/07/2019	7	36,65	0	VOLUNTARIO
2186	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	11/07/2019	7	52,21	0	VOLUNTARIO
2068	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	12/07/2019	7	94,49	7	VOLUNTARIO
2272	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	15/07/2019	7	107,53	5	VOLUNTARIO
2067	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	16/07/2019	7	280,71	22	VOLUNTARIO
2309	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	16/07/2019	7	71,30	5	VOLUNTARIO
225	VILLA URIBE	LAGUNAS	DEMOLIDO	17/07/2019	7	29,91	0	VOLUNTARIO
574	NUEVA FLORIDA	LAGUNAS	DEMOLIDO	17/07/2019	7	80,43	0	VOLUNTARIO
580	NUEVA FLORIDA	LAGUNAS	DEMOLIDO	17/07/2019	7	28,27	0	VOLUNTARIO
671	NUEVA FLORIDA	LAGUNAS	DEMOLIDO	17/07/2019	7	25,07	0	VOLUNTARIO
762	NUEVA FLORIDA	LAGUNAS	DEMOLIDO	17/07/2019	7	37,50	0	VOLUNTARIO
2221	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	17/07/2019	7	271,26	7	VOLUNTARIO
2307	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	17/07/2019	7	231,64	6	VOLUNTARIO
2048	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	18/07/2019	7	1975,28	24	VOLUNTARIO
2177	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	18/07/2019	7	251,60	8	VOLUNTARIO
2208	NAVARRO	JARILLÓN	RESTITUIDO	19/07/2019	7	446,46	11	RESTITUIDO
539	NUEVA FLORIDA	LAGUNAS	DEMOLIDO	23/07/2019	7	59,68	0	VOLUNTARIO
2168	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	23/07/2019	7	338,52	8	VOLUNTARIO
2234	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	23/07/2019	7	304,73	0	VOLUNTARIO
2332	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	23/07/2019	7	100,57	0	VOLUNTARIO
2145	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	24/07/2019	7	1434,44	15	VOLUNTARIO
2180	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	24/07/2019	7	787,64	21	VOLUNTARIO

TECHO	AHDI	SECTOR	ESTADO_TECHOS	FECHA DEMOLICIÓN	MES DE DEMOLICIÓN	AREA (mt ²)	METROS LINEALES(FRENTE)	OBSERVACION
2133	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	25/07/2019	7	71,95	0	VOLUNTARIO
2149	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	25/07/2019	7	1611,55	8	VOLUNTARIO
2202	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	25/07/2019	7	239,46	6	VOLUNTARIO-PROCESO RESTITUCION
2642	LA PLAYITA	JARILLÓN	DEMOLIDO	25/07/2019	7	85,14	0	VOLUNTARIO
2645	LA PLAYITA	JARILLÓN	DEMOLIDO	25/07/2019	7	15,82	0	VOLUNTARIO
2646	LA PLAYITA	JARILLÓN	DEMOLIDO	25/07/2019	7	18,69	0	VOLUNTARIO
2647	LA PLAYITA	JARILLÓN	DEMOLIDO	25/07/2019	7	15,69	0	VOLUNTARIO
2667	LA PLAYITA	JARILLÓN	DEMOLIDO	25/07/2019	7	36,71	0	VOLUNTARIO
2682	LA PLAYITA	JARILLÓN	DEMOLIDO	25/07/2019	7	109,08	0	VOLUNTARIO
2683	LA PLAYITA	JARILLÓN	DEMOLIDO	25/07/2019	7	49,31	0	VOLUNTARIO
2685	LA PLAYITA	JARILLÓN	DEMOLIDO	25/07/2019	7	41,63	0	VOLUNTARIO
2694	LA PLAYITA	JARILLÓN	DEMOLIDO	25/07/2019	7	52,42	0	VOLUNTARIO
2699	LA PLAYITA	JARILLÓN	DEMOLIDO	25/07/2019	7	100,96	0	VOLUNTARIO
2722	LA PLAYITA	JARILLÓN	DEMOLIDO	25/07/2019	7	27,22	0	VOLUNTARIO
2732	LA PLAYITA	JARILLÓN	DEMOLIDO	25/07/2019	7	92,83	0	VOLUNTARIO
2747	LA PLAYITA	JARILLÓN	DEMOLIDO	25/07/2019	7	48,09	0	VOLUNTARIO
2748	LA PLAYITA	JARILLÓN	DEMOLIDO	25/07/2019	7	35,59	0	VOLUNTARIO
2756	LA PLAYITA	JARILLÓN	DEMOLIDO	25/07/2019	7	65,47	0	VOLUNTARIO
2757	LA PLAYITA	JARILLÓN	DEMOLIDO	25/07/2019	7	73,95	0	VOLUNTARIO
2165	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	26/07/2019	7	528,74	13	VOLUNTARIO
2181	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	30/07/2019	7	262,94	7	VOLUNTARIO
2981	PUERTO NUEVO	JARILLÓN	DEMOLIDO	30/07/2019	7	65,16	0	VOLUNTARIO
2983	PUERTO NUEVO	JARILLÓN	DEMOLIDO	30/07/2019	7	54,64	0	VOLUNTARIO
2174	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	31/07/2019	7	255,75	7	VOLUNTARIO
2230	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	31/07/2019	7	66,17	5	VOLUNTARIO
3472	BRISAS DEL CAUCA	JARILLÓN	DEMOLIDO	01/08/2019	8	73,81	5	VOLUNTARIO-PROCESO RESTITUCION
3522	BRISAS DEL CAUCA	JARILLÓN	DEMOLIDO	01/08/2019	8	157,93	5	VOLUNTARIO-PROCESO RESTITUCION
2960	PUERTO NUEVO	JARILLÓN	DEMOLIDO	02/08/2019	8	87,02	0	VOLUNTARIO-PROCESO RESTITUCION
3150	BRISAS DEL CAUCA	JARILLÓN	DEMOLIDO	02/08/2019	8	95,28	5	VOLUNTARIO-PROCESO RESTITUCION
3462	BRISAS DEL CAUCA	JARILLÓN	DEMOLIDO	02/08/2019	8	179,80	3	VOLUNTARIO-PROCESO RESTITUCION
2187	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	05/08/2019	8	45,44	0	VOLUNTARIO

TECHO	AHDI	SECTOR	ESTADO_TECOS	FECHA DEMOLICIÓN	MES DE DEMOLICIÓN	AREA (mt ²)	METROS LINEALES(FRENTE)	OBSERVACION
2331	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	06/08/2019	8	53,67	0	VOLUNTARIO
2169	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	08/08/2019	8	189,70	5	VOLUNTARIO
2227	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	08/08/2019	8	250,25	5	VOLUNTARIO
2303	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	08/08/2019	8	288,41	7	VOLUNTARIO
2315	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	08/08/2019	8	159,73	1	VOLUNTARIO
2959	PUERTO NUEVO	JARILLÓN	DEMOLIDO	09/08/2019	8	77,11	0	VOLUNTARIO
2962	PUERTO NUEVO	JARILLÓN	DEMOLIDO	09/08/2019	8	67,49	0	VOLUNTARIO
2967	PUERTO NUEVO	JARILLÓN	DEMOLIDO	09/08/2019	8	41,23	0	VOLUNTARIO
2188	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	13/08/2019	8	62,20	0	VOLUNTARIO
2194	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	13/08/2019	8	274,46	20	VOLUNTARIO
2193	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	15/08/2019	8	27,47	0	VOLUNTARIO
2197	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	15/08/2019	8	294,30	7	VOLUNTARIO
2791	PUERTO NUEVO	JARILLÓN	EXPROPIADO	15/08/2019	8	47,50	(+4)	EXPROPIACION
2129	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	16/08/2019	8	345,15	13	VOLUNTARIO
2137	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	21/08/2019	8	328,82	0	VOLUNTARIO
3030	PUERTO NUEVO	JARILLÓN	DEMOLIDO	21/08/2019	8	69,13	0	VOLUNTARIO
3031	PUERTO NUEVO	JARILLÓN	DEMOLIDO	21/08/2019	8	49,57	0	VOLUNTARIO
177	VILLA URIBE	LAGUNAS	DEMOLIDO	22/08/2019	8	57,32	0	VOLUNTARIO
331	LA FLORIDA	LAGUNAS	DEMOLIDO	22/08/2019	8	67,22	0	VOLUNTARIO
408	LA FLORIDA	LAGUNAS	DEMOLIDO	22/08/2019	8	36,29	0	VOLUNTARIO
537	NUEVA FLORIDA	LAGUNAS	DEMOLIDO	22/08/2019	8	63,54	0	VOLUNTARIO
568	NUEVA FLORIDA	LAGUNAS	DEMOLIDO	22/08/2019	8	61,77	0	VOLUNTARIO
684	NUEVA FLORIDA	LAGUNAS	DEMOLIDO	22/08/2019	8	52,57	0	VOLUNTARIO
907	POLO	LAGUNAS	DEMOLIDO	22/08/2019	8	56,85	0	VOLUNTARIO
591	NUEVA FLORIDA	LAGUNAS	DEMOLIDO	23/08/2019	8	21,24	0	VOLUNTARIO
641	NUEVA FLORIDA	LAGUNAS	DEMOLIDO	23/08/2019	8	49,82	0	VOLUNTARIO
705	NUEVA FLORIDA	LAGUNAS	DEMOLIDO	23/08/2019	8	46,42	0	VOLUNTARIO
784	NUEVA FLORIDA	LAGUNAS	DEMOLIDO	23/08/2019	8	60,18	0	VOLUNTARIO
2643	LA PLAYITA	JARILLÓN	DEMOLIDO	23/08/2019	8	75,34	0	VOLUNTARIO
2122	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	27/08/2019	8	416,06	7	VOLUNTARIO
2862	PUERTO NUEVO	JARILLÓN	DEMOLIDO	27/08/2019	8	110,89	0	VOLUNTARIO

TECHO	AHDI	SECTOR	ESTADO_TECOS	FECHA DEMOLICIÓN	MES DE DEMOLICIÓN	AREA (mt ²)	METROS LINEALES(FRENTE)	OBSERVACION
435	LA FLORIDA	LAGUNAS	DEMOLIDO	28/08/2019	8	98,37	0	VOLUNTARIO
552	NUEVA FLORIDA	LAGUNAS	DEMOLIDO	28/08/2019	8	92,16	0	VOLUNTARIO
579	NUEVA FLORIDA	LAGUNAS	DEMOLIDO	28/08/2019	8	33,56	0	VOLUNTARIO
1040	POLO	LAGUNAS	DEMOLIDO	28/08/2019	8	60,51	0	VOLUNTARIO
2957	PUERTO NUEVO	JARILLÓN	DEMOLIDO	29/08/2019	8	71,21	0	VOLUNTARIO
2964	PUERTO NUEVO	JARILLÓN	DEMOLIDO	29/08/2019	8	69,79	4	VOLUNTARIO
2986	PUERTO NUEVO	JARILLÓN	DEMOLIDO	29/08/2019	8	77,33	0	VOLUNTARIO
2302	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	30/08/2019	8	315,19	9	VOLUNTARIO
2789	PUERTO NUEVO	JARILLÓN	DEMOLIDO	30/08/2019	8	104,02	(+8)	VOLUNTARIO
3199	BRISAS DEL CAUCA	JARILLÓN	DEMOLIDO	30/08/2019	8	70,77	0	VOLUNTARIO
3475	BRISAS DEL CAUCA	JARILLÓN	DEMOLIDO	30/08/2019	8	373,50	6	VOLUNTARIO-PROCESO RESTITUCION
3491	BRISAS DEL CAUCA	JARILLÓN	DEMOLIDO	30/08/2019	8	208,33	7	VOLUNTARIO-PROCESO RESTITUCION
3577	BRISAS DEL CAUCA	JARILLÓN	RESTITUIDO	30/08/2019	8	327,71	7	RESTITUIDO
2261	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	03/09/2019	9	86,79	0	VOLUNTARIO
2337	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	04/09/2019	9	168,56	16	VOLUNTARIO
2716	LA PLAYITA	JARILLÓN	DEMOLIDO	05/09/2019	9	99,95	0	VOLUNTARIO
2720	LA PLAYITA	JARILLÓN	DEMOLIDO	05/09/2019	9	39,48	0	VOLUNTARIO
3444	BRISAS DEL CAUCA	JARILLÓN	DEMOLIDO	05/09/2019	9	283,13	5	VOLUNTARIO
258	VILLA URIBE	LAGUNAS	DEMOLIDO	06/09/2019	9	30,34	0	VOLUNTARIO
2882	PUERTO NUEVO	JARILLÓN	DEMOLIDO	06/09/2019	9	93,05	0	VOLUNTARIO
3182	BRISAS DEL CAUCA	JARILLÓN	DEMOLIDO	06/09/2019	9	74,70	0	VOLUNTARIO-PROCESO RESTITUCION
3210	BRISAS DEL CAUCA	JARILLÓN	RESTITUIDO	06/09/2019	9	91,99	7	RESTITUIDO
3497	BRISAS DEL CAUCA	JARILLÓN	DEMOLIDO	06/09/2019	9	160,92	5	VOLUNTARIO-PROCESO RESTITUCION
3574	BRISAS DEL CAUCA	JARILLÓN	DEMOLIDO	06/09/2019	9	189,23	4	VOLUNTARIO
3112	PUERTO NUEVO	JARILLÓN	DEMOLIDO	09/09/2019	9	169,06	4	VOLUNTARIO
2225	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	11/09/2019	9	218,71	6	VOLUNTARIO
2226	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	11/09/2019	9	226,58	6	VOLUNTARIO
2420	SAMANES	JARILLÓN	DEMOLIDO	11/09/2019	9	230,77	16	VOLUNTARIO
3323	BRISAS DEL CAUCA	JARILLÓN	DEMOLIDO	11/09/2019	9	52,67	0	VOLUNTARIO
3324	BRISAS DEL CAUCA	JARILLÓN	DEMOLIDO	11/09/2019	9	36,85	0	VOLUNTARIO
2734	LA PLAYITA	JARILLÓN	DEMOLIDO	12/09/2019	9	125,53	0	VOLUNTARIO

TECHO	AHDI	SECTOR	ESTADO_Techos	FECHA DEMOLICIÓN	MES DE DEMOLICIÓN	AREA (mt ²)	METROS LINEALES(FRENTE)	OBSERVACION
2874	PUERTO NUEVO	JARILLÓN	DEMOLIDO	12/09/2019	9	115,47	0	VOLUNTARIO
2883	PUERTO NUEVO	JARILLÓN	DEMOLIDO	12/09/2019	9	42,78	0	VOLUNTARIO
2899	PUERTO NUEVO	JARILLÓN	DEMOLIDO	12/09/2019	9	98,79	0	VOLUNTARIO
2900	PUERTO NUEVO	JARILLÓN	DEMOLIDO	12/09/2019	9	117,30	0	VOLUNTARIO
2921	PUERTO NUEVO	JARILLÓN	DEMOLIDO	12/09/2019	9	119,50	0	VOLUNTARIO
3069	PUERTO NUEVO	JARILLÓN	DEMOLIDO	12/09/2019	9	91,66	0	VOLUNTARIO
3093	PUERTO NUEVO	JARILLÓN	DEMOLIDO	12/09/2019	9	96,78	0	VOLUNTARIO
2498	SAMANES	JARILLÓN	RESTITUIDO	13/09/2019	9	557,06	14	RESTITUIDO
547	NUEVA FLORIDA	LAGUNAS	DEMOLIDO	18/09/2019	9	109,54	0	VOLUNTARIO
593	NUEVA FLORIDA	LAGUNAS	DEMOLIDO	18/09/2019	9	21,07	0	VOLUNTARIO
621	NUEVA FLORIDA	LAGUNAS	DEMOLIDO	18/09/2019	9	42,44	0	VOLUNTARIO
714	NUEVA FLORIDA	LAGUNAS	DEMOLIDO	18/09/2019	9	53,52	0	VOLUNTARIO
765	NUEVA FLORIDA	LAGUNAS	DEMOLIDO	18/09/2019	9	35,67	0	VOLUNTARIO
2878	PUERTO NUEVO	JARILLÓN	DEMOLIDO	19/09/2019	9	125,75	0	VOLUNTARIO
2898	PUERTO NUEVO	JARILLÓN	DEMOLIDO	19/09/2019	9	127,01	0	VOLUNTARIO
2966	PUERTO NUEVO	JARILLÓN	DEMOLIDO	19/09/2019	9	62,97	0	VOLUNTARIO
963	POLO	LAGUNAS	DEMOLIDO	23/09/2019	9	64,77	0	VOLUNTARIO
2922	PUERTO NUEVO	JARILLÓN	DEMOLIDO	23/09/2019	9	77,38	0	VOLUNTARIO
676	NUEVA FLORIDA	LAGUNAS	DEMOLIDO	24/09/2019	9	30,15	0	VOLUNTARIO
934	POLO	LAGUNAS	DEMOLIDO	24/09/2019	9	107,48	0	VOLUNTARIO
2927	PUERTO NUEVO	JARILLÓN	DEMOLIDO	24/09/2019	9	48,93	0	VOLUNTARIO
2934	PUERTO NUEVO	JARILLÓN	DEMOLIDO	24/09/2019	9	137,76	0	VOLUNTARIO
261	VILLA URIBE	LAGUNAS	DEMOLIDO	25/09/2019	9	28,47	0	VOLUNTARIO
2935	PUERTO NUEVO	JARILLÓN	DEMOLIDO	25/09/2019	9	57,00	0	VOLUNTARIO
2508	SAMANES	JARILLÓN	DEMOLIDO	26/09/2019	9	496,52	11	VOLUNTARIO-PROCESO RESTITUCION
2336	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	27/09/2019	9	49,75	6	VOLUNTARIO
2260	NAVARRO	JARILLÓN	DEMOLIDO	30/09/2019	9	79,00	0	VOLUNTARIO
2816	PUERTO NUEVO	JARILLÓN	DEMOLIDO	30/09/2019	9	168,47	0	VOLUNTARIO

El siguiente cuadro contiene la información de Lugar AHDI, Cantidad de techos demolidos, Metros lineales liberados y Área (m²), que se realizó en la respectiva demolición de techos, durante el tercer trimestre del año 2019.

LISTADO GENERAL DE TECHOS DEMOLIDOS DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			
AHDI	Cantida de Techos Demolidos	Metros Lineales Liberados	AREA (mt^2) Liberados
BRISAS DEL CAUCA	15	59	2376,62
NAVARRO	52	338	15445,68
NUEVA FLORIDA	20	0	1004,59
POLO	4	0	289,61
PUERTO NUEVO	31	8	2741,73
SAMANES	3	41	1284,35
VILLA URIBE	4	0	146,04
LA FLORIDA	3	0	201,88
LA PLAYITA	20	0	1208,90
Total general	152	446	24699,40

VALIDACION DE RECURSOS

En la Valoración de esta actividad se incluyó los siguientes componentes: costo de mano de obra por total de operarios y/o oficiales calculado en hora/hombre y costo de utilización de cada equipo y/o maquinaria de manera proporcional al área demolida.

ANALISIS UNITARIO				
DEMOLICION DE EDIFICACIONES EXISTENTES			Unidad =	M2
1.0 Insp + 4.0 Op + 18.0 Ob (Jornada de 8 Horas)				
ACTIVIDAD	UND	CANT	VR/UNITARIO	VR/TOTAL
MANO de OBRA				7.679
INSPECTOR	HH	0,10	12.481	1.248
OPERARIOS (4) (Retroexcavadora, Camiones)	HH	0,35	11.220	3.927
OBREROS (18)	HH	0,25	10.015	2.504
EQUIPO				17.707
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	HM	0,006	85.000	510
HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)	%	1%	7.700	77
VOLQUETA	HM	0,08	72.000	5.760
CAMION (1)	HM	0,16	71.000	11.360
VALOR TOTAL M2				25.386

Se realiza la validación de recursos por un total de \$ 627.018.935 seiscientos veintisiete millones dieciocho mil novecientos treinta y cinco M/CTE

ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Demolición	M2	24699,40	\$ 25.386	\$ 627.018.935

CARRETEABLE PUENTE CANAL CVC JARILLÓN CORREGIMIENTO DE NAVARRO

Lo referente a los trabajos realizados por parte de la Secretaría de Infraestructura en el sector del Jarillón Corregimiento de Navarro, se tiene como primera instancia una visita de campo para conocer el sitio y verificar técnicamente la solución a tener en cuenta para

realizar el remontaje de la vía que se encuentra por la corona del jarillón, la propuesta a este tema fue la construcción de un carreteable provisional pegado al jarillón y sobre la pata del mismo, planteando el levantamiento de la vía más o menos 1.0 m a partir del terreno existente, posteriormente a esta visita se envía a realizar un levantamiento topográfico de la zona a intervenir para luego realizar los estudios y diseños geométricos del carreteable, el cual este diseño ya fue entregado por parte de la Secretaría para continuar con los procesos que permitan la construcción del carreteable.

Se realizó un acercamiento con los dueños de los predios y se les suministro la información del proyecto.

Está en proceso de verificación el tema de predios por parte de Contratación Municipal y acercamiento con los propietarios.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto No1. Recorridos de verificación, vigilancia y control AHDl puerto nuevo.



Foto No 2. Demolición Voluntaria en AHDl NAVARRO



Foto No 3. Proceso/ Demoliciones voluntarias en el AHDI NAVARRO



Foto No 4. Demolición voluntaria en el asentamiento de NAVARRO



Foto No 5. Demoliciones voluntarias en el AHDI NAVARRO



Foto No 6. Demoliciones voluntarias en el AHDI NAVARRO.



Foto No 7. Demolición voluntaria // Asentamiento de la Playita Renaciente.



Foto No 8. Demolición voluntaria // Asentamiento de Puerto Nuevo.



Foto No 9. Demolición voluntaria // Asentamiento de Brisas del Cauca.

2. EMPRESTITO

1. MARCO LEGAL

Mediante el Acuerdo 0415 de 2017¹ “(...) Artículo 1°: “Autorizar al señor Alcalde de Santiago de Cali, para celebrar contratos de empréstito hasta el treinta y uno (31) de julio de 2017 conforme a las normas de contratación vigentes en materia de crédito público hasta por valor de ciento noventa y cuatro mil quinientos millones de pesos moneda corriente (\$194.500.000.000.00) M/CTE, destinados a financiar la ejecución de programas del plan de desarrollo Municipal 2016-2019 “Cali progresa contigo” de conformidad con la siguiente relación.

Tabla 1 - Plan de desarrollo del municipio de Santiago de Cali 2016 – 2019 “Cali progresa contigo”

¹ Acuerdo 0415 de 2017 “POR EL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI PARA CELEBRAR CONTRATOS DE EMPRÉSTITO HASTA POR UN VALOR DE CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L (\$194.500.000.000.00) Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 2016 – 2019 “CALI PROGRESA CONTIGO”			
EJE	COMPONENTE	PROGRAMA	INDICADOR DE PRODUCTO
2. Cali amable y sostenible	2.1 Movilidad sostenible, saludable, segura y accesible	2.1.4 Infraestructura para la movilidad en transporte privado	Intersecciones a desnivel construidas
			Frentes de trabajo de las 21 Megaobras a realizar por el sistema de contribución por valorización ejecutadas
	2.2 Ordenamiento territorial e integración regional	2.2.2 Ciudad – región	Vías vehiculares zona urbana y rural mejoradas
			Corredor verde construido
			Prolongación Avenida Ciudad de Cali entre la carrera 80, hasta vía a Puerto Tejada construida (incluyen construcción puente sobre el río Lili)

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali.

a. ACUERDO 0415 DE 2017.²

Mediante el artículo 1° se autorizó la celebración de los contratos mediante recursos de Banca Privada Fondo 6203 para los siguientes proyectos.

Tabla 2 - cuadro de obras a ejecutar acuerdo 0415 de 2017.

PROYECTO	VALOR TOTAL
Ciclo infraestructura	
Intersección a desnivel Calle 70 con Av 3N-Sameco	
Puente sobre el Rio Lili Vía Cali -Jamundí	
Puente de la Carrera 100 con Calle 25	
Tramo Vial ampliación Vía – Cali Jamundí	

² Acuerdo 0415 de 2017 “POR EL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI PARA CELEBRAR CONTRATOS DE EMPRÉSTITO HASTA POR UN VALOR DE CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L (\$194.500.000.000) Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

Puente Av. Ciudad de Cali	\$194.500.000.000
Estudios y diseños Av. Ciudad de Cali	
Reparación de Puentes	
Retorno Autopista Cali Jamundí con Vía a Cascajal	
Rehabilitación vía cascajal	
Vuelta de Occidente Tramo 1 Ventiadores -Puente sobre el rio Pichinde	
Vuelta de Occidente Tramo 2 Puente sobre el rio Pichinde Via Pavimentada la leonera	
Programa de adoquines	

Fuente: Acuerdo 0415 de 2017

b. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL EMPRÉSTITO.

La siguiente tabla nos muestra una pequeña descripción de los tramos a intervenir con el alcance en longitud medida en kilómetros (kms), de cada uno de los proyectos que se han venido ejecutando la Secretaria de Infraestructura.

Tabla 3. Proyectos “Programa obras para el progreso “EMPRESTITO”.

NO.	PROYECTO	TRAMO	LONGITUD INTERVENCIÓN (KMS)
1	Ampliación vía Cali Jamundí	Puente rio Lili carrera 102 hasta carrera 127.	3.50
2	Puente Avenida Ciudad de Cali y sus empalmes	Carrera 99 A Hasta carrera 109	0.80
3	Construcción puente vehicular a desnivel carrera 100 calle 25	Desde la carrera 98 hasta carrera 102.	4.10
4	Rehabilitación vía a Cascajal (carrera 143)	Desde vía Cali Jamundí hasta cruce vía a Puerto Tejada.	3.50
5	Retorno A Cascajal Pr111+200 De La Ruta 2504, Vía Cali – Jamundí	Desde el PR111+020 hasta el PR111+450.	0.40
6	Mantenimiento puentes vehiculares	Calle 42 carrera 43 / Calle 6 Oeste diag. 53	_____
7	Construcción cicloinfraestructura	8 tramos incluyen calle 5	20.0
8	Pavimentación vía Vuelta a Occidente tramo 1	Desde el sector Ventiaderos (Corregimiento de los Andes) hasta el Puente rio Pichinde	3.10
9	Proyecto Adoquines	“Adquisición de insumos - materiales y equipos menores, para la construcción de vías y andenes por el sistema constructivo de adoquines	13.0

Fuente: Secretaria de Infraestructura.

c. ACTUALIZACIÓN DEL VALOR APROBADO.

Una vez analizados los diferentes proyectos, se determinó el presupuesto de cada uno y se descartó el proyecto de los **Estudios y diseños Av. Ciudad de Cali**, lo cual generó un ajuste en el presupuesto total aprobado mediante acuerdo No. 0415 de 2017. De esta forma, el valor para la ejecución de las Obras del Progreso quedó establecido en **CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS M/CTE (\$180.331.237.123).**

Tabla 4- Costos del plan de Obras del EMPRÉSTITO.

NO.	FICHA	PROYECTO	VALOR TOTAL	GESTION PREDIAL	DISEÑOS	OBRA
1	18028955	Construcción de Cicloinfraestructura	\$ 19.082.368.528		\$ 173.000.000	\$ 17.687.663.905
2	18028952	Mejoramiento de Cicloinfraestructura	\$ 4.450.342.108		\$ 198.675.987	\$ 3.973.519.736
3	18028929	intersección a desnivel en la carrera 100 con calle 25.	\$ 18.116.986.372			\$ 17.420.177.966
4	18028918	Construcción de puente vehicular sobre río Lili - Vía Cali – Jamundí.	\$ 8.593.087.620	\$ 203.930.000		\$ 7.957.157.620
	18028927	Ampliación de infraestructura vía Cali Jamundí entre río Lili y carrera 127, Santiago de Cali.	\$ 56.238.070.764	\$ 12.147.059.550		\$ 41.004.640.429
5	18028924	Construcción de Retornos vía Cali – Jamundí.	\$ 5.785.273.084	\$ 2.810.904.000		\$ 2.836.504.946
6	18028925	Mejoramiento Vía Cascajal entre vía Cali - Jamundí y vía a Puerto Tejada, Santiago de Cali	\$ 6.603.902.104			\$ 6.349.905.869
7	18028950	Avenida Ciudad de Cali entre carrera 80 y Vía a Puerto Tejada, Santiago de Cali	\$ 17.228.432.403	\$ 3.300.000.000		\$ 13.324.638.976
8	18028921	intersección a desnivel en la calle 70 con Avenida 3N, Santiago de Cali	\$ 19.534.474.140			\$ 18.167.060.950

9	18028922	Reparación de puentes peatonales	\$ 4.854.288.091			\$ 4.598.952.537
10	18028923	Reparación de puentes vehiculares	\$ 467.911.909			\$ 443.299.743
11	18028926	Construcción corredora vial Vuelta de Occidente,	\$ 9.000.000.000		\$ 300.000.000	\$ 8.107.633.430
12	18028917	Adecuación de vías y andenes con adoquines	\$ 9.000.000.000			\$ 9.000.000.000
13	18028919	Estudios y diseños infraestructura vial Avenida Ciudad de Cali entre carrera 80 y Vía a Puerto Tejada, Santiago de Cali	\$ 1.376.100.000		\$ 1.376.100.000	
		TOTAL	\$ 180.331.237.123	\$ 18.461.893.550	\$ 2.047.775.987	\$ 150.871.156.107

Fuente: Secretaría de Infraestructura.

d. FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS.

Desde la concepción y la formulación, varios proyectos se tenían contemplado en su presupuesto distintos fondos de financiación, se aunaron esfuerzos para el desarrollo de los proyectos, se derivaron varios convenios administrativos con Metro Cali s.a., Emcali y recursos por Valorización entre otros como lo muestra la siguiente tabla.

Tabla 5- Fuentes de Financiación EMPRÉSTITO.

No.	ficha	proyecto	recursos del empréstito	convenio emcali	recursos metrocali	valorización
1	18028955	Construcción de Cicloinfraestructura en la ciudad de Santiago de Cali	\$ 19.082.368.528			
2	18028952	Mejoramiento de Cicloinfraestructura en Santiago de Cali	\$ 4.450.342.108			
3	18028929	Construcción de intersección a desnivel en la carrera 100 con calle 25, Santiago de Cali	\$ 18.116.986.372	\$ 2.870.000.000	\$ 8.000.000.000	\$ 14.170.153.290
4	18028918	Construcción de puente vehicular sobre río Lili - Vía Cali - Jamundí, Santiago de Cali	\$ 8.593.087.620			
	18028927	Ampliación de infraestructura vía Cali Jamundí entre río Lili y carrera 127, Santiago de Cali	\$ 56.238.070.764	\$ 6.350.000.000	\$ 1.700.000.000	
5	18028924	Construcción de Retornos vía Cali - Jamundí (ruta 2504), Municipio Santiago de Cali	\$ 5.785.273.084			

6	18028925	Mejoramiento Vía Cascajal entre vía Cali - Jamundí y vía a Puerto Tejada, Santiago de Cali	\$ 6.603.902.104			
7	18028950	Construcción de Infraestructura vial Avenida Ciudad de Cali entre carrera 80 y Vía a Puerto Tejada, Santiago de Cali	\$ 17.228.432.403	\$ 1.500.000.000		
8	18028921	Construcción de intersección a desnivel en la calle 70 con Avenida 3N, Santiago de Cali	\$ 19.534.474.140			
9	18028922	Reparación de puentes peatonales en Santiago de Cali	\$ 4.854.288.091			
10	18028923	Reparación de puentes vehiculares en Santiago de Cali	\$ 467.911.909			
11	18028926	Construcción corredora vial Vuelta de Occidente, zona rural Municipio Santiago de Cali	\$ 9.000.000.000			
12	18028917	Adecuación de vías y andenes con adoquines en Santiago de Cali	\$ 9.000.000.000			
13	18028919	Estudios y diseños infraestructura vial Avenida Ciudad de Cali entre carrera 80 y Vía a Puerto Tejada, Santiago de Cali	\$ 1.376.100.000			
		TOTAL	\$ 180.331.237.123	\$ 10.720.000.000	\$ 9.700.000.000	\$ 14.170.153.290

Fuente: Secretaría de Infraestructura.

2. EJECUCIÓN FINANCIERA

Conforme al Acuerdo Municipal No. 0415 de 2017, se autorizó al señor alcalde para celebrar contratos de empréstito hasta por valor de \$194.500 Millones de pesos, para financiar proyectos de infraestructura vial; el Municipio de Santiago de Cali celebró los siguientes contratos de empréstito con las Entidades financieras del sector privado, en el siguiente gráfico circular se muestra las proporciones con sus porcentajes de los contratos realizados con la Banca Privada.

Gráfico 1.- Porcentaje de participación con la Bancos.

Tabla 6- Relación con la Bancos.



Tabla 6- Relación con la Bancos.

NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CONTRATO
Banco Popular S.A.	\$ 100.000.000.000
Banco de Occidente S.A.	\$ 50.000.000.000
Banco BBVA S.A.	\$ 44.500.000.000

Fuente: Secretaría de Infraestructura

Fuente: Secretaría de Infraestructura

La Administración Municipal ha ejercido una supervisión permanente sobre los recursos de empréstito tendientes a financiar la ejecución de las obras de infraestructura aprobadas mediante el Acuerdo No. 0415 de 2017.

El departamento Administrativo de Hacienda, ha realizado un ejercicio riguroso al solicitar desembolso de recursos únicamente contra facturas de obra, bienes y servicios debidamente ejecutados por la secretaria de Infraestructura y validadas por la oficina de Contabilidad General del Municipio de Cali. Así mismo se han aportado los documentos establecidos contractualmente por las entidades financieras para la materialización de los desembolsos.

Para el tercer trimestre del presente año la Secretaría de Infraestructura solicitó desembolsos por un valor total de **\$33.782.592.443 m/cte.**; en comparación con los desembolsos solicitados para el primer trimestre y el segundo trimestre del año, se muestra un avance significativo en cuanto a la ejecución de los proyectos del Empréstito. El valor total desembolsado en el transcurso de este año fue de **\$64.034.562.175 m/cte.**

Gráfico 2.- Desembolsos Realizados
