

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN ACTA DE REUNION No. 001	CODIGO	FO-220-011
		VERSIÓN	2
		APROBADO	18/12/2018

OBJETIVO REUNION: Socialización Adecuación cubierta sobre cancha Múltiple – Institución Educativa Técnica Industrial Gerardo Valencia – Buenaventura D.E. – Valle del Cauca.

Fecha : 28 de octubre de 2021
Lugar : Institución Educativa Técnica Industrial Gerardo Valencia
Hora inicio: 10:30am **Hora final:** 11:45 am

INVITADOS:

NOMBRE	CARGO	EMAIL	TELEFONO
Lic. Beatriz Panchano	Rectora I.E. Gerardo Valencia		3152830812
Sr. Leónidas Martínez	Gestor		3157446956
Sr. Leomar Martínez	Líder social		3104463209
Arq. Daniel Espinosa	Arquitecto Indervalle - contratista		3162995487
Ingeniero Jhon Martínez	Ingeniero Indervalle - contratista		315669996
Viviana Montoya	Coordinadora Auditorías Visibles Ciudadanas Indervalle - contratista	Auditoriasvisibles.indervalle2@gmail.com	3117199388
Paula Olarte	Profesional Apoyo Auditorías Visibles Indervalle - contratista		3226381264

ORDEN DEL DIA

1. Presentación de los representantes de cada sector.
2. Presentación técnica de la obra a cargo del arquitecto Daniel Espinosa y el Ingeniero Jhon Martínez.
3. Preguntas de la comunidad
4. Cierre a cargo del equipo de Auditorías Visibles Ciudadanas.

La reunión es presidida por: Viviana Montoya – Profesional Coordinadora de Auditorías Visibles Ciudadanas, Arq. Daniel Espinosa – Arquitecto supervisor de Indervalle y Ingeniero Jhon Martínez.

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN ACTA DE REUNION No. 001	CODIGO	FO-220-011
		VERSIÓN	2
		APROBADO	18/12/2018

DESARROLLO

- 1- Cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad por la pandemia del Covid-19, Viviana Montoya - Coordinadora de Auditorías Visibles Ciudadanas de Indervalle, da inicio a la socialización dando la bienvenida en nombre de la Gobernadora Clara Luz Roldán y el Gerente de Indervalle Carlos Felipe López, cada uno de los líderes se presenta y se le da la bienvenida agradeciendo su participación en la reunión.
- 2- Viviana Montoya indica el desarrollo de la reunión y da paso a los asistentes para presentarse.
- 3- **Palabras de los asistentes:** Uno de los asistentes indica que se siente muy emocionado y agradece a la gobernación y al equipo de indervalle por traer este tipo de obras al municipio sabiendo que esto trae progreso. Se da paso al señor Jorge Cabezas indica que es maravillosa esta obra porque van a disfrutar mucho de los torneos juveniles y este tipo de proyectos realmente erradican los vicios y el ocio en nuestros jóvenes dice. Por otro lado otro asistente indica que esta obra servirá para mejorar el desarrollo deportivo de los jóvenes. Los niños de la institución expresan que se sienten muy emocionados por la obra porque van a tener muchos torneos y un espacio adecuado para que familiares y padres puedan acompañarlos.
- 4- Se da paso a la intervención del Arquitecto Daniel Espinosa quien muestra por medio de render y otras imágenes en plano de lo que será la ejecución del proyecto a construir. El proyecto cuenta con el mantenimiento y recuperación de la placa existente, esta cancha va quedar funcionando para voleibol, microfútbol, baloncesto. De igual manera la cancha cuenta con los accesos para personas con movilidad reducida y cuenta con pólizas de garantía que aseguran la total calidad en la ejecución, se muestra el plano de implantación y describe la planta arquitectónica, desniveles, andenes perimetrales, canales para aguas lluvias, columnas, pantallas de protección porterías e iluminación.
- 5- Interviene el ingeniero Jhon Martínez quien va explicar la construcción de la cubierta, indicando que esta se construirá con los más estrictos estándares de calidad, indicando que Buenaventura esta entre las ciudades más sísmicas del departamento y de Colombia, por lo cual está cubierta requiere una capacidad estructural fuerte, garantizando una estabilidad completa, se muestra los planos, y se explica técnicamente cómo será la construcción de la misma. Indica que la cubierta es en estructura metálica con un techado intercalado para garantizar iluminación y estabilidad.
- 6- Se da por terminada la intervención de los profesionales técnicos de Indervalle, dando paso a la preguntas de la comunidad, indica una de las asistentes que es importante tener en cuenta el tema de los canales de desagüe de las lluvias porque a veces es muy fuerte y no dan abasto, para que tengan esta parte como detalle. Por otro lado preguntan sobre quien estará a cargo los servicios públicos de la cancha, se les explica que la obra al terminarse es entregada al municipio en este caso el Imder de Buenaventura, ya tanto el Imder como la Institución Educativa concertaran el tema de administración del escenario. Teniendo en cuenta que la cancha es para toda la comunidad no solo para la institución y de igual manera así lo aclara la rectora de la institución.

Viviana Montoya – Profesional Social agradece la intervención de la comunidad e indica a los asistentes que es muy importante escuchar las sugerencias de ellos antes de iniciar la ejecución. Y este tipo de obras son muy importantes para la comunidad por que trae beneficios en salud física para todos, es decir, la salud va más allá, abarca la salud integral,

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN ACTA DE REUNION No. 001	CODIGO	FO-220-011
		VERSIÓN	2
		APROBADO	18/12/2018

la salud mental, psicológica, aleja la violencia de los territorios y son una gran herramienta de salud pública.

- 7- Finalmente interviene Paula Olarte profesional Social para auditorías visibles ciudadanas, indicando que en el momento del inicio a la ejecución de la obra se convocará la comunidad para realizar las reuniones de auditorías visibles ciudadanas que son una estrategia del gobierno nacional que busca fomentar la participación ciudadana y por medio del control social erradicar los actos de corrupción. Indica que se realizan 3 reuniones. 1 de inicio. Otra de seguimiento y la reunión de entrega. Las reuniones de seguimiento pueden ser más si la obra así lo requiere, en la primer reunión se conforma un equipo local de seguimiento o veedores que son las personas que están al frente de la obra durante la ejecución con el fin de realizar control social de ella y comunicar a su comunidad como va el proceso. Los veedores se les entregará copia del contrato y los planos.
- 8- La directora del plantel educativo agradece a los técnicos y profesionales de Indervalle por la presentación, e indica que esta obra traerá progreso y unión a nivel deportivo
- 9- Siendo las 11:45 pm se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS/ ACCIONES

Actividad	Responsable	Fecha


PROXIMA REUNION (si se programa una nueva reunión) Por definir

Fecha:	Hora:	Lugar:
--------	-------	--------


ANEXOS : lista de asistencia y registro fotografico



 INDERVALLE INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN ACTA DE REUNION No. 001		CODIGO	FO-220-011
			VERSIÓN	2
			APROBADO	18/12/2018

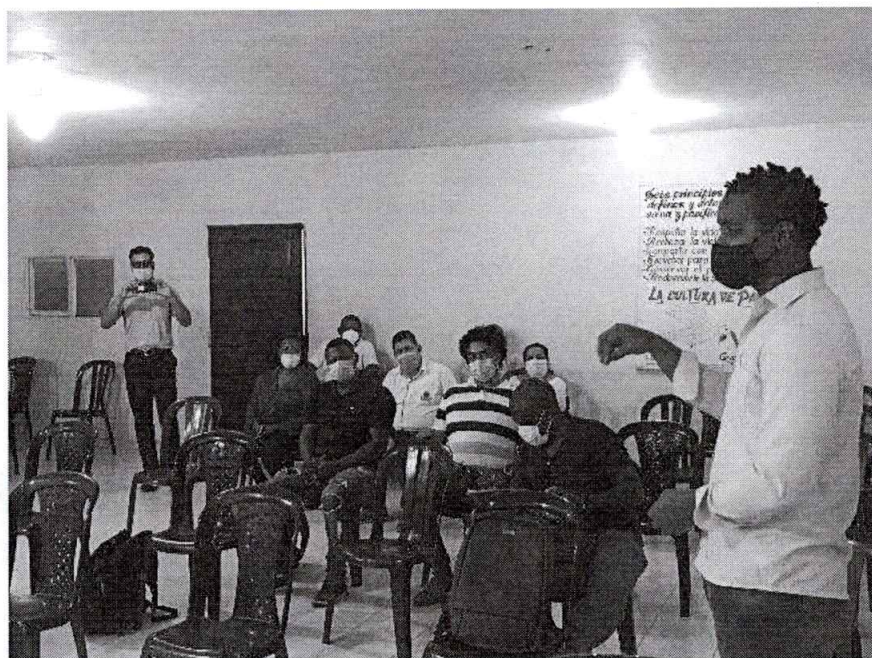

 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN ACTA DE REUNION No. 001	CODIGO	FO-220-011
		VERSIÓN	2
		APROBADO	18/12/2018

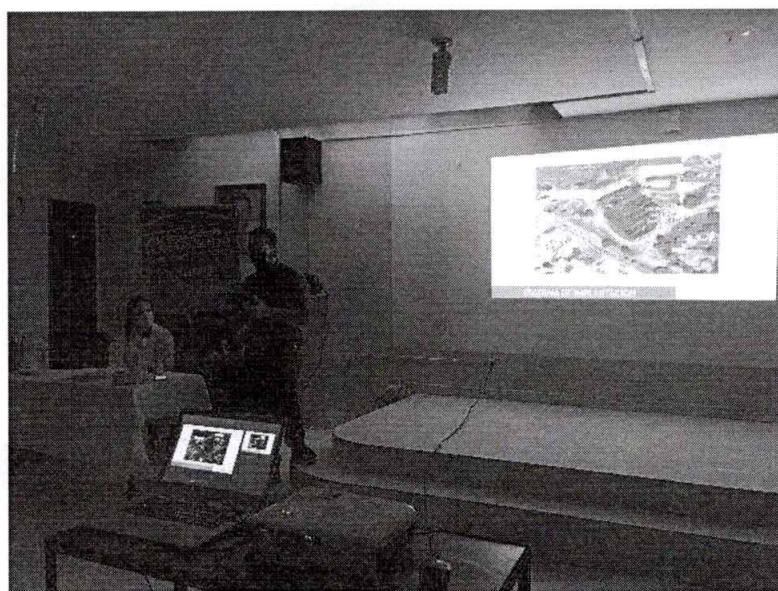



INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SISTEMA DE GESTIÓN

CÓDIGO FO-400-038
VERSIÓN 1
AFROBACIÓN 16/12/2018

REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS DE CAPACITACIÓN

NOMBRE DEL EVENTO: Sozialización Aborígena sobre Gestión Multigé
LUGAR, CIUDAD Y DEPARTAMENTO: IF Planeta Valsurbi, Cerde Valsurbi, Huila FECHA: 28 Oct 2018 COORDINADOR:
INTENSIDAD HORARIA

MODALIDAD DEL EVENTO: Presencial ☐ A distancia ☐
CLASE DE EVENTO: Diplomado ☐ Seminario ☐ Taller ☐ Curso ☐ Foro ☐
Conferencia ☐ Otros Cui

MODULO (Para el caso de Diplomados):

NOMBRES	APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (C.C.)	CLASIFICACIÓN DE LOS ASISTENTES										ENTIDAD / ORGANIZACIÓN	CARGO / OCUPACIÓN	MUNICIPIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
			Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad						
1	Beatriz	Pancho	1673065	X									ITIGVE	Docente	Buenavista	3153310	buenavista@itigve.gov.co	Beatriz
2	Edurne	Hernández	16455615										ITIGVE	Docente	Buenavista	3153310	buenavista@itigve.gov.co	Edurne
3	Wendy	Maya	1694085										ITIGVE	Docente	Buenavista	3153310	buenavista@itigve.gov.co	Wendy
4	Lucy	Calderón	16440101										ITIGVE	Docente	Buenavista	3153310	buenavista@itigve.gov.co	Lucy
5	Daniel	Sanjón	1650330										ITIGVE	Docente	Buenavista	3153310	buenavista@itigve.gov.co	Daniel
6	Lucy	Alvarado	1650330										ITIGVE	Docente	Buenavista	3153310	buenavista@itigve.gov.co	Lucy
7	Rosa María	Torres	66944960										ITIGVE	Docente	Buenavista	3153310	buenavista@itigve.gov.co	Rosa María
8	Myriam	Cardona	91389424										ITIGVE	Docente	Buenavista	3153310	buenavista@itigve.gov.co	Myriam
9	Wendy	Maya	1694085										ITIGVE	Docente	Buenavista	3153310	buenavista@itigve.gov.co	Wendy
10	Wendy	Maya	1694085										ITIGVE	Docente	Buenavista	3153310	buenavista@itigve.gov.co	Wendy
11	Jose Santiago	Quintero	16479570										ITIGVE	Docente	Buenavista	3153310	buenavista@itigve.gov.co	Jose Santiago
12	Alexandro	Torres	16479570										ITIGVE	Docente	Buenavista	3153310	buenavista@itigve.gov.co	Alexandro
13	Heriberto	Alvarado	16479570										ITIGVE	Docente	Buenavista	3153310	buenavista@itigve.gov.co	Heriberto
14	Patricia	Cardona	1150433711										ITIGVE	Docente	Buenavista	3153310	buenavista@itigve.gov.co	Patricia
15	Wendy	Maya	1694085										ITIGVE	Docente	Buenavista	3153310	buenavista@itigve.gov.co	Wendy

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL EVENTO			COORDINADOR DEL EVENTO		
NOMBRE	CARGO	FIRMA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Paula Quintero	Docente	[Firma]	Wendy Maya	Docente	[Firma]

ANEXO: Wendy Maya 1606305807
Patricia Cardona 1150433711
Wendy Maya 1606305807
Patricia Cardona 1150433711

 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACION SISTEMA DE GESTIÓN ACTA DE REUNION No. 002	CODIGO	FO-220-011
		VERSIÓN	2
		APROBADO	18/12/2018

OBJETIVO REUNION: Socialización Adecuación cubierta sobre cancha Múltiple – Institución Educativa Técnica Industrial Gerardo Valencia – Buenaventura D.E. – Valle del Cauca.

Fecha: 20 de octubre de 2023

Lugar: Institución Educativa Técnica Industrial Gerardo Valencia

Hora inicio: 10:30am **Hora final:** 11:45 am

INVITADOS:

NOMBRE	CARGO	EMAIL	TELEFONO
Lic. Beatriz Panchano	Rectora I.E. Gerardo Valencia		3152830812
Arq. Daniel Espinosa	Arquitecto Indervalle - contratista		3162995487
Arquitecto Heraclio Mena	Arquitecto Indervalle - contratista		3145693463
Viviana Montoya	Coordinadora gestión social , Subgerencia Infraestructura Indervalle - contratista	AVCindervalle@gmail.com	3117199388

ORDEN DEL DIA

1. Presentación de los representantes de cada sector.
2. Presentación técnica de la obra a cargo del arquitecto Daniel Espinosa y el Ingeniero Jhon Martínez.
3. Preguntas de la comunidad
4. Cierre a cargo del equipo de Gestión Social.

La reunión es presidida por: Viviana Montoya – Coordinadora gestión social, Subgerencia Infraestructura, Arq. Daniel Espinosa – Arquitecto apoyo supervisión formulación Indervalle, Arquitecto Heraclio Mena- Apoyo supervisión técnica Indervalle

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACION SISTEMA DE GESTIÓN ACTA DE REUNION No. 002	CODIGO	FO-220-011
		VERSIÓN	2
		APROBADO	18/12/2018

DESARROLLO

- 1- Viviana Montoya - Coordinadora Gestión social, Subgerencia de Infraestructura de Indervalle, da inicio a la socialización con la bienvenida en nombre de la Gobernadora Clara Luz Roldán y la Gerente de Indervalle Dra. Daira Faisury Dorado Gómez, se le da la bienvenida agradeciendo su participación en la reunión.
- 2- Se da paso a la intervención del Arquitecto Heraclio quien muestra por medio de planos lo que será la ejecución del proyecto a construir. El proyecto cuenta con el mantenimiento y recuperación de la placa existente, esta cancha quedará funcionando para voleibol, microfútbol, baloncesto. De igual manera la cancha cuenta con los accesos para personas con movilidad reducida y cuenta con pólizas de garantía que aseguran la calidad en la ejecución, se muestra el plano de implantación y describe la planta arquitectónica, desniveles, andenes perimetrales, canales para aguas lluvias, columnas, pantallas de protección porterías e iluminación, en cuanto a la cubierta, indica que esta se construirá con los más estrictos estándares de calidad, garantizando una estabilidad completa, se muestra los planos, y explica técnicamente cómo será la construcción de la misma. Indica que la cubierta es en estructura metálica con un techado intercalado para garantizar iluminación y estabilidad. Contará con iluminación.
- 3- Se da por terminada la intervención de los profesionales técnicos de Indervalle, dando paso a las preguntas de la comunidad, indica uno de los docentes si tendrá cerramiento el escenario ya que se podría tener mejor control y cuidado por el mismo, contesta el Arquitecto Daniel Espinosa que el cerramiento no está contemplado para este proyecto. La comunidad le preocupa la lluvia de la zona y que esta vaya afectar el escenario, el arquitecto Heraclio responde que la estructura contará con canales de desagüe. La rectora de la Institución Licenciada Beatriz Panchano agradece la adecuación de este escenario deportivo tan necesario para toda la comunidad educativa como comunidad aledaña.
Viviana Montoya – Profesional Social agradece la intervención de la comunidad, dice que este tipo de obras son muy importantes para la región por que trae beneficios en salud física, socialmente impacta a niños y jóvenes incentivando la práctica de diversos deportes surgiendo semilleros deportivos que la aparta de actividades delictivas y de ocio. Aporta a la salud mental, psicológica, aleja la violencia de los territorios y son una gran herramienta de salud pública.
- 4- La profesional social, indica que en el momento del inició a la ejecución de la obra se convocará la comunidad para realizar las reuniones de auditorías visibles ciudadanas que son una estrategia del gobierno nacional que busca fomentar la participación ciudadana y por medio del control social erradicar los actos de corrupción. Indica que se realizan 3 reuniones. 1 de inicio. Otra de seguimiento y la reunión de entrega. Las reuniones de seguimiento pueden ser más si la obra así lo requiere, en la primera reunión se conforma un equipo local de seguimiento o veedores que son las personas que están al frente de la obra durante la ejecución con el fin de realizar control social de ella y comunicar a su comunidad como va el proceso. Los veedores se les entregará copia del contrato y los planos.
 - 2- La directora del plantel educativo agradece a los técnicos y profesionales de Indervalle por la presentación, e indica que esta obra traerá progreso y unión a nivel deportivo
 - 3- Siendo las 11:45 pm se da por terminada la reunión.

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACION SISTEMA DE GESTIÓN ACTA DE REUNION No. 002	CODIGO	FO-220-011
		VERSIÓN	2
		APROBADO	18/12/2018

DESARROLLO

- 1- Viviana Montoya - Coordinadora Gestión social, Subgerencia de Infraestructura de Indervalle, da inicio a la socialización con la bienvenida en nombre de la Gobernadora Clara Luz Roldán y la Gerente de Indervalle Dra. Daira Faisury Dorado Gómez, se le da la bienvenida agradeciendo su participación en la reunión.
- 2- Se da paso a la intervención del Arquitecto Heraclio quien muestra por medio de planos lo que será la ejecución del proyecto a construir. El proyecto cuenta con el mantenimiento y recuperación de la placa existente, esta cancha quedará funcionando para voleibol, microfútbol, baloncesto. De igual manera la cancha cuenta con los accesos para personas con movilidad reducida y cuenta con pólizas de garantía que aseguran la calidad en la ejecución, se muestra el plano de implantación y describe la planta arquitectónica, desniveles, andenes perimetrales, canales para aguas lluvias, columnas, pantallas de protección porterías e iluminación, en cuanto a la cubierta, indica que esta se construirá con los más estrictos estándares de calidad, garantizando una estabilidad completa, se muestra los planos, y explica técnicamente cómo será la construcción de la misma. Indica que la cubierta es en estructura metálica con un techado intercalado para garantizar iluminación y estabilidad. Contará con iluminación.
- 3- Se da por terminada la intervención de los profesionales técnicos de Indervalle, dando paso a las preguntas de la comunidad, indica uno de los docentes si tendrá cerramiento el escenario ya que se podría tener mejor control y cuidado por el mismo, contesta el Arquitecto Daniel Espinosa que el cerramiento no está contemplado para este proyecto. La comunidad le preocupa la lluvia de la zona y que esta vaya afectar el escenario, el arquitecto Heraclio responde que la estructura contará con canales de desagüe. La rectora de la Institución Licenciada Beatriz Panchano agradece la adecuación de este escenario deportivo tan necesario para toda la comunidad educativa como comunidad aledaña.
Viviana Montoya – Profesional Social agradece la intervención de la comunidad, dice que este tipo de obras son muy importantes para la región por que trae beneficios en salud física, socialmente impacta a niños y jóvenes incentivando la práctica de diversos deportes surgiendo semilleros deportivos que la aparta de actividades delictivas y de ocio. Aporta a la salud mental, psicológica, aleja la violencia de los territorios y son una gran herramienta de salud pública.
- 4- La profesional social, indica que en el momento del inicio a la ejecución de la obra se convocará la comunidad para realizar las reuniones de auditorías visibles ciudadanas que son una estrategia del gobierno nacional que busca fomentar la participación ciudadana y por medio del control social erradicar los actos de corrupción. Indica que se realizan 3 reuniones. 1 de inicio. Otra de seguimiento y la reunión de entrega. Las reuniones de seguimiento pueden ser más si la obra así lo requiere, en la primera reunión se conforma un equipo local de seguimiento o veedores que son las personas que están al frente de la obra durante la ejecución con el fin de realizar control social de ella y comunicar a su comunidad como va el proceso. Los veedores se les entregará copia del contrato y los planos.
 - 2- La directora del plantel educativo agradece a los técnicos y profesionales de Indervalle por la presentación, e indica que esta obra traerá progreso y unión a nivel deportivo
 - 3- Siendo las 11:45 pm se da por terminada la reunión.

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACION SISTEMA DE GESTIÓN ACTA DE REUNION No. 002	CODIGO	FO-220-011
		VERSIÓN	2
		APROBADO	18/12/2018




COMPROMISOS/ ACCIONES

Actividad	Responsable	Fecha

PROXIMA REUNION (si se programa una nueva reunión) Por definir

Fecha:	Hora:	Lugar:
--------	-------	--------

ANEXOS: lista de asistencia y registro fotográfico

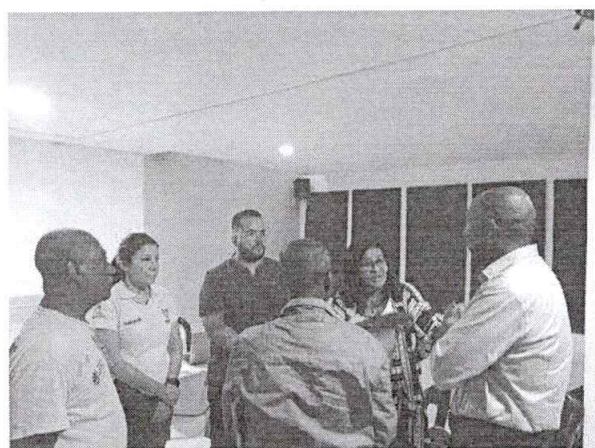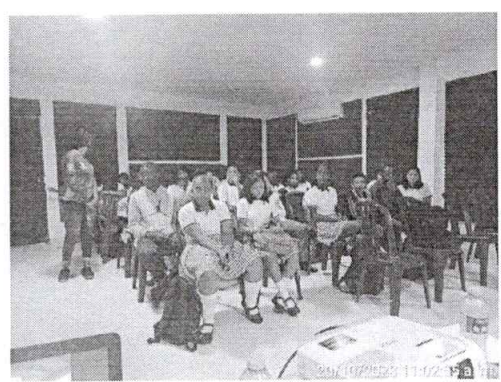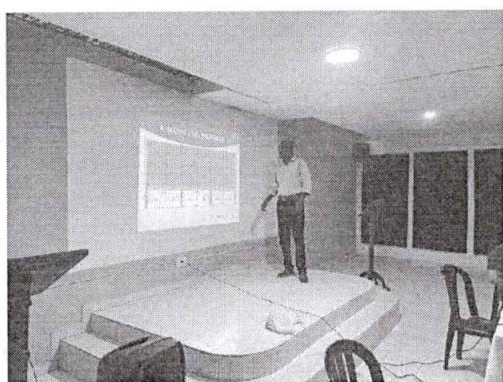



INDERVALLE

INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO
VERSIÓN
APROBACIÓN

PM-FO-600-006
1
28/ABRIL/2023

REGISTRO DE ASISTENCIA
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Nombre del evento: Socialización Cobertura sobre cancha múltiple Ed. 1. Gerardo Valenzuela Lugar: Buenaventura.

Equipo Acompañante:

Equipo Técnico y Social Indevalle

Hora: 10:30 - 20/10/23

Id.	Nombre	Apellidos	No. De identificación	Cargo/ Entidad	Municipio	Teléfono	Correo electrónico	Firma
1	IVERITO	CAMPIDO G	16480.000	empleado - o. e. hot.	B/tura	355357066		
2	Carlos	Ignacio M	66730.623	Empleado - o. e. lib.	B/tura	66730623		
3	Rafael	Valencia	111748.220	Docente	B/tura	111748220		
4	Geraldine	Núñez V.		Estudiante	Buenaventura	315206283		
5	Ana Sofía	Orobio Aguilar	1111289797	Estudiante	Buenaventura	3147165567		
6	Elsa	Contreras	31375803	Docente	B/tura	36826305		
7	Norman H	Norman	1648042	ITIGVC	B/tura	315243962		
8	Luis Fernando	Valencia Contreras	1028194204	Estudiante	B/tura	3106079441		
9	Brayan	Rodriguez A.	1150942926	Estudiante	B/tura	317674043		
10	Jesus David	Ortiz	1089.799.719	Estudiante	B/tura	3119297671		
11	Klara Yandira	Mejia Salazar	1127792541	Estudiante	B/tura	3184650792		
12	Martin Victor	Ortiz	1151441646	Estudiante	B/tura	3125267578		
13	Jesus E.	Andon Paredes	1151441646	Docente	B/tura	3103773874		
14	Glenn A. Llan	Ortiz	66735.937	coordinadora	B/tura	3235134467		
15	Pamela	Calle		Estudiante	Buenaventura	310302232		

INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO

PM-FO-600-006

REGISTRO DE ASISTENCIA

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

VERSIÓN

1

APROBACIÓN

28/ABRIL/2023

Nombre del evento:

Socialización Cuestu sobre Queda vifirle Gerardo Valdeygar: Ed. f.t

Buenaventura

Equipo Acompañante:

Equipo Técnico y social Indervalle

Hora: 10:30. 20/09/23

No.	Nombre	Apellidos	No. De identificación	Cargo/ Entidad	Municipio	Teléfono	Correo electrónico	Firma
1	Rocimar	mina V.	1	Estudiante	Buenaventura	3162841564		Rocimar
2	Daiva Camila	Guzarano H.	1086047922	Estudiante	Buenaventura	3118622096	@gmail.com	Camila G.
3	Camila	Espata Casas		Estudiante	Buenaventura	3135223548		
4	Luis emerson	valencia Renteria		Estudiante	Buenaventura	3152343473		Luis Emerson
5	Joel Alexis	Castillo Rodriguez	1105378568	Estudiante	Buenaventura	3206760685	joelcastillo@gmail.com	Joel Castillo
6	Luis Miguel	Ramirez	171545978	Estudiante	Buenaventura	3173766063		Luis Ramirez
7	Juan R.O.	Riascos	1150935733	Personero	B/tura	3185800641		
8	Vineth Vanessa	Mosquera Gamba		Estudiante	B/tura	3136744088		Mosquera
9	Sara Angelina	Rivas Garcia		Estudiante	B/tura			Rivas
10	Heyner A Valencia	Viveros	1028182547	Docente	B/tura	3152988894	arqheyner@gmail.com	Heyner
11	Therese S.	Angulo I.	1.151.439.894	Estudiante	B/tura	3243608236		Angulo
12	Luis Adan	Rodriguez		Estudiante	B/tura	3186102372		Rodriguez
13	Andres Felipe	Munillo Floret	1107062240	Estudiante	B/tura	3025276197	afmunillo@gmail.com	Andres + Munillo
14	Valery	Ramos Pelgado	1115454642	Estudiante	B/tura	3126011034	valerytohana@gmail.com	Valery RD
15	Juan David	Uribe Hernandez	1196743894	Estudiante	B/tura	3205466487		Hernandez

13473-13474

3/11/1914

13473-13474

13473-13474

13473-13474

13473-13474

13473-13474

13473-13474

13473-13474

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA INDERVALLE CONCEPTO DE LEGALIDAD PROCEDIMIENTO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	PE-FO-220-124
		VERSIÓN	1
		APROBADO	24 JUN 2022

INDERVALLE
REGISTRADO
PRESUPUESTO

Consecutivo de Autorización No. 5791 del 11 de septiembre de 2023.

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE JURÍDICA DEL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA "INDERVALLE" EMITE CONCEPTO DE LEGALIDAD PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN LICITACION PUBLICA IND-23-ID-11-4470.


La Subgerencia de Infraestructura Deportiva remitió para la revisión de la Oficina Asesora de Jurídica de INDERVALLE, los siguientes documentos: análisis del sector, estudios previos, matriz de riesgo, aviso de convocatoria, disponibilidad presupuestal, certificados de viabilidad, autorizaciones comité de contratación, oficio comité estructurador, complemento al contrato.

En virtud de lo anterior, mediante la presente comunicación procedemos a informar el resultado de la revisión jurídica realizada al proceso mencionado, la cual, se realizó conforme a las disposiciones vigentes en materia de contratación estatal y especialmente lo preceptuado por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas modificatorias, la cual, se concreta en los siguientes términos:

DOCUMENTO REQUERIDO	OBSERVACIONES
Estudios Previos	CUMPLE. Documento elaborado en el formato estudios previos código FO-220-032, versión 2, y conforme con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015, Modificado por el artículo 1 del Decreto 399 del 13 de abril de 2021.
Plan Anual de Adquisiciones	La presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones. 72141300. Servicio de Construcción de facilidades atléticas y recreativas. 72153100. Servicio de Construcción de facilidades atléticas y recreativas.
Análisis del sector.	CUMPLE. El documento contempla el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, para ello las personas que integran el comité estructurador dejan constancia de su revisión, y visto bueno. Se deja constancia que la elaboración del análisis del sector, estudios previos y matriz de riesgos es responsabilidad del grupo estructurador designado por el subgerente y/o ordenador del gasto de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de INDERVALLE y acto administrativo de delegación.
Matriz de riesgos.	CUMPLE. Contiene los riesgos y forma de mitigarlos relacionado al objeto contractual.
Documento base – proyecto pliego de condiciones	CUMPLE. El proyecto de pliego CUMPLE con las exigencias del artículo 2.2.1.1.2.1.3 y artículo 2.2.1.2.2.1.9 del Decreto 1082 de 2015.

 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA INDERVALLE CONCEPTO DE LEGALIDAD PROCEDIMIENTO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	PE-FO-220-124
		VERSIÓN	1
		APROBADO	24-JUN-2022

Requisitos Habilitantes pliegos tipo.	Capacidad Jurídica. Capacidad Financiera y organizacional. Capacidad Técnica. Experiencia. Criterios de evaluación, asignación de puntaje y criterios de desempate. La formulación de los requisitos habilitantes y matriz de riesgos es responsabilidad del grupo estructurador designado por el subgerente y/o ordenador del gasto de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de INDERVALLE.
Requisitos de Ponderación.	La formulación de los requisitos ponderables es responsabilidad del grupo estructurador designado por el subgerente y/o ordenador del gasto de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de INDERVALLE, acto administrativo de delegación y/o pliegos tipo.
Aviso De Convocatoria	CUMPLE. Se aporta un (1) aviso de convocatoria cumpliendo los requisitos señalados en los artículos 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015.
Objeto:	Contratar por el sistema de precios fijos unitarios mejoramiento a escenarios deportivos y recreativos para los Municipios de Cartago, el distrito de Buenaventura y el distrito especial de Cali en el Departamento del Valle del Cauca realizando la ejecución de los siguientes: GRUPO 1: FRENTE 1. Gimnasio al aire libre y ecobikes, urbanización la cabaña, Municipio de Cartago - Departamento del Valle del Cauca. FRENTE 2. Adecuación cerramiento - barrio decepaz - distrito especial de Cali - Departamento del Valle del Cauca. FRENTE 3. Adecuación escenario deportivo barrio comuneros II Municipio de Cali - Valle del Cauca. GRUPO 2: FRENTE 1. Adecuación cubierta distrito especial de Buenaventura Departamento del Valle del Cauca.
Disponibilidad presupuestal	1023 del 25/07/2023
Presupuesto Oficial.	Cuatro mil cincuenta y tres millones trescientos ochenta y un mil trescientos noventa y nueve pesos (\$4.053.381.399)
Plazo	El plazo para la ejecución del objeto del proceso será hasta el 30 de junio de 2024.
Supervisión y/o interventoría.	En proceso de solicitud autorización contratación.
Garantías.	De conformidad con el Artículo 2.2.1.2.3.1.1. Del Decreto 1082 de 2015, el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley y del presente título. Para el presente proceso se deberá cubrir los siguientes riesgos: 1. Garantía de seriedad de la oferta.

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA INDERVALLE CONCEPTO DE LEGALIDAD PROCEDIMIENTO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	PE-FO-220-124
		VERSIÓN	1
		APROBADO	24-JUN-2022

INDERVALLE
REGISTRADO
PRESUPUESTO


	2. Garantía de cumplimiento
	3. Pago de Salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales.
	4. Calidad del Servicio.
	5. Pluralidad de oferentes.
	5. Responsabilidad Civil Extracontractual.
Observaciones:	Cumple.

Se recuerda que en virtud de la delegación efectuada mediante la Resolución IND-SG-0705 del 23 de junio de 2022, es de exclusiva responsabilidad del delegatario adelantar el proceso de conformidad con las normas que regulan el proceso de contratación estatal, los principios de transparencia, economía, responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 21 de la ley 1150 de 2007.


No obstante, lo anterior es importante indicar que la subgerencia responsable de la contratación debe garantizar los soportes de índole técnico, financiero y jurídico; así como el análisis y revisión de documentos base para la elaboración de los estudios previos y sus anexos y la fijación de los requisitos habilitantes y criterios de ponderación establecidos por el comité estructurador, los cuales, comprometen de manera exclusiva su responsabilidad.

El presente concepto se circunscribe solamente al análisis jurídico de los documentos presentados. Los aspectos técnicos, así como los términos de ejecución contractual y cumplimiento de las normas presupuestales de disciplina fiscal contenidas en el Decreto 111 de 1996, la Ley 617 de 2000; son responsabilidad exclusiva del área delegada, como también, el análisis del término del plazo para la correcta ejecución y cumplimiento del contrato, la supervisión, Interventoría o vigilancia de la ejecución contractual, y la modalidad de sección.

En consecuencia, y de la revisión jurídica realizada se encuentra que los documentos se ajustan a los requisitos exigidos para la suscripción del presente proceso, por lo tanto, se procede a IMPARTIR CONCEPTO DE LEGALIDAD FAVORABLE para la presente contratación.

Atentamente,

CAMILA OROZCO GONZALEZ.
Jefe Oficina Asesora de Jurídica.
INDERVALLE.

Proyecto: Juan José Caviendes Rey - Abogada Contratista.
Revisó: Karen Viviana Lozano Amaguaña – Profesional Especializado.
Revisó: Luz Stella Díaz Vélez – Profesional Universitario.
Aprobó: Jorge Eliecer Tamayo Muñoz - Secretario General.



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO N° IND-23-5027			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-IDI-35	Página	1 de 14
Versión No.	3		

ANEXO 4
MINUTA DEL CONTRATO

TABLA DE CONTENIDO

CLÁUSULA 1.	DEFINICIONES
CLÁUSULA 2.	OBJETO
CLÁUSULA 3.	ALCANCE DEL OBJETO
CLÁUSULA 4.	PLAZO DEL CONTRATO
CLÁUSULA 5.	VALOR DEL CONTRATO
CLÁUSULA 6.	ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
CLÁUSULA 7.	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
CLÁUSULA 8.	FORMA DE PAGO
CLÁUSULA 9.	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 10.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 11.	DERECHOS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 12.	OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
CLÁUSULA 13.	RESPONSABILIDAD
CLÁUSULA 14.	INDEMNIDAD
CLÁUSULA 15.	MULTAS
CLÁUSULA 16.	CLÁUSULA PENAL
CLÁUSULA 17.	CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
CLÁUSULA 18.	GARANTÍAS
CLÁUSULA 19.	INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 20.	INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA
CLÁUSULA 21.	CESIÓN
CLÁUSULA 22.	LIQUIDACIÓN
CLÁUSULA 23.	SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN
CLÁUSULA 24.	LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL
CLÁUSULA 25.	DOCUMENTOS

ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO N° IND-23-5027 LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-IDI-35	Página	2 de 14
Versión No.	3		

El Instituto del Deporte, La Educación Física Y La Recreación Del Valle Del Cauca "INDERVALLE", en adelante la "Entidad", por una parte; y, por la otra, BRENDA LIZETH MURILLO BARCO, identificada con cedula de ciudadanía N°1.006.166.501 de Cali, en calidad de representante legal del CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC con NIT N° 901526894-4 en adelante el "Contratista", identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas las siguientes consideraciones:

- I. Que mediante la Resolución 1339 del 28 de septiembre del 2023 la Entidad abrió el Proceso de Contratación IND-23-ID-07-4469
- II. Que por medio de la Resolución 1518 del 10 de noviembre del 2023 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), convienen las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del presente contrato es "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: **GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**"

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

Por su parte, en el Distrito Especial de Buenaventura se adecuará superficie de juego de cancha múltiple existente y construirá cubierta sobre dicha placa deportiva para lo cual se realizarán excavaciones, fundición de cimentación y estructura según diseños, así como montaje e instalación de estructura metálica, teja y canales según especificaciones de diseño. Se construirán pantallas de protección y se instalarán dotaciones.

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecución para los dos grupos de adjudicación será hasta el treinta (30) de junio de 2024 contados a partir de la fecha de inicio del contrato una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El presupuesto oficial asignado por INDERVALLE, para la presente selección a través de licitación Pública según el estudio del mercado es por la suma MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS (\$ 1.426.801.042). MCTE incluido AIU, discriminado para cada grupo 2:

GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La Entidad no entregará anticipo y/o pago anticipado en el presente proceso y su respectivo contrato que se derive.

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

Certificados de disponibilidad presupuestal del sistema general de regalías: N° 1023 del 25 de Julio de 2023 por valor de CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$ 4.053.381.399), de los cuales para el presente contrato se comprometen **MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS (\$ 1.426.801.042).**

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO:

EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION INDERVALLE pagará al CONTRATISTA conforme a lo descrito en la Minuta del Contrato respectivo. En concordancia, el valor de las Actas de avance de Obra corresponderá a la sumatoria de los valores por los conceptos que a continuación se listan, y según lo definido en el Contrato:

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 70% del valor del contrato. El 30% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

Las actas de pagos parciales por avance de obra deberán contener como mínimo el Diez (10%) de ejecución de obra para su presentación, de igual manera, es preciso indicar que las mismas deberán ser avaladas y aprobadas por el Interventor y el funcionario designado por EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION INDERVALLE para la supervisión de la interventoría de obra.

La entidad efectuará al Contratista los pagos por acta de avance presentada, de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría y supervisor de la entidad, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

Para proceder al pago se deberá anexar los siguientes documentos:

- 1. Factura debidamente diligenciada.
- 2. Acta de pago parcial debidamente diligenciada, en formato de la entidad, firmada por las partes. El acta se entregará en medio físico (impresa) y digital en formato Excel en tamaño de letra legible.
- 3. Informe de avance físico, económico, financiero y legal por parte del contratista. Se entregará en medio físico (impresa) y digital en formato Excel en tamaño de letra legible.

ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO N° IND-23-5027 LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-IDI-35	Página	4 de 14
Versión No.	3		

- Informe de la supervisión y/o interventoría certificando que las obras a pagar se encuentran debidamente soportadas. Se entregará en medio físico (impresa) y digital en formato Excel en tamaño de letra legible.
- Actas de modificación de cantidades de obra, debidamente diligenciada y aprobada por el ordenador del gasto.
- Acta de fijación y aprobación de precios unitarios ítems no previstos o adicionales.
- Análisis de precios unitarios de actividades adicionales o ítems no previstos debidamente aprobados por el ordenador del gasto.
- Certificación del cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la seguridad social integral en salud, pensión y ARL y pago de parafiscales de conformidad con lo señalado por la Ley.
- Copia del cronograma de avance de obra a la fecha del corte de obra, donde se verifique que el valor a pagar corresponde al porcentaje de avance físico ejecutado.
- Copia de la bitácora de obra, debidamente diligenciada, firmada por las partes y actualizada a la fecha del corte de obra. (El libro de bitácora deberá llevarse en un libro foliado por cada frente de trabajo y deberá permanecer en cada frente de trabajo).
- Cuadro del flujo de inversiones.
- Registro fotográfico en medio impreso a color por cada frente de trabajo, indicando la actividad y la fecha de ejecución. (incluir en la primera acta, foto de la valla de cada frente de trabajo).
- Soportes de los ensayos de laboratorios y demás formatos de control que sean requeridos por la entidad y/o el interventor.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

- Legalizar las pólizas y amparos exigidos en los documentos del proceso dentro de los Cinco (5) primeros días después de la firma del contrato o cualquier actuación contractual que implique su modificación.
- Suscribir el acta de inicio, junto con el interventor, a partir de la fecha en que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
- Elaborar cronograma de actividades a partir del perfeccionamiento y legalización del contrato.
- Dar cumplimiento en las fechas establecidas en el presente proceso, a todas y cada una de las obligaciones requeridas en la etapa de pre construcción para el inicio de las obras.
- Realizar en coordinación con la interventoría y un representante de INDERVALLE la reunión de socialización del contrato de obra, realizando en el sitio de la convocatoria una presentación relativa al alcance del contrato.
- Cumplir con el pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social y pago de parafiscales (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003).
- Las obligaciones que se deriven del presente contrato deberán prestarse en la oportunidad requerida, de tal manera que se garantice la continua y eficiente ejecución de los proyectos.
- Presentar los informes requeridos por el área interventora y/o la entidad para el seguimiento de las actividades contratadas y como requisito para cada pago.
- Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que por razón del contrato llegue a conocer, obligación que deberá ser cumplida por el CONTRATISTA aún después de terminado el contrato.
- Cumplir con los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes para todo su personal a cargo.
- Garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos sobre Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Cumplir en su integridad con el objeto del contrato.
- Aportar su conocimiento y experticia para el desarrollo eficiente del objeto contractual.
- Pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a que haya lugar, o los honorarios correspondientes, garantizando las obligaciones al Sistema de Seguridad Social y aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Los aportes al Sistema de Seguridad Social deberán ser liquidados de acuerdo a las normas que reglamenten la materia. La Interventoría deberá certificar el cumplimiento de esta obligación.

ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO N° IND-23-5027			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-IDI-35	Página	5 de 14
Versión No.	3		

- 15. Informar al interventor, las situaciones atípicas o extraordinarias generadas o presentadas durante la ejecución del contrato.
- 16. Reportar cualquier hecho o circunstancia de fuerza mayor que impida o dificulte la ejecución del presente contrato al interventor del contrato.
- 17. Atender los requerimientos realizados por la comunidad una vez se encuentren dentro de los parámetros del contrato, proyecto, siempre informando a INDERVALLE.
- 18. Dar respuesta oportuna, pertinente y veraz a las inquietudes de la comunidad con respecto al Contrato en un periodo no mayor a 5 días hábiles desde su solicitud.
- 19. El contratista se obliga a cuidar que sus empleados, contratistas o mandatarios que por la razón que sea, se involucren o relacionen con cada actividad objeto de este contrato, se obliguen solidaria e íntegramente a la protección de la información generada en el marco del contrato.
- 20. Las demás obligaciones que le asistan al CONTRATISTA y que se encuentren incluidas en la propuesta presentada por él.

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

- 1. Desarrollar el objeto del contrato de conformidad con los estudios previos, anexo técnico, pliego de condiciones, especificaciones técnicas y la propuesta presentada.
- 2. Conocer a cabalidad el contrato, anexo técnico y el pliego de condiciones.
- 3. Entregar al inicio del contrato y mensualmente los soportes del pago de la seguridad social de todo el personal (profesionales, técnicos, obreros y personal administrativo), asignado a cada frente de trabajo.
- 4. Poner a disposición la maquinaria, equipos y herramientas necesarios y/o según las especificaciones técnicas y requerimientos, así como las condiciones descripciones y valores ofertados en la propuesta la cual harán parte del contrato.
- 5. Asignar el personal idóneo con experiencia para el manejo y operación de la maquinaria, equipos y herramientas necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato.
- 6. La dotación del personal que labore dentro del cumplimiento del contrato debe cumplir con las normas de seguridad industrial vigentes.
- 7. Realizar y cumplir a cabalidad con el cronograma de entrega y con el plazo establecido para el desarrollo de las actividades.
- 8. Mantener en obra profesionales y el personal mínimo requerido, que cumplan con los perfiles requeridos en el proceso.
- 9. Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la calidad de los materiales y de la obra conforme a las especificaciones.
- 10. Efectuar los correctivos pertinentes en el caso que los ensayos de laboratorio demuestren que no se está cumpliendo con las exigencias de calidad y de ejecución exigida por las normas de construcción vigentes o las establecidas en las especificaciones del instituto pliego de condiciones o demás documentos técnicos del presente proceso. El desconocimiento del contratista frente a las normas de construcción vigentes o de las especificaciones técnicas de la entidad, no lo relevan de la responsabilidad frente a las obligaciones de adelantar los ensayos y pruebas requeridas para corroborar la calidad de los materiales u obras ejecutadas.
- 11. Instalar valla informativa con la información e imagen corporativa según especificaciones entregada por INDERVALLE
- 12. Cumplir con las normas vigentes en cuanto en cuanto a Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- 13. Presentar al interventor informes semanales de avance de obra, en donde se establezcan las actividades contractuales realizadas en el periodo, las actividades contractuales programadas para el periodo siguiente, el avance físico de obra programado, el avance físico de obra ejecutado, el estado de los pagos, las pólizas, los compromisos adquiridos.
- 14. Presentar informes ejecutivos de cumplimiento de actividades de cronograma y ejecución presupuestal con una periodicidad mensual hasta la finalización del contrato.
- 15. Presentar el informe final (memorias) en donde se detalle todo el desarrollo del contrato. Una vez finalice el objeto del contrato, el CONTRATISTA deberá entregar al interventor, un informe consolidado de las actividades realizadas durante su ejecución indicando en el mismo los asuntos asignados, tramitados y pendientes por resolver, así como los archivos físicos y magnéticos que se hubieren generado durante la ejecución del mismo. Los informes antes citados deben entregarse en original debidamente firmado y una (1) copia de seguridad, que deberá reposar en el expediente del contrato.

ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO N° IND-23-5027 LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-IDI-35	Página	6 de 14
Versión No.	3		

16. Entregar en medio impreso y digital y en original y una (1) copia de los planos definitivos del proyecto, debidamente firmados. Planos como lo construido. Este requisito es obligatorio para el pago del acta final.
17. Realizar semanalmente la reunión de comités de obra, dejando constancia mediante acta de las actuaciones del periodo en relación con la ejecución del contrato. -
18. Asistir a las reuniones que convoque Indervalle a través de la subgerencia de Infraestructura Deportiva, siendo necesario la entrega de los informes de avance y cronograma actualizado de obra.
19. Reportar al CONTRATANTE el número de cuenta bancaria de ahorro o corriente, donde se le ha de consignar el pago derivado de la ejecución del presente contrato.
20. Solicitar al interventor con la debida antelación la aprobación del inicio de cada actividad del contrato, lo cual deberá constar por escrito en acta o en la bitácora de obra. Solo podrá iniciarse una actividad cuando la actividad antecesora esta ejecutada a cabalidad y el interventor emita concepto favorable.
21. Cumplir con las demás obligaciones que sean necesarias para el cabal desarrollo del objeto contractual.
22. El contratista deberá contratar los dictámenes eléctricos (Certificación RETIE y RETILAP) para los proyectos que contengan sistemas de iluminación.
23. El contratista deberá apoyar a la entidad contratante con la gestión administrativa y documental necesaria para la aprobación de los proyectos ante las entidades prestadoras de servicios públicos cuando esto sea necesario.

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del Contrato.

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del Contrato.
4. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del Contrato.
5. Ejercer vigilancia y control sobre el presente Contrato de manera directa o indirecta.

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus Subcontratistas o empleados.

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD

1. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato.

CLÁUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10% de mano de obra no calificada de la región causará multas equivalentes a CERO PUNTO CERO UNO POR CIENTO (0,01%) SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al [1% del valor total del contrato].

2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10% de la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato, causará multas equivalentes a 10% SMMLV] por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.

3. Se impondrá una multa equivalente a UNO POR CIENTO (1%) del SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento base.

2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a UNO POR CIENTO (1%) del SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

3. Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 40% de personal colombiano, causará multas equivalentes a UNO POR CIENTO (1%), por cada día de incumplimiento.

Se causarán multas equivalentes a UNO POR CIENTO (1%) del contrato], por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 50% del valor del contrato.

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una multa equivalente al 15% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de aplicar), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 17, de acuerdo con el contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 2% del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 2% del valor del Contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 2% valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no reinicie la ejecución del Contrato después de levantada la suspensión del Contrato.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 5% del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso.

ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO N° IND-23-5027 LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-IDI-35	Página	8 de 14
Versión No.	3		

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 2% del valor del Contrato, por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 2% valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
8. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 2% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
9. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, se impondrá una multa equivalente al 2% del valor del Contrato.
10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Subcontratistas, al Contratista se impondrá una multa equivalente a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
11. Por atraso en el cumplimiento de ejercer el derecho al cobro de las actas pactadas en la forma de pago del presente contrato se impondrá una multa equivalente al 2% del valor del Contrato.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de esta, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento del Contrato.

Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.

Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del

presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad una suma equivalente al treinta por ciento (30 %) del valor del Contrato a título de tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Parágrafo 3. Esta indemnización se aplicará en caso de declararse la caducidad del Contrato.

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la Garantía única de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características:

Característica	Condición		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.		
Asegurado/ beneficiario	INDERVALLE identificada con el NIT. 805.012.896-4		
Amparos, vigencia valores asegurados y	Amparo	Vigencia	Valor Asegurado
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan.	Hasta la liquidación del contrato.	20% del valor del contrato
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	El 8% del valor del contrato

	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Cinco (5) contados a partir de la fecha de suscripción del Acta del Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la entidad.	El 20% del valor del contrato.
Tomador	• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el Contratista conformado por una Estructura Plural (Unión Temporal o Consorcio): la Garantía tendrá que ser otorgada por todos sus integrantes, para lo cual se deberán relacionar con su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.		
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del Contrato • Objeto del Contrato • Firma del representante legal del Contratista • En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421		

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construcción y mano de obra deficientes utilizados en la Construcción.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de Garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la

ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO N° IND-23-5027			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-IDI-35	Página	11 de 14
Versión No.	3		

Entidad hará efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	INDERVALLE identificada con el NIT. 805.012.896-4 y el Contratista
Tomador	- Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. - No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. - Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación.
Valor	200 SMMLV
Vigencia	Igual al período de ejecución del Contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y INDERVALLE identificada con el NIT 805.012.896-4
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	- Número y año del Contrato - Objeto del Contrato - Firma del representante legal del Contratista - En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término establecido para la Garantía única de cumplimiento.

ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO N° IND-23-5027 LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-IDI-35	Página	12 de 14
Versión No.	3		

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA 21. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de 6 meses a partir de la fecha del acta de terminación del contrato.

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante el término de 2 meses , previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la

ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO N° IND-23-5027			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-IDI-35	Página	13 de 14
Versión No.	3		

Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL




DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCION
Valle del Cauca	BUENAVENTURA	BUENAVENTURA.

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

- 1. Estudios y documentos previos.
- 2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
- 3. Propuesta presentada por el Contratista.
- 4. Las Garantías debidamente aprobadas.
- 5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

Por la Entidad,  JUAN CARLOS RUEDA ÁNGEL Subgerente de infraestructura deportiva	Por el contratista,  BRENDA LIZETH MURILLO BARCO Representante legal CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC NIT: 901526894-4
--	--

Proyecto: Katherin J. Mera C.- contratista	Firma: 
Reviso: León Pedro Cesar – abogado contratista	Firma: 
Reviso: Diana Marcela Santos – abogada contratista	Firma: 
Reviso: Camila Orozco- jefe oficina jurídica	Firma: 
Reviso: Jorge Eliecer Tamayo – secretario general	Firma: 
Aprobó: Juan Carlos Rueda ángel	Firma: 

ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO N° IND-23-5027 LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-IDI-35	Página	14 de 14
Versión No.	3		

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN		CODIGO	FO-220-006
	RESOLUCIÓN IND-SG- Nro.1703 (28/DICIEMBRE/2023)		VERSIÓN	3
			APROBADO	18/12/2018

“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN POLIZAS DE GARANTIA”

La Secretaria General del Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca “INDERVALLE”, en uso de la delegación concedida por el Gerente del Instituto del Deporte del Valle del Cauca INDERVALLE, según Resolución No.720 de Junio 24 del año 2022 y las atribuciones legales especialmente las contenidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y .

CONSIDERANDO

Que el Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca “INDERVALLE”, suscribió el Contrato de obra pública Nro. IND-23-5027, Con CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC, cuyo objeto es: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”, Representado Legalmente por BRENDA LIZETH MURILLO BARCO con cedula de ciudadanía 1.006.166.501, identificado con el Nit. No. 901.526.894-4, contrato por valor MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUARENTA Y DOS MCTE (\$1.426.801.042).

Que la Ley 1150 de 2007, en su Artículo 7°. Establece:

“De las garantías en la contratación. Reglamentado por los Decreto Nacionales 4828 de 2008 y 1430 de 2010, “Los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. El Gobierno Nacional señalará las condiciones generales que deberán ser incluidas en las pólizas de cumplimiento de los contratos estatales”.

Que el Decreto 1082 de 2015, establece: Las entidades para evaluar la suficiencia de la garantía aplicarán las siguientes reglas. **2.2.1.2.3.1.9. Suficiencia de la garantía de seriedad de la oferta.** La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato y su valor debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor de la oferta. **2.2.1.2.3.1.10. Suficiencia de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo.** La Garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo debe estar vigente hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo, de acuerdo con lo que determine la Entidad Estatal. El valor de esta garantía debe ser el ciento por ciento (100%) de la suma establecida como anticipo, ya sea este en dinero o en especie. **2.2.1.2.3.1.12 Cumplimiento.** El valor de esta garantía será como mínimo equivalente al monto de la cláusula penal pecuniaria y en todo caso, no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. **2.2.1.2.3.1.13. Suficiencia de la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.** Esta garantía debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más. El valor de la garantía no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. **2.2.1.2.3.1.14. Suficiencia de la**

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN RESOLUCIÓN IND-SG- Nro.1703 (28/DICIEMBRE/2023)	CODIGO	FO-220-006
		VERSIÓN	3
		APROBADO	18/12/2018

“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN POLIZAS DE GARANTIA”

garantía de estabilidad y calidad la obra. Garantía debe vigente por un término no inferior a cinco (5) años contados a de la fecha en la cual la Estatal recibe a satisfacción obra. Entidad Estatal debe determinar el valor asegurado de garantía en los documentos del de acuerdo con el objeto, la cuantía, la naturaleza y obligaciones contenidas en contrato a celebrar.

2.2.1.2.3.1.15. Suficiencia de la garantía de calidad del servicio. La Entidad Estatal debe determinar el valor y el plazo de la garantía de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato. En los contratos de interventoría, la vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.

2..2.1.2.3.1.17. Suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMLMV. La vigencia de esa garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato.

Que en la cláusula decima octava. El contratista se obligó a constituir las respectivas pólizas, las cuales garantizarán el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, las cuales deberán ser expedidas por compañía de seguros legalmente autorizadas. Teniendo como beneficiario al Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca. INDERALLE, la cual cubrirá los amparos y vigencias de las pólizas mencionadas en los anteriores considerandos y son los siguientes:

Aseguradora	Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza: No. 420 47 994000042515 Anexo 0 (27/12/2023)	Garantía de cumplimiento de	22/12/2023 ✓	30/12/2024 ✓	\$ 286.787.009.44 ✓
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza: No. 420 47 994000042515 Anexo 0 (27/12/2023)	Garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	22/12/2023 ✓	30/06/2027 ✓	\$ 115.570.884.40 ✓
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza: No. 420 47 994000042515 Anexo 0 (27/12/2023)	Garantía de estabilidad y calidad de la obra	5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA		\$ 286.787.009.44 ✓
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza: No. 420 74 994000010243 Anexo 0 (27/12/2023)	Garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo	22/12/2023 ✓	30/06/2024 ✓	\$ 232.000.000.00 ✓

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN RESOLUCIÓN IND-SG- Nro.1703 (28/DICIEMBRE/2023)	CODIGO	FO-220-006
		VERSIÓN	3
		APROBADO	18/12/2018

“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN POLIZAS DE GARANTIA”

Que el artículo 41 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, señala que para la ejecución de los contratos estatales se requerirá de la aprobación de la garantía por parte de la entidad contratante.

Que en virtud y cumplimiento de lo anterior,

RESUELVE:


ARTICULO PRIMERO: Aprobar las pólizas de Garantías descritas en el acápite anterior, de conformidad con las especificaciones descritas y que se tiene como ciertas, de acuerdo con la validación realizada a través de la plataforma de la aseguradora, la cual reposa dentro de la carpeta contractual del proceso.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Santiago de Cali, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2023.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

JORGE ELIECER TAMAYO MUÑOZ
 Secretario General

Proyecto y elaboro: Pablo Eider Jurado Valencia	Cargo: Abogado Contratista	Firma: 
Reviso: Luz Stella Diaz Vélez	Cargo: Profesional Universitario	Firma: 

DATOS DE LA PÓLIZA

Número de póliza:

994000042515

Número de anexo:

0

Agencia:

CALI NORTE

Ramo:

CUMP. ENT. ESTATALES

Asegurado / Beneficiario:

INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE .

Tomador / Garantizado:

CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	domingo, 30 de junio de 2024	sábado, 30 de junio de 2029	\$286,787,009.44
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	viernes, 22 de diciembre de 2023	miércoles, 30 de junio de 2027	\$115,570,884.40
CUMPLIMIENTO	viernes, 22 de diciembre de 2023	lunes, 30 de diciembre de 2024	\$286,787,009.44

Nueva Consulta

Visualizar PDF

DATOS DE LA PÓLIZA

Número de póliza:

994000010243

Número de anexo:

0

Agencia:

CALI NORTE

Ramo:

RESP CIVIL EXT PATRI

Asegurado / Beneficiario:

CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC

Tomador / Garantizado:

CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	viernes, 22 de diciembre de 2023	domingo, 30 de junio de 2024	\$232,000,000.00

Nueva Consulta

Visualizar PDF

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4209405630

PÓLIZA No: 420 - 47 - 994000042515 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **CALI NORTE**

COD. AGENCIA: 420 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: **EXPEDICION**

TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

DIA MES AÑO
27 12 2023
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO
27 12 2023
FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.526.894-4**

DIRECCIÓN: **MANZANA H 14 A BRR HUASIPANGA**

CIUDAD: **MOCOA, PUTUMAYO**

TELÉFONO: **3204736672**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE**

IDENTIFICACIÓN: NIT **805.012.896-4**

BENEFICIARIO: **INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE**

IDENTIFICACIÓN: NIT **805.012.896-4**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO CUMPLIMIENTO	22/12/2023	30/12/2024	286,787,009.44
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	22/12/2023	30/06/2027	115,570,884.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		286,787,009.44

BENEFICIARIOS
NIT 805012896 - **INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE,**

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO No. IND-23-5027 (COL.PCCNTR.5581333), CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2, FRENTE 1, ADECUACIÓN CUBIERTA DISTITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DLE CAUCA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.
** CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA**

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ***689,144,903.28	\$ *****5,339,422	\$ ****15,000.00	\$ ****1,017,340	\$ *****6,371,762

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
ASESORIAS Y SEGUROS JC LTDA	9126	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS, IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx)

DE ACUERDO CON EL ART. 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCE LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO.

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)00000000007000420940563

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADA20710B0FF9785C

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180

Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com

Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:



Ahorra y protege tu patrimonio. Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del sistema de información de la entidad. Vigilado por el Defensor del Consumidor Financiero de Colombia.

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUADA RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE

COD. AGENCIA: 420

RAMO: 47

No PÓLIZA: 994000042515 ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC

IDENTIFICACIÓN: NIT 901.526.894-4

ASEGURADO: . INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL
VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE

IDENTIFICACIÓN: NIT 805.012.896-4

BENEFICIARIO: . INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL
VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE

IDENTIFICACIÓN: NIT 805.012.896-4

TEXTO ITEM 1

POR DISPOSICIÓN DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRará POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS, QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

CLIENTE

**NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS**
4209405689

PÓLIZA No: 420 -74 - 994000010243 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE				COD. AGE: 420				RAMO: 74				PAP:			
DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS
27	12	2023		22	12	2023	23:59	30	06	2024	23:59	191			
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE				A LAS				VIGENCIA HASTA			
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL												FECHA DE IMPRESIÓN			
												TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION			

TIPO DE MOVIMIENTO EXPEDICION				VIGENCIA DEL ANEXO				DIA				MES				AÑO				HORAS				DIAS																			
								22				12				2023				23:59				30				06				2024				23:59				191			
								VIGENCIA DESDE				A LAS				VIGENCIA HASTA				A LAS																							

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.526.894-4**
DIRECCIÓN: **MANZANA H 14 A BRR HUASIPANGA** CIUDAD: **MOCOA, PUTUMAYO** TELÉFONO: **3204736672**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.526.894-4**
DIRECCIÓN: **MANZANA H 14 A BRR HUASIPANGA** CIUDAD: **MOCOA, PUTUMAYO** TELÉFONO: **3204736672**
BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: **CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC** NIT : **901526894**
ITEM: 1 DEPARTAMENTO: **VALLE** CIUDAD: **BUENAVENTURA**
DIRECCION: **VIA No. 0-0**
ACTIVIDAD: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**
TIPO EDIFICIO: **NO APLICA PARA ESTE RAMO** TIPO DE RIESGO: **ESTATAL** MANZANA: **AV.-0**
DESCRIPCION AMPAROS SUMA ASEGURADA % INVAR SUBLIMITE
CONTRATO \$ 232,000,000.00
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 232,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 232,000,000.00
RCE PATRONAL 232,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 232,000,000.00
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No. IND-23-5027 (COL.PCCNTR.5581333) REFERENTE A CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2, FRENTE 1, ADECUACIÓN CUBIERTA DISTITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DLE CAUCA.

SISTEMA BASE DE COBERTURA: **OCURRENCIA**

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ***232,000,000.00	\$ *****364,208	\$ *****0.00	\$ *****69,200	\$ *****433,408

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE	CLAVE	%PART	VALOR ASEGURADO
ASESORIAS Y SEGUROS JC LTDA	9126	100.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)00000000007000420940568

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADA20710B0FF97857

JJBARRERA 0

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE

COD. AGENCIA: 420

RAMO: 74

No PÓLIZA: 994000010243 ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC

IDENTIFICACIÓN: NIT 901.526.894-4

ASEGURADO: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC

IDENTIFICACIÓN: NIT 901.526.894-4

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

TEXTO ITEM 1

** AMPARO DE VEHÍCULOS PROPIOS O NO PROPIOS: OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL O CONTRACTUAL DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES CONTRATADA O NO, CON LÍMITES MÍNIMOS POR EVENTO DE \$100.000.000 / \$100.000.000 / \$200.000.000. EN CASO DE SINIESTRO, SE DEBE DEMOSTRAR LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL VEHÍCULO SINIESTRADO Y EL CONTRATO AMPARADO BAJO LA PÓLIZA.

** AMPARO PATRONAL: OPERA EN EXCESO DE LA ARL

LA PRESENTE POLIZA EXCLUYE, ADEMÁS DE LAS EXCLUSIONES INDICADAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO, LAS SIGUIENTES COBERTURAS:

- TODA RC CONTRACTUAL
- RC PROFESIONAL MÉDICA
- RC PROFESIONAL CLINICAS Y HOSPITALES
- RC PRODUCTOS CUALQUIER OTRO TIPO DE RC PROFESIONAL

ASEGURADO: EL CONTRATISTA CONSTRUPACICOL S A S ZOMAC Y EL CONTRATANTE IMDERVALLE, LIMITADA LA COBERTURA DE LA PRESENTE PÓLIZA A ÚNICAMENTE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL CONTRATISTA CONSTRUPACICOL S A S ZOMAC CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO POR LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 994000042515 EXPEDIDA POR ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y/O IMDERVALLE, ESTÁ ÚLTIMA RESPECTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL OCASIONADA POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO MENCIONADO EN ESTA PÓLIZA.



Reporte compromiso para el giro "Compromiso" Unidad Ejecutora:
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Subordinada

MHvalverd
03-7600010
FABIAN VALVERDE CORREA
INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE

2024-05-03-3:36 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 1023 de fecha 2023-07-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Numero:	1123	Fecha Registro:	2023-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-7600010 INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	1.426.801.042,00		Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	1.426.801.042,00	Saldo x Obligar:	1.254.281.011,00
TERCERO									
Identificacion:		Razon Social:	CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC		Medio de Pago:		Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Numero:		Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
Identificacion:		Nombre:	DORADO GOMEZ DAYRA FAISURY		Cargo:	GERENTE			
ORDENADOR DEL GASTO									
DOCUMENTO SOPORTE									
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	IND-23-5027	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2023-12-22
VIGENCIA ANTERIOR									
Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:	Obligación:				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
POSICION CATALOGO DE GASTO				DETALLE MOVIMIENTOS					
DEPENDENCIA		FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION		VALOR INICIAL		VALOR OPERACION
03-7600010 INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE	00AR-4301-1604-2022-00376-0006 MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Nación	AR76000	CSF	2023-12-22		1.426.801.042,00		0,00
					Total:		1.426.801.042,00		0,00
							1.426.801.042,00		1.254.281.011,00

Objeto: CONTRATO No. IND-23-5027, CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS, MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2, FRENTE 1, ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, (CJ-5791) POLIZAS EN TRAMITE

INDERVALLE
REGISTRADO
PRESUPUESTO



Reporte comprometido para el año "Comprobables"

Usuario: Gub. Valle

Miércoles

FABIAN CORREA

Unidad de Subordinación

03-7600010

INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE

Elaboración: Gub. Valle

Fecha y Hora Sistema:

2024-05-03 3:36 p. m.

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-7600010	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE	2024-01-26	285,360,208.00	112,840,177.00	NINGUNO
03-7600010	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE	2024-03-16	285,360,208.00	285,360,208.00	NINGUNO
03-7600010	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE	2024-05-14	428,040,313.00	428,040,313.00	NINGUNO
03-7600010	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE	2024-05-15	428,040,313.00	428,040,313.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INDERVALLE
REGISTRADO
PRESUPUESTO



PLAN DE INVERSION									
CONTRATO No.		IND-23-5027		DE		2023		PLAN INICIAL	
CONCEPTO		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.		X		MODIFICACIÓN		FECHA	
				22		12		AÑO	
								2022	
I. DATOS GENERALES									
1. ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA									
FRENTE DE OBRA		30 DE JUNIO 2024		CONSTRUPACICOL S.A.S ZOMAC		NIT. 901526894-4			
CONTRATISTA						4484		IND-23	
INTERVENTOR		CONSORCIO GRUPO 3							
CDP		1023 DEL 25 DE JULIO DE 2023							
TIPO DE RECURSO		SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS							
II. DATOS ESPECÍFICOS									
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		1.426.801.042,00							
ANTICIPO		0%		\$					
FECHA PROYECCIÓN DESEMBOLSO		Porcentaje proyectado Ejecución		Valor proyectado Ejecución		Amortización Acta 30%		Valor a Pagar por Acta - amortización	
ANTICIPO		0%		-		-		-	
MES 1 (ENERO 26 2024)		20%		285.360.208,00		-		285.360.208,00	
MES 2 (MARZO 16 2024)		20%		285.360.208,00		-		570.720.416,00	
MES 3 (MAYO 14 2024)		30%		428.040.313,00		-		998.760.729,00	
MES 4 (JUNIO 15 2024)		30%		428.040.313,00		-		1.426.801.042,00	
VALOR TOTAL		20%		1.426.801.042,00		-		1.426.801.042,00	
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA									
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA									
PROYECTO: MAY STIVEN PARAMO MARTINEZ/CONTRATISTA PROFESIONAL									

Nicolas Triana
NICOLAS TRIANA CASTILLO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

230

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5581333
 Versión del contrato 1
 Estado de contrato Firmado
 Fecha de generación del estado 30 días de tiempo transcurrido (22/11/2023 12:04:53 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
 Número del contrato IND-23-5027.
 Objeto del contrato CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
 Tipo de Contrato Obra
 ¿Asociado a otro contrato? ☐ Si ☒ No
 Duración del contrato 8 Meses
 Fecha de inicio de contrato *
 Fecha de terminación del contrato 30/06/2024 11:59 PM *
 Tiempo adiciones en días 0 días
 Liquidación ☒ Si ☐ No *
 Fecha de inicio de liquidación 1/07/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
 Fecha fin de liquidación 1/01/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
 Obligaciones Ambientales ☐ Si ☒ No *
 Obligaciones pos consumo ☐ Si ☒ No *
 Reversión ☐ Si ☒ No *



INDERVALLE
REGISTRADO
PRESUPUESTO



INDERVALLE
COPIA
PRESUPUESTO

Información de la Entidad Estatal contratante



INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA (INDERVALLE)

0 Recomendación (es)

COLOMBIA, Cali
 ★★★★★



Información del Proveedor contratista



CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC

COLOMBIA, Mocoa
 Número de documento 901526894

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado BRENDA LIZETH Fecha de 22/12/2023 1:44:02 PM ((UTC-
 por: MURILLO BARCO aprobación: 05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado JUAN CARLOS Fecha de 22/12/2023 2:27:38 PM ((UTC-
 por: RUEDA ANGEL aprobación: 05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo Si Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
 Sector: Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte)

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐ Si ☒ No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒ Si ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☒ Si ☐ No

etapas

Seriedad de la oferta

☒ Si ☐ No

☒ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta

Cumplimiento

☒ Si ☐ No

☒ Cumplimiento del contrato

☒ Pago de salarios

☒ Estabilidad y calidad de la obra

Responsabilidad civil extra contractual

☒ Si ☐ No

☒ No, de SMMLV

Fecha límite para entrega de garantías:

6 días de tiempo transcurrido (15/12/2023 11:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías:-

Documento explicativo de las garantías		Clasificación del documento	Descripción			
Nombre					Descargar	Detalle
DOCUMENTO EXPLICATIVO DE LAS GARANTIAS..pdf		-	DOCUMENTO EXPLICATIVO DE LAS GARANTIAS..pdf			

Garantías del proveedor:							Estado	
Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Entor	Fecha fin			Detalle
CO1.WRT.13017013	Seriedad de la oferta	-	147.115.945,00 COP	-	26/01/2024 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito		Aprobada	

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Si ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5581333
Proveedor CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 36 No. 5B3 - 65
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección Carrera 36 No. 5B3 - 65
Código postal 76001

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Buenaventura	COLOMBIA > Valle del Cauca > Buenaventura

1		CO1.PCCNTR.5581333						
1.1		Lote 2		Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal				
							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1,471,159,945.00	1,426,801,042.00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Descripción		Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO OBRA PUBLICA No. 5027.pdf	CONTRATO OBRA PUBLICA No. 5027.pdf	(detalle)
☐	CONCEPTO DE LEGALIDAD.pdf	CONCEPTO DE LEGALIDAD.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN CARLOS RUEDA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94501292	Guardar y notificar
Supervisor	Nicolas Triana Castillo	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1144030665	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JUAN CARLOS RUEDA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94501292	Guardar y notificar
--------------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------	---------------------

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL	22/12/2023 2:27:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
Supervisor	Nicolas Triana Castillo	22/12/2023 2:27:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
Ordenador del pago	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL	22/12/2023 2:27:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Si ☒ No

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto

Inversión

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

0

Sistema General de Participaciones - SGP

0

Sistema General de Regalias - SGR

1.426.801.042

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

0

Recursos de Crédito

0

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

0

Total 1.426.801.042

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2022003760006	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2022003760006	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF

☐ Si ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	Editar
☐ 1023	CDP	No validado	4.053.381.399 COP	1.426.801.042 COP	00-00-00	

Saldo de CDP 4.053.381.399 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 1.426.801.042 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
-------------------	------	------------------	-------------------	--------------------------	--------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 13 Actualización de oficio		4. Número de formulario 14890466241			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 901526894		6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	
14. Buzón electrónico 46					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
27. Fecha expedición		28. País		29. Departamento	
30. Ciudad/Municipio		31. Primer apellido		32. Segundo apellido	
33. Primer nombre		34. Otros nombres		35. Razón social	
36. Nombre comercial		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Putumayo		40. Ciudad/Municipio Mocoa	
41. Dirección principal MZ H 14 A BRR HUASIPANGA		42. Correo electrónico construpacificosaszomac@gmail.com		43. Código postal	
44. Teléfono 1 3218005123		45. Teléfono 2 3204736672			
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación		52. Número establecimientos	
46. Código 4220		47. Fecha inicio actividad 20211001		48. Código 4321	
49. Fecha inicio actividad 20211001		50. Código 42907210		51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 571442485255					
54. Impto. renta y compl. régimen ordinario					
55. Retención en la fuente a título de renta					
56. Informante de exógena					
57. Obligado a llevar contabilidad					
58. Impuesto sobre las ventas - IVA					
59. Facturador electrónico					
60. Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros			Exportadores		
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			55. Forma 56. Tipo		
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20			Servicio 1 2 3		
			57. Modo		
			58. CPC		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2023-01-23 / 16:15:30	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.		
Firma del solicitante:			Firma autorizada:		
			984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA		
			985. Cargo		

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 4 Hoja 2		
			4. Número de formulario 14890466241		
			(415)7707212489984(8020) 000001489046624 1		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 2 6 8 9 4		4	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís		4 6
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		2	63. Formas asociativas		1 2
65. Fondos			66. Cooperativas		
68. Sin personería jurídica			69. Otras organizaciones no clasificadas		
			64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados		
			67. Sociedades y organismos extranjeros		
			70. Beneficio		1
Constitución, Registro y Última Reforma					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase		0 4		0 1	
72. Número				2	
73. Fecha		2 0 2 1, 0 9, 2 8		2 0 2 2, 1 2, 0 1	
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro		0 3		0 3	
76. Fecha de registro		2 0 2 1, 1 0, 0 1		2 0 2 2, 1 2, 2 0	
77. No. Matrícula mercantil		0 0 0 0 0 8 3 1 5 7		8 3 1 5 7	
78. Departamento		8 6		8 6	
79. Ciudad/Municipio		0 0 1		4 6	
Vigencia					
80. Desde		2 0 2 1, 1 0, 0 1		2 0 2 2, 1 2, 2 0	
81. Hasta		9 9 9 9, 1 2, 3 1			
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Superintendencia de Sociedades					
5					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	8 0	2 0 2 1, 0 9, 2 9			
2					
3					
4					
5					
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 3 de 4 Hoja 3		
			4. Número de formulario 14890466241		
			 (415)7707212489984(8020) 000001489046624 1		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 2 6 8 9 4		4	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís		4 6
Representación					
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL PRIN		1 8 2 0 2 2 1 2 2 0			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3		1 0 0 6 1 6 6 5 0 1			
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
MURILLO		BARCO		BRENDA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones		001	
Espacio reservado para la DIAN		Página 4 de 4 Hoja 4			
		4. Número de formulario		14890466241	
		(415)7707212489984(8020) 000001489046624 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 2 6 8 9 4		4	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís		4 6
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales					
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadana 1 3		1 0 0 6 1 6 6 5 0 1			COLOMBIA
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
MURILLO		BARCO		BRENDA	LIZETH
119. Razón social					
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
				2 0 2 2 0 2 0 2	2 0 2 2 1 2 2 0
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1		9 0 0 0 3 3 1 7 1		8	COLOMBIA
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social					
BRACO CONSTRUCTOR S.A.S EN REORGANIZACION					
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
				2 0 2 2 0 2 0 2	2 0 2 2 1 2 2 0
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1		9 0 1 3 6 1 4 9 7		3	COLOMBIA
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social					
ACM EMPRESA CONSTRUCTORA SAS					
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
				2 0 2 2 0 2 0 2	
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social					
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social					
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro



BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **CONSTRUPACICOL S.A.S ZOMAC** identificado(a) con número **901.526.894** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130598000100027217** aperturada el **04 de mayo de 2023**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **598027217**

10 dígitos: **0598027217**

16 dígitos: **0598000100027217**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **18 de septiembre de 2023** a las **15:53**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA

FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10



SPGR

Sistema de Presupuesto y
Cero de Regalías

Reporte Certificado de
Comprobante

Comprobantabilidad Presupuestal

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

ifvalverd

03-7600010

FABIAN VALVERDE CORREA
INSTITUTO DEL DEPORTE LA
EDUCACION FISICA DEL VALLE -
INDERVALLE

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-25-9:05 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	1023	Fecha Registro:	2023-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-7600010 INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	4.053.381.399,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.053.381.399,00
				Saldo x Comprometer:	4.053.381.399,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	1023	Fecha Registro:	2023-07-25	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:
VIGENCIA ANTERIOR						
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS			
03-7600010 INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE	00AR-4301-1604-2022-00376-0006 MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Nación	AP76000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	SALDO X COMPROMETER
					2023-07-25			
					Total:	4.053.381.399,00	0,00	4.053.381.399,00

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS, MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES GRUPOS. GRUPO 1: ADECUACION CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ- DE CALI- DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE 2. COMUNEROS II MUNICIPIO DE CALI VALLE DEL CAUCA. GRUPO 2 FRENTE 1. ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

INDERVALLE

REGISTRADO



SPGR
Sistema de Presupuesto y
Ciclo de Pagos

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Suato Solicitante:

MHValverd

FABIAN VALVERDE CORREA

Unidad 6 Subunidad

03-7600010

INSTITUTO DEL DEPORTE LA
EDUCACION FISICA DEL VALLE -
INDERVALLE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-25 9:05 a. m.

Firma Responsable





CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 901505804

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC			

Aprobación del contrato

Aprobador - Proveedor
Aprobado por: BRENDIA LIZETH MURILLO BARCO Fecha de aprobación: 22/12/2023 1:44:02 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lma, Guao

Aprobador - Entidad Estatal
Aprobado por: JUAN CARLOS RUEDA ANGEL Fecha de aprobación: 22/12/2023 2:27:38 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lma, Guao

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8581333_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso: Licitación pública (Otra pública)
Unidad de contratación: SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA INDERVALLE
Proceso de Contratación: IND-23-ID-07-4489
Título de la oferta: INDERVALLE CONSTRUPACICOL
Cuantía del contrato: 1.426.801.042 COP

Información del Proveedor contratista



CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC

COLOMBIA, Mocoa
Número de documento 901523334

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC			

Aprobación del contrato

Aprobador - Proveedor			
Aprobado por:	BRENDA LIZETH MURILLO BARGO	Fecha de aprobación:	22/12/2023 1:44:02 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Aprobador - Entidad Estatal			
Aprobado por:	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL	Fecha de aprobación:	22/12/2023 2:27:38 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Contrato Firmado:	CO1_PCONTR_5581333_Firmado		
Contrato en ejecución:			

Información del contrato

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA INDERVALLE
Proceso de Contratación	IND-23-ID-07-4459
Título de la oferta	INDERVALLE CONSTRUPACICOL
Cuantía del contrato	1 428 801 042 COP



Iniciar ejecución

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN	CODIGO	FO-400-017
		VERSIÓN	1
		APROBADO	18/12/2018

ACTA DE INICIO
Contrato de obra IND-23-5027

Contratante: Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca – INDERVALLE
 NIT: No. 805.012.896-4
 Ordenador del Gasto: JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
 Cédula de Ciudadanía: No. 94.501.292
 Contratista: CONSTRUPACICOL S.A. S ZOMAC
 Nit: 901.526.894-4
 Representante Legal: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
 Cédula de Ciudadanía: No. 1006.166.501
 Interventor: CONSORCIO GRUPO 3
 Representante Legal: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ
 Cédula de Ciudadanía: No. 16.700.426
 Contrato: No. IND-23-4484
 Tipo de contrato: OBRA PUBLICA
 Objeto: Objeto: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES GRUPO 2 FRENTE 1: ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"
 Valor: \$ 1.426. 801.042 M/CTE – INCLUIDO AIU
 Plazo: Hasta el 30 de Junio de 2024
 Fecha de inicio: 28 de Diciembre de 2023
 Fecha terminación: 30 de Junio de 2024

C.D.P.: No. 1023 del 25 de Julio de 2023 del Sistema General de Regalías

R.P. No. 1123 del 22 de Diciembre de 2023

Los suscritos a saber: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.700.426 en calidad de Representante Legal del CONSORCIO GRUPO 3 con Nit. 901.769.200-6, en su condición de Interventor del Contrato de Obra Pública No. IND-23-4469, actuando en nombre y representación de INDERVALLE, de una parte, y por la otra, BRENDA LIZETH MURILLO BARCO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1006. 166.501, Representante Legal de CONSTRUPACICOL S.A. S ZOMAC con Nit. 901.526.894-4, en calidad de Contratista de Obra, se reunieron en las instalaciones de INDERVALLE, con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato una vez que:

1. Tiene el registro presupuestal No. 1123 del 22 de Diciembre de 2023.
2. Las garantías, póliza de Cumplimiento No. 420- 47- 994000042515, Anexo 0, Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 420- 74- 994000010243, Anexo 0, expedidas por



ACTA DE INICIO
Contrato de obra INJ-24-8017

INSTITUTO DE LA JUVENTUD
REPUBLICA DE CUBA
SISTEMA DE GESTION

Contratante
INJUV
Ordenador del Contrato
Cédula de Ciudadanía
Contratista
INJUV
Representante Local
Cédula de Ciudadanía
Intervento
Representante Local
Cédula de Ciudadanía
Contrato
Tipo de contrato
Objeto Objeto

Valor
Lugar
Fecha de inicio
Fecha de término

C.D.P.:
R.M.:
Los suscritos a saber: EL CAJON MATEO RAMIREZ, ingeniero en obras, y EL CAJON MATEO RAMIREZ, ingeniero en obras, ambos con cédulas de ciudadanía No. 700 428 y 700 429 respectivamente, en el contrato No. 24-8017, celebrado en la ciudad de La Habana, el día 15 de mayo de 1980, por el que se encomendó a los suscritos la ejecución de las obras de construcción y reparación de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de La Habana, y en virtud de lo establecido en el artículo 150 del Reglamento de Contratos de Obra, se ha acordado que los suscritos se comprometen a cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y a presentar los informes de avance de obra, de acuerdo a lo establecido en el artículo 150 del Reglamento de Contratos de Obra.

1. El tiempo de ejecución de las obras será de 120 días hábiles, a contar desde la fecha de inicio de las obras, y se terminará el día 15 de agosto de 1980.

2. Las partes se comprometen a cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y a presentar los informes de avance de obra, de acuerdo a lo establecido en el artículo 150 del Reglamento de Contratos de Obra.

Responsables: EL CAJON MATEO RAMIREZ, ingeniero en obras, y EL CAJON MATEO RAMIREZ, ingeniero en obras, ambos con cédulas de ciudadanía No. 700 428 y 700 429 respectivamente.

En fe de lo cual, se firmó en la ciudad de La Habana, el día 15 de mayo de 1980, en dos ejemplares, uno de los cuales se conserva en el archivo del INJUV, y el otro se entrega al contratista.

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN ACTA DE INICIO Contrato de obra IND-23-5027		CODIGO	FO-400-017
			VERSIÓN	1
			APROBADO	18/12/2018


Aseguradora Solidaria de Colombia, fueron aprobadas por la Secretaría General de INDERVALLE.


- El Interventor certifica que el Contratista de Obra cumple con los requisitos exigidos para el inicio del Contrato.

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre del año dos mil veintitrés (2023).

El Interventor,

El Contratista de Obra,


JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ
 Representante Legal
 CONSORCIO GRUPO 3


BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
 Representante Legal
 CONSTRUPACICOL S.A.S ZOMAC

1971

1972

1973

1974

INSTITUTO DEL DEPORTE
REPUBLICA DE EL SALVADOR
SISTEMA DE EDUCACION



ACTA DE
CONVENCION DE LOS

El presente documento tiene por objeto...

...

...

...

El presente...

...

...

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. IND-23-5027 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA "INDERVALLE" Y CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	CÓDIGO	PA-FO-240-001
		VERSIÓN	4
		APROBADO	14/AGOS/2023

OtroSí 1 del Contrato de Obra No. IND-23-5027

JUAN CARLOS RUEDA ANGEL, mayor de edad, domiciliado en Santiago de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.501.292 de Cali, quien obra en nombre y representación del **INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE**, por delegación del Gerente General a través de la Resolución IND-SG-0705 del 23 de junio de 2022 en su artículo 2, párrafo 3, modificada mediante Resolución IND SG No. 144 del 14 de febrero de 2023, y a su vez, esta última modificada parcialmente por la Resolución IND SG No. 261 del 01 de marzo de 2023. Establecimiento Público del Orden Departamental, creado mediante Ordenanza No. 022 del veintiséis (26) de noviembre de 1997, con NIT. No. 805.012.896-4, en su calidad de Subgerente de Infraestructura Deportiva, nombrado mediante Acta de Posesión No. 15-022 del siete (07) de octubre de 2022, quien por delegación queda facultado, cumpliendo con el literal d) del artículo 16, de la Ordenanza 022 del veintiséis (26) de noviembre de 1997 y el Literal j) del artículo 18 de los Estatutos Internos de INDERVALLE, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y el Acuerdo 007 del 12 de diciembre de 2022, expedido por la Junta Directiva del Instituto, quien en adelante y para los efectos del mismo, se denominará EL CONTRATANTE y **CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC**, identificada con Nit No. 901526894-4, representado legalmente por la señora **BRENDA LIZETH MURILLO BARCO**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No.1.006.166.501 de Cali, quien se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el presente **OTROSÍ No. 01 de MODIFICACIÓN** al Contrato de Obra No. IND-23-5027, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

1. Que el INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA -INDERVALLE (en adelante, "INDERVALLE") elaboró los Estudios Previos, Análisis del Sector, Matriz de Riesgos, Proyecto de pliego de condiciones definitivo surtiendo las etapas de publicación con el objeto de adelantar la Licitación Pública No. **IND-23-ID-07-4469** cuyo objeto es "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FLOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO

 INDERVALLE INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. IND-23-5027 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA "INDERVALLE" Y CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	CÓDIGO	PA-FO-240-001
		VERSIÓN	4
		APROBADO	14/AGOS/2023

ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA". Que mediante Resolución IND-SG-1518 del 10 de noviembre de 2023, luego de agotar los procedimientos administrativos pertinentes y necesarios, se procedió, entre otras cuestiones, a adjudicar el GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA a la empresa CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOCAM.

- 2. Que, el día 22 de diciembre del 2023 se celebró el contrato de obra No. IND-23-5027 entre **INDERVALLE** y la empresa CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOCAM, cuyo objeto es: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FLOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".
- 3. Que el Acta de Inicio del Contrato de Obra No. IND-23-5027, se suscribió el día 28 de diciembre de 2023, siendo el plazo de ejecución del contrato hasta el día 30 de junio de 2024.
- 4. Que, el contrato de obra en su cláusula 5 establece como **VALOR DEL CONTRATO**, la suma de **MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS (\$ 1.426.801.042)** MCTE incluido AIU, para el GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
- 5. Que, así mismo, el referido contrato consagra en su cláusula 8: "**FORMA DE PAGO.** (...) La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 70% del valor del contrato. El 30% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. Las actas de pagos parciales por avance de obra deberán contener como mínimo el Diez (10%) de ejecución de obra para su presentación, de igual manera, es preciso indicar que las mismas deberán ser avaladas y aprobadas por el Interventor y el funcionario designado por EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION INDERVALLE para la supervisión de la interventoría de obra".
- 6. Que, el día 26 de diciembre de 2023, el contratista de obra CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOCAM, a través de su representante legal dirigió oficio a INDERVALLE solicitando la modificación de la cláusula 8 del contrato, referida a la FORMA DE PAGO, en los siguientes términos:

"(...) por medio del presente oficio nos permitimos solicitar comedidamente a **INDERVALLE** realizar el cambio en la forma de pago, quedando esta de manera definitiva en un **95%**

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. IND-23-5027 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA "INDERVALLE" Y CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	CÓDIGO	PA-FO-240-001
		VERSIÓN	4
		APROBADO	14/AGOS/2023

correspondiente a pago en actas parciales y un 5% correspondiente a la liquidación, para soportar dicha petición se allega a ustedes un informe técnico donde se relacionan gastos fijos que se tendrán en el desarrollo de la obra.

INFORME TÉCNICO: Como se puede observar en nuestra propuesta económica, el capítulo de la **CIMENTACIÓN** tiene un valor superior a los **CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS \$110.000.000**, la sola **ESTRUCTURA METALICA** incluida la **CUBIERTA** posee un valor cercano a los **QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS \$575.000.000**. solamente el valor de estas actividades sumaria **SEISIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS \$685.000.000**, si a estos valores se le aplica su correspondiente porcentaje de **AIU (36%)**, para estas actividades nos daría un valor de ejecución de **NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS \$931.000.000**, ahora bien como lo estableció la entidad en los pliegos de condiciones y como quedo reflejado en la propuesta económica y como se le informo a los proponentes estos valores tendrían un incremento del **14.26%** por contratarse la obra en el año 2023 y ejecutarse en la vigencia 2024. Esto ya nos daría un valor final de aproximadamente de **MIL SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS \$1.065.000.000**. Cifra que equivaldría casi al **75%** del valor contractual (**1426.801.042.**).

Se hace alusión solo a estas actividades porque son las que se realizan con compras de contado, pues para insumos como el cemento, materiales pétreos y el acero no se consiguen créditos, estas compras se hacen de contado. Situación que la debe de asumir el contratista máximo cuando la obra a ejecutar tampoco cuenta con un **ANTICIPO**.

También cabe recalcar que en el ejercicio anterior solo se están tratando unas actividades específicas, quedando por fuera otras que son muy significativas como son las **hidrosanitarias, eléctricas etc.** Las cuales por lógica también se construirán, pero se encuentran por fuera del porcentaje del 75%, lo que hace técnicamente más desafiante la ejecución con la forma planteada por la entidad de pago de un 70% para cancelar y un 30% para liquidar.

Por tal motivo se le solicita muy comedidamente a la entidad se reevalúe esta condición de pago y se aplique la consagrada en el Anexo 4 - Minuta del contrato aplicando la forma de pago igual a 95% con actas parciales y 5% con la liquidación.

Por otro lado, debemos de analizar que técnicamente al dejar un 30% de pago para cancelarse con la liquidación, el cual supera incluso el porcentaje de utilidad que uno podría asumir que se pagase así, se está financiando la obra por parte del contratista, situación a la cual el ejecutor no debe de someterse, máximo cuando los recursos son del estado".

- 7. Que, en virtud de lo anterior, el Supervisor del contrato en mención, Arquitecto **NICOLAS TRIANA CASTILLO**, dirigió Oficio No. 600-17129-23 fechado el 28 de diciembre de 2023 al Subgerente de Infraestructura Deportiva de INDERVALLE, Arquitecto **Juan Carlos Rueda Ángel**, en el cual informa que:

 INDERVALLE INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. IND-23-5027 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA "INDERVALLE" Y CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	CÓDIGO	PA-FO-240-001
		VERSIÓN	4
		APROBADO	14/AGOS/2023

"(...) atendiendo la solicitud del contratista CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOCAM, en mi calidad de Supervisor del Contrato de Obra No. IND-23-5027, se procedió a analizar la forma de pago establecida en el contrato, la cual consiste en pagos parciales por avance de obra, hasta el 70% del valor del contrato y el 30% restante contra liquidación del contrato; y se observa que según lo indicado por el contratista, el contrato posee ciertas condiciones técnicas relacionadas con la compra anticipada de los materiales necesarios para llevar a cabo la obra, tales como los concretos y aceros para la cimentación y la estructura metálica (incluida la cubierta), que deben ser adquiridos al inicio del proceso para la prefabricación y que junto con el AIU del 36% tendrían un costo superior al 70% inicial, siendo materiales indispensables y fundamentales para iniciar la ejecución del contrato, así como también existen otras actividades significativas en costo que requieren compras de insumos, referidas a la parte hidrosanitaria y eléctrica, siendo todos insumos que se cancelan de contado, lo cual podría llegar a afectar el flujo de efectivo del contratista si su retorno o pago no se hace de acuerdo al avance que se refleje en la obra, teniendo en cuenta que el 30% restante del valor contrato se pagaría una vez se haga la liquidación, es decir, por fuera del plazo contractual, lo cual podría llegar a afectar la ejecución del contrato y su cumplimiento.

No obstante lo anterior, una vez analizada la solicitud y justificación de CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOCAM, se advierte que, toda vez que el presente contrato de obra es financiado con recursos del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR), en la actualidad conforme al flujo de caja financiero existente de regalías para este contrato, la forma de pago solo podría ser modificada en un 90% contra actas de obra de avance parcial y un 10% contra la liquidación y no tal como lo solicitó el contratista, sin embargo, se deja presente que esto no afecta de ninguna manera la disponibilidad presupuestal de la entidad, y por sobre todo, dado que la contratación estatal se asocia al interés general del Estado en cumplir sus fines, es interés de las partes mantener vigente el contrato inicial suscrito, a fin de culminar satisfactoriamente su objeto, que es entregar la obra a la comunidad del Distrito Especial de Buenaventura, por lo cual, se hace necesario sin desconocer el principio de legalidad administrativa y dentro del marco del ejercicio de la autonomía de la voluntad, del interés general, y del principio de conservación del contrato, suscribir el presente otrosí modificadorio".

- Que, en consecuencia, se procederá a modificar la cláusula octava del contrato de obra No. IND-23-5027, correspondiente a la FORMA DE PAGO en el sentido de que el valor del contrato será cancelado en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el **90%** del valor del contrato. El **10%** restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.
- Que, la modificación citada se hace necesaria para seguir garantizando el eficaz desarrollo y el cumplimiento del contrato de obra, fines, metas y objetivos trazados desde el plan estratégico del Instituto y el Departamento del Valle del

 INDERVALLE INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO PA-FO-240-001
	OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. IND-23-5027 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA “INDERVALLE” Y CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC		VERSIÓN 4
			APROBADO 14/AGOS/2023

Cauca y con los principios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia de la función administrativa.

10. Que, mediante oficio No. 600-17130-23 de fecha 28 de diciembre de 2023, el ordenador del gasto del contrato de obra No. IND-23-5027, Subgerente de Infraestructura Deportiva, solicitó aval de legalidad a la secretaria general y autorización de modificación de contrato a la Gerencia para la suscripción del **OTROSÍ No. 1 DE MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE PAGO** al citado Contrato.
11. Que, mediante aval de legalidad emitido por Secretaría General y autorización emitida por Gerencia de fecha 28 de diciembre de 2023, mediante consecutivo No. 1713, se aprobó la suscripción del presente otrosí.
12. Que, en consecuencia, se reconoce la importancia de atender esta solicitud, por lo cual se motiva la modificación del Contrato de Obra N° IND-23-5027, a través del presente Otrosí N° 1, modificándose la cláusula 8 FORMA DE PAGO, de conformidad con lo expresado anteriormente y con fundamento en lo estipulado en la siguiente normatividad y jurisprudencia:
 - Que la contratación estatal busca satisfacer los fines estatales, de acuerdo a lo consignado en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993: *“Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”*.
 - Los numerales 1 y 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 1.993 titulado “De los medios que pueden utilizar las entidades estatales para el cumplimiento del objeto contractual”, señala que, para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato podrán Interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas e introducir modificaciones a lo contratado.
 - La Ley 80 de 1993, en su artículo 40, establece que las partes podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran para el cumplimiento de los fines estatales.

 INDERVALLE Administración del Deporte y la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. IND-23-5027 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA "INDERVALLE" Y CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	CÓDIGO	PA-FO-240-001
		VERSIÓN	4
		APROBADO	14/AGOS/2023


- Que en concepto 1439 de 18 de Julio de 2002 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se menciona: *"...Roberto Dromi. Derecho Administrativo. Edición 5a, pág. 348. "El principio de mutabilidad de los contratos administrativos es una consecuencia impuesta por finalidades del interés público, dado que con ellos se tiende a lograr una más eficiente realización de La "justicia distributiva (...) las modificaciones en el contrato pueden traducirse tanto en aumento (adicionales) como en una disminución (reducciones) de las prestaciones". De lo anterior resulta claro que es un deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación; es un imperativo de su gestión, al cual no puede sustraerse so pena de incurrir en responsabilidad por omisión, pues iría en contra de lo previsto en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993.*
- Así mismo, la Corte Constitucional en Sentencia C - 300 de 2012, manifestó que *"Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros (negrilla fuera de texto). entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal.*
- Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en **concepto del 13 de agosto de 2009:**

*"La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que **la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo***

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	PA-FO-240-001
	OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. IND-23-5027 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA "INDERVALLE" Y CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC		VERSIÓN	4
			APROBADO	14/AGOS/2023

del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado" (negrilla fuera de texto).

- Que al respecto de los fines de la contratación estatal y las modificaciones a los contratos estatales el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han establecido lo siguiente: *"...El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos "instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas. El interés general, además de guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a regular el régimen de contratación administrativa, determina las actuaciones de la Administración, de los servidores que la representan y de los contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de las obligaciones generales de todo contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los fines del Estado..." (Sentencia C-713/09 de la Corte Constitucional).*
- A su vez, el Consejo de Estado se ha pronunciado en el siguiente sentido: *"...Los cambios o ajustes a los contratos estatales que reúnan las siguientes condiciones pueden ser realizados válidamente, en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad y dando primicia al fin del contrato: (i) que resulten necesarios para la adecuada ejecución del contrato y el logro de la finalidad perseguida con el mismo, debido a hechos sobrevinientes y no previstos al momento de su celebración; (ii) que mejoren o amplíen la protección de los derechos, activos e intereses del Estado, sin generar un desequilibrio económico en contra del contratista; (iii) que no resulten contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres; (iv) que no modifiquen sustancialmente las condiciones esenciales del proceso de contratación y del contrato a celebrar, tales como el objeto principal del contrato (o "núcleo del objeto"), los factores de evaluación y selección, la clase o modalidad del contrato, etc., y (iv) que no supongan para el contratista una situación más ventajosa de la que tenía frente a los otros interesados (por ejemplo, los precalificados) y oferentes durante el proceso de contratación. Esta última situación podría darse si pudiera inferirse razonablemente que la modificación contractual que se pretenda efectuar, de haberse hecho durante el proceso de*

 INDERVALLE SERVICIO DE DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. IND-23-5027 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA "INDERVALLE" Y CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	CÓDIGO	PA-FO-240-001
		VERSIÓN	4
		APROBADO	14/AGOS/2023

selección, hubiera implicado la participación de oferentes adicionales, o una variación en las condiciones de participación de los proponentes y/o en el orden de elegibilidad de sus ofertas, en relación con la que se tuvo en cuenta para la adjudicación ...” (consejero ponente: ÁLVARO NAMÉN VARGAS, Bogotá D.C., quince (15) de agosto de dos mil diecisiete (2017), Radicación número: 11001-03-06-000-2017-00098-00 – 2346-). Por lo tanto, es deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los objetos contratados y el logro del fin perseguido con la contratación, en este caso del convenio en comento.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se procede a la suscripción y perfeccionamiento del presente **Otrosí No. 1 DE MODIFICACIÓN**, del Contrato de Obra No. **No. IND-23-5027**, el cual se registrá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la cláusula **OCTAVA** del Contrato de Obra No. **No. IND-23-5027**, relacionada con la forma de pago, la cual quedará así:

“CLÁUSULA 8: FORMA DE PAGO: EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION INDERVALLE pagará al CONTRATISTA conforme a lo descrito en la Minuta del Contrato respectivo. En concordancia, el valor de las Actas de avance de Obra corresponderá a la sumatoria de los valores por los conceptos que a continuación se listan, y según lo definido en el Contrato:

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 90% del valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

Las actas de pagos parciales por avance de obra deberán contener como mínimo el Diez (10%) de ejecución de obra para su presentación, de igual manera, es preciso indicar que las mismas deberán ser avaladas y aprobadas por el Interventor y el funcionario designado por EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION INDERVALLE para la supervisión de la interventoría de obra.

La entidad efectuará al Contratista los pagos por acta de avance presentada, de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas

 INDERVALLE INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. IND-23-5027 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA "INDERVALLE" Y CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	CÓDIGO	PA-FO-240-001
		VERSIÓN	4
		APROBADO	14/AGOS/2023

a satisfacción por la interventoría y supervisor de la entidad, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

Para proceder al pago se deberá anexar los siguientes documentos:

1. Factura debidamente diligenciada.
2. Acta de pago parcial debidamente diligenciada, en formato de la entidad, firmada por las partes. El acta se entregará en medio físico (impresa) y digital en formato Excel en tamaño de letra legible.
3. Informe de avance físico, económico, financiero y legal por parte del contratista. Se entregará en medio físico (impresa) y digital en formato Excel en tamaño de letra legible.
4. Informe de la supervisión y/o interventoría certificando que las obras a pagar se encuentran debidamente soportadas. Se entregará en medio físico (impresa) y digital en formato Excel en tamaño de letra legible.
5. Actas de modificación de cantidades de obra, debidamente diligenciada y aprobada por el ordenador del gasto.
6. Acta de fijación y aprobación de precios unitarios ítems no previstos o adicionales.
7. Análisis de precios unitarios de actividades adicionales o ítems no previstos debidamente aprobados por el ordenador del gasto.
8. Certificación del cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la seguridad social integral en salud, pensión y ARL y pago de parafiscales de conformidad con lo señalado por la Ley.

 INDERVALLE INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. IND-23-5027 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA "INDERVALLE" Y CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	CÓDIGO	PA-FO-240-001
		VERSIÓN	4
		APROBADO	14/AGOS/2023

- 9. *Copia del cronograma de avance de obra a la fecha del corte de obra, donde se verifique que el valor a pagar corresponde al porcentaje de avance físico ejecutado.*
- 10. *Copia de la bitácora de obra, debidamente diligenciada, firmada por las partes y actualizada a la fecha del corte de obra. (El libro de bitácora deberá llevarse en un libro foliado por cada frente de trabajo y deberá permanecer en cada frente de trabajo).*
- 11. *Cuadro del flujo de inversiones.*
- 12. *Registro fotográfico en medio impreso a color por cada frente de trabajo, indicando la actividad y la fecha de ejecución. (incluir en la primera acta, foto de la valla de cada frente de trabajo).*
- 13. *Soportes de los ensayos de laboratorios y demás formatos de control que sean requeridos por la entidad y/o el interventor".*

CLÁUSULA SEGUNDA: TERCERA: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Las demás cláusulas y estipulaciones pactadas en el contrato de obra, que no han sido modificadas, se conservan tal como fueron convenidas.

CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO. El presente otrosí No. 1 de modificación de la forma de pago, se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas partes a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

Proyectó: Paola Andrea Rojas Escobar	Abogada Contratista	Firma:
Revisó: Nicolas Triana Castillo	Asesor de Despacho	Firma: <i>Nicolas Triana</i>
Revisó: Camila Orozco G	Jefe Oficina Jurídica	
Revisó: Luz Stella Diaz Velez	Profesional universitario	Firma:
Aprobó: Aprobó: Jorge Eliecer Tamayo Muñoz	Secretario General	Firma:
Revisó y aprobó: Juan Carlos Rueda Ángel	Subgerente de Infraestructura Deportiva	Firma: <i>[Signature]</i>

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AUTORIZACIÓN MODIFICACION A CONTRATOS	CODIGO	PE-FO-220-134
		VERSIÓN	1
		APROBADO	06/MAR/2023

LA GERENCIA DEL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA CERTIFICA:

Que el INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA “INDERVALLE”, requiere realizar modificación al contrato No IND-23-5027 en la secretaria general, para ejecutar actividades conforme a la siguiente información.

Que, en consecuencia, ya se expidió aval de legalidad por parte de la secretaria general y se aprueba:

DOCUMENTO REQUERIDO	OBSERVACIONES
1. No. De Contrato 1.1. No De Proceso	IND-23-5027 IND-23-ID-07-4469
2. Certificado de Disponibilidad presupuestal.	CDP 1023 del 25/7/2023 por valor de \$ 4.053.381.399
3. Valor del contrato.	MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS MCTE (\$ 1.426.801.042)
4. Modificación	CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO: “(...) La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 70% del valor del contrato. El 30% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. Las actas de pagos parciales por avance de obra deberán contener como mínimo el Diez (10%) de ejecución de obra para su presentación, de igual manera, es preciso indicar que las mismas deberán ser avaladas y aprobadas por el Interventor y el funcionario designado por EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION INDERVALLE para la supervisión de la interventoría de obra (...).
5. Plazo	Plazo actual 30/06/2024
6. Garantías.	Póliza expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia, Garantía Única de Cumplimiento No. 420-47-994000042515 Anexo 0 del 27 de diciembre de 2023, la cual incluye los siguientes riesgos amparados, en los siguientes montos y plazos: cumplimiento: \$286.787.009,44, 22/12/2023-30/12/2024. Prestaciones Sociales: \$115.570.884,40, 22/12/2023 - 30/06/2027. Estabilidad y calidad de la obra: \$286.787.009,44, 5 años contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de recibo y entrega final de la obra. Póliza expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 420-74-994000010243, la cual incluye los siguientes riesgos amparados, en los siguientes montos: Predios, labores y

 INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AUTORIZACIÓN MODIFICACION A CONTRATOS	CODIGO	PE-FO-220-134
		VERSIÓN	1
		APROBADO	06/MAR/2023

	operaciones, contratista y subcontratistas, RCE Patronal, vehículos propios y no propios: \$232.000.000, 22/12/2023-30/06/2024.
--	---

Se precisa que hasta aquí no se ejerce un control de legalidad, solo se tiene un aval de legalidad por parte de secretaria general, y sobre el proceso pues será labor del área jurídica de cada dependencia velar por la coherencia con el ordenamiento jurídico vigente y garantizar que se ajuste a las disposiciones administrativas para su celebración y ejecución, y de parte del supervisor garantizar el cumplimiento del contrato.

Se indica igualmente, que conforme a lo expresado por el manual de contratación del Instituto, los objetos contractuales de los procesos de prestación de servicios deberán coincidir con actividades especializadas, profesionales, técnicas o de apoyo a la gestión que no puedan ser llevadas a cabo por el personal o es insuficiente en la entidad, siendo labor de cada Subgerencia verificar la coherencia con la normatividad de contratación estatal vigente y la normatividad administrativa, además de verificar que se observen los valores de contraprestación asignados conforme a las circulares internas existentes y garantizar que se trate de personas idóneas para el cumplimiento del objeto a contratar.

Si esta autorización no es utilizada antes de UN MES contados desde la fecha de expedición se considera revocada y como tal el proceso contractual no se considera autorizado.


En caso de utilizarse por fuera de los parámetros aquí establecidos, se dará traslado a la oficina encargada de ejercer las acciones disciplinarias que correspondan.

De acuerdo con la delegación recibida por cada Subgerente, este será responsable de la contratación conforme a la Ley.

Para constancia se firma en Santiago de Cali, el día 28 de diciembre del 2023.


DAYRA FAISURY DORADO GOMEZ
Gerente

Consecutivo de Autorización No. **1713**

Proyectó: Paola Andrea Rojas Escobar - Abogada Contratista	Firma: 
Aprobado: Maira Alejandra Cabrera Valencia - Asesor Gerencia	Firma: 

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AVAL DE LEGALIDAD	CÓDIGO	PE-FO-220-13 5
		VERSIÓN	1
		APROBADO	14/08/2023

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE, SE PERMITE EMITIR EL PRESENTE AVAL DE LEGALIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN LA RESOLUCIÓN IND-SG-144 DE FEBRERO 23 DE 2023 Y LA RESOLUCIÓN IND-SG-261 DE MARZO 1 DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCIÓN IND-SG-144 DE FEBRERO 23 DE 2023:

Mediante oficio No. 600-17130-23 del 28 de diciembre de 2023, la Subgerencia de Infraestructura Deportiva remitió para la revisión de la Secretaría General de INDERVALLE, los documentos contractuales tendientes a solicitar aval de legalidad para realizar OTROSÍ NO. 1 DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE OBRA NO. IND-23-5027, a suscribirse entre el INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE y el contratista CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC, identificado con el NIT. 901.526.894.

En virtud de lo anterior, mediante la presente comunicación procedo a informar el resultado de la revisión jurídica realizada al proceso mencionado, la cual, se realizó conforme a las disposiciones vigentes en materia de contratación estatal, y especialmente a lo preceptuado por la Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015 y la resolución de delegación Nro. IND-SG-0705 del 23 de junio de 2022 y sus modificatorias, la cual, se concreta en los siguientes términos:

DOCUMENTO REQUERIDO	OBSERVACIONES
1. Plan anual de adquisiciones.	La presente contratación se encuentra prevista dentro del plan anual de adquisiciones reportado por la Subgerencia Administrativa y Financiera de INDERVALLE.
2. Objeto.	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, LE DISTRICTO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".
3. Certificado de disponibilidad presupuestal.	Certificados de disponibilidad presupuestal del Sistema General de Regalías: N° 1023 del 25 de julio de 2023 por valor de CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$4.053.381.399), de los cuales para el presente contrato se comprometen MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS (\$1.426.801.042).
4. Valor del contrato.	El presupuesto oficial asignado por INDERVALLE, para la presente selección a través de licitación pública según el estudio del mercado es por la suma de MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS (\$1.426.801.042) MCTE incluido AUI.
5. Valor adicionar.	N/A.
6. Modificación.	Modificar el contenido de la cláusula ocho relacionada con la forma del pago.
7. Plazo.	El plazo de ejecución para los dos grupos de adjudicación será hasta el treinta (30) de junio de 2024 contados a partir de la fecha de inicio del contrato una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AVAL DE LEGALIDAD	CÓDIGO	PE-FO-220-135
		VERSIÓN	1
		APROBADO	14/08/2023

8. Plazo a prorrogar.	N/A.
9. Garantías.	Aseguradora: Solidaria de Colombia Número de póliza: 420-47-994000042515. Número de anexo: 0 del 27 de diciembre de 2023. Ramo: cumplimiento en favor de entidades estatales. Detalle amparos asegurados: cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, estabilidad y calidad de la obra. Aseguradora: Solidaria de Colombia Número de póliza: 420-74-994000010243 Número de anexo: 0 del 27 de diciembre de 2023. Ramo: responsabilidad civil extracontractual. Detalle amparos asegurados: predios, labores y operaciones, contratistas y subcontratistas, RCE patronal, y vehículos propios y no propios.
10. Supervisión.	Se ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de un interventor externo a la entidad: CONSORCIO GRUPO 3.
11. Personas naturales - contratistas.	Se anexaron los documentos solicitados en la lista de chequeo.
12. Justificación suscrita por el supervisor y que avala la suscripción del otrosí.	Se anexó justificación suscrita por el supervisor que avala la suscripción del otrosí.



Se recuerda que en virtud de la delegación efectuada mediante la Resolución IND-SG-0705 del 23 de junio de 2022, es de exclusiva responsabilidad del delegatario adelantar el proceso de conformidad con las normas que regulan la contratación estatal, los principios de transparencia, economía, responsabilidad, y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007.

En consecuencia, y de la revisión jurídica realizada, se encuentra que los documentos se ajustan a los requisitos propios del tipo de contrato, y por lo tanto, se procede a **IMPARTIR AVAL DE LEGALIDAD FAVORABLE** para la presente actuación: OTROSÍ NO. 1 DE MODIFICACIÓN.

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente,


JORGE ELIÉCER TAMAYO MUÑOZ
Secretario General
INDERVALLE

Proyectó: Pablo Eider Jurado Valencia - Abogado contratista	Firma: 
Revisó: Luz Stella Díaz Vélez - Profesional universitario	Firma: 

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN OFICIOS	CÓDIGO	FO-220-016
		VERSIÓN	2
		APROBADO	18/12/2018

Santiago de Cali, diciembre 28 de 2023
600-17130-23

Doctora
DAYRA FAISURY DORADO GOMEZ
Gerente

Doctor
JORGE ELIECER TAMAYO MUÑOZ
Secretario General

ASUNTO: Solicitud de aval de legalidad y autorización de modificación de contrato por parte de la Secretaría General y la Gerencia para suscripción de OTROSÍ No. 1 DE MODIFICACIÓN, al Contrato de Obra No. IND-23-5027.

En mi calidad de Ordenador del Gasto, respetuosamente solicito emitir aval de legalidad y autorización de modificación de contrato por parte de Gerencia, en razón a lo estipulado en la Resolución IND- SG-0705 del 23 de junio de 2022 en su artículo 2, parágrafo 3, modificada mediante Resolución IND SG No. 144 del 14 de febrero de 2023, y a su vez, esta última modificada parcialmente por la Resolución IND SG No. 261 del 01 de marzo de 2023 para la suscripción de OTROSÍ No 1 de modificación al contrato obra No. IND-23-5027, teniendo en cuenta la justificación presentada por el supervisor mediante oficio de fecha 26 de diciembre de 2023.

Conforme a los siguientes puntos:

1. Que el INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA -INDERVALLE (en adelante, "INDERVALLE") elaboró los Estudios Previos, Análisis del Sector, Matriz de Riesgos, Proyecto de pliego de condiciones definitivo surtiendo las etapas de publicación con el objeto de adelantar la Licitación Pública No. **IND-23-ID-07-4469** cuyo objeto es "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FLOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".
2. Que mediante Resolución IND-SG-1518 del 10 de noviembre de 2023, luego de agotar los procedimientos administrativos pertinentes y necesarios, se procedió, entre otras cuestiones, a adjudicar el GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA a la empresa CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOCAM.

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN OFICIOS	CÓDIGO	FO-220-016
		VERSIÓN	2
		APROBADO	18/12/2018

3. Que, el día 22 de diciembre del 2023 se celebró el contrato de obra No. IND-23-5027 entre **INDERVALLE** y la empresa **CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOCAM**, cuyo objeto es: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FLOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".
4. Que el Acta de Inicio del Contrato de Obra No. IND-23-5027, se suscribió el día 28 de diciembre de 2023, siendo el plazo de ejecución del contrato hasta el día 30 de junio de 2024.
5. Que, el contrato de obra en su cláusula 5 establece como **VALOR DEL CONTRATO**, la suma de **MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS (\$ 1.426.801.042)** MCTE incluido AIU, para el GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
6. Que, así mismo, el referido contrato consagra en su cláusula 8: "**FORMA DE PAGO.** (...) La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 70% del valor del contrato. El 30% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. Las actas de pagos parciales por avance de obra deberán contener como mínimo el Diez (10%) de ejecución de obra para su presentación, de igual manera, es preciso indicar que las mismas deberán ser avaladas y aprobadas por el Interventor y el funcionario designado por EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION INDERVALLE para la supervisión de la interventoría de obra".
- 4 Que el día 26 de diciembre de 2023, el contratista de obra **CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOCAM**, a través de su representante legal dirigió oficio a **INDERVALLE** solicitando la modificación de la cláusula 8 del contrato, referida a la **FORMA DE PAGO**, en los siguientes términos:

"(...) por medio del presente oficio nos permitimos solicitar comedidamente a **INDERVALLE** realizar el cambio en la forma de pago, quedando esta de manera definitiva en un **95%** correspondiente a pago en actas parciales y un **5%** correspondiente a la liquidación, para soportar dicha petición se allega a ustedes un informe técnico donde se relacionan gastos fijos que se tendrán en el desarrollo de la obra.

INFORME TÉCNICO: Como se puede observar en nuestra propuesta económica, el capítulo de la **CIMENTACIÓN** tiene un valor superior a los **CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS \$110.000.000**, la sola **ESTRUCTURA METALICA** incluida la **CUBIERTA** posee un valor cercano a los **QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS \$575.000.000**. solamente el valor de estas actividades sumaria **SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS \$685.000.000**, si a estos valores se le aplica su correspondiente porcentaje de **AIU (36%)**, para estas actividades nos daría un valor de ejecución de **NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS \$931.000.000**, ahora bien como lo estableció la entidad en los pliegos de condiciones y como quedo reflejado en la propuesta económica y como se le informo a los proponentes estos valores tendrían un incremento del **14.26%** por contratarse la obra en el año 2023 y ejecutarse en la vigencia 2024. Esto ya nos daría un valor final de aproximadamente de **MIL SESENTA Y**

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN OFICIOS	CÓDIGO	FO-220-016
		VERSIÓN	2
		APROBADO	18/12/2018

CINCO MILLONES DE PESOS \$1.065.000.000. *Cifra que equivaldría casi al 75% del valor contractual (1426.801.042.).*

Se hace alusión solo a estas actividades porque son las que se realizan con compras de contado, pues para insumos como el cemento, materiales pétreos y el acero no se consiguen créditos, estas compras se hacen de contado. Situación que la debe de asumir el contratista máximo cuando la obra a ejecutar tampoco cuenta con un ANTICIPO.

También cabe recalcar que en el ejercicio anterior solo se están tratando unas actividades específicas, quedando por fuera otras que son muy significativas como son las hidrosanitarias, eléctricas etc. Las cuales por lógica también se construirán, pero se encuentran por fuera del porcentaje del 75%, lo que hace técnicamente más desafiante la ejecución con la forma planteada por la entidad de pago de un 70% para cancelar y un 30% para liquidar.

Por tal motivo se le solicita muy comedidamente a la entidad se reevalúe esta condición de pago y se aplique la consagrada en el Anexo 4 - Minuta del contrato aplicando la forma de pago igual a 95% con actas parciales y 5% con la liquidación.

Por otro lado, debemos de analizar que técnicamente al dejar un 30% de pago para cancelarse con la liquidación, el cual supera incluso el porcentaje de utilidad que uno podría asumir que se pagase así, se está financiando la obra por parte del contratista, situación a la cual el ejecutor no debe de someterse, máximo cuando los recursos son del estado".

6. Que, en virtud de lo anterior, el Supervisor del contrato en mención, Arquitecto NICOLAS TRIANA CASTILLO, dirigió Oficio No. 600-17129-23 fechado el 28 de diciembre de 2023 al Subgerente de Infraestructura Deportiva de INDERVALLE, Arquitecto Juan Carlos Rueda Ángel, en el cual informa que:

"(...) atendiendo la solicitud del contratista CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOCAM, en mi calidad de Supervisor del Contrato de Obra No. IND-23-5027, se procedió a analizar la forma de pago establecida en el contrato, la cual consiste en pagos parciales por avance de obra, hasta el 70% del valor del contrato y el 30% restante contra liquidación del contrato; y se observa que según lo indicado por el contratista, el contrato posee ciertas condiciones técnicas relacionadas con la compra anticipada de los materiales necesarios para llevar a cabo la obra, tales como los concretos y aceros para la cimentación y la estructura metálica (incluida la cubierta), que deben ser adquiridos al inicio del proceso para la prefabricación y que junto con el AIU del 36% tendrían un costo superior al 70% inicial, siendo materiales indispensables y fundamentales para iniciar la ejecución del contrato, así como también existen otras actividades significativas en costo que requieren compras de insumos, referidas a la parte hidrosanitaria y eléctrica, siendo todos insumos que se cancelan de contado, lo cual podría llegar a afectar el flujo de efectivo del contratista si su retorno o pago no se hace de acuerdo al avance que se refleje en la obra, teniendo en cuenta que el 30% restante del valor contrato se pagaría una vez se haga la liquidación, es decir, por fuera del plazo contractual, lo cual podría llegar a afectar la ejecución del contrato y su cumplimiento.

No obstante lo anterior, una vez analizada la solicitud y justificación de CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOCAM, se advierte que, toda vez que el presente contrato de obra es financiado con recursos del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR), en la actualidad conforme al flujo de caja financiero existente de regalías para este contrato, la forma de pago solo podría ser modificada en un 90% contra actas de obra de avance parcial y un 10% contra la liquidación y no tal como lo solicitó el contratista, sin embargo, se deja presente que esto no afecta de ninguna manera la disponibilidad presupuestal de la entidad, y por sobre todo, dado que la contratación estatal se asocia al interés general del Estado en cumplir sus fines, es interés de las partes mantener vigente el contrato inicial suscrito, a fin de culminar satisfactoriamente su objeto, que es entregar la obra a la comunidad del Distrito Especial de Buenaventura, por lo cual, se hace necesario sin desconocer el principio de legalidad administrativa y dentro del marco del ejercicio de la

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN OFICIOS	CÓDIGO	FO-220-016
		VERSIÓN	2
		APROBADO	18/12/2018

autonomía de la voluntad, del interés general, y del principio de conservación del contrato, suscribir el presente otrosí modificatorio."

7. Que la modificación de la forma de pago solicitada se hace necesaria para seguir garantizando el eficaz desarrollo y el cumplimiento del contrato de obra, fines, metas y objetivos trazados desde el plan estratégico del Instituto y el Departamento del Valle del Cauca y con los principios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia de la función administrativa.
8. Que, se modificará la cláusula octava del contrato de obra No. IND-23-5027, correspondiente a la FORMA DE PAGO.
9. Que, en consecuencia, se reconoce la importancia de atender esta solicitud, por lo cual se motiva la modificación del Contrato de Obra N° IND-23-5027, a través del presente Otrosí N° 1, modificándose la cláusula 8 FORMA DE PAGO, de conformidad con lo expresado anteriormente y con fundamento en lo estipulado en la siguiente normatividad y jurisprudencia:

- Que la contratación estatal busca satisfacer los fines estatales, de acuerdo a lo consignado en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, *"Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines."*
- Los numerales 1 y 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 1.993, titulado "De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual", señala que, para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato podrán Interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas e introducir modificaciones a lo contratado.
- La Ley 80 de 1993, en su artículo 40, establece que las partes podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran para el cumplimiento de los fines estatales.
- Que en concepto 1439 de 18 de Julio de 2002 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se menciona: *"...Roberto Dromi. Derecho Administrativo. Edición 5a, pág. 348. "El principio de mutabilidad de los contratos administrativos es una consecuencia impuesta por finalidades del interés público, dado que con ellos se tiende a lograr una más eficiente realización de La "justicia distributiva (...) las modificaciones en el contrato pueden traducirse tanto en aumento (adicionales) como en una disminución (reducciones) de las prestaciones". De lo anterior resulta claro que es un deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación; es un imperativo de su gestión, al cual no puede*

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN OFICIOS		CÓDIGO	FO-220-016
			VERSIÓN	2
			APROBADO	18/12/2018

sustraerse so pena de incurrir en responsabilidad por omisión, pues iría en contra de lo previsto en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993.

- Que la Corte Constitucional en Sentencia C - 300 de 2012, manifestó que *"...Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para (...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación"* (negrilla fuera de texto). En el mismo sentido, en la **Sentencia C-949 de 2001**, la Corte Constitucional señaló que **las prórrogas de los contratos – como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal.**
- Que, sobre los fines de la contratación estatal y las modificaciones a los contratos estatales, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han establecido lo siguiente: *"...El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos "instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas. El interés general, además de guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a regular el régimen de contratación administrativa, determina las actuaciones de la Administración, de los servidores que la representan y de los contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de las obligaciones generales de todo contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los fines del Estado..."* (Sentencia C-713/09 de la Corte Constitucional).
- A su vez, el Consejo de Estado se ha pronunciado en el siguiente sentido: *"...Los cambios o ajustes a los contratos estatales que reúnan las siguientes condiciones pueden ser realizados válidamente, en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad y dando primicia al fin del contrato: (i) que resulten necesarios para la adecuada ejecución del contrato y el logro de la finalidad perseguida con el mismo, debido a hechos sobrevinientes y no previstos al momento de su celebración; (ii) que mejoren o amplíen la protección de los derechos, activos e intereses del Estado, sin generar un desequilibrio económico en contra del contratista; (iii) que no resulten contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres; (iv) que no modifiquen sustancialmente las condiciones esenciales del proceso de contratación y del contrato a celebrar, tales como el objeto principal del contrato (o "núcleo del objeto"), los factores de evaluación y selección, la clase o modalidad del contrato, etc., y (v) que no supongan para el contratista una situación más ventajosa de la que tenía frente a los otros interesados (por ejemplo, los precalificados) y oferentes durante el proceso de contratación. Esta última situación podría darse si pudiera*



	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN OFICIOS		CÓDIGO	FO-220-016
			VERSIÓN	2
			APROBADO	18/12/2018

inferirse razonablemente que la modificación contractual que se pretenda efectuar, de haberse hecho durante el proceso de selección, hubiera implicado la participación de oferentes adicionales, o una variación en las condiciones de participación de los proponentes y/o en el orden de elegibilidad de sus ofertas, en relación con la que se tuvo en cuenta para la adjudicación ...” (Consejero ponente: ÁLVARO NAMÉN VARGAS, Bogotá D.C., quince (15) de agosto de dos mil diecisiete (2017), Radicación número: 11001-03-06-000-2017-00098-00 – 2346-). Por lo tanto, es deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación, en este caso del Contrato en comento.

Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta la justificación presentada por el Supervisor, se hace necesario conforme a derecho se emita aval de legalidad favorable y autorización de modificación por parte de Gerencia, para la realización del **OTROSÍ No. 1 DE MODIFICACIÓN** al Contrato de Obra No. IND-23-5027.

Atentamente,


JUAN CARLOS RUEDA ÁNGEL
 Subgerente de Infraestructura Deportiva
 INDERVALLE

Proyectó:	Paola Andrea Rojas Escobar – Abogada Contratista	 
Revisó:	Álvaro José Bazurto Cubillos– Ingeniero Contratista	
Revisó:	Nicolás Triana – Arquitecto Asesor	

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN OFICIOS	CODIGO	FO-220-016
		VERSIÓN	2
		APROBADO	18/12/2018

Santiago de Cali, 28 de diciembre de 2023
600-17129-23

Arquitecto
JUAN CARLOS RUEDA ÁNGEL
Subgerente Infraestructura Deportiva
INDERVALLE
Ciudad

ASUNTO: Solicitud para suscripción de OTROSÍ No 1 DE MODIFICACIÓN, al Contrato de Obra N° IND-23-5027 - CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOCAM

En mi calidad de Supervisor del Contrato de Obra N° IND-23-5027, respetuosamente solicito autorización para la suscripción de OTROSÍ No. 1 de dicho contrato, en consecuencia de lo anterior, modificar: la forma de pago del contrato.

Lo anterior teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que, el día 22 de diciembre del 2023 se celebró el contrato de obra No. IND-23-5027 entre el INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE y la empresa CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOCAM, cuyo objeto es: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FLOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", por valor total de MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 1.426.801.042).
2. Que el Acta de Inicio del Contrato de Obra No. IND-23-5027, se suscribió el día 28 de diciembre de 2023, siendo el plazo de ejecución del contrato hasta el día 30 de junio de 2024.
3. Que, el contrato de obra en su cláusula 5 establece como **VALOR DEL CONTRATO**, la suma de **MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS (\$ 1.426.801.042) MCTE** incluido AIU, para el GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
4. Que, así mismo, el referido contrato consagra en su cláusula 8: **"FORMA DE PAGO. (...) La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 70% del valor del contrato. El 30% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. Las actas de pagos parciales por avance de obra deberán contener como mínimo el Diez (10%) de ejecución de obra para su presentación, de igual manera, es preciso indicar que las mismas deberán ser avaladas y aprobadas por el Interventor y el funcionario designado por EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION INDERVALLE para la supervisión de la interventoría de obra"**.

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN OFICIOS	CODIGO	FO-220-016
		VERSIÓN	2
		APROBADO	18/12/2018

5. Que, el contratista de obra CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOCAM, solicitó a INDERVALLE a través del oficio de fecha 26 de diciembre de 2023, la modificación de la forma de pago establecida en la cláusula 8 del contrato de obra, argumentando lo siguiente:

*"(...) por medio del presente oficio nos permitimos solicitar comedidamente a **INDERVALLE** realizar el cambio en la forma de pago, quedando esta de manera definitiva en un **95%** correspondiente a pago en actas parciales y un **5%** correspondiente a la liquidación, para soportar dicha petición se allega a ustedes un informe técnico donde se relacionan gastos fijos que se tendrán en el desarrollo de la obra.*

INFORME TÉCNICO: Como se puede observar en nuestra propuesta económica, el capítulo de la **CIMENTACIÓN** tiene un valor superior a los **CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS \$110.000.000**, la sola **ESTRUCTURA METALICA** incluida la **CUBIERTA** posee un valor cercano a los **QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS \$575.000.000**. solamente el valor de estas actividades sumaria **SEISIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS \$685.000.000**, si a estos valores se le aplica su correspondiente porcentaje de **AIU (36%)**, para estas actividades nos daría un valor de ejecución de **NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS \$931.000.000**, ahora bien como lo estableció la entidad en los pliegos de condiciones y como quedo reflejado en la propuesta económica y como se le informo a los proponentes estos valores tendrían un incremento del **14.26%** por contratarse la obra en año 2023 y ejecutarse en la vigencia 2024. Esto ya nos daría un valor final de aproximadamente de **MIL SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS \$1.065.000.000**. Cifra que equivaldría casi al **75%** del valor contractual (**1426.801.042.**).

*Se hace alusión solo a estas actividades porque son las que se realizan con compras de contado, pues para insumos como el cemento, materiales pétreos y el acero no se consiguen créditos, estas compras se hacen de contado. Situación que la debe de asumir el contratista máximo cuando la obra a ejecutar tampoco cuenta con un **ANTICIPO**.*

También cabe recalcar que en el ejercicio anterior solo se están tratando unas actividades específicas, quedando por fuera otras que son muy significativas como son las hidrosanitarias, eléctricas etc. Las cuales por lógica también se construirán, pero se encuentran por fuera del porcentaje del 75%, lo que hace técnicamente más desafiante la ejecución con la forma planteada por la entidad de pago de un 70% para cancelar y un 30% para liquidar.

Por tal motivo se le solicita muy comedidamente a la entidad se reevalúe esta condición de pago y se aplique la consagrada en el Anexo 4 - Minuta del contrato aplicando la forma de pago igual a 95% con actas parciales y 5% con la liquidación.

Por otro lado, debemos de analizar que técnicamente al dejar un 30% de pago para cancelarse con la liquidación, el cual supera incluso el porcentaje de utilidad que uno podría asumir que se pagase así, se está financiando la obra por parte del contratista, situación a la cual el ejecutor no debe de someterse, máximo cuando los recursos son del estado".

6. Que, atendiendo la solicitud del contratista CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOCAM, en mi calidad de Supervisor del Contrato de Obra No. IND-23-5027, se procedió a analizar la forma de pago establecida en el contrato, la cual consiste en pagos parciales por avance de obra, hasta el 70% del valor del contrato y el 30% restante contra liquidación del contrato; y se observa que según lo indicado por el contratista, el contrato posee ciertas condiciones técnicas relacionadas con la compra anticipada de los materiales necesarios para llevar a cabo la obra, tales como los concretos y aceros para la cimentación y la estructura metálica (incluida la cubierta), que deben ser adquiridos al inicio del proceso para la prefabricación y que junto con el AIU del 36% tendrían un costo superior al 70% inicial, siendo materiales indispensables y fundamentales para iniciar la ejecución del contrato, así como también existen otras actividades significativas en costo que requieren compras de insumos, referidas a la parte hidrosanitaria y eléctrica, siendo todos insumos que se cancelan de contado, lo cual podría llegar a afectar el flujo de efectivo del contratista si su retorno o pago no se hace de acuerdo al avance que se refleje en la obra,

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN OFICIOS	CODIGO	FO-220-016
		VERSIÓN	2
		APROBADO	18/12/2018

teniendo en cuenta que el 30% restante del valor contrato se pagaría una vez se haga la liquidación, es decir, por fuera del plazo contractual, lo cual podría llegar a afectar la ejecución del contrato y su cumplimiento.

No obstante lo anterior, una vez analizada la solicitud y justificación de CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOCAM, se advierte que, toda vez que el presente contrato de obra es financiado con recursos del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR), en la actualidad conforme al flujo de caja financiero existente de regalías para este contrato, la forma de pago solo podría ser modificada en un 90% contra actas de obra de avance parcial y un 10% contra la liquidación y no tal como lo solicitó el contratista, sin embargo, se deja presente que esto no afecta de ninguna manera la disponibilidad presupuestal de la entidad, y por sobre todo, dado que la contratación estatal se asocia al interés general del Estado en cumplir sus fines, es interés de las partes mantener vigente el contrato inicial suscrito, a fin de culminar satisfactoriamente su objeto, que es entregar la obra a la comunidad del Distrito Especial de Buenaventura, por lo cual, se hace necesario sin desconocer el principio de legalidad administrativa y dentro del marco del ejercicio de la autonomía de la voluntad, del interés general, y del principio de conservación del contrato, suscribir el presente otrosí modificatorio.

- 7. Que la modificación de la forma de pago solicitada se hace necesaria para seguir garantizando el eficaz desarrollo y el cumplimiento del convenio interadministrativo, fines, metas y objetivos trazados desde el plan estratégico del Instituto y el Departamento del Valle del Cauca y con los principios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia de la función administrativa.
- 8. Que, se modificará la cláusula octava del contrato de obra No. IND-23-5027, correspondiente a la FORMA DE PAGO.
- 9. Para justificar legalmente la solicitud de adición de recursos al convenio en mención se citan las siguientes normas:

Constitución Política de Colombia, Artículo 52 (Modificado por el Artículo 01, Acto Legislativo No. 02 de 2000), nuevo texto: "El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano.

El deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público social.

Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.

El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas (...)"

Los numerales 1 y 2 del Artículo 14 de la Ley 80 de 1.993 titulado "De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual", señala que, para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato podrán Interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas e introducir modificaciones a lo contratado.

Que en concepto 1439 de 18 de Julio de 2002 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se menciona: "...Roberto Dromi. Derecho Administrativo. ADICIÓN 5a, pág. 348. "El principio de mutabilidad de los contratos administrativos es una consecuencia impuesta por

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN OFICIOS	CODIGO	FO-220-016
		VERSIÓN	2
		APROBADO	18/12/2018

finalidades del interés público, dado que con ellos se tiende a lograr una más eficiente realización de La "justicia distributiva (...) las modificaciones en el contrato pueden traducirse tanto en aumento (adicionales) como en una disminución (reducciones) de las prestaciones". "...De lo anterior resulta claro que es un deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación; es un imperativo de su gestión, al cual no puede sustraerse so pena de incurrir en responsabilidad por omisión, pues iría en contra de lo previsto en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993.

En consecuencia, solicito se realice el trámite pertinente para que se expida aval de legalidad por parte de secretaria general y autorización de modificación del contrato por parte de la Gerencia, en virtud de la suscripción del referido otrosí No. 1 de modificación de la forma de pago del contrato de obra No. IND-23-5027.

Cordialmente,

Nicolas Triana
NICOLAS TRIANA CASTILLO
Supervisor contrato de obra No. IND-23-5027
INDERVALLE

Proyectó: Juan Pablo Martínez	Arquitecto Apoyo Técnico Indervalle
Revisó: Paola Andrea Rojas Escobar	Abogado Contratista. Apoyo Jurídico Indervalle

20230051201

Santiago de Cali, 26 de diciembre de 2023

SEÑORES

INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION INDERVALLE
- SUBGERENCIA ARQUITECTO JUAN CARLOS RUEDA



*** 20230051201 ***

Recibido : 2023-12-26 15:05:49
Radicado por : dramirezl
Remitente : Brenda Murillo Barco
Empresa : Zomac
Radicado a : GER - gerencia
Nro. Folios : 1 Nro. Anexos : 0

REFERENCIA	CONTRATO CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES". GRUPO 1: FRENTE 1. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACIÓN LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE: 2. ADECUACION CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1. FRENTE 3. ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA",
ASUNTO	SOLICITUD DE CAMBIO EN LA FORMA DE PAGO

CORDIAL SALUDO,

La suscrita, en calidad de representante legal de la sociedad adjudicataria del proceso de la referencia **CONSTRUPACICOL S.A.S ZOMAC** identificada con el **NIT:901526894-4**, por medio del presente oficio nos permitimos solicitar comedidamente a **INDERVALLE** realizar el cambio en la forma de pago, quedando esta de manera definitiva en un **95%** correspondiente a pago en actas parciales y un **5%** correspondiente a la liquidación, para soportar dicha petición se allega a ustedes un informe técnico donde se relacionan gastos fijos que se tendrán en el desarrollo de la obra.

INFORME TÉCNICO

Como se puede observar en nuestra propuesta económica, el capítulo de la **CIMENTACIÓN** tiene un valor superior a los **CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS \$110.000.000**, la sola **ESTRUCTURA METALICA** incluida la **CUBIERTA** posee un valor cercano a los **QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS \$575.000.000**. solamente el valor de estas actividades sumaria **SEISIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS \$685.000.000**, si a estos valores se le aplica su correspondiente porcentaje de **AIU (36%)**, para estas actividades nos daría un valor de ejecución de **NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS \$931.000.000**, ahora bien como lo estableció la entidad en los pliegos de condiciones y como quedo reflejado en la propuesta económica y como se le informo a los proponentes estos valores tendrían un incremento del **14.26%** por contratarse la obra en el año 2023 y ejecutarse en la vigencia 2024. Esto ya nos daría un valor final de aproximadamente de **MIL SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS \$1.065.000.000**. Cifra que equivaldría casi al **75%** del valor contractual (**1426.801.042.**).

Se hace alusión solo a estas actividades porque son las que se realizan con compras de contado, pues para insumos como el cemento, materiales pétreos y el acero no se consiguen créditos, estas compras se hacen de contado. Situación que la debe de asumir el contratista máximo cuando la obra a ejecutar tampoco cuenta con un ANTICIPO.

También cabe recalcar que en el ejercicio anterior solo se están tratando unas actividades específicas, quedando por fuera otras que son muy significativas como son las hidrosanitarias, eléctricas etc. Las cuales por lógica también se construirán, pero se encuentran por fuera del porcentaje del 75%, lo que hace técnicamente más desafiante la ejecución con la forma planteada por la entidad de pago de un 70% para cancelar y un 30% para liquidar.




Por tal motivo se le solicita muy comedidamente a la entidad se reevalúe esta condición de pago y se aplique la consagrada en el Anexo 4 - Minuta del contrato aplicando la forma de pago igual a 95% con actas parciales y 5% con la liquidación.

Por otro lado, debemos de analizar que técnicamente al dejar un 30% de pago para cancelarse con la liquidación, el cual supera incluso el porcentaje de utilidad que uno podría asumir que se pagase así, se está financiando la obra por parte del contratista, situación a la cual el ejecutor no debe de someterse, máximo cuando los recursos son del estado.

Atentamente;



BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
Representante legal de CONTRUPACICOL S.A.S ZOMAC
Cc:1.006.166.501

		INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA		CODIGO FO-400-025	
		SISTEMA DE GESTIÓN		VERSIÓN 2	
INFORME DE APOYO A LA SUPERVISION - SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRA - REGISTRO FOTOGRÁFICO				APROBACIÓN 25/07/2019	
MES	ENERO	Período del 28/12/2023 hasta el 31/01/2024	FECHA PRESENTACIÓN 01/02/2024		
ANEXO N° 1: REGISTRO FOTOGRÁFICO					
PROYECTO DE REGALIAS No. BPIN 202200376006					
Proyecto	ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Localización	DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	
Contratista:	CONSTRUPACIOL S.A.S ZOMAC		Director de obra:	Guillermo Villegas	
Interventor:	CONSORCIO GRUPO 3		Director Interventoría:	JULIO ARBELAES	
Fecha del registro fotográfico:	30-ene-24				
FOTOGRAFÍA N° 1					
					
Descripción: Cerramiento de Obra		Descripción: Plano general del escenario		Descripción: Estado Actual de la Placa	
FOTOGRAFÍA N° 4					
				FOTOGRAFÍA N° 6	
Descripción:		Descripción:		Descripción:	
FORMATO DE INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA - ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO					
Insertar el registro fotográfico del mes que se está reportando, las imágenes deben tener una resolución mínima de 72 DPI, no se aceptarán imágenes distorsionadas y/o borrosas, las fotos deben tener la fecha y deben incluir una breve descripción.					
UNA VEZ DILIGENCIADO Y FIRMADO POR LA INTERVENTORÍA Y EL SUPERVISOR DELEGADO POR EL MUNICIPIO SE DEBE GRABAR EN PDF, REMITIRLO AL SUPERVISOR DEL CONVENIO Y SUBIRLO AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN					

 INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN - ACTA GENERAL REUNION AUDITORIA VISIBLE CIUDADANA INICIO	Código: FO-400-030
	Versión: 02
	Aprobación: 25/07/2019

ACTA No. 400-030-005-2024

CONTRATO DE OBRA: : IND-23-5027, Adecuación cubierta sobre cancha múltiple, Institución Educativa Técnica Industrial Gerardo Valencia Cano ITI, Buenaventura.

FECHA: martes 6 de febrero de 2024	HORA INICIO: 10:00 am	HORA FIN: 11:00 am
---	------------------------------	---------------------------

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca

MUNICIPIO: Distrito Especial Buenaventura

LUGAR: Institución Educativa Técnica Industrial Gerardo Valencia Cano ITI, Buenaventura

En el día de hoy se reunieron representantes de la comunidad e Indervalle representados por las personas que aparecen en el listado adjunto :

Alcaldía: no asistió

Personería: no asistió
subgerencia Infraestructura Indervalle.

Representantes del contratista responsable del proyecto: Construpacicol Zomac- Ingeniero Guillermo Villa

Representantes de la interventoría contratada para el proyecto: Consorcio Grupo 3- Ingeniero Jair Hernandez

OBJETIVO DE LA REUNION:

1. Dar inicio a la intervención formalmente ante la comunidad y autoridades locales
2. Presentar el contrato de obra y resolver las inquietudes de los asistentes con relación al mismo
3. Presentar a los reponsables de la obra, supervisión por parte de indervalle e interventoría y establecer los canales de comunicación para la atención al
4. Exponer la estrategia de Auditorias Visibles Ciudadanas como el mecanismo de rendición de cuentas y participación ciudadana establecido por INDERVALLE, donde se realizarán reuniones de seguimiento a partir del inicio de la obra..
5. Sondeo de Percepción al Ciudadano

TEMAS TRATADOS: Siendo las 10:00 a.m. Inicia la reunión de primera auditoría visible, la profesional de Gestión Social Viviana Montoya da a conocer el objeto del contrato de obra Contrato de obra que consiste la puesta en marcha del proyecto denominado "Adecuación cubierta sobre cancha Múltiple – Institución Educativa Técnica Industrial Gerardo Valencia – Buenaventura D.E. – Valle del Cauca; presenta al Ingeniero Alvaro Bazurto, supervisor de la obra por parte de Indervalle; se informa que la firma contratista encargada de la ejecución de la obra es Construpacicol Zomac- Ingeniero Guillermo Villa y la interventoría se realiza por parte de Consorcio Grupo 3 - Ingeniero Jair Hernandez . De igual forma los asistentes que son docentes de la entidad y estudiantes se presentan.

De esta manera le concede la palabra al ingeniero Alvaro Bazurto, quien explicapor medio de diapositivas la obra con sus diferentes actividades y alcance. Indica que la obra se encuentra en actividades preliminares como son el cerramiento en tela, actividades de localización y replaneo que es basicamento lo que esta descrito en planos pasarlo a terreno. El proyecto cuenta con el mantenimiento y recuperación de la placa existente, esta cancha quedará funcionando para voleibol, microfútbol, baloncesto. De igual manera la cancha cuenta con los accesos para personas con movilidad reducida y cuenta con pólizas de garantía que aseguran la calidad en la ejecución, se muestra el plano de implantación y describe la planta arquitectónica, desniveles, andenes perimetrales, canales para aguas lluvias, columnas, pantallas de protección porterías e iluminación, en cuanto a la cubierta, indica que esta se construirá con los más estrictos estándares de calidad, garantizando una estabilidad completa, se muestra los planos, y explica técnicamente cómo será la construcción de la misma. Indica que la cubierta es en estructura metálica con un techado intercalado para garantizar iluminación y estabilidad. Contará con iluminación. La comunidad pregunta si se contara con baterías sanitarias y camerinos y el Ingeniero Bazusto que no se encuentra en el alcance de éste proyecto.

La profesional de gestión social Viviana Montoya explica a la comunidad sobre lo que es una Auditoría Visible Ciudadana y las etapas de la misma, la necesidad de conformar un Equipo Local de Veeduría y la importancia de brindar estos espacios de participación ciudadana para lograr el buen uso de los recursos públicos, seguimiento y vigilancia de los mismos por parte de la comunidad, además de crear sentido de pertenencia. Antes de finalizar la reunión se convoca a la comunidad presente quien quiera hacer parte del equipo veedor quienes haran vigilancia y seguimiento al proceso de la obra y se cumpla con las diferentes actividades de la misma, quienes se proponen radican su nombre y firma en el acta de constitución equipo veedor, quienes son elegidos son Sr. Leonidas Martinez, Norman Mosquera, Mercedes Molineros, Luis Alfredo Cedeño, Yan Franco Abonaga . Se entrega el contrato de obra y acta de constitución al Sr. Leonidas y contrato como planos a la Licenciada Beatriz Panchano rectora de la institución. Al no asistir la Alcaldía de Buenaventura a pesar de realizar la invitación formal por correo electrónico, se procederá a contactar desde Indervalle. La comunidad esta a gusto con el inicio de la obra y esperan se lleve a feliz termino. Una vez terminada la obra se entregara tanto al municipio como a la comunidad un manual de mantenimiento. se da por terminada la reunión, siendo las 11:20 am.

COMPROMISOS ESTABLECIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

LUGAR Y FECHA DE LA SIGUIENTE REUNION: por definir




DIRECTORIO DE CONTACTOS

Personas que participarán en el seguimiento de la obra para cualquier tema con relación a la misma de parte de la Interventoría, Contratista de obra y Equipo Local de Seguimiento.

NOMBRE	CARGO/EMPRESA	TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO
Ingeniero Alvaro Bazurto	Apoyo Supervisión Técnica Indervalle	3156167274
Psicóloga Viviana Montoya	Apoyo social Indervalle	3117199388

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

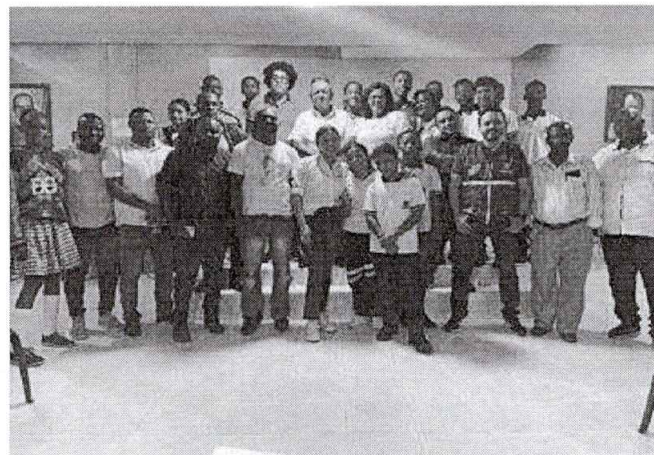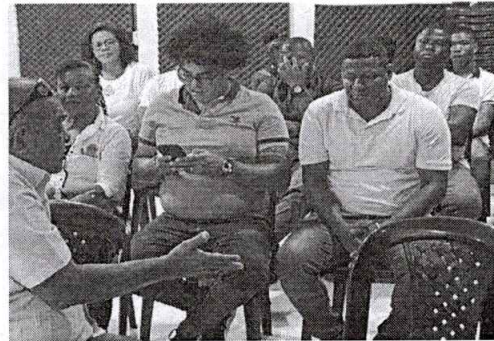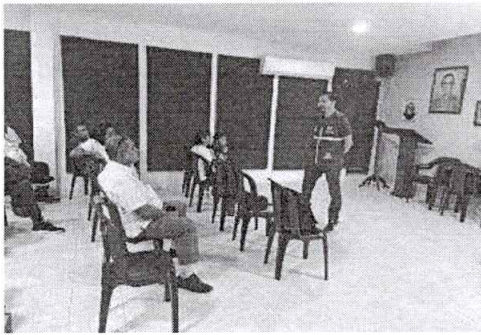

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACTA CONSTITUCIÓN EQUIPO LOCAL DE VEEDURÍA CIUDADANA PROYECTO/OBRA	CODIGO	PM-FO-600-003
		VERSIÓN	3
		APROBADO	28/ABRIL/2023

En el municipio de D.E. Buenaventura, a los Seis (6) días del mes de Febrero de 2024, se realiza la REUNIÓN DE AUDITORÍA VISIBLE No. 1 del Contrato de Obra No. IND-23-5027, proyecto Adecuación cubierta cancha múltiple Institución Educativa Técnica Industrial Gerardo Valencia Cano con recursos de Regalías por el valor de 1.462.801.042 cuyo domicilio es D.E. Buenaventura que va a ser ejecutado en el marco del suscrito entre INDERVALLE y el contratista Construpaccol Zomac. Esta obra cuenta con interventoría a cargo de Consorcio Grupo 3.


Fecha del acta de inicio 28 Dic. 2023
 plazo de ejecución 30 junio 2024

En esta reunión participan: el contratista de obra, interventor, residente de obra, supervisor del contrato por INDERVALLE, Coordinadora Auditorías Visibles de INDERVALLE, Alcaldía Municipal, Personero Municipal o su representante, representantes de organizaciones de la sociedad civil y comunidad beneficiaria de la obra a ejecutar; con el objeto de constituir la Veeduría Ciudadana para el Proyecto/Obra, de acuerdo con lo estipulado en la Constitución Nacional, Ley 80 de 1993 y Ley 850 de 2003.


Se aprueba el siguiente orden del día:

1. Diligenciamiento del registro de asistencia
2. Explicación del objeto de la reunión
3. Información del proyecto a realizar (Componente Técnico y Social, contratista, interventor y alcance de la obra, entre otros)
4. Presentación de la metodología de acompañamiento social
5. Elección de los Veedores
6. Establecimiento de funciones de la Veeduría
7. Cierre y firma del Acta

Las siguientes personas se postularon voluntariamente y aceptadas para formar parte de la veeduría ciudadana:

Cargo	Nombre y Apellidos	Cédula	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
Presidente	Leonidas Martínez Hurtado	16465615	3194144366	leonidas.martinez003@gmail.com	
Vicepresidente	Norman Mosquera Arias	16480425	3153243962	normosa@hotmail.com	Norman M.A.
Secretario	Mercedes Holinero	38466502	3165775601	mecor34@yahoo.es	Mercedes M

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACTA CONSTITUCIÓN EQUIPO LOCAL DE VEEDURIA CIUDADANA PROYECTO/OBRA	CODIGO	PM-FO-600-003
		VERSIÓN	3
		APROBADO	28/ABRIL/2023

Vocal1	Luis Alfredo Cedeño Ortiz	16268822	3173760311	lucavale@ hotmail.com	
Vocal2	Jon Franco Obando Ruina 10-2	1150936205	3143419822	dani 71358 gmail.com	Jon Franco Obando

Se acordó que la Veeduría se designa hasta el Recibo a Satisfacción de la Obra por parte de la Entidad Territorial, a partir de la fecha de su registro ante la Personería o Cámara de Comercio.

Como funciones de la Veeduría se establecieron las siguientes:

- Denunciar oportunamente ante las autoridades locales sobre eventuales irregularidades en la ejecución del proyecto y en los casos pertinentes, poner en conocimiento de los organismos de control.
- Mantener el flujo de información necesario entre INDERVALLE, Alcaldía, Contratista, Interventoría, Comunidad y demás miembros de la comunidad.
- Ser proactiva contribuyendo con el normal desarrollo de la obra, cumpliendo sus funciones sin paralizar su ejecución.
- Velar por que las obras se terminen de acuerdo con las características pactadas en el contrato y en el tiempo estipulado.

Siendo las 11:04 del día 6 del mes Febrero de 2024, se da por terminada la reunión y para constancia firman.

En constancia firman:

Presidente de la Veeduría

Nombre:

C.C. 16 465.615

Teléfono: 319-4144366.

Secretario de la Veeduría

Nombre:

C.C.

Teléfono:



INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO
PM-FO-600-006

VERSIÓN
1

APROBACIÓN
28/ABRIL/2023

REGISTRO DE ASISTENCIA
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Nombre del evento: Primera Auditoria Visible Ciudadana Contacto IND-23-5027 Lugar: Buenaventura
Adecuación cubierta Cancha múltiple I.E Gerardo Valencia Cano Fecha: Feb 6 - 2024
Equipo Acompañante: Hora: 10:00 am

No.	Nombre	Apellidos	No. De identificación	Cargo/ Entidad	Municipio	Teléfono	Correo electrónico	Firma
1	Guillermo Villalga	Villalga	41377407	DIRECTOR		38511754	Guillermo.Villalga@ind.gov.co	
2	Pedro Cano	Cano	16512797	apoyo contable	B/tura	310444889	pedrocano1011@gmail.com	
3	Deniel Santos	Santos	16503307	Alumno	B/tura	32051612	Isabel.santos@ind.gov.co	
4	Luis FARE	FARE	1006186002	ADM. ITI	B/tura	31486167	luisfare2007@gmail.com	
5	Pardo	Pardo	31380388	Coordinador	B/tura	31568234	Pardo Meda 1988	
6	JAIR	Hernandez	16490802	Interventoria	B/tura	31881010	Jehovan 2867	
7	Alvaro	Tenorio Rincon	11180491	Supo de Obra	B/tura	32261343	tenorioalvaro1962	
8	Bayman	Benameto Angulo	1111790144	R. de obra	B/tura	3184009367	angbayman@gmail.com	
9	Candelaria	Candelaria	16471100	Ser. G	B/tura	31586444		
10	Yamir	Carcedo	1150937166	Estudiante	B/tura	318385933		
11	Luis	Alzate	1150635609	Deportista	B/tura	3143088904		
12	Yan	Obonaga	1150936205	Deportista	B/tura	3173419822	doni9135@gmail.com	
13	Helmer	Suarez	1150938842	Deportista	B/tura	31741464	Helmer.suarez@gmail.com	
14	Erick Tomas	Patino Gil	1021978881	Deportista	B/tura	317588888	ericktomasa@gmail.com	
15	Aslyne	Medel	1117786546	Deportista	B/tura	31667820	medelap52@gmail.com	

Reativiz Panchano Mun 6630623. Rectora
Mercedes Malineros Ortiz 38466502 Docente O.
Breiner Alexander Páyan murillo
Edward Sinisterra 111777616 estudiante
Hailes Garcia M. estudiante
B/tura 3113112854 Hailes esneider garcia M.

Norman Mosquera CC. 16480425 - Docente 315 324 3962 Norman P. A.
ARIAS

Luis Alfredo Cedeño Ortiz CC. 16168722 DOCTORE 314 3760311 

Alan Cundumi Quasos Estudiante 314 7190362

Alan Quasos

171

171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180

171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180

171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180

 INDERVALLE INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN - SONDEO DE PERCEPCION CIUDADANA AUDITORIAS VISIBLES	CODIGO: FO 400-032 VERSIÓN: 02 APROBADO: 25/07/2019
---	---	---

Adecuacion cubierta de la cancha
Nombre del Proyecto

Nombre y apellido del encuestado (Opcional) 3160678209
Teléfono (Opcional)

Valle B/Tura 06-02-2024
Departamento Municipio Fecha

Marcar con una X y explicar:

A. La información que ha recibido por parte de INDERVALLE del proyecto ha sido:

1. Muy deficiente ☐ 2. Deficiente ☐ 3. Aceptable ☐ 4. Buena ☒ 5. Excelente ☐

Explique su respuesta: Buena porque nos va favorecer en los deportes de la institucion

B. Cómo se siente frente a lo que es (o será) el proyecto:

1. Muy insatisfecho ☐ 2. Insatisfecho ☐ 3. Indiferente ☐ 4. Satisfecho ☒ 5. Muy satisfecho ☐

Explique su respuesta: Bien por que tendriamos su propia cancha para entrenar

C. Cómo se siente en términos generales con la participación de los diferentes actores involucrados en el proyecto: (INDERVALLE), el contratista de obra, la interventoría, la comunidad):

1. Muy insatisfecho ☐ 2. Insatisfecho ☐ 3. Indiferente ☐ 4. Satisfecho ☒ 5. Muy satisfecho ☐

Explique su respuesta: _____

D. Cómo se siente frente a los beneficios que se entregan o serán entregados por el proyecto a su comunidad:

1. Muy insatisfecho ☐ 2. Insatisfecho ☐ 3. Indiferente ☐ 4. Satisfecho ☒ 5. Muy satisfecho ☐

Explique su respuesta: _____

E. Sólo responder esta pregunta en caso de haber interpuesto alguna queja o reclamo ante INDERVALLE. Cómo ha sido la información recibida sobre la queja o reclamo?

1. Muy deficiente ☐ 2. Deficiente ☐ 3. Aceptable ☐ 4. Buena ☒ 5. Excelente ☐

Explique su respuesta: _____

F. Qué sugiere para que EL PROYECTO traiga beneficios tanta para usted como a su comunidad?

1 vertederos

2 baños

3 _____

ASly Alejandra Garces B/Tura
Nombre del encuestador Ciudad

[Firma] 6-02-2024
Firma del encuestador Fecha

Association County of the ...

Association

00-11-2011

10/11/11

10/11/11

X

There is a ...
of the ...

X

There is a ...
of the ...

X

X

X

Association
County

00-11-2011

10/11/11



INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN
DEL VALLE DEL CAUCA
SISTEMA DE GESTIÓN - SONDEO DE PERCEPCIÓN CIUDADANA
AUDITORIAS VISIBLES

CODIGO: FO 400-032

VERSIÓN: 02

APROBADO: 25/07/2019

Adecuación Cubierta De La Cancha

Nombre del Proyecto

Kevin Andres Suarez Rivas

Nombre y apellido del encuestado (Opcional)

Valle

Departamento

Buenaventura

Municipio

Teléfono (Opcional)

0610212024

Fecha

Marcar con una X y explicar:

A. La información que ha recibido por parte de INDERVALLE del proyecto ha sido:

1. Muy
deficiente

☐

2. Deficiente

☐

3. Aceptable

☐

4. Buena

☐

5. Excelente

☒

Explique su
respuesta:

B. Cómo se siente frente a lo que es (o será) el proyecto:

1. Muy
insatisfecho

☐

2. Insatisfecho

☐

3. Indiferente

☐

4. Satisfecho

☐

5. Muy satisfecho

☒

Explique su
respuesta:

C. Cómo se siente en términos generales con la participación de los diferentes actores involucrados en el proyecto: (INDERVALLE), el contratista de obra, la interventoría, la comunidad):

1. Muy
insatisfecho

☐

2. Insatisfecho

☐

3. Indiferente

☐

4. Satisfecho

☐

5. Muy satisfecho

☒

Explique su
respuesta:

D. Cómo se siente frente a los beneficios que se entregan o serán entregados por el proyecto a su comunidad:

1. Muy
insatisfecho

☐

2. Insatisfecho

☐

3. Indiferente

☐

4. Satisfecho

☐

5. Muy satisfecho

☒

Explique su
respuesta:

E. Sólo responder esta pregunta en caso de haber interpuesto alguna queja o reclamo ante INDERVALLE. Cómo ha sido la información recibida sobre la queja o reclamo?

1. Muy
deficiente

☐

2. Deficiente

☐

3. Aceptable

☐

4. Buena

☒

5. Excelente

☐

Explique su
respuesta:

F. Qué sugiere para que EL PROYECTO traiga beneficios tanta para usted como a su comunidad?

1

Mas juegos en el deporte

2

3

Viviana Montoya

Nombre del encuestador

Firma del encuestador

Blueshua

Ciudad

6-02-2024

Fecha

 INDERVALLE INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN - SONDEO DE PERCEPCIÓN CIUDADANA AUDITORÍAS VISIBLES		CODIGO: FO 400-032 VERSIÓN: 02 APROBADO: 25/07/2019
	<i>a adecuación abierta sobre cancha múltiple, Institución ITC</i> Nombre del Proyecto <i>Luis Felipe Akate Ibarra</i> Nombre y apellido del encuestador (Opcional) <i>Balón del Cauca</i> <i>Bistrura</i> <i>6/02/2024</i> Departamento Municipio Fecha		
	Marcar con una X y explicar:		

A. La información que ha recibido por parte de INDERVALLE del proyecto ha sido:

1. Muy deficiente ☐ 2. Deficiente ☐ 3. Aceptable ☐ 4. Buena ☐ 5. Excelente ☒

Explique su respuesta: _____

B. Cómo se siente frente a lo que es (o será) el proyecto:

1. Muy insatisfecho ☐ 2. Insatisfecho ☐ 3. Indiferente ☐ 4. Satisfecho ☐ 5. Muy satisfecho ☒

Explique su respuesta: _____

C. Cómo se siente en términos generales con la participación de los diferentes actores involucrados en el proyecto: (INDERVALLE), el contratista de obra, la interventoría, la comunidad:

1. Muy insatisfecho ☐ 2. Insatisfecho ☐ 3. Indiferente ☐ 4. Satisfecho ☒ 5. Muy satisfecho ☐

Explique su respuesta: _____

D. Cómo se siente frente a los beneficios que se entregan o serán entregados por el proyecto a su comunidad:

1. Muy insatisfecho ☐ 2. Insatisfecho ☐ 3. Indiferente ☐ 4. Satisfecho ☐ 5. Muy satisfecho ☒

Explique su respuesta: _____

E. Sólo responder esta pregunta en caso de haber interpuesto alguna queja o reclamo ante INDERVALLE. Cómo ha sido la información recibida sobre la queja o reclamo?

1. Muy deficiente ☐ 2. Deficiente ☐ 3. Aceptable ☐ 4. Buena ☒ 5. Excelente ☐


Explique su respuesta: _____

F. Qué sugiere para que EL PROYECTO traiga beneficios tanta para usted como a su comunidad?

1. *menos delincuencia en la comunidad*

2. *mas juegos en el deporte*

3. *una comunidad con modales*

<i>Viviana Montoya</i> Nombre del encuestador	<i>Bistrura</i> Ciudad
 Firma del encuestador	<i>6-02-2024</i> Fecha

 INTERVALLE INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN - SONDEO DE PERCEPCIÓN CIUDADANA AUDITORIAS VISIBLES		CODIGO: FO 400-032 VERSIÓN: 02 APROBADO: 25/07/2019
	adecuación cubierta sobre canchas múltiples institución [I.I.]		
	Nombre del Proyecto Yannir Fernando Leonado Martinez Nombre y apellido del encuestado (Opcional) Valledupar Departamento Teléfono (Opcional) 6102124 Fecha		

Marcar con una X y explicar:

A. La información que ha recibido por parte de INTERVALLE del proyecto ha sido:

1. Muy deficiente

☐

2. Deficiente

☐

3. Aceptable

☐

4. Buena

☐

5. Excelente

☒

Explique su respuesta: _____

B. Cómo se siente frente a lo que es (o será) el proyecto:

1. Muy insatisfecho

☐

2. Insatisfecho

☐

3. Indiferente

☐

4. Satisfecho

☐

5. Muy satisfecho

☒

Explique su respuesta: _____

C. Cómo se siente en términos generales con la participación de los diferentes actores involucrados en el proyecto: (INTERVALLE), el contratista de obra, la interventoría, la comunidad):

1. Muy insatisfecho

☐

2. Insatisfecho

☐

3. Indiferente

☐

4. Satisfecho

☒

5. Muy satisfecho

☐

Explique su respuesta: _____

D. Cómo se siente frente a los beneficios que se entregan o serán entregados por el proyecto a su comunidad:

1. Muy insatisfecho

☐

2. Insatisfecho

☐

3. Indiferente

☐

4. Satisfecho

☐

5. Muy satisfecho

☒

Explique su respuesta: _____

E. Sólo responder esta pregunta en caso de haber interpuesto alguna queja o reclamo ante INTERVALLE. Cómo ha sido la información recibida sobre la queja o reclamo?

1. Muy deficiente

☐

2. Deficiente

☐

3. Aceptable

☐

4. Buena

☒

5. Excelente

☐

Explique su respuesta: _____

F. Qué sugiere para que EL PROYECTO traiga beneficios tanta para usted como a su comunidad?

1	mas juvenes en el deporte
2	
3	

Viviana Montoya

Nombre del encuestador

[Firma]

Firma del encuestador

Bitorra

Ciudad

6/02/24

Fecha



INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN
DEL VALLE DEL CAUCA
SISTEMA DE GESTIÓN - SONDEO DE PERCEPCION CIUDADANA
AUDITORIAS VISIBLES

CODIGO: FO 400-032

VERSIÓN: 02

APROBADO: 25/07/2019

Adecuación cubierta de la cancha

Nombre del Proyecto

Tomás Patiño Gil

Nombre y apellido del encuestado (Opcional)

valle

Departamento

B/ porta

Municipio

Teléfono (Opcional)

6/Feb/2024

Fecha

Marcar con una X y explicar:

A. La información que ha recibido por parte de INDERVALLE del proyecto ha sido:

1. Muy
deficiente

☐

2. Deficiente

☐

3. Aceptable

☐

4. Buena

☒

5. Excelente

☐

Explique su
respuesta:

B. Cómo se siente frente a lo que es (o será) el proyecto:

1. Muy
insatisfecho

☐

2. Insatisfecho

☐

3. Indiferente

☒

4. Satisfecho

☒

5. Muy satisfecho

☐

Explique su
respuesta:

C. Cómo se siente en términos generales con la participación de los diferentes actores involucrados en el proyecto: (INDERVALLE), el contratista de obra, la interventoría, la comunidad:

1. Muy
insatisfecho

☐

2. Insatisfecho

☐

3. Indiferente

☐

4. Satisfecho

☒

5. Muy satisfecho

☐

Explique su
respuesta:

D. Cómo se siente frente a los beneficios que se entregan o serán entregados por el proyecto a su comunidad:

1. Muy
insatisfecho

☐

2. Insatisfecho

☐

3. Indiferente

☐

4. Satisfecho

☐

5. Muy satisfecho

☒

Explique su
respuesta:

E. Sólo responder esta pregunta en caso de haber interpuesto alguna queja o reclamo ante INDERVALLE. Cómo ha sido la información recibida sobre la queja o reclamo?

1. Muy
deficiente

☐

2. Deficiente

☐

3. Aceptable

☐

4. Buena

☒

5. Excelente

☐

Explique su
respuesta:

F. Qué sugiere para que EL PROYECTO traiga beneficios tanta para usted como a su comunidad?

1

Baños

2

vestidores

3

Viviana Montoya

Nombre del encuestador

Firma del encuestador

Blueshua

Ciudad

6-02-2024

Fecha



INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° IND - 23 - 5027
 CONTRATANTE: INDERVALLE NIT. 805.012.896-4 ORDENADOR DEL GASTO: NICOLAS TRIANA CASTILLO
 CONTRATISTA: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC NIT. 901.526.894-4
 REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO C.C. 1.006.166.501
 INTERVENOR: CONSORCIO GRUPO 3 NIT. 901.769.200-6 REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ. C.C. 16.700.426

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR TOTAL \$ \$1.426.801.042 M/CTE – INCLUIDO AIU
 PLAZO 6 MESES 185 DÍAS
 FECHA DE INICIO 28-dic-23
 PRORROGA 1 DEL: HASTA:
 PRORROGA 2 DEL: HASTA:
 PRORROGA 3 DEL: HASTA:
 SUSPENSION 1 DEL: HASTA:
 SUSPENSION 2 DEL: HASTA:
 SUSPENSION 3 DEL: HASTA:

2. INFORMACION BASICA DEL FRENTE DE OBRA

FRENTE No. 01: CUBIERTA CANCHA MULTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO

VALOR COSTOS TOTALES: \$1.426.801.042
 Informe N°: 1 Fecha de informe: 28/12/2023 A 7/01/2024

INFORMACION GENERAL			SEGUIMIENTO DE OBRA					
CONTRATISTA DE OBRA			AVANCE FISICO (%)					
Valor frente de obra:		\$1.426.801.042	Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso	
Adiciones o mayor valor:			% Programado	0,00%	0,00%	0,00%	0	
Valor total:		\$1.426.801.042	% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	0	
Fecha de Inicio		28/12/2023	Diferencia	0,00%	0,00%	0,00%		
Tiempo de prorrogas			AVANCE FINANCIERO					En %
Tiempo de suspensiones		-	Programado(%)	\$0,00	\$ 0	\$ 0	0,00%	
Plazo estipulado:			Ejecutado (%)	\$0,00	\$ 0	\$ 0	0,00%	
Fecha de terminacion:		30/06/2024	Diferencia	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	
Tiempo transcurrido contrato:		10 días	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso					
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA			PERSONAL PROMEDIO EN OBRA					
Fecha de Inicio:		28/12/2023	Interventoría:	Ingeniero Residente e Inspector				
Tiempo de prorrogas:		-	Contratista:	Ingeniero Director de Obra				
Tiempo de suspensiones:		-	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA					
Plazo actualizado:		185						
Fecha de terminacion:		30/06/2024						
Tiempo transcurrido Interventoría:		10	SEGUIMIENTO OBLIGACIONES			VERIFICADO POR	S/N/NA	
			Aportes a seguridad Social y parafiscales			Interventor	N	
			Normas seguridad, higiene y salud ocupacional			Interventor	N	
			Normas ambientales			Interventor	N	

3. REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1: revision localizacion

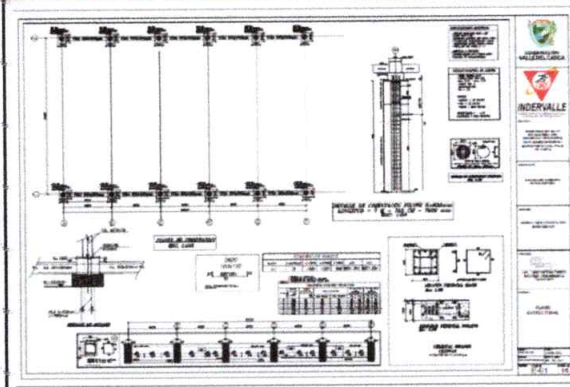


Foto 2: revision estructural



INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

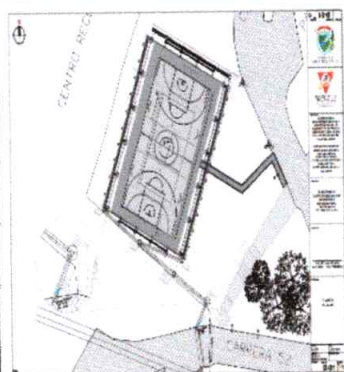


Foto 3: revision hidro-sanitario

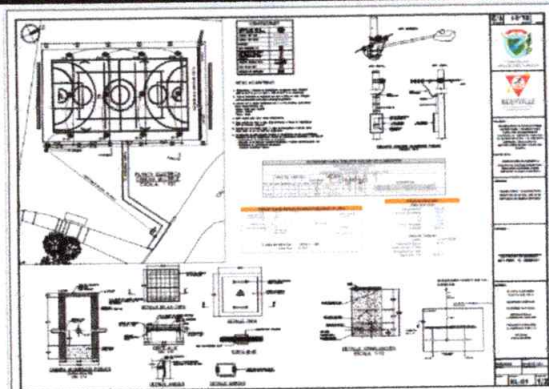
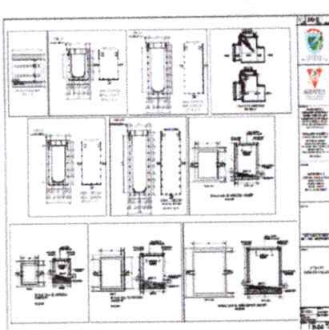


Foto 4: revision electrico

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

LUNES:

MARTES: trabajos de oficina.

MIÉRCOLES: trabajos de oficina.

JUEVES: - trabajos de oficina.

VIERNES: trabajos de oficina.

SABADO:

DOMINGO:

ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR

Se programa trabajo documental para inicio de obra

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:

El contratista deberá efectuar los ajustes, con el fin de mostrar las fechas de ejecución.

2. Disponibilidad de Recursos:

La entidad contiene todos los recursos por el plan nacional de regalías, con el fin de financiar el proyecto

3. Ejecución Financiera:

No se dispone de ningún porcentaje en Actas Parciales, ya que no se contiene porcentaje de ejecución.

4. Calidad de los trabajos:

Hasta el momento no hay obra ejecutada

5. Manejo Ambiental:

Se le solicita al contratista los certificados de botadero de residuos y materiales sobrantes.

6. Seguridad Industrial:

Se le solicita al contratista que, antes de iniciar actividades, se debe presentar la seguridad social, ARL, Pension, con el fin de verificar información.

7. Programa salud ocupacional (si aplica):

8. Aspectos sociales:

Se realizará la socialización el día miércoles 31 de enero y se aprovechará ésta, como auditoría visible.

OBSERVACIONES:

* No se presentan observaciones de la obra para el periodo del presente informe.

Aprobado por:

Brenda Murillo B

FIRMA EL CONTRATISTA

NOMBRE: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

CARGO: REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

VuBo (FIRMA)

NOMBRE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ

CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA



REPORT ON THE ADVANCEMENT OF THE PROJECT OF THE REPAIR OF THE

1. GENERAL INFORMATION	
1.1. Name of the project	Repair of the road from the village of Yeghvard to the village of Yeghvard
1.2. Location of the project	Yeghvard, Yeghvard district, Yeghvard province
1.3. Date of the report	15.05.2024
1.4. Name of the contractor	Yeghvard Road Repairing Company
1.5. Name of the supervisor	Yeghvard Road Repairing Company
1.6. Name of the client	Yeghvard Road Repairing Company
1.7. Name of the investor	Yeghvard Road Repairing Company
1.8. Name of the sponsor	Yeghvard Road Repairing Company
1.9. Name of the donor	Yeghvard Road Repairing Company
1.10. Name of the beneficiary	Yeghvard Road Repairing Company
1.11. Name of the stakeholder	Yeghvard Road Repairing Company
1.12. Name of the partner	Yeghvard Road Repairing Company
1.13. Name of the collaborator	Yeghvard Road Repairing Company
1.14. Name of the associate	Yeghvard Road Repairing Company
1.15. Name of the affiliate	Yeghvard Road Repairing Company
1.16. Name of the subsidiary	Yeghvard Road Repairing Company
1.17. Name of the branch	Yeghvard Road Repairing Company
1.18. Name of the division	Yeghvard Road Repairing Company
1.19. Name of the department	Yeghvard Road Repairing Company
1.20. Name of the section	Yeghvard Road Repairing Company
1.21. Name of the unit	Yeghvard Road Repairing Company
1.22. Name of the post	Yeghvard Road Repairing Company
1.23. Name of the position	Yeghvard Road Repairing Company
1.24. Name of the job	Yeghvard Road Repairing Company
1.25. Name of the role	Yeghvard Road Repairing Company
1.26. Name of the function	Yeghvard Road Repairing Company
1.27. Name of the task	Yeghvard Road Repairing Company
1.28. Name of the responsibility	Yeghvard Road Repairing Company
1.29. Name of the obligation	Yeghvard Road Repairing Company
1.30. Name of the duty	Yeghvard Road Repairing Company
1.31. Name of the liability	Yeghvard Road Repairing Company
1.32. Name of the accountability	Yeghvard Road Repairing Company
1.33. Name of the answerability	Yeghvard Road Repairing Company
1.34. Name of the responsibility	Yeghvard Road Repairing Company
1.35. Name of the obligation	Yeghvard Road Repairing Company
1.36. Name of the duty	Yeghvard Road Repairing Company
1.37. Name of the liability	Yeghvard Road Repairing Company
1.38. Name of the accountability	Yeghvard Road Repairing Company
1.39. Name of the answerability	Yeghvard Road Repairing Company
1.40. Name of the responsibility	Yeghvard Road Repairing Company
1.41. Name of the obligation	Yeghvard Road Repairing Company
1.42. Name of the duty	Yeghvard Road Repairing Company
1.43. Name of the liability	Yeghvard Road Repairing Company
1.44. Name of the accountability	Yeghvard Road Repairing Company
1.45. Name of the answerability	Yeghvard Road Repairing Company
1.46. Name of the responsibility	Yeghvard Road Repairing Company
1.47. Name of the obligation	Yeghvard Road Repairing Company
1.48. Name of the duty	Yeghvard Road Repairing Company
1.49. Name of the liability	Yeghvard Road Repairing Company
1.50. Name of the accountability	Yeghvard Road Repairing Company
1.51. Name of the answerability	Yeghvard Road Repairing Company
1.52. Name of the responsibility	Yeghvard Road Repairing Company
1.53. Name of the obligation	Yeghvard Road Repairing Company
1.54. Name of the duty	Yeghvard Road Repairing Company
1.55. Name of the liability	Yeghvard Road Repairing Company
1.56. Name of the accountability	Yeghvard Road Repairing Company
1.57. Name of the answerability	Yeghvard Road Repairing Company
1.58. Name of the responsibility	Yeghvard Road Repairing Company
1.59. Name of the obligation	Yeghvard Road Repairing Company
1.60. Name of the duty	Yeghvard Road Repairing Company
1.61. Name of the liability	Yeghvard Road Repairing Company
1.62. Name of the accountability	Yeghvard Road Repairing Company
1.63. Name of the answerability	Yeghvard Road Repairing Company
1.64. Name of the responsibility	Yeghvard Road Repairing Company
1.65. Name of the obligation	Yeghvard Road Repairing Company
1.66. Name of the duty	Yeghvard Road Repairing Company
1.67. Name of the liability	Yeghvard Road Repairing Company
1.68. Name of the accountability	Yeghvard Road Repairing Company
1.69. Name of the answerability	Yeghvard Road Repairing Company
1.70. Name of the responsibility	Yeghvard Road Repairing Company
1.71. Name of the obligation	Yeghvard Road Repairing Company
1.72. Name of the duty	Yeghvard Road Repairing Company
1.73. Name of the liability	Yeghvard Road Repairing Company
1.74. Name of the accountability	Yeghvard Road Repairing Company
1.75. Name of the answerability	Yeghvard Road Repairing Company
1.76. Name of the responsibility	Yeghvard Road Repairing Company
1.77. Name of the obligation	Yeghvard Road Repairing Company
1.78. Name of the duty	Yeghvard Road Repairing Company
1.79. Name of the liability	Yeghvard Road Repairing Company
1.80. Name of the accountability	Yeghvard Road Repairing Company
1.81. Name of the answerability	Yeghvard Road Repairing Company
1.82. Name of the responsibility	Yeghvard Road Repairing Company
1.83. Name of the obligation	Yeghvard Road Repairing Company
1.84. Name of the duty	Yeghvard Road Repairing Company
1.85. Name of the liability	Yeghvard Road Repairing Company
1.86. Name of the accountability	Yeghvard Road Repairing Company
1.87. Name of the answerability	Yeghvard Road Repairing Company
1.88. Name of the responsibility	Yeghvard Road Repairing Company
1.89. Name of the obligation	Yeghvard Road Repairing Company
1.90. Name of the duty	Yeghvard Road Repairing Company
1.91. Name of the liability	Yeghvard Road Repairing Company
1.92. Name of the accountability	Yeghvard Road Repairing Company
1.93. Name of the answerability	Yeghvard Road Repairing Company
1.94. Name of the responsibility	Yeghvard Road Repairing Company
1.95. Name of the obligation	Yeghvard Road Repairing Company
1.96. Name of the duty	Yeghvard Road Repairing Company
1.97. Name of the liability	Yeghvard Road Repairing Company
1.98. Name of the accountability	Yeghvard Road Repairing Company
1.99. Name of the answerability	Yeghvard Road Repairing Company
1.100. Name of the responsibility	Yeghvard Road Repairing Company



INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Foto 3:

Foto 4:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR

LUNES:

MARTES: trabajos de oficina.

MIÉRCOLES: trabajos de oficina.

JUEVES: - trabajos de oficina.

VIERNES: trabajos de oficina.

SABADO:

DOMINGO:

se programa afiliación de trabajadores

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:

El contratista entrega la documentación pertinente para revisión de interventoría y poder dar inicio a las actividades de obra.

2. Disponibilidad de Recursos:

La entidad contiene todos los recursos por el plan nacional de regalías, con el fin de financiar el proyecto

3. Ejecución Financiera:

No se dispone de ningún porcentaje en Actas Parciales, ya que no se contiene porcentaje de ejecución.

4. Calidad de los trabajos:

Hasta el momento no hay obra ejecutada

5. Manejo Ambiental:

Se le solicita al contratista los certificados de botadero de residuos y materiales sobrantes.

6. Seguridad Industrial:

Se le solicita al contratista que, antes de iniciar actividades, se debe presentar la seguridad social, ARL, Pension, con el fin de verificar información.

7. Programa salud ocupacional (si aplica):

8. Aspectos sociales:

Se realizará la socialización el día miércoles 31 de enero y se aprovechará ésta, como auditoría visible.

OBSERVACIONES:

* No se presentan observaciones de la obra para el periodo del presente informe.

Aprobado por:

Brenda Murillo Barco

FIRMA EL CONTRATISTA

NOMBRE: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

CARGO: REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

Eduardo Gádenas Rodríguez

VoBo (FIRMA)

NOMBRE: EDUARDO GÁDENAS RODRÍGUEZ

CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA



INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° IND - 23 - 5027

CONTRATANTE: INDERVALLE NIT. 805.012.896-4 ORDENADOR DEL GASTO: NICOLAS TRIANA CASTILLO

CONTRATISTA: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC NIT. 901.526.894-4

REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO C.C. 1.006.166.501

INTERVENOR: CONSORCIO GRUPO 3 NIT. 901.769.200-6 REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ, C.C. 16.700.426

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR TOTAL \$ 1.426.801.042 M/CTE - INCLUIDO AIU
PLAZO 6 MESES 185 DÍAS
FECHA DE INICIO 28-dic-23
PRORROGA 1 DEL: HASTA:
PRORROGA 2 DEL: HASTA:
PRORROGA 3 DEL: HASTA:
SUSPENSION 1 DEL: HASTA:
SUSPENSION 2 DEL: HASTA:
SUSPENSION 3 DEL: HASTA:

2. INFORMACIÓN BÁSICA DEL FRENTE DE OBRA

FRENTE No. 01: CUBIERTA CANCHA MULTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO

VALOR COSTOS TOTALES: \$1.426.801.042

Informe N°: 3 Fecha de informe: 15/01/2024 A 21/01/2024

INFORMACION GENERAL		SEGUIMIENTO DE OBRA				
CONTRATISTA DE OBRA		AVANCE FISICO (%)				
Valor frente de obra:	\$1.426.801.042	Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso
Adiciones o mayor valor:		% Programado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Valor total:	\$1.426.801.042	% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	0
Fecha de Inicio	28/12/2023	Diferencia	0,00%	0,00%	0,00%	
Tiempo de promogas		AVANCE FINANCIERO				
Tiempo de suspensiones	-	Programado(%)	\$0,00	\$ 0	\$ 0	0,00%
Plazo estipulado:		Ejecutado (%)	\$0,00	\$ 0	\$ 0	0,00%
Fecha de terminación:	30/06/2024	Diferencia	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
Tiempo transcurrido contrato:	24 días	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		PERSONAL PROMEDIO EN OBRA				
Fecha de Inicio:	28/12/2023	Interventoría:	Ingeniero Residente e inspector			
Tiempo de promogas:	-	Contratista:	Ingeniero Director de Obra			
Tiempo de suspensiones:	-	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA				
Plazo actualizado:	185					
Fecha de terminación:	30/06/2024					
Tiempo transcurrido Interventoría:	24	SEGUIMIENTO OBLIGACIONES			VERIFICADO POR	S/N/A
		Aportes a seguridad Social y parafiscales			Interventor	N
		Normas seguridad, higiene y salud ocupacional			Interventor	N
		Normas ambientales			Interventor	N

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1: visita preliminar

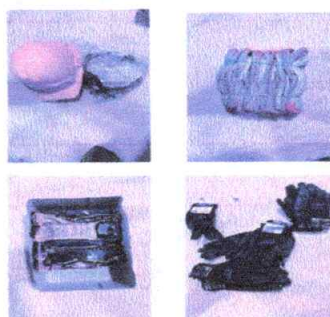


Foto 2: implementos de seguridad industrial.

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA															
El presente informe tiene como objetivo detallar el avance de los proyectos de infraestructura durante la semana del 15 al 21 de mayo de 2023. Se detallan los trabajos realizados, los recursos asignados y el estado actual de cada proyecto.															
El avance de los proyectos se ha realizado de acuerdo con el cronograma establecido, cumpliendo con los plazos y los recursos asignados. Se han identificado algunas áreas de mejora y se han tomado medidas para optimizar el proceso.															
Se han realizado los siguientes trabajos durante la semana: - Revisión de los planos de los proyectos de infraestructura. - Elaboración de los presupuestos de los proyectos. - Asignación de los recursos humanos y materiales. - Monitoreo del avance de los trabajos en campo.															
El estado actual de los proyectos es el siguiente: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Proyecto</th> <th>Avance (%)</th> <th>Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proyecto A</td> <td>85%</td> <td>Se han completado los trabajos de excavación y se está realizando la construcción de la estructura.</td> </tr> <tr> <td>Proyecto B</td> <td>60%</td> <td>Se han completado los trabajos de cimentación y se está realizando la construcción de la estructura.</td> </tr> <tr> <td>Proyecto C</td> <td>40%</td> <td>Se han completado los trabajos de diseño y se está realizando la construcción de la estructura.</td> </tr> </tbody> </table>				Proyecto	Avance (%)	Observaciones	Proyecto A	85%	Se han completado los trabajos de excavación y se está realizando la construcción de la estructura.	Proyecto B	60%	Se han completado los trabajos de cimentación y se está realizando la construcción de la estructura.	Proyecto C	40%	Se han completado los trabajos de diseño y se está realizando la construcción de la estructura.
Proyecto	Avance (%)	Observaciones													
Proyecto A	85%	Se han completado los trabajos de excavación y se está realizando la construcción de la estructura.													
Proyecto B	60%	Se han completado los trabajos de cimentación y se está realizando la construcción de la estructura.													
Proyecto C	40%	Se han completado los trabajos de diseño y se está realizando la construcción de la estructura.													
Se han identificado las siguientes áreas de mejora: - Optimizar el uso de los recursos humanos y materiales. - Mejorar la comunicación entre los equipos de trabajo. - Implementar un sistema de monitoreo más eficiente.															
Se han tomado las siguientes medidas para optimizar el proceso: - Revisión de los planes de trabajo y ajuste de los recursos. - Implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real. - Realización de reuniones de trabajo para mejorar la comunicación.															
Se adjuntan los siguientes documentos: - Planos de los proyectos de infraestructura. - Presupuestos de los proyectos. - Asignación de los recursos humanos y materiales. - Monitoreo del avance de los trabajos en campo.															
Se adjuntan los siguientes mapas: - Mapa de la zona de estudio. - Mapa de la ubicación de los proyectos. - Mapa de la red de transporte.															



INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

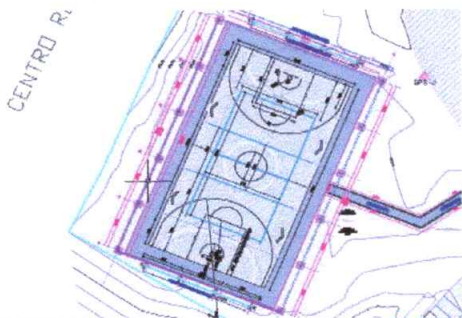


Foto 3:

Foto 4: Reconocimiento de terreno

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
LUNES: Se realiza visita preliminar MARTES: trabajo de oficina MIÉRCOLES: adquisición de materiales y dotación. JUEVES: - trabajo de oficina VIERNES: trabajo de oficina SABADO: DOMINGO:	Se programa la primer reunión administrativa y técnica entre la entidad contratante, la interventoría y el contratista para revisar inicio de actividades físicas y posible socialización de proyecto con comunidad del sector.
LOGROS Y/O DIFICULTADES	
1. Cronograma: El contratista inicia el suministro de materiales para el inicio de la obra como el de contratación y afiliación del personal.	
2. Disponibilidad de Recursos: La entidad contiene todos los recursos por el plan nacional de regalías, con el fin de financiar el proyecto.	
3. Ejecución Financiera: No se dispone de ningún porcentaje en Actas Parciales, ya que no se contiene porcentaje de ejecución.	
4. Calidad de los trabajos: Hasta el momento no hay obra ejecutada.	
5. Manejo Ambiental: Se le solicita al contratista los certificados de botadero de residuos y materiales sobrantes.	
6. Seguridad Industrial: Se le solicita al contratista que, antes de iniciar actividades, se debe presentar la seguridad social, ARL, Pension, con el fin de verificar información.	
7. Programa salud ocupacional (si aplica):	
8. Aspectos sociales: Se realizará la socialización el día miércoles 31 de enero y se aprovechará ésta, como auditoría visible.	
OBSERVACIONES:	
* No se presentan observaciones de la obra para el periodo del presente informe.	
 FIRMA DEL CONTRATISTA NOMBRE: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO CARGO: REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA	Aprobado por: VoBo (FIRMA) NOMBRE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA



INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° IND - 23 - 5027

CONTRATANTE: INTERVALLE NIT. 805.012.896-4 ORDENADOR DEL GASTO: NICOLAS TRIANA CASTILLO

CONTRATISTA: CONSTRUPACIOL S.A.S. ZOMAC NIT. 901.526.894-4

REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO C.C. 1.006.166.501

INTERVENTOR: CONSORCIO GRUPO 3 NIT. 901.769.200-6 REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ, C.C. 16.700.426

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR TOTAL \$

\$1.426.801.042 MCTE - INCLUIDO AUI

PLAZO

6 MESES

185 DÍAS

FECHA DE INICIO

28-dic-23

PRORROGA 1

DEL:

HASTA:

PRORROGA 2

DEL:

HASTA:

PRORROGA 3

DEL:

HASTA:

SUSPENSION 1

DEL:

HASTA:

SUSPENSION 2

DEL:

HASTA:

SUSPENSION 3

DEL:

HASTA:

2. INFORMACIÓN BÁSICA DEL FRENTE DE OBRA

FRENTE No. 01: CUBIERTA CANCHA MULTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO

VALOR COSTOS TOTALES: \$1.426.801.042

Informe N°:

4

Fecha de informe: 22/01/2024

A

28/01/2024

INFORMACION GENERAL		SEGUIMIENTO DE OBRA				
CONTRATISTA DE OBRA		AVANCE FISICO (%)				
Valor frente de obra:	\$1.426.801.042	Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso
Adiciones o mayor valor:		% Programado	0,00%	0,00%	0,00%	0
Valor total:	\$1.426.801.042	% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	0
Fecha de Inicio	28/12/2023	Diferencia	0,00%	0,00%	0,00%	
Tiempo de prorrogas		AVANCE FINANCIERO				En %
Tiempo de suspensiones	-	Programado(%)	\$0,00	\$ 0	\$ 0	0,00%
Plazo estipulado:		Ejecutado (%)	\$0,00	\$ 0	\$ 0	0,00%
Fecha de terminación:	30/06/2024	Diferencia	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
Tiempo transcurrido contrato:	31 días	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		PERSONAL PROMEDIO EN OBRA				
Fecha de Inicio:	28/12/2023	Interventoria:	Ingeniero Residente e Inspector			
Tiempo de prorrogas:	-	Contratista:	Ingeniero Director de Obra			
Tiempo de suspensiones:	-	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA				
Plazo actualizado:	185					
Fecha de terminación:	30/06/2024					
Tiempo transcurrido Interventoría:	31	SEGUIMIENTO OBLIGACIONES			VERIFICADO POR	S/N/NA
		Aportes a seguridad Social y parafiscales			Interventor	N
		Normas seguridad, higiene y salud ocupacional			Interventor	N
		Normas ambientales			Interventor	N

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1:


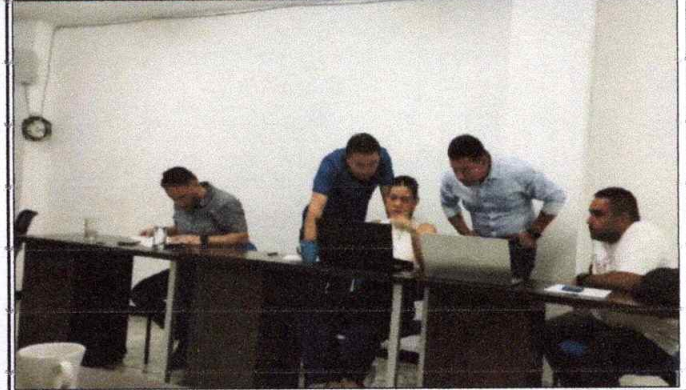


Foto 2:

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO DE INVESTIGACION



FECHA	ACTIVIDADES	AVANCE
15/01/2023	Revisión de la literatura científica sobre el tema de la investigación.	Se revisaron 10 artículos científicos.
16/01/2023	Elaboración del protocolo de investigación.	Se elaboró el protocolo de investigación.
17/01/2023	Revisión del protocolo de investigación.	Se revisó el protocolo de investigación.
18/01/2023	Elaboración del plan de trabajo.	Se elaboró el plan de trabajo.
19/01/2023	Revisión del plan de trabajo.	Se revisó el plan de trabajo.
20/01/2023	Elaboración del informe de avance.	Se elaboró el informe de avance.
21/01/2023	Revisión del informe de avance.	Se revisó el informe de avance.
22/01/2023	Elaboración del informe final.	Se elaboró el informe final.
23/01/2023	Revisión del informe final.	Se revisó el informe final.
24/01/2023	Elaboración del informe de cierre.	Se elaboró el informe de cierre.
25/01/2023	Revisión del informe de cierre.	Se revisó el informe de cierre.





INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



Foto 3:



Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

LUNES: Se realiza reunion con contratista, con el fin de determinar las observaciones que tiene en cuenta a los diseños

MARTES: -

MIÉRCOLES:

JUEVES: - Se realiza reunion de seguimiento con la entidad contratante, con el fin de determinar el inicio de las actividades. El contratista indica, que debe generarse la socialización del proyecto, antes de iniciar actividades.

VIERNES:

SABADO:

DOMINGO:

ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR

Se programa socialización de proyecto para el día miércoles 31 de enero a las 10:00 de manera presencia en el instituto técnico de Buenaventura.

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:

El contratista debiera efectuar el ajuste del documento, con el fin de mostrar las fechas de ejecución.

2. Disponibilidad de Recursos:

La entidad contiene todos los recursos por el plan nacional de regalías, con el fin de financiar el proyecto

3. Ejecución Financiera:

No se dispone de ningún porcentaje en Actas Parciales, ya que no se contiene porcentaje de ejecución.

4. Calidad de los trabajos:

Hasta el momento no hay obra ejecutada

5. Manejo Ambiental:

Se le solicita al contratista los certificados de botadero de residuos y materiales sobrantes.

6. Seguridad Industrial:

Se le solicita al contratista que, antes de iniciar actividades, se debe presentar la seguridad social, ARL, Pension, con el fin de verificar información.

7. Programa salud ocupacional (si aplica):

8. Aspectos sociales:

Se realizará la socialización el día miércoles 31 de enero y se aprovechará ésta, como auditoría visible.

OBSERVACIONES:

* No se presentan observaciones de la obra para el periodo del presente informe.

Aprobado por:

FIRMA EL CONTRATISTA

NOMBRE: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO



CARGO: REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

VuBo (FIRMA)

NOMBRE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ

CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO DE INFRASURSTRUCTURA



INDICADORES DE AVANCE	
1. Avance físico	
2. Avance financiero	
3. Avance técnico	
4. Avance legal	
5. Avance ambiental	
6. Avance social	
7. Avance de seguridad	
8. Avance de calidad	
9. Avance de sostenibilidad	
10. Avance de innovación	
11. Avance de eficiencia	
12. Avance de efectividad	
13. Avance de impacto	
14. Avance de equidad	
15. Avance de inclusión	
16. Avance de transparencia	
17. Avance de rendición de cuentas	
18. Avance de participación ciudadana	
19. Avance de corresponsabilidad	
20. Avance de gobernanza	
21. Avance de gestión	
22. Avance de planeación	
23. Avance de monitoreo y evaluación	
24. Avance de comunicación	
25. Avance de relaciones públicas	
26. Avance de marketing	
27. Avance de ventas	
28. Avance de distribución	
29. Avance de servicio al cliente	
30. Avance de satisfacción del cliente	
31. Avance de fidelización	
32. Avance de retención	
33. Avance de crecimiento	
34. Avance de expansión	
35. Avance de diversificación	
36. Avance de internacionalización	
37. Avance de alianzas	
38. Avance de asociaciones	
39. Avance de consorcios	
40. Avance de joint ventures	
41. Avance de fusiones	
42. Avance de adquisiciones	
43. Avance de reestructuraciones	
44. Avance de liquidaciones	
45. Avance de quiebras	
46. Avance de insolvencias	
47. Avance de concursos de acreedores	
48. Avance de procedimientos de quiebra	
49. Avance de procesos de reorganización	
50. Avance de procesos de liquidación	



INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° IND - 23 - 5027

CONTRATANTE: INTERVALLE NIT. 805.012.896-4 ORDENADOR DEL GASTO: NICOLAS TRIANA CASTILLO

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC NIT. 901.526.894-4

REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO C.C. 1.006.166.501

INTERVENTOR: CONSORCIO GRUPO 3 NIT. 901.769.200-6 REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ C.C. 16.700.426

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR TOTAL \$

\$1.426.801.042 M/CTE - INCLUIDO AIU

PLAZO

6 MESES

185 DÍAS

FECHA DE INICIO

28-dic-23

PRORROGA 1

DEL:

HASTA:

PRORROGA 2

DEL:

HASTA:

PRORROGA 3

DEL:

HASTA:

SUSPENSION 1

DEL:

HASTA:

SUSPENSION 2

DEL:

HASTA:

SUSPENSION 3

DEL:

HASTA:

2. INFORMACIÓN BÁSICA DEL FRENTE DE OBRA

FRENTE No. 06: CUBIERTA CANCHA MULTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO

VALOR COSTOS TOTALES: \$1.426.801.042

Informe N°:

5

Fecha de informe: 29/01/2024

A

4/02/2024

INFORMACION GENERAL		SEGUIMIENTO DE OBRA				
CONTRATISTA DE OBRA		AVANCE FISICO (%)				
Valor frente de obra:	\$1.426.801.042	Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso
Adiciones o mayor valor:		% Programado	0,00%	4,17%	4,17%	1
Valor total:	\$1.426.801.042	% Ejecutado	0,00%	7,84%	7,84%	0
Fecha de Inicio	28/12/2023	Diferencia	0.00%	3.67%	3.67%	
Tiempo de prorrogas	-	AVANCE FINANCIERO				En %
Tiempo de suspensiones	-	Programado(%)	\$0	\$59.454.799	\$59.454.799	4,17%
Plazo estipulado:	185	Ejecutado (%)	\$0	\$111.861.202	\$111.861.202	7.84%
Fecha de terminación:	30/06/2024	Diferencia	\$0	\$52.406.402	\$52.406.402	3,67%
Tiempo transcurrido contrato:	38 días	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		PERSONAL PROMEDIO EN OBRA				
Fecha de Inicio:	28/12/2023	Interventoría:	Ingeniero Residente e inspector			
Tiempo de prorrogas:	-	Contratista:	Arquitecto Residente de obra y tres obreros			
Tiempo de suspensiones:	-	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA				
Plazo actualizado:	185	Herramienta menor				
Fecha de terminación:	30/06/2024					
Tiempo transcurrido Interventoria:	38	SEGUIMIENTO OBLIGACIONES			VERIFICADO POR	S/N/A
		Aportes a seguridad Social y parafiscales			Interventor	N
		Normas seguridad, higiene y salud ocupacional			Interventor	N
		Normas ambientales			Interventor	N

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1: Visita al frente de obra por el contratista.



Foto 2: Cerramiento perimetral con tela tejida



INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO DE INTERPRETACION

El presente informe tiene como objetivo informar sobre el avance del proyecto de interpretación de los mapas de la zona de estudio, durante la semana del 10 al 16 de mayo de 2010. El trabajo se ha centrado en la actualización de la base de datos de la zona de estudio, así como en la elaboración de los mapas de interpretación de los mapas de la zona de estudio.

El trabajo se ha dividido en tres partes principales: la primera parte se ha centrado en la actualización de la base de datos de la zona de estudio, la segunda parte se ha centrado en la elaboración de los mapas de interpretación de los mapas de la zona de estudio, y la tercera parte se ha centrado en la elaboración de los mapas de interpretación de los mapas de la zona de estudio.

FECHA	ACTIVIDADES	RESULTADOS
10/05/2010	Revisión de la base de datos de la zona de estudio.	Actualización de la base de datos de la zona de estudio.
11/05/2010	Elaboración de los mapas de interpretación de los mapas de la zona de estudio.	Elaboración de los mapas de interpretación de los mapas de la zona de estudio.
12/05/2010	Elaboración de los mapas de interpretación de los mapas de la zona de estudio.	Elaboración de los mapas de interpretación de los mapas de la zona de estudio.
13/05/2010	Elaboración de los mapas de interpretación de los mapas de la zona de estudio.	Elaboración de los mapas de interpretación de los mapas de la zona de estudio.
14/05/2010	Elaboración de los mapas de interpretación de los mapas de la zona de estudio.	Elaboración de los mapas de interpretación de los mapas de la zona de estudio.
15/05/2010	Elaboración de los mapas de interpretación de los mapas de la zona de estudio.	Elaboración de los mapas de interpretación de los mapas de la zona de estudio.
16/05/2010	Elaboración de los mapas de interpretación de los mapas de la zona de estudio.	Elaboración de los mapas de interpretación de los mapas de la zona de estudio.





INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



Foto 3: Campamento de obra

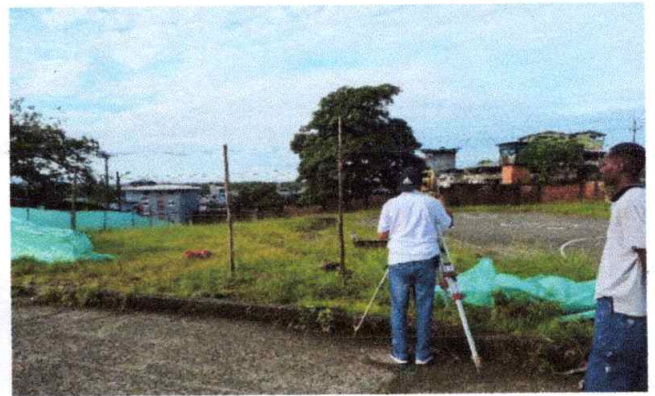


Foto 4: Localización y replanteo



Foto 5: Corte y figurado del acero



Foto 6: Estructura de acero para dado o zapata en concreto

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

LUNES: - Visita por el contratista al frente de la obra.
MARTES: - Se realizó cerramiento provisional en tela verde.
MIÉRCOLES: - Se realizó localización y replanteo de puntos para pilotes de la estructura de cubierta y la malla contra impacto.
- Se realizó reunión con la comunidad educativa del Instituto Técnico Industrial GVC con el objetivo de socializar el proyecto.
JUEVES: - Se plantea a la interventoría la problemática surtida a partir de la localización y replanteo; en la cual se observa a partir de la misma localización que algunos de los puntos localizados están dando exactamente sobre una pendiente en inmediaciones de la carmel, por otro lado, con el muro existente de la I.E. en ese sentido se pueden generar daños en el muro y con la excavación se podría romper la tubería existente de aguas lluvias que pasan por los puntos determinados. - Se realizó corte, figurado y armado de acero refuerzo para estructuras en concreto.
VIERNES: - Se realizó corte, figurado y armado de acero refuerzo para estructuras en concreto.
SABADO: - Se realizó excavación manual para instalación de alcantarillado y drenajes.
DOMINGO: - No se realizan actividades en la obra el día de hoy.

ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR

* Localización y replanteo arquitectónico y drenajes
Excavación manual para fundición de cajas de inspección y sumideros
Demoliciones varias
figurado y armado de acero refuerzo para estructuras en concreto
Socialización con la Comunidad Educativa e Intervalle

* Corte,
*

LOGROS Y/O DIFICULTADES

- 1. Cronograma:**
La obra presenta una ejecución 7 días con respecto al cronograma programado.
- 2. Disponibilidad de Recursos:**
En la obra se encuentran todos los recursos, maquinaria y equipos requeridos para realizar de manera correcta las actividades.
- 3. Ejecución Financiera:**
Se realiza actividades correspondientes a lo programado, donde se electua una inversión total de \$111.861.202
- 4. Calidad de los trabajos:**
Hasta el momento los trabajos ejecutados son aceptados por la interventoría.
- 5. Manejo Ambiental:**
Hasta la fecha no se requiere de un botadero de residuos y materiales sobrantes.
- 6. Seguridad Industrial:**
Hasta el momento los trabajos no requieren que los trabajadores hagan uso de los elementos de seguridad requeridos para las actividades.
- 7. Programa salud ocupacional (si aplica):**
- 8. Aspectos sociales:**

OBSERVACIONES:

* Una vez localizado los puntos para pilotes de la malla contra impacto y la estructura de cubierta, en estos últimos se pudo evidenciar, que su referenciación

Aprobado por:

FIRMA EL CONTRATISTA

NOMBRE: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

CARGO: REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA




VoBo (FIRMA)

NOMBRE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ

CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA



MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
INFORME DE L'AVANCE SEMANAL PROYECTO DE RE-ESTRUCTURACION



1. OBJETIVO	
El presente informe tiene como finalidad informar a la Junta Directiva sobre el avance de la re-estructuración del proyecto de desarrollo agrícola, durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de mayo de 1975.	
2. AVANCE DE LA RE-ESTRUCTURACION	
2.1. RE-ESTRUCTURACION DEL PLAN DE TRABAJO	
Se ha re-estructurado el plan de trabajo para el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de mayo de 1975, teniendo en cuenta las actividades realizadas durante el periodo anterior y las actividades programadas para el periodo siguiente.	
2.2. RE-ESTRUCTURACION DEL PRESUPUESTO	
Se ha re-estructurado el presupuesto para el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de mayo de 1975, teniendo en cuenta las actividades realizadas durante el periodo anterior y las actividades programadas para el periodo siguiente.	
2.3. RE-ESTRUCTURACION DEL PERSONAL	
Se ha re-estructurado el personal para el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de mayo de 1975, teniendo en cuenta las actividades realizadas durante el periodo anterior y las actividades programadas para el periodo siguiente.	
2.4. RE-ESTRUCTURACION DE LOS RECURSOS	
Se ha re-estructurado los recursos para el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de mayo de 1975, teniendo en cuenta las actividades realizadas durante el periodo anterior y las actividades programadas para el periodo siguiente.	
3. CONCLUSIONES	
Se concluye que el avance de la re-estructuración del proyecto de desarrollo agrícola, durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de mayo de 1975, ha sido satisfactorio.	
4. RECOMENDACIONES	
Se recomienda que se continúe con la re-estructuración del proyecto de desarrollo agrícola, durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de mayo de 1975.	



CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC
NIT 901526894-4

INFORME MENSUAL No. 01
CONTRATO DE OBRA No. IND - 23 - 5027

28 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

GENERALIDADES

INTRODUCCION

El presente documento es elaborado por el contratista, CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC NIT. 901.526.894-4 mediante el contrato de obra No. IND – 23 – 5027, cuyo objeto es: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: **GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.**

En este informe mensual se resume el seguimiento técnico, administrativo, ambiental, financiero, jurídica de los aspectos más relevantes ocurridos durante la ejecución de la obra en el periodo comprendido entre el 28 de diciembre del 2023 al 31 de enero del 2024.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

DATOS BASICOS DEL PROYECTO

**ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

CODIGO BPIN: 2022003760006

La Gobernación del Valle del Cauca realizó procesos de concertación y socialización del Plan Departamental de Desarrollo Departamental denominado: **VALLE INVENCIBLE 2020 – 2023**, dentro del cual se encuentra incluido el proyecto en asunto, con las poblaciones de los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el Departamento del Valle del Cauca.

Dirección: Manzana H14- Barrio Huasipanga, Mocoa, Putumayo

Cel: 320 4736672

Correo Electrónico: construpacicolzaszomac.info@gmail.com



CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC
NIT 901526894-4

Así mismo se realizaron mesas de trabajo con la comunidad beneficiaria del proyecto en relación con su alcance.

El proyecto general de: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: **GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**, la Gobernación del Valle del Cauca y la Entidad promotora del Deporte, Educación Física y la Recreación - Indervalle, se ha basado en estudios donde se comprueba que la recreación, el deporte y la actividad física es un medio transversal que potencializa la calidad de vida de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores, convirtiéndose así en una ruta de primer nivel para la ocupación del tiempo libre, fomento de hábitos saludables y resolución de conflictos. En consecuencia, se quiere lograr que dentro de las políticas públicas locales y territoriales deportivas exista el compromiso de apoyar activamente estas iniciativas y generar espacios de encuentros diferentes que permitan explorar nuevas capacidades, transformar imaginarios, hacer uso adecuado del tiempo libre y fortalecer redes de apoyo.

Con la ejecución del proyecto, se propone articular la experiencia profesional con los conocimientos técnicos y profesionales que INDERVALLE ofrece, los cuales contribuyen al beneficio de la Comunidad y la recreación en el Distrito de: Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca, a través de adecuación, construcción o dotación, e igualmente se canalizan las habilidades aprendidas en intervenciones anteriores.

Es importante resaltar que el proyecto consolida los procesos deportivos, recreativos y culturales en el Departamento del Valle del Cauca, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y construcción de tejido social en los sitios donde se desarrollan.

En resumen, tenemos:

Dirección: Manzana H14- Barrio Huasipanga, Mocoa, Putumayo
Cel: 320 4736672
Correo Electrónico: construpacicolzaszomac.info@gmail.com



Así mismo se realizarán mesas de trabajo con la comunidad beneficiada que permitan la relación con su alcance.

El proyecto general de MEJORAMIENTO A ESCUELAS DE PRIMARIA Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE ALTA y BAJA GUAYAMA DEL VALLE DEL CAUCA REABLANDO LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS DEL GRUPO 2. BUENAVENTURA Y CLUSTRO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, la Gobernación del Valle del Cauca y la Entidad promotor del Dpto de Educación Física y Recreación, tienen como finalidad en estudios donde se convenga que la recreación en el entorno y la actividad física sea un medio transversal que potencialice la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes adolescentes, adultos y adultos mayores, contribuyendo así a la salud de la comunidad para la ocupación del tiempo libre, fomento de hábitos saludables, la participación comunitaria y la convivencia pacífica. En consecuencia, se busca impactar que dentro de las diferentes acciones se realicen actividades deportivas que permitan a los deportistas tener un espacio para la práctica de actividades físicas y deportivas que permitan explorar nuevas capacidades físicas y psicológicas de los deportistas, hacer uso adecuado del tiempo libre y fortalecer los hábitos.

Con la ejecución del proyecto, se propone fortalecer la experiencia de los deportistas en conocimientos técnicos y profesionales que INDESPA les ofrece, así como la participación beneficiada de la comunidad y la recreación en el Distrito del Buenaventura. El Departamento del Valle del Cauca, a través de la educación, contribuye en el desarrollo integral de la comunidad y la realización de actividades deportivas en intervenciones sociales.

Es importante resaltar que el proyecto contribuye a la realización de actividades físicas y deportivas en el Distrito del Buenaventura, fortaleciendo la calidad de vida de los deportistas y la participación de la comunidad en las actividades deportivas.

En resumen, tener la

CONTRATO DE OBRA No. IND - 23 – 5027 GRUPO 2

INFORMACION DEL CONTRATO

1. TIPO DE CONTRATO		
OBRA ☒	INTERVENTORIA ☐	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐	
Informe Número: 1	Periodo desde el (28/12/2023) hasta el (31/01/2024)	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN		
Contrato / Aceptación de Oferta No. IND – 23 – 5027 GRUPO 2		
Nombre Completo del Contratista: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC		
Cédula y/o Nit: 901.526.894-4	Correo Electrónico: construpacicolzaszomac.info@gmail.com	
Dirección: manzana H 14A Barrio Huasipanga Mocoa - Putumayo	Teléfonos: 320 473 66 72	
Nombre de interventoría: CONSORCIO GRUPO 3		
Dependencia: Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca - INDERVALLE	No. Teléfono y Extensión: (602) 25569242	
Obra Física Ejecutada del Periodo: 0.00%	Obra Física Ejecutada Acumulada: 0.00%	
Objeto Contrato Obra: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES GRUPO 2 FRENTE 1: ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
3. INFORME JURÍDICO		
Fecha de Inicio	Plazo de Ejecución	Fecha terminación
28 DE DICIEMBRE DE 2023	185 DIAS	30 DE JUNIO DE 2024
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO		



CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC
NIT 901526894-4

Valor del Contrato: Es hasta por la suma de: MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE \$ 1.426.801.042			
Adición No. 1: N/A			
Prórroga No.: 1 N/A			
Prórroga No.: 2 N/A			
Prórroga No.: 3 N/A			
Prórroga No.: 4 N/A			
Suspensión No.: 1 N/A			
Reinicio No.: 1 N/A			
Cesión: N.A.			
Terminación Anticipada: N/A			
Acta de recibo final de obra: N/A			
Acta de liquidación: N/A			
Resumen Contable y Financiero:			
Valor Total del Contrato	Valor Adición 1	Valor Acumulado Contrato	Valor Anticipo
\$ 1.426.801.042	\$ 0.00	\$ 1.426.801.042	\$ 0.00

ACTA				RECIBO PARCIAL		VALOR NETO A PAGAR	
No	Meses Ejecución			Ejecutado (Valor Bruto)	Acumulado	Amortización Anticipo	A pagar
1							
2							
3							
4							

Dirección: Manzana H14- Barrio Huasipanga, Mocoa, Putumayo
Cel: 320 4736672
Correo Electrónico: construpacicolssaszomac.info@gmail.com



Valor del Contrato en pesos por la suma de mil cuatrocientos y dos pesos y 00/100 (\$ 1,428.801.042)		
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS Y 00/100 (\$ 1,428.801.042)		
Adición No. 1 N/A		
Prórroga No. 1 N/A		
Prórroga No. 2 N/A		
Prórroga No. 3 N/A		
Prórroga No. 4 N/A		
Suspensión No. 1 N/A		
Reinicio No. 1 N/A		
Cesión N/A		
Terminación Anticipada N/A		
Acta de recibo final N/A		
Acta de liquidación N/A		
Resumen Control de Pagos		
Valor Total del Contrato	Valor Adicional	Valor Compensación
\$ 1,428.801.042	\$ 0.00	\$ 1,428.801.042
		Valor Anticipo
		\$ 0.00

ACTA		RECIBO PARCIAL		VALOR A PAGAR	
No.	Mes	Periodo	Acumulado (Valor Dólar)	Acumulado (Valor Dólar)	Valor a Pagar
1					
2					
3					
4					



CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC
NIT 901526894-4

POLIZAS

SEGÚN FECHA DE CONTRATO

GARANTE (Aseguradora, Banco o Fiduciaria)	No. GARANTÍA	FECHA DE EXPEDICIO N	AMPAROS	VIGENCIA		SUFICIENCIA (monto garantizado)
				Desde (d/m/a)	Hasta (d/m/a)	
Seguros solidaria	420-47- 994000042515 Póliza de Garantía Única de Cumplimiento Estatel	27/12/2023	Cumplimiento del Contrato	28/12/2023	30/12/2024	\$ 286.787.009,44
			Pago de salarios, prestaciones sociales	28/12/2023	30/06/2027	\$ 115.570.884,40
			Calidad de la Obra	30/06/2024	30/12/2029	\$ 286.787.009,44
Seguros solidaria	420-47- 994000010243 Póliza Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual	27/12/2023	Predios labores y operaciones	28/12/2023	30/06/2024	\$ 260.000.000.00

ACTIVIDADES EJECUTADAS DESDE EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

Según la proyección de ejecución de obra, las actividades realizadas en este periodo corresponden a las actividades preliminares de la malla contra impacto y la estructura de la cubierta al mismo tiempo de actividades de cimentación como acero flejado para pilotes de la estructura de cubierta y drenajes en general.

- ✓ Visita por el contratista al frente de la obra.
- ✓ Se realizó cerramiento provisional en tela verde.
- ✓ Se realiza reunión con la entidad contratante, con el fin de puntualizar las observaciones que se tienen en cuanto a los diseños.
- ✓ Se realiza reunión de seguimiento con la entidad contratante, con el fin de determinar el inicio de las actividades.
- ✓ Se realizó localización y replanteo de puntos para pilotes de la estructura de cubierta y la malla contra impacto.
- ✓ Se realizó reunión con la comunidad educativa del Instituto Técnico Industrial GVC con el objetivo de socializar el proyecto.
- ✓ Se realizó corte, figurado y armado de acero refuerzo para estructuras en concreto.


Dirección: Manzana H14- Barrio Huasipanga, Mocoa, Putumayo

Cel: 320 4736672

Correo Electrónico: construpacicolzaszomac.info@gmail.com



CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC
NIT 901526894-4



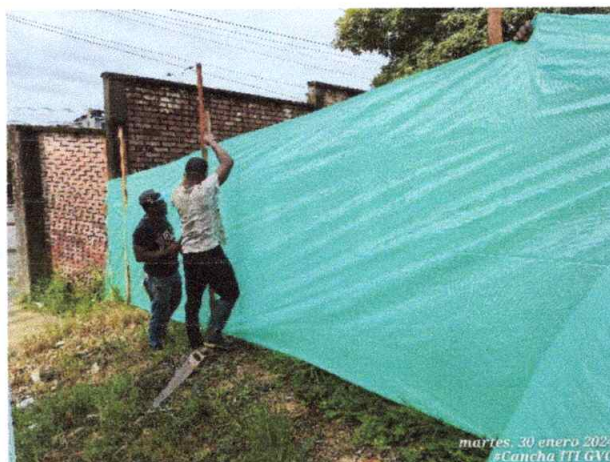


Visita por el contratista al frente de la obra.

Dirección: Manzana H14- Barrio Huasipanga, Mocoa, Putumayo

Cel: 320 4736672

Correo Electrónico: construpacicolzaszomac.info@gmail.com



Vista por el costado de la casa

El agua es muy buena y el clima es muy agradable. La casa es muy bonita y tiene muchas cosas interesantes. Si quieres saber más, visita el sitio web de la casa.



CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC
NIT 901526894-4

Se realizó cerramiento provisional en tela verde.



Se realiza reunión con la entidad contratante, con el fin de puntualizar las observaciones que se tienen en cuanto a los diseños.



Se realizó localización y replanteo de puntos para pilotes de la estructura de cubierta y la malla contra impacto.

Se realizó corte, figurado y armado de acero refuerzo para estructuras en concreto.

Dirección: Manzana H14- Barrio Huasipanga, Mocoa, Putumayo


Cel: 320 4736672

Correo Electrónico: construpacicolzaszomac.info@gmail.com



Se realizó levantamiento provisional en terreno

1987-88



Se realizó reunión con la entidad contratada, con el fin de verificar los datos que se tienen en los planos.



Se realizó el levantamiento definitivo de la estructura de la planta y la planta de la planta.

Se realizó el levantamiento definitivo de la estructura de la planta y la planta de la planta.



CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC
NIT 901526894-4

RECURSOS HUMANOS

Para la gestión y ejecución de las actividades de obra durante este periodo se contó con el apoyo del siguiente personal:

- Ing. Guillermo villegas
- Arq. Beymar Panameño Angulo
- Profesional en SST Alvaro Tenorio
- Almacenista
- 1 Oficiales
- 3 Ayudantes

Revisión y Verificación de Pago de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscal (EPS, ARL y AFP)

Para el periodo informado se verificaron que las afiliaciones de todo el personal al Sistema General de Riesgos Laborales y los respectivos pagos de las planillas de aportes al sistema Integral de seguridad social, según los dos últimos dígitos del NIT, como lo establece el Art.3.2.2.1 del Decreto 923 de 2017 expedido por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud y Protección Social por el Consorcio Grupo 3 y personal independiente del contratista.

REVISION DE ENSAYOS DE LABORATORIO

A la fecha se han efectuado actividades de suelos y de materiales como son los diseños de mezclas los cuales fueron entregados a la interventoría para su aprobación.

AVANCE DE OBRA

Ejecución del contrato

Porcentaje de Obra Proyectado Grupo 2: 0.00 %

Porcentaje de obra Ejecutado: 0.00 %

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el presente periodo se ha contratado personal del sector donde se ejecuta cada frente de obra.
- Se aprueba el Plan de Calidad de la obra

Dirección: Manzana H14- Barrio Huasipanga, Mocoa, Putumayo
Cel: 320 4736672

Correo Electrónico: construpacicolzaszomac.info@gmail.com



RECURSOS HUMANOS

Para la gestión y el control de las actividades de observación, se cuenta con el apoyo del siguiente personal:

- Ing. Guillermo Velásquez
- Ald. Berrío, Tania Angulo
- Profesional en GPT, Ana Teresa
- Asistentes
- 1 Operador
- 3 Ayudantes

Revisión y Verificación de Pago de Aportes a la Seguridad Social (EPS, ARL y AFR)

Para el periodo referido se verificó que las entidades que las aportaciones a la Seguridad Social (EPS, ARL y AFR) se encuentran al día en el pago de los aportes y los respectivos pagos de los intereses. Se verificó que las entidades que las aportaciones a la Seguridad Social (EPS, ARL y AFR) se encuentran al día en el pago de los aportes y los respectivos pagos de los intereses. Se verificó que las entidades que las aportaciones a la Seguridad Social (EPS, ARL y AFR) se encuentran al día en el pago de los aportes y los respectivos pagos de los intereses.

REVISIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO

A la fecha se han efectuado actividades de control y verificación de los resultados de los ensayos de laboratorio, los cuales se encuentran dentro de los parámetros establecidos.

AVANCE DE OBRA

Ejecución del contrato

Porcentaje de Obra Proyectada Grupo 2: 0.00 %

Porcentaje de obra Ejecutada: 0.00 %

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el presente periodo se ha cumplido con el cronograma de ejecución de la obra.
- Se aprobó el Plan de Calidad de la obra.

El presente informe fue elaborado por el personal de la Oficina de Asesoría Jurídica, el cual se encuentra en concordancia con los resultados de la auditoría.



CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC
NIT 901526894-4

- El contrato de obra presenta un avance del 16.75 %.

Hasta el corte de presente informe, el contratista se dispone al inicio de actividades de excavaciones de cimentación, pero han iniciado las precipitaciones a nivel nacional, por lo que estas actividades, no se han logrado iniciar.

Se espera que se inicien las excavaciones de las vigas de cimentación y se pueda transportar la piloteadora, con el fin empezar las perforaciones profundas y los anchos de acuerdo con los diseños estructurales

Atentamente,

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Dirección: Manzana H14- Barrio Huasipanga, Mocoa, Putumayo

Cel: 320 4736672

Correo Electrónico: construpacicolzaszomac.info@gmail.com

SISO

113

CONSTRUPACICOL ZOMAC

NIT 901.526.894

**“MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA
LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL
DISTRITO ESPECIAL DE CALI”**

CONTRATO DE OBRA No.: IND-23-5027

**INFORME MENSUAL No. 1
AVANCE DE OBRA SST
01 DE ENERO A 31 DE ENERO**

CONSTRUPACICOL ZOMAC

CONSTRUPACICOL ZOMAC

NIT 901.526.894

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION.....	3
2. OBJETIVOS.....	4
2.1. Objetivos General.....	4
2.2. Objetivos Especifico.....	4
3. INDUCCIÓN.....	5
4. AFILIACION DEL PERSONAL DE OBRA.....	6
5. COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN (EPP).....	7

1. INTRODUCCIÓN

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es una disciplina que se encarga de la prevención de accidentes y enfermedades laborales, así como de la promoción y protección de la salud de los trabajadores mediante un conjunto de actividades, medidas, para preservar la salud y la integridad física y mental de los trabajadores, en todos los aspectos relacionados con su trabajo, mejorando el bienestar laboral y la productividad en las empresas, promoviendo una cultura en seguridad y calidad basado en la mejora continua.

La Seguridad y Salud en el Trabajo es una responsabilidad compartida por los empleadores y los trabajadores. Los empleadores tienen la obligación de garantizar la Seguridad y Salud de sus Trabajadores, adoptando las medidas necesarias para prevenir los accidentes y enfermedades laborales. Los trabajadores, por su parte, tienen la obligación de cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo y de utilizar los equipos de protección personal de manera adecuada.

La Construpacicol Zomac través de su SG-SST, busca disponer de herramientas que asegure un ambiente laboral con factores de riesgo controlados y con ello la disminución de los incidentes y accidentes de trabajo y las enfermedades laborales.

92
CONSTRUPACICOL ZOMAC

NIT 901.526.894

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Cumplir con lo propuesto en el plan de trabajo en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo; que garanticen el bienestar de los colaboradores con el fin de contrarrestar los impactos, riesgos y peligros inherentes a las actividades del Contrato de Obra IND-23-5027 **"MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI"**

2.2. Objetivos Específicos

- ❖ Ejecutar las actividades planteadas en el plan de trabajo anual del SG-SST, cumpliendo con la normatividad legal vigente.
- ❖ Realizar charlas de seguridad de prevención de los peligros y riesgos que se encuentran en las actividades que se desarrollan en obra.
- ❖ Entregar elementos de protección personal a los colaboradores y llevar el control de estos.
- ❖ Fomentar cultura de autocuidado y mutuo-cuidado en el desarrollo de las actividades promoviendo la prevención de incidentes o accidentes, de trabajo, así como la prevención de los actos o condiciones inseguras

3. INDUCCION DE SST

La vinculación del personal al proyecto, inicio con la inducción y reinducción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se expuso las políticas, reglamentos, obligaciones del empleador y del trabajador, los riesgos a los que pueden estar expuestos y todas las medidas preventivas para evitar incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral. En este espacio se deja claro que la Construpacicol Zomac tiene un gran compromiso con la protección integral del recurso humano.

Los temas tratados en la inducción se mencionan a continuación:

- ❖ SGSST: Política SST: (Contextualización de la estructura del SGSST, divulgación y sensibilización de la política y los objetivos de SST.)
- ❖ Política de Prevención Antitabaco, Alcohol y Sustancias Psicoactivas: (Divulgación y sensibilización de la política PAASPA)
- ❖ Uso clasificación y mantenimiento de elementos de protección personal: (Sensibilización uso adecuado, clasificación, mantenimiento-reposición y medidas disciplinarias de EPP)
- ❖ Política Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias: (Divulgación y sensibilización de la política PPRAE)
- ❖ Programa de orden y aseo: (Sensibilización y aplicación del programa en los ambientes de trabajo)
- ❖ Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial: (Divulgación y contextualización del reglamento y cumplimiento de este)
- ❖ Reporte incidentes-accidentes de trabajo y enfermedad laboral: (Socialización conceptos-reportes de incidentes/accidentes de trabajo y enfermedad laboral)

99
CONSTRUPACICOL ZOMAC

NIT 901.526.894

4. AFILIACIONES DE LOS TRABAJADORES

A partir del 1 de diciembre de 2012 los empleadores que incorporen nuevos trabajadores, que ya estén afiliados a Colpensiones, no necesitan diligenciar el formulario de afiliación. Deberán hacerlo a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), marcando el campo de la novedad de ingreso.




Únicamente deben presentar las afiliaciones de las personas que ingresan por primera vez al Sistema General de Pensiones (afiliación inicial) y los traslados de régimen de fondos privados de pensiones a Colpensiones, la solicitud de estos trámites podrá realizarse en forma electrónica a través de portal de transmites o en los puntos de atención PAC, que se encuentren más cercanos a su domicilio.

CONSTRUPACICOL ZOMAC

NIT 901.526.894

5. COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Antes de iniciar la ejecución del proyecto se realiza la compra de los elementos de protección personal, de igual manera se evalúa la vida útil de los EPP, puesto que de acuerdo con ello se reemplaza por deterioro o daño.

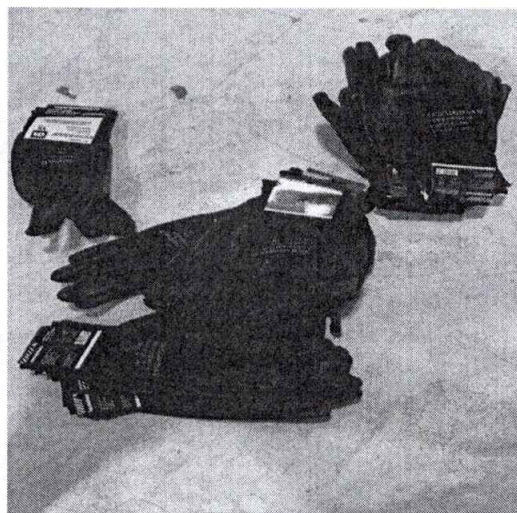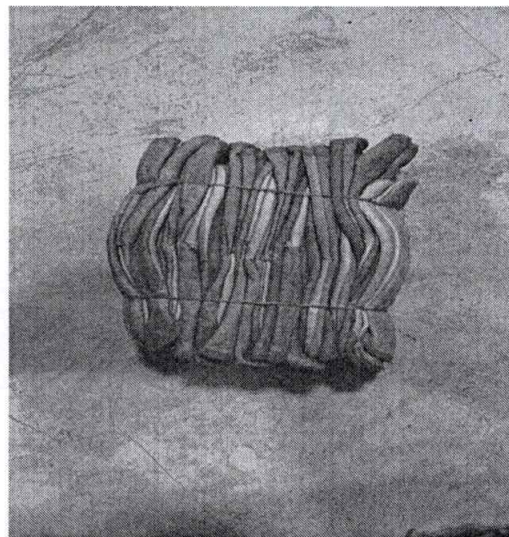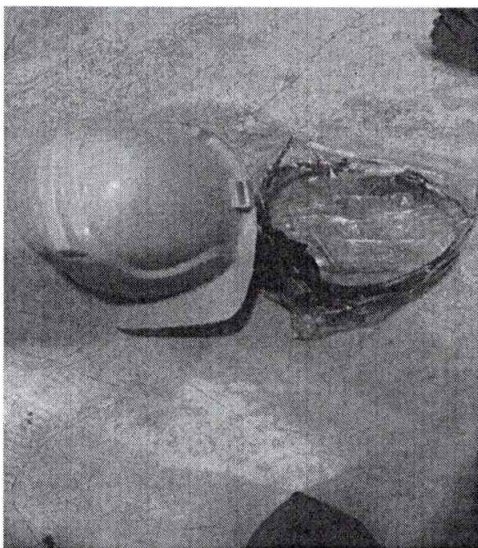


CONSTRUPACICOL ZOMAC

NIT 901.526.894

PARA CONSTANCIA SE FIRMA

31/01/2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alvaro', is written over a horizontal line.

ALVARO TENORIO RINCON

SISO ENCARGADO

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°: IND-23-6027

OBJETO DEL CONTRATO: Mejoramiento a escenarios deportivos y recreativos para los municipios de Cartago, El Distrito de Bitorá y el Distrito Especial de Cali en el Departamento del Valle del Cauca

CONTRATISTA: CONSTRUPACOL SAS ZOMAC

Representante Legal:

Residente de Obra: Arq. Beymar Panamiro Angulo

FECHA DE INICIO: 28 de diciembre de 2023

FECHA FINAL: 30 de Junio de 2024

INTERVENTORIA: CONSORCIO GRUPO 3

Representante Legal:

Residente Interventoria:

Fecha: Martes, 30/01/2024

Detalles de la obra: Se da inicio a la ejecución de las obras con instalación de lona verde (Cerramiento provisional), realizando a su vez inspección del lugar de acuerdo, al diagnóstico previamente realizado, focalizando el área a intervenir, el proceso de ejecución de las actividades y sobre todo la ruta programada para llevar a cabo la ejecución del proyecto; todo esto una vez se haga efectiva reunión programada para el día miércoles 31 de enero 2024. e iniciar en forma la ejecución de la obra.

Estado del tiempo: Día totalmente soleado

Personal en obra:

Director de obra

Sub-contratista de obra

Residente de obra


Maestro de obra

3 Ayudantes

Almacenista



Arg: Residente de obra


Presidente Interventoría

Fecha: Miércoles, 31/01/2024

Se realizó cerramiento con tela verde en campamento y limpieza del mismo. De igual manera se empezó con el corte, figurado y armado de acero de refuerzo de $3/8"$ para vigas de cimentación con una longitud de 1,60mts. También se realizó reunión con la comunidad educativa del ITI GVC con el objetivo de socializar el proyecto y conformar el Comité de Vigilancia Ciudadanos, pero se aplazó para el día 06 de febrero ya que el personal de interventoría y intervalle no pudieron asistir por problemas en la vía Cali-Bogotá (Cierros parciales). Por consiguiente se hizo toma del acta de reunión y se dio formalmente apertura a la obra.

Estado del tiempo: Día totalmente soleado.

Personal en obra:

Sub-contratista de obra

Director de obra

Residente de obra


Siso

Maestro


1. Oficial

2 Ayudantes

Almacenista



Arq. Residente de obra


Presidente Interventoría

Fecha: Jueves, 01/02/2024

Se continúa con el corte, figurado y armado de acero de refuerzo de $3/8"$ (costribos) para vigas de cimentación con una longitud de 4,60 mts.

Estado del tiempo: Día totalmente soleado.

Personal en obra:

Sub-contratista de obra

Residente de obra


Siso

Maestro


1. Oficial

2. Ayudantes

Almacenista



Arq. Residente de obra


Presidente Interventoría

Fecha: Viernes, 02/02/2024

Se continúa con el corte, figurado y armado de acero de refuerzo de $3/8"$ y $5/8"$ para vigas de cimentación y dudos en concreto respectivamente con longitudes de 4,60 mts y 4,85 mts

Norma

ACTA DE MODIFICACION 1

Distrito de Santiago de Cali 13 de febrero de 2024

CG3B-009-2024

Señores

JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

Subgerente de Infraestructura Deportiva

INDERVALLE

e-mail: infraestructura@indervalle.gov.co infra.indervalle@gmail.com


Referencia: Contrato de interventoria No. IND-23-4484

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA E INTEGRAL DE LAS OBRAS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJUDICACIÓN: **GRUPO 3. CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS** PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

Asunto: ENTREGA UBICACIÓN CANCHA MÚLTIPLE SEGÚN IMPLANTACIÓN PROPUESTA POR CONTRATISTA


El suscrito, JUAN CARLOS NARANJO RAMÍREZ en mi calidad de representante legal del CONSORCIO GRUPO 3, interventoria del contrato de obra No. IND-23-5027, cuyo objeto es: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", me dirijo a ustedes de la manera más respetuosa con el fin de entregar la propuesta realizada por el contratista CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC, donde se genera la reimplantación de la cancha múltiple y todos los elementos a construir, teniendo en cuenta que, desde la semana anterior, el contratista ha manifestado la preocupación de la ubicación plasmada en los diseños de las cimentaciones de la pantalla de protección y la cubierta, ya que, ésta colinda con el muro del centro penitenciario del Distrito de Buenaventura (Valle del Cauca), dado a que se podrá afectar la cimentación de este muro por las vibraciones de la piloteadora y el posible corte de sección de la cimentación de este muro, teniendo en cuenta que, éste funciona como un muro de carga autoportante de gran altura.



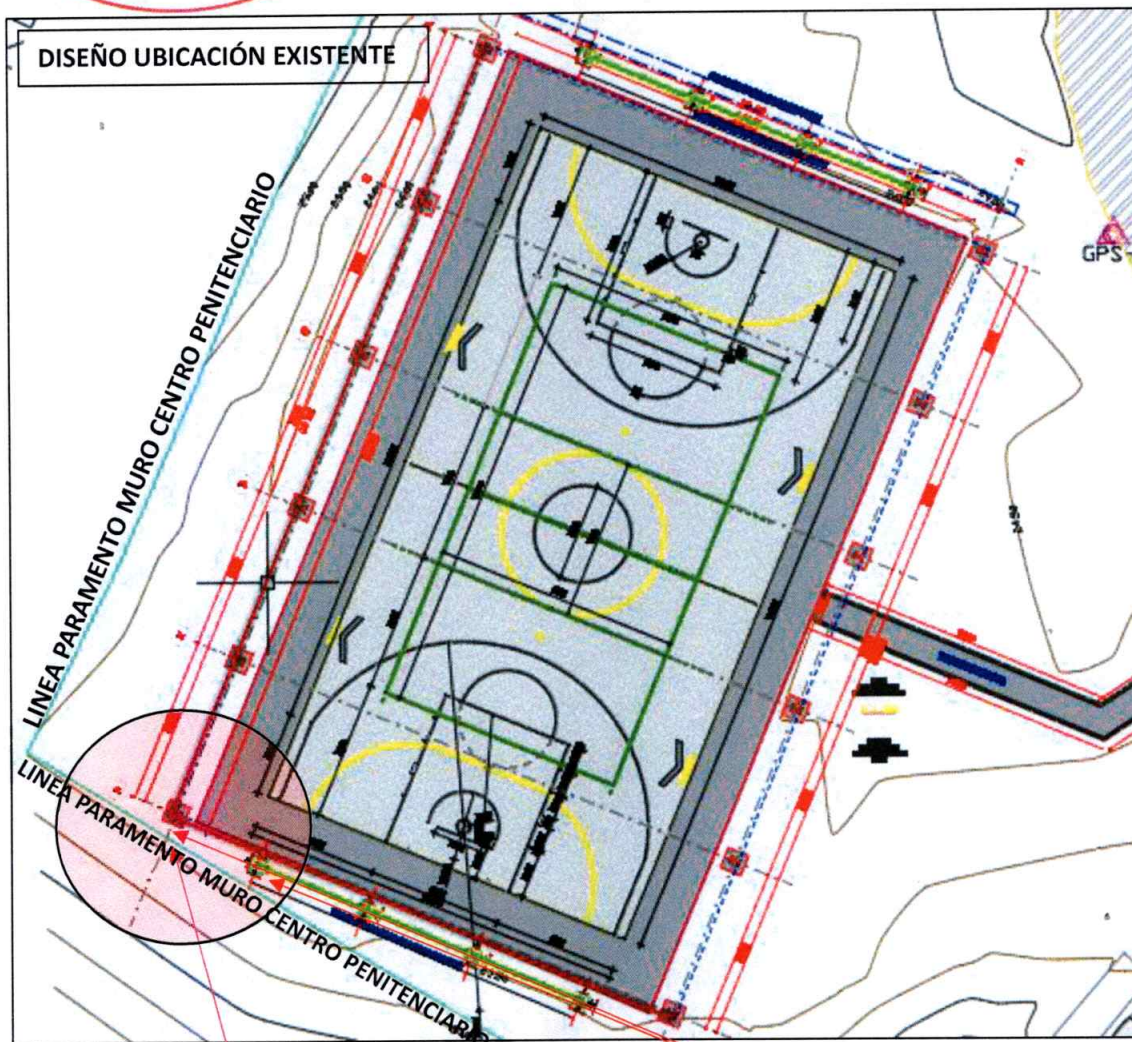

Línea de muro Centro Penitenciario

Distancia entre cimentación de cubierta y
pantalla de protección a menos de 1 metro

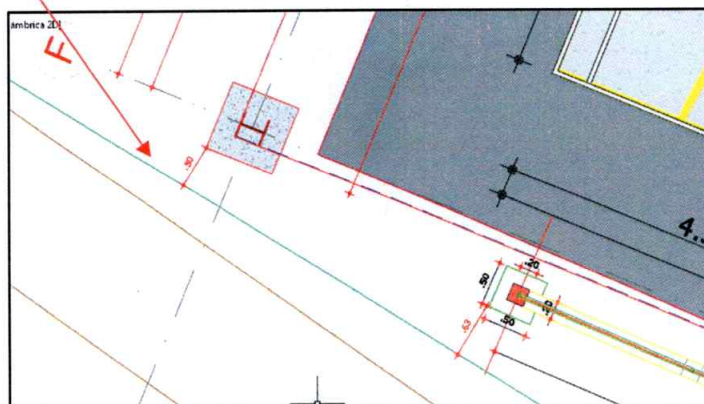

CALLE 18 N # 3N-70
OFICINA 401
EDIFICIO NOYRA
CALI-COLOMBIA



consorciogrupo3@gmail.com
cardenascivil99@gmail.com




301-2759200; 316-4918891, 602 668 55 24

La imagen anterior muestra en color verde turquesa el muro perimetral del centro penitenciario, el cual evidencia la ubicación del pilote de la cubierta del eje F1 a una distancia no superior a 50 centímetros.

El pilote de la cimentación del eje 1 de la pantalla de protección, muestra una distancia en su localización de 63 centímetros, por lo que, puede haber transferencias de vibraciones y posibles deformaciones del muro en cuestión, debido a las excavaciones tan aproximadas en el elemento.

Según el planteamiento realizado por el contratista, siguiendo los parámetros técnicos de curvas de nivel, líneas de paramento, deltas, niveles e inclusión de elementos mostrados en el diseño inicial, éste realiza la relocalización de la cancha múltiple, teniendo en cuenta que, de acuerdo a lo manifestado en comités técnicos de seguimiento, oficios y demás documentos, la cancha deberá ser demolida en su totalidad, por lo que se recurre a generar el desplazamiento de todos los elementos de la siguiente manera:

Desplaza Eje F2, 72 centímetros en sentido Suroriente, desplaza Eje F2, 187 centímetros en sentido norte, se realiza el giro de ejes, desplazando la totalidad del proyecto en bloque en sentido Nororiental, tomando como referencia de giro, el EJE F2 hasta desplazarlo **4.5 grados**, con respecto a la localización del diseño inicial. Logrando así, alejar la ejecución de las actividades correspondientes a la excavación mecánica de la cimentación de la cubierta y la pantalla.

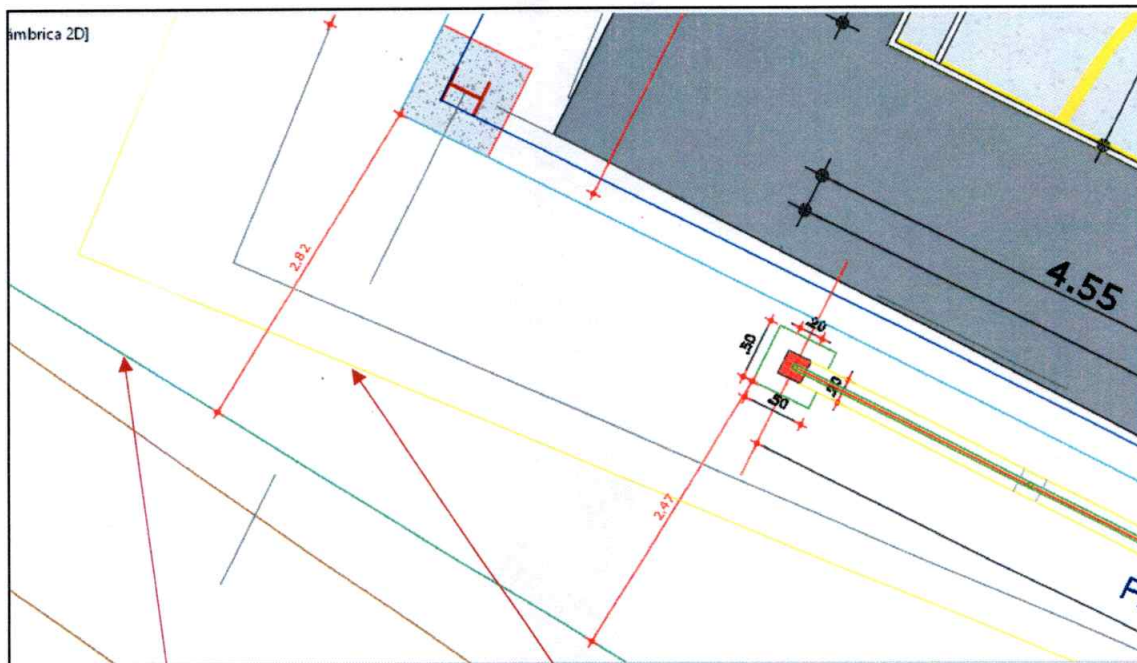

Línea Muro centro
penitenciario

Ubicación inicial cancha




De acuerdo al nuevo replanteo, se cumple con el objetivo de la no afectación de elementos estructurales colindantes y se proporciona el factor de seguridad para todos los elementos a construir. En este caso, la interventoría CONSORCIO GRUPO 3, considera que es la alternativa más acertada a ejecutar, teniendo en cuenta que se han tomado otras medidas como, por ejemplo, solo generar el desplazamiento de todos los elementos en un solo sentido, pero prevalece la limitante del manejo de las curvas de nivel que disponen realizar más actividades de estabilidad en la zona, por lo que no es una buena alternativa.

En cuanto al acercamiento de la vía, este nuevo desplazamiento genera que los pedestales de la cubierta, queden ubicados a un metro de la calle 10, por lo que la interventoría considera que no genera traumatismo alguno, debido a que la estructura de la vía no se verá afectada por las perforaciones y cumple con las condiciones mínimas para la ejecución de la cimentación de los elementos previstos en el diseño.

Se envía así, el plano de la implantación en formato editable AutoCAD y en formato .PDF, con el fin de entrar en revisión esta nueva ubicación y se viabilice por escrito, las modificaciones sugeridas por el contratista CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC; estudiadas y viabilizadas por la interventoría CONSORCIO GRUPO 3.

Se envía ACTA DE MODIFICACION 01 mostrando el alcance de ejecución necesario, con el fin de realizar las actividades preliminares de excavación de pilotes y la normal continuidad de la obra.

Cordialmente,



CONSORCIO GRUPO 3

JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

CC N°. 16.700.426 de Cali

Dirección de correo: Calle 18 Norte No. 3-70 -Oficina 401

Dirección electrónica: consorciogrupo3@gmail.com

Teléfono: (602) 6685524

Ciudad: Cali

Copia: Ing. Álvaro José Bazurto – Profesional apoyo supervisión de interventoría

ANEXO: Archivo AutoCAD, implantación de ubicación cancha múltiple. Archivo .PDF implantación de ubicación cancha múltiple. ACTA DE MODIFICACION 01



Santiago de Cali, 12 de febrero de 2024.

SEÑORES

CONSORCIO GRUPO 3

JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

Dirección de correo: Calle 18 Norte No. 3-70 -Oficina 401

Dirección electrónica: consorciogrupo3@gmail.com

Teléfono: (602) 6685524

REFERENCIA	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "
ASUNTO	REMISION ACTA 1.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito hacer entrega de la remisión del ACTA 1 de obra, con su correspondiente balance de mayores y menores cantidades.

El principal sustento de la modificación de cantidades se encuentra en el momento de realizar las memorias de cantidades de obra a ejecutar donde se aprecia el incremento y su disminución de ítems provenientes de las operaciones matemáticas y de la minuciosa tarea de calcular cada una de sus cantidades.

También una vez realizada la localización del proyecto se detecta la necesidad de replantear su ubicación debido a que la cimentación de la estructura se encontraba dando dentro de la canal de aguas lluvias existente continua al centro penitenciario situación que obliga a modificar su trazado.

Por tal motivo al implantar la nueva cancha, se observa la necesidad de realizar la demolición y posterior retiro de una franja de la cancha existente pues la estructura queda dentro de ella, esta situación se ve reflejada en el acta de balance de mayores y menores cantidades 1 con su respectivo soporte de análisis de precios unitario y memoria de cantidad.

Atentamente.


BRENDA MURILLO BARCO
Representante Legal

E-MAIL: construpacicolzaszomac.info@gmail.com

Contacto: 3204736672



7

INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: PM-FO-600-012	
	VERSION: 2	
	APROBACIÓN: 18/OCT/23	
	ACTA DE MAYORES, MENORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS. BALANCE DE OBRA PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	

FECHA PRESENTE ACTA	12 DE FEBRERO DE 2024	ACTA No.	1
CONTRATO No.	IND-23-5027		
OBJETO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA*		
CONTRATISTA :	CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	NIT - CC	901526894-4
VALOR:	\$ 1.426.801.042,00		
PLAZO DE EJECUCION	185 DIAS		
FECHA DE INICIO	28 DE DICIEMBRE DE 2023		
PROROGAS	N/A		
SUSPENSIONES	N/A		
REINICIO	N/A		
FECHA DE TERMINACION	30 DE JUNIO DE 2024		
INTERVENTOR:	CONSORCIO GRUPO G3	NIT - CC	901769200-8
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL		

Mediante el presente documento INTERVALLE, EL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR, fijan el balance actual de mayores, menores cantidades de obra e ítems no previstos en las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO. CONDICIONES ACTUALES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL NUEVAS CONDICIONES CONTRACTUALES	VALOR TOTAL
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL \$	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	
1	PRELIMINARES									
1.1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	666.81	4.390	2.927.296,00	-	0,05	-	219,50	2.927.076,00
1.1.2	EXCAVACION MANUAL TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	35,55	21.850	776.768,00	-	5,49	-	119.966,50	656.811,00
1.1.3	DEMOL. CONCRETO REFORZADO	M3	0,88	177.170	155.910,00	0,56	-	99.215,20	-	255.125,00
1.1.4	RETIRO SOBANTES MAQUINA <=10KM	M3	37,93	19.780	750.255,00	3,02	-	59.735,60	-	809.991,00
1.1.5	PODA DE ARBOLES	UND	1,00	126.280	126.280,00	-	-	-	-	126.280,00
1.1.6	DESMONTE JUEGO	UND	2,00	53.270	106.540,00	-	-	-	-	106.540,00
	SUBTOTAL CAP. 1.1 PRELIMINARES:				4.843.049			158.951	120.176	4.881.823
1.2	CIMENTACION									
1.2.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	25,91	21.850	566.134,00	24,93	-	544.730,12	-	1.110.864,00
1.2.2	RETIRO SOBANTES MAQUINA <=10KM	M3	64,56	19.780	1.276.997,00	1,53	-	30.296,27	-	1.307.293,00
1.2.3	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	38,00	27.600	1.048.800,00	-	1,00	-	27.600,00	1.021.200,00
1.2.4	PILOTE CONCRETO REFORZADO	M3	23,75	630.870	14.983.163,00	0.000440	-	277,87	-	14.983.440,00
1.2.5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	4141,87	6.200	25.679.594,00	-	209,42	-	1.298.386,65	24.381.207,00
1.2.6	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	6,00	491.180	2.947.080,00	-	-	-	-	2.947.080,00
1.2.7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	402,28	6.200	2.494.136,00	-	0,52	-	3.224,00	2.490.912,00
1.2.8	VIGA CIMENTO ENLACE 4000 PSI 28.MPA	M3	13,00	865.180	11.247.340,00	-	-	-	-	11.247.340,00
1.2.9	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	1802,64	6.200	11.176.368,00	-	7,04	-	43.648,00	11.132.720,00
1.2.10	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	6,29	551.830	3.471.011,00	-	0,15	-	80.567,18	3.390.444,00
1.2.11	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	2211,28	6.200	13.709.936,00	641,74	-	3.978.812,80	-	17.688.749,00

CATEGORIA		DESCRIPCION		VALOR		OBSERVACIONES	
1		2		3		4	
5		6		7		8	
9		10		11		12	
13		14		15		16	
17		18		19		20	
21		22		23		24	
25		26		27		28	
29		30		31		32	
33		34		35		36	
37		38		39		40	
41		42		43		44	
45		46		47		48	
49		50		51		52	
53		54		55		56	
57		58		59		60	
61		62		63		64	
65		66		67		68	
69		70		71		72	
73		74		75		76	
77		78		79		80	
81		82		83		84	
85		86		87		88	
89		90		91		92	
93		94		95		96	
97		98		99		100	

CATEGORIA		DESCRIPCION		VALOR		OBSERVACIONES	
1		2		3		4	
5		6		7		8	
9		10		11		12	
13		14		15		16	
17		18		19		20	
21		22		23		24	
25		26		27		28	
29		30		31		32	
33		34		35		36	
37		38		39		40	
41		42		43		44	
45		46		47		48	
49		50		51		52	
53		54		55		56	
57		58		59		60	
61		62		63		64	
65		66		67		68	
69		70		71		72	
73		74		75		76	
77		78		79		80	
81		82		83		84	
85		86		87		88	
89		90		91		92	
93		94		95		96	
97		98		99		100	

CATEGORIA		DESCRIPCION		VALOR		OBSERVACIONES	
1		2		3		4	
5		6		7		8	
9		10		11		12	
13		14		15		16	
17		18		19		20	
21		22		23		24	
25		26		27		28	
29		30		31		32	
33		34		35		36	
37		38		39		40	
41		42		43		44	
45		46		47		48	
49		50		51		52	
53		54		55		56	
57		58		59		60	
61		62		63		64	
65		66		67		68	
69		70		71		72	
73		74		75		76	
77		78		79		80	
81		82		83		84	
85		86		87		88	
89		90		91		92	
93		94		95		96	
97		98		99		100	

1.2.12	SIKAGRROUT PARA ANCLAJES	KG	731.86	29.540	21.619.144,00	-	117.46	-	3.469.788.40	614.40	18.149.376.00
SUBTOTAL CAP. 1.2 CIMENTACION:					110.219.703				4.923.195		109.850.625.00
ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA											
1.3	ACERO ESTRUCTURAL	KLS	30550.40	17.260	527.299.904,00	1.866.42	-	-	-	32.214.383	559.514.287.00
SUBTOTAL CAP. 1.3 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA:					527.299.904				-	32.214.383	559.514.287
CUBIERTA											
1.4	TEJA TERMOACUSTICA UPVC	M2	607.21	79.540	48.297.483,00	0.31	-	-	-	24.856	48.322.340,00
SUBTOTAL CAP. 1.4 CUBIERTA:					48.297.483				-	24.856	48.322.340
CANCHA MULTIPLE											
2.1	GEOTEXTIL REPAV 450	M2	544.14	5.340	2.905.706,00		544.14		2.905.707.60		
2.2	CARPETA ASFALTICA [ST]	M3	27.64	673.200	18.607.249,00		27.64		18.607.248.00		
2.3	IMPRIMACION	M2	544.14	3.190	1.735.807,00		544.14		1.735.806.60		
2.4	ACARREO ASFALTO VOLUMEN COMPACTADO	M3K	3317.08	1.920	6.368.794,00		3.317.08		6.368.793.60		
2.5	TRANSPORTE DE EQUIPO 31KM A 50 KM	T/K	6000,00	1.090	6.540.000,00		6.000,00		6.540.000,00		
2.6	LINEA DEMARCAACION AGRILICA A=12CM	ML	345.39	2.530	873.837,00		0.37		948.22		872.888,00
2.7	PORTERIA MULT FLUA MICROF. BALONC.TIPO 2 SIN CONCRETO	JGO	1,00	5.915.850	5.915.850,00		-		-		5.915.850,00
2.8	SOPORTE PARA VOLEIBOL TRES POSICIONES + TUBO AUX	JGO	1,00	1.212.600	1.212.600,00		-		-		1.212.600,00
ITEMS ADICIONALES											
1.1.3	DEMOL. CONCRETO REFORZADO	M3		177.170	-	7.01	-		1.241.981,70	7.01	1.241.982,00
1.2.2	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3		19.780	-	5.62	-		111.172,36	5.62	111.172,00
SUBTOTAL CAP. 2 CANCHA MULTIPLE:					44.159.844				1.353.134		9.354.472
PANTALLAS DE PROTECCION											
3.1	PRELIMINARES	ML	25.90	2.210	57.239,00	0.01	-	-	26.52	25.91	57.266,00
LOCALIZACION+REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO											
SUBTOTAL CAP. 3.1 PRELIMINARES:					57.239				27		57.266
MOVIMIENTOS DE TIERRRA											
3.2.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	1.99	21.850	43.482,00	4.43	-		96.854,80	6.42	140.336,00
3.2.2	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	5.95	19.780	117.691,00	1.65	-		32.548,90	7.60	150.240,00
SUBTOTAL CAP. 3.2 MOVIMIENTOS DE TIERRRA:					161.173				129.404		290.576
CIMENTACION Y ESTRUCTURA											
3.3.1	SOLIDO ESPESOR E=0.09M 3000 PSI 210 MPA	M2	9.26	27.600	255.576,00	0.51	-		14.175,36	9.77	269.751,00
3.3.2	VIGA CIMENTO ENLACE 4000 PSI 28.0MPA	M3	3.71	865.180	3.209.818,00	-	1.51		1.305.591,23	2.20	1.904.227,00
3.3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	207.40	6.200	1.285.880,00	-	0.46		2.852,00	206.94	1.283.028,00
3.3.4	PILOTE CONCRETO REFORZADO	M3	3.96	630.870	2.498.245,00	-	1.45		912.695,95	2.51	1.585.549,00
3.3.5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	615.96	6.200	3.818.952,00	-	251.37		1.558.501,44	394.59	2.260.451,00
3.3.6	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	0.50	551.830	275.915,00	-	0.24		134.646,52	0.26	141.268,00
3.3.7	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	0.60	491.180	294.708,00	0.20	-		98.236,00	0.80	392.944,00
3.3.8	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	104.40	6.200	647.280,00	-	55.18		342.140,80	49.22	305.139,00
SUBTOTAL CAP. 3.3 CIMENTACION Y ESTRUCTURA:					12.286.374				112.411		8.142.357
MAMPOSTERIA											

3.4.1	MURO LAD. SOGA LIMPIO 2C	M2	9.26	61.280	567,453.00	0.34	-	20,835.20	-	9.60	588,288.00
3.4.2	CINTA CONFINAMIENTO MURO	ML	23.16	28.330	656,123.00	2.34	-	66,292.20	-	25.50	722,415.00
3.4.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	31.82	6.200	197,284.00	8.88	-	55,043.60	-	40.70	252,328.00
	SUBTOTAL CAP. 3.4 MAMPOSTERIA:				1,420,860			142,171			1,563,031
3.5	MALLA										
3.5.1	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"	M2	102.32	29.450	3,013,324.00	0.08	-	2,356.00	-	102.40	3,015,680.00
3.5.2	POSTE TUBO GALV. 2" x 2.3MM C.13	ML	119.44	30.950	3,696,668.00	24.26	-	750,847.00	-	143.70	4,447,515.00
3.5.3	DIAGONAL HORIZ. TUBO GALV CAL. 16 X 1/12"	ML	112.64	16.640	1,874,330.00	-	78.56	-	1,307,238.40	34.08	567,091.00
3.5.4	ANGULO HIERRO 1 1/2" X 3/16"	ML	25.58	19.980	511,088.00	-	0.08	-	1,588.40	25.50	509,490.00
	SUBTOTAL CAP. 3.5 MALLA:				9,085,410			763,203			8,539,776
4	ANDENES										
4.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	7.91	21.850	172,834.00	0.15	-	3,195.56	-	8.06	176,029.00
4.2	RETIRO SOBREPANTES MAQUINA <=10KM.	M3	7.91	19.780	156,460.00	2.56	-	50,688.61	-	10.47	207,158.00
4.3	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	M3	6.32	29.990	189,537.00	0.13	-	3,748.75	-	6.45	193,286.00
4.4	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	26.16	68.220	1,784,635.00	4.78	-	325,818.72	-	30.94	2,110,454.00
4.5	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	50.70	7.910	401,037.00	11.17	-	88,370.52	-	61.87	489,408.00
4.6	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	5.46	27.600	150,696.00	25.48	-	703,137.60	-	30.94	853,834.00
4.7	CORDON CONCRETO 3100 PSI	M3	1.09	1,039.620	1,133,186.00	0.46	-	474,898.42	-	1.55	1,608,084.00
4.8	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	135.23	6.200	838,426.00	-	0.10	-	597.06	135.13	837,829.00
4.9	ACARREO MATERIAL PETREO VOL COMPACT	M3K	78.42	1.990	156,056.00	138.13	-	274,882.68	-	216.55	430,938.00
	SUBTOTAL CAP. 4 ANDENES:				4,982,867			1,924,751			6,907,020
5	DRENAJE PLUVIAL										
5.1	PRELIMINARES										
5.1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	133.65	2.070	276,656.00	-	-	-	-	133.65	276,656.00
	SUBTOTAL CAP. 5.1 PRELIMINARES:				276,656						276,656
5.2	MOVIMIENTOS TIERRA, DEMOLICIONES Y RELLENOS										
5.2.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	76.26	21.850	1,666,281.00	44.20	-	965,712.43	-	120.46	2,631,993.00
5.2.2	RETIRO SOBREPANTES MAQUINA <=10KM.	M3	76.26	19.780	1,508,423.00	80.33	-	1,589,017.88	-	156.59	3,097,441.00
5.2.3	RELLENO ARENA MEDIANA (ST)	M3	2.40	75.050	180,120.00	1.61	-	120,455.25	-	4.01	300,575.00
5.2.4	RELLENO GRAVA TRITURADA POLVILLO COMPACTAD	M3	4.16	98.470	409,635.00	7.86	-	773,481.85	-	12.02	1,183,117.00
5.2.5	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	33.52	31.670	1,061,578.00	0.52	-	16,547.57	-	34.04	1,078,126.00
5.2.6	RELLENO TIERRA-NIVELACION	M3	3.09	26.370	81,483.00	4.92	-	128,740.40	-	8.01	211,224.00
5.2.7	ACARREO MATERIAL PETREO VOL COMPACT	M3K	535.46	1.990	1,065,565.00	152.82	-	304,111.10	-	688.28	1,369,677.00
	SUBTOTAL CAP. 5.2 MOVIMIENTOS TIERRA, DEMOLICIONES Y RELLENOS:				5,973,085			3,899,066			9,872,153
5.3	FILTRO										
5.3.1	GRAVA TRITURADA DE 1/2"	M3	1.73	87.010	150,527.00	0.11	-	9,614.61	-	1.84	160,142.00
5.3.2	GRAVA TRITURADA DE 1"	M3	1.73	69.340	119,958.00	0.11	-	7,662.07	-	1.84	127,620.00
5.3.3	GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	28.35	5.340	151,389.00	4.37	-	23,335.80	-	32.72	174,725.00
5.3.4	TUB PVC 6 DREN SF NOVAFOR	ML	20.45	51.680	1,056,856.00	-	-	-	-	20.45	1,056,856.00
	SUBTOTAL CAP. 5.3 FILTRO:				1,478,730			40,612			1,519,343
5.4	DRENAJE PLUVIAL										
5.4.1	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	1.00	340.150	340,150.00	-	-	-	-	1.00	340,150.00

5.4.2	CAJA INSPECCION 100X100 CM [CONCRETO]	UND	1,00	504.070	504.070,00	-	-	-	1,00	504.070,00
5.4.3	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	UND	1,00	406.850	406.850,00	-	-	-	1,00	406.850,00
5.4.4	CAJA INSPECCION 120x120 CM [CONCRETO]	UND	1,00	794.450	794.450,00	-	-	-	1,00	794.450,00
5.4.5	CAJA INSPECCION 175x 80 CM DOM[CONCRETO]	UND	1,00	997.970	997.970,00	-	-	-	1,00	997.970,00
5.4.6	CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.01+2.50 MTS	UND	1,00	1.930.280	1.930.280,00	-	-	-	1,00	1.930.280,00
5.4.7	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	30.65	27.600	845.940,00	-	-	-	30.65	845.940,00
5.4.8	CANAL CONCRETO PISO 50x25x08 CM DOBLE	ML	61.30	93.150	5.710.095,00	-	-	-	61.30	5.710.095,00
5.4.9	TAPA CANAL CONCRETO PERFORADA PREF. ESP.8CM	UND	103,00	52.800	5.438.400,00	-	-	-	103,00	5.438.400,00
5.4.10	ACERO REFUERZO FLEADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	273.56	6.200	1.696.072,00	244.84	1518.010.48	63.342.40	518.40	3.714.082,00
5.4.11	DESCOLMATACION CUNETAS ZANJAS DESCOLES (MANUAL)	ML	6.04	2.440	14.738,00	25.96	-	-	32,00	78.080,00
5.4.12	TUBERIA PVC 4 RDE 21 - 200 PSI	ML	111.24	92.360	10.274.126,00	-	-	-	111.24	10.274.126,00
5.4.13	TUB PVC NOVAFORT 8"	ML	1.14	77.250	88.065,00	-	-	-	1,14	88.065,00
5.4.14	TUB PVC NOVAFORT 10"	ML	20.58	83.890	1.726.456,00	-	-	-	20.58	1.726.456,00
5.4.15	TUB PVC NOVAFORT 12"	ML	24.31	164.460	3.998.023,00	-	-	-	24.31	3.998.023,00
5.4.16	CODO PVC-UM 4 x 90	UND	36,00	113.210	4.075.560,00	-	-	-	36,00	4.075.560,00
5.4.17	FRAGANTE LOSA TCI 4 ATRAPA MANTO-ALUM	UND	12,00	376.500	4.518.000,00	-	-	-	12,00	4.518.000,00
5.4.18	ABRAZADERA SANITARIA 4"	UND	48,00	20.750	996.000,00	-	-	-	48,00	996.000,00
5.4.19	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 22	ML	60.60	98.660	5.978.796,00	0.40	38.464,00	-	61,00	6.018.260,00
5.4.20	VELOCIDAD ANTIRRETORNO PVC DE 300 MM CARPETA DE POLIETILENO LUNTAJABADA Y REGISTRO SUPERIOR	UND	1,00	2.595.090	2.595.090,00	-	-	-	1,00	2.595.090,00
5.4.21	EMPALME TUB CONC 8-12" CAMARA CONCRETO	UND	27,00	120.250	3.246.750,00	-	-	-	27,00	3.246.750,00
5.4.22	BATEA EN CONCRETO 3000 PSI	M3	2.11	523.130	1.103.804,00	0.02	13.078.25	-	2.14	1.116.883,00
					SUBTOTAL CAP. 5.4 DRENAJE PLUVIAL:					58.913.580
						57.279.685		1.633.895		
6	SISTEMA DE ILUMINACION									
6.1	EXCAVACION MANUAL TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	7,20	21.850	157.320,00	-	-	-	7,20	157.320,00
6.2	ACOME 3F(3# 6"-H# 8")	ML	36,00	80.610	2.901.960,00	-	-	-	36,00	2.901.960,00
6.3	CAPACETE GALV 2	UND	1,00	14.280	14.280,00	-	-	-	1,00	14.280,00
6.4	CURVA PVC 2	ML	1,00	23.690	23.690,00	-	-	-	1,00	23.690,00
6.5	TUBO GALV 2 X3 MTS	UND	2,00	109.510	219.020,00	-	-	-	2,00	219.020,00
6.6	CONTADOR 3F-TRIFASICO 120/208V M.DIRECTA	UND	1,00	633.630	633.630,00	-	-	-	1,00	633.630,00
6.7	CAJA CONTADOR 3F POLICARB OPORTABREAKER	UND	1,00	154.770	154.770,00	-	-	-	1,00	154.770,00
6.8	CAJA ELECTRICA 0.8 X 0.8 X 1 MT	UND	2,00	438.928	877.856,00	-	-	-	2,00	877.856,00
6.9	MALLA A TIERRA 3 VARILLAS-PERNADA	UND	1,00	1.154.310	1.154.310,00	-	-	-	1,00	1.154.310,00
6.10	TABLEROS DE BAJA TENSION-ILUMINACION 220 V	UND	1,00	1.889.190	1.889.190,00	-	-	-	1,00	1.889.190,00
6.11	ACOME 3F(3# 10"-H#10) 1" EMT"	ML	70,00	38.510	2.695.700,00	-	-	-	70,00	2.695.700,00
6.12	SAL LAMP EMT	UND	12,00	97.970	1.175.640,00	-	-	-	12,00	1.175.640,00
6.13	LUMINARIA LED 150 W 13074 LUMENS INDUSTRIAL	UND	12,00	1.697.530	20.370.360,00	-	-	-	12,00	20.370.360,00
6.14	PUNTA CAPTORA ACERO GAL	UND	12,00	87.300	1.047.600,00	-	-	-	12,00	1.047.600,00
6.15	CONECTOR PARALELO BIMETALICO	UND	6,00	39.970	239.820,00	-	-	-	6,00	239.820,00
6.16	CAJA RAWELL 34"	UND	6,00	22.540	135.240,00	-	-	-	6,00	135.240,00
6.17	GRAPA SUECCION PUNTA CAPTORA	UND	12,00	40.930	491.160,00	-	-	-	12,00	491.160,00
6.18	GRAPA CRUCE CABLE -PUNTA CAPTORA	UND	12,00	53.360	640.320,00	-	-	-	12,00	640.320,00
6.19	GRAPA SOPORTE BAJANTE	UND	40,00	35.870	1.434.800,00	-	-	-	40,00	1.434.800,00
6.20	MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE	UND	1,00	271.690	271.690,00	-	-	-	1,00	271.690,00
6.21	MOLDE SOLDADURA CABLE-CABLE (110 A 410)	UND	1,00	271.690	271.690,00	-	-	-	1,00	271.690,00
6.22	SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM	UND	16,00	29.160	466.560,00	-	-	-	16,00	466.560,00
6.23	ALAMBRON DE ALUMINIO DE 8 MM	ML	242,00	16.670	4.034.140,00	-	-	-	242,00	4.034.140,00
6.24	VARILLA CU-CU 9/16X 2.40	UND	6,00	190.140	1.140.840,00	-	-	-	6,00	1.140.840,00

6.25	CAJA ELECTRICA 0.3 X 0.3 X 0.5 MT + TAPA	UND	6,00	162.530	975.180,00			6,00	975.180,00
SUBTOTAL CAP. 6 SISTEMA DE ILUMINACION:					43.416.766				43.416.766
7	ASEO Y LIMPIEZA								
7.1	LIMPIEZA GENERAL	M2	544,14	2.070	1.126.370,00	0,14	297,87	544,28	1.126.668,00
8	INCREMENTO POR TRANSPORTE Y GRADO DE DIFICULTAD (6% PARA	6%			52.342.511,88	-	10.412,46		52.352.924,34
9	ICOCIV (Construcción de obras civiles) - estimada por el DANE, según public	14%			124.400.703,23	-			124.216.749,86
SUBTOTAL CAP. 7 ASEO Y LIMPIEZA:					177.869.585		10.710	183.954	177.896.342
SUBTOTAL CAP. P2 ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA					1.049.118.413		46.951.691	46.951.691	1.049.118.413
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA:									
COSTOS INDIRECTOS									
VALOR COSTOS DIRECTOS					1.049.118.413,11		46.951.691	46.951.691	1.049.118.413,00
ADMINISTRACION				29%	304.244.340,00		13.615.990	13.615.990	304.244.340,00
IMPREVISTOS				1%	10.491.184,00		469.517,00	469.517,00	10.491.184,00
UTILIDAD				6%	62.947.105,00		2.817.101,00	2.817.101,00	62.947.105,00
TOTAL AUI				36%	377.682.629,00		16.902.608,00	16.902.608,00	377.682.629,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD				0%					
COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS					1.426.801.042		63.854.299	63.854.299	1.426.801.042
VALOR TOTAL PRESUPUESTO					1.426.801.042		63.854.299	63.854.299	1.426.801.042
SUBTOTAL CAP. P00 ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA					1.426.801.042		63.854.299	63.854.299	1.426.801.042
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA MAS ITEMS NO PREVISTOS									

Nota: Con la presente acta se deja constancia que las mayores y menores cantidades de obra aquí contenidas, se encuentran comprometidas directamente con el objeto y naturaleza del contrato de obra y que son requeridas para garantizar la calidad y cumplimiento de los trabajos a ejecutar.

EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

VR. INTERVALLE

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS BEDA ANGELO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA

	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS		Versión	Código
	ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA			

JUSTIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES ACTA 1

TIPO DE CONTRATO:

OBRA

CONTRATISTA:

CONTRATO No. IND 11-5027-2023

OBRA

CONSTRUPACIOS ZON

Mediante la presente Acta, El señor Guillermo Villegas González, Director de Obra del Contratista y el señor Juan Carlos Naranjo Representante Legal de Interventoría dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el día 12 del mes de Febrero del año 2024, en las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a las items o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO CONDICIONES ACTUALES			CANTIDADES	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)
1	PRELIMINARES						
1.1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	666,81	4.390	2.927.296,00	-	0,05
1.1.2	EXCAVACION MANUAL TIERRA SECA H=1,8M(SR)	M3	35,55	21.850	776.768,00	-	5,49
1.1.3	DEMOL. CONCRETO REFORZADO	M3	0,88	177.170	155.910,00	0,56	-
1.1.4	RETIRO SOBREPANTES MAQUINA <= 10KM.	M3	37,93	19.780	750.255,00	3,02	-
1.1.5	PODA DE ARBOLES	UND	1,00	126.280	126.280,00	-	-
1.1.6	DESMONTE JUEGO	UND	2,00	53.270	106.540,00	-	-
	SUBTOTAL CAP. 1.1 PRELIMINARES:				4.843.049		
1.2	CIMENTACION						
1.2.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	25,91	21.850	566.134,00	24,93	-
1.2.2	RETIRO SOBREPANTES MAQUINA <= 10KM.	M3	64,56	19.780	1.276.997,00	1,53	-
1.2.3	SOLDADO ESPESOR E=0,05M 3000 PSI 210 MPA	M2	38,00	27.600	1.048.800,00	-	1,00
1.2.4	PILOTE CONCRETO REFORZADO	M3	23,75	630.870	14.983.163,00	0,00	-
1.2.5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI /420Mpa	KLS	4141,87	6.200	25.679.594,00	-	209,42
1.2.6	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	6,00	491.180	2.947.080,00	-	-
1.2.7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI /420Mpa	KLS	402,28	6.200	2.494.136,00	-	0,52
1.2.8	VIGA CIMIENTO ENLACE 4000 PSI 28.0MPa	M3	13,00	865.180	11.247.340,00	-	-
1.2.9	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI /420Mpa	KLS	1802,64	6.200	11.176.368,00	-	7,04
1.2.10	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	6,29	551.830	3.471.011,00	-	0,15
1.2.11	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI /420Mpa	KLS	2211,28	6.200	13.709.936,00	641,74	-
1.2.12	SIKAGROUT PARA ANCLAJES	KG	731,86	29.540	21.619.144,00	-	117,46
	SUBTOTAL CAP. 1.2 CIMENTACION:				110.219.703		
1.3	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA						
1.3.1	ACERO ESTRUCTURAL	KLS	30530,40	17.260	527.299.904,00	1.866,42	-
	SUBTOTAL CAP. 1.3 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA:				527.299.904		
1.4	CUBIERTA						

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS									
ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA									
		M2	607,21	79,540	48.297.483,00	0,31		Version	Código
1.4.1	TEJA TERMOACUSTICA UPVC	M2	607,21	79,540	48.297.483,00	0,31			
		SUBTOTAL CAP. 1.4		CUBIERTA:					
				48.297.483					
2	CANCHA MULTIPLE								
2.1	GEOTEXTIL REPAV 450	M2	544,14	5,340	2.905.708,00	-	544,14		según lo trabajo en los distintos comités de obras y una vez constatado el verdadero estado de la cancha en concreto, se evidencia que es imposible debido al grado de deterioro que esta posee realizar el correspondiente reforzamiento, por lo tanto se ve la necesidad de demoler la actual y realizar una nueva cancha la cual cumple con todas las normativas, por esta razón estos ITEMS, NO SE REALIZARÁN, sumado a esto esta la necesidad de desplazar la localización inicial de la cancha producto de la cercanía que daba en el replanteo la cimentación por el eje
2.2	CARPETA ASFALTICA [ST]	M3	27,64	673,200	18.607.248,00	-	27,64		
2.3	IMPREGNACION	M2	544,14	3,190	1.735.807,00	-	544,14		
2.4	ACARREO ASFALTO VOLUMEN COMPLETADO	M3K	3317,08	1,920	6.368.794,00	-	3.317,08		
2.5	TRANSPORTE DE EQUIPO 31KM A 50 KM	T/K	6000,00	1,090	6.540.000,00	-	6.000,00		
2.6	LINEA DEMARCAACION ACRILICA A=12CM	ML	345,39	2,530	873.837,00	-	0,37		
2.7	PORTERIA MULTIFUIMICROF BALONC TIPO 2 SIN CONCRETO	JGO	1,00	5,915.850	5.915.850,00	-			
2.8	SOPORTE PARA VOLEIBOL TRES POSICIONES + TUBO AUX	JGO	1,00	1.212.600	1.212.600,00	-			
ITEMS ADICIONALES									
2.9 (1.1.3)	DEMOL. CONCRETO REFORZADO	M3		177,170	-	7,01			Estas mayores cantidades, son producto de la necesidad que surgió en el momento de la nueva localización de la cubierta, lo cual se hizo necesario para poder construir la cimentación de la estructura de acuerdo a los diseños aportados.
2.11 (1.2.2)	RETRO SOBANTES MAQUINA <= 10KM.	M3		19,780	-	5,62			
3	PANTALLAS DE PROTECCIÓN								
3.1	PRELIMINARES								
3.1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	ML	25,90	2,210	57.239,00	0,01			esta mayor cantidad es el producto resultante de las operaciones realizadas en la memoria de cantidades, las cuales se encuentran de acuerdo a los diseños entregados por la entidad contratante y con la revisión y aprobación de la interventoría.
		SUBTOTAL CAP. 2		CANCHA MULTIPLE:					
				44.159.844					
3.2	MOVIMIENTOS DE TIERRA								
3.2.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	1,99	21,850	43.482,00	4,43			esta mayor cantidad es el producto resultante de las operaciones realizadas en la memoria de cantidades, las cuales se encuentran de acuerdo a los diseños entregados por la entidad contratante y con la revisión y aprobación de la interventoría.
3.2.2	RETRO SOBANTES MAQUINA <= 10KM.	M3	5,95	19,780	117.691,00	1,65			esta mayor cantidad es el producto resultante de las operaciones realizadas en la memoria de cantidades, las cuales se encuentran de acuerdo a los diseños entregados por la entidad contratante y con la revisión y aprobación de la interventoría.
		SUBTOTAL CAP. 3.2		MOVIMIENTOS DE TIERRA:					
				161.173					
3.3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA								
3.3.1	SOLADO ESPESOR E=0,05M 3000 PSI 210 MPA	M2	9,26	27,600	255.576,00	0,51			esta mayor cantidad es el producto resultante de las operaciones realizadas en la memoria de cantidades, las cuales se encuentran de acuerdo a los diseños entregados por la entidad contratante y con la revisión y aprobación de la interventoría.
3.3.2	VIGA CIMENTO ENLACE 4000 PSI 28,0MPa	M3	3,71	865,180	3.209.818,00	-	1,51		esta menor cantidad es el producto resultante de las operaciones realizadas en la memoria de cantidades, las cuales se encuentran de acuerdo a los diseños entregados por la entidad contratante y con la revisión y aprobación de la interventoría.
3.3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	207,40	6,200	1.285.880,00	-	0,46		esta menor cantidad es el producto resultante de las operaciones realizadas en la memoria de cantidades, las cuales se encuentran de acuerdo a los diseños entregados por la entidad contratante y con la revisión y aprobación de la interventoría.
3.3.4	PILOTE CONCRETO REFORZADO	M3	3,96	630,870	2.498.245,00	-	1,45		esta menor cantidad es el producto resultante de las operaciones realizadas en la memoria de cantidades, las cuales se encuentran de acuerdo a los diseños entregados por la entidad contratante y con la revisión y aprobación de la interventoría.
3.3.5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	615,96	6,200	3.818.952,00	-	251,37		esta menor cantidad es el producto resultante de las operaciones realizadas en la memoria de cantidades, las cuales se encuentran de acuerdo a los diseños entregados por la entidad contratante y con la revisión y aprobación de la interventoría.
3.3.6	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21,0 MPA	M3	0,50	551,830	275.915,00	-	0,24		esta menor cantidad es el producto resultante de las operaciones realizadas en la memoria de cantidades, las cuales se encuentran de acuerdo a los diseños entregados por la entidad contratante y con la revisión y aprobación de la interventoría.
3.3.7	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	0,60	491,180	294.708,00	0,20			esta mayor cantidad es el producto resultante de las operaciones realizadas en la memoria de cantidades, las cuales se encuentran de acuerdo a los diseños entregados por la entidad contratante y con la revisión y aprobación de la interventoría.
3.3.8	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	104,40	6,200	647.280,00	-	55,18		esta menor cantidad es el producto resultante de las operaciones realizadas en la memoria de cantidades, las cuales se encuentran de acuerdo a los diseños entregados por la entidad contratante y con la revisión y aprobación de la interventoría.
		SUBTOTAL CAP. 3.3		CIMENTACION Y ESTRUCTURA:					
				12.286.374					
3.4	MAMPONERIA								

2004-10-4-002

1. OBJETIVO		Elaborar el plan de trabajo para el desarrollo de la actividad de enseñanza-aprendizaje.	
2. ALCANCE		El plan de trabajo se elabora para el desarrollo de la actividad de enseñanza-aprendizaje.	
3. JUSTIFICACIÓN		El plan de trabajo es un documento que sirve para organizar y planificar la actividad de enseñanza-aprendizaje.	
4. METODOLOGÍA		El plan de trabajo se elabora mediante el uso de la metodología de la enseñanza-aprendizaje.	
5. RESULTADOS		El plan de trabajo se elabora para el desarrollo de la actividad de enseñanza-aprendizaje.	
6. CONCLUSIONES		El plan de trabajo es un documento que sirve para organizar y planificar la actividad de enseñanza-aprendizaje.	
7. RECOMENDACIONES		El plan de trabajo se elabora mediante el uso de la metodología de la enseñanza-aprendizaje.	
8. BIBLIOGRAFÍA		El plan de trabajo se elabora para el desarrollo de la actividad de enseñanza-aprendizaje.	
9. ANEXOS		El plan de trabajo se elabora mediante el uso de la metodología de la enseñanza-aprendizaje.	
10. GLOSARIO		El plan de trabajo se elabora para el desarrollo de la actividad de enseñanza-aprendizaje.	
11. ÍNDICE		El plan de trabajo se elabora mediante el uso de la metodología de la enseñanza-aprendizaje.	
12. OTROS		El plan de trabajo se elabora para el desarrollo de la actividad de enseñanza-aprendizaje.	

TECNOLÓGICO DE INGENIERÍA Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INGENIERÍA Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INGENIERÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INGENIERÍA Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INGENIERÍA

100

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS									
ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA									
								Versión	Código
5.2.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	76,26	21.850	1.666.281,00	44,20	esta mayor cantidad es el producto resultante de las operaciones realizadas en la memoria de cantidades, las cuales se encuentran de acuerdo a los diseños entregados por la entidad contratante y con la revisión y aprobación de la interventoría.		
5.2.2	RETRO SOBREPANTES MAQUINA <=10KM.	M3	76,26	19.780	1.508.423,00	80,33	esta mayor cantidad es el producto resultante de las operaciones realizadas en la memoria de cantidades, las cuales se encuentran de acuerdo a los diseños entregados por la entidad contratante y con la revisión y aprobación de la interventoría.		
5.2.3	RELLENO ARENA MEDIANA (ST)	M3	2,40	75.050	180.120,00	1,61	esta mayor cantidad es el producto resultante de las operaciones realizadas en la memoria de cantidades, las cuales se encuentran de acuerdo a los diseños entregados por la entidad contratante y con la revisión y aprobación de la interventoría.		
5.2.4	RELLENO GRAVA TRITURADA-POLVILLO COMPACTAD	M3	4,16	98.470	409.635,00	7,86	esta mayor cantidad es el producto resultante de las operaciones realizadas en la memoria de cantidades, las cuales se encuentran de acuerdo a los diseños entregados por la entidad contratante y con la revisión y aprobación de la interventoría.		
5.2.5	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	33,52	31.670	1.061.578,00	0,52	esta mayor cantidad es el producto resultante de las operaciones realizadas en la memoria de cantidades, las cuales se encuentran de acuerdo a los diseños entregados por la entidad contratante y con la revisión y aprobación de la interventoría.		
5.2.6	RELLENO TERRA-NIVELACION	M3	3,09	26.370	81.483,00	4,92	esta mayor cantidad es el producto resultante de las operaciones realizadas en la memoria de cantidades, las cuales se encuentran de acuerdo a los diseños entregados por la entidad contratante y con la revisión y aprobación de la interventoría.		
5.2.7	ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT	M3K	535,46	1.990	1.065.565,00	152,82	esta mayor cantidad es el producto resultante de las operaciones realizadas en la memoria de cantidades, las cuales se encuentran de acuerdo a los diseños entregados por la entidad contratante y con la revisión y aprobación de la interventoría.		
SUBTOTAL CAP. 5.2. MOVIMIENTOS TIERRA, DEMOLICIONES Y RELLENOS:					5.973.085				
5.3	FILTRO								
5.3.1	GRAVA TRITURADA DE 1/2"	M3	1,73	87.010	150.527,00	0,11	esta mayor cantidad es el producto resultante de las operaciones realizadas en la memoria de cantidades, las cuales se encuentran de acuerdo a los diseños entregados por la entidad contratante y con la revisión y aprobación de la interventoría.		
5.3.2	GRAVA TRITURADA DE 1"	M3	1,73	69.340	119.958,00	0,11	esta mayor cantidad es el producto resultante de las operaciones realizadas en la memoria de cantidades, las cuales se encuentran de acuerdo a los diseños entregados por la entidad contratante y con la revisión y aprobación de la interventoría.		
5.3.3	GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	28,35	5.340	151.389,00	4,37	esta mayor cantidad es el producto resultante de las operaciones realizadas en la memoria de cantidades, las cuales se encuentran de acuerdo a los diseños entregados por la entidad contratante y con la revisión y aprobación de la interventoría.		
5.3.4	TUB.PVC 6 DREN SF NOVAFOR	ML	20,45	51.680	1.056.856,00	-			
SUBTOTAL CAP. 5.3. FILTRO:					1.478.730				

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS									
ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA									
5.4 DRENAJE PLUVIAL									
5.4.1	CAJA INSPECCION 80x80 CM [CONCRETO]	UND	1,00	340.150	340.150,00	-	-	-	-
5.4.2	CAJA INSPECCION 100x100 CM [CONCRETO]	UND	1,00	504.070	504.070,00	-	-	-	-
5.4.3	CAJA INSPECCION 80x80 CM [CONCRETO]	UND	1,00	406.850	406.850,00	-	-	-	-
5.4.4	CAJA INSPECCION 120x120 CM [CONCRETO]	UND	1,00	794.450	794.450,00	-	-	-	-
5.4.5	CAJA INSPECCION 175x80 CM DOM[CONCRETO]	UND	1,00	997.970	997.970,00	-	-	-	-
5.4.6	CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.01-2.50 MTS	UND	1,00	1.930.280	1.930.280,00	-	-	-	-
5.4.7	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	30,65	27.600	845.940,00	-	-	-	-
5.4.8	CANAL CONCRETO PISO 50x25x0,8 CM DOBLE	ML	61,30	93.150	5.710.095,00	-	-	-	-
5.4.9	TAPA CANAL CONCRETO PERFORADA PREF. ESP.8CM	UND	103,00	52.800	5.438.400,00	-	-	-	-
5.4.10	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	273,56	6.200	1.696.072,00	244,84	-	-	-
5.4.11	DESCOLMATAION CUNETAS,ZANJAS,DESCOLES (MANUAL)	ML	6,04	2.440	14.738,00	25,96	-	-	-
5.4.12	TUBERIA PVC 4 RDE 21" - 200 PSI	ML	111,24	92.360	10.274.126,00	-	-	-	-
5.4.13	TUB PVC NOVAFORT 8"	ML	1,14	77.250	88.065,00	-	-	-	-
5.4.14	TUB PVC NOVAFORT 10"	ML	20,58	83.890	1.726.456,00	-	-	-	-
5.4.15	TUB PVC NOVAFORT 12"	ML	24,31	164.460	3.998.023,00	-	-	-	-
5.4.16	CODO PVC-UM 4" x 90	UND	36,00	113.210	4.075.560,00	-	-	-	-
5.4.17	TRAGANTE LOSA TCI 4 ATRAPA MANTO-ALUM	UND	12,00	376.500	4.518.000,00	-	-	-	-
5.4.18	ABRAZADERA SANITARIA 4"	UND	48,00	20.750	996.000,00	-	-	-	-
5.4.19	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 22	ML	60,60	98.660	5.978.796,00	0,40	-	-	-
5.4.20	VALVULA ANTIRRETORNO PVC DE 300 MM, CLAPETA DE POLIPROPILENO, JUNTA LABIADA Y REGISTRO SUPERIOR	UND	1,00	2.595.090	2.595.090,00	-	-	-	-
5.4.21	EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	27,00	120.250	3.246.750,00	-	-	-	-
5.4.22	BATEA EN CONCRETO 3000 PSI	M3	2,11	523.130	1.103.804,00	0,02	-	-	-
SUBTOTAL CAP. 5.4 DRENAJE PLUVIAL:				57.279.685		-	-	-	-
6 SISTEMA DE ILUMINACION									
6.1	EXCAVACION MANUAL TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	7,20	21.850	157.320,00	-	-	-	-
6.2	ACOME 3F(3# 6+1# 8) 2"	ML	36,00	80.610	2.901.960,00	-	-	-	-
6.3	CAPACETE GALV 2	UND	1,00	14.280	14.280,00	-	-	-	-
6.4	CURVA PVC 2	ML	1,00	23.690	23.690,00	-	-	-	-
6.5	TUBO GALV 2 X3 MTS	UND	2,00	109.510	219.020,00	-	-	-	-
6.6	CONTADOR 3F-TRIFASICO 120/208V M.DIRECTA	UND	1,00	633.630	633.630,00	-	-	-	-
6.7	CAJA CONTADOR 3F POLICARB C/PORTABREAKER	UND	1,00	154.770	154.770,00	-	-	-	-
6.8	CAJA ELECTRICA 0.8 X 0.8 X 1 MT	UND	2,00	438.928	877.856,00	-	-	-	-
6.9	MALLA A TIERRA 3 VARILLAS-PERNADA	UND	1,00	1.154.310	1.154.310,00	-	-	-	-
6.10	TABLERO DE BAJA TENSION ILUMINACION 220 V	UND	1,00	1.889.190	1.889.190,00	-	-	-	-

ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

[illegible]

esta mayor cantidad es el producto resultante de las operaciones realizadas en la memoria de cantidades, las cuales se encuentran de acuerdo a los diseños entregados por la entidad contratante y con la revisión y aprobación de la interventoría.

7.1	LIMPIEZA GENERAL	M2	544,14	2,070	1.126.370,00	0,14			- esta mayor cantidad es el producto resultante de las operaciones realizadas en la memoria de cantidades, las cuales se encuentran de acuerdo a los diseños entregados por la entidad contratante y con la revisión y aprobación de la interventoría.
8 g	INCREMENTO POR TRANSPORTE Y GRADO DE DIFICULTAD (6% PARA LA ZONA OCOCIV (Construcción de obras civiles) - estimada por el DANE, según publicación del %	%	6%		52.342.511,88 124.400.703,23	-			
	SUBTOTAL CAP. 7 ASEO Y LIMPIEZA:				177.869.585			-	-
	SUBTOTAL CAP. P2 ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA:				1.049.118.413			-	-
	COSTOS INDIRECTOS								
	VALOR COSTOS DIRECTOS				1.049.118.413,11			-	-
	ADMINISTRACION	29%			304.244.340,00			-	-
	IMPREVISTOS	1%			10.491.184,00			-	-
	UTILIDAD	6%			62.947.105,00			-	-
	TOTAL AM	36%			377.682.629,00			-	-
	I/A SOBRE LA UTILIDAD	0%			-			-	-
	COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				1.426.801.042			-	-
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO				1.426.801.042			0	0
	SUBTOTAL CAP. P00 ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA MAS ÍTEMES NO PREVISTOS				1.426.801.042			-	-

4. DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS

Esta parte va únicamente en la última página)

~~FI-CONTRATISTA:~~

EL INTERVENTOR:

12 DE FEBRERO DE 2024

FECHA DE ELABORACIÓN


Firma:

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ
REP. LEGAL INTERVENTORIA O DIRECTOR DE
INTERVENTORIA

Series: Contratación Interventor

Nota:

En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.



Vertical text or markings along the right edge of the page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is extremely faint and illegible.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

12/02/2024

01

1

12/02/2024

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

IND-23-5027

SUPERVISOR PROYECTO

JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

CONSTRUPACOL S.A.S. ZOMAC

CONSORCIO GRUPO G3

DESIGNADO ENTE TERRITORIAL

IND-23-5027

CONCRETO REFORZADO

UNIDAD

M3

FECHA

aaaa-mm-dd

LOCALIZACIÓN

LOS DE CONCRETO

mitro existente

12

3.00

0.1

0.45

1


M3

0.90

0.54

1.44

ESQUEMA

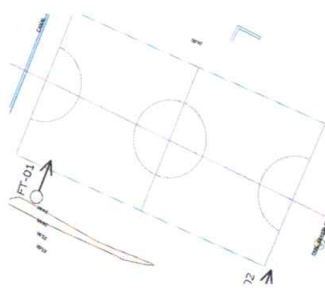

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma: Brenda Murillo B

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma: [Firma]

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra. Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NT.

Aprobó - Representante legal o Director de obra. Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NT.

Financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregir, anular o reemplazar, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, anular o reemplazar, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, anular o reemplazar, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, anular o reemplazar, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría.

Availo - Designado Ente Territorial (si aplica). Registre la firma y el nombre de la persona designada para auditar el pago por parte del Ente Territorial. Esta requiere constancia en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, anular o reemplazar cualquier aspecto relacionado con la normalidad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe auditar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FUERZOS).

Brenda Murillo B

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

12/02/2024

01

1

12/02/2024

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

IND-23-5027

JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

CONSTRUPACIOL S.A.S. ZOMAC

DESIGNADO ENTE TERRITORIAL

INTERVENTOR

CONSORCIO GRUPO G3

ITEM

1.1.6 DESMONTE JUEGO

UNIDAD

UND

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo (ML)	Ancho (ML)				
				2	UNIDAD	2,00	
						2,00	

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma: Brenda Murillo B

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma: [Firma]

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra. Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NIT.

Aprobó - Representante legal o Director de interventoría. Registre la firma y el nombre claramente del Director de interventoría. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en consultar a nuevo examen los obra objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los sistemas presentados por el contratista de obra para cumplir, ejecutar, o reparar, en el servicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, esta es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según le exige en que la misma se encuentre.

Avató - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para conge, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normalidad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de esta norma. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Vigencia a partir de

Versión

01

SOPORTE DEL ACTA No.

1

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE

12/02/2024

OBJETO

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATO No.

IND-23-5027

SUPERVISOR PROYECTO

JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

CONTRATISTA

CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC

DESIGNADO ENTE TERRITORIAL

INTERVALLE

INTERVENTOR

CONSORCIO GRUPO G3

UNIDAD

M3

ITEM

1.2.1 EXCAVACION TIERRA A MANO

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo (ML)	Ancho (ML)	Alto (M.)				
	CUBO PARA PILOTES	1,00	1,00	1,07	12	M3	12,84	
	VIGA LONG.	5,00	0,50	0,57	10	M3	14,25	
	PILOTES	0,30	7,00	1,98	12	M3	23,75	
							50,84	

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

Brenda Murillo B

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

[Signature]

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NT.

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en consultar a nuevo examen las áreas objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o ignorarlo, en función de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentra.

[illegible]



75-471011-10000-2011

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Vigencia a partir de

Version

01

SOPORTE DEL ACTA No.

1

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE

12/02/2024

OBJETO

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATO No.

IND-23-5027

CONTRATISTA

CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC

INTERVENTOR

CONSORCIO GRUPO G3

ITEM

1.2.3 SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA

SUPERVISOR PROYECTO


JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

DESIGNADO ENTE TERRITORIAL

INDERVALLE

UNIDAD

M2

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo (ML)	Ancho (ML)	Alto (M.)				
	VIGA	5,00	0,50		10,00	M2	25,00	
	CUBO PARA PILOTES	1,00	1,00		12,00	M3	12,00	
							37,00	

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma: Brenda Munillo B

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma: [Signature]

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra. Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NIT.

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría. Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en verificar a mano o con ayuda de otros medios del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregir, enmendado o reparado, un aspecto de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, esto es, "calificar como suficiente" y "adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Version

01

Vigencia a partir de

1

12/02/2024

SOPORTE DEL ACTA No.

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATO No.

IND-23-5027

CONTRATISTA

CONSTRUPACIOL S.A.S. ZOMAC

INTERVENTOR

CONSORCIO GRUPO G3

ITEM

1.2.4 PILETE CONCRETO REFORZADO

FECHA

aaaa-mm-dd

LOCALIZACIÓN

DIMENSIONES

R

Alto (M.)

Volumen

CANTIDAD

12

UNIDAD

M3

TOTAL

ACUMULADO

23.75

23.75

ESQUEMA



Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

Brenda Murillo B

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:



Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NIT.

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregir, enmendarlo o repararlo, en servicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, es decir, calificar como satisfactoria y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según le exige en que la misma se encuentre.

Avalúo - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para evaluar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendarlo o reparar cualquier aspecto relacionado con la normalidad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe evaluar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FOMOS).

126

22

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										Version	
Vigencia a partir de										01	
SOPORTE DEL ACTA No.		1		PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE		12/02/2024					
OBJETO										MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	
CONTRATO No.		IND-23-5027		SUPERVISOR PROYECTO		JUAN CARLOS RUEDA ANGEL					
CONTRATISTA		CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC		DESIGNADO ENTE TERRITORIAL		INDERVALLE					
INTERVENTOR		CONSORCIO GRUPO G3									
ITEM		1.2.7 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa								UNIDAD	KLS
FECHA	aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA			
			Largo (ML)	Peso varilla						No. Var	
		Zapata	1,35	1,55	16		401,76				
							401,76				
Elaboró											
EL CONTRATISTA:											
Firma: Brenda Munillo B											
Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO											
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA											
Aprobó											
EL INTERVENTOR:											
Firma: [Firma]											
Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ											
REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA											
Nota: Instrucciones para la firma											
Elaboró - Representante legal o Director de obra. Registrar la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT.											
Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría. Registrar la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregir, enmendarlo o reemplazarlo, en ejecución de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde al interventor, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según le exige en que la misma se encuentre.											
Avale - Designado Ente Territorial (si aplica). Registrar la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendarlo o reemplazar cualquier aspecto relacionado con la normalidad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, en decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).											

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

[illegible]

26

131

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Version

Vigencia a partir de

01

1

12/02/2024

SOPORTE DEL ACTA No.

1

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

OBJETO

IND-23-5027

CONTRATISTA

CONSTRUPACIOL S.A.S. ZOMAC

INTERVENTOR

CONSORCIO GRUPO G3

ITEM

1.2.9 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa

SUPERVISOR PROYECTO

DESIGNADO ENTE TERRITORIAL

JUAN CARLOS RUEDA ANGEL


INTERVALLE

UNIDAD

NLS

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo (ML)	Peso varilla	No. Var			
	Viga						
	Long	34,10	1,55	4,00	2	422,84	
		34,10	2,25	2,00	2	306,90	
		34,5	1,55	6,00	2	641,70	
	Flejes	1,6	0,55	241	2	424,16	
						1795,60	

ESQUEMA

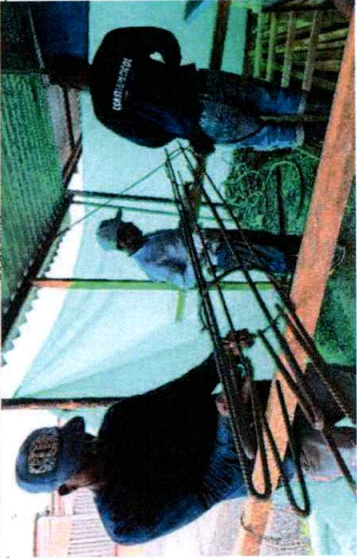

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

Brenda Murillo B

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

12

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elaboro - Representante legal o Director de obra. Registrar la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para cumplir, emendando o reponiendo, en ejecución de las funciones asignadas contractualmente a la intervención. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, este es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaleo - Designado Ente Territorial (si aplica): Registrar la firma y el nombre de la persona designada para avalear el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el análisis de los informes del contratista de obra para corregir, emendar o reponer cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalear, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estar normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Version

Vigencia a partir de

01

1

12/02/2024

SOPORTE DEL ACTA No.

1

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE

12/02/2024

OBJETO

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATO No.

IND-23-5027

SUPERVISOR PROYECTO

JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

CONTRATISTA

CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC

DESIGNADO ENTE TERRITORIAL

INTERVALLE

INTERVENITOR


CONSORCIO GRUPO G3

ITEM

1.2.10 PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA

UNIDAD

M3

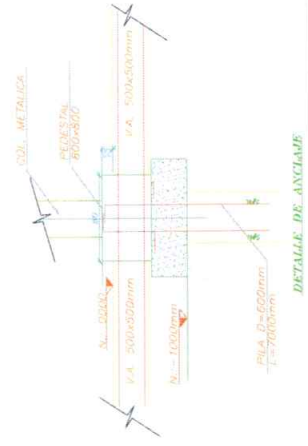FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo (ML)	Ancho (ML)				
		0.80	0.80	12	M3	6.14	
						6.14	

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma: Brenda Murillo B

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENITOR:

Firma: [Signature]

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre del representante legal, nombre y NIT.

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregir, emendar o reparar, en función de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en la anterior, al interventor le corresponde aprobar, este es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar al pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el orden de los informes del contratista de obra para corregir, emendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normalidad territorial aplicable. En desarrollo de la entidad territorial debe avalar, no decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Vigencia a partir de

12/02/2024

1

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATO No. IND-23-5027

SUPERVISOR PROYECTO JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

CONTRATISTA CONSTRUPACIOL S.A.S. ZOMAC

DESIGNADO ENTE TERRITORIAL INDERVALLE

INTERVENTOR CONSORCIO GRUPO G3

ITEM 1.2.11 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo (ML)	Peso varilla				
	Pedestal						
	Gancho en U	2.88	3.98	12.00		1648.51	
		2.88	2.55	4.00		352.51	
	Fleje	3.10	1.00	10.00		372.00	
	Gancho en C	1.00	1.00	40.00		480.00	
						2.853,02	

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma: Brenda Munillo B

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma: [Firma]

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NT.

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en controlar a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregir, enmendarlo o reemplazar, en ejecución de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, calificar o como suficiente y adecuada la ejecución de las obras en la obra, según le exige en que la misma se encuentre.

Availó - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para evaluar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendarlo o reemplazar cualquier aspecto relacionado con la normalidad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe evaluar, en su momento, su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
Versión									
01									
Vigencia a partir de									
1									
12/02/2024									
PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE									
MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO ESPECIAL DE CAJI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA									
IND-23-5027									
CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC									
CONSORCIO GRUPO G3									
INTERVENOR									
13.1 ACERO ESTRUCTURAL									
ITEM									
FECHA									
aaaa-mm-dd									
LOCALIZACIÓN									
DIMENSIONES									
Largo (ML) Ancho (ML) Alto (M)									
HEA-300 88.3 8.50 750.55									
HEA-200 43.36 8.63 374.20									
VIGA VA-1 11.07 55.40 613.28									
CEL. PTE. 3.61 31.40 113.35									
GERCHA 14.81 19.63 290.66									
CELOSA 6.39 33.55 214.38									
CELOSA DIAG 24.58 8.79 216.06									
PHR 220*90*3mm 9.55 30.00 286.50									
TEMPLETE 1.56 7.80 12.17									
PLAT. 36"x4" 7.56 30.00 227.40									
CONEX. 150x150 117.75 0.07 8.27									
Conex. 50x50 70.65 0.01 0.69									
Conex. 120x120 94.20 0.05 4.98									
Conex. 70x70 94.20 0.03 2.72									
LAM. ANCL. 1.1x2" 296.3 0.49 146.17									
ANCL. 1" 4.00 0.60 2.40									
Tornillería y platinas									
3%									
944.18									
32.416,82									
ESQUEMA									
TOTAL ACUMULADO									
UNIDAD									
CANTIDAD									
SUPERVISOR PROYECTO									
DESIGNADO ENTE TERRITORIAL									
JUAN CARLOS RUEDA ANGEL									
INTERVALLE									
R.L.S.									

[illegible]

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA						Vigencia a partir de	01	Versión																																																																																			
1																																																																																												
SOPORTE DEL ACTA No.		1		PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE		12/02/2024																																																																																						
OBJETO				MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA																																																																																								
CONTRATO No.		IND-23-5027		SUPERVISOR PROYECTO		JUAN CARLOS RUEDA ANGEL																																																																																						
CONTRATISTA		CONSTRUPACOL S.A.S. ZOMAC		DESIGNADO ENTE TERRITORIAL		INDERVALLE																																																																																						
INTERVENIOR		CONSORCIO GRUPO G3																																																																																										
ITEM		2.7 PORTERIA MULT.FLJA MICROF. BALONC.TIPO 2 SIN CONCRETO																																																																																										
<table><thead><tr><th rowspan="2">FECHA aaaa-mm-dd</th><th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th><th colspan="2">DIMENSIONES</th><th rowspan="2">CANTIDAD</th><th rowspan="2">UNIDAD</th><th rowspan="2">TOTAL ACUMULADO</th><th rowspan="2">ESQUEMA</th></tr><tr><th>Largo (ML)</th><th>Ancho (ML)</th><th>Alto (M.)</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>JGO</td><td>1,00</td><td rowspan="8"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td></tr></tbody></table>									FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA	Largo (ML)	Ancho (ML)	Alto (M.)				1		1	JGO	1,00																																																																	1,00
FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA																																																																																					
		Largo (ML)	Ancho (ML)					Alto (M.)																																																																																				
			1		1	JGO	1,00																																																																																					
							1,00																																																																																					
Elaboró EL CONTRATISTA: Firma: Brenda Munillo B Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA Aprobó EL INTERVENIOR: Firma: [Signature] Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENORIA Nota: Instrucciones para la firma Elabora - Representante legal o Director de obra. Registre la firma y el nombre, llamando al Director de obra. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NIT. Aprobo - Representante legal o Director de Interventoria. Registre la firma y el nombre llamando al Director de Interventoria. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en controlar si se cumplen las condiciones técnicas, económicas, administrativas y jurídicas, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregir, emendarlo o reemplazarlo, en función de las funciones asignadas contractualmente a la intervención. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los servicios en la obra, según la etapa en que la misma se encuentra. Anula - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para auditar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, emendarlo o reemplazar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de la entidad territorial debe auditar, as decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estar normal (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FOMOS).																																																																																												

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Version

01

Vigencia a partir de

1

12/02/2024

OBJETO

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATO No.

IND-23-5027

CONTRATISTA

CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC

INTERVENTOR

CONSORCIO GRUPO G3

ITEM

DEMOL. CONCRETO REFORZADO

SUPERVISOR PROYECTO

JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

DESIGNADO ENTE TERRITORIAL

INDERVALLE

UNIDAD

M3

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo (ML)	Ancho (ML)	Alto (M.)				
		20.00	3.51	0.10	1.00	M2	7.01	
							7.01	

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma: Brenda Murillo B

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma: [Signature]

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra. Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y HT.

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría. Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y HT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica así como los informes presentados por el contratista de obra para corregir, emendarlos o repararlos, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avalúo - Designado Ente Territorial (si aplica). Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, emendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normalidad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACION DE FONDOS).

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							Versión
Vigencia a partir de							01
SOPORTE DEL ACTA No.		1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE		12/02/2024		
OBJETO	MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA						
CONTRATO No.	IND-23-5027						
CONTRATISTA	CONSTRUPACOL S.A.S. ZOMAC						
INTERVENIOR	CONSORCIO GRUPO G3						
ITEM	RETIRO SOBREPANTES MAQUINA <=10KM.						
			SUPERVISOR PROYECTO	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL			
			DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	INTERVALLE			
			UNIDAD	JGO			

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo (ML)	Ancho (ML)	Alto (ML)				
	DEMOLICION LOSA	19,00	2,96	0,10	1,00	M3	5,62	
							5,62	

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma: Brenda Murillo B

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENIOR:

Firma: _____

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter al nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregir, emendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente al interventor. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la aplicación de los recursos en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Aprobó - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, emendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normalidad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar el cumplimiento de su deber con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

1

12/02/2024

01

Vigencia a partir de

SOPORTE DEL ACTA No. 1

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE

12/02/2024

OBJETO

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATO No.

IND-23-5027

SUPERVISOR PROYECTO

JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

CONTRATISTA

CONSTRUPACIOL S.A.S. ZOMAC

DESIGNADO ENTE TERRITORIAL

INTERVALLE

INTERVENTOR

CONSORCIO GRUPO G3

ITEM

3.1.1 LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO

UNIDAD

ML

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo (ML)	Ancho (ML)				
		12.96		2	ML	25.91	
						25.91	

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma: Brenda Munillo B

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registrar la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en verificar a su vez, en el momento de la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregir, emendarlos o reemplazarlos, en ejecución de las funciones asignadas contractualmente a la intervención. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, este es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de las obras en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registrar la firma y el nombre de la persona designada para evaluar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, emendarlos o reemplazar cualquier aspecto relacionado con la normalidad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe evaluar, en su caso, manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de esta norma. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

[illegible]

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

144

39

1

1

12/02/2024

01

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

IND-23-5027

CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC

CONSORCIO GRUPO G3

3.2.2 RETIRO SOBRANTES MAQUINA <= 10KM.

JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

INDERVALLE

M3

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACION	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo (ML)	Ancho (ML)				
	Vigia	12,956	0,3	0,4	2	M3	3,11
	Zapata	0,5	0,5	0,4	8		0,80
	Picote	2,5	0,4	0,13	8		2,51
	% Expansion				30%		1,17
							7,60

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma: Brenda Muñillo B

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elaboro - Representante legal o Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT.

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoria. Registrar la firma y el nombre claramente del Director de Interventoria. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregir, enmendarlo o separarlo, en función de las funciones asignadas contractualmente a la intervención. Con base en lo anterior, el interventor se corresponde aprobar, este es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según le exige en que la misma se encuentre.

Avaleo - Designado Ente Territorial (si aplica): Registrar la firma y el nombre de la persona designada para avalear el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendarlo o separar cualquier aspecto relacionado con la normalidad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalear, es decir mantener su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACION DE FONDOS).

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Version

01

Vigencia a partir de

12/02/2024

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

IND-23-4027

CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC

CONSORCIO GRUPO G3

3.3.1 SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA

JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

INDIERVALLE

ITEM

FECHA

aaaa-mm-dd

LOCALIZACIÓN

Largo (ML)

Ancho (ML)

Alto (M.)

CANTIDAD

UNIDAD

TOTAL ACUMULADO

ESQUEMA

9.77

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

Brenda Murillo

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NIT.

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoria: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoria. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en considerar a nuevo examen las obras objeto del contrato y la aplicación del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregir, enmendarse o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, esta es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según le exige en que la misma se encuentre.

Avaleó - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalear el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendarse o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalear, no decir mantener su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

7

1951

1951

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Vigencia a partir de

12/02/2024

1

1

12/02/2024

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

IND-23-5027

CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC

SUPERVISOR PROYECTO

JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

CONSORCIO GRUPO G3

DESIGNADO ENTE TERRITORIAL

INDervalle

3.4.1 MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C

UNIDAD

M2

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo (ML)	Ancho (ML)				
		2,00	0,4	12	M2	9,60	
						9,60	

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma: Brenda Munillo B

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma: [Firma]

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra. Registrar la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT.
Aprobó - Representante legal o Director de obra. Registrar la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en verificar a su vez los planos de la obra, el diseño del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregir, ordenar o reparar, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la intervención. Con base en lo anterior, el interventor la correspondiente aprobar, esta es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según le corresponda en la medida de la misma se encuentre.
Avalúo - Designado Ente Territorial (si aplica). Registrar la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Este requisito consiste en el orden de los informes del contratista de obra para corregir, ordenar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normalidad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Vigencia a partir de

1

12/02/2024

1

12/02/2024

01

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

IND-23-5027

SUPERVISOR PROYECTO

JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC

DESIGNADO ENTE TERRITORIAL

INTERVENIOR


CONSORCIO GRUPO G3

ITEM

3.4.2 CINTA CONFINAMIENTO MURO

UNIDAD

ML

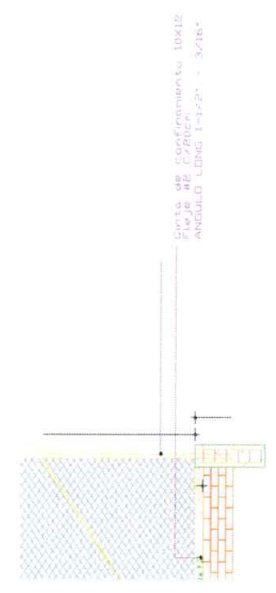FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo (ML)	Ancho (ML)				
		12.75		2	ML	25.50	
						25.50	

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma: Brenda Murillo B

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENIOR:

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NT.

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en consultar a nuevo examen los obra objeto del contrato y la aplicación del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregir, emendarlo o separarlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, esta es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentra.

Avató - Designado Ente Territorial la aplica. Registre la firma y el nombre de la persona designada para auditar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, emendarlo o separar cualquier aspecto relacionado con la normalidad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe auditar, en decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

12/02/2024

01

1

1

12/02/2024

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

IND-23-5027

JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC

DESIGNADO ENTE TERRITORIAL

CONSORCIO GRUPO G3

INTERVALLE

3.5.1 MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"

M2

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo (ML)	Ancho (ML)				
		12,8	4,00	2	M2	102,40	

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

Brenda Murillo B

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

[Firma]

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra. Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NIT.

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría. Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregir, emendarlos o repararlos, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentra.

Aprobó - Designado Ente Territorial (si aplica). Registre la firma y el nombre de la persona designada para auditar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, emendarlos o reparar cualquier aspecto relacionado con la normalidad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe auditar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

12/02/2024

01

1

12/02/2024

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

IND-23-5027

CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC

CONSORCIO GRUPO G3


3.5.2 POSTE TUBO GALV. 2" x 2.3MM C.13

SUPERVISOR PROYECTO

DESIGNADO ENTE TERRITORIAL

JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

INDERVALLE

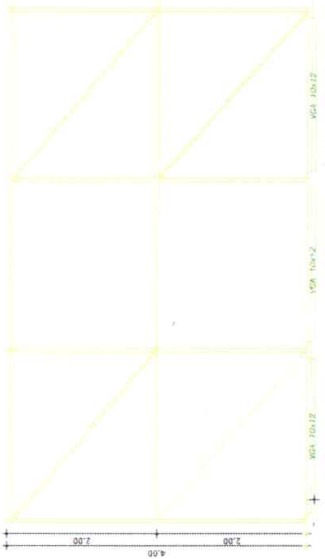FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo (ML)	Ancho (ML)				
				14	ML	67,20	
		12,75		6	ML	76,50	
						143,70	

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma: Brenda Murillo B

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NIT. La misión por parte del interventor del contrato de obra consiste en supervisar a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregir, entenderlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Availó - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para auditar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, entender o reparar cualquier aspecto relacionado con la normalidad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe auditar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Version
Vigencia a partir de	01

Vigencia a partir de

SOPORTE DEL ACTA No.		1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	12/02/2024
MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA				
OBJETO				
CONTRATO No.	IND-23-5027			
CONTRATISTA	CONSTRUPACOL S.A.S. ZOMAC	SUPERVISOR PROYECTO		
INTERVENTOR	CONSORCIO GRUPO G3	DESIGNADO ENTE TERRITORIAL		
ITEM	3.5.3 DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 1,1/2"			UNIDAD
				ML

[illegible]

EL CONTRATISTA:

Firma: Brenda
Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

EL INTERVENTOR:

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

PER LECA O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

REF. LEGAL O DIRECTOR DE I

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registre la firma del representante legal nombre y NIT

Aprobó: Representante legal o Director de Interventoría: Recibir la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal recibir la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica

En consecuencia, el interventor debe ser responsable de las acciones que se realicen en el proceso de intervención, así como de la correcta aplicación de los recursos asignados para el cumplimiento de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar con su sujeción y adhesión la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avalúo - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para *avalar* el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de la entidad beneficiaria.

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Date		Time		Place		Remarks	
1911	10/1	10:00	11:00	St. Louis	Mo.	Left St. Louis for St. Paul	
1911	10/2	11:00	12:00	St. Paul	Mn.	Arrived St. Paul	
1911	10/3	12:00	1:00	St. Paul	Mn.	Left St. Paul for Minneapolis	
1911	10/4	1:00	2:00	Minneapolis	Mn.	Arrived Minneapolis	
1911	10/5	2:00	3:00	Minneapolis	Mn.	Left Minneapolis for St. Paul	
1911	10/6	3:00	4:00	St. Paul	Mn.	Arrived St. Paul	
1911	10/7	4:00	5:00	St. Paul	Mn.	Left St. Paul for St. Louis	
1911	10/8	5:00	6:00	St. Louis	Mo.	Arrived St. Louis	
1911	10/9	6:00	7:00	St. Louis	Mo.	Left St. Louis for St. Paul	
1911	10/10	7:00	8:00	St. Paul	Mn.	Arrived St. Paul	
1911	10/11	8:00	9:00	St. Paul	Mn.	Left St. Paul for Minneapolis	
1911	10/12	9:00	10:00	Minneapolis	Mn.	Arrived Minneapolis	
1911	10/13	10:00	11:00	Minneapolis	Mn.	Left Minneapolis for St. Paul	
1911	10/14	11:00	12:00	St. Paul	Mn.	Arrived St. Paul	
1911	10/15	12:00	1:00	St. Paul	Mn.	Left St. Paul for St. Louis	
1911	10/16	1:00	2:00	St. Louis	Mo.	Arrived St. Louis	
1911	10/17	2:00	3:00	St. Louis	Mo.	Left St. Louis for St. Paul	
1911	10/18	3:00	4:00	St. Paul	Mn.	Arrived St. Paul	
1911	10/19	4:00	5:00	St. Paul	Mn.	Left St. Paul for Minneapolis	
1911	10/20	5:00	6:00	Minneapolis	Mn.	Arrived Minneapolis	
1911	10/21	6:00	7:00	Minneapolis	Mn.	Left Minneapolis for St. Paul	
1911	10/22	7:00	8:00	St. Paul	Mn.	Arrived St. Paul	
1911	10/23	8:00	9:00	St. Paul	Mn.	Left St. Paul for St. Louis	
1911	10/24	9:00	10:00	St. Louis	Mo.	Arrived St. Louis	
1911	10/25	10:00	11:00	St. Louis	Mo.	Left St. Louis for St. Paul	
1911	10/26	11:00	12:00	St. Paul	Mn.	Arrived St. Paul	
1911	10/27	12:00	1:00	St. Paul	Mn.	Left St. Paul for Minneapolis	
1911	10/28	1:00	2:00	Minneapolis	Mn.	Arrived Minneapolis	
1911	10/29	2:00	3:00	Minneapolis	Mn.	Left Minneapolis for St. Paul	
1911	10/30	3:00	4:00	St. Paul	Mn.	Arrived St. Paul	
1911	10/31	4:00	5:00	St. Paul	Mn.	Left St. Paul for St. Louis	
1911	11/1	5:00	6:00	St. Louis	Mo.	Arrived St. Louis	
1911	11/2	6:00	7:00	St. Louis	Mo.	Left St. Louis for St. Paul	
1911	11/3	7:00	8:00	St. Paul	Mn.	Arrived St. Paul	
1911	11/4	8:00	9:00	St. Paul	Mn.	Left St. Paul for Minneapolis	
1911	11/5	9:00	10:00	Minneapolis	Mn.	Arrived Minneapolis	
1911	11/6	10:00	11:00	Minneapolis	Mn.	Left Minneapolis for St. Paul	
1911	11/7	11:00	12:00	St. Paul	Mn.	Arrived St. Paul	
1911	11/8	12:00	1:00	St. Paul	Mn.	Left St. Paul for St. Louis	
1911	11/9	1:00	2:00	St. Louis	Mo.	Arrived St. Louis	
1911	11/10	2:00	3:00	St. Louis	Mo.	Left St. Louis for St. Paul	
1911	11/11	3:00	4:00	St. Paul	Mn.	Arrived St. Paul	
1911	11/12	4:00	5:00	St. Paul	Mn.	Left St. Paul for Minneapolis	
1911	11/13	5:00	6:00	Minneapolis	Mn.	Arrived Minneapolis	
1911	11/14	6:00	7:00	Minneapolis	Mn.	Left Minneapolis for St. Paul	
1911	11/15	7:00	8:00	St. Paul	Mn.	Arrived St. Paul	
1911	11/16	8:00	9:00	St. Paul	Mn.	Left St. Paul for St. Louis	
1911	11/17	9:00	10:00	St. Louis	Mo.	Arrived St. Louis	
1911	11/18	10:00	11:00	St. Louis	Mo.	Left St. Louis for St. Paul	
1911	11/19	11:00	12:00	St. Paul	Mn.	Arrived St. Paul	
1911	11/20	12:00	1:00	St. Paul	Mn.	Left St. Paul for Minneapolis	
1911	11/21	1:00	2:00	Minneapolis	Mn.	Arrived Minneapolis	
1911	11/22	2:00	3:00	Minneapolis	Mn.	Left Minneapolis for St. Paul	
1911	11/23	3:00	4:00	St. Paul	Mn.	Arrived St. Paul	
1911	11/24	4:00	5:00	St. Paul	Mn.	Left St. Paul for St. Louis	
1911	11/25	5:00	6:00	St. Louis	Mo.	Arrived St. Louis	
1911	11/26	6:00	7:00	St. Louis	Mo.	Left St. Louis for St. Paul	
1911	11/27	7:00	8:00	St. Paul	Mn.	Arrived St. Paul	
1911	11/28	8:00	9:00	St. Paul	Mn.	Left St. Paul for Minneapolis	
1911	11/29	9:00	10:00	Minneapolis	Mn.	Arrived Minneapolis	
1911	11/30	10:00	11:00	Minneapolis	Mn.	Left Minneapolis for St. Paul	
1911	12/1	11:00	12:00	St. Paul	Mn.	Arrived St. Paul	
1911	12/2	12:00	1:00	St. Paul	Mn.	Left St. Paul for St. Louis	
1911	12/3	1:00	2:00	St. Louis	Mo.	Arrived St. Louis	
1911	12/4	2:00	3:00	St. Louis	Mo.	Left St. Louis for St. Paul	
1911	12/5	3:00	4:00	St. Paul	Mn.	Arrived St. Paul	
1911	12/6	4:00	5:00	St. Paul	Mn.	Left St. Paul for Minneapolis	
1911	12/7	5:00	6:00	Minneapolis	Mn.	Arrived Minneapolis	
1911	12/8	6:00	7:00	Minneapolis	Mn.	Left Minneapolis for St. Paul	
1911	12/9	7:00	8:00	St. Paul	Mn.	Arrived St. Paul	
1911	12/10	8:00	9:00	St. Paul	Mn.	Left St. Paul for St. Louis	
1911	12/11	9:00	10:00	St. Louis	Mo.	Arrived St. Louis	
1911	12/12	10:00	11:00	St. Louis	Mo.	Left St. Louis for St. Paul	
1911	12/13	11:00	12:00	St. Paul	Mn.	Arrived St. Paul	
1911	12/14	12:00	1:00	St. Paul	Mn.	Left St. Paul for Minneapolis	
1911	12/15	1:00	2:00	Minneapolis	Mn.	Arrived Minneapolis	
1911	12/16	2:00	3:00	Minneapolis	Mn.	Left Minneapolis for St. Paul	
1911	12/17	3:00	4:00	St. Paul	Mn.	Arrived St. Paul	
1911	12/18	4:00	5:00	St. Paul	Mn.	Left St. Paul for St. Louis	
1911	12/19	5:00	6:00	St. Louis	Mo.	Arrived St. Louis	
1911	12/20	6:00	7:00	St. Louis	Mo.	Left St. Louis for St. Paul	
1911	12/21	7:00	8:00	St. Paul	Mn.	Arrived St. Paul	
1911	12/22	8:00	9:00	St. Paul	Mn.	Left St. Paul for Minneapolis	
1911	12/23	9:00	10:00	Minneapolis	Mn.	Arrived Minneapolis	
1911	12/24	10:00	11:00	Minneapolis	Mn.	Left Minneapolis for St. Paul	
1911	12/25	11:00	12:00	St. Paul	Mn.	Arrived St. Paul	
1911	12/26	12:00	1:00	St. Paul	Mn.	Left St. Paul for St. Louis	
1911	12/27	1:00	2:00	St. Louis	Mo.	Arrived St. Louis	
1911	12/28	2:00	3:00	St. Louis	Mo.	Left St. Louis for St. Paul	
1911	12/29	3:00	4:00	St. Paul	Mn.	Arrived St. Paul	
1911	12/30	4:00	5:00	St. Paul	Mn.	Left St. Paul for Minneapolis	
1911	12/31	5:00	6:00	Minneapolis	Mn.	Arrived Minneapolis	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Vigencia a partir de

12/02/2024

1

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

IND-23-5027

SUPERVISOR PROYECTO

JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC

DESIGNADO ENTE TERRITORIAL

INTERVENTOR

CONSORCIO GRUPO G3

ITEM

4.2 RETIRO SOBREPANTES MAQUINA c=10KM.

UNIDAD

M3

ESQUEMA

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo (ML)	Ancho (ML)			
	Retiro excavado	25,78	1,25	1	M3	8,06
	Expansion				30%	2,42
						10,47

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma: Brenda Murillo B

Nombre: BRÉNDIA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NIT.
Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en revisar los planos de la obra desde la perspectiva técnica, económica, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregir, enmendarlo o reemplazarlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.
Avaló - Designado Esta Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reemplazar cualquier aspecto relacionado con la normalidad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, en decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de esta norma. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Version
	Vigencia a partir de	01

		1	
SOPORTE DEL ACTA No.		1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE
			12/02/2024

12/02/2024	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	1	SOPORTE DEL ACTA No.
------------	----------------------------------	---	----------------------

OBJETO	IND. 23.5027	SUPERVISOR PROYECTO	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
CONTRATO N.º			

IND 20-2021	DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	INTERVALLE
CONTRATISTA	CONSTRUPACIOL S.A.S.ZOMAC	
CONTINUIDAD 100%		

INTERVENTOR			
CONSUMICJO GRUPO 63			
		UNIDAD	M3

[illegible][illegible]

Avalúo - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para auditar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del controlador de obra para corregir, emendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe poder acceder a los expedientes de la obra, para verificar el cumplimiento de los requisitos de la normativa.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Version

01

Vigencia a partir de

12/02/2024

1

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

IND-23-5027

JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

CONSTRUPACIOL S.A.S. ZOMAC

SUPERVISOR PROYECTO

CONSORCIO GRUPO G3

DESIGNADO ENTE TERRITORIAL

4.4 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI

INTERVALLE

ITEM

UNIDAD

M2

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo (ML)	Ancho (ML)				
		25.78	1.20	1	M2	30.94	
						30.94	

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

Brenda Murillo B

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Juan Carlos Naranjo Ramirez

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra. Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NIT.

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoria. Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoria. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en controlar a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregir, emendarlos o repararlos, en ejecución de las funciones asignadas contractualmente a la interventoria. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de las obras en la obra, según le exige en que la misma se encuentre.

Avalúo - Designado Ente Territorial (si aplica). Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, emendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normalidad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

[illegible]

19

100

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Version

Vigencia a partir de

01

1

12/02/2024

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

IND-23-5027

CONSTRUPACOL S.A.S. ZOMAC

CONSORCIO GRUPO G3

4.7 CORDON CONCRETO 3100 PSI

JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

INDERVALLE

M3

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo (ML)	Ancho (ML)				
		25.78	0.15	2	M3	1.55	
						1.55	

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma: Brenda Munillo B

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma: [Firma]

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ


REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra. Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen los datos objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, emendarlo o repararlo, en función de las funciones asignadas contractualmente a la intervención. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según le exige en que la misma se encuentre.


Avila - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para auditar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el orden de los informes del contratista de obra para corregir, emendarlo o reparar cualquier aspecto relacionado con la normalidad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe auditar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

[illegible]



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA						
Vigencia a partir de						
01	Versión					
SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE		12/02/2024		
OBJETO	MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA					
CONTRATO No.	IND-23-5027		SUPERVISOR PROYECTO		JUAN CARLOS RUEDA ANGEL	
CONTRATISTA	CONSTRUPACIFICOL S.A.S.ZOMAC		DESIGNADO ENTE TERRITORIAL		INTERVALLE	
INTERVERTOR	CONSorcio GRUPO G3					
ITEM	4.9 ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT					
FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	Largo (ML)	DIMENSIONES Ancho (ML) Alto (M.)	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Rocamuerta	25.78	1.20 0.20	20.00	1.00	123.74
	Concreto anden	25.78	1.20 0.10	20.00	1.00	61.87
	Sardinel	25.78	0.15 0.20	20.00	2.00	30.94
						216.55
						
Elaboró						
Firma:						
Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO						
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
Aprobó						
Firma:						
Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ						
REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA						
Nota: Instrucciones para la firma						
Elaboró - Representante legal o Director de obra. Registrar la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NT. Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría. Registrar la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en verificar si se cumplen las condiciones técnicas, económicas y administrativas establecidas en el contrato y la especificación del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para cumplir con lo establecido en el contrato, emitiendo un informe final al interventor. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde emitir este es calificar como suficiente y adecuado la ejecución de las obras en su forma, según la etapa en que la misma se encuentra. Avaleo - Designado Ente Territorial (si aplica). Registrar la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el análisis de los informes, el cumplimiento de esta función, el desempeño de la entidad territorial donde avalar, así como manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).						

[illegible]



OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

BOPORTE DEL ACTA No.		1		PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE		12/02/2024	
OBJETO		MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA					
CONTRATO No.		IND-23-5927					
CONTRATISTA		CONSTRUPACIOL S.A.S.ZOMAC					
INTERVENIOR		CONSORCIO GRUPO G3					
ITEM		5.2.2 RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.					
						M3	
						UNIDAD	
						M3	

FECHA		LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
aaaa-mm-dd		Largo (ML)	Ancho (ML)	Alto (M)				
	TRAMO 1	CANAL	30,50	0,65	0,85	1,00	M3	16,65
	4 - 5	CAJA 6X3	9,97	0,75	0,80	1,00		5,98
		CAJA 60X90	0,80	0,80	1,20	1,00		0,77
	5 - 6	CAJA 1,2X1,2	9,78	0,44	1,20	1,00		5,16
		CAJA 120X120	1,20	1,20	1,50	1,00		2,16
	TRAMO 2	CAJA 6X6	1,14	0,55	0,50	1,00		0,31
		CAJA 60X60	0,60	0,60	0,80	2,00		0,58
	TRAMO 2	CANAL	30,50	0,95	0,85	1,00		16,85
	3 - 4	CAJA 1X1	10,61	1,15	0,95	1,00		11,59
		CAJA 100X100	1,00	1,00	1,20	1,00		1,20
	6 - 7	C. DISIPADOR	9,07	2,10	1,70	1,00		32,38
	7 - 8	CAMARA	5,48	1,00	2,04	1,00		11,18
		CAMARA TIPC	1,50	1,50	2,50	1,00		5,63
		DRENAJE	20,45	0,60	0,80	1,00		9,82
	Expansion					0,30		36,14
								156,59

Elaboró

Prenda Morillo B

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
EL INTE

Circuit:

.....

REP LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

REF: LEGAL O DIRECTOR DE

Con varamento loal roasir a la firma del representante local nativo y NIT

[illegible]

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
	Vigencia a partir de	01

01

1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	12/02/2024
SOPORTE DEL ACTA No.		


12/02/2024

OBJETO	
CONTRATO N°	
IND. 23.5027	
SUPERVISOR PROYECTO	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

INTERVALLE

M3

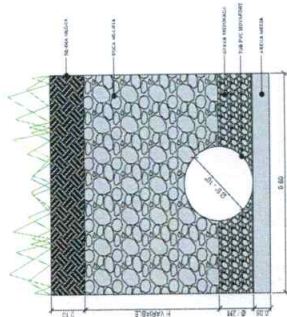[illegible]

EL CONTRATISTA:

Firma: Brenda Mori

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

EL INTERVENTOR:

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

Nota: Instrucciones para la firma

[illegible]

Anexo - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para actuar a pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, amendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de la entidad territorial debe haber un decisor mediante su acuerdo con la autorización del contrato, desde la perspectiva de estas normas: (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACION DE FONDOS).

[illegible]

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										Version
Vigencia a partir de										01
SOPORTE DEL ACTA No.		1		PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE		12/02/2024				
OBJETO										MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
CONTRATO No.		IND-23-5027		SUPERVISOR PROYECTO		JUAN CARLOS RUEDA ANGEL				
CONTRATISTA		CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC		DESIGNADO ENTE TERRITORIAL		INTERVALLE				
INTERVENITOR										CONSORCIO GRUPO G3
ITEM										5.2.7 ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT
UNIDAD										M3K
ESQUEMA										
FECHA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL				
aaaa-mm-dd		Largo (ML)	Ancho (ML)	Alto (M.)		ACUMULADO				
	arena	66,50	0,60	0,10	15,00	59,85				
	grava	66,50	0,60	0,20	15,00	119,70				
	rocamuerta	66,50	0,60	0,85	15,00	508,73				
						688,28				
Elaboró										
EL CONTRATISTA:										
Firma:										Brenda Murillo B
Nombre:										BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA										
Aprobó										
EL INTERVENITOR:										
Firma:										
Nombre:										JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ
REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA										
Nota: Instrucciones para la firma										
Elaboró - Representante legal o Director de obra. Para representante legal registre la firma del representante legal. Nombre y NT Aprobó - Representante legal o Director de Interventoria. Para representante legal registre la firma del representante legal. Nombre y NT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregir, emendar o reparar, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de las obras en la obra, según le exige en que la misma se encuentre. Anexo - Designado Esta Territorial (si aplica) Registre la firma y el nombre de la persona designada para auxiliar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, emendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normalidad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe auxiliar, en su caso, en el cumplimiento de las obligaciones del contratista, desde la perspectiva de estos normar. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).										



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión

01

Vigencia a partir de

1

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE

12/02/2024

OBJETO

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATO No.

IND-23-5027

SUPERVISOR PROYECTO

JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

CONTRATISTA

CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC

DESIGNADO ENTE TERRITORIAL

INTERVALLE

INTERVENTOR


CONSORCIO GRUPO G3

ITEM

5.3.2 GRAVA TRITURADA DE 1"

UNIDAD

M3

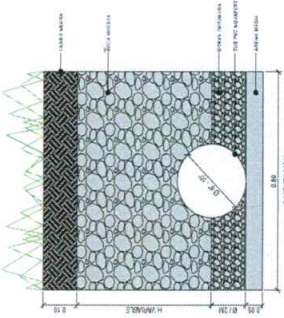FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo (ML)	Ancho (ML)				
		20.45	0.45	1	M3	1.84	 
						1.84	

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

Brenda Muriel B

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen los obra objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregir, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Availó - Designado Ente Territorial (si aplica). Registrar la firma y el nombre de la persona designada para velar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendarlo o reparar cualquier aspecto relacionado con la normalidad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe velar, se debe manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estos normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FOMOCO).

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Vigencia a partir de

12/02/2024

01

1

1

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE

12/02/2024

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

IND-23-5027

CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC

SUPERVISOR PROYECTO

JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

CONSORCIO GRUPO G3

DESIGNADO ENTE TERRITORIAL

INDIERVALLE

5.4.4 CAJA INSPECCION 120x120 CM [CONCRETO]

UNIDAD

UNO

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACION	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo (ML)	Ancho (ML)				
				1	UNIDAD	1,00	
						1,00	

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma: Brenda Murillo B

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma: [Signature]

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NT.

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en considerar a nuevo escenas los otros datos del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregir, enmendando o reparando, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, estos es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según le corresponda en la misma se encuentre.

Aprobó - Designado Ente Territorial (si aplica). Registre la firma y el nombre de la persona designada para auditar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el orden de los informes del contratista de obra para corregir, enmendando o reparar cualquier aspecto relacionado con la normalidad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe auditar, en decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas: (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Version

01

Vigencia a partir de

1

12/02/2024

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

IND-23-0027

CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC

CONSORCIO GRUPO G3

5.4.7 SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA

SUPERVISOR PROYECTO

DESIGNADO ENTE TERRITORIAL

JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

INTERVALLE

UNIDAD

M2

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo (ML)	Ancho (ML)				
		30.65	0.50	2.00	M2	30.65	
						30.65	

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

Brenda Muxillo B

Nombre:

BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

[Firma manuscrita]

Nombre:

JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota:

Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NT.

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregido, enmendado o reparado, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuado la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica). Registrar la firma y el nombre de la persona designada para auditar al pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendado o reparar cualquier aspecto relacionado con la normalidad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe auditar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de esta norma. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

1

12/02/2024

01

SOPORTE DEL ACTA No.

1

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE

12/02/2024

OBJETO

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATO No.

IND-23-5027

SUPERVISOR PROYECTO

JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

CONTRATISTA

CONSTRUPACIOL S.A.S. ZOMAC

DESIGNADO ENTE TERRITORIAL

INTERVALLE

INTERVENTOR


CONSORCIO GRUPO G3

ITEM

5.4.9 TAPA CANAL CONCRETO PERFORADA PREF. ESP:8CM

UNIDAD

UND

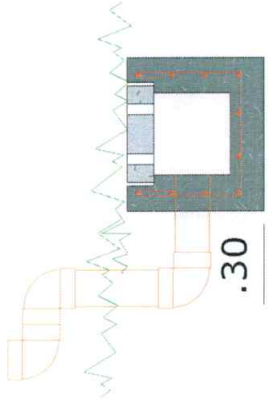FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo (ML)	Ancho (ML)				
		0.60	0.32	103	UNIDAD	103.00	
						103.00	

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma: Brenda Murillo B

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma: [Firma]

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma


Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NT.

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregir, enmendarlo o repararlo, en ejecución de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avale - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendarlo o reparar cualquier aspecto relacionado con la normalidad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA						Vigencia a partir de	01	Versión
SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	12/02/2024					
OBJETO	MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA							
CONTRATO No.	IND-23-5027	SUPERVISOR PROYECTO JUAN CARLOS RUEDA ANGEL						
CONTRATISTA	CONSTRUPACOL S.A.S.ZOMAC	DESIGNADO ENTE TERRITORIAL INDERVALLE						
INTERVENTOR	CONSORCIO GRUPO G3							
ITEM	1.1.3 DEMOL. CONCRETO REFORZADO							
FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA	
	LOSA DE CONCRETO	Largo (ML)	Ancho (ML)	Alto (M.)				
	muro existente	12	0,1	0,45	1	M3		
						1,44		
Elaboró								
EL CONTRATISTA:								
Firma:	Brenda Murillo B							
Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO								
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA								
Aprobó								
EL INTERVENTOR:								
Firma:								
Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ								
REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA								
Nota: Instrucciones para la firma								
Elaboro - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NIT. Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en controlar a menor escalar los otros objetos del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, emendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, veto o, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre. Aprobó - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente. Teniendo en cuenta que esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, emendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FORTICIOS).								

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										Version
Vigencia a partir de										01
1										12/02/2024
SOPORTE DEL ACTA No. 1 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE										
OBJETO MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA										
CONTRATO No. IND-23-5027 SUPERVISOR PROYECTO JUAN CARLOS RUEDA ANGEL										
CONTRATISTA CONSTRUPACOL S.A.S. ZOMAC DESIGNADO ENTE TERRITORIAL INTERVALLE										
INTERVENTOR CONSORCIO GRUPO G3										
ITEM 1.1.4 RETIRO SOBRRANTES MAQUINA <=10KM.										M3
FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA			
		Largo (ML)	Ancho (ML)	Alto (M.)						
	NIVELACION TERRENO PARA SIEMBRA DE PRADO	34,60	3,00	0,10	2,00	M3	10,38			
		24,1	3	0,1	2	M3	7,23			
	PERFECTACION DE TERRENO EJE A-B	31,00	3,00	0,10	1,00	M3	9,30			
		10,50	1,50	0,20	1,00	M3	3,15			
	DEMOLICIONES	3,00	3,00	0,10	1,00	M3	0,90			
		12,00	0,10	0,45	1,00	M3	0,54			
		EXPANSION			30%		9,45			
							40,95			
Elaboró										
EL CONTRATISTA:										
Firma: Brenda Murillo B										
Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO										
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA										
Aprobó										
EL INTERVENTOR:										
Firma:										
Nombre: JUAN CARLOS MARANJO RAMIREZ										
REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA										
Nota: Instrucciones para la firma										
Elaboró - Representante legal o Director de obra. Rogar la firma y el nombre. El representante legal rogara la firma del representante legal, nombre y NIT.										
Aprobó - Representante legal o Director de Interventoria. Rogar la firma y el nombre. El representante legal rogara la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo, desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregir, complementar o mejorar, en ejecución de las funciones asignadas contractualmente a la intervención. Con base en lo anterior, el interventor le comunicará al contratista las acciones a tomar, según lo expone en la obra, según lo expone en la obra, según lo expone en la obra, según lo expone en la obra.										
Aviso - Designado Ente Territorial (si aplica): Rogar la firma y el nombre de la persona designada para avise el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, complementar o mejorar cualquier aspecto relacionado con la conformidad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avisar, por escrito, al contratista, su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de la conformidad territorial.										



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Version

01

Vigencia a partir de

1

SOPORTE DEL ACTA No.

1

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE

12/02/2024

OBJETO

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATO No.

IND-23-5027

SUPERVISOR PROYECTO

JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

CONTRATISTA

CONSTRUPACIOL S.A.S. ZOMAC

DESIGNADO ENTE TERRITORIAL

INDERVALLE

INTERVENTOR

CONSORCIO GRUPO G3

ITEM

1.1.5 PODA DE ARBOLES

UNIDAD

UND

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo (ML)	Ancho (ML)				
				1	UNIDAD	1,00	
						1,00	

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma: Brenda Murillo B

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma: [Signature]

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra. Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen los obra objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregir, emitir o reparar, en aplicación de las funciones asignadas contractualmente a la intervención. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, este es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avale - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avale el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, emitir o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avale, no decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Version

Vigencia a partir de

01

SOPORTE DEL ACTA No.

1

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE

12/02/2024

OBJETO

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATO No.

IND-23-5027

SUPERVISOR PROYECTO

JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

CONTRATISTA

CONSTRUPACOL S.A.S. ZOMAC

DESIGNADO ENTE TERRITORIAL

INDERVALLE

INTERVENTOR

CONSORCIO GRUPO G3

ITEM

1.1.6 DESMONTAJE JUEGO

UNIDAD

UND

FECHA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		Largo (ML)	Ancho (ML)				
aaaa-mm-dd				2	UNIDAD	2,00	
						2,00	

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma: Brenda Munillo B

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra. Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregir, emendar o reparar, en función de las funciones asignadas contractualmente a la intervención. Con base en la anterior, el interventor le corresponde aprobar, este es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según le elija en que la misma se encuentre.

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, emendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normalidad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, dando la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

12

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

1

12/02/2024

01

Vigencia a partir de

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

IND-23-5027

CONSTRUPACOL S.A.S. ZOMAC

CONSORCIO GRUPO G3

1.2.1 EXCAVACION TIERRA A MANO

SUPERVISOR PROYECTO

DESIGNADO ENTE TERRITORIAL

JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

INTERVALLE

UNIDAD

M3

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo (ML)	Ancho (ML)	Alto (M.)				
	CUBO PARA PILOTES	1,00	1,00	1,07	12	M3	12,84	
	VIGA LONG.	5,00	0,50	0,57	10	M3	14,25	
	PILOTES	0,30	7,00	1,98	12	M3	23,75	
							50,84	

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma: Brenda Muillo B

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma: [Signature]

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ


REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elabora - Representante legal o Director de obra: Fugate la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NT.

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoria: Fugate la firma y el nombre claramente del Director de Interventoria. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en verificar a nuevo examen los datos objeto del contrato y la ejecución del mismo, desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregir, emendarlos o separarlos, en ejecución de las funciones asignadas contractualmente a la interventoria. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, auto es, calificar como satisfactorio y adecuando la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentra.

[illegible]



Handwritten text, likely a signature or date, located in the upper right corner of the page.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							Versión
						01	
Vigencia a partir de							
1							
SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE		12/02/2024			
MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA							
OBJETO							
CONTRATO No.	IND-23-5027	SUPERVISOR PROYECTO		JUAN CARLOS RUEDA ANGEL			
CONTRATISTA	CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	DESIGNADO ENTE TERRITORIAL		INTERVALLE			
INTERVENIOR	CONSORCIO GRUPO G3						
ITEM	1.2.3 SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA						
ESQUEMA							
FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	
	VIGA	Largo (ML)	Ancho (ML)	Alto (M.)			
		5,00	0,50		M2	25,00	
	CUBO PARA PILOTES	1,00	1,00		M3	12,00	
						37,00	

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma: Brenda Murillo B

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENIOR:

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

The photograph shows several construction workers in safety gear standing on a newly poured or prepared concrete surface. They appear to be inspecting or guiding the work. The background shows some vegetation and a clear sky.

Elaboro - Representante legal o Director de obra. Registra la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NT.

Aprobo - Representante legal o Director de Interventoria. Registra la firma y el nombre claramente del Director de Interventoria. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregir, ordenar o reparar, en servicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según lo exige la ley que la misma se encuentre.

[illegible]

Vigencia a partir de

Version

01

SOPORTE DEL ACTA No.		1		PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE		12/02/2024	
OBJETO		MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA					
CONTRATO No.		IND-23-5027		SUPERVISOR PROYECTO		JUAN CARLOS RUEDA ANGEL	
CONTRATISTA		CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC		DESIGNADO ENTE TERRITORIAL		INDERVALLE	
INTERVENIOR		CONSORCIO GRUPO G3					
ITEM		1.2.5 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa					
						KLS	

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo (ML)	Peso varilla			
	Long	7,75	1,55	12		2594,7
	Circ	1,91	0,55	43		543,11
	Gancho	0,7	0,55	172		794,64
						3832,45

ESQUEMA

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma: Brenda Munlo B

Firma:

Nombre: **BRENDA LIZETH MURILLO BARCO**

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

FI INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registre la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó.- Representante legal o Director de Intervención: Para representante legal registra la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato es obra consiste en someter a nuevo examen los datos objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, económica y financiera. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Aviso - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para recibir el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consista en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, emendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe auditar, en decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACION DE FONDOS).

 INDERVALLE INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA- INDERVALLE SISTEMA DE GESTIÓN		CODIGO	PA-FO-220-060
			VERSION	1
			APROBADO	20/OCT/2020
REFERENCIA CRUZADA				

Día 11 Mes_Marzo Año 2024

El tipo documental perteneciente:

Del folio No. _____ al folio No _____
 Del expediente con nombre_Licitación Pública IND-2023-4469
 De la serie_____, subserie_____

Correspondiente a:

Mapa_____ Plano_____ Propuesta_____ Contrato_____ Fotografías_____
 Otros_____


Se encuentra ubicado en:

Depósito Archivo de Gestión Estantería__x__ Archivador rodante_____
 Modulo_____ Fila _____ Columna_____.

Cuando el documento es electrónico:

Servidor_____ Computador_____ Unidad Externa: _____

El contrato de obra IND-2023-5027, hace parte de la licitación pública IND-2023-4469,
 está queda incluida en el contrato de obra IND-2023-4469



Firma del responsable del archivo

THE
FEDERAL
BUREAU OF
INVESTIGATION



WASHINGTON, D. C.

TO : DIRECTOR, FBI

FROM : SAC, NEW YORK
SUBJECT: [Illegible]

RE: [Illegible]

DATE: [Illegible]

BY: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]



5. [Illegible]
