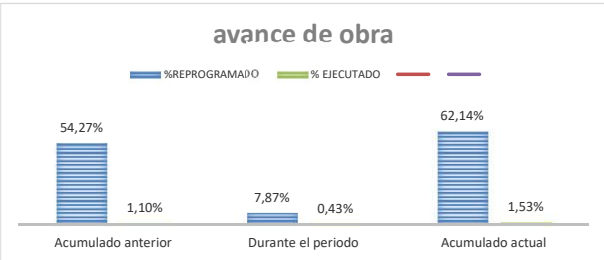
	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		31/01/2020

CONTRATO DE OBRA			
Contratista:	MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8	Objeto	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"
Contrato No.	CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-002-2019		
Valor Inicial:	\$ 932.100.000,00		
Valor Actualizado:	\$ 932.100.000,00		
Plazo Inicial:	4 MESES		
Plazo Actualizado:			
Fecha de Iniciación:	29/11/2019		
Fecha de Vencimiento:	30/03/2020		
Semana Número:	8 Del: 24/01/2020 Al 31/01/2020	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato	8 días
Nombre del Supervisor	Secretario de Planeacion, Carlos Curiel		

AVANCE DE LA OBRA			
OBRA PROGRAMADA SEMANAL		OBRA EJECUTADA SEMANAL	
Obra programada (%)	7,87%	Obra Física Ejecutada (%)	0,43%
Valor de la Obra	\$ 932.100.000,00	Valor de la Obra	\$ 932.100.000,00
	62,14%		1,53%


GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO			
	REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	54,27%	1,10%	-61%
Durante el periodo	7,87%	0,43%	
Acumulado actual	62,14%	1,53%	

avance de obra








Excavaciones y Rellenos	
<p>Para la octava semana de ejecucion aun se continua realizando las diferentes excavaciones tanto para Zapatas como para la zona administrativa y la gradería, contrapesos, vigas de cimentación, etc, teniendo en cuenta los ejes descritos en la localización y replanteo para su correcta ubicación.</p>	

 MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		31/01/2020

CONTRATO DE OBRA	
Contratista:	MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS- LP-002-2019
Contrato No.	
Valor Inicial:	\$ 932.100.000,00
Valor Actualizado:	\$ 932.100.000,00
Plazo Inicial:	4 MESES
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	29/11/2019
Fecha de Vencimiento:	30/03/2020
Objeto "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"	
Semana Número: 8 Del: 24/01/2020 Al 31/01/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 8 días	
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel	

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	<p>ALCALDE MUNICIPAL  NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena</p> <p>INTERVENTOR  Nombre KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ CC 7.142.674 de Santa Marta</p> <p>SUPERVISOR MUNICIPAL  Nombre: Carlos Curiel Correa C.C.: 84.079.279</p>
