


República de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina
Nit. N° 891780053-9



INFORME MENSUAL DE EJECUCION
CONVENIO N.º 859 DE 2019 MINISTERIO MUNICIPIO DE SALAMINA - MAGDALENA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE 2020

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVEZ DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA- C.I.C, EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA- MAGDALENA "		
UBICACIÓN DEL PROYECTO:			
VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO	TOTAL, DEL CONVENIO	\$1.075.900.000	
	APORTES MIN – FONSECON	\$1.075.900.000	
	APORTES MUNICIPIO	LOTE DE CONSTRUCCION	
	OTROS APORTES	\$	
FECHA SUSCRIPCION	21 DE JUNIO DE 2019		
FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO	31 DE MARZO 2021		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	CARLOS CURIEL		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	SILVANA ESCORCIA GUETTE	21/06/2019	31/12/2019

"Salamina Avanza 2020-2023"

Calle 7 # 2 -13 Palacio Municipal – Salamina Magdalena
E-mail: contactenos@salamina-magdalena.gov.co
Cel. 3015442786 Código Postal 474070



República de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina
Nit. N° 891780053-9



APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
	CARLOS RAFAEL CURIEL CORREA	01/12/2020	31/12/2020
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 42319		
FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA INICIAL	326-47-99400004320	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCION DEL CONVENIO	29 de Noviembre de 2019		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	ACTA MODIFICATORIA N° 01	FECHA: 03/08/2020	
	PRIMERA PRORROGA	FECHA: 30/06/2020	
	SEGUNDA PRORROGA	FECHA: DD/MM/AAAA	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSION 01	FECHA: DD/MM/AAAA	
	AMPLIACION SUSPENSION	FECHA: DD/MM/AAAA	
	REINICIO	FECHA: DD/MM/AAAA	
POLIZA SEGÚN ACTUACION (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$46.605.000		
VALOR DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$27.963.000		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			
VALOR DE OBRA	\$932.100.000		
VALOR INTERVENTORIA	\$69.232.000		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	\$		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO


- **Convenio interadministrativo** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)

“Salamina Avanza 2020-2023”

Calle 7 # 2 -13 Palacio Municipal – Salamina Magdalena

E-mail: contactenos@salamina-magdalena.gov.co

Cel. 3015442786 Código Postal 474070



República de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina
Nit. N° 891780053-9




CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJ E DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. PREVIA SUSCRIPCION DEL CONVENIO. 2. EXPEDICION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL. 3. EXPEDICION Y APROBACION DE GARANTIA UNICA	NO APLICA	20-08-2019	\$107.590.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	1. CERTIFICACION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO, DONDE ACREDITE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO. 2. ACTA DE INICIO DE OBRA. 3. CERTIFICACION POR PARTE DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MINISTERIO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS POR PARTE DEL MUNICIPIO.	NO APLICA	19-12-2019	\$322.770.000,00
TERCER DESEMBOLSO	1. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL 30% EJECUCION DE OBRA. 2. INFORME POR PARTE DE LA INTERVENTORIA CON REGISTRO FOTOGRAFICO. 3. ACTA PARCIAL AVALADA POR EL INTERVENTOR. 4. CERTIFICADO DE PAGO O CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA CERTIFICADORA DE RETIE Y RETILAP- 5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO DESIGNADO POR EL MINISTERIO.	30% AVANCE DE OBRA		\$215.180.000,00
CUARTO DESEMBOLSO	1. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL 60% EJECUCION DE OBRA. 2. INFORME POR PARTE DE LA INTERVENTORIA CON REGISTRO FOTOGRAFICO. 3. ACTA PARCIAL AVALADA POR EL INTERVENTOR.	60% DE AVANCE DE OBRA		\$215.180.000,00

"Salamina Avanza 2020-2023"

Calle 7 # 2 -13 Palacio Municipal – Salamina Magdalena

E-mail: contactenos@salamina-magdalena.gov.co

Cel. 3015442786 Código Postal 474070



República de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina
Nit. N° 891780053-9



	4. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO DESIGNADO POR EL MINISTERIO.			
QUINTO DESEMBOLSO	1. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL 60% EJECUCION DE OBRA. 2. INFORME POR PARTE DE LA INTERVENTORIA CON REGISTRO FOTOGRAFICO. 3. ACTA FINAL AVALADA POR EL INTERVENTOR. 4. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO DESIGNADO POR EL MINISTERIO	100% DE EJECUCION DE LA OBRA		\$215,180.000,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$ 430,360.000,00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				\$ 0,00

3. POLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
No. 42319	Cumplimiento	\$215.180.000,00	27/07/2020	30/04/2021
	Calidad de servicio	\$215.180.000,00	27/07/2020	30/04/2021

4. INFORMACION CONTRATACION DERIVADA

➤ *Contrato de Ejecución de Estudios y diseños*


DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. 180	EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$46.605.000,00

"Salamina Avanza 2020-2023"

Calle 7 # 2 -13 Palacio Municipal – Salamina Magdalena

E-mail: contactenos@salamina-magdalena.gov.co

Cel. 3015442786 Código Postal 474070



República de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina
Nit. N° 891780053-9



	DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA -CIC DEL MUNICIPIO DE SALAMINA.		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)			
Nombre contratista	CARLOS ARBERTO AMELLA CONTRERAS C.C. # 72.244.421		
Fecha de Acta de inicio del contrato	03-10-2019		
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSION	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del Contrato	18-10-2019		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$46.605.000,00
COMPañIA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
POLIZA N°	320-47-994000018952		
FECHA DE LA POLIZA	08/10/2019		

➤ **Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y diseños**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
N°181	EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO PARA REALIZAR LA" INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE UN CEMNTRO DE INTEGRACION	\$27.963.000,00

"Salamina Avanza 2020-2023"

Calle 7 # 2 -13 Palacio Municipal – Salamina Magdalena

E-mail: contactenos@salamina-magdalena.gov.co

Cel. 3015442786 Código Postal 474070



República de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina
Nit. N° 891780053-9




	CIUDADANA-CIC, MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA.		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	LORENS VILLANUEVA MARTINEZ C.C. 1.085.228.495		
Fecha de Acta de inicio del contrato	3-10-2019		
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSION	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del Contrato	18-10-2019		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$27.963.000,00
COMPANÍA ASEGURADORA	COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
POLIZA N°	Póliza Única de cumplimiento N° BQ-100024163		
FECHA DE LA POLIZA	08/10/2019		

➤ Contrato de Ejecución de obra

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
N°MS-LP-002-2019 MS-215-2019	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA	\$932.100.000,00
	DD/MM/AAAA	\$ 0,00

“Salamina Avanza 2020-2023”

Calle 7 # 2 -13 Palacio Municipal – Salamina Magdalena
E-mail: contactenos@salamina-magdalena.gov.co
Cel. 3015442786 Código Postal 474070



República de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina
Nit. N° 891780053-9



Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 REP. LUIS ALBERTO QUIROZ CC. 1.082.243.763		
Fecha de Acta de inicio del contrato	29-11-2019		
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA	31/10/2020	
	SUSPENSION	19/03/2020	
	REINICIO	16/06/2020	
	OTRO SI	29/06/2020	
	OTRO SI	2/11/2020	
Fecha de terminación del Contrato	30-03-2021		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ \$1.325.900.000,00
COMPañÍA ASEGURADORA	EQUIDAD SEGUROS		
POLIZA N°	Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual N° AA014011 expedidas por la compañía LA EQUIDAD SEGUROS O.C.		
FECHA DE LA POLIZA	17-09-2020		

➤ **Contrato de Ejecución de Interventoría de obra**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
N° 216	EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR LA INTERVENTORIA	\$69.232.000,00

“Salamina Avanza 2020-2023”

Calle 7 # 2 -13 Palacio Municipal – Salamina Magdalena
E-mail: contactenos@salamina-magdalena.gov.co
Cel. 3015442786 Código Postal 474070



República de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina
Nit. N° 891780053-9



	TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA-MAGDALENA		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		\$ 0.00
	DD/MM/AAAA		\$ 0.00
Nombre contratista	INVERSIONES DISEÑO E INGENIERIA – INDISING S.A.S. NIT: 900.543.271-4 REP. KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ C.C 7.141.674		
Fecha de Acta de inicio del contrato	29-11-2019		
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSION	19/03/2020	
	REINICIO	16/06/2020	
Fecha de terminación del Contrato	30-03-2021		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$69.232.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA		EQUIDAD SEGUROS	

“Salamina Avanza 2020-2023”

Calle 7 # 2 -13 Palacio Municipal – Salamina Magdalena

E-mail: contactenos@salamina-magdalena.gov.co

Cel. 3015442786 Código Postal 474070



República de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina
Nit. N° 891780053-9



POLIZA N°	Póliza Única de cumplimiento N° AA014012 expedidas por la compañía LA EQUIDAD SEGUROS O.C
FECHA DE LA POLIZA	17-09-2020

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

FECHA DEL ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	30/11/2020	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	SEMANA # 40	
INFORME FINANCIERO		
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		
OTROS		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:						PORCENTAJE (%)						
% REPROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA						70.00%						
% EJECUTADO DE OBRA						30,7%						
% AVANCE DE OBRA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
	0,35%	10,65%	0,00%	0,00%	0,00%	7,87%	5,84%	5,4%	1,90%	2,29%	1,20%	30,7%

INFORME: # 12

AVANCE: 30,7%

AVANCE TOTAL: 70.00%(REPROGRAMADO 70.00%)

ESTADO: EL CONTRATISTA SIGUE CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CONTRATADAS, APLICANDO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. EN EL PRESENTE MES EL CONTRATISTA REALIZA EL LEVANTAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL.

INFORME DE ACTIVIDADES

EL CONTRATISTA EN EL PRESENTE MES SUMINISTRA A LA OBRA LA ESTRUCTURA METALICA, INCLUYENDO COLUMNAS, CERCHAS Y CELOSIA. SE CONTINUA LA FUNDIDA DE LA VIGA DE CIMENTACION EN EL CUAL SE INSTALARON FLEJES DE 3/8" Y VARILLAS LONGITUDINALES DE 1/2" CORRUGADAS PARA EL MURO PERIMETRAL Y COMIENZA CON EL LAS COLUMNAS DE CONFINAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL CON TUBOS METALICOS. SE CONTINUA CON EL LEVANTAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL. SE INSTALAN LA TUBERIA

"Salamina Avanza 2020-2023"

Calle 7 # 2 -13 Palacio Municipal – Salamina Magdalena

E-mail: contactenos@salamina-magdalena.gov.co

Cel. 3015442786 Código Postal 474070



República de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina
Nit. N° 891780053-9



PARA LAS REDES ELECTICA. EN LOS BAÑOS SE INSTALAN LAS REDES HIDROSANITARIAS. EL CONTRATISTA SUMINISTRA MALLAS ELECTROSOLDADAS 20X20 PANEL DE 6MX2,35 M DE 4 mm PARA LAS PLACAS Y RAMPAS. SE HA APLICANDO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD TALES COMO USO DE TAPABOCAS, TOMA DE TEMPERATURA, DESINFECCION DE BOTAS, LAVADO DE MANOS CADA 3 HORAS, DISTANCIAMIENTO SOCIAL AL REALIZAR ACTIVIDADES. DURANTE ESTE PERIODO SE LEGALIZO LA ADICION SOLICITADA POR EL CONTRATISTA Y APROBADA Y VERIFICADAS POR LA INTERVENTORIA CON LAS CANTIDADES PROPUESTA POR LA MISMA, ESTA ADICION SE REALIZO CON RECURSOS MIN INTERIOR.

NOTA:

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)


1/12/2020	3/12/2020 A.M	3/12/2020 P.M	4/12/2020 A.M	4/12/2020 P.M	5/12/2020
7/12/2020	10/12/2020	12/12/2020	16/12/2020	19/12/2020	21/12/2020
23/12/2020	26/12/2020 A-M	26/12/2020 P.M	27/12/2020	28/12/2020	30/12/2020

“Salamina Avanza 2020-2023”

Calle 7 # 2 -13 Palacio Municipal – Salamina Magdalena

E-mail: contactenos@salamina-magdalena.gov.co



Cel. 3015442786 Código Postal 474070



República de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina
Nit. N° 891780053-9



8. REGISTRO FOTOGRAFICO

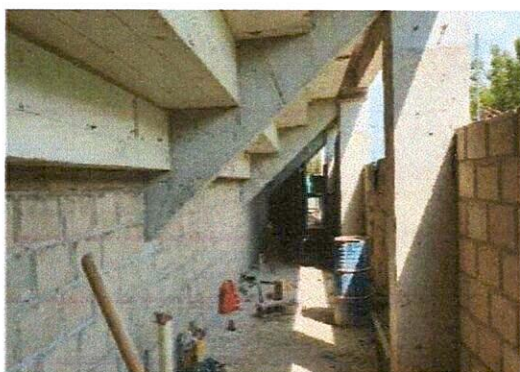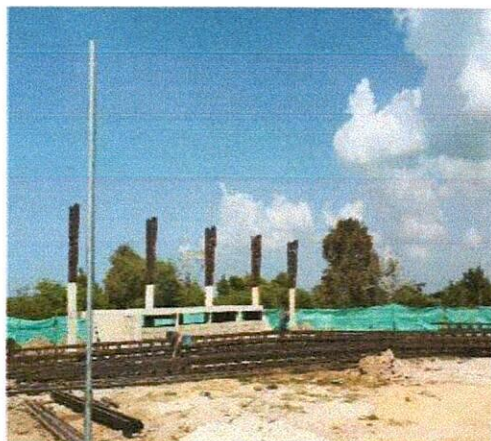

“Salamina Avanza 2020-2023”

Calle 7 # 2 -13 Palacio Municipal – Salamina Magdalena

E-mail: contactenos@salamina-magdalena.gov.co

Cel. 3015442786 Código Postal 474070



República de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina
Nit. N° 891780053-9



9. SUPERVISOR MUNICIPIO

SE LE HACE LLAMADO DE ATENCION AL CONTRATISTA SOBRE EL AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA CONTRATADA. EN OBRA SIGUE FALTANDO MATERIALES PARA QUE EL PERSONAL PUEDA AVANZAR SIGNIFICATIVAMENTE Y SE PUEDA AUMENTAR EL AVANCE DE LA OBRA EN EJECUCION. EN ESTE MES DE DICIEMBRE LA ACTIVIDAD SIGUE SIENDO NO REPRESENTATIVA.

“Salamina Avanza 2020-2023”

Calle 7 # 2 -13 Palacio Municipal – Salamina Magdalena

E-mail: contactenos@salamina-magdalena.gov.co

Cel. 3015442786 Código Postal 474070
