

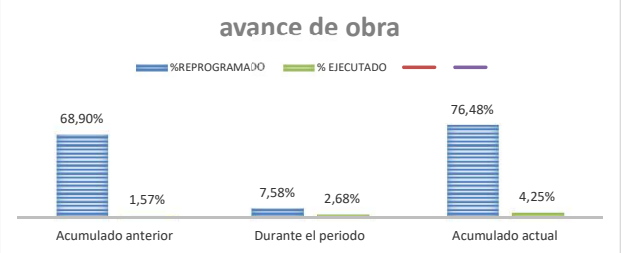
	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		16/02/2020

CONTRATO DE OBRA		
Contratista:	MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8	Objeto
	CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-002-2019	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"
Contrato No.	002-2019	
Valor Inicial:	\$ 932.100.000,00	
Valor Actualizado:	\$ 932.100.000,00	
Plazo Inicial:	4 MESES	
Plazo Actualizado:		
Fecha de Iniciación:	29/11/2019	
Fecha de Vencimiento:	30/03/2020	
Semana Número:	10	Del: 9/02/2020 Al 16/02/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 8 días
Nombre del Supervisor	Secretario de Planeacion, Carlos Curiel	

AVANCE DE LA OBRA					
OBRA PROGRAMADA SEMANAL			OBRA EJECUTADA SEMANAL		
Obra programada (%)		ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)		ACUMULADO
	7,58%	76,48%		2,68%	4,25%
Valor de la Obra	\$ 932.100.000,00	0,00%	Valor de la Obra	\$ 932.100.000,00	


GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO				REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL	
	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	 	
Acumulado anterior	68,90%	1,57%	-72%		
Durante el periodo	7,58%	2,68%			
Acumulado actual	76,48%	4,25%			

avance de obra





Estructuras en concreto

Para la decima semana se empenzo con el emparrillado para la estructura de cimentacion de zapatas, de diferentes diametros, vigas de amarres y se esta emparrillado los diferentes castillos para las columnas de 0.40*,70 y pedestales.

	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		16/02/2020

CONTRATO DE OBRA		
Contratista:	MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-002-2019	Objeto "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"
Contrato No.	002-2019	
Valor Inicial:	\$ 932.100.000,00	
Valor Actualizado:	\$ 932.100.000,00	
Plazo Inicial:	4 MESES	
Plazo Actualizado:		
Fecha de Iniciación:	29/11/2019	
Fecha de Vencimiento:	30/03/2020	
Semana Número:	10 Del: 9/02/2020 Al 16/02/2020	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 8 días
Nombre del Supervisor	Secretario de Planeación, Carlos Curiel	

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	<p>ALCALDE MUNICIPAL  NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena</p> <p>INTERVENTOR Nombre KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ CC 7.142.674 de Santa Marta</p> <p>SUPERVISOR MUNICIPAL  Nombre: Carlos Curiel Correa C.C.: 84.079.279</p>
