
	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		24/02/2020

CONTRATO DE OBRA		
Contratista:	MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-002-2019	Objeto "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"
Contrato No.	002-2019	
Valor Inicial:	\$ 932.100.000,00	
Valor Actualizado:	\$ 932.100.000,00	
Plazo Inicial:	4 MESES	
Plazo Actualizado:		
Fecha de Iniciación:	29/11/2019	
Fecha de Vencimiento:	30/03/2020	
Semana Número: 11 Del: 17/02/2020 Al 24/02/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 8 días Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel		


AVANCE DE LA OBRA					
OBRA PROGRAMADA SEMANAL			OBRA EJECUTADA SEMANAL		
Obra programada (%)		ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)		ACUMULADO
6,79%		83,27%	3,72%		7,97%
Valor de la Obra	\$ 932.100.000,00	0,00%	Valor de la Obra	\$ 932.100.000,00	

	%REPROGRAMA	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	76,48%	4,25%	-75%
Durante el periodo	6,79%	3,72%	
Acumulado actual	83,27%	7,97%	

avance de obra

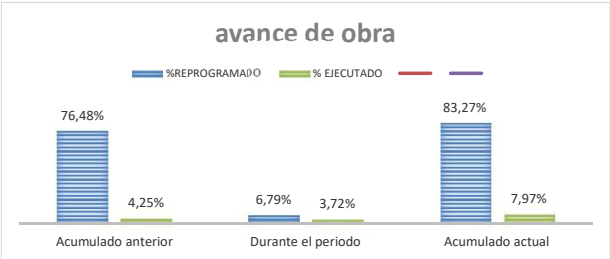

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



(FRENTE 1 CERRAMIENTO) Excavaciones y Rellenos
Estructuras en concreto
(FRENTE 2 GRADERÍAS) Excavaciones y Rellenos
Para la semana doce se continua con emparrillado para la cimentacion de zapatas, de diferentes diametros y vigas de amarres, se continua construyendo los diferentes castillos para las columnas de 0.40*,70 y pedestales.

	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		24/02/2020

CONTRATO DE OBRA	
Contratista:	MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-
Contrato No.	002-2019
Valor Inicial:	\$ 932.100.000,00
Valor Actualizado:	\$ 932.100.000,00
Plazo Inicial:	4 MESES
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	29/11/2019
Fecha de Vencimiento:	30/03/2020
Objeto "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"	
Semana Número: 11 Del: 17/02/2020 Al 24/02/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 8 días	
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel	

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	ALCALDE MUNICIPAL NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena
	INTERVENTOR Nombre KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ CC 7.142.674 de Santa Marta
	SUPERVISOR MUNICIPAL Nombre: Carlos Curiel Correa C.C.: 84.079.279
