	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		8/02/2020

CONTRATO DE OBRA		
Contratista:	MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8	Objeto "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"
Contrato No.	CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-002-2019	
Valor Inicial:	\$ 932.100.000,00	
Valor Actualizado:	\$ 932.100.000,00	
Plazo Inicial:	4 MESES	
Plazo Actualizado:		
Fecha de Iniciación:	29/11/2019	
Fecha de Vencimiento:	30/03/2020	
Semana Número:	9 Del: 1/02/2020 Al 8/02/2020	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 8 días
Nombre del Supervisor	Secretario de Planeacion, Carlos Curiel	

AVANCE DE LA OBRA					
OBRA PROGRAMADA SEMANAL			OBRA EJECUTADA SEMANAL		
		ACUMULADO			ACUMULADO
Obra programada (%)		6,75%	Obra Física Ejecutada (%)		0,04%
Valor de la Obra		\$ 932.100.000,00	Valor de la Obra		\$ 932.100.000,00
		68,90%			1,57%

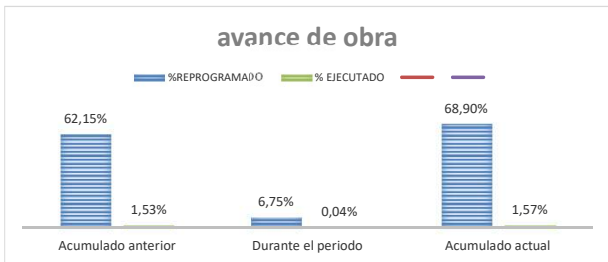
GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	62,15%	1,53%	-67%
Durante el periodo	6,75%	0,04%	
Acumulado actual	68,90%	1,57%	

avance de obra


Periodo	% REPROGRAMADO	% EJECUTADO
Acumulado anterior	62,15%	1,53%
Durante el periodo	6,75%	0,04%
Acumulado actual	68,90%	1,57%

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL






Estructuras en concreto

Por parte de la empresa contratista se ha realizado las difentes excavaciones tanto para Zapatas y vigas de cimentación de la zona de gradería, se procedio a la fundicion del solado, que es un concreto de 2000 PSI de espesor de 10 cm. La empresa contratista cuenta con el Acero de refuerzo de 60000 PSI (420 Mpa) Corrugado, comprado, para las estructuras de zapatas, vigas de cimentacion, pedestal y columnas.

	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		8/02/2020

CONTRATO DE OBRA	
Contratista:	MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS- LP-002-2019
Contrato No.	
Valor Inicial:	\$ 932.100.000,00
Valor Actualizado:	\$ 932.100.000,00
Plazo Inicial:	4 MESES
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	29/11/2019
Fecha de Vencimiento:	30/03/2020
Objeto "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"	
Semana Número: 9 Del: 1/02/2020 Al 8/02/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 8 días	
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel	

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	<p>ALCALDE MUNICIPAL  NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena</p> <p>INTERVENTOR  Nombre KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ CC 7.142.674 de Santa Marta</p> <p>SUPERVISOR MUNICIPAL  Nombre: Carlos Curiel Correa C.C.: 84.079.279</p>
