

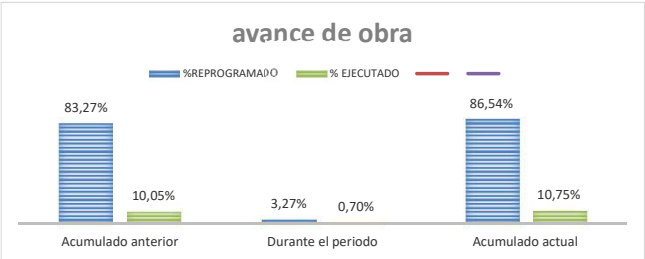
	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		11/03/2020

CONTRATO DE OBRA	
Contratista:	MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-002-2019
Objeto	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"
Contrato No.	002-2019
Valor Inicial:	\$ 932.100.000,00
Valor Actualizado:	\$ 932.100.000,00
Plazo Inicial:	4 MESES
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	29/11/2019
Fecha de Vencimiento:	30/03/2020
Semana Número:	13 Del: 4/03/2020 Al 11/03/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 8 días
Nombre del Supervisor	Secretario de Planeacion, Carlos Curiel


AVANCE DE LA OBRA					
OBRA PROGRAMADA SEMANAL			OBRA EJECUTADA SEMANAL		
ACUMULADO			ACUMULADO		
Obra programada (%)	3,27%	86,54%	Obra Física Ejecutada (%)	0,70%	10,75%
Valor de la Obra	\$ 932.100.000,00	18,00%	Valor de la Obra	\$ 932.100.000,00	

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO				REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL	
	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO			
Acumulado anterior	83,27%	10,05%	-76%		
Durante el periodo	3,27%	0,70%			
Acumulado actual	86,54%	10,75%			




avance de obra



(FRENTE 1 CERRAMIENTO) Excavaciones y Rellenos
Estructuras en concreto
(FRENTE 2 GRADERÍAS) Excavaciones y Rellenos
El Contratista empieza a presentar dificultades a causa de la presencia del virus COVID- 19 que afecta la poblacion mundial, se presentan represamientos para el transporte terrestre de los materiales.

	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		11/03/2020

CONTRATO DE OBRA		
Contratista:	MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-002-2019	Objeto "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"
Contrato No.	002-2019	
Valor Inicial:	\$ 932.100.000,00	
Valor Actualizado:	\$ 932.100.000,00	
Plazo Inicial:	4 MESES	
Plazo Actualizado:		
Fecha de Iniciación:	29/11/2019	
Fecha de Vencimiento:	30/03/2020	
Semana Número:	13 Del: 4/03/2020 Al 11/03/2020	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 8 días
Nombre del Supervisor	Secretario de Planeacion, Carlos Curiel	

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	<p>ALCALDE MUNICIPAL  NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena</p> <p>INTERVENTOR  Nombre KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ CC 7.142.674 de Santa Marta</p> <p>SUPERVISOR MUNICIPAL  Nombre: Carlos Curiel Correa C.C.: 84.079.279</p>
