



 MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		30/08/2020


CONTRATO DE OBRA	
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Contrato No. 002-2019 Valor Inicial: \$ 932.100.000,00 Valor Actualizado: \$ 932.100.000,00 Plazo Inicial: 4 MESES Plazo Actualizado: 4,5 MESES ADICIONALES Fecha de Iniciación: 29/11/2019 Fecha de Vencimiento: 30/03/2020	Objeto: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA Fecha Suspension No1: 19/03/2020 Fecha Reinicio No1: 16/06/2020 Fecha Terminacion Final: 31/10/2020 Semana Número: 24 Del: 24/08/2020 Al 30/08/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato _____ días Nombre del Supervisor: Secretario de Planeacion, Carlos Curiel

AVANCE DE LA OBRA					
OBRA PROGRAMADA SEMANAL			OBRA EJECUTADA SEMANAL		
		ACUMULADO			ACUMULADO
Obra programada (%)	2,69%	43,24%	Obra Física Ejecutada (%)	1,35%	30,11%
Valor de la Obra	\$ 25.073.490,00	\$ 403.040.040,00	Valor de la Obra	\$ 12.583.350,00	\$ 280.655.310,00

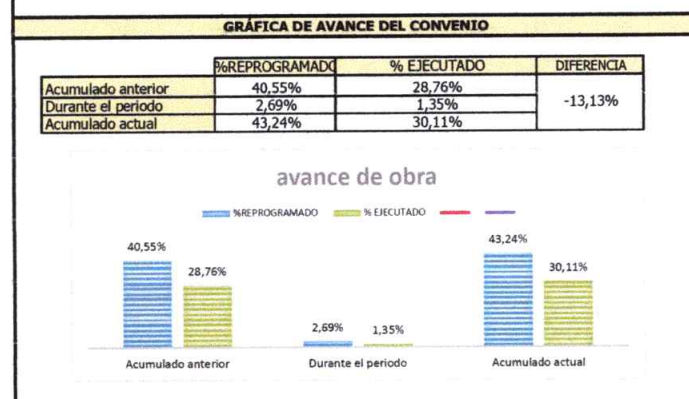

ESTRUCTURA METALICA
La produccion de la estructura metalica continua en el taller de fabricacion, se muestran ya secciones medias construidas.
VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3500 PSI
Se continua con el amarrado del acero de refuerzo para estas vigas
GRADERIAS EN CONCRETO DE 3500 PSI
Se inicia armado de fondo de graderias con la formaleteria al igual que el amarre del acero de refuerzo para el fondo de grada.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	ALCALDE MUNICIPAL  NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena
	INTERVENTOR  Nombre: KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ CC: 7.142.674 de Santa Marta
	SUPERVISOR MUNICIPAL  Nombre: Carlos Curiel Correa C.C.: 84.079.279


	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		23/08/2020




CONTRATO DE OBRA			
Contratista:	MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-002-2019		Objeto "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"
Contrato No.	002-2019		
Valor Inicial:	\$	932.100.000,00	
Valor Actualizado:	\$	932.100.000,00	
Plazo Inicial:	4 MESES		
Plazo Actualizado:	4,5 MESES ADICIONALES		
Fecha de Iniciación:	29/11/2019		Fecha Suspension No1: 19/03/2020
Fecha de Vencimiento:	30/03/2020		Fecha Reinicio No1: 16/06/2020
			Fecha Terminación Final: 31/10/2020
Semana Número:	23	Del: 17/08/2020 Al: 23/08/2020	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: _____ días
Nombre del Supervisor	Secretario de Planeación, Carlos Curiel		


AVANCE DE LA OBRA			
	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	ACUMULADO	
Obra programada (%)	3,46%	40,55%	
Valor de la Obra	\$ 32.250.660,00	\$ 377.966.550,00	
	OBRA EJECUTADA SEMANAL	ACUMULADO	
Obra Física Ejecutada (%)	1,25%	28,76%	
Valor de la Obra	\$ 11.651.250,00	\$ 268.071.960,00	

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO			
	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	37,09%	27,51%	-11,79%
Durante el periodo	3,46%	1,25%	
Acumulado actual	40,55%	28,76%	

avance de obra





ESTRUCTURA METALICA	
La produccion de la estructura metalica continua en el taller de fabricacion.	
VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3500 PSI	
Se continua con el amarrado del acero de refuerzo para estas vigas	
GRADERIAS EN CONCRETO DE 3500 PSI	
Se completan el vaciado de las vigas inclinadas principales de las graderias con concreto de 3500 PSI	
OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	<p>ALCALDE MUNICIPAL  NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco C.C.: 85.478.687, de Salamina - Magdalena</p> <p>INTERVENTOR  Nombre: KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ CC: 7.142.674 de Santa Marta</p> <p>SUPERVISOR MUNICIPAL  Nombre: Carlos Curiel Correa C.C.: 84.079.279</p>


 MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		16/08/2020




CONTRATO DE OBRA			
Contratista:	MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-		
Contrato No.	002-2019		
Valor Inicial:	\$	932.100.000,00	Objeto
Valor Actualizado:	\$	932.100.000,00	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"
Plazo Inicial:	4 MESES		
Plazo Actualizado:	4,5 MESES ADICIONALES		
Fecha de Iniciación:	29/11/2019		
Fecha de Vencimiento:	30/03/2020		
Semana Número:		22	Del: 10/08/2020 Al: 16/08/2020
Nombre del Supervisor		Secretario de Planeacion, Carlos Curiel	
		Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato _____ días	


AVANCE DE LA OBRA					
OBRA PROGRAMADA SEMANAL		ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL		ACUMULADO
Obra programada (%)	2,85%	37,09%	Obra Física Ejecutada (%)	1,45%	27,51%
Valor de la Obra	\$ 26.564.850,00	\$ 345.715.890,00	Valor de la Obra	\$ 13.515.450,00	\$ 256.420.710,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO				REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL	
	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA		
Acumulado anterior	34,24%	26,06%	-9,58%		
Durante el periodo	2,85%	1,45%			
Acumulado actual	37,09%	27,51%			

avance de obra



ESTRUCTURA METALICA	
Presenta buen ritmo la produccion de la estructura metalica, los elementos interiores de las cerchas principales se encuentran cortados, avanza la fabricacion	
VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3500 PSI	
Se continua con el amarrado del acero de refuerzo para estas vigas	
GRADERIAS EN CONCRETO DE 3500 PSI	
Se desencofran las vigas principales que cumplen 8 dias de encofrado vaciadas la semana pasada, se continua con el armado de las vigas principales de las graderias con concreto de 3500 PSI	
OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	<p>ALCALDE MUNICIPAL  NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena</p> <p>INTERVENTOR  Nombre: KIRLEEND JOSEPH COTES PEREZ CC: 7.142.674 de Santa Marta</p> <p>SUPERVISOR MUNICIPAL  Nombre: Carlos Curiel Correa C.C.: 84.079.279</p>

 MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		03/08/2020




CONTRATO DE OBRA	
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 CONTRATO DE OBRAS PÚBLICA N° MS-LP-002-2019	Objeto: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA
Contrato No.: 002-2019 Valor Inicial: \$ 932.100.000,00 Valor Actualizado: \$ 932.100.000,00 Plazo Inicial: 4 MESES Plazo Actualizado: 4,5 MESES ADICIONALES Fecha de Iniciación: 29/11/2019 Fecha de Vencimiento: 30/03/2020	Fecha Suspension No1: 19/03/2020 Fecha Reinicio No1: 16/06/2020 Fecha Terminacion Final: 31/10/2020
Semana Número: 21 Del: 30/07/2020 Al: 03/08/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: _____ días Nombre del Supervisor: Secretario de Planeacion, Carlos Curiel	


AVANCE DE LA OBRA			
OBRA PROGRAMADA SEMANAL		ACUMULADO	
Obra programada (%)	2,85%		34,24%
Valor de la Obra	\$ 26.564.850,00		\$ 319.151.040,00
OBRA EJECUTADA SEMANAL		ACUMULADO	
Obra Física Ejecutada (%)	1,35%		26,06%
Valor de la Obra	\$ 12.583.350,00		\$ 242.905.260,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO			
	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	31,39%	24,71%	-8,18%
Durante el periodo	2,85%	1,35%	
Acumulado actual	34,24%	26,06%	



ESTRUCTURA METALICA
Se continua la produccion de la estructura metalica, el contratista concentra trabajos de fabricacion en la ciudad de Barranquilla
VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3500 PSI
Se inicia el amarrado del acero de refuerzo para estas vigas
GRADERIAS EN CONCRETO DE 3500 PSI
Se continua con el vaciado de las vigas principales de las graderias con concreto de 3500 PSI

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	ALCALDE MUNICIPAL  NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena
	INTERVENTOR  Nombre: KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ CC: 7.142.674 de Santa Marta
	SUPERVISOR MUNICIPAL  Nombre: Carlos Curiel Correa C.C.: 84.079.279

 MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		29/07/2020




CONTRATO DE OBRA			
Contratista:	MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8		
	CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-		
Contrato No.	002-2019	Objeto	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA,
Valor Inicial:	\$ 932.100.000,00		MAGDALENA
Valor Actualizado:	\$ 932.100.000,00		
Plazo Inicial:	4 MESES		
Plazo Actualizado:	4,5 MESES ADICIONALES	Fecha Suspension No1:	19/03/2020
Fecha de Iniciación:	29/11/2019	Fecha Reinicio No1:	16/06/2020
Fecha de Vencimiento:	30/03/2020	Fecha Terminacion Final:	31/10/2020
Semana Número:	20	Del:	21/07/2020 Al 29/07/2020
Nombre del Supervisor	Secretario de Planeacion, Carlos Curiel		


AVANCE DE LA OBRA					
OBRA PROGRAMADA SEMANAL		ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL		ACUMULADO
Obra programada (%)	4,85%	31,39%	Obra Física Ejecutada (%)	1,64%	24,71%
Valor de la Obra	\$ 45.206.850,00	\$ 292.586.190,00	Valor de la Obra	\$ 15.286.440,00	\$ 230.321.910,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO			
	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	23,96%	21,47%	-5,70%
Durante el periodo	4,85%	1,64%	
Acumulado actual	28,81%	23,11%	



ESTRUCTURA METALICA
Se continua con los trabajos de construccion de la estrucutra metalica para cubierta, el punto de fabricacion es en la ciudad de Barranquilla.
LOSA MACIZA E=10 CMTS DE 3500 PSI
Se desencofra la losa y el acabado es aceptable, se realiza curado por ocho dias continuos
GRADERIAS EN CONCRETO DE 3500 PSI
Se realiza vaciado de de vigas principales de las graderias con concreto de 3500 PSI

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	<p>ALCALDE MUNICIPAL  NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena</p> <p>INTERVENTOR  Nombre: KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ CC: 7.142.674 de Santa Marta</p> <p>SUPERVISOR MUNICIPAL  Nombre: Carlos Curiel Correa C.C.: 64.079.279</p>

 MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		20/07/2020


CONTRATO DE OBRA	
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Contrato No. 002-2019 Valor Inicial: \$ 932.100.000,00 Valor Actualizado: \$ 932.100.000,00 Plazo Inicial: 4 MESES Plazo Actualizado: 4,5 MESES ADICIONALES Fecha de Iniciación: 29/11/2019 Fecha de Vencimiento: 30/03/2020	Objeto: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA Fecha Suspension No1: 19/03/2020 Fecha Reinicio No1: 16/06/2020 Fecha Terminacion Final: 31/10/2020 Semana Número: 19 Del: 13/07/2020 Al: 20/07/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato _____ días Nombre del Supervisor: Secretario de Planeacion, Carlos Curiel

AVANCE DE LA OBRA			
OBRA PROGRAMADA SEMANAL		OBRA EJECUTADA SEMANAL	
Obra programada (%)	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	ACUMULADO
2,58%	26,54%	1,60%	23,07%
Valor de la Obra \$ 24.048.180,00	\$ 247.379.340,00	Valor de la Obra \$ 14.913.600,00	\$ 215.035.470,00


GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	23,96%	21,47%	-3,47%
Durante el periodo	2,58%	1,60%	
Acumulado actual	26,54%	23,07%	




avance de obra




REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL




ESTRUCTURA METALICA
Se continúa con los trabajos de construcción de la estructura metálica para cubierta, el punto de fabricación es en la ciudad de Barranquilla.
LOSA MACIZA E=10 CMTS DE 3500 PSI
Se refuerza la parte inferior de la losa maciza con paralelos de madera, se inicia la instalación de las guarderas perimetrales.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	<p>ALCALDE MUNICIPAL  NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena</p> <p>INTERVENTOR  Nombre: KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ CC: 7.142.674 de Santa Marta</p> <p>SUPERVISOR MUNICIPAL  Nombre: Carlos Curiel Correa C.C.: 84.079.279</p>

 MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		12/07/2020

CONTRATO DE OBRA			
Contratista:	MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8		
Objeto	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA		
Contrato No.	002-2019		
Valor Inicial:	\$	932.100.000,00	
Valor Actualizado:	\$	932.100.000,00	
Plazo Inicial:	4 MESES		
Plazo Actualizado:	4,5 MESES ADICIONALES		
Fecha de Inicio:	29/11/2019		
Fecha de Vencimiento:	30/03/2020		
Fecha Suspension No1:	19/03/2020		
Fecha Reinicio No1:	16/06/2020		
Fecha Terminacion Final:	31/10/2020		
Semana Número:	18	Del:	6/07/2020 Al 12/07/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato _____ días
Nombre del Supervisor	Secretario de Planeacion, Carlos Curiel		

AVANCE DE LA OBRA			
OBRA PROGRAMADA SEMANAL		ACUMULADO	
Obra programada (%)	2,58%		23,96%
Valor de la Obra	\$ 24.048.180,00	\$	223.331.160,00
OBRA EJECUTADA SEMANAL		ACUMULADO	
Obra Física Ejecutada (%)	1,45%		21,47%
Valor de la Obra	\$ 13.515.450,00	\$	200.121.870,00



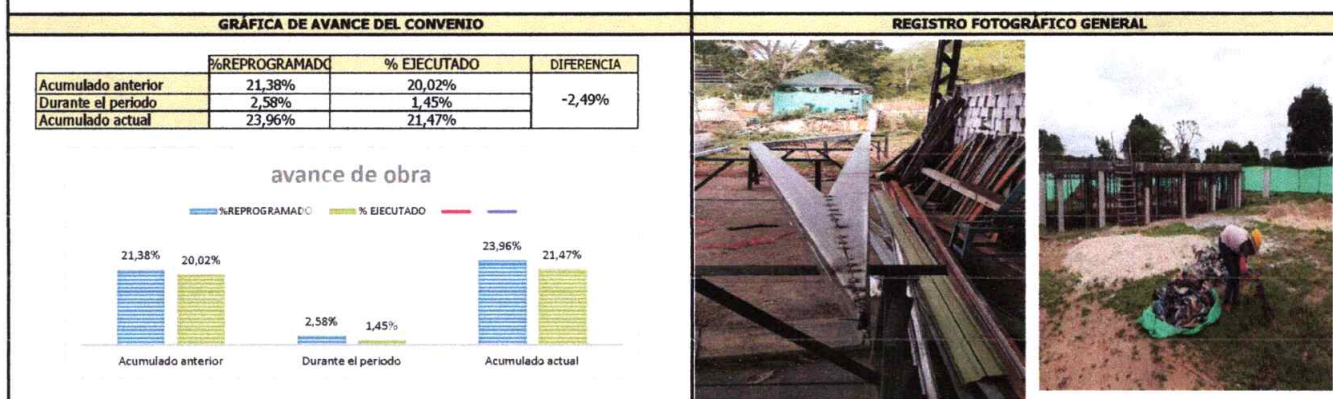



ESTRUCTURA METALICA

Se continúa con los trabajos de construcción de la estructura metálica para cubierta, el punto de fabricación es en la ciudad de Barranquilla.

LOSA MACIZA E=10 CMTS DE 3500 PSI



Se Continúa la construcción de la losa Maciza, el armado de la formaletería esta reforzado con gatos y madera, se utiliza para el fondo el mismo material utilizado para columnas, el armado del acero de refuerzo.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	<p>ALCALDE MUNICIPAL  NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena</p> <p>INTERVENTOR  Nombre: KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ CC: 7.142.674 de Santa Marta</p> <p>SUPERVISOR MUNICIPAL  Nombre: Carlos Curiel Correa C.C.: 84.079.279</p>




 MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		5/07/2020


CONTRATO DE OBRA			
Contratista:	MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8		
	CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS N° MS-LP-		
Contrato No.	002-2019	Objeto	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA,
Valor Inicial:	\$ 932.100.000,00		MAGDALENA
Valor Actualizado:	\$ 932.100.000,00		
Plazo Inicial:	4 MESES		
Plazo Actualizado:	4,5 MESES ADICIONALES	Fecha Suspension No1:	19/03/2020
Fecha de Iniciación:	29/11/2019	Fecha Reinicio No1:	16/06/2020
Fecha de Vencimiento:	30/03/2020	Fecha Terminacion Final:	31/10/2020
Semana Número:	17	Del:	29/06/2020 Al 5/07/2020
Nombre del Supervisor	Secretario de Planeacion, Carlos Curiel		

AVANCE DE LA OBRA					
Obra programada (%)	OBRA PROGRAMADA		Obra Física Ejecutada (%)	OBRA EJECUTADA	
	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
	2,58%	21,38%		1,15%	20,02%
Valor de la Obra	\$ 24.048.180,00	\$ 199.282.980,00	Valor de la Obra	\$ 10.719.150,00	\$ 186.606.420,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO				REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL	
	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA		
Acumulado anterior	18,80%	18,87%	-1,36%		
Durante el periodo	2,58%	1,15%			
Acumulado actual	21,38%	20,02%			
<p>avance de obra</p> 					

ESTRUCTURA METALICA
Se continua con los trabajos de construccion de la estrucutra metalica para cubierta, el punto de fabricacion es en la ciudad de Barranquilla.
LOSA MACIZA E=10 CMTS DE 3500 PSI
Se inicia la construccion de la losa, con el armado de la formaleteria y armado del acero de refuerzo

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	<p>ALCALDE MUNICIPAL  NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena</p> <p>INTERVENTOR  Nombre: KIREND JOSEPH COTES PEREZ CC: 7.142.674 de Santa Marta</p> <p>SUPERVISOR MUNICIPAL  Nombre: Carlos Curiel Correa C.C.: 84.079.279</p>

	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		28/06/2020


CONTRATO DE OBRA			
Contratista:	MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8		
Contrato No.	CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-002-2019		
Valor Inicial:	\$	932.100.000,00	Objeto
Valor Actualizado:	\$	932.100.000,00	MAGDALENA
Plazo Inicial:	4 MESES		
Plazo Actualizado:	4,5 MESES ADICIONALES		
Fecha de Iniciación:	29/11/2019	Fecha Suspension No1:	19/03/2020
Fecha de Vencimiento:	30/03/2020	Fecha Reinicio No1:	16/06/2020
		Fecha Terminación Final:	31/10/2020
Semana Número:	16	Del:	22/06/2020 Al 28/06/2020
Nombre del Supervisor	Secretario de Planeación, Carlos Curiel		

AVANCE DE LA OBRA			
OBRA PROGRAMADA SEMANAL		OBRA EJECUTADA SEMANAL	
Obra programada (%)	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	ACUMULADO
3,87%	18,80%	2,01%	18,87%
Valor de la Obra	\$ 36.072.270,00	Valor de la Obra	\$ 18.735.210,00


GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO




	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	14,92%	16,86%	0,07%
Durante el periodo	3,87%	2,01%	
Acumulado actual	18,80%	18,87%	


avance de obra



REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL



ESTRUCTURA METALICA	
Se inicia trabajos de construcción de la estructura metálica para cubierta, el punto de fabricación es en la ciudad de Barranquilla.	
CONCRETO PARA COLUMNAS DE 4000 PSI	
Se realiza el curado a las columnas desde el día de su desencofre, presentan buen acabado, textura y color el concreto.	
OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	<p>ALCALDE MUNICIPAL  NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena</p> <p>INTERVENTOR  Nombre: KIRLEEND JOSEPH COTES PEREZ CC: 7.142.674 de Santa Marta</p> <p>SUPERVISOR MUNICIPAL  Nombre: Carlos Curiel Correa C.C.: 84.079.279</p>

	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		21/06/2020

CONTRATO DE OBRA			
Contratista:	MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8		
Objeto:	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA		
Contrato No.	002-2019		
Valor Inicial:	\$	932.100.000,00	
Valor Actualizado:	\$	932.100.000,00	
Plazo Inicial:	4 MESES		
Plazo Actualizado:	4,5 MESES ADICIONALES		
Fecha de Inicial:	29/11/2019		
Fecha de Vencimiento:	30/03/2020		
Fecha Suspension No1:	19/03/2020		
Fecha Relinico No1:	16/06/2020		
Fecha Terminacion Final:	31/10/2020		
Semana Número:	15	Del:	16/06/2020
Nombre del Supervisor	Secretario de Planeacion, Carlos Curiel		

AVANCE DE LA OBRA			
OBRA PROGRAMADA SEMANAL		ACUMULADO	
Obra programada (%)	3,87%		14,92%
Valor de la Obra	\$ 36.072.270,00	\$	139.069.320,00
OBRA EJECUTADA SEMANAL		ACUMULADO	
Obra Física Ejecutada (%)	5,81%		16,86%
Valor de la Obra	\$ 54.155.010,00	\$	157.152.060,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO			
	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	11,05%	11,05%	2%
Durante el periodo	3,87%	5,81%	
Acumulado actual	14,92%	16,86%	







ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS

Se continua y finaliza la actividad de amarre de columnas del area de grtaderias y del area de tarimas, preparandose para el armado en formate para acabado a la vista, esta aprueba el material que empleara el contratista para formatear las columnas y garantizar un acabado a las vista aceptable.

CONCRETO PARA COLUMNAS DE 4000 PSI



Se procede al vaciado de las columnas con concreto de 4000 PSI garantizando vibrado para contrarrestar las porosidades, se golpean levemente en la base con un martillo de caucho para evitar el hormigueo al pie de las columnas.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	<p>ALCALDE MUNICIPAL  NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena</p> <p>INTERVENTOR  Nombre: KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ CC: 7.142.674 de Santa Marta</p> <p>SUPERVISOR MUNICIPAL  Nombre: Carlos Curiel Correa C.C.: 84.079.279</p>


	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		19/03/2020

CONTRATO DE OBRA	
Contratista:	MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8
Objeto:	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"
Contrato No.	CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-002-2019
Valor Inicial:	\$ 932.100.000,00
Valor Actualizado:	\$ 932.100.000,00
Plazo Inicial:	4 MESES
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	29/11/2019
Fecha de Vencimiento:	30/03/2020
Semana Número:	14 Del: 12/03/2020 Al: 19/03/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 8 días
Nombre del Supervisor:	Secretario de Planeacion, Carlos Curiel




AVANCE DE LA OBRA					
OBRA PROGRAMADA SEMANAL		ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL		ACUMULADO
Obra programada (%)	3,27%	86,54%	Obra Física Ejecutada (%)	0,30%	11,05%
Valor de la Obra	\$ 932.100.000,00		Valor de la Obra	\$ 932.100.000,00	

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO				REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL	
	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA		
Acumulado anterior	83,27%	10,75%	-75%		
Durante el periodo	3,27%	0,30%			
Acumulado actual	86,54%	11,05%			
<p>avance de obra</p> 					

(FRENTE 1 CERRAMIENTO) Excavaciones y Rellenos
Estructuras en concreto
(FRENTE 2 GRADERÍAS) Excavaciones y Rellenos
El Contratista presenta dificultades para el avance de la obra, no ha llegado la formaleta para fundir las columnas por dificultades para el transporte terrestre, algunos materiales electricos tampoco han podido llegar al Municipio de Salamina debido a restricciones, se planea suspender la obra debido a la propagacion del COVID-19 en el Departamento del Magdalena y segun recomendaciones del gobierno nacional.

 MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		19/03/2020

CONTRATO DE OBRA	
Contratista:	MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-IP-
Contrato No.	002-2019
Valor Inicial:	\$ 932.100.000,00
Valor Actualizado:	\$ 932.100.000,00
Plazo Inicial:	4 MESES
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	29/11/2019
Fecha de Vencimiento:	30/03/2020
Objeto: "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"	
Semana Número:	14 Del: 12/03/2020 Al 19/03/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 8 días
Nombre del Supervisor	Secretario de Planeacion, Carlos Curiel

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	<p> ALCALDE MUNICIPAL  NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco C.C.: 85.478.687, de Salamina - Magdalena </p> <p> INTERVENTOR  Nombre: KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ CC: 7.142.674 de Santa Maria </p> <p> SUPERVISOR MUNICIPAL  Nombre: Carlos Curiel Correa C.C.: 84.079.279 </p>
