	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		23/01/2020

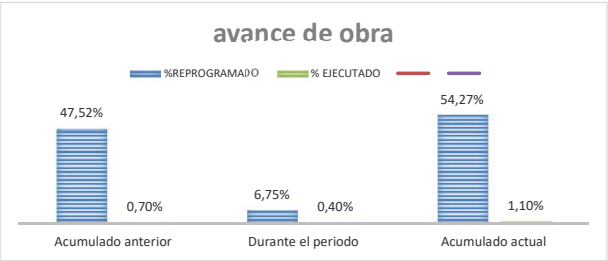
CONTRATO DE OBRA			
Contratista:	MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8		Objeto
	CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS- LP-002-2019		"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"
Contrato No.			
Valor Inicial:	\$	932.100.000,00	
Valor Actualizado:	\$	932.100.000,00	
Plazo Inicial:	4 MESES		
Plazo Actualizado:			
Fecha de Iniciación:	29/11/2019		
Fecha de Vencimiento:	30/03/2020		
Semana Número: 7 Del: 16/01/2020 Al 23/01/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 8 días			
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel			

AVANCE DE LA OBRA					
OBRA PROGRAMADA SEMANAL			OBRA EJECUTADA SEMANAL		
Obra programada (%)		ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)		ACUMULADO
6,75%		54,27%	0,40%		1,10%
Valor de la Obra		\$ 932.100.000,00	Valor de la Obra		\$ 932.100.000,00



GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	47,52%	0,70%	-53%
Durante el periodo	6,75%	0,40%	
Acumulado actual	54,27%	1,10%	


avance de obra






REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

(FRENTE 1 CERRAMIENTO) Excavaciones y Rellenos
<p>EXCAVACIONES VARIAS: una vez acondicionado el lote empezaron hacer las diferentes excavaciones tanto para Zapatas como para la zona administrativa y la gradería, contrapesos, vigas de cimentación, etc, donde se utilizaron palas, picos, maquinaria pesada, para esto se tuvo en cuenta los ejes descritos en la localización y replanteo para su correcta ubicación.</p>
(FRENTE 2 GRADERIAS) Excavaciones y Rellenos
<p>Se realizo Excavaciones tanto para Zapatas y vigas de cimentaciónde de la zona de gradería.</p>

 MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		23/01/2020

CONTRATO DE OBRA	
Contratista:	MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS- LP-002-2019
Contrato No.	
Valor Inicial:	\$ 932.100.000,00
Valor Actualizado:	\$ 932.100.000,00
Plazo Inicial:	4 MESES
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	29/11/2019
Fecha de Vencimiento:	30/03/2020
Objeto "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"	
Semana Número: 7 Del: 16/01/2020 Al 23/01/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 8 días	
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel	

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	<p>ALCALDE MUNICIPAL  NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena</p> <p>INTERVENTOR  Nombre KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ CC 7.142.674 de Santa Marta</p> <p>SUPERVISOR MUNICIPAL  Nombre: Carlos Curiel Correa C.C.: 84.079.279</p>
