	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		3/03/2020

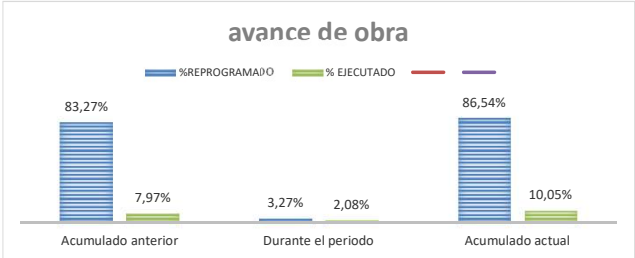
CONTRATO DE OBRA		
<b>Contratista:</b>	MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8	Objeto
	CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-002-2019	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"
Contrato No.		
Valor Inicial:	\$ 932.100.000,00	
Valor Actualizado:	\$ 932.100.000,00	
Plazo Inicial:	4 MESES	
Plazo Actualizado:		
Fecha de Iniciación:	29/11/2019	
Fecha de Vencimiento:	30/03/2020	
Semana Número:	12	Del: 25/02/2020 Al 3/03/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 8 días
Nombre del Supervisor	Secretario de Planeacion, Carlos Curiel	

AVANCE DE LA OBRA					
OBRA PROGRAMADA SEMANAL			OBRA EJECUTADA SEMANAL		
Obra programada (%)		ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)		ACUMULADO
	3,27%	86,54%		2,08%	10,05%
Valor de la Obra	\$ 932.100.000,00	18,00%	Valor de la Obra	\$ 932.100.000,00	



GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	83,27%	7,97%	
Durante el periodo	3,27%	2,08%	-76%
Acumulado actual	86,54%	10,05%	


avance de obra






REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

(FRENTE 1 CERRAMIENTO) Excavaciones y Rellenos
Estructuras en concreto
(FRENTE 2 GRADERÍAS ) Excavaciones y Rellenos
Para la semana doce se continua con emparrillado para la cimentacion de zapatas, de diferentes diametros y vigas de amarres, se continua construyendo los diferentes castillos para las columnas de 0.40*,70 y pedestales, a mediado de la semana se iniciara a fundir las estructuras, como zapata, vigas de amarres y columnas.

 <b>MININTERIOR</b>	Formato	Dirección de Infraestructura
	<b>FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC</b>	FECHA
		3/03/2020

CONTRATO DE OBRA		
<b>Contratista:</b>	MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP- 002-2019	Objeto "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"
Contrato No.	002-2019	
Valor Inicial:	\$ 932.100.000,00	
Valor Actualizado:	\$ 932.100.000,00	
Plazo Inicial:	4 MESES	
Plazo Actualizado:		
Fecha de Iniciación:	29/11/2019	
Fecha de Vencimiento:	30/03/2020	
Semana Número:	12 Del: 25/02/2020 Al 3/03/2020	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 8 días
Nombre del Supervisor	Secretario de Planeacion, Carlos Curiel	

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	<p><b>ALCALDE MUNICIPAL</b>  NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena</p> <p><b>INTERVENTOR</b>  Nombre KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ CC 7.142.674 de Santa Marta</p> <p><b>SUPERVISOR MUNICIPAL</b>  Nombre: Carlos Curiel Correa C.C.: 84.079.279</p>
