

SADE 2022 11 6182

Santiago de Cali, 14 de octubre de 2022

Señor
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Dirección:
Calle 22 Norte No. 6AN-24
Oficina 1003
Edificio Santa Mónica Centra
Ciudad



ASUNTO: Reprogramación citación para comparecer a Audiencia Pública prevista por el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, Para debatir sobre el Posible incumplimiento y eventual aplicación de las multas del Contrato de Obra No1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021 suscrito entre CONSORCIO VIAS DEL VALLE. Nit. 901-545.310-6 y LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA.

El Secretario de Infraestructura de la Gobernación del Valle del Cauca, con nombramiento por medio de Decreto Departamental No 1-3-0001 del 01 de enero de 2020 y posesionado mediante acta de posesión No 2010 de fecha 01 de enero de 2020 y en virtud de la facultad legal conferida por el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, actuando en calidad de ordenador del gasto y en ejercicio de la supervisión del Contrato mencionado, me dirijo a usted para citarlo a audiencia pública prevista por el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011¹, por el

¹ **Artículo 86. Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento.** Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento:

a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera;

b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad;

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax:
Sitio WEB: www.valledelcauca.gov.co e-mail: infraestructura@valledelcauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia

presunto incumplimiento del Contrato de Obra No1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021.

Por lo anterior y con el fin de garantizar sus derechos consagrados en la Constitución Política; a la defensa y contradicción, tal y como lo establece el literal a) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, a continuación, ponemos de presente:

I. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

El Departamento del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Infraestructura, mediante Resolución No. 1.310.02-59.8-0356 del 02 de septiembre de 2021 ordenó la apertura de la licitación Pública No. LP-SIV-002-2019 con el fin de contratar el MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
(ANEXO I)

Que mediante Resolución No.1.310.02-59.8-0849 del 29 de noviembre de 2021 la Entidad adjudicó el Contrato al CONSORCIO VIAS DEL VALLE.
(ANEXO II)

En virtud de lo anterior el 23 de diciembre 2021 la GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA suscribió con el contratista CONSORCIO VÍAS DEL VALLE, identificado con el Nit 901545310-6, cuyo Representante Legal Jhon Jairo Conde Carrera, identificado con cédula de ciudadanía No 79.384752 de Bogotá, el Contrato de Obra pública No 1.310.02-59.8-0581 cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

(ANEXO III)

c) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia;

d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia.

La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.

Que el Alcance al Objeto del referido contrato estuvo consagrado en la Cláusula 3 así "(...) *El contratista deberá desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No LP-SIV-002-2019 los cuales son parte integral del contrato 1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021(...)*"

Que el anexo técnico contenido en la LP-SIV-002-2019 en la parte: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO indico que: El proyecto Mejoramiento a Nivel de Subrasante en las Vías para la Paz de Cuatro Municipios del Departamento del Valle del Cauca, pretende mejorar la transitabilidad de las vías terciarias que a continuación se describen:

a. Localización Florida

La vía Florida - El cruce - Rivera - Granate es una vía de tercer orden de competencia municipal que comunica el municipio de Florida con el corregimiento de Granate el tramo a intervenir tiene una longitud de 5,78 Km.

b. Localización Pradera

La vía Pradera - Lomitas - El Recreo - San Isidro es una vía de tercer orden de competencia municipal que comunica el municipio de Pradera con el corregimiento de San Isidro el tramo a intervenir tiene una longitud de 4,16 Km.

c. Localización Roldanillo - El Dovio

La vía Roldanillo - El Dovio es una vía de tercer orden de competencia municipal que comunica los municipios de Roldanillo y el Dovio con los corregimientos Cajamarca - San Isidro - La Esperanza, el tramo a intervenir tiene una longitud de 6,121 km.

(ANEXO IV)

Que el contrato en mención conto con un plazo inicial de seis (06) meses y un valor de (\$ 5.219.088.659) y su forma de pago se pactó así:

"(..) LA CLAUSULA 8 FORMA DE PAGO

Mediante pagos parciales de ejecución de obra, previa presentación de las actas parciales por parte del contratista, debidamente aprobadas por la interventoría del contrato según el caso, y el cumplimiento de los requisitos de la entidad contratante para el pago respectivo.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

La fecha de inicio del contrato fue el 11 de febrero de 2022.

A continuación, se relacionan las actas suscritas en torno al Contrato de Obra No 1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021 que se indicaron en el informe de la firma Supervisora:

1. (...) *Mediante Acta de Suspensión No. 1. del 01 de junio de 2022 se suspendió el contrato de obra pública No. 1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021, desde el primero (01) de junio de 2022, hasta el treinta (30) de julio de 2022.*
2. *Mediante Acta de Prórroga de la Suspensión No. 1 del 31 de julio de 2022, se dio prórroga al Contrato de obra pública No. 1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021 desde el treinta y uno (31) de julio, hasta el treinta (30) de agosto de 2022.*
3. *Como consecuencia de la prórroga de la suspensión de la vigencia del contrato de obra pública No. 1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021, el plazo de este será hasta el día 10 de noviembre de 2022*
4. *De otro lado, el Contrato de Interventoría tiene una duración de nueve (9) meses contados a partir del acta de inicio, o sea 11 de febrero de 2022.*
5. *Mediante Acta de Suspensión No. 1. del 01 de junio de 2022 se suspendió el contrato de interventoría No. 1.310.02-59.1-0582 del 29 de diciembre de 2021, desde el primero (01) de junio de 2022, hasta el treinta (30) de julio de 2022.*
6. *Mediante Acta de Prórroga de la Suspensión No. 1 del 31 de julio de 2022, se prorrogó el Contrato de obra pública No. 1.310.02-59.1-0582 del 29 de diciembre de 2021 desde el treinta y uno (31) de julio, hasta el treinta (30) de agosto de 2022.*
7. *Como consecuencia de la prórroga de la suspensión de la vigencia del contrato de interventoría No. 1.310.02-59.1-0582 del 29 de diciembre de 2021, el plazo de este será hasta el día 10 de febrero de 2023*
8. *Con corte 08 de septiembre de 2022, el plazo que resta al Contrato de obra es de 64 días y el plazo que queda para las labores de Interventoría es de 156 días. (...)"*

(ANEXO V)

El contrato se encuentra amparado por las Pólizas No. CBC-100033048 expedidas en la fecha 28 de diciembre del año 2021 y CBC-100004725 expedidas en la fecha 29 de diciembre del año 2021 por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASIGNADA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	23/12/2021	23/ 10/2022	\$ 1.565.726.597,70
CUMPLIMIENTO	23/12/2021	23/10/2022	\$ 521.908.865,90
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/12/2021	23/06/2025	\$ 260.954.432,95
ESTABILIDAD DE LA OBRA	23/12/2021	23/06/2027	\$ 1.565.726.587,70
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	23/12/2021	23/06/2022	\$ 454.263.000,00

Las referidas pólizas cuentan con la siguiente extensión o ampliación de garantía:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASIGNADA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	11/02/2022	12/ 12/2022	\$ 1.565.726.597,70
CUMPLIMIENTO	11/02/2022	12/12/2022	\$ 521.908.865,90
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	11/02/2022	12/08/2025	\$ 260.954.432,95
ESTABILIDAD DE LA OBRA	11/02/2022	12/08/2027	\$ 1.565.726.587,70
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	11/02/2022	12/08/2022	\$ 500.000.000,00

II. HECHOS CONSTITUTIVOS DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.

La interventoría del contrato de obra No 1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021, es la firma Martínez & Manrique Arquitectura e Ingeniería S.A. cuyo objeto es realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídica para el mejoramiento a nivel de subrasante en las vías para la paz de cuatro municipios del departamento del Valle del Cauca. Quienes en la fecha 16 de septiembre por medio de oficio VR4-079A-2022, informaron a la Secretaría de Infraestructura, sobre un presunto incumplimiento así:

" (...) En nuestra condición de interventoría del contrato de obra pública 1.310.02-59.8-0581 suscrito el 28 de diciembre de 2021 entre La Gobernación del Valle a través de la Secretaría de Infraestructura y el Consorcio Vías del Valle, de conformidad contrato de interventoría No. 1.310.02-59.1-0852, suscrito el 29 de diciembre de 2021 se ha evidenciado diferentes actuaciones que configuran posibles incumplimientos parciales del contrato de obra pública y dan lugar a imposiciones de sanciones pecuniarias con fines de apremio. Para ello, y en virtud de la exigencia del artículo 86 de la ley 1474 de 2011, se radica el presente informe de interventoría para que se dé inicio al trámite de incumplimiento contractual.

El objeto del contrato de Martínez & Manrique Arquitectura e Ingeniería S.A.S es realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídica para el mejoramiento a nivel de subrasante en las vías para la paz de cuatro municipios del

departamento del Valle del Cauca. Como tal, una de las obligaciones a la cual está sujeta es velar por que el Contratista de Obra cumpla con los compromisos contractuales adquiridos al haber suscrito el contrato No. 1.310.02-59.8-0581.

Es preciso que esta Interventoría se manifieste en cuanto al estado del proyecto del asunto. Para tal fin es muy importante recordar que las actuaciones de la Interventoría se pueden dar mediante oficios, actas de comité, informes semanales, informes mensuales y todos aquellos documentos que hacen parte de nuestra función cumpliendo las obligaciones que nos atañen mediante el contrato en referencia. Es así como en forma regular mediante oficios y en actas de comité se han originado los avances de ejecución, evidenciando así la situación para cada uno de los frentes objeto de este contrato.

Con base a lo anterior, esta Interventoría por medio de diferentes comunicaciones escritas le ha solicitado al Consorcio Vías del Valle la documentación pertinente como son balances, programación de obra, información contractual, inicio de actividades, informes técnicos, justificación por cese de actividades, aprobación de planes de manejo del tráfico, soporte de la inversión del anticipo, etcétera, pero no se ha obtenido respuesta formal, oficial u oportuna.

A continuación, se relacionan los oficios enviados al contratista:

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
VR4-003-2022	Enero 25 de 2022	Lista de Chequeo Actividades para Ejecución del Contrato No. 0581 de 2021
VR4-009-2022	Febrero 25 de 2022	Solicitud de Información Contrato No. 1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021: Acta de Reunión de Seguimiento del 25 de enero de 2022
VR4-012-2022	Febrero 25 de 2022	Solicitud de Información Contrato No. 1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021: Oficio VR4-003-2022
VR4-014-2022	Marzo 10 de 2022	Solicitud de Caracterización de los suelos en cada uno de los tramos y memoria de cálculo de la dosificación para los estabilizantes a utilizar.
VR4-015-2022	Marzo 14 de 2022	Oficio CVV-010-2022, Remisión de Hojas de Vida y Pagos de Seguridad Social del mes de febrero de 2022.
		Oficio CVV-008-2022, Respuesta a su Comunicado VR4-009-2022 – Remisión Información Solicitada y VR4-012-2022: Solicitud de memoria de cálculo de los sondeos y pruebas técnicas que realicen en campo.
		Solicitud de realizar pista de prueba de al menos 500 metros.
		Realizar tramo experimental de 500 metros para las actividades de Tratamiento Superficial Doble con Emulsión CRR-2 Tipo I y Sello de Arena – Asfalto con Emulsión CRR-2.
		Presentación de los ensayos de laboratorio que se realicen para verificar y controlar la estabilidad y demás que sean requeridos para dar alcance al objeto del Contrato No. 1.310.02-59.8-0581.
		Forma de controlar dosificación en campo de los diferentes compuestos que lleva la fórmula del Polímero SlicondPox, dado que según el documento "DOSIFICACIÓN" enfatiza que el producto llega a obra terminado.
VR4-016-2022	Marzo 14 de 2022	Oficio CVV-008-2022, Respuesta a su comunicado VR4-009-2022 – Remisión Información Solicitada y VR4-012-2022, Falta de información relacionada en el oficio CVV-008-2022.
VR4-017-2022	Marzo 14 de 2022	Solicitud de presentar diseño de mezcla para ejecución de dicha actividad en campo.
VR4-018-2022	Marzo 14 de 2022	Entrega de documentos aprobados para primer pago del anticipo.
VR4-019-2022	Marzo 15 de 2022	Oficio CVV-011-2022. Concepto favorable y aprobación al Cronograma de Obra entregado por el Contratista mediante oficio del asunto.

VR4-021-2022	Marzo 24 de 2022	Rendimientos generados fiducia e informe de gestión sobre el manejo del anticipo.
VR4-023-2022	Marzo 24 de 2022	Observaciones al CVV-PL-01 PLAN DE GERENCIA Y CALIDAD.
CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
VR4-024-2022	Marzo 28 de 2022	Observaciones al PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD PARA ORIENTAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN TENDIENTES A CONTENER A LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA POR COVID 19 EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
VR4-029-2022	Abril 04 de 2022	Solicitud de Información SST. Oficio VR4-003-2022
VR4-030-2022	Abril 04 de 2022	Oficio CVV-014-2022 Respuesta a su comunicación VR4-014-2022 Envío de Hojas de Vida faltante, de su personal profesional.
VR4-031-2022	Abril 04 de 2022	Control de correspondencia.
VR4-034-2022	Abril 07 de 2022	Oficio CVV-017-2022 solicitud de diseño de concreto, para actividad de CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15
VR4-035-2022	Abril 11 de 2022	Revisión al presupuesto entregado mediante Correo electrónico del 31 de marzo de 2022. Presupuesto Obras Adicionales.
VR4-036-2022	Abril 11 de 2022	Observaciones al documento entregado mediante Oficio CVV-016-2022 PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD.
VR4-037-2022	Abril 19 de 2022	Información Requerida, Pendiente de Entrega. Oficios: VR4-012-2022, VR4-015-2022, VR4-016-2022, VR4-023-2022, VR4-030-2022, VR4-034-2022, VR4-035-2022, VR4-036-2022.
VR4-041-2022	Abril 29 de 2022	Solicitud de Entrega de Información Pendiente SST: Oficio VR4-003-2022, VR4-029-2022 y VR4-037-2022
VR4-042-2022	Mayo 02 de 2022	Solicitud de actas de Vecindad Municipio de Florida.
VR4-043-2022	Mayo 04 de 2022	Oficio CVV-008-2022 Respuesta a su comunicado VR4-009-2022 Respuesta a su comunicado VR4-009-2022 – Remisión de Información Solicitada y VR4-012 (PLAN DE MANEJO DE TRAFICO MUNICIPIO DE FLORIDA – PMT) : Se Solicita hacer entrega del PMT del municipio de florida respectivamente aprobado por el Municipio.
VR4-046-2022	Mayo 11 de 2022	Oficio CVV-019-2022 Observaciones al PAGA tramo Florida.
VR4-047-2022	Mayo 11 de 2022	Oficio CVV-021-2022 Informe de Cumplimiento Ambiental No. 1. Entrega de documento sin previa aprobación del PAGA.
VR4-048-2022	Mayo 12 de 2022	Requerimiento de documentación proyecto VR4: Oficios VR4-003-2022, VR4-009-2022, VR4-014-2022, VR4-016-2022, VR4-017-2022, VR4-023-2022, VR4-029-2022, VR4-030-2022, VR4-034-2022, VR4-035-2022, VR4-036-2022, VR4-037-2022, VR4-041-2022, VR4-042-2022, VR4-043-2022, VR4-046-2022 (Protocolo General de Bioseguridad, Información relacionada con SST, Complemento de la información relacionada con las hojas de vida de su personal profesional, diseño de la mezcla de concreto de 3000psi, revisión presupuesto obras adicionales, actas de vecindad, plan de manejo de tráfico del Municipio de Florida y de los demás municipios a trabajar, Plan de Gestión Ambiental del Municipio de Florida y de los demás municipios a trabajar.)
VR4-050-2022	Mayo 13 de 2022	Respuesta Oficio CVV-020-2022 / VR4-015-2022/ DOSIFICACIÓN DEFINITIVA SILCONDPOX DEL TRAMO FLORIDA.
CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
VR4-052-2022	Mayo 12 de 2022	Ejecución de Actividades de obra, Inicio de actividad "SUMINISTRO ESTABILIZACIÓN DE SUELOS – TIPO GEOPOLÍMERO CON TRANSPORTE COLOIDAL – TRATAMIENTO BIFASE, INCLUYE MEZCLA, IRRIGACIÓN Y COMPACTACIÓN PUESTO EN OBRA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO
VR4-053-2022	Mayo 14 de 2022	Respuesta Oficio CVV-027-2022 Solicitud de Modificación de Programación.
VR4-054-2022	Mayo 17 de 2022	Respuesta Oficio CVV-024-2022 / Respuesta Oficio VR4-023-2022 CVV-PL-01 PLAN DE GERENCIA Y CALIDAD. Observaciones al Anexo No. 3 Plan de Inspección y Ensayos.
VR4-055-2022	Mayo 21 de 2022	Respuesta a Oficio CVV-029-2022 y CVV-030-2022, Observaciones al Plan de Adaptación de la Guía Ambiental del Invias – PAGA y a la información relacionada con SST.
VR4-056-2022	Mayo 23 de 2022	Respuesta a Oficio CVV-027-2022 Solicitud entrega Cronograma de Obra ajustado, con su respectivo flujo de caja.
VR4-057-2022	Mayo 23 de 2022	Seguimiento Cronograma de Actividades. Inicio de actividad "SUMINISTRO ESTABILIZACIÓN DE SUELOS – TIPO GEOPOLÍMERO CON TRANSPORTE


		COLOIDAL – TRATAMIENTO BIFASE, INCLUYE MEZCLA, IRRIGACIÓN Y COMPACTACIÓN PUESTO EN OBRA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO
VR4-059-2022	Mayo 25 de 2022	AVANCE DE OBRA.
VR4-060-2022	Mayo 26 de 2022	Respuesta Oficio CVV-032-2022 Cambio de Director de Obra.
VR4-061-2022	Mayo 27 de 2022	Compromisos adquiridos Comité de Gerencia 19 de mayo de 2022
VR4-063-2022	Mayo 31 de 2022	Respuesta a Oficio CVV-029-2022, CVV-030-2022 y CVV-039-2022. Solicitud de entrega del PAGA con las observaciones presentadas al informe.
VR4-089-2022	Agosto 20 de 2022	Solicitud Soportes de la Inversión del Anticipo.
VR4-073A-2022	Septiembre 07 de 2022	Llamado a Reinicio Contrato de Obra No. 1.310.02-59.8-0581

(VER ANEXO I)

De otro lado, mediante oficio CVV-011-2022 el Consorcio Vías del Valle presentó su cronograma de obra. Dicho documento fue revisado y aprobado por esta Interventoría y remitido a la entidad Contratante mediante oficio VR4-022-2022.
(VER ANEXO II)

Dando alcance al cronograma aprobado, actualmente la obra presenta atraso.

A continuación, se presenta gráficos del avance de obra.

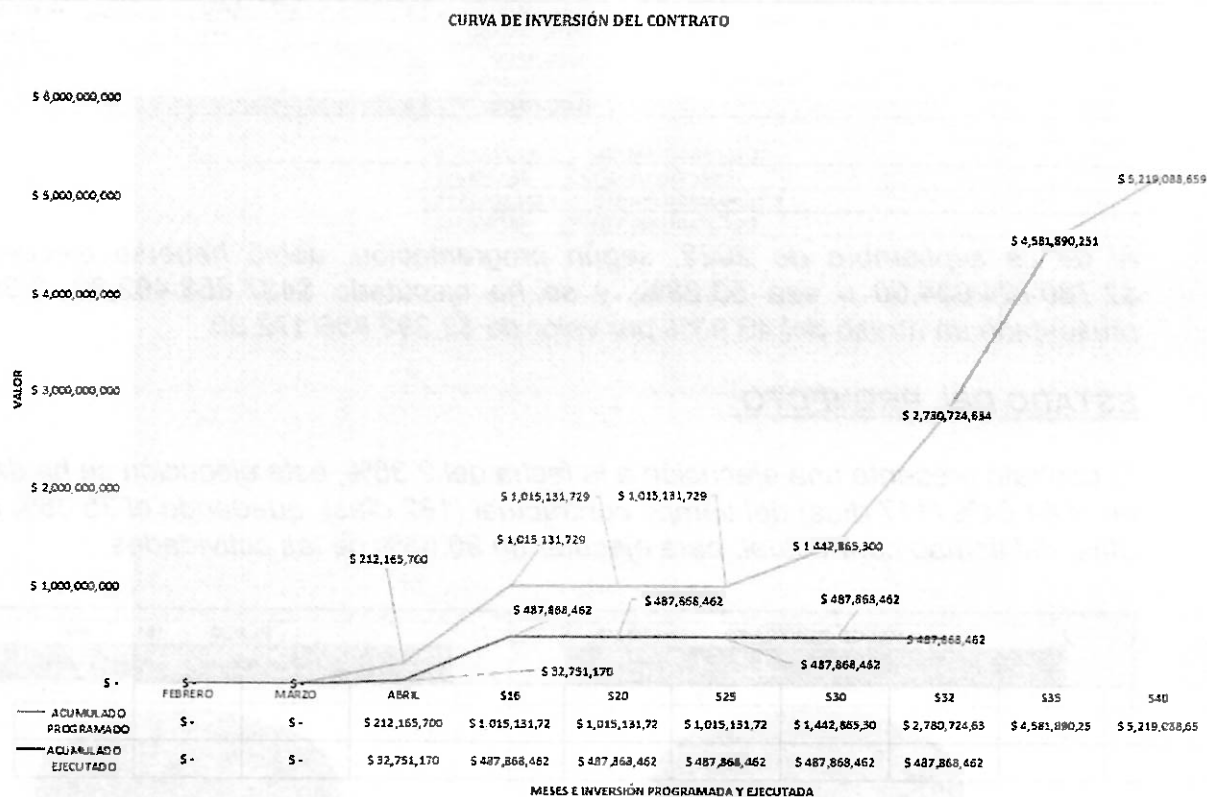

EJECUCION PRESUPUESTAL

FECHA DE CORTE:

8-sep-22

Vr. Contrato	Total		
Vr. Programado	8-sep-22	2,780,724,634	53.28%
Vr. Presup. Ejec.	8-sep-22	487,868,462	9.35%
Vr. Pago Acta	8-sep-22	-	0.00%
Vr. Anticipo	8-sep-22	1,565,726,598	30.00%
Vr. Anticipo Amortizado	8-sep-22	-	0.00%

NIT: 890399029-5


Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax:
 Sitio WEB: www.valledelcauca.gov.co e-mail: infraestructura@valledelcauca.gov.co
 Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia

Estado de avance financiero por municipio a Septiembre 08 de 2022			
		Agosto	Acumulado 08/09/2022
FLORIDA (Peratense – Libano – La Rivera – Granates – Libano – Nuevo Horizonte – Las Guacas)	PROGRAMADO	\$ 1,248,821,978	\$ 1,644,519,430
	EJECUTADO	\$ 487,868,462	\$ 487,868,462
PRADERA (Lomitas – San Isidro – Las Frias)	PROGRAMADO	\$ 183,237,849	\$ 819,503,115
	EJECUTADO	\$ -	\$ -
ROLDANILLO - EL DOVIDO (Cajamarca – San Isidro – La Esperanza)	PROGRAMADO	\$ 10,805,472	\$ 316,702,088
	EJECUTADO	\$ -	\$ -
TOTAL PROGRAMADO		\$ 2,780,724,633.6	
TOTAL EJECUTADO		\$ 487,868,462	
PROGRAMADO AGOSTO		\$ 1,442,865,299.8	
EJECUTADO AGOSTO		\$ 487,868,462	

Al 08 de septiembre de 2022, según programación, debió haberse ejecutado \$2.780'724.634,00 o sea 53.28%, y se ha ejecutado \$487.868.462,00, 9.35% presentado un atraso del 43.93% por valor de \$2.292'856.172,00


ESTADO DEL PROYECTO:

El contrato presenta una ejecución a la fecha del 9.35%, esta ejecución se ha dado en el 64.64% (117 días) del tiempo contractual (182 días), quedando el 35.36% (64 días) del tiempo contractual, para ejecutar un 90.65% de las actividades

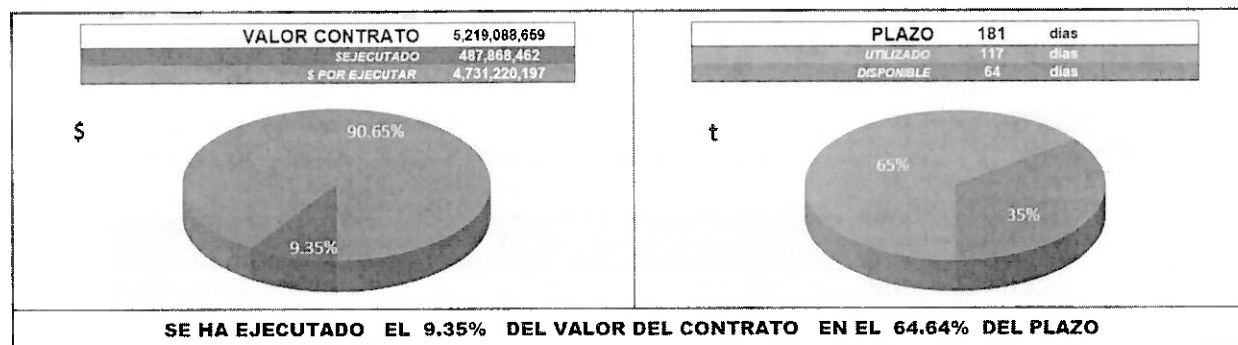

A la fecha de este informe (08 de septiembre de 2022) el Contratista de Obra – Consorcio Vías del Valle, ha adelantado actividades en campo que no han sido entregadas formalmente a esta Interventoría, no obstante, este avance no logra llevar a que el CONSORCIO VIAS DEL VALLES se nivele entre lo ejecutado y lo programado, pues según cronograma de obra entregado mediante oficio CVV-011-2022 el Consorcio Vías del Valle, teniendo presente el tiempo de suspensión y prórroga, debería de estar en un valor programado de \$2.780'724.634.00

Según el cronograma, el estado actual de cada uno de los frentes es el siguiente:
FLORIDA: Obra física ejecutada 22.73% por valor de \$ 487.868.462.00 faltando por ejecutar el 77.27% por valor de \$1.658'099.454.00, en un tiempo de 64 días (35.36%)

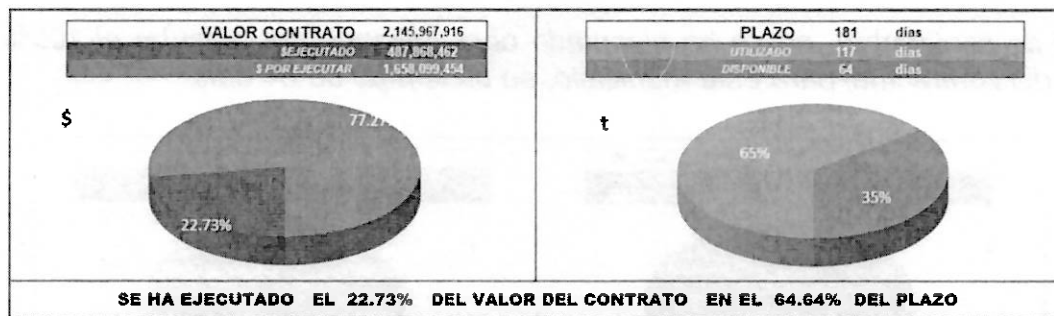

EJECUCION PRESUPUESTAL

FECHA DE CORTE: 8-sep-22

Vr. Contrato	Total	2,145,967,916	100.00%
Vr. Programado	8-sep-22	1,644,519,430	76.63%
Vr. Presup. Ejec.	8-sep-22	487,868,462	22.73%
Vr. Pago Acta	8-sep-22	-	0.00%
Vr. Anticipo	8-sep-22	643,790,375	30.00%
Vr. Anticipo Amortizado	8-sep-22	-	0.00%

A la fecha de este informe el contratista debería haber ejecutado el 76.63% del valor contractual para el municipio de Florida, pero solo ha ejecutado el 22.73%

Con relación al valor total del frente de obra se tiene lo siguiente:

ACTIVIDAD	EJECUTADO	VR TOTAL CONTRACTUAL
LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS NO URBANAS	\$ 18,727,200	\$ 18,727,200 00
EXCAVACION A MAQUINA (CAJEO) (SR)	\$ 89,006,448	\$ 89,006,448 00
RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	\$ -	\$ 32,861,256 00
RELLENO COMP MAT SELECC 10KM (ROCA MUERTA)	\$ -	\$ 30,724,113 00
SUMINISTRO E INSTALACION ESTABILIZACION DE SUELOS - TIPO GEOPOLIMERO CON TRANSPORTE COLOIDAL-TRATAMIENTO BIFASE, INCLUYE MEZCLA, IRRIGACION Y COMPACTACION PUESTO EN OBRA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO	\$ -	\$ 742,464,120 00
IMPRIMACION	\$ -	\$ 168,475,440 00
CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	\$ -	\$ 32,042,463 00
REMOCION DERRUMBES EN SITIO	\$ 692,450	\$ 1,043,639 00
EXCAVACION A MAQUINA (CAJEO) (SR)	\$ -	\$ 427,495 00
RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM	\$ 369,579,644	\$ 369,579,609 00
TRANSPORTE DE EQUIPO < = 50 KM	\$ 9,862,720	\$ 17,004,678 00
LINEA DE DEMARCAACION INCLUYE MICROESFERAS	\$ -	\$ 36,830,160 00
TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSION CRR-2 TIPO I	\$ -	\$ 325,789,700 00
TRANSPORTE DE AGREGADO PETREO	\$ -	\$ 152,002,770 00
SELLO DE ARENA - ASFALTO CON EMULSION CRR-2	\$ -	\$ 107,825,900 00
PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA	\$ -	\$ 7,871,338 00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT	\$ -	\$ 8,601,287 00
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	\$ -	\$ 4,690,300 00
SUBTOTAL	\$ 487,868,462 43	\$ 2,145,967,916 00

PRADERA: Obra física ejecutada 0.00 %,


NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax:

Sitio WEB: www.valledelcauca.gov.co e-mail: infraestructura@valledelcauca.gov.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia

Al 08 de septiembre, no se ha ejecutado obra, faltando por ejecutar el 100% del valor del contractual para este municipio, en un tiempo de 64 días

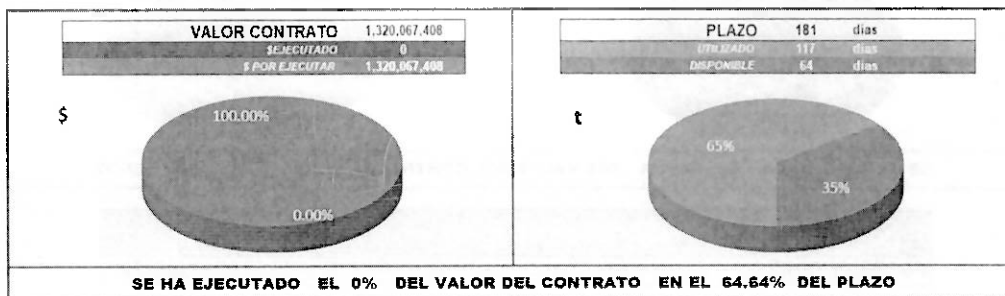

EJECUCION PRESUPUESTAL	
FECHA DE CORTE:	8-sep-22

Vr. Contrato	Total	1,320,067,408	100.00%
Vr. Programado	8-sep-22	819,503,115	62.08%
Vr. Presup. Ejec.	8-sep-22	-	0.00%
Vr. Pago Acta	8-sep-22	-	0.00%
Vr. Anticipo	8-sep-22	396,020,222	30.00%
Vr. Anticipo Amortizado	8-sep-22	-	0.00%

A la fecha de este informe el contratista debería haber ejecutado el 62.08% del valor contractual para el municipio de Pradera, pero no se ha ejecutado obra, 0%

Con relación al valor total del frente de obra se tiene lo siguiente:

ACTIVIDAD	EJECUTADO	VR TOTAL CONTRACTUAL
LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS NO URBANAS	\$ -	\$ 13,478,400.00
EXCAVACION A MAQUINA (CAJEO) (SR)	\$ -	\$ 24,814,416.00
RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	\$ -	\$ 14,641,884.00
RELLENO COMP. MAT SELECC. 10KM (ROCA MUERTA)	\$ -	\$ 22,112,857.00
SUMINISTRO E INSTALACION ESTABILIZACION DE SUELOS - TIPO GEOPOLIMERO CON TRANSPORTE COLOIDAL-TRATAMIENTO BIFASE, INCLUYE MEZCLA, IRRIGACION Y COMPACTACION PUESTO EN OBRA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO	\$ -	\$ 534,368,640.00
IMPRIMACION	\$ -	\$ 121,255,680.00
CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	\$ -	\$ 14,098,684.00
REMOCION DERRUMBES EN SITIO	\$ -	\$ 751,131.00
EXCAVACION A MAQUINA (CAJEO) (SR)	\$ -	\$ 307,678.00
RETRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM	\$ -	\$ 98,777,292.00
TRANSPORTE DE EQUIPO <= 50 KM	\$ -	\$ 12,238,661.00
LINEA DE DEMARCAACION INCLUYE MICROESFERAS	\$ -	\$ 26,507,520.00
TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSION CRR-2 TIPO I	\$ -	\$ 234,478,400.00
SELLO DE ARENA - ASFALTO CON EMULSION CRR-2	\$ -	\$ 77,604,800.00
TRANSPORTE DE AGREGADO PETREO	\$ -	\$ 109,399,918.00
PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA	\$ -	\$ 5,665,184.00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT	\$ -	\$ 6,190,545.00
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	\$ -	\$ 3,375,718.00
SUBTOTAL	\$ -	\$ 1,320,067,408.00

ROLDANILLO – EL DOVIO: Obra física ejecutada 0 %


NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax:

Sitio WEB: www.valledelcauca.gov.co e-mail: infraestructura@valledelcauca.gov.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia

Al 08 de septiembre, no se ha ejecutado obra, faltando por ejecutar el 100% del valor del contractual para este municipio, en un tiempo de 64 días

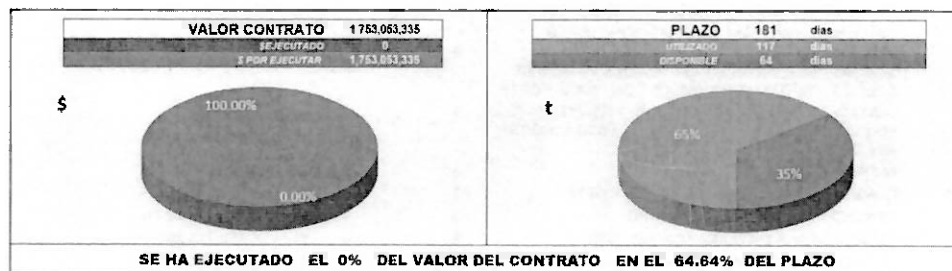

EJECUCION PRESUPUESTAL	
FECHA DE CORTE:	8-sep-22

Vr. Contrato	Total	1.753.063,335	100.00%
Vr. Programado	8-sep-22	316,702,088	18.07%
Vr. Presup. Ejec.	8-sep-22	-	0.00%
Vr. Pago Acta	8-sep-22	-	0.00%
Vr. Anticipo	8-sep-22	525,916,001	30.00%
Vr. Anticipo Amortizado	8-sep-22	-	0.00%

A la fecha de este informe el contratista debería haber ejecutado el 18.07% del valor contractual para los municipios Roldanillo – El Dovio, pero no se ha ejecutado obra, 0%

Con relación al valor total del frente de obra se tiene lo siguiente:

ACTIVIDAD	EJECUTADO	VR, TOTAL CONTRACTUAL
LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS NO URBANAS	\$ -	\$ 19,832,040 00
EXCAVACION A MAQUINA (CAJEO) (SR)	\$ -	\$ 47,168,208 00
RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	\$ -	\$ 13,842,538 00
RELLENO COMP MAT SELECC 10KM (ROCA MUERTA)	\$ -	\$ 32,536,730 00
SUMINISTRO E INSTALACION ESTABILIZACION DE SUELOS - TIPO GEOPOLIMERO CON TRANSPORTE COLOIDAL-TRATAMIENTO BIFASE INCLUYE MEZCLA IRRIGACION Y COMPACTACION PUESTO EN OBRA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO	\$ -	\$ 655,222,445 00
IMPRIMACION	\$ -	\$ 148,679,090 00
CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	\$ -	\$ 23,070,573 00
REMOCION DERRUMBES EN SITIO	\$ -	\$ 1,105,210 00
EXCAVACION A MAQUINA (CAJEO) (SR)	\$ -	\$ 452,715 00
RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM	\$ -	\$ 203,393,071 00
TRANSPORTE DE EQUIPO <= 50 KM	\$ -	\$ 18,007,895 00
LINEA DE DEMARCAACION INCLUYE MICROESFERAS	\$ -	\$ 39,003,012 00
TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSION CRR-2 TIPO I	\$ -	\$ 276,008,132 00
TRANSPORTE DE AGREGADO PETREO	\$ -	\$ 180,970,408 00
SELLO DE ARENA - ASFALTO CON EMULSION CRR-2	\$ -	\$ 91,349,804 00
PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA	\$ -	\$ 8,335,719 00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT	\$ -	\$ 9,108,733 00
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	\$ -	\$ 4,967,012 00
SUBTOTAL	\$ -	\$ 1,753,053,335 00 (...)"

CLÁUSULAS PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS O A RIESGO DE INCUMPLIRSE:

Se evidencia incumplimiento parcial o total a lo consignado en las cláusulas que a continuación relaciono:

1. CLÁUSULA 2 OBJETO El objeto del Contrato es: **MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.**

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO. El contratista, deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documento del Proceso de Contratación No. LP-SIV-002-2019, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal – en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme a lo señalado en el Formulario 10 – Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asume de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 – Riesgos y aceptados con la presentación de su propuesta.

2. **CLÁUSULA 4-PLAZO DEL CONTRATO.** El plazo de ejecución ser de seis (6) meses, contados a partir del registro presupuestal, aprobación de pólizas y suscripción del acta de inicio.

3. **CLÁUSULA 6-ANCITICPO.** La Entidad entregará un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la Gobernación del Valle del Cauca, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.

Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:

- *El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.*
- *El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.*
- *Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor.*
- *Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor*
- *La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato.*
- *En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.*
- *La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.*

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría.


4. CLÁUSULA 9- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las


obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en la propuesta del contratista, vigente durante la ejecución del control, el contratista se obliga a: 9.1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 9.2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación. 9.3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 9.5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los premissos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervención). 9.6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad. 9.12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 9.13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres: así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).

5. **CLÁUSULA 12- RESPONSABILIDAD.** El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la Cláusula 2 del presente Contrato. El Contratista es responsable por los daños que ocasionen sus contratistas o empleados, los empleados o contratistas de sus subcontratistas, a la Entidad en la ejecución del objeto del presente Contrato.


ANTICIPO

Con relación al anticipo, la entidad contratante realizó el desembolso.

 CONSORCIO DEL VALLE		MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.			
		FECHA	DD	MM	AA
			12	2	2022
DATOS GENERALES					
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.				
CONTRATISTA:	CONSORCIO VAS DEL VALLE WTC SAS				
INTERVENIENTE:	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS				
DATOS ESPECÍFICOS					
El presente es de carácter preliminar, para la ejecución de trabajos de construcción, obras de personal, para la ejecución de los trabajos, el cual se repartirá el valor del contrato, de acuerdo a la prioridad de los trabajos que se ejecuten dentro de la ruta crítica del proyecto de obra.					
VALOR CONTRATO	\$	5,219,089,659.00			
VALOR CONTRACTUAL ANTICIPO 10%	\$	521,908,965.90			
No.	ACTIVIDAD	MES 1	MES 2	VALOR TOTAL	
1	MANO DE OBRA				
ITEM 1.1	TOPOGRAFIA	\$ 26,018,820	\$ 26,018,820.00	\$ 52,037,640.00	
PRE GENERAL	PERSONAL DE OBRA	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000.00	\$ 60,000,000.00	
2	MATERIALES				
(LOS MATERIALES SE PAGAN ANTECIPUAMENTE PARA CORREGIR LOS VALORES DE ESTOS ÍTEMOS)					
ITEM 2.1	ESTABILIZANTE TIPO GEOPOLIMERICO	\$ 756,628,120	\$ -	\$ 756,628,120.00	
ITEM 2.2	Emulsion asfáltica CR-1	\$ 106,339,916	\$ -	\$ 106,339,916.00	
ITEM 2.3	Emulsion asfáltica CR-2	\$ 202,522,320	\$ -	\$ 202,522,320.00	
ITEM 2.1 + 2.2 + 2.3	Agregado para tratamiento superficial doble	\$ 89,502,426	\$ -	\$ 89,502,426.00	
3	MAQUINARIA Y EQUIPO				
ITEM 3.1	MOTONIVELADORA, VASO Y RETENCIÓN	\$ 107,744,749.92	\$ 46,176,321.40	\$ 153,921,071.32	
ITEM 3.2	RETENCIÓN DE ESCOMBROS A MAQUINARIA	\$ 86,865,062.83	\$ 57,910,041.89	\$ 144,775,104.72	
		\$ 1,405,621,414.42	\$ 160,105,183.28	\$ 1,565,726,597.70	



CARLOS DAVID CARRERA
REPRESENTANTE DEL CONSORCIO VAS DEL VALLE



CARLOS DAVID CARRERA
REPRESENTANTE DEL CONSORCIO VAS DEL VALLE

Tabla. Inversión de Anticipo mes de marzo de 2022.

A corte del presente informe, el anticipo girado se presenta en la siguiente tabla:

GOBERNACIÓN DEL VALLE SECRETARÍO DE INFRAESTRUCTURA						
DATOS GENERALES						
OBJETO DEL CONTRATO						
MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA						
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VÍAS DEL VALLE			REP. LEGAL	JHON JAIRO CONDE CARRERA	
CONTRATISTA DE INTERV	MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S A S			REP. LEGAL	CARLOS DAVID MARTÍNEZ VELEZ	
SUPERVISOR	ING. ALFREDO ALMEIDA BAYARDO GARCÍA					
DATOS ESPECÍFICOS						
ORDEN DE OPERA/COMPROBANTE No	FECHA ORDEN DE OPERA/COMPRO	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO	
1	8/03/2022	GRUPO SS SAS	\$ 107,744,749.92	3.1	Motoniveladora, vibro y recicladora	
			\$ 86,865,062.83	3.6	Retiro de escombros a máquina	
		CONDPOX INC SAS	\$ 756,628,119.62	3.1	Estabilizante tipo geopolímero	
			\$ 106,339,915.71	3.2	Emulsión asfáltica CRL-0	
			\$ 202,522,320.00	3.9	Emulsión asfáltica CRR-2	
			\$ 89,502,426.34	3.9 y 3.11	Agregado para tratamiento superficial doble	
GRUPO LST SAS	\$ 26,018,820.00	1.1	Topografía			
	\$ 30,000,000.00	P.G	Personal de Obra			
2	3/05/2022	GRUPO SS SAS	\$ 104,085,353.28	3.1 y 3.6	Motoniveladora, vibro y recicladora y Retiro de escombros a máquina	
			\$ 56,018,820.00	1.1 y P.G	Topografía y Personal de Obra	
RESUMEN						
ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1.1	Topografía	\$ 52,037,640.00	\$ 26,018,820.00	\$ 26,018,820.00	\$ 52,037,640.00	\$ -
P.G.	Personal de Obra	\$ 60,000,000.00	\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00	\$ 60,000,000.00	\$ -
3.1	Estabilizante tipo geopolímero	\$ 756,628,119.62	\$ 756,628,119.62	\$ -	\$ 756,628,119.62	\$ -
3.2	Emulsión asfáltica CRL-0	\$ 106,339,915.71	\$ 106,339,915.71	\$ -	\$ 106,339,915.71	\$ -
3.9	Emulsión asfáltica CRR-2	\$ 202,522,320.00	\$ 202,522,320.00	\$ -	\$ 202,522,320.00	\$ -
3.9 y 3.11	Agregado para tratamiento superficial doble	\$ 89,502,426.34	\$ 89,502,426.34	\$ -	\$ 89,502,426.34	\$ -
3.1	Motoniveladora, vibro y recicladora	\$ 153,921,071.32	\$ 107,744,749.92	\$ 46,176,321.40	\$ 153,921,071.32	\$ -
3.6	Retiro de escombros a máquina	\$ 144,775,104.71	\$ 86,865,062.83	\$ 57,910,041.88	\$ 144,775,104.71	\$ -
TOTALES		\$ 1,565,726,597.70	\$ 1,405,621,414.42	\$ 160,105,183.28	\$ 1,565,726,597.70	\$ -

Fuente: Elaboración Propia

En cumplimiento de la CLÁUSULA 6 del mismo contrato, esta interventoría solicita al CONSORCIO VÍAS DEL VALLE, haga entrega del soporte donde se dé evidencia que el monto total del Anticipo desembolsado fue usado adecuadamente para las actividades enmarcadas dentro de este contrato, información que a la fecha de corte de este informe no fue entregada.

MULTAS.

De acuerdo con el contrato No. 1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021, según CLAUSULA 14, que tiene que ver con MULTAS, estipuló lo siguiente:

(...) **CLÁUSULA 14. MULTAS:** La mora por parte del CONTRATISTA en el cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones del contrato dará lugar a la aplicación de multas sucesivas por una suma equivalente al 0.5 por ciento (0.5%) del valor del contrato por cada día de atraso y que, sumadas no superen el diez por ciento (10%) del valor del contrato.

Se causará multa equivalente a diez (10) SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax:
Sitio WEB: www.valledelcauca.gov.co e-mail: infraestructura@valledelcauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia

Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que haya sido notificada a la Entidad. (...)"

" . Comillas fuera de contexto,

Frente a lo anterior y teniendo en cuenta que el contratista tiene un atraso de treinta (30) días, de acuerdo con la programación entregada por el mediante oficio CVV-011-2022 del 14 de marzo de 2022, que comienza el 09 de mayo de 2022 con la actividad de SUMINISTRO ESTABILIZACIÓN DE SUELOS – TIPO GEOPOLÍMERO CON TRANSPORTE COLOIDAL – TRATAMIENTO BIFASE, INCLUYE MEZCLA, IRRIGACIÓN Y COMPACTACIÓN PUESTO EN OBRA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO en el frente del municipio de Florida. Por lo tanto, esta interventoría tasa la multa en un valor que no supere el 10% (diez por ciento) del valor total del contrato, es decir, de \$521.908.866. (QUINIENTOS VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS. MCTE)

Esta interventoría expone que el retraso en la ejecución de las obras, se deba a no contar con el personal, la logística y los recursos necesarios y/o adecuados para adelantar los trabajos objeto de este contrato, De conservarse este rendimiento por parte del Contratista de Obra, entre lo proyectado y lo programado, estarían haciendo falta 16 meses (480 días) adicionales al plazo contractual para finalizar el 100% de las actividades, lo cual quiere decir que a la fecha el contratista no ha demostrado capacidad suficiente para llevar a cabo la totalidad de las actividades.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Sin importar los reiterados oficios, solicitando diferente documentación necesaria para el avance del proyecto, el CONSORCIO VIAS DEL VALLE no contestó o si lo hizo lo hace de manera extemporánea, siendo posible que no cuenta con el personal o la logística necesaria adecuada para responder de manera oportuna a los requerimientos solicitados por la Interventoría.
- Con base en la programación aprobada se evidencia que el proyecto presenta atraso del 43.93% es decir una inversión de \$2.292'856.172,00
- El contrato tiene una ejecución a la fecha del 9.35%, esta ejecución se ha dado en el 64.64% (117 días) del tiempo contractual (182 días), quedando el 35.36% (64 días) del tiempo contractual, para ejecutar un 90.65% de las actividades.

- *El contratista no entrega evidencia del adecuado uso del anticipo en cumplimiento con la Cláusula Sexta del Contrato de Obra No. 1.310.02-59.8-0581.*
- *Dicho atraso es producto de no haber iniciado las actividades de suministro e instalación estabilización de suelos – tipo Geopolímero con transporte coloidal – tratamiento bifase, incluye mezcla, irrigación y compactación. Puesto en obra y acompañamiento técnico, imprimación y transporte de agregados para la implementación del tratamiento superficial. Todo esto en el frente de Florida.*
- *Con relación al Plan de Manejo ambiental, dicho documento fue entregado de manera definitiva en el mes de junio, habiendo suscrito acta de inicio el 11 de febrero 2022.*
- *El Contratista Consorcio Vías del Valle, a la fecha no ha dado una justificación técnica, argumentativa o evidenciable, que justifique el porqué de los atrasos presentados.*
- *La Inversión realizada (\$487.868.462,00) está muy por debajo del valor del anticipo recibido (\$1.565.729.598).*
- *Pese al avance presentado por el contratista, fruto del seguimiento realizado tanto por la Interventoría como por la entidad, el contrato presenta una situación bastante crítica.*
- *El contratista al inicio de la ejecución de la obra presenta demora en el avance de la ejecución de la misma, por no contar con el personal o la logística necesaria y/o adecuada para adelantar los trabajos objeto de este contrato, no por demás, en el avance de la misma, la presencia de la fuerte ola invernal que ha azotado nuestro departamento también ha generado retrasos no imputables al contratista en los últimos meses.*
- *De conservarse la tendencia de la curva de avance del proyecto entre lo proyectado y lo programado, estarían haciendo falta 16 meses (480 meses) adicionales al plazo contractual para finalizar el 100% de las actividades.*
- *La interventoría cumpliendo con sus obligaciones contractuales, solicita iniciar el proceso administrativo sancionatorio que corresponda, atendiendo lo*

contemplado en este informe y las cláusulas del contrato, teniendo como base un posible incumplimiento contractual

- *De esta manera, estaremos atentos a sus instrucciones para seguir con el trámite solicitado (...)*

(ANEXO VI)

III. INDIVIDUALIZACION DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1.310.02-59.8-0581 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021

1. De acuerdo con los hechos anteriormente relatados se tiene que el contratista Consorcio Vías del Valle, identificado con Nit 901545310-6 presuntamente ha incumplido el contrato de obra por retrasos injustificados en la ejecución de las obras impidiendo que se dé cabal cumplimiento al objeto del proyecto dentro del plazo planteado, pues estarían faltando 16 meses (480 días) adicionales al plazo contractual para finalizar el 100% de las actividades, aunado a lo anterior llama la atención el constante desinterés por parte del contratista en responder a la interventoría de manera oportuna a todos sus requerimientos afectando drásticamente en los tiempos planteados, cabe resaltar que el contratista recibió un anticipo en la fecha 2 de marzo del 2022 y a la fecha no se tiene un reporte claro por parte del contratista sobre como empleo dicho anticipo.

IV. CLÁUSULAS PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS O A RIESGO DE INCUMPLIRSE:

CLÁUSULA	DESCRIPCIÓN CLÁUSULA	DESCRIPCIÓN INCUMPLIMIENTO
1	CLÁUSULA 1- OBJETO DEL CONTRATO.	Se incumplió con esta cláusula pues no se ha cumplido con la totalidad de la obra a ejecutar parte del contratista.
2	CLÁUSULA 2- ALCANCE DEL OBJETO	Se incumplió con esta cláusula pues: No se ha desarrollado el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documento del Proceso de

		Contratación No. LP-SIV-002-2019
3	CLÁUSULA 4-PLAZO DEL CONTRATO	<i>Se ha incumplió, pues el plazo de ejecución de seis (6) meses y el contrato tiene una ejecución a la fecha del 9.35%, esta ejecución se ha dado en el 64.64% (117 días) del tiempo contractual (182 días), quedando el 35.36% (64 días) del tiempo contractual, para ejecutar un 90.65% de las actividades.</i>
4	CLÁUSULA 6-ANCITICPO	<i>Se ha incumplido pues el contratista de obra no ha hecho la entrega del soporte donde se dé evidencia que el monto total del Anticipo desembolsado fue usado adecuadamente para las actividades enmarcadas dentro de este contrato.</i>
5	CLÁUSULA OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA	<p>Se ha incumplido con las siguientes cláusulas:</p> <p>9.1. <i>El contratista no ha dado respuesta a los oficios remitidos por parte de la interventoría sobre el cumplimiento del contrato.</i></p> <p>9.2. <i>El contratista no ha cumplido con el cronograma y el presupuesto establecido para la ejecución de la obra.</i></p> <p>9.3. <i>El contratista no ha cumplido con las condiciones técnicas exigidas por la interventoría.</i></p> <p>9.5. <i>El contratista ha ejecutado actividades sin reportar a la interventoría el manejo que le ha dado al presupuesto que se le ha entregado.</i></p>

		<p>9.6. <i>El contratista no ha cumplido con plazo establecido en el cronograma</i></p> <p>9.12. <i>El contratista no ha informado a la entidad las circunstancias que han afectado la normal ejecución de la obra.</i></p> <p>9.13. <i>El contratista no ha entregado a la interventoría la relación del personal idóneo para la ejecución de la obra.</i></p>
6	CLÁUSULA RESPONSABILIDAD.	12- <i>Se ha incumplido por el contratista no ha sido responsable por el cumplimiento del objeto del contrato</i>

V. POSIBLES CONSECUENCIAS QUE SE PUEDEN DERIVAR PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA PRESENTE ACTUACIÓN

De conformidad con la Ley y el contrato las consecuencias previstas frente al posible incumplimiento a que se refiere el informe de interventoría consistente en que previo al agotamiento del debido proceso consagrado en la Constitución Política en artículo 29 y desarrollado por los artículos 4 de la Ley 80 de 1993, 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011, la entidad contratante de encontrarlo procedente podrá declarar el incumplimiento y hacer efectivas las multas consagradas en la cláusula 14 del contrato en mención:

(...) **CLÁUSULA 14. MULTAS:** La mora por parte del CONTRATISTA en el cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones del contrato dará lugar a la aplicación de multas sucesivas por una suma equivalente al 0.5 por ciento (0.5%) del valor del contrato por cada día de atraso y que, sumadas no superen el diez por ciento (10%) del valor del contrato.

Se causará multa equivalente a diez (10) SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que haya sido notificada a la Entidad. (...)"

Lo anterior conforme a lo estipulado en el informe de incumplimiento de la interventoría así que taso las mulas en un valor equivalente a QUINIENTOS VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$521.908.866.)

VI. FUNDAMENTOS DE DERECHO PARA ADELANTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.

LEY 80 DE 1993:

- **Artículo 3º.** Establece como fines de la Contratación Estatal que "Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (...)"
- **Artículo 4º. Derechos y deberes de las entidades estatales.** Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Iguaes exigencias podrán hacer al garante. 2o. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar (...)"
- **Artículo 5º. Derechos y deberes de los contratistas.** Para la realización de los fines de que trata el artículo 3o. de esta Ley, los contratistas: "(...) 2. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entramamiento que pudieran presentarse".

- **Artículo 18. De la caducidad y sus efectos.** “La caducidad es la estipulación en virtud de la cual, si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre (...)

Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley.

La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.”

- **Artículo 26 numeral 1º.** Establece que en virtud del principio de responsabilidad, los servidores públicos tienen entre otras, las siguientes obligaciones “(...) buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato (...)”

LEY 1150 DE 2007:

- **Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.** Establece “(...) el derecho al debido proceso. El debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales. En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato. (...)”

LEY 1474 DE 2011:

- **Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.** Señala “(...) IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento (...)”

DECRETO REGLAMENTARIO 1082 DE 2015:

- **Artículo 2.2.1.2.3.1.1.** “Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación. El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión de: (...) (ii) los contratos y su liquidación (...).
- **Artículo 2.2.1.2.3.1.7.** “Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento del contrato debe cubrir: 3. Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: (...) 3.1. El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista (...)
- **Artículo 2.2.1.2.3.1.19.** “Efectividad de las garantías. La Entidad Estatal debe hacer efectivas las garantías previstas en este capítulo así: (...) **“1. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal declare la caducidad del contrato y ordene el pago al contratista y al garante, bien sea de la cláusula penal o de los perjuicios que ha cuantificado. El acto administrativo de caducidad constituya el siniestro.”** (Negrilla fuera de texto original)

VII. NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE INCUMPLIDAS.

LEY 80 DE 1993:

- **Artículo 5º. De los Derechos y Deberes de los Contratistas.** Para la realización de los fines de que trata el artículo 3º. de esta Ley, los contratistas: 2. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entramamiento que pudieran presentarse”.
- **Artículo 52.- De la Responsabilidad de los Contratistas.** Los contratistas responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley. Los consorcios y uniones temporales responderán por las acciones y omisiones de sus integrantes, en los términos del artículo 7º. de esta Ley.”

VIII. MEDIOS DE PRUEBA.

Constituyen medios de prueba documentales, además del Contrato y los documentos que hacen parte de éste, los que se enuncian a continuación, de los cuales se acompaña copia con la presente comunicación:

- Anexo 1: Apertura de la licitación Pública No. LP-SIV-002-2019
- Anexo 2: Resolución de adjudicación No. 1.310.02-59.8- 0849 del 29 de noviembre del 2021
- Anexo 3: Contrato de Obra No1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021.

- Anexo 4: Anexo Técnico
- Anexo 5 Actas suscritas en la ejecución
- Anexo 6: Informe del interventor VR4-079A-2022 de fecha 16 de septiembre de 2022, del Contrato de Obra No1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021

VIII LUGAR Y FECHA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA.

La Administración se permite reprogramar la AUDIENCIA PÚBLICA que se realizará en el marco en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, **Audiencia incumplimiento VR4, viernes, 21 octubre · 2:00 – 6:00pm, Información para unirse a la reunión de Google Meet, Vínculo a la videollamada: <https://meet.google.com/uab-sirh-tfo> O marca el: (CO) +57 602 3896602 PIN: 506 630 945#, Más números de teléfono: <https://tel.meet/uab-sirh-tfo?pin=4270710545887>.**

En el desarrollo de la audiencia la Administración le informará las circunstancias de hecho que motivaron el inicio de la actuación, con el propósito de permitirle el ejercicio del derecho de contradicción y de defensa que le asiste, para lo cual se les concederá el uso de la palabra al contratista o su representante para que presente los descargos y rinda las explicaciones del caso, aporten pruebas y controvertan las presentadas por la entidad.

Cordialmente,



FRANK ALEXANDER RAMÍREZ ORDOÑEZ ✕

Secretario de Infraestructura
Gobernación del Valle del Cauca

Anexo: Lo enunciado

Elaboró: Doris Yazmin Larrotta Abogada Contratista.

Revisó Lorena Zapata – Abogado Contratista.

Aprobó: María Del Pilar Escarria Romero Jefe Oficina Jurídica de la Secretaría de Infraestructura

CONTRATO No. 1.310.02-59.8 - 0581

(23 DIC - 2021)

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA Y EL CONSORCIO VIAS DEL VALLE****MINUTA DEL CONTRATO****TABLA DE CONTENIDO**

CLÁUSULA 1.	DEFINICIONES
CLÁUSULA 2.	OBJETO
CLÁUSULA 3.	ALCANCE DEL OBJETO
CLÁUSULA 4.	PLAZO DEL CONTRATO
CLÁUSULA 5.	VALOR DEL CONTRATO
CLÁUSULA 6.	ANTICIPO
CLÁUSULA 7.	APROPiación PRESUPUESTAL
CLÁUSULA 8.	FORMA DE PAGO
CLÁUSULA 9.	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 10.	DERECHOS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 11.	OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
CLÁUSULA 12.	RESPONSABILIDAD
CLÁUSULA 13.	INDEMNIDAD
CLÁUSULA 14.	MULTAS
CLÁUSULA 15.	CLÁUSULA PENAL
CLÁUSULA 16.	TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO
CLÁUSULA 17.	CADUCIDAD
CLÁUSULA 18.	GARANTÍAS
CLÁUSULA 19.	INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 20.	INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA
CLÁUSULA 21.	CESIÓN
CLÁUSULA 22.	CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR
CLÁUSULA 23.	SUPERVISIÓN
CLÁUSULA 24.	INTERVENTORIA
CLÁUSULA 25.	LIQUIDACIÓN
CLÁUSULA 26.	SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN
CLÁUSULA 27.	LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL
CLÁUSULA 28.	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
CLÁUSULA 29.	DOCUMENTOS

CONTRATO No. 1.310.02-59.8 - 0581

(23 DIC - 2021)

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA Y EL CONSORCIO VIAS DEL VALLE**

Entre los suscritos: **FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ**, mayor de edad y vecino de Santiago de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía número 94.522.032 expedida en Cali (Valle del Cauca), en su calidad de Secretario de Infraestructura, con nombramiento ordinario realizado por medio del Decreto Departamental No. 1-3-0001 del 01 de enero del 2020, habiendo tomado posesión mediante acta de posesión No. 0010 el día 01 de enero del 2020, facultado para celebrar el presente contrato según Decreto Departamental No. 1-3-0023 del 07 de enero de 2020, "POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚAN UNAS DELEGACIONES EN MATERIA CONTRACTUAL Y SE DISPONEN MEDIDAS PARA EJERCER EL CONTROL Y VIGILANCIA EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL, quien en adelante se denominará la entidad, por una parte; y por la otra, **EL CONSORCIO VIAS DEL VALLE**, identificado con NIT No. 901.545.310-6, cuyo representante legal es el señor **JHON JAIRO CONDE CARRERA**, identificado con la cedula de ciudadanía número 79.384.752 de Bogotá, quien en adelante se denominará el Contratista, tal como aparece en el Formato 1 - "CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA" y en el formato 2" CONFORMACION DEL PROPONENTE PLURAL", hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

- I. Que mediante Resolución No. 1.310.02-59.8-0356 del 02 de septiembre de 2021 se ordena la apertura de la licitación Pública No. LP-SIV-002-2019 con el fin de contratar el **MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**.
- II. Que mediante Resolución No. 1.310.02-59.8-0849 del 29 de noviembre de 2021 la Entidad adjudicó el Contrato al **CONSORCIO VIAS DEL VALLE**.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio y las demás normas legales aplicables a la materia, y por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 - Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto

CONTRATO No. 1.310.02-59.8-081**(23 Dic - 2021)****CONTRATO DE OBRA PUBLICA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA Y EL CONSORCIO VIAS DEL VALLE**

contenidos en el pliego de condiciones y sus adendas para la ejecución del objeto contractual.

CLÁUSULA 6. ANTICIPO

La Entidad entregará un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la Gobernación del Valle del Cauca, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.



CONTRATO No. 1.310.02-59.8 - 0581

(23 DEC 2021)

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA Y EL CONSORCIO VIAS DEL VALLE

1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es: **MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.**

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista, deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP-SIV-002-2019, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 10 – Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de su propuesta.

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecución ser de seis (06) meses, contados a partir del registro presupuestal, aprobación de pólizas y suscripción del acta de inicio.

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

Para efectos legales el valor del presente Contrato es la suma de CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$5.219.088.659), valor que incluye todos los impuestos a que haya lugar. El Contratista con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. - **PARÁGRAFO:** El proponente seleccionado y contratista deberá sujetarse a los parámetros

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 • Piso: 13 Teléfono: 6200000
Correo: infraestructuravalledelcauca@gmail.com • www.valledelcauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia

#ValleInvencible
Página: 3 de 19

CONTRATO No. 1.310.02-59.8 -0881**(23 DIC 2021)****CONTRATO DE OBRA PUBLICA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA Y EL CONSORCIO VIAS DEL VALLE****CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente las siguientes disponibilidades presupuestales: CDP No. 3600001565 DEL 14 DE ABRIL DE 2021, por valor de CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE (\$5.131.640.104) y CDP No. 3600001566 DEL 16 DE ABRIL DE 2021, por valor de DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$225.424.575)

De igual manera el presente proceso cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías No. 7321 DE 14 DE ABRIL DE 2021, por valor de CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE (\$5.131.640.104) y No. 7621 DEL 16 DE ABRIL DE 2021, por valor de DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$225.424.575)

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

El Valor del contrato se cancelará de la siguiente manera:

Mediante pagos parciales de ejecución de obra, previa presentación de las actas parciales por parte del contratista, debidamente aprobadas por la interventoría del contrato según el caso, y el cumplimiento de los requisitos de la entidad contratante para el pago respectivo.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en la propuesta del contratista, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

Palacio de San Francisco - Carrera 6 Calle 9 y 10 - Piso 13 Teléfono: 6200000
Correo: Infraestructuravalledelcauca@gmail.com - www.valledelcauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia

#ValleInvenible
Página: 6 de 19

CONTRATO No. 1.310.02-59.8 -0581

(23 Dic 2021)

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA Y EL CONSORCIO VIAS DEL VALLE**

El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.

Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:












- El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.
- El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.
- Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor.
- Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.
- La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato.
- En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.
- La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría.

CONTRATO No. 1.310.02-59.8 - 0531**(23 Dic 2021)****CONTRATO DE OBRA PUBLICA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA Y EL CONSORCIO VIAS DEL VALLE**

- 9.1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
- 9.2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.
- 9.3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
- 9.4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
- 9.5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
- 9.6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
- 9.7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
- 9.8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
- 9.9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
- 9.10. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.
- 9.11. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.
- 9.12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
- 9.13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
- 9.14. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existente al momento de

Palacio de San Francisco - Carrera 6 Calle 9 y 10 - Piso: 13 Teléfono: 6200000
Correo: Infraestructuravalledelcauca@gmail.com - www.valledelcauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia

           **#ValleInvencible**
Página: 7 de 19

CONTRATO No. 1.310.02-59.8 -0581

(23 Dic 2021)

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA Y EL CONSORCIO VIAS DEL VALLE**

proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

- a) El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción.
- b) El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.
- c) Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años (5) contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras.
- d) El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato.
- e) El contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

- 10.1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CONTRATO No. 1.310.02-59.8 -0589

(23 DIC 2021)

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA Y EL CONSORCIO VIAS DEL VALLE****CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD**

La Entidad está obligada a:

- 11.1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
- 11.2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
- 11.3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la Cláusula 2 del presente Contrato. El Contratista es responsable por los daños que ocasionen sus contratistas o empleados, los empleados o contratistas de sus subcontratistas, a la Entidad en la ejecución del objeto del presente Contrato.

Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA estará obligada a mantener INDEMNEMENTO al DEPARTAMENTO de cualquier reclamación proveniente de terceros, que tenga como causa las actuaciones del mismo, de sus dependientes o subcontratistas. El CONTRATISTA se obliga a indemnizar al DEPARTAMENTO con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato, por lo tanto, mantendrá indemne al DEPARTAMENTO de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El CONTRATISTA también mantendrá indemne al DEPARTAMENTO por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

CLÁUSULA 14. MULTAS

Palacio de San Francisco - Carrera 6 Calle 9 y 10 - Piso: 13 Teléfono: 6200000

Correo: Infraestructuravalledelcauca@gmail.com - www.valledelcauca.gov.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia

www.valledelcauca.gov.co

#ValleInvencible

Página: 9 de 19

CONTRATO No. 1.310.02-59.8 -0531**(23 DIC 2021)****CONTRATO DE OBRA PUBLICA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA Y EL CONSORCIO VIAS DEL VALLE**

La mora por parte del CONTRATISTA en el cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones del contrato, dará lugar a la aplicación de multas sucesivas por una suma equivalente al 0.5 por ciento (0.5%) del valor del contrato por cada día de atraso y que, sumadas no superen el diez por ciento (10%) del valor del Contrato

Se causará multa equivalente a diez (10) SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que esta haya sido notificada a la Entidad.

CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL

En caso de declaratoria de caducidad o de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o total del Contrato o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, éste pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor del contrato. La tasación de la Cláusula Penal atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para demandar ante del juez del Contrato, la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal.

El pago o deducción de la Cláusula Penal no exonerará al Contratista, del cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato incluyendo de la que se declara el incumplimiento.

En caso de proceder a la aplicación de la Cláusula Penal, de conformidad con la normativa vigente, el Contratista, autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista o en su defecto se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la garantía única de cumplimiento.

**CLÁUSULA 16. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN
UNILATERALES DEL CONTRATO**

CONTRATO No. 1.310.02-59.8 -0589
(23 DIC 2021)
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA Y EL CONSORCIO VIAS DEL VALLE**

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refieren los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA 17. CADUCIDAD

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar al DEPARTAMENTO, a título de indemnización, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el DEPARTAMENTO adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil.

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales. (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.		
Asegurado/ beneficiario	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA, identificada con NIT 890-399-029-5		
Amparos, vigencia valores asegurados	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato	Diez por ciento (10%) del valor total del contrato.
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo	El valor de esta garantía debe ser el ciento por ciento (100%) de la suma establecida como anticipo.

CONTRATO No. 1.310.02-59.8 -0521
(23 DIC 2021)
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA Y EL CONSORCIO VIAS DEL VALLE**

	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad	El treinta por ciento (30%) del valor final del contrato.
Tomador	<ul style="list-style-type: none"> No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 		
Información necesaria dentro de la póliza	<ul style="list-style-type: none"> Número y año del contrato Objeto del contrato Firma del representante legal del Contratista En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421 		

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18. 2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

CONTRATO No. 1.310.02-59.8 -0581

(23 Dic 2021)

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA Y EL CONSORCIO VIAS DEL VALLE**

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años (5) contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA, identificada con NIT 890-399-029-5
Tomador	<ul style="list-style-type: none">No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de

Palacio de San Francisco - Carrera 6 Calle 9 y 10 - Piso: 13 - Teléfono: 6200000

Correo: Infraestructuravalledelcauca@gmail.com - www.valledelcauca.gov.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia

www.valledelcauca.gov.co#ValleInvencible
Página: 13 de 19

CONTRATO No. 1.310.02-59.8 - 0(91)

(23 DIC 2021)

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA Y EL CONSORCIO VIAS DEL VALLE**

	participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	No debe ser inferior a: 1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV. 2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV. 3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV. 4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV. 5. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV.
Vigencia	Igual al periodo de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA, identificada con NIT 890-399-029-5
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	<ul style="list-style-type: none"> Número y año del contrato Objeto del contrato Firma del representante legal del Contratista En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2 000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

CONTRATO No. 1.310.02-59.8 -0521**(23 Dic 2021)****CONTRATO DE OBRA PUBLICA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA Y EL CONSORCIO VIAS DEL VALLE**

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista sólo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA 21. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el

CONTRATO No. 1.310.02-59.8 - 0171

(23 DIC 2021)

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA Y EL CONSORCIO VIAS DEL VALLE**

artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

CLÁUSULA 22. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

El contratista y el contratante estarán exentos de responsabilidad en el cumplimiento de plazos establecidos en el presente contrato, toda vez que estén impedidos por causas atribuidas a casos fortuitos o de fuerza mayor. Para los fines de este contrato, se considerarán casos fortuitos o fuerza mayor los establecidos por las normas legales vigentes, siempre que tales casos hayan tenido efectiva influencia o producido interrupciones en la ejecución del contrato y se hayan utilizado la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias, tales como: A) huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas; b) incendios, naufragios, derrumbes, etc. Al producirse un caso fortuito o fuerza mayor, la parte interesada deberá comunicársela a la otra de forma inmediata, estableciéndose un plazo de diez (10) días calendario para aportar las pruebas correspondientes, a menos que, existan graves impedimentos para ello.

CLÁUSULA 23. SUPERVISIÓN

La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato está a cargo del secretario de Infraestructura o por quien éste designe. Sin que esta labor sea concurrente con las funciones de la interventoría.

CLÁUSULA 24. INTERVENTORÍA

La interventoría del presente Contrato está a cargo del proponente seleccionado en el proceso de selección de contratistas No.CM-SIV-001-2021. Sin que esta labor, sea concurrente con la supervisión.

CLÁUSULA 25. LIQUIDACIÓN

Se procederá a su liquidación en los términos y plazos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLÁUSULA 26. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CONTRATO No. 1.310.02-59.8 - 0571

(23 Dic 2021)

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA Y EL CONSORCIO VIAS DEL VALLE****CLÁUSULA 27. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL**

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en el lugar de la ejecución de la obra objeto de la interventoría esto es: las vías rurales en mal estado en los municipios El Dovio, Florida, Pradera y Roldanillo y el domicilio contractual será en el Edificio Palacio San Francisco, ubicado en la Carrera 6 con Calle 9 y 10, Secretaría de Infraestructura y Valorización Piso 13, Gobernación del Valle del Cauca.

CLÁUSULA 28. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado las instancias y procedimientos contemplados en los artículos 68 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

CLÁUSULA 29. DOCUMENTOS


Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato

CLÁUSULA 30. NOTIFICACIONES

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico en las

Palacio de San Francisco - Carrera 6 Calle 9 y 10 - Piso: 13 Teléfono: 6200000
Correo: Infraestructuravalledelcauca@gmail.com - www.valledelcauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia


www.valledelcauca.gov.co
#ValleInvencible
Página: 17 de 19

CONTRATO No. 1.310.02-59.8 -0581

(23 DIC 2021)

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA Y EL CONSORCIO VIAS DEL VALLE**

direcciones indicadas a continuación: a) el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, carrera 6 con calles 9ª y 10ª, Palacio de San Francisco, Secretaría de Infraestructura y Valorización piso 13; en la ciudad de Santiago de Cali, dirigida a Nombre del supervisor designado para este Contrato, y a la interventoría. b) El representante legal del contratista el JHON JAIRO CONDE CARRERA, identificado con la cedula de ciudadanía número 79.384.752 de Bogotá en calidad de representante Legal del CONSORCIO VIAS DEL VALLE, y/o quien haga sus veces en la dirección: CR 6 89 25 AP 101 de la ciudad de Bogotá, y al Correo electrónico: gruposssas@gmail.com PARÁGRAFO: El interventor deberá comunicar al DEPARTAMENTO y al CONTRATISTA su dirección física y electrónica donde se entenderán surtidas las notificaciones.

El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecución necesita la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (a través de certificación expedida por el representante legal, contador o revisor fiscal del contratista), la elaboración y aprobación del registro presupuestal de compromiso (RPC), la aprobación de las garantías de que trata la cláusula 13 del presente Contrato y la suscripción del acta de inicio.

CLÁUSULA 31. ADICION Y/O PRORROGA

EL presente contrato puede adicionarse y prorrogarse en los términos permitidos en la Ley siempre que se cuente con concepto favorable del interventor designado. Para los efectos anteriores, la adición y/o prórroga deberá consignarse por escrito mediante otrosí firmado por las partes contractuales o sus apoderados debidamente facultados. PARÁGRAFO: En este caso deben prorrogarse y ajustarse las pólizas conforme a la adición y/o prórroga para cubrir los nuevos términos.

CLÁUSULA 32. CONFIDENCIALIDAD

En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial.

CLÁUSULA 33. MANIFESTACIONES SARLAFT

El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en


CONTRATO No. 1.310.02-59.8 - 0571

(23 DIC 2021)


**CONTRATO DE OBRA PUBLICA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA Y EL CONSORCIO VIAS DEL VALLE**

general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

En constancia se firma el presente contrato en Santiago de Cali, a los veintitres (23) del mes de diciembre del año Dos Mil veintiuno (2021).

POR LA ENTIDAD**POR EL CONTRATISTA**
FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ
Secretario de Infraestructura
JHON JAIRO CONDE CARRERA
C.C. No. 79.384.752 de Bogotá
Representante Legal del CONSORCIO
VIAS DEL VALLE
NIT No. 901.545.310-6


Proyecto: Claudia Ines Marin Ballesteros-Abogada contratista SI
Aprobó: Juliana Álvarez Ordoñez- Jefe Oficina Asesora Jurídica SI

Departamento del Valle del Cauca	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA DE INICIO	Código: FO-M9-P2-03
 GOBERNACION		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 2

Santiago de Cali, 11 de febrero de 2022/


Contrato de Obra	1.310.02-59.8-0581
Numero de R.P.C	SAP: RPC No. 4500038072 del 14 de enero de 2022 SPGR: RPC No. 3722 del 11 de febrero de 2022 RPC No. 3822 del 11 de febrero de 2022
Fecha de Firma del Contrato (Manual o en el SECOP I)	Por parte del Contratista: 23 de diciembre de 2021 Por parte del Departamento: 23 de diciembre de 2021
Contratista	CONSORCIO VIAS DEL VALLE
Objeto	MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Valor del Contrato	CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$5.219.088.659)/
Plazo de Ejecución	Hasta el 11 de agosto del 2022.
Fecha de Inicio	11 de febrero de 2022.
Lugar de Reunión	DESPACHO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
Garantías	Cumplimiento No. CBC-100033048/ -CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: \$521.908.865.90 desde el 23 de diciembre 2021 hasta el 23 de octubre de 2022. -BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: \$1.565.726.597.70 desde el 23 de diciembre 2021 hasta el 23 de octubre de 2022. -PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: \$260.954.432.95 desde el 23 de diciembre 2021 hasta el 23 de junio de 2025. ESTABILIDAD DE LA OBRA: \$1.565.726.597.70 desde el 23 de diciembre 2021 hasta el 23 de junio de 2027. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. CBC-100004725/ \$ 454.263.000/ desde el 23 de diciembre 2021 hasta el 23 de junio de 2022/ Expedidas por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A/
Acta de Aprobación de la Garantía	No. 1.310.02.59.8-002 del 12 de enero de 2022/


El día 11 del mes febrero del año 2022 nos reunimos por parte del Contratista JHON JAIRO CONDE CARRERA, identificado con cédula de ciudadanía número 79.384.752 de Bogotá, representante legal del CONSORCIO VIAS DEL VALLE con Nit.901.545.310-6, por parte del interventor CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ, identificado con la cédula de ciudadanía


<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>GOBERNACION</p>	<p>MANUAL DE CONTRATACIÓN</p> <p>ACTA DE INICIO</p>	<p>Código: FO-M9-P2-03</p> <p>Versión:02</p> <p>Fecha de Aprobación: 17/06/2019</p> <p>Página: 2 de 2</p>
---	---	---

número 94.372.004 de Cali, obrando en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de la Firma **MARTINEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.** con Nit.900.596.808-6 y por parte del Departamento **FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 94.522.032 de Cali, obrando en calidad de **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**, con nombramiento realizado por medio del Decreto Departamental No. 1-3-0001 del 01 de enero del 2020 habiendo tomado posesión mediante Acta No. 0010 del 01 de enero 2020, una vez reunidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, con el fin de suscribir el acta y dar inicio a la ejecución del presente contrato. Con la firma se acepta que tanto el contratista como el supervisor y/o interventor deben mantener alimentado el expediente físico y electrónico del contrato de manera oportuna, así como la gestión de sus modificaciones en tiempo real.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los intervinientes en ella.


FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ
 C.C. 94.522.032 de Cali
 Secretario de Infraestructura


CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ
 CC. 94.372.004 de Cali
 Representante Legal
**MARTINEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA
 E INGENIERIA S.A.S.**
 Interventor


JHON JAIRO CONDE CARRERA
 CC. 79.384.752 de Bogotá
 Representante Legal
CONSORCIO VIAS DEL VALLE
 Contratista



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

RESOLUCION No. 1.310.02-59.8- 0849 DE 2021
(2 9 nov) 2021

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SE LA ADJUDICACION DE LA
LICITACION PUBLICA No. LP-SIV-002-2019.

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 305 de la Constitución Política de Colombia y en ejercicio de lo preceptuado en el artículo 11 de la Ley 80 de 1993 y las demás normas que la modifiquen o adicionen en especial La Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015, y en cumplimiento del decreto de delegación 1-3-0023 del 7 de enero de 2020,

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto No. 1-3-0023 del 7 de enero de 2020, la señora Gobernadora del Valle del Cauca delego en los Secretarios de Despacho, Directores de Departamentos Administrativos, Altos Consejeros, Directores y Jefes de Oficina adscritos al Despacho de la Gobernación, la competencia para celebrar contratos resultantes de las modalidades de selección previstas en el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, incluyendo la realización de todas las actividades precontractuales, contractuales y post contractuales.

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015, el Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Infraestructura elaboró los estudios y documentos previos con el objeto de adelantar el proceso con Objeto: **MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.**

Que, de acuerdo al Estatuto General de Contratación de la administración pública, el Decreto reglamentario 1082 de 2015, el presupuesto oficial y en virtud del principio de transparencia la escogencia del contratista se efectuará a través de la modalidad de Licitación Pública.

Que por término y para los efectos del artículo 2.2.1.1.1.7.1. Decreto 1082 de 2015, el Departamento publicó el proyecto de Pliego de condiciones de la Convocatoria Pública, en el Portal único de la Contratación www.contratos.gov.co desde el 19 de septiembre de 2019, garantizando así la publicidad y transparencia del proceso dando la posibilidad de que se presentaran las observaciones que los interesados en participar consideraran pertinentes.

Que dentro del término para presentar observaciones al proyecto de pliegos, se presentaron observaciones sustanciales, a las cuales el Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Infraestructura y Valorización, dio respuesta y realizó los ajustes pertinentes, los cuales quedaron consignados en el Pliego de Condiciones definitivo publicado en el Portal Único de la Contratación: www.contratos.gov.co

Que el cronograma del proceso se detalla en la parte resolutive del presente Acto



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

RESOLUCION No. 1.310.02-59.8- 0849 DE 2021
(29 nov) 2021

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SE LA ADJUDICACION DE LA
LICITACION PUBLICA No. LP-SIV-002-2019.**

Que el lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar el pliego de condiciones y los estudios y documentos previos y definitivos es el Despacho de la Secretaría de Infraestructura, ubicada en el Palacio de San Francisco Carrera 6 entre Calles 9 y 10 Piso 13 – Gobernación del Valle del Cauca y/o en el Portal Único de la Contratación: www.contratos.gov.co.

Que existe disponibilidad presupuestal para hacer la apertura de la convocatoria pública LP-SIV-002-2019 relativa al **MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.**

El valor estimado del contrato derivado de la presente licitación será de:

El valor estimado del contrato derivado de la presente licitación será de: CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$5.357.064.679) PRESUPUESTO DEL SGR, cuyo valor es el estimado previamente según los estudios de mercado.

El contrato de obra resultante del presente proceso de selección, se ejecutará a precios unitarios fijos, sin formula de ajuste.

Para la atención de los compromisos derivados del presente proceso de selección, el Departamento del Valle cuenta con las siguientes disponibilidades presupuestales: CDP No. 3600001565 DEL 14 DE ABRIL DE 2021, por valor de CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE (\$5.131.640.104) y CDP No. 3600001566 DEL 16 DE ABRIL DE 2021, por valor de DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$225.424.575)

De igual manera el presente proceso cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías No. 7321 DE 14 DE ABRIL DE 2021, por valor de CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE (\$5.131.640.104) y No. 7621 DEL 16 DE ABRIL DE 2021, por valor de DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$225.424.575)

El contrato de obra resultante del presente proceso de selección, se ejecutará a precios unitarios fijos, sin formula de ajuste.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

RESOLUCION No. 1.310.02-59.8- 0849 DE 2021
(29 NOV) 2021

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SE LA ADJUDICACION DE LA
LICITACION PUBLICA No. LP-SIV-002-2019.**

Que se publicaron los avisos de convocatoria los días 19 de septiembre.

Que el 02 de septiembre de 2021 se publicaron las respuestas a las observaciones efectuadas al proyecto de pliego de condiciones.

Que mediante Resolución No. 1.310.02-59.8-0356 del 02 de septiembre de 2021 se ordena la apertura de la licitación Pública No. LP -SIV -002-2019, y se publicaron los Pliegos de Condiciones Definitivos en el Portal Único de Contratación.

Que el día 15 de septiembre de 2021, a las 10:00 a.m. se efectuó el Acto de Cierre de la Licitación Pública LP -SIV -002-2019, y en la cual se recibieron un total de cuatro (04) ofertas.

ORDEN	PROPONENTE	INTEGRANTE DE LA ESTRUCTURA PLURAL		REPRESENTANTE LEGAL	CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA	
		NOMBRE	PORCENTAJE DE PARTICIPACION		SI	NO
1	CONSORCIO GENOVA 2021	GARCIA RIOS CONSTRUCTORES SAS	45%	FABIAN GARCIA RIOS	X	
		ROCALES Y CONCRETOS SAS	55%			
2	CONSORCIO DOGMA	LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO	50%	LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO	X	
		CONSTRUCTORA CCC SA	50%			
3	CONSORCIO VALLE	INTERESTUDIOS SAS	70%	GUSTAVO PEREZ MARINO	X	
		JAVIER MUÑOZ JARAMILLO	30%			
4	CONSORCIO VIAS DEL VALLE	GRUPO SS SAS	50%	JHON JAIRO CONDE CARRERA	X	
		LACIDES SEGOVIA	40%			
		GRUPO IS COLOMBIA SAS	10%			

Que el pasado 6 de octubre del 2021, se publicó la Adenda No. 1, mediante el cual se modificó el cronograma de la Licitación Pública LP -SIV -002-2019.

Que el pasado 21 de octubre del 2021, se publicó la Adenda No. 2, mediante el cual se modificó el cronograma de la Licitación Pública LP -SIV -002-2019.

Que mediante Resolución No.1.310.02-59.8-0499 del 02 de noviembre de 2021 se designación de comité evaluador del proceso de licitación pública No. LP -SIV -002-2019, que tiene como objeto es el "MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

RESOLUCION No. 1.310.02-59.8- 0549 DE 2021
(29 nov) 2021

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SE LA ADJUDICACION DE LA
LICITACION PUBLICA No. LP-SIV-002-2019.
EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA".

Que el día 03 de noviembre de 2021 se publicó el informe de evaluación dando
como resultado:

Factores de Verificación	Cumple / No cumple
Capacidad Jurídica (Componente Jurídico)	
Capacidad Financiera (componente Financiero)	
Capacidad Organizacional (Componente Financiero)	
Capacidad Residual (Componente Financiero)	
Experiencia (componente Técnico)	

• **CAPACIDAD JURIDICA:**

A continuación, se realiza la evaluación jurídica de los siguientes proponentes:

No.	PROPONENTE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CONSORCIO GENOVA 2021		X
2	CONSORCIO DOGMA		X
3	CONSORCIO VALLE		X
4	CONSORCIO VIAS DEL VALLE		X

Para ver en detalle cada evaluación, ver el Anexo No. 1 – Componente jurídico.

• **CAPACIDAD FINANCIERA:**

A continuación, se realiza la evaluación de capacidad financiera de los siguientes
proponentes:



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

RESOLUCION No. 1.310.02-59.8- 0849 DE 2021
(29 nov) 2021

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SE LA ADJUDICACION DE LA
LICITACION PUBLICA No. LP-SIV-002-2019.

No.	PROPONENTE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CONSORCIO GENOVA 2021	X	
2	CONSORCIO DOGMA	X	
3	CONSORCIO VALLE	X	
4	CONSORCIO VIAS DEL VALLE	X	

Para ver en detalle cada evaluación, ver el Anexo No. 2 – Componente financiero.

• **CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:**

A continuación, se realiza la evaluación de capacidad organizacional de los siguientes proponentes:

No.	PROPONENTE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CONSORCIO GENOVA 2021	X	
2	CONSORCIO DOGMA	X	
3	CONSORCIO VALLE	X	
4	CONSORCIO VIAS DEL VALLE	X	

Para ver en detalle cada evaluación, ver el Anexo No. 2 – Componente financiero.

• **CAPACIDAD RESIDUAL:**

A continuación, se realiza la evaluación de capacidad residual de los siguientes proponentes:

No.	PROPONENTE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CONSORCIO GENOVA 2021	X	
2	CONSORCIO DOGMA		X
3	CONSORCIO VALLE		X
4	CONSORCIO VIAS DEL VALLE		X

Para ver en detalle cada evaluación, ver el Anexo No. 2 – Componente financiero

130



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

RESOLUCION No. 1.310.02-59.8- 0849 DE 2021
(29 nov) 2021

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SE LA ADJUDICACION DE LA
LICITACION PUBLICA No. LP-SIV-002-2019.

• EXPERIENCIA:

A continuación, se realiza la evaluación de experiencia de los siguientes
proponentes:

No.	PROPONENTE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CONSORCIO GENOVA 2021	X	
2	CONSORCIO DOGMA	X	
3	CONSORCIO VALLE	X	
4	CONSORCIO VIAS DEL VALLE	X	

Para ver en detalle cada evaluación, ver el Anexo No. 3 – Componente técnico.

• RESUMEN GENERAL DE REQUISITOS HABILITANTES:

La evaluación de requisitos habilitantes determino que los proponentes habilitados
y a los cuales se les realizara la evaluación técnica puntuable, son los que se
relacionan en la siguiente tabla:

No.	PROPONENTE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CONSORCIO GENOVA 2021		X
2	CONSORCIO DOGMA		X
3	CONSORCIO VALLE		X
4	CONSORCIO VIAS DEL VALLE		X

• ANALISIS DE LAS PROPUESTAS PARA EVALUACION TECNICA PUNTUABLE

De acuerdo a la expuesto, no hay evaluación puntuable y orden de elegibilidad de
las propuestas presentadas, toda vez que todos los proponentes deben de
subsananar.

Que durante el periodo de traslado no se presentaron observaciones al informe de
evaluación, pero si se allego la documentación necesaria para subsanar las
falencias presentadas por parte de algunos de lo oferentes.

Que el día 25 de noviembre de 2021, se publicó el informe de evaluación puntuable
corregido.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

RESOLUCION No. 1.310.02-59.8- 0849 DE 2021
(29 nov) 2021

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SE LA ADJUDICACION DE LA
LICITACION PUBLICA No. LP-SIV-002-2019.

Una vez realizada la evaluación de los requisitos habitantes, se procede a evaluar la propuesta técnica de las ofertas que salieron habilitadas.

A continuación, se realiza la evaluación jurídica de los siguientes proponentes:

No.	PROPONENTE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CONSORCIO GENOVA 2021		X
2	CONSORCIO DOGMA	X	
3	CONSORCIO VALLE	X	
4	CONSORCIO VIAS DEL VALLE	X	

Para ver en detalle cada evaluación, ver el Anexo No. 1 – Componente jurídico.

• **CAPACIDAD FINANCIERA:**

A continuación, se realiza la evaluación de capacidad financiera de los siguientes proponentes:

No.	PROPONENTE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CONSORCIO GENOVA 2021	X	
2	CONSORCIO DOGMA	X	
3	CONSORCIO VALLE	X	
4	CONSORCIO VIAS DEL VALLE	X	

Para ver en detalle cada evaluación, ver el Anexo No. 2 – Componente financiero.

• **CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:**

A continuación, se realiza la evaluación de capacidad organizacional de los siguientes proponentes:

No.	PROPONENTE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CONSORCIO GENOVA 2021	X	
2	CONSORCIO DOGMA	X	

3



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

RESOLUCIÓN No. 1.310.02-59.8- 0849 DE 2021
(29 nov) 2021

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SE LA ADJUDICACION DE LA
LICITACION PUBLICA No. LP-SIV-002-2019.

No.	PROPONENTE	CUMPLE	NO CUMPLE
3	CONSORCIO VALLE	X	
4	CONSORCIO VIAS DEL VALLE	X	

Para ver en detalle cada evaluación, ver el Anexo No. 2 – Componente financiero.

• CAPACIDAD RESIDUAL:

A continuación, se realiza la evaluación de capacidad residual de los siguientes
proponentes:

No.	PROPONENTE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CONSORCIO GENOVA 2021	X	
2	CONSORCIO DOGMA	X	
3	CONSORCIO VALLE	X	
4	CONSORCIO VIAS DEL VALLE	X	

Para ver en detalle cada evaluación, ver el Anexo No. 2 – Componente financiero.

• EXPERIENCIA:

A continuación, se realiza la evaluación de experiencia de los siguientes
proponentes:

No.	PROPONENTE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CONSORCIO GENOVA 2021	X	
2	CONSORCIO DOGMA	X	
3	CONSORCIO VALLE	X	
4	CONSORCIO VIAS DEL VALLE	X	

Para ver en detalle cada evaluación, ver el Anexo No. 3 – Componente técnico.

• RESUMEN GENERAL DE REQUISITOS HABILITANTES:

3



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

RESOLUCION No. 1.310.02-59.8- 0849 DE 2021
(29 nov) 2021

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SE LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA No. LP-SIV-002-2019.

La evaluación de requisitos habilitantes determino que los proponentes habilitados y a los cuales se les realizara la evaluación técnica puntuable, son los que se relacionan en la siguiente tabla:

No.	PROPONENTE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CONSORCIO GENOVA 2021		X
2	CONSORCIO DOGMA	X	
3	CONSORCIO VALLE	X	
4	CONSORCIO VIAS DEL VALLE	X	

• **ANALISIS DE LAS PROPUESTAS PARA EVALUACION TECNICA PUNTUABLE**

De acuerdo a la expuesto, la evaluación puntuable y orden de elegibilidad de cada una de las propuestas está contenido en el Anexo No. 4 – Evaluación técnica puntuable.

El viernes 26 de noviembre de 2021 a las 9:30 a.m. se dio inicio a la Audiencia Pública de Adjudicación de la LICITACIÓN PUBLICA No. LP -SIV -002-2019, la cual se realizó de forma virtual por la plataforma Google Meet.

Que no se presentaron observaciones frente al informe de evaluación definitivo.

Que se relaciona el puntaje final dentro del Informa de evaluación Definitiva de la LICITACIÓN PUBLICA No. LP -SIV -002-2019 y el orden de elegibilidad de las propuestas habilitadas quedando de la siguiente forma:

No.	PROPONENTE	PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO	ORDEN DE ELEGIBILIDAD
1	CONSORCIO DOGMA	30,00000	1
2	CONSORCIO VALLE	30,00000	1
3	CONSORCIO VIAS DEL VALLE	30,00000	1

Posteriormente se procedió a dar apertura al sobre No. 2 correspondiente a la oferta económica de las ofertas validas, de acuerdo al orden de entrega de la oferta del ()



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION**

**RESOLUCION No. 1.310.02-59.8- 0849 DE 2021
(NOV 29.) 2021**

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SE LA ADJUDICACION DE LA
LICITACION PUBLICA No. LP-SIV-002-2019.**

y lectura del valor de cada oferta económica de cada uno de los proponentes habilitados:

No.	PROPONENTE	PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO
1	CONSORCIO DOGMA	\$ 5.223.138.384
2	CONSORCIO VALLE	\$ 5.203.991.769
3	CONSORCIO VIAS DEL VALLE	\$ 5.219.088.659

Así las cosas, se procede evaluar las ofertas económicas, de acuerdo a las siguientes condiciones, establecidas en el pliego de condiciones:

ITEM	REQUISITO
1	Que el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial no se allegue firmado. Literal I
2	Que la oferta presente una diferencia mayor o igual al uno por ciento (1%), por exceso o defecto, con respecto al valor registrado en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial luego de realizar la corrección aritmética del ofrecimiento económico en los términos descritos en la sección 4.1 del Pliego de Condiciones. Literal L
3	Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicación exceda el Presupuesto Oficial Estimado para el Proceso de Contratación. Literal M
4	Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras que no estén convalidadas en la forma indicada en la sección 2.3 del Pliego de Condiciones. Literal N
5	Que el proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. Literal O
6	No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecer como valor de un precio unitario cero (0). Literal P
7	Superar el valor unitario de alguno o algunos de los ítems ofrecidos con respecto al valor establecido para cada ítem del Presupuesto Oficial. Literal Q
8	Ofrecer un porcentaje para imprevistos inferior al definido en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. Literal R
9	No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AUJ en la forma como lo establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. Literal S
10	Ofrecer como valor del AUJ un porcentaje diferente al rango establecido por la Entidad en la sección 4.1.1. AUJ del Pliego de Condiciones. Literal T
11	Que se hayan modificado los valores estimados en los presupuestos oficiales, como no modificables o inmodificables. Literal U

Una vez revisados los requisitos anteriores, los proponentes habilitados cumplen.

Que de igual manera se tiene que la corrección aritmética de las ofertas económicas presentadas es el siguiente:

ORDEN	OFERENTE	VALOR PROPUESTA ECONOMICA	REPRESENTANTE LEGAL	VALOR CORRECCION ARITMETICA	PROPONENTE HABILITADO
1	CONSORCIO DOGMA	\$ 5.223.138.384	LUIS OSCAR YARGAS ASONDANO	\$ 5.223.138.384	<u>SI CUMPLE</u>
2	CONSORCIO VALLE	\$ 5.203.991.769	GUSTAVO PEREZ MASERO	\$ 5.203.991.769	<u>SI CUMPLE</u>
3	CONSORCIO VIAS DEL VALLE	\$ 5.219.088.659	JOHFI LIRIO CONDE CASPERA	\$ 5.219.088.659	<u>SI CUMPLE</u>

13



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

RESOLUCION No. 1.310.02-59.8- 0849 DE 2021
(29 nov) 2021

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SE LA ADJUDICACION DE LA
LICITACION PUBLICA No. LP-SIV-002-2019.**

Que realizado lo anterior, se procede a determinar el método de ponderación para la oferta económica, que de acuerdo a lo establecido en el pliego se tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) (certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio web: <https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819>) que rija el día de la Audiencia efectiva de Adjudicación, definida en el cronograma vigente al momento del cierre del proceso de selección, aun cuando la fecha de la Audiencia efectiva de Adjudicación se modifique posteriormente en desarrollo del Proceso de Contratación.

Que para el caso que nos ocupa la Audiencia Efectiva de Adjudicación es la del día 21 de octubre del 2022, definida en la Resolución de Apertura de la Licitación Pública LP-SIV-002-2019 No. 1.310.02-59.8-0356 del 2 de septiembre del 2021.

De acuerdo a lo anterior la TRM del 21 de octubre del 2021, es \$3770,58

Es por ello que, para obtener el puntaje por concepto de oferta económica, se procede seleccionar el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes alternativas, establecidas en el pliego tipo:

Concepto	Método
1	Mediana con valor absoluto
2	Media geométrica con Presupuesto Oficial
3	Media aritmética alta
4	Media aritmética baja
5	Menor Valor

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive)	Número	Método
De 0.00 a 0.19	1	Mediana con valor absoluto
De 0.20 a 0.39	2	Media geométrica con Presupuesto Oficial
De 0.40 a 0.59	3	Media aritmética alta
De 0.60 a 0.79	4	Media aritmética baja
De 0.80 a 0.99	5	Menor valor

En concordancia con lo anterior y dado que la TRM del 21 de octubre del 2021 fue de 3770,58, tenemos que en el presente proceso se aplica el siguiente método de ponderación:

Rango (inclusive)	Número	Método
De 0.40 a 0.59	3	Media aritmética alta

30



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

RESOLUCION No. 1.310.02-59.8- 0849 DE 2021
(29 nov) 2021

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SE LA ADJUDICACION DE LA
LICITACION PUBLICA No. LP-SIV-002-2019.

Que una vez aplicado el anterior método de ponderación (Media aritmética alta), se obtuvieron los siguientes resultados por oferta económica:

No.	PROPONENTE	OFERTA ECONOMICA (70 Puntos)
1	CONSORCIO DOGMA	69,896
2	CONSORCIO VALLE	69,795
3	CONSORCIO VIAS DEL VALLE	69,998

Que una vez realizada la evaluación de la oferta económica el Secretario de Infraestructura de la Gobernación del Valle del Cauca, da a conocer el orden de elegibilidad definitivo así:

No.	PROPONENTE	PUNTAJE DEFINITIVO	ORDEN DE ELEGIBILIDAD
1	CONSORCIO DOGMA	99,896	2
2	CONSORCIO VALLE	99,795	3
3	CONSORCIO VIAS DEL VALLE	99,998	1

En virtud de lo anterior el proponente ganador es el **CONSORCIO VIAS DEL VALLE**, con 99.998 puntos, ocupando así el primer lugar en el orden de elegibilidad definitivo.

Que en desarrollo de la audiencia de adjudicación se acoge la recomendación del comité evaluador y se adjudica al proponente **CONSORCIO VIAS DEL VALLE**, cuyo representante legal es el señor **JHON JAIRO CONDE CARRERA**, identificado con la cedula de ciudadanía número 79.384.752 de Bogotá.

Que en mérito de lo expuesto, el delegado de la señora Gobernadora del Departamento del Valle:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar al proponente **CONSORCIO VIAS DEL VALLE**, cuyo representante legal es el señor **JHON JAIRO CONDE CARRERA**, identificado con la cedula de ciudadanía número 79.384.752 de Bogotá, el contrato resultante de la Licitación Pública LP -SIV -002-2019, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

RESOLUCION No. 1.310.02-59.8-0849 DE 2021
(29 nov) 2021

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SE LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA No. LP-SIV-002-2019. propuesta por valor de CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$5.219.088.659). Valor que incluye todos los impuestos a que haya lugar

PARÁGRAFO: El proponente seleccionado deberá sujetarse a los parámetros contenidos en el pliego de condiciones y sus adendas para la ejecución del objeto contractual.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución se notifica al adjudicatario en desarrollo de la presente audiencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y a los demás proponentes que participaron en el proceso de selección se les comunicará mediante publicación de la presente decisión a través del SECOP.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el párrafo 1º del artículo 77 de la Ley 80 de 1993 contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) a través del Portal Único de Contratación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 de Decreto 1082 de 2015.


ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santiago de Cali, el 29 del mes de noviembre de 2021.


FRANK ALEXANDER RAMÍREZ ORDOÑEZ f
Secretario de Infraestructura

Proyectó: Dra. Claudia Marín - Abogada Contratista Oficina Asesora Jurídica - SIV
Revisó: Dra. Juliana Álvarez Ordoñez - Jefe Oficina Asesora Jurídica - SIV





GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Infraestructura y Valorización

LICITACION PÚBLICA LP-SIV-002-2019

ANEXO 1

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO

MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA pretende mejorar la transitabilidad de las vías terciarias que a continuación se describen.

a. Localización Florida

La vía Florida – El crucero – Rivera – Granate es una vía de tercer orden de competencia municipal que comunica el municipio de Florida con el corregimiento de Granate el tramo a intervenir tiene una longitud de 5,78 Km.

b. Localización Pradera

La vía Pradera - Lomitas – El Recreo – San Isidro es una vía de tercer orden de competencia municipal que comunica el municipio de Pradera con el corregimiento de San Isidro el tramo a intervenir tiene una longitud de 4,16 Km.

c. Localización Roldanillo – El Dovio

La vía Roldanillo – El Dovio es una vía de tercer orden de competencia municipal que comunica los municipios de Roldanillo y El Dovio con los corregimientos Cajamarca – San Isidro – La Esperanza, el tramo a intervenir tiene una longitud de 6,121 Km.

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

El área de influencia del proyecto está localizada en la zona rural de 4 municipios del Departamento del Valle del Cauca, los cuales cuentan con una malla vial en regular estado de aproximadamente de 1.160,45 km, los cuales se ven afectados económicamente al depender del transporte terrestre para la comercialización de sus productos y para el desarrollo de su economía en general.

Las vías rurales que van a ser intervenidas con el proyecto tienen una longitud total de 16,061 Km aproximadamente de las afectadas por el problema, las cuales son de competencia municipal.

Su ancho promedio esta entre los 5 y 6 mts, con bermas entre 0.50 y 1.0 mts y cunetas en tierra, su capa de rodadura está en afirmado con espesores promedios de 5 a 10 cm.

Estas vías han presentado un comportamiento aceptable respecto a las obras de drenaje que poseen, no presentan inestabilidades mayores ni sectores de alto riesgo.

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 • Piso: 13 • Teléfono: 6200020 – 6200000 Ext. 1300 -1303-1322

Correo: licitacionesinfraestructuragob@gmail.com - www.valledelcauca.gov.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca



El Valle
está en
vos

MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Página: 1 de 29



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Infraestructura y Valorización

LICITACION PÚBLICA LP-SIV-002-2019

ANEXO 1

En general las vías a intervenir con el proyecto se encuentran en regular estado presentan las siguientes tipologías generales:

- La superficie de rodadura presenta deterioro superficial y presencia de baches y hundimientos puntuales
- Tiene circulación sin restricciones durante el año
- Obras de arte con daños menores y obras de drenaje parcialmente colmatadas
- Velocidad de Circulación aproximadamente entre 20 y 40 kilómetros por hora en tramos rectos

a. Localización:

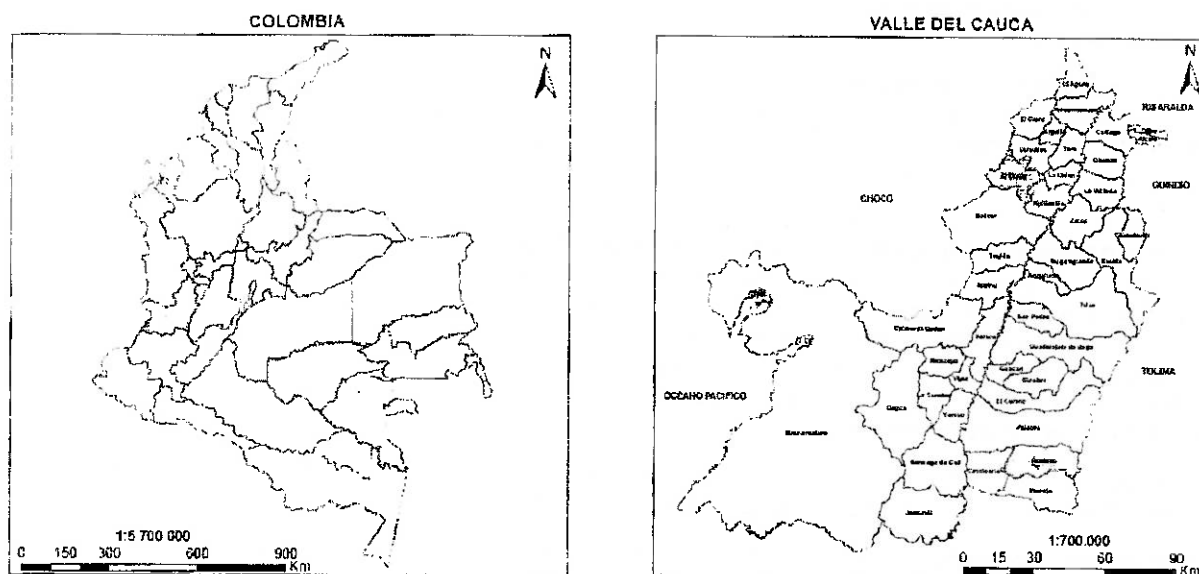


Figura 1.1. Localización General Colombia – Valle del Cauca

NIT: 890399029-5
Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 • Piso: 13 - Teléfono: 6200020 – 6200000 Ext. 1300 -1303-1322
Correo: licitacionesinfraestructuragob@gmail.com - www.valledelcauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca



MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA





GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Infraestructura y Valorización

LICITACION PÚBLICA LP-SIV-002-2019

ANEXO 1

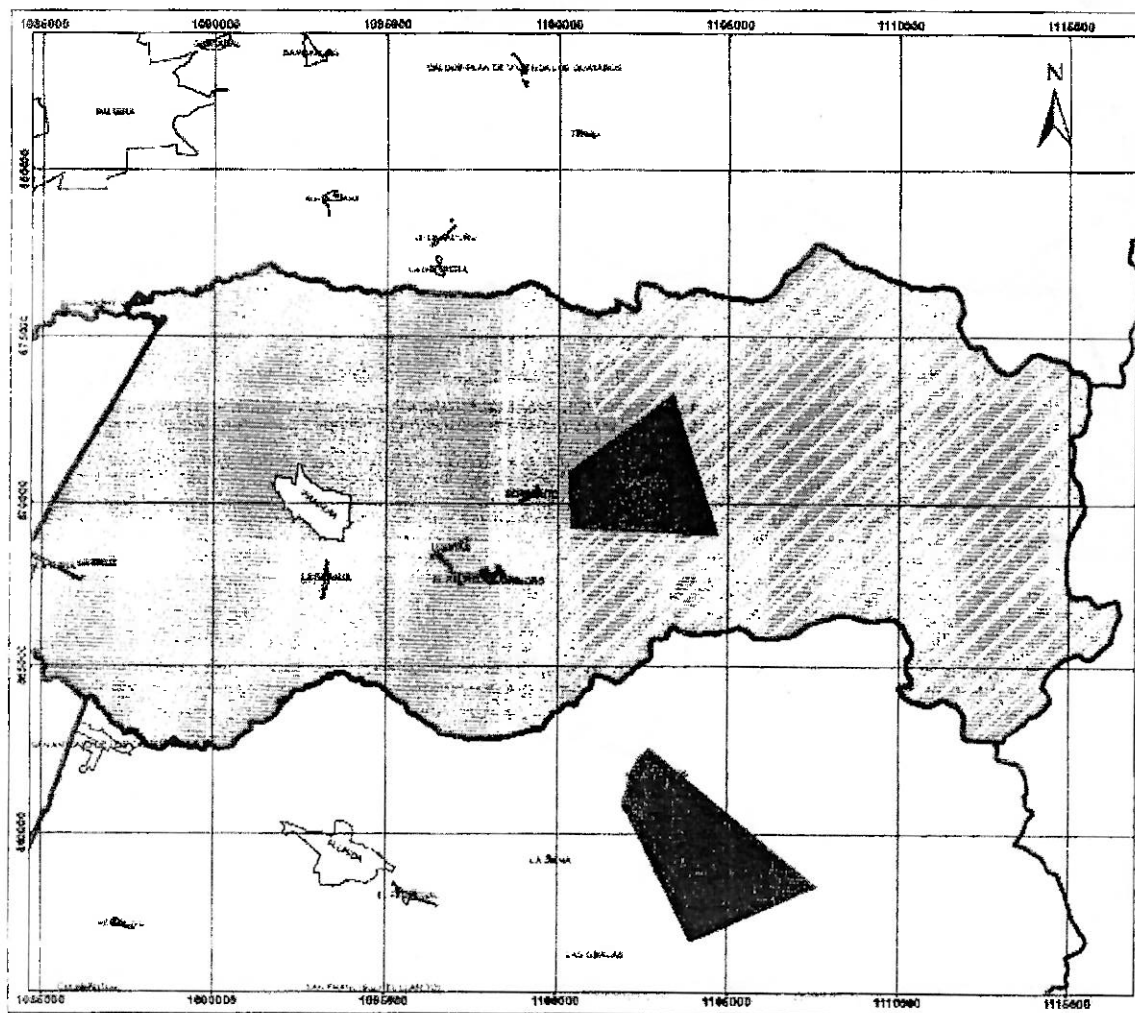


Figura 1.3. Localización de la vía Lomitas – el Recreo – San Isidro. Municipio de Pradera – Valle del Cauca

NIT: 890399029-5
Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 - Piso: 13 - Teléfono: 6200020 – 6200000 Ext. 1300-1303-1322
Correo: licitacionesinfraestructuragob@gmail.com - www.valledelcauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca



El Valle
está en
vos

MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Página: 4 de 29



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Infraestructura y Valorización

LICITACION PÚBLICA LP-SIV-002-2019

ANEXO 1

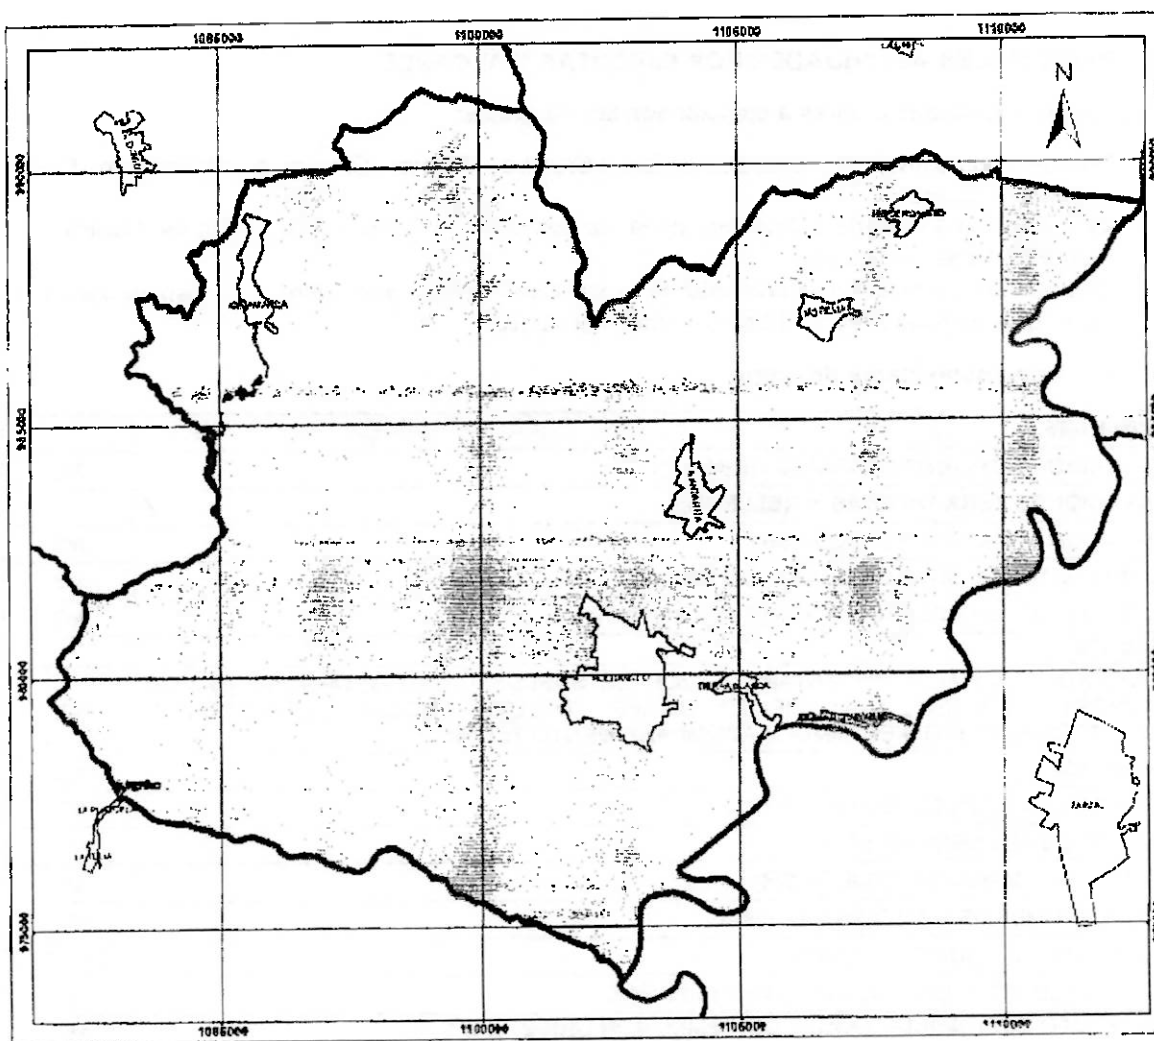


Figura 1.4. Localización de la vía Cajamarca – San Isidro – La Esperanza, Municipios de Roldanillo y El Dovio – Valle del Cauca

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 · Piso: 13 · Teléfono: 6200020 – 6200000 Ext. 1300-1303-1322

Correo: licitacionesinfraestructuragob@gmail.com - www.valledelcauca.gov.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca



**El Valle
está en
vos**

MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Página: 5 de 29



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Infraestructura y Valorización

LICITACION PÚBLICA LP-SIV-002-2019

ANEXO 1

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las principales actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

- Mejoramiento a nivel de subrasante de la vía Crucero – Rivera – Granate del Municipio de Florida – Valle del Cauca
- Mejoramiento a nivel de subrasante de la vía Lomitas – El Recreo - San Isidro del Municipio de Pradera – Valle del Cauca
- Mejoramiento a nivel de subrasante de la vía Cajamarca – San Isidro – La Esperanza de los municipios de Roldanillo y El Dovio - Valle del Cauca.

a. Principales ítems de pago:

PRELIMINARES	
LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS NO URBANAS	ML
EXCAVACIONES TERRAPLENES Y RELLENOS	
EXCAVACION A MAQUINA (CAJEO) (SR)	M3
RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3
RELLENO COMP. MAT SELECC. 10KM (ROCA MUERTA)	M3
OBRAS VIA	
SUMINISTRO E INSTALACION ESTABILIZACION DE SUELOS - TIPO GEOPOLIMERO CON TRANSPORTE COLOIDAL-TRATAMIENTO BIFASE, INCLUYE MEZCLA, IRRIGACION Y COMPACTACION. PUESTO EN OBRA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO	M2
IMPRIMACION	M2
CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0,15	M3
REMOCION DERRUMBES EN SITIO	M3
EXCAVACION A MAQUINA (CAJEO) (SR)	M3
RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM	M3
TRANSPORTE DE EQUIPO < = 50 KM	T – KM
LINEA DE DEMARCAACION INCLUYE MICROESFERAS	ML
TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSION CRR-2 TIPO I	M2
SELLO DE ARENA-ASFALTO CON EMULSION CRR-2	M2
TRANSPORTE DE AGREGADO PÉTREO	M3 – KM

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 - Piso: 13 - Teléfono: 6200020 – 6200000 Ext. 1300-1303-1322

Correo: licitacionesinfraestructuragob@gmail.com - www.valledelcauca.gov.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca



El Valle
está en
vos

**MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Página: 6 de 29



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Infraestructura y Valorización

LICITACION PÚBLICA LP-SIV-002-2019

ANEXO 1

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la sección 1.1 del Pliego de Condiciones, el cual se contará a partir del cumplimiento de los requisitos para dar inicio a la ejecución del contrato.

El plazo establecido para la ejecución de las obras es de SEIS (06) MESES

5. FORMA DE PAGO

El valor del contrato se cancelará de la siguiente manera: Mediante pagos parciales de ejecución de obra, previa presentación de las actas parciales por parte del contratista, debidamente aprobadas por la interventoría/supervisión del contrato, según el caso, y el cumplimiento de los requisitos de la entidad contratante para el pago respectivo.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Las siguientes especificaciones técnicas son tomadas del proyecto identificado con BPIN 2017000030181, el cual tiene por objeto MANTENIMIENTO CON ESTABILIZACIÓN BIFASE Y PROTECCIÓN SUPERFICIAL DE LAS VÍAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA así como también de las estipuladas en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras vigentes del Instituto Nacional de Vías – INVIAS y las establecidas en el Manual de Señalización Vial del INVIAS, adaptadas para el proyecto identificado con BPIN 2018000030055 MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

6.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO VÍAS NO URBANAS

6.1.1 DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en la materialización, por única vez, del eje de construcción y las estacas de chaflanes de acuerdo con los planos de diseño previo al inicio a los trabajos de construcción.

El alcance corresponde a la materialización del eje de diseño y su nivelación y las estacas de chaflanes para el control de los trabajos. Se deberán dejar testigos para replanteos de control.

El CONTRATISTA será responsable de cualquier desviación en la localización del proyecto.

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 • Piso: 13 • Teléfono: 6200020 – 6200000 Ext. 1300-1303-1322

Correo: licitacionesinfraestructuragob@gmail.com - www.valledelcauca.gov.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca




El Valle
está en
vos

**MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Página: 7 de 29



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Infraestructura y Valorización

LICITACION PÚBLICA LP-SIV-002-2019

ANEXO 1

6.1.2 MATERIALES Y EQUIPO

Para la ejecución de esta actividad se utilizarán estacas o tacos de madera, puntillas de 2" pulgadas, piola y esmalte para señalización. Se utilizará para la actividad equipo topográfico, como nivel de precisión, plomadas, cintas métricas y niveles.

6.1.3 MEDIDA

La medida para los efectos de pago de esta actividad será el metro cuadrado (M2) en primer nivel. La cantidad será obtenida por cálculos realizados sobre los planos arquitectónicos, y se tomará de acuerdo a los ejes de construcción localizados. No se contabilizarán sobreanchos adicionales que sean necesarios, para realizar procesos constructivos. Se incluirá en la actividad todas las operaciones de replanteo, tanto en el primer nivel como en niveles superiores.

6.1.4 FORMA DE PAGO

El precio unitario de esta actividad incluye todos los costos de materiales, equipo y mano de obra necesarios durante todo el tiempo de la construcción; y se rectificará o repetirá total o parcialmente en los casos que sea necesario.

6.2 EXCAVACIÓN A MÁQUINA (CAJEO) (SR)

6.2.1 DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover, cargar y colocar en los sitios de disposición o desecho, los materiales provenientes de las vías, indicados en el proyecto, con las modificaciones que ordene el Interventor.

6.2.2 MATERIALES Y EQUIPO


Los materiales provenientes de los fallos presentes en las vías que presenten características adecuadas para uso en la construcción de la obra, serán reservados para colocarlos posteriormente. Su disposición provisional se hará en los sitios aprobados previamente para tal fin por el Interventor.

6.2.3 MEDIDA

La unidad de medida para la excavaciones a máquina, será el metro cúbico (m3), aproximado al entero, de trabajo realizado de acuerdo con esta especificación y a satisfacción del Interventor en el área definida por éste.

6.2.4 FORMA DE PAGO

NIT: 890399029-5
Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 · Piso: 13 · Teléfono: 6200020 – 6200000 Ext. 1300-1303-1322
Correo: licitacionesinfraestructuragob@gmail.com - www.valledelcauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca



**MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Página: 8 de 29



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Infraestructura y Valorización

LICITACION PÚBLICA LP-SIV-002-2019

ANEXO 1

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato por excavación a máquina extraída a plena satisfacción del Interventor.

El precio unitario deberá incluir los costos de administración e imprevistos y la utilidad del Constructor.

6.3 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM

6.3.1 DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación y compactación del material del sitio producto de la excavación sobre la subrasante terminada, o sobre un afirmado existente, de acuerdo con la presente especificación, los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en el proyecto y las instrucciones del Interventor.

6.3.2 MATERIALES Y EQUIPO

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos, el material que vaya a compactar el Constructor deberá dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente y viceversa.

El tamaño máximo nominal no deberá exceder de 1/3 del espesor de la capa compactada. Normalmente, el equipo requerido para la compactación de la calzada incluye equipos para mezclado, cargue, transporte, extensión, humedecimiento y compactación del material, así como herramientas menores.

6.3.3 MEDIDA

La unidad de medida para la compactación de del material del sitio producto de la excavación, será el metro cúbico (m3), aproximado al entero, de trabajo realizado de acuerdo con esta especificación y a satisfacción del Interventor en el área definida por éste.

6.3.4 FORMA DE PAGO

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato por toda área compactada a plena satisfacción del Interventor.

El precio unitario deberá incluir los costos de administración e imprevistos y la utilidad del Constructor.

6.4 RELLENO COMP. MAT SELECC. 10KM (ROCA MUERTA)

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 · Piso: 13 · Teléfono: 6200020 – 6200000 Ext. 1300 -1303-1322

Correo: licitacionesinfraestructuragob@gmail.com · www.valledelcauca.gov.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca



El Valle
está en
vos

**MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Página: 9 de 29



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Infraestructura y Valorización

LICITACION PÚBLICA LP-SIV-002-2019

ANEXO 1

6.4.1 DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales tipo roca muerta sobre la subrasante terminada, o sobre un afirmado existente, de acuerdo con la presente especificación, los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en el proyecto y las instrucciones del Interventor.

6.4.2 MATERIALES Y EQUIPO

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos, el material que vaya a compactar el Constructor deberá dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente y viceversa.

El tamaño máximo nominal no deberá exceder de 1/3 del espesor de la capa compactada.

Normalmente, el equipo requerido para la compactación de la roca muerta incluye equipos para mezclado, cargue, transporte, extensión, humedecimiento y compactación del material, así como herramientas menores.

6.4.3 MEDIDA

La unidad de medida para la compactación de roca muerta, será el metro cúbico (m³), aproximado al entero, de trabajo realizado de acuerdo con esta especificación y a satisfacción del Interventor en el área definida por éste.

6.4.4 FORMA DE PAGO

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato por toda área compactada a plena satisfacción del Interventor.

El precio unitario deberá incluir los costos de administración e imprevistos y la utilidad del Constructor.

6.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTABILIZACIÓN SUELOS – TIPO GEOPÓLIMERO CON TRANSPORTE COLOIDAL- TRATAMIENTO BIFASE INCLUYE MEZCLA, IRRIGACIÓN Y COMPACTACIÓN. PUESTO EN OBRA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO

6.5.1 DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en la disgregación del material de la subrasante existente, el eventual retiro de parte de este material, la adición de estabilizante de suelos tipo químico-cementante, la mezcla, humedecimiento o aireación, compactación y perfilado final, de acuerdo con la presente especificación, y con las dimensiones, alineamientos y pendientes señalados en el proyecto y las instrucciones del Interventor.

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 · Piso: 13 · Teléfono: 6200020 – 6200000 Ext. 1300-1303-1322

Correo: licitacionesinfraestructuragob@gmail.com · www.valledelcauca.gov.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca



El Valle
está en
vos

MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Página: 10 de 29



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Infraestructura y Valorización

LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIV-002-2019

ANEXO 1

6.5.2 MATERIALES Y EQUIPO

Los materiales de adición deberán presentar una calidad tal que la capa de subrasante mejorada cumpla los requisitos exigidos para los suelos seleccionados.

6.5.3 MEDIDA

La unidad de medida para la estabilización suelos tipo químico-cementante, será el metro cuadrado (m²), aproximado al entero, de trabajo realizado de acuerdo con esta especificación y a satisfacción del Interventor en el área definida por éste.

6.5.4 FORMA DE PAGO

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato por toda área estabilizada a plena satisfacción del Interventor.

El precio unitario deberá incluir los costos de administración e imprevistos y la utilidad del Constructor.

6.6 IMPRIMACIÓN

6.6.1 DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en la aplicación de una película de emulsión RCL, con el fin de proporcionar una adherencia adecuada entre el suelo mejorado y la mezcla con emulsión y material granular que constituye el sello de protección con el que protegerá la subrasante mejorada mediante estabilización bifase, de acuerdo con la presente especificación, y con las dimensiones, alineamientos señalados en el proyecto y las instrucciones del Interventor.

6.6.2 MATERIALES Y EQUIPO

Los materiales deben cumplir con las características requeridas y presentar una calidad tal que se pueda garantizar la perfecta adherencia entre el suelo y el sello flexible de protección.

6.6.3 MEDIDA

La unidad de medida para la imprimación suelos, será el metro cuadrado (m²), aproximado al entero, de trabajo realizado de acuerdo con esta especificación y a satisfacción del Interventor en el área definida por éste.

6.6.4 FORMA DE PAGO

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato por toda área estabilizada a plena satisfacción del Interventor.

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 - Piso: 13 - Teléfono: 6200020 – 6200000 Ext. 1300 -1303-1322

Correo: licitacionesinfraestructuragob@gmail.com - www.valledelcauca.gov.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca

**El Valle
está en
vos**

**MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Página: 11 de 29



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Infraestructura y Valorización

LICITACION PÚBLICA LP-SIV-002-2019

ANEXO 1

El precio unitario deberá incluir los costos de administración e imprevistos y la utilidad del Constructor.

6.7 CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0,15

6.7.1 DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en el transporte, suministro, elaboración, manejo, almacenamiento y colocación de los materiales de construcción de cunetas de concreto prefabricadas o fundidas en el lugar. Las cotas de cimentación, las dimensiones, tipos y formas de las cunetas revestidas de concreto deberán ser las indicadas en los planos del proyecto u ordenadas por el Interventor.

En caso necesario, incluye también las operaciones de alineamiento, excavación, conformación de la sección, suministro del material de relleno necesario y compactación del suelo de soporte.

6.7.2 MATERIALES Y EQUIPO

El concreto para la construcción de las cunetas vaciadas in situ será del tipo definido en los documentos del proyecto, y su elaboración se hará según lo ordenado por el interventor. En caso de que el acondicionamiento de la superficie se efectúe con cargo al presente Artículo, se deberá disponer de elementos para su conformación, para la excavación, cargue y transporte de los materiales, así como equipos manuales de compactación.

6.7.3 MEDIDA

La unidad de medida será el metro cúbico (m3), aproximado al décimo de metro cúbico, de cuneta satisfactoriamente elaborada y terminada, de acuerdo con la sección transversal, cotas y alineamientos indicados o determinados por el Interventor.

6.7.4 FORMA DE PAGO

El pago se hará al precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificación y aceptada a satisfacción por el Interventor.

El precio unitario deberá incluir los costos de administración e imprevistos y la utilidad del Constructor.

6.8 REMOCION DERRUMBES EN SITIO

6.8.1 DESCRIPCIÓN

NIT: 890399029-5
Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 • Piso: 13 - Teléfono: 6200020 – 6200000 Ext. 1300-1303-1322
Correo: licitacionesinfraestructuragob@gmail.com - www.valledelcauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca



El Valle
está en
vos

MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Página: 12 de 29



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Infraestructura y Valorización

LICITACION PÚBLICA LP-SIV-002-2019

ANEXO 1

Este trabajo consiste en la remoción, desecho y disposición o en la remoción, cargue, transporte hasta la distancia de acarreo libre, descargue y disposición de los materiales provenientes del desplazamiento de taludes o del terreno natural, depositados sobre una vía y que se convierten en obstáculo para la utilización normal de la vía o para la ejecución de las obras.

6.8.2 MATERIALES Y EQUIPO

Los materiales por remover serán los provenientes del derrumbe.

Los equipos para la remoción de derrumbes estarán sujetos a la aprobación del Interventor y deberán ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta especificación y del programa de trabajo.

6.8.3 MEDIDA

La unidad de medida para la remoción de derrumbes será el metro cúbico (m³), aproximado al metro cúbico completo, de material efectivamente retirado de cualquier parte de la vía.

El volumen de material removido, desechado y dispuesto se medirá en estado suelto, verificado por el Interventor con base en el número de viajes transportados.

No se determinarán los volúmenes de derrumbes que, a juicio del Interventor, fueren causados por procedimientos inadecuados o por negligencia del Constructor.

6.8.4 FORMA DE PAGO

La remoción de derrumbes se pagará al precio unitario del contrato, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente, de acuerdo con la presente especificación y aceptado por el Interventor.

No se autorizarán pagos para los volúmenes de material de derrumbes, si los materiales se descargan sobre obras del proyecto o en áreas no autorizadas por el Interventor.

Tampoco se autorizarán pagos para los volúmenes de material de derrumbes, causados por procedimientos inadecuados o negligencia del Constructor.

El precio unitario deberá incluir los costos de administración e imprevistos y la utilidad del Constructor.

6.10. EXCAVACIONES A MÁQUINA (CAJEO) (SR)

6.10.1 DESCRIPCIÓN

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 • Piso: 13 • Teléfono: 6200020 – 6200000 Ext. 1300-1303-1322

Correo: licitacionesinfraestructuragob@gmail.com • www.valledelcauca.gov.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca



El Valle
está en
vos

**MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Página: 13 de 29



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Infraestructura y Valorización

LICITACION PÚBLICA LP-SIV-002-2019

ANEXO 1

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover, cargar y colocar en los sitios de disposición o desecho, los materiales provenientes de los fallos presentes en las vías, indicados en el proyecto, con las modificaciones que ordene el Interventor.

6.10.2 MATERIALES Y EQUIPO

Los materiales provenientes de los fallos presentes en las vías que presenten características adecuadas para uso en la construcción de la obra, serán reservados para colocarlos posteriormente. Su disposición provisional se hará en los sitios aprobados previamente para tal fin por el Interventor.

6.10.3 MEDIDA

La unidad de medida para las excavaciones a máquina (fallos), será el metro cúbico (m³), aproximado al entero, de trabajo realizado de acuerdo con esta especificación y a satisfacción del Interventor en el área definida por éste.

6.10.4 FORMA DE PAGO

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato por excavación a máquina extraída a plena satisfacción del Interventor.

El precio unitario deberá incluir los costos de administración e imprevistos y la utilidad del Constructor.

6.11. RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA < = 10KM

6.11.1 DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste, única y exclusivamente, en el transporte de los materiales provenientes de escombros a máquina, derrumbes, escarificado, excavación, y el transporte de los materiales provenientes de las excavaciones.

6.11.2 MATERIALES Y EQUIPO

Los vehículos para el transporte de materiales estarán sujetos a la aprobación del Interventor y deberán ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias de esta especificación y del programa de trabajo. Deberán estar provistos de los elementos necesarios para evitar contaminación o cualquier alteración perjudicial del material transportado y su caída sobre las vías empleadas para el transporte.

Todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes referentes al control de la contaminación ambiental.

NIT: 890399029-5
Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 • Piso: 13 • Teléfono: 6200020 – 6200000 Ext. 1300 -1303-1322
Correo: licitacionesinfraestructuragob@gmail.com - www.valledelcauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca



**MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Página: 14 de 29



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Infraestructura y Valorización

LICITACION PÚBLICA LP-SIV-002-2019

ANEXO 1

Ningún vehículo de los utilizados por el Constructor para el transporte de materiales provenientes de excavaciones y derrumbes por las vías de uso público podrá exceder las dimensiones y las cargas admisibles por eje y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes al respecto.

6.11.3 MEDIDA

La unidad de medida para las de los materiales provenientes de escombros a máquina, derrumbes, escarificado, de excavación, será el metro cúbico (m³), aproximado al entero, de trabajo realizado de acuerdo con esta especificación y a satisfacción del Interventor en el área definida por éste.

6.11.4 FORMA DE PAGO

El pago de las cantidades de transporte de materiales determinadas en la forma indicada anteriormente, se hará al precio unitario pactado en el contrato, por unidad de medida, conforme a lo establecido en este Artículo y a las instrucciones del Interventor.

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de mano de obra, equipo, herramientas, acarreo y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos aquí contemplados.

6.12 TRANSPORTE DE EQUIPO < 50KM

6.12.1 DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste, única y exclusivamente, al transporte de maquinaria pesada para ser utilizado en la obra.

6.12.2 MATERIALES Y EQUIPO

Los vehículos para el transporte de equipo estarán sujetos a la aprobación del Interventor y deberán ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias de esta especificación y del programa de trabajo. Deberán estar provistos de los elementos necesarios para evitar contaminación o cualquier alteración perjudicial del equipo.

Todos los vehículos para el transporte de equipo deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes referentes al control de la contaminación ambiental y al código nacional de tránsito.

Ningún vehículo de los utilizados por el Constructor para el transporte de equipos por las vías de uso público podrá exceder las dimensiones y las cargas admisibles por eje y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes al respecto.

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 · Piso: 13 · Teléfono: 6200020 – 6200000 Ext. 1300 -1303-1322

Correo: licitacionesinfraestructuragob@gmail.com · www.valledelcauca.gov.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca



El Valle
está en
vos

**MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Página: 15 de 29



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Infraestructura y Valorización

LICITACION PÚBLICA LP-SIV-002-2019

ANEXO 1

6.12.3 MEDIDA

La unidad de medida para transporte de equipo y maquinaria pesada será tonelada - kilómetro (T-Km), aproximado al entero, de trabajo realizado de acuerdo con esta especificación y a satisfacción del Interventor en el área definida por éste.

6.12.4 FORMA DE PAGO

El pago de las cantidades de transporte de equipo determinadas en la forma indicada anteriormente, se hará al precio unitario pactado en el contrato, por unidad de medida, conforme a lo establecido en este Artículo y a las instrucciones del Interventor.

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de mano de obra, equipo, herramientas, acarreo y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos aquí contemplados.

6.13 DEMARCACIÓN INCLUYE MICROESFERAS

6.13.1 DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, transporte y aplicación de pintura de tráfico o resina termoplástica de aplicación en caliente, reflectorizada con microesferas de vidrio para líneas y marcas viales sobre un pavimento, de acuerdo con las dimensiones y los colores que indiquen los planos del proyecto o establezca el Interventor.

6.13.2 MATERIALES Y EQUIPO

Se podrán utilizar pinturas de aplicación en frío, resinas termoplásticas, materiales prefabricados de larga duración o plásticos de dos componentes de aplicación en frío que cumplan los requisitos de la norma.

La pintura de líneas y la elaboración de marcas viales se deberán realizar con un equipo que cumpla lo especificado en la norma en lo referente a este particular y en cada uno de sus puntos.

Se deberá disponer, además, de un camión con capacidad igual o superior a cinco (5) toneladas, adecuado para el transporte de los materiales hasta los frentes de trabajo, lo mismo que las señales verticales de tránsito, conos y barricadas necesarias para informar a los usuarios sobre el cierre de la vía o para restringir la velocidad de circulación cuando se pinta con vía abierta.

6.13.3 MEDIDA

NIT: 890399029-5
Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 • Piso: 13 - Teléfono: 6200020 – 6200000 Ext. 1300 -1303-1322
Correo: licitacionesinfraestructuragob@gmail.com - www.valledecauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca



El Valle
está en
vos

MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Página: 16 de 29



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Infraestructura y Valorización

LICITACION PÚBLICA LP-SIV-002-2019

ANEXO 1

La unidad de medida para la demarcación será metro lineal (ml), aproximado al entero, de trabajo realizado de acuerdo con esta especificación y a satisfacción del Interventor en el área definida por éste.

6.13.4 FORMA DE PAGO

El pago de las cantidades de demarcación determinadas en la forma indicada anteriormente, se hará al precio unitario pactado en el contrato, por unidad de medida, conforme a lo establecido en este Artículo y a las instrucciones del Interventor.

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de mano de obra, equipo, herramientas, acarreo y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos aquí contemplados.

6.14 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2 TIPO I

(Ver Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías – INVIAS). Artículo 431. Tratamiento Superficial Doble.

6.15 SELLO DE ARENA-ASFALTO CON EMULSION CRR-2

(Ver Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías – INVIAS). Artículo 432. Sello Arena - Asfalto.

6.16 TRANSPORTE DE AGREGADO PÉTREO

(Ver Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías – INVIAS).

a. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato

El Contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este Contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y diseños, si el Contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 - Piso: 13 - Teléfono: 6200020 – 6200000 Ext. 1300 -1303-1322

Correo: licitacionesinfraestructuragob@gmail.com - www.valledelcauca.gov.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca



El Valle
está en
vos

**MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Página: 17 de 29



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Infraestructura y Valorización

LICITACION PÚBLICA LP-SIV-002-2019

ANEXO 1

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.


7 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.
- Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
- El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión.
- Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
- El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.
- En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

Postgrado con título	Requisitos de Experiencia General	Requisitos de Experiencia Específica
Especialización	Veinticuatro (24) meses	Doce (12) meses
Maestría	Treinta y seis (36) meses	Dieciocho (18) meses
Doctorado	Cuarenta y ocho (48) meses	Veinticuatro (24) meses

NIT: 890399029-5
Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 · Piso: 13 · Teléfono: 6200020 – 6200000 Ext. 1300-1303-1322
Correo: licitacionesinfraestructuragob@gmail.com - www.valledelcauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca



MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Página: 18 de 29



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Infraestructura y Valorización

LICITACION PÚBLICA LP-SIV-002-2019

ANEXO 1

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la nómina del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del Contrato. Se aclara que los perfiles en deben estar acorde con las profesiones específicas de acuerdo con el proyecto y deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto.

El personal requerido es el siguiente:

- Un (1) Ingeniero Director de Obra
- Tres (3) Ingenieros Residentes de Obra
- Un (1) Ingeniero Especialista en Pavimentos o Infraestructura Vial
- Un (1) Ingeniero Ambiental

DIRECTOR DE OBRA:

El profesional ofrecido para el cargo de DIRECTOR DE OBRA debe acreditar lo siguiente:

1. Poseer matrícula profesional de Ingeniero Civil y/o Ingeniero en Transporte y Vías, vigente.
2. Tener la siguiente experiencia:

- General: Mínimo Diez (10) años, contados entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y el cierre del presente proceso.
- Específica: Haber participado como mínimo en CINCO (5) contratos, como Director de Obra en proyectos relacionados con la CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN DE VIAS.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:

Los profesionales ofrecidos para el cargo de INGENIERO RESIDENTE deben acreditar lo siguiente:

1. Poseer matrícula profesional de Ingeniero Civil y/o Ingeniero en Transportes y Vías, vigente.

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 - Piso: 13 - Teléfono: 6200020 – 6200000 Ext. 1300 -1303-1322

Correo: licitacionesinfraestructuragob@gmail.com - www.valledelcauca.gov.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca

**El Valle
está en
vos**

**MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Página: 19 de 29



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Infraestructura y Valorización

LICITACION PÚBLICA LP-SIV-002-2019

ANEXO 1

2. Tener la siguiente experiencia:

- General: Mínimo ocho (8) años, contados entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y el cierre del presente proceso.
- Específica: Haber participado como mínimo en TRES (03) contratos, como Residente de Obra, de proyectos relacionados con la CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN DE VIAS.

INGENIERO ESPECIALISTA:

El profesional ofrecido para el cargo de INGENIERO ESPECIALISTA debe acreditar lo siguiente:

PREFERIBLEMENTE debe ser Ingeniero Civil en su defecto Ingeniero de Transporte y Vías; que tenga por lo menos Título de Especialista en el Área de Pavimentos y/o Infraestructura Vial y/o Geotecnia Vial. Sólo se considerará la experiencia específica relacionada con OBRAS CIVILES VIALES.

Para el cargo de Especialista debe acreditar lo siguiente:

- Matrícula profesional vigente, título de Especialización y/o Postgrado y/o Maestría y/o Doctorado o superior, en el área vial.
- Tener una experiencia general no menor de diez (10) años, contada a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.
- Poseer experiencia específica en mínimo un (1) proyecto, como Especialista asesor de Obra y/o Interventoría de proyectos relacionados con OBRAS CIVILES VIALES.

INGENIERO AMBIENTAL:

El profesional ofrecido para el cargo de INGENIERO AMBIENTAL debe acreditar lo siguiente:

1. Poseer matrícula profesional de Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Sanitario y Ambiental y/o Ingeniero Ambiental y de Saneamiento en su defecto Ingeniero Civil que tenga por lo menos Título de Especialista

NIT: 890399029-5
Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 • Piso: 13 - Teléfono: 6200020 – 6200000 Ext. 1300 -1303-1322
Correo: licitacionesinfraestructuragob@gmail.com - www.valledelcauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca



El Valle
está en
vos

**MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Página: 20 de 29



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Infraestructura y Valorización

LICITACION PÚBLICA LP-SIV-002-2019

ANEXO 1

en el Área Ambiental. Sólo se considerará la experiencia específica relacionada con OBRAS CIVILES VIALES.

Para el cargo de Especialista debe acreditar lo siguiente:

- Matrícula profesional vigente, título de Especialización y/o Postgrado y/o Maestría y/o Doctorado o superior, en el área ambiental.
- Tener una experiencia general no menor de ocho (8) años, contada a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.
- Poseer experiencia específica en mínimo en dos (2) contratos, como Ingeniero Ambiental de proyectos relacionados con OBRAS CIVILES VIALES y que haya participado en la implementación del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental - PAGA.

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

Profesional Ofrecido para el Cargo	Requisitos de Experiencia General	Requisitos de Experiencia Específica
Ingeniero Director de Obra	Mínimo Diez (10) años, contados entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y el cierre del presente proceso.	Haber participado como mínimo en CINCO (5) contratos, como Director de Obra en proyectos relacionados con LA CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN DE VIAS.
Ingeniero Residente de Obra	Mínimo ocho (8) años, contados entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y el cierre del presente proceso.	Haber participado como mínimo en TRES (03) contratos, como Residente de Obra, de proyectos relacionados con LA CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN DE VIAS.

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco - Carrera 6 Calle 9 y 10 - Piso: 13 - Teléfono: 6200020 - 6200000 Ext. 1300 -1303-1322

Correo: licitacionesinfraestructuragob@gmail.com - www.valledelcauca.gov.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca



El Valle
está en
vos

**MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Página: 21 de 29



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Infraestructura y Valorización

LICITACION PÚBLICA LP-SIV-002-2019

ANEXO 1

Ingeniero Especialista	Preferiblemente debe ser Ingeniero Civil en su defecto Ingeniero en Transportes y Vías; que tenga por lo menos Título de Especialista en el Área de Pavimentos y/o Infraestructura Vial y/o Geotecnia Vial. Sólo se considerará la experiencia específica relacionada con OBRAS CIVILES VIALES. Tener una experiencia general no menor de diez (10) años, contada a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.	Poseer experiencia específica en mínimo un (1) proyecto, como Especialista asesor de Obra y/o Interventoría de proyectos relacionados con OBRAS CIVILES VIALES.
Ingeniero Ambiental	Mínimo ocho (8) años, contados entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y el cierre del presente proceso.	Haber participado como mínimo en DOS (02) contratos, como Ingeniero Ambiental, de proyectos relacionados con LA CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN DE VIAS y que haya participado en la implementación del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA

b. Maquinaria vinculada al Proyecto

1. CAMPERO – CAMIONETA TRANSPORTE DE MATERIALES
2. MOTONIVELADORA – RIPPER
3. RETROEXCAVADORA
4. VOLQUETA 5MTS
5. VIBROCOMPACTADOR CA-15
6. MOTONIVELADORA CAT-12-F
7. VOLQUETA TRANSPORTE MAT. PETREOS 1-10KMS
8. CARROTANQUE DE AGUA
9. FRESADORA - ASFALTO
10. CARROTANQUE IRRIGADOR
11. COMPRESOR

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 · Piso: 13 - Teléfono: 6200020 – 6200000 Ext. 1300-1303-1322

Correo: licitacionesinfraestructuragob@gmail.com - www.valledelcauca.gov.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca



El Valle
está en
vos

MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Página: 22 de 29



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Infraestructura y Valorización

LICITACION PÚBLICA LP-SIV-002-2019

ANEXO 1

12. RETROEXCAVADORA JD-510
13. RETROEXCAVADORA CARGADORA
14. VOLQUETA 6 M3
15. VOLQUETA (ACARREO)
16. CAMA BAJA DISTANCIA < 50KM
17. MAQUINA APLICADORA DE PINTURA
18. CARROTANQUE IRRIGADOR DE ASFALTO, 1000 GALONES DE CAPACIDAD
19. COMPACTADOR NEUMÁTICO DE POTENCIA 70 HP, PESO DE 13 TON
20. COMPRESOR (BARRIDO Y SOPLADO)
21. ESPARCIDOR DE GRAVILLA, ANCHO DE ESPARCIMIENTO 3100MM, VELOCIDAD DE TRABAJO 10—20KM2/H

c. Maquinaria mínima del Proyecto

El equipo mínimo requerido es el siguiente:

1. MOTONIVELADORA - RIPPER
2. FRESADORA DE ASFALTO Y/O HOMOGENIZADORA TIPO FAE
3. VIBROCOMPACTADOR CA-15
4. RETROEXCAVADORA
5. RETROEXCAVADORA CARGADORA
6. CARROTANQUE DE AGUA
7. CARROTANQUE IRRIGADOR DE ASFALTO, 1000 GALONES DE CAPACIDAD
8. COMPACTADOR NEUMÁTICO DE POTENCIA 70 HP, PESO DE 13 TON

Nota: El Contratista, previo al inicio de las actividades en cada tramo a intervenir, deberá entregar la ficha técnica de los equipos con sus respectivos soportes de acuerdo con las NORMAS DEL CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE, para aprobación por parte del Interventor, el cual verificará y emitirá certificación de autorización del equipo a utilizar en cada uno de los tramos a intervenir.

8 POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

NIT: 890399029-5
Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 • Piso: 13 - Teléfono: 6200020 – 6200000 Ext. 1300 -1303-1322
Correo: licitacionesinfraestructuragob@gmail.com - www.valledelcauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca

**El Valle
está en
vos**

**MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Página: 23 de 29



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Infraestructura y Valorización

LICITACION PÚBLICA LP-SIV-002-2019

ANEXO 1

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el Interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del Proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas y certificadas por escrito por la respectiva Interventoría, previo al inicio de las obras. El Contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El Proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la Entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la Interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del Contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas y certificadas por escrito por la respectiva Interventoría, previo al inicio de las obras.

NIT: 890399029-5
Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 · Piso: 13 · Teléfono: 6200020 – 6200000 Ext. 1300 · 1303-1322
Correo: licitacionesinfraestructuragob@gmail.com · www.valledelcauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca



**El Valle
está en
vos**

**MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA




GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Infraestructura y Valorización

LICITACION PÚBLICA LP-SIV-002-2019

ANEXO 1

a. Fuente de Material Roca Muerta para los municipio de Florida y Pradera

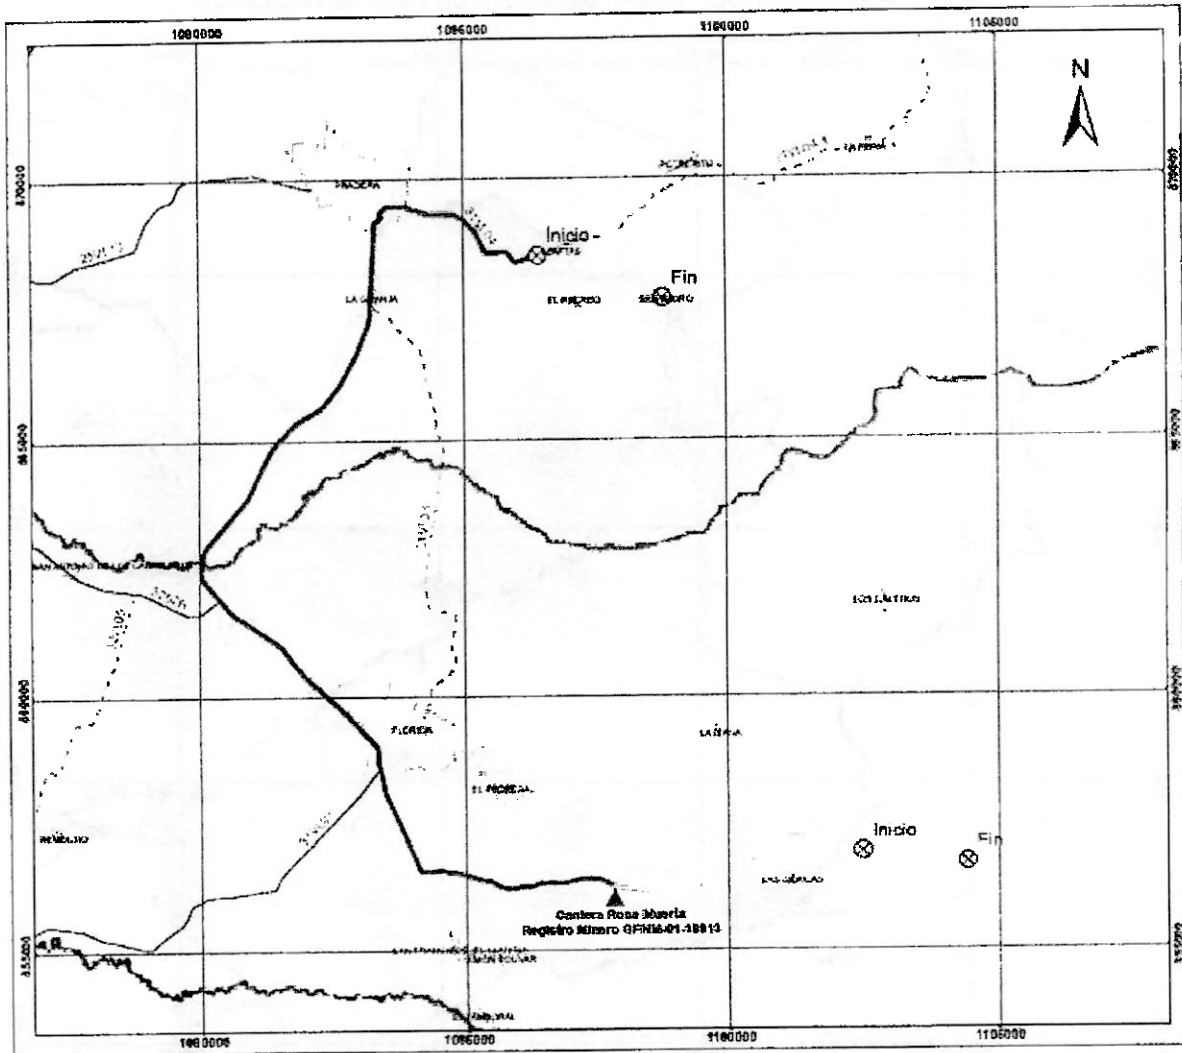

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco - Carrera 6 Calle 9 y 10 - Piso: 13 - Teléfono: 6200020 - 6200000 Ext. 1300-1303-1322

Correo: licitacionesinfraestructuragob@gmail.com - www.valledelcauca.gov.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca

**El Valle
está en
vos**

**MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Página: 25 de 29




GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Infraestructura y Valorización

LICITACION PÚBLICA LP-SIV-002-2019

ANEXO 1

b. Fuente de Material Roca Muerta para los municipio de Roldanillo

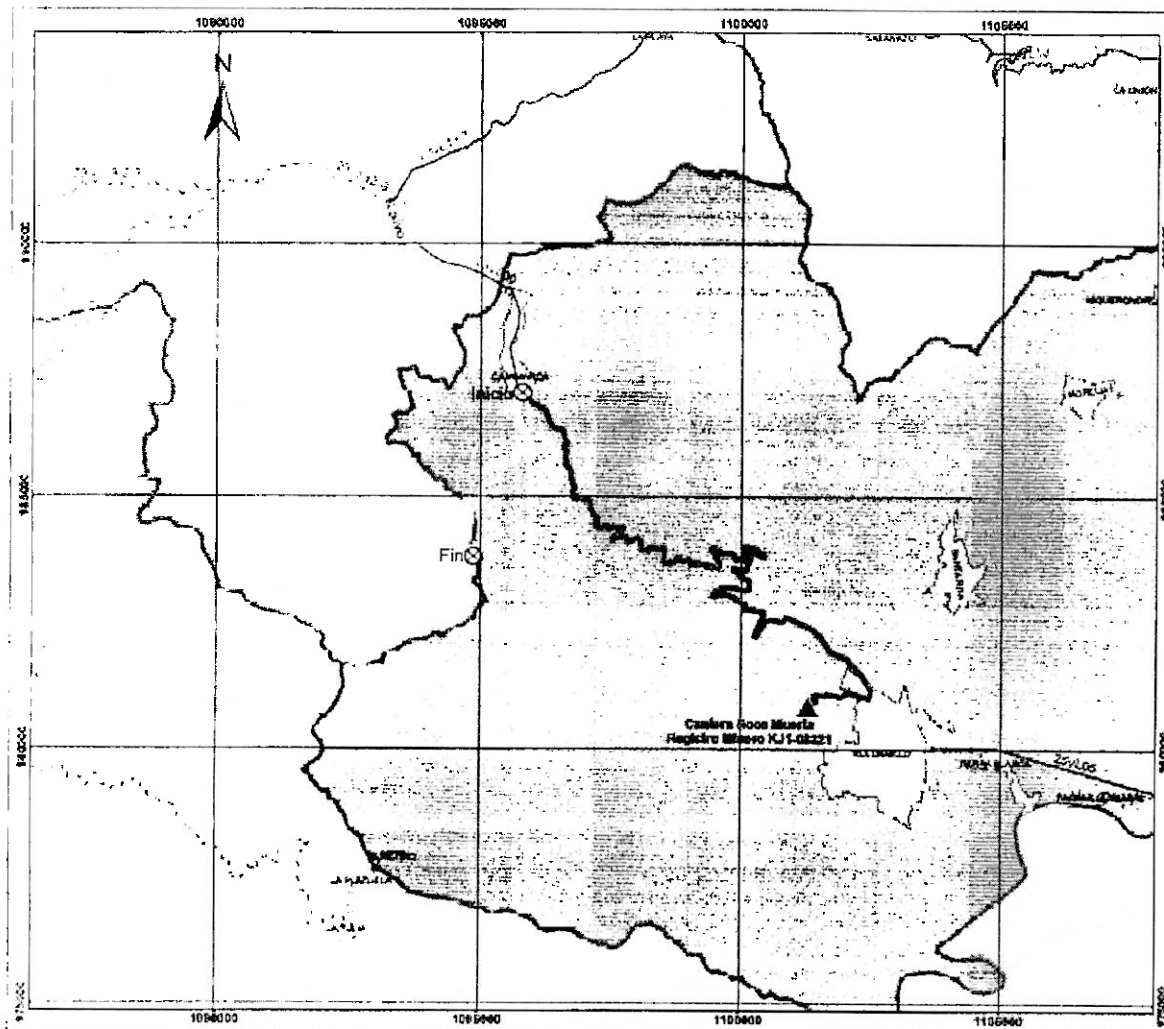

NIT: 890399029-5
Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 • Piso: 13 • Teléfono: 6200020 – 6200000 Ext. 1300 -1303-1322
Correo: licitacionesinfraestructuragob@gmail.com - www.valledelcauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca



El Valle
está en
vos

MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Página: 26 de 29



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Infraestructura y Valorización

LICITACION PÚBLICA LP-SIV-002-2019

ANEXO 1

9 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA

Es responsabilidad del Proponente, inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse, sobre la forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y, de manera especial las fuentes de materiales para su explotación junto con los volúmenes de explotación, vías internas de explotación y vías de acceso a las mismas, zonas de botaderos, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con la normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervención a efectos de obviar el procedimiento de Consulta Previa, y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta.

Así mismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los riesgos previsibles de la obra, pues su desconocimiento o falta de información no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones a la Entidad.

La Entidad señalará las condiciones con las que se llevará a cabo el examen del sitio de la obra, este no podrá ser definido como requisito habilitante o criterio de evaluación de las Propuestas.

10 OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su

NIT: 890399029-5
Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 · Piso: 13 · Teléfono: 6200020 – 6200000 Ext. 1300-1303-1322
Correo: licitacionesinfraestructuragob@gmail.com · www.valledelcauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca

**El Valle
está en
vos**

**MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Página: 27 de 29



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Infraestructura y Valorización

LÍCITACION PÚBLICA LP-SIV-002-2019

ANEXO 1

responsabilidad. Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.

11 SEÑALIZACIÓN

De ser necesario, según los Estudios Previos son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad deberá definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

12 PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

La Gobernación del Valle del Cauca cuenta con concepto 0700-68092018 de fecha 30 de enero de 2018 y concepto 0700-114212018 de fecha 26 de Marzo de 2018, por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, en donde se informa que no se requiere de trámite de licenciamiento ambiental para el proyecto, sin embargo, se deja claridad que en caso de demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales, se deberán tramitar los respectivos permisos (ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, concesión de agua, vertimientos de aguas residuales no domésticas, etc.) ante la Dirección Ambiental Regional correspondiente.

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 • Piso: 13 - Teléfono: 6200020 – 6200000 Ext. 1300 - 1303-1322

Correo: licitacionesinfraestructuragob@gmail.com - www.valledelcauca.gov.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca



El Valle
está en
vos

MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Página: 28 de 29



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Infraestructura y Valorización

LICITACION PÚBLICA LP-SIV-002-2019

ANEXO 1

13 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:

Especificaciones Generales de Construcción del INVÍAS vigentes.

14 DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO: El proyecto dentro de los Estudios y Diseños cuenta con un Plan de Manejo de Tránsito, para su implementación durante la ejecución de los tramos a intervenir en los municipios de Florida, Pradera, Roldanillo y El Dovio, previo al inicio de actividades, y con base en este documento el Contratista elaborará de acuerdo con las condiciones actuales del tránsito de las vías, el Plan de Manejo de Tránsito actualizado, el cual debe ser presentado, aprobado y certificado por escrito por la Interventoría y por la dependencia encargada en cada uno de los municipios que hacen parte del proyecto.

PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL - PAGA: El proyecto dentro de los Estudios y Diseños cuenta con un Plan de Adaptación a la Guía Ambiental - PAGA, para su implementación durante la ejecución de los tramos a intervenir en los municipios de Florida, Pradera, Roldanillo y El Dovio, previo al inicio de actividades, y con base en este documento el Contratista elaborará de acuerdo con las condiciones actuales ambientales de las vías, el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental - PAGA actualizado, el cual debe ser presentado, aprobado y certificado por escrito por la Interventoría. Por otra parte debe realizar los trámites pertinentes, es decir, tener en cuenta el concepto 0700-68092018 de fecha 30 de enero de 2018 y el concepto 0700-114212018 de fecha 26 de Marzo de 2018, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, en donde se informa que no se requiere de trámite de licenciamiento ambiental para el proyecto, sin embargo, se deja claridad que en caso de demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales, se deberán tramitar los respectivos permisos (ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, concesión de agua, vertimientos de aguas residuales no domésticas, etc.) ante la Dirección Ambiental Regional correspondiente.

ORIGINAL FIRMADO

Miguel Ángel Muñoz Narváez
Secretario de Infraestructura y Valorización

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 · Piso: 13 · Teléfono: 6200020 – 6200000 Ext. 1300 -1303-1322

Correo: licitacionesinfraestructuragob@gmail.com - www.valledelcauca.gov.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca




El Valle
está en
vos

**MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Página: 29 de 29

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	ACTA DE SUSPENSIÓN 1	Código: FO-M9-P2-06
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 1 de 6

CONTRATO NÚMERO: 1.310.02-59.8-0581

FECHA: 23- diciembre 2021

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL VALLE. Nit. 901-545.310-6

INTERVENTOR: MARTINEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. NIT: 900.596.808-6

FECHA DE INICIO: 11 de febrero 2022.


FECHA DE SUSPENSIÓN: 01 de junio de 2022.

OBJETO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA


VALOR INICIAL: CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$5.219.088.659)

Entre los suscritos a saber, **FRANK ALEXANDER RAMÍREZ ORDÓÑEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 94.522.032 expedida en Santiago de Cali (Valle del Cauca), en su calidad de **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA** del Departamento del Valle del Cauca, con nombramiento ordinario realizado por medio del Decreto Departamental No. 1-3-0001 del 01 de enero del 2020, habiendo tomado posesión mediante acta No. 0010 el día 01 de enero del 2020, facultado para celebrar la presente Acta según Decreto Departamental No. 1-3-0023 del 07 de enero de 2020, "POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚAN UNAS DELEGACIONES EN MATERIA CONTRACTUAL Y SE DISPONEN MEDIDAS PARA EJERCER EL CONTROL Y VIGILANCIA EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL" quien obra en nombre y representación del Departamento del Valle del Cauca en su condición de **CONTRATANTE**, de una parte y por la otra; el señor **JHON JAIRO CONDE CABRERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.384.752 de Bogotá como representante legal de la firma **CONSORCIO VIAS DEL VALLE**, actuando como Interventor del contrato, y **MARTINEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.**, identificado con el NIT No. 900.596.808-6 cuyo representante legal es el señor el **ING. CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.372.004 de Cali Valle, nos reunimos en las instalaciones de la Gobernación del Valle del Cauca con el objetivo de suspender la ejecución del Contrato de obra No.1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021, con base en las siguientes consideraciones:

Que, en la cláusula CUARTA del Contrato original, el plazo del contrato No. 1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021, es de cinco (06) meses contados a partir del registro presupuestal, aprobación de pólizas y la suscripción del acta de inicio; es decir, del 11 de febrero de 2022.


<div>Departamento del Valle del Cauca</div> <div></div> <div>Gobernación</div>	<div>ACTA DE SUSPENSIÓN 1</div>	Código: FO-M9-P2-06
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 2 de 6

Que mediante oficio VR4-066A-2022 del 01 junio de 2022 suscrito por el señor CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ Representante Legal Martínez & Manrique Arquitectura e Ingeniería S.A.S., se solicita avalar la suspensión del contrato de obra y a su vez, la suspensión del contrato de interventoría, de la siguiente manera: (...) Asunto: ASUNTO: CONTRATO DE INTERVENTORA No. 1.310.02.59.1-0582 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2021. CON OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. SOLICITUD SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. Cordial Saludo, Por medio de la presente, notificamos a la entidad que hemos recibido una comunicación de parte del contratista de obra por medio de oficio CVV-037-2022, en el cual solicita la suspensión del contrato de obra. En la comunicación, el contratista aduce algunas dificultades o factores que han afectado el desarrollo de las obras En la comunicación, el contratista aduce algunas dificultades o factores que han afectado el desarrollo de las obras, sin embargo, esta interventoría hace la salvedad de que solo las siguientes razones expuestas, han sido consideradas: "Las fuertes y constantes precipitaciones han impedido que se pueda avanzar en las actividades contractuales de acuerdo con el cronograma presentado. Prueba de esta situación, es que la Gobernación del Valle del Cauca, mediante Decreto 1-17-236 del 14 de marzo de 2022 (documento anexo a este informe), declara calamidad pública en el departamento, por el término de seis (6) meses, a fin de atender las situaciones presentadas en los diferentes Municipios, de conformidad con la parte considerativa de este decreto y lo señalado en la Ley 1523 de 2012. En la comunicación el contratista de obra también expresa lo siguiente: "A su vez, el 20 de mayo de 2022 el IDEAM informó "...Por lo anterior, y de acuerdo con los centros internacionales de predicción climática, se presenta comportamientos como, una probabilidad del 87% de que esta condición (La Niña) se mantenga durante el trimestre de mayo - junio - julio (Revista Semana)". De acuerdo con lo anterior, y con los reportes suministrados por el IDEAM en Colombia (Adjunto), donde se expone la predicción climática de la precipitación en la cual indica que se mantienen las condiciones del Fenómeno La Niña. Y de acuerdo con la predicción clima para los siguientes meses se espera que: "Junio 2022: Las lluvias por encima de los promedios (con excesos entre 30% y 40% con respecto al promedio) se esperan en sectores del norte de la región Andina, oriente y sur de la Orinoquía, así como en zonas del sur y occidente en la Amazonia. Excesos superiores al 60% se concentrarían en el centro y sur de la región Andina, como también en el norte de La Guajira." "Julio 2022: Las lluvias por encima de los promedios (con excesos alrededor del 60% respecto al promedio) se estiman en amplias extensiones de las regiones Caribe (continental e insular) y Andina, incluidos sectores del sur en la región Pacífica y zonas de piedemonte en la Orinoquía y Amazonia." El contratista de obra, presento también el siguiente análisis por tramo, con el objeto de sustentar y evidenciar la suspensión: -Tramo Florida y Tramo Pradera. El proyecto se encuentra a una altura promedio de 1852 msnm, pero la estación pluviométrica más cercana con información actualizadas es FLORIDA [26070760], la cual se encuentra en el casco urbano del municipio de Florida a 1059 msnm. De acuerdo a lo anterior, es pertinente asumir que la precipitación del tramo es mayor a la registrada por estación, puesto que su altitud es mayor y se encuentra en zona montañosa. En el caso del tramo de Pradera, La estación más cercana al proyecto es la estación LAS BRISAS, pero la información de dicha estación es de baja confiabilidad puesto que está limitada al periodo del año 2011 al año 2016. En consecuencia, se toman los datos del 2022 de la estación FLORIDA, que se encuentra a 9.5 Km del punto de inicio de pradera. Para el análisis, se tomaron datos comprendidos entre el 2000 y el 2022, los cuales se muestran a continuación: A pesar de que el valor promedio mensual disminuyera en el mes de mayo, de acuerdo a los reportes hidroclimatológicos mensuales de la CVC "Tras 16 meses de superávit de lluvias en la región, la mayoría de los suelos en la zona de ladera presentan diferentes grados de afectación por sobrecarga de humedad, tal situación impacta su estabilidad y los hace vulnerables a prestar derrumbes y deslizamientos de tierra; las afectaciones ya se hacen evidentes especialmente en las estribaciones de la cordillera central y han afectado el suministro de agua potable, las vías y el desarrollo de los cultivos. (...) continuamos bajo la influencia del fenómeno La Niña y de acuerdo a la NOAA esta permanecerá por lo menos hasta el mes de septiembre (reportes hidroclimatológicos - Abril 2022 - CVC) (...) En consecuencia, a lo anterior, este consorcio

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	ACTA DE SUSPENSIÓN 1	Código: FO-M9-P2-06 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 15/08/2018 Página: 3 de 6
---	-----------------------------	---

presentó toda la documentación necesaria para adicionar cunetas y filtros al tramo de Florida, puesto que cualquier intervención que se realice en la vía, se vera directamente afectada, por las condiciones del terreno y disminuirá la vida útil de la misma. - Tramo Roldanillo – El Dovio. El Municipio de Roldanillo, cuenta con variaciones de altura desde 1350 msnm, hasta 2400 msnm, con una precipitación máxima promedio mensual de 9.06 mm. La estación más cercana al proyecto es la estación LITUANIA, la cual cuenta con información actualizada a marzo de 2022. Es pertinente señalar que este tramo también cuenta con fallos importantes dentro de la vía, a causa del mal manejo de la escorrentía superficial. En consecuencia, se requieren rellenos y filtros para garantizar la vida útil de la vía después de su intervención. Al comparar información disponible del 2022, con los valores promedio de precipitaciones mensuales total del periodo comprendido entre el 2000 y el 2021, se observa un aumento en la precipitación mensual. Dentro de este tramo, se presentan zonas erosionadas por la escorrentía superficial. Es pertinente señalar que la subrasante donde se planea implementar un mejoramiento con Polímeros Bifásicos requiere la humedad óptima de aplicación, la cual asegura el nivel de compactación y comportamiento idóneo del diseño. Los periodos con precipitaciones obstaculizan las labores. La dosificación implica una cantidad de producto de acuerdo con la caracterización del suelo para dar el mejor comportamiento posible, al realizar la aplicación del producto se contempla la humedad natural y llevándola a humedad óptima la cual se verá afectada si se realiza el trabajo en presencia de precipitaciones, llevando a un estado de saturación imposibilitando la actuación química por exceso de agua, modificando la dosificación y por tanto perdiendo la calidad esperada. En consecuencia, a las precipitaciones y falta de días secos, se imposibilita la realización de estas labores. Y una vez expuestas las razones, el contratista procede a realizar la siguiente solicitud: "En consecuencia, a lo expuesto anteriormente, este consorcio solicite una suspensión de sesenta (60) días a partir de la fecha, con el fin de evitar más pérdidas económicas y garantizar la calida de la vía a intervenir. "Tomando en cuenta las razones expuestas por el Contratista de obra, esta interventoría considera viable basarse en el concepto de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación del 29 de octubre de 1936 sobre la Teoría de la Imprevisión: "La Teoría de la Imprevisión, consiste en la ocurrencia de hechos extraordinarios posteriores al contrato, que no hayan podido ser previstos por las partes, cuyo acaecimiento sin hacer completamente imposible el cumplimiento de la obligación, lo dificultan en forma extrema, haciéndolo tan oneroso, que el contrato pierde para la parte obligada todo sentido y finalidad. No se trata en suma de una imposibilidad absoluta de cumplir, lo que constituye ya la fuerza mayor, sino de una imposibilidad relativa, como la proveniente de una grave crisis económica, de una guerra, etc. Para la aplicación contractual de esta Teoría, se debe demostrar que las nuevas circunstancias exceden las previsiones que racionalmente podían hacerse al tiempo de contratar. Jurisprudencialmente se ha establecido que la Teoría de la Imprevisión, "no puede aplicarse sino a los contratos en ejecución, pero no a los ya cumplidos, porque entonces el acto jurídico ya no existe". "Por lo anterior, y considerando las razones expuestas por el contratista de obra podemos concluir que los hechos que ocasionan la presente solicitud se consideran imprevisibles e irresistibles, puesto que se deben a un fenómeno natural "LA NIÑA" que afecta las condiciones en las cuales esta concebida la ejecución del contrato. Por lo anterior, esta interventoría recomienda a la entidad otorgar la suspensión para el contrato de obra a partir del día 01 de junio hasta el día 30 de julio del presente año. Con el objeto de evaluar las posibles mejoras en el comportamiento climático en la zona y dar reinicio a las actividades. Las fechas del contrato estarían determinadas de la siguiente manera. Fecha de inicio de la suspensión: 01 de junio de 2022 Fecha de terminación de la suspensión: 30 de julio de 2022 Fecha de reinicio: 31 de julio de 2022 Nueva fecha de terminación: 11 de octubre de 2022. Es importante dejar previsto, que este acto administrativo no ocasiona ningún daño o perjuicio al contratista de obra y a la interventoría. (...).


Que mediante oficio número **CVV-037-2022**, de 01 de junio de 2022, el contratista de obra **CONSORCIO VIAS DEL VALLE** solicitó la suspensión de la ejecución del contrato de obra No. 1.310.02-59.8-0581, por las siguientes razones: (...) REF. Contrato de obra No. 1.310.02-59.8-0581 - "MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VIAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA." Asunto: SOLICITUD SUSPENSIÓN DE OBRA Cordial Saludo. De manera atenta nos permitimos solicitar la suspensión de la obra en referencia, debido

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	Código: FO-M9-P2-06	
	Versión: 01	
	Fecha de Aprobación: 15/08/2018	
	Página: 4 de 6	

ACTA DE SUSPENSIÓN 1

a la temporada de lluvias por la que está pasando el departamento. Las fuertes y constantes precipitaciones han impedido que se pueda avanzar en las actividades contractuales de acuerdo con el cronograma presentado; generando retrasos por al menos 60 días. Esta situación fue reportada el día 25 de mayo de 2022, mediante el oficio CVV-034-2022, apoyándonos en los reportes de las estaciones pluviométricas del IDEAM cercanas a las obras. A su vez, el 20 de mayo de 2022 el IDEAM informó "... Por lo anterior, y de acuerdo con los centros internacionales de predicción climática, se presentan comportamientos como, una probabilidad del 87 % de que esta condición (La Niña) se mantenga durante el trimestre mayo-junio-julio" (Revista Semana). A continuación, presentamos un análisis hidroclimático de cada tramo con el fin de sustentar la suspensión: - Tramo Florida y Tramo Pradera El proyecto se encuentra a una altura promedio de 1852 msnm, pero la estación pluviométrica más cercana con información actualizada es FLORIDA [26070760], la cual se encuentra en el caso urbano del municipio de Florida a 1059 msnm. De acuerdo a lo anterior, es pertinente asumir que la precipitación del tramo es mayor a la registrada por estación, puesto que su altitud es mayor y se encuentra en zona montañosa. A pesar de que el valor promedio mensual disminuyera en el mes de mayo, de acuerdo a los reportes hidroclimáticos mensuales de la CVC "...Tras 16 meses de superávit de lluvias en la región, la mayoría de los suelos en sus zonas de ladera presentan diferentes grados de afectación por sobrecarga de humedad, tal situación impacta su estabilidad y los hace vulnerables a presentar derrumbes y deslizamientos de tierra. Las afectaciones ya se hacen evidentes especialmente en las estribaciones de la cordillera central y han afectado el suministro de agua potable, las vías y el desarrollo de los cultivos. (...) continuamos bajo la influencia del fenómeno La Niña y de acuerdo a la NOAA esta permanecerá por lo menos hasta el mes de septiembre." (reportes hidroclimáticos - Abril 2022- CVC (...)). En consecuencia, a lo anterior, este consorcio solicitó la suspensión de labores en el tramo y presentó toda la documentación necesaria para adicionar cunetas y filtros al tramo de Florida, puesto que cualquier intervención que se realice en la vía, se verá directamente afectada por las condiciones del terreno y disminuirá la vida útil de la misma. Dicha información se encuentra en proceso de revisión por la interventoría. De acuerdo a la información presentada anteriormente, se puede concluir que en el presente año las lluvias han superado los valores medios esperados en los tramos de Florida y Pradera. Dicha condición ha generado retrasos en el tramo de Florida, causados principalmente por derrumbes y falta de estructuras para el manejo de escorrentía. Es pertinente señalar que la subrasante donde se planea implementar un mejoramiento con Polímeros bifásicos, requiere la una humedad óptima de aplicación la cual asegura el nivel de compactación y comportamiento idóneo del diseño los periodos con precipitaciones obstaculizan las labores. La dosificación implica una cantidad de producto de acuerdo con la caracterización del suelo para dar el mejor comportamiento posible, al realizar la aplicación del producto se contempla la humedad natural y llevándola a humedad óptima la cual se verá afectada si se realiza el trabajo en presencia de precipitaciones, llevando a un estado de saturación imposibilitando la actuación química por exceso de agua, modificando la dosificación y por tanto perdiendo la calidad esperada. En consecuencia, a las precipitaciones y falta de días secos, se imposibilita la realización de estas labores. Nos permitimos resaltar las labores del consorcio ante la situación climática, puesto que continuamos labores en el tramo de Florida a pesar de las pérrimas condiciones ya justificadas, los constantes derrumbes y el traslado y profundización de la red de acueducto veredal de la zona; actividad que no se encontraba dentro del contrato. A su vez, señalamos que la decisión de iniciar en este tramo se dio debido a la presión de la comunidad indígena de la zona. En consecuencia, a lo expuesto anteriormente, este consorcio solicita una suspensión de 60 días a partir de la fecha, con el fin de evitar más pérdidas económicas y garantizar la calidad de la vía a intervenir.

Que mediante oficio número 1.310.10.52 del día 01 de junio de 2022, el supervisor del contrato ALFREDO BAYARDO ALMEIDA GARCIA, Subsecretario de Infraestructura del Transporte, solicitó lo siguiente: (...): REFERENCIA: Contrato de obra No. 1.310.02-59.8-0581 que tiene por objeto: "MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA". ASUNTO: Aval a la solicitud de suspensión de los contrato citado en la referencia En atención al comunicado VR4-066A-2022 del 1 de junio de 2022 suscrito por el señor CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ, representante legal de Martinez & Manrique Arquitectura e Ingeniería S.A.S. del contrato citado en la Referencia por medio del cual considera pertinente y viable la solicitud de suspensión al contrato de obra N° 1.310.02-59.8-

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	Código: FO-M9-P2-06
	Versión: 01
	Fecha de Aprobación: 15/08/2018
	Página: 5 de 6

ACTA DE SUSPENSIÓN 1


0581, es necesario sobre el particular realizar las siguientes precisiones: Mediante comunicado CVV-037-2022 del 1 de junio de 2022 el señor JOHN JAIRO CONDE CARRERA, Representante Legal del CONSORCIO VIAS DEL VALLE, en calidad de contratista del contrato citado en la Referencia, argumentó lo siguiente: "(...) De manera atenta nos permitimos solicitar la suspensión de la obra en referencia, debido a la temporada de lluvias por la que esta pasando el departamento. Las fuertes y constantes precipitaciones han impedido que se pueda avanzar en las actividades contractuales de acuerdo con el cronograma presentado; generando retrasos por al menos 60 días. Esta situación fue reportada el día 25 de mayo de 2022, mediante el oficio CVV-034-2022, apoyándonos en los reportes de las estaciones pluviométricas del IDEAM cercanas a las obras. A su vez, el 20 de mayo de 2022 el IDEAM informó "... Por lo anterior, y de acuerdo con los centros internacionales de predicción climática, se presentan comportamientos como, una probabilidad del 87 % de que esta condición (La Niña) se mantenga durante el trimestre mayo-junio-julio" (Revista Semana) A continuación, presentamos un análisis hidroclimológico de cada tramo con el fin de sustentar la suspensión: - Tramo Florida y Tramo Pradera El proyecto se encuentra a una altura promedio de 1852 msnm, pero la estación pluviométrica más cercana con información actualizada es FLORIDA [26070760], la cual se encuentra en el casco urbano del municipio de Florida a 1059 msnm. De acuerdo a lo anterior, es pertinente asumir que la precipitación del tramo es mayor a la registrada por estación, puesto que su altitud es mayor y se encuentra en zona montañosa. En el caso del tramo de Pradera, La estación más cercana al proyecto es la estación LASBRISAS, pero la información de dicha estación es de baja confiabilidad puesto que está limitada al periodo del año 2011 al año 2016. En consecuencia, se toman los datos del 2022 de la estación FLORIDA, que se encuentra a 9.5 km del punto de inicio de Pradera. Para el análisis, se tomaron datos comprendidos entre el 2000 y el 2022 los cuales se muestran a continuación: A pesar de que el valor promedio mensual disminuyera en el mes de mayo, de acuerdo a los reportes hidroclimáticos mensuales de la CVC "...Tras 16 meses de superávit de lluvias en la región, la mayoría de los suelos en sus zonas de ladera presentan diferentes grados de afectación por sobrecarga de humedad, tal situación impacta su estabilidad y los hace vulnerables a presentar derrumbes y deslizamientos de tierra; las afectaciones ya se hacen evidentes especialmente en las estrías de la cordillera central y han afectado el suministro de agua potable, las vías y el desarrollo de los cultivos. (...) continuamos bajo la influencia del fenómeno La Niña y de acuerdo a la NOAA esta permanecerá por lo menos hasta el mes de septiembre." (reportes hidroclimáticos - Abril 2022-CVC)...".Consecuentemente con el oficio No. VR4-066A-2022 del 1 de junio del año en curso emitido por el representante legal de Martínez & Manrique Arquitectura e Ingeniería S.A.S., en el que viabiliza la solicitud hecha por el contratista de obra..."Tomando en cuenta las razones expuestas por el Contratista de obra, esta interventoría considera viable basarse en el concepto de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación del 29 de octubre de 1936 sobre la Teoría de la Imprevisión: "La Teoría de la Imprevisión, consiste en la ocurrencia de hechos extraordinarios posteriores al contrato, que no hayan podido ser previstos por las partes, cuyo acaecimiento sin hacer completamente imposible el cumplimiento de la obligación, lo dificultan en forma extrema, haciéndolo tan oneroso, que el contrato pierde para la parte obligada todo sentido y finalidad. No se trata en suma de una imposibilidad absoluta de cumplir, lo que constituye ya la fuerza mayor, sino de una imposibilidad relativa, como la proveniente de una grave crisis económica, de una guerra, etc. Para la aplicación contractual de esta Teoría, se debe demostrar que las nuevas circunstancias exceden las previsiones que racionalmente podían hacerse al tiempo de contratar. Jurisprudencialmente se ha establecido que la Teoría de la Imprevisión, "no puede aplicarse sino a los contratos en ejecución, pero no a los ya cumplidos, porque entonces el acto jurídico ya no existe". Por lo anterior, y considerando las razones expuestas por el contratista de obra podemos concluir que los hechos que ocasionan la presente solicitud se consideran imprevisibles e irresistibles, puesto que se deben a un fenómeno natural "LA NIÑA" que afecta las condiciones en las cuales está concebida la ejecución del contrato. Por lo anterior, esta interventoría recomienda a la entidad otorgar la suspensión para el contrato de obra a partir del día 01 de junio hasta el día 30 de julio del presente año. Con el objeto de evaluar las posibles mejoras en el comportamiento climático en la zona y dar reinicio a las actividades..." En este orden, me permito manifestarle que, una vez revisado lo anteriormente expuesto, como supervisor considero procedente la suspensión de los contratos de la referencia desde 1 junio de 2022 hasta el día 30 de julio de 2022 (...)

Que la celebración de la presente acta de suspensión no genera costos adicionales para el Departamento.

Que en caso de superar las causas que motivaron la suspensión, la fecha de reinicio del contrato de obra pública No. 1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021 será el día 31 de julio de 2022

Por consiguiente:

ACORDAMOS

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	ACTA DE SUSPENSIÓN 1	Código: FO-M9-P2-06
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 6 de 6

PRIMERO: Suspender la ejecución del contrato de obra pública No. 1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021, desde el primero (01) de junio de 2022, hasta el día treinta (30) de julio de 2022.


SEGUNDO: Como consecuencia de la suspensión de la vigencia del contrato de obra pública No. 1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021, el plazo de este será hasta el día 11 de octubre de 2022.

TERCERO: El Contratista CONSORCIO VIAS DEL VALLE, se obliga a ajustar la Garantía Única, una vez se reinicie el contrato en los términos establecidos en el mismo y en la presente Acta de Suspensión.

CUARTO: La suspensión del presente contrato no genera costos adicionales para el Departamento.

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los 1 días del mes de junio de año 2022



FRANK ALEXANDER RAMÍREZ ORDÓÑEZ
 Secretario de Infraestructura
 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA


JHON JAIRO CONDE CABRERA
 C.C. 79.884.752 de Bogotá
 Representante Legal
 CONSORCIO VIAS DEL VALLE
 Contratista


CARLOS DAVID MARTÍNEZ VELEZ
 CC: 94.372.004 de Cali Valle.
 Representante Legal
 MARTINEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
 Interventoría

Revisó: Doris Yazmin Larrotta - Abogada contratista SIV
 Aprobó: Aspectos jurídicos: Juliana Álvarez Ordoñez - Jefe Oficina Jurídica SIV

Revisión	Aprobación
Aprobó: Aspectos jurídicos: Juliana Álvarez Ordoñez - Jefe Oficina Jurídica SIV. Elaboración Nombre: Juan Gabriel Rojas Cargo: Subdirector de Contratación, Contratista	Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión Acta N. 006
Firma: Fecha: 10/08/2018	Firma: Fecha: 15/08/2018

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	ACTA DE PRORROGA DE LA SUSPENSIÓN No.1	Código: FO-M9-P2-06
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 1 de 4

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 1.310.02-59.8-0581

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 23 de diciembre 2021

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL VALLE. Nit. 901-545.310-6

INTERVENTOR: MARTINEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. NIT: 900.596.808-6

FECHA DE INICIO: 11 de febrero 2022.

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 01 de junio de 2022, al de 30 julio 2022.

FECHA DE PRORROGA DE LA SUSPENSIÓN No1 desde el 31 de julio de 2022 hasta el 30 de agosto de 2022.


FECHA DE REINICIO: 31 de agosto de 2022.

OBJETO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR INICIAL: CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$5.219.088.659).

Entre los suscritos a saber, **FRANK ALEXANDER RAMÍREZ ORDÓÑEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 94.522.032 expedida en Santiago de Cali (Valle del Cauca), en su calidad de **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA** del Departamento del Valle del Cauca, con nombramiento ordinario realizado por medio del Decreto Departamental No. 1-3-0001 del 01 de enero del 2020, habiendo tomado posesión mediante acta No. 0010 el día 01 de enero del 2020, facultado para celebrar la presente Acta según Decreto Departamental No. 1-3-0023 del 07 de enero de 2020, "POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚAN UNAS DELEGACIONES EN MATERIA CONTRACTUAL Y SE DISPONEN MEDIDAS PARA EJERCER EL CONTROL Y VIGILANCIA EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL" quien obra en nombre y representación del Departamento del Valle del Cauca en su condición de **CONTRATANTE**, de una parte y por la otra; el señor **JHON JAIRO CONDE CABRERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.384.752 de Bogotá como representante legal de la firma **CONSORCIO VIAS DEL VALLE**, actuando como Interventor del contrato, y **MARTINEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.**, identificado con el NIT No. 900.596.808-6 cuyo representante legal es el señor el **ING. CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.372.004 de Cali Valle, nos reunimos en las instalaciones de la Gobernación del Valle del Cauca con el objetivo de prorrogar la suspensión No.1 de la ejecución del Contrato de obra No.1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021, con base en las siguientes consideraciones:


Que, en la cláusula CUARTA del Contrato original, el plazo del contrato No. 1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021, es de seis (06) meses contados a partir del registro

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	ACTA DE PRORROGA DE LA SUSPENSIÓN No.1	Código: FO-M9-P2-06
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 2 de 4

presupuestal, aprobación de pólizas y la suscripción del acta de inicio; es decir, del 11 de febrero de 2022.

Que mediante oficio VR4-068A-2022 del 31 de julio de 2022 suscrito por el señor CARLOS DAVILA MARTINEZ VELEZ, representante legal interventoría del MARTINEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S., solicitó:

(...) **ASUNTO:** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1.310.02.59.1-0582 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2021.
CON OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. SOLICITUD DE PRORROGA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. Cordial Saludo, Mediante la presente, notificamos a la entidad que hemos recibido una comunicación de parte del contratista de obra por medio de oficio CVV-055-2022, en el cual solicitan prórroga No. 1 a la suspensión No. 1 del contrato de obra. En la comunicación, el contratista aduce nuevamente la siguiente dificultad o factor que sigue afectado el desarrollo de las obras: "La temporada de lluvias por las que está pasando el departamento no cesa, manteniéndose las fuertes y constantes precipitaciones que son un impedimento para poder ejecutar las actividades contractuales." Prueba de esta situación, es que la Gobernación del Valle del Cauca, mediante Decreto 1-17-0236 del 14 de marzo de 2022 (documento anexo a este informe), declara calamidad pública en el departamento, por el término de seis (6) meses, a fin de atender las situaciones presentadas en los diferentes Municipios, de conformidad con la parte considerativa de este decreto y lo señalado en la Ley 1523 de 2012.(...) Considerando lo expresado en oficio CVV-037-2022, suministrado por el Contratista CONSORCIO VIAS DEL VALLE el 01 de junio de 2022, donde señala que la subrasante donde se planea implementar un mejoramiento con Polímeros Bifásicos, requiere la humedad óptima de aplicación, la cual asegura el nivel de compactación y comportamiento idóneo del diseño. Los períodos con precipitaciones obstaculizan las labores. La dosificación implica una cantidad de producto de acuerdo con la caracterización del suelo para dar el mejor comportamiento posible, al realizar la aplicación del producto se contempla la humedad natural y llevándola a humedad óptima la cual se verá afectada si se realiza el trabajo en presencia de precipitaciones, llevando a un estado de saturación imposibilitando la actuación química por exceso de agua, modificando la dosificación y por tanto perdiendo la calidad esperada. En consecuencia, a las precipitaciones y falta de días secos, se imposibilita la realización de estas labores. Por las razones expuestas, el contratista procede a realizar la siguiente solicitud: "En consecuencia, a lo expuesto anteriormente, este consorcio solicita una prórroga a la suspensión de treinta (30) días a partir de la fecha, con el fin de evitar más pérdidas económicas y garantizar la calidad de la vía a intervenir." Tomando en cuenta las razones nuevamente expuestas por el Contratista de obra, esta interventoría considera viable basarse en el concepto de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación del 29 de octubre de 1986 sobre la Teoría de la Imprevisión: "La Teoría de la Imprevisión, consiste en la ocurrencia de hechos extraordinarios posteriores al contrato, que no hayan podido ser previstos por las partes, cuyo acaecimiento sin hacer completamente imposible el cumplimiento de la obligación, lo dificultan en forma extrema, haciéndolo tan oneroso, que el contrato pierde para la parte obligada todo sentido y finalidad. No se trata en suma de una imposibilidad absoluta de cumplir, lo que constituye ya la fuerza mayor, sino de una imposibilidad relativa, como la proveniente de una grave crisis económica, de una guerra, etc. Para la aplicación contractual de esta Teoría, se debe demostrar que las nuevas circunstancias exceden las previsiones que racionalmente podían hacerse al tiempo de contratar. Jurisprudencialmente se ha establecido que la Teoría de la Imprevisión, "no puede aplicarse sino a los contratos en ejecución, pero no a los ya cumplidos, porque entonces el acto jurídico ya no existe." Por lo anterior, y considerando las razones expuestas por el contratista de obra podemos concluir que los hechos que ocasionan la presente solicitud se consideran imprevisibles e irresistibles, puesto que se deben a un fenómeno natural "LA NIÑA" que afecta las condiciones en las cuales está concebida la ejecución del contrato. Por lo anterior, esta interventoría recomienda a la entidad otorgar prórroga a la suspensión para el contrato de obra a partir del día 31 de julio hasta el día 30 de agosto del presente año. Con el objeto de evaluar las posibles mejoras en el comportamiento climático en la zona y dar reinicio a las actividades, Las fechas del

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	ACTA DE PRORROGA DE LA SUSPENSIÓN No.1	Código: FO-M9-P2-06
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 3 de 4

contrato estarían determinadas de la siguiente manera, Fecha de inicio de la suspensión No. 1: 01 de junio de 2022. Fecha de terminación de la suspensión No. 1: 30 de julio de 2022. Fecha de Inicio Prorroga No. 1 de la suspensión No. 1: 31 de julio de 2022, Fecha de terminación Prorroga No 1 de la suspensión No 1: 30 de agosto de 2022. Fecha de reinicio No. 1: 31 de agosto de 2022. Nueva fecha de terminación: 10 de noviembre de 2022. Es importante dejar previsto, que este acto administrativo no ocasiona ningún daño o perjuicio al contratista de obra y a la interventoría. (...).

Que mediante oficio CVV-055-2022, julio 28 de 2022, el contratista de obra CONSORCIO VIAS DEL VALLE solicitó prorrogar la suspensión No1 de la ejecución del contrato de obra No. 1.310.02-59.8-0581, por las siguientes razones:


(...) "REF. Contrato de obra No. 1.310.02-59.8-0581 – "MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.". Asunto: SOLICITUD PRORROGA SUSPENSIÓN DE OBRA. Cordial Saludo. De manera atenta nos permitimos dar alcance al oficio CVV 037-2022 "SOLICITUD SUSPENSIÓN DE OBRA", y por medio del presente solicitar se prorrogue la suspensión de la obra en referencia, debido a que la temporada de lluvias por la que está pasando el departamento no cesa, manteniéndose la fuertes y constantes precipitaciones que son un impedimento para poder ejecutar las actividades contractuales. En consecuencia, a lo expuesto anteriormente, este consorcio solicita una prórroga a la suspensión de 30 días, con el fin de evitar más pérdidas económicas y garantizar la calidad de la vía a intervenir. (...)"

Que mediante oficio número 1.310.10.52 del día 31 de julio de 2022, el supervisor del contrato ALFREDO BAYARDO ALMEIDA GARCIA, Subsecretario de Infraestructura del Transporte, solicito lo siguiente:

(...): REFERENCIA: Contrato de obra No. 1.310.02-59.8-0581 que tiene por objeto: "MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA". ASUNTO: Aval a la solicitud de prórroga a la suspensión No.1 del contrato citado en la referencia. En atención al comunicado VR4-068A-2022 del 30 de junio de 2022 suscrito por el señor CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ, representante legal de Martínez & Manrique Arquitectura e Ingeniería S.A.S. del contrato citado en la Referencia por medio del cual considera pertinente y viable la solicitud de suspensión al contrato de obra N° 1.310.02-59.8-0581, es necesario sobre el particular realizar las siguientes precisiones: "(...), considerando las razones expuestas por el contratista de obra podemos concluir que los hechos que ocasionan la presente solicitud se consideran imprevisibles e irresistibles, puesto que se deben a un fenómeno natural, "LA NIÑA" que afecta las condiciones en las cuales está concebida la ejecución del contrato. Por lo anterior, esta interventoría recomienda a la entidad otorgar prórroga a la suspensión para el contrato de obra a partir del día 31 de julio hasta el día 30 de agosto del presente año. Con el objeto de evaluar las posibles mejoras en el comportamiento climático en la zona y dar reinicio a las actividades. En este orden, me permito manifestarle que, una vez revisado lo anteriormente expuesto, como supervisor considero procedente la prórroga de la suspensión del contrato de la referencia desde 31 julio de 2022 hasta el día 30 de agosto de 2022. (...)"

Que en caso de superar las causas que motivaron la prórroga de suspensión No.1, la fecha de reinicio del contrato de obra pública No. 1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021 será el día 31 de agosto de 2022

Teniendo en cuenta lo anterior es menester indicar que es viable la suscripción de la presente prórroga y que la celebración de la misma no genera costos adicionales para el Departamento.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	ACTA DE PRORROGA DE LA SUSPENSIÓN No.1	Código: FO-M9-P2-06
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 4 de 4

Por consiguiente:

ACORDAMOS


PRIMERO: Prorrogar la suspensión No.1 de la ejecución del contrato de obra pública No. 1.310.02-59.8-0581 suscrito el 23 de diciembre de 2021, desde el treinta y uno (31) de julio de 2022, hasta el día treinta (30) de agosto de 2022. Reinicio 31 de agosto de 2022.


SEGUNDO: Como consecuencia de la prórroga de la suspensión No.1 de la vigencia del contrato de obra pública No. 1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021, el plazo de este será hasta el día 10 de noviembre de 2022.

TERCERO: El Contratista **CONSORCIO VIAS DEL VALLE**, se obliga a ajustar la Garantía Única, una vez se reinicie el contrato en los términos establecidos en el mismo y en la presente Acta de Suspensión.

CUARTO: La prórroga de la suspensión del presente contrato no genera costos adicionales para el Departamento.

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los 31 días del mes de Ago de año 2022


FRANK ALEXANDER RAMÍREZ ORDÓÑEZ
 Secretario de Infraestructura
 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA


JOHN JAIRO CONDE CABRERA
 CC: 9.384.752 de Bogotá
 Representante Legal
CONSORCIO VIAS DEL VALLE
 Contratista



CARLOS DAVID MARTÍNEZ VELEZ
 CC: 94.372.004 de Cali Valle.
 Representante Legal
MARTINEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
 Interventoría

Proyecto: Doris Yazmin Larrotta Abogada Contratista SIV.

Revisión: Lorena Zapata Molina - Abogada Contratista

Aprobación: Aspectos jurídicos: Juliana Álvarez Ordóñez - Jefe Oficina Jurídica SIV

Revisión		Aprobación
Aprobó: Aspectos jurídicos: Juliana Álvarez Ordóñez - Jefe Oficina Jurídica SIV. Elaboración		Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión Acta N. 006
Nombre: Juan Gabriel Rojas	Nombre: Diana Lorena Vanegas Cajiao	
Cargo: Subdirector de Contratación, Contratista	Cargo: Directora Jurídica	
Firma:	Firma:	
Fecha: 10/08/2018	Fecha: 10/08/2018	Fecha: 15/08/2018

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	ACTA DE REINICIO	Código: FO-M9-P2-06
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 1 de 4

CONTRATO NÚMERO: 1.310.02-59.8-0581

FECHA: 23- diciembre 2021

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL VALLE. Nit. 901-545.310-6

INTERVENTOR: MARTINEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. NIT: 900.596.808-6

FECHA DE INICIO: 11 de febrero 2022.

FECHA DE SUSPENSIÓN: 01 de junio de 2022.al de 30 julio

FECHA DE PRORROGA DE LA SUSPENSIÓN No1 desde el 31 de julio de 2022 hasta el 30 de agosto de 2022


FECHA DE REINICIO: 31 de agosto de 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR INICIAL: CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$5.219.088.659)

Entre los suscritos a saber, **FRANK ALEXANDER RAMÍREZ ORDÓÑEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 94.522.032 expedida en Santiago de Cali (Valle del Cauca), en su calidad de **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA** del Departamento del Valle del Cauca, con nombramiento ordinario realizado por medio del Decreto Departamental No. 1-3-0001 del 01 de enero del 2020, habiendo tomado posesión mediante acta No. 0010 el día 01 de enero del 2020, facultado para celebrar la presente Acta según Decreto Departamental No. 1-3-0023 del 07 de enero de 2020, "POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚAN UNAS DELEGACIONES EN MATERIA CONTRACTUAL Y SE DISPONEN MEDIDAS PARA EJERCER EL CONTROL Y VIGILANCIA EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL" quien obra en nombre y representación del Departamento del Valle del Cauca en su condición de **CONTRATANTE**, de una parte y por la otra; el señor **JHON JAIRO CONDE CABRERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.384.752 de Bogotá como representante legal de la firma **CONSORCIO VIAS DEL VALLE**, actuando como Interventor del contrato, y **MARTINEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.**, identificado con el NIT No. 900.596.808-6 cuyo representante legal es el señor el **ING. CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.372.004 de Cali Valle, nos reunimos en las instalaciones de la Gobernación del Valle del Cauca con el objetivo de Reiniciar la ejecución del Contrato de obra No.1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021, con base en las siguientes consideraciones:

Que la fecha de inicio del contrato de obra pública No. .310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021 fue el 11 de febrero del 2022.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	Código: FO-M9-P2-06	
	Versión: 01	
	Fecha de Aprobación: 15/08/2018	
	Página: 2 de 4	


ACTA DE REINICIO

Que mediante acta de Suspensión No. 1 de fecha 1 de junio del 2022 el contrato de obra pública No. 310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021 fue suspendido desde el 01 de junio de 2022 al 30 de Julio 2022.

Que mediante acta de prórroga No1 de la suspensión de fecha 31 de agosto el contrato de obra pública No. 310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021, se prórroga la suspensión desde el julio 31 del 2022 al 30 de agosto de 2022.

Que mediante comunicado CVV-056-2022 del 29 de agosto de 2022 el señor JOHN JAIRO CONDE CARRERA, Representante Legal del CONSORCIO VIAS DEL VALLE, contratista de obra solicito lo siguiente: "(...)Por medio del presente documento solicitamos a ustedes de la manera más formal, se dé el reinicio de las actividades del Contrato de obra No. 1.310.02-59.8-0581 cuyo objeto esta mencionado en la referencia, el cual se suspendió desde el primero (01) de junio según el Acta de Suspensión No. 01 hasta el treinta (30) agosto del presente año según la Prórroga a la suspensión. Por otro lado, solicitamos a ustedes el acta de reinicio del día treinta y uno (31) de agosto con la nueva fecha de terminación del día diez (10) de noviembre debidamente firmada para solicitar la actualización de las pólizas a la aseguradora. (...)”

Que mediante oficio No. VR4-072A-2022 del 30 de agosto del año en curso emitido por el representante legal de Martínez & Manrique Arquitectura e Ingeniería S.A.S., contratistas de interventoría viabiliza la solicitud hecha por el contratista de obra. ASUNTO: CONTRATO DE INTERVENTORA No. 1.310.02.59.1-0582 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2021. CON OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA." SOLICITUD REINICIO CONTRATO DE OBRA No. 1.310.02-59.8-581 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021 (...) "Mediante la presente, notificamos a la entidad que hemos recibido una comunicación de parte del contratista de obra por medio de oficio CW-056-2022, en el cual solicita se reinicie actividades del contrato de obra. En la comunicación, el contratista expone el siguiente motivo. "Por medio del presente documento solicitamos a ustedes de la manera más formal, se dé el reinicio de las actividades del Contrato de obra No. 1.310.02-59.8-0581 cuyo objeto esta mencionado en la referencia, el cual se suspendió desde el primero (01) de junio según el Acta de Suspensión No. 01 hasta el treinta (30) agosto del presente año según la Prórroga a la suspensión. Por otro lado, solicitamos a ustedes el acta de reinicio del día treinta y uno (31) de agosto con la nueva fecha de terminación del día diez (10) de noviembre debidamente firmada para solicitar la actualización de las pólizas a la aseguradora. "Por lo anterior, esta interventoría recomienda a la entidad proceder con el reinicio del Contrato de Obra No. 1.310.02-59.8-581 dentro de las siguientes fechas. Fecha de Reinicio No. 1 Contrato No. 1.310.02.59.8-0581: 31 de agosto de 2022. Nueva Fecha de Terminación contrato No. 1.310.02.59.8-0581: 10 de noviembre de 2022" (...) (...) "Mediante la presente, notificamos a la entidad que hemos recibido una comunicación de parte del contratista de obra por medio de oficio CW-056-2022, en el cual solicita se reinicie actividades del contrato de obra. En la comunicación, el contratista expone el siguiente motivo. "Por medio del presente documento solicitamos a ustedes de la manera más formal, se dé el reinicio de las actividades del Contrato de obra No. 1.310.02-59.8-0581 cuyo objeto esta mencionado en la referencia, el cual se suspendió desde el primero (01) de junio según el Acta de Suspensión No. 01 hasta el treinta (30) agosto del presente año según la Prórroga a la suspensión. Por otro lado, solicitamos a ustedes el acta de reinicio del día treinta y uno (31) de

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	Código: FO-M9-P2-06	
	Versión: 01	
	Fecha de Aprobación: 15/08/2018	
	Página: 3 de 4	


ACTA DE REINICIO

agosto con la nueva fecha de terminación del día diez (10) de noviembre debidamente firmada para solicitar la actualización de las pólizas a la aseguradora."Por lo anterior, esta interventoría recomienda a la entidad proceder con el reinicio del Contrato de Obra No. 1.310.02-59.8-581 dentro de las siguientes fechas. Fecha de Reinicio No. 1 Contrato No. 1.310.02.59.8-0581: 31 de agosto de 2022. Nueva Fecha de Terminación contrato No. 1.310.02.59.8-0581: 10 de noviembre de 2022" (...)

Que mediante oficio del 30 de agosto del 2022 el Subsecretario de Infraestructura del Transporte Doctor ALFREDO BAYARDO ALMEIDA GARCIA remite a la oficina asesora jurídica lo siguiente: (...) REFERENCIA: Contrato de obra No. 1.310.02-59.8-0581 que tiene por objeto: "MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA". ASUNTO: Aval a la solicitud de reinicio del contrato citado en la referencia. En atención al comunicado VR4-072A-2022 del 30 de agosto de 2022 suscrito por el señor CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ, representante legal de Martínez & Manrique Arquitectura e Ingeniería S.A.S. del contrato citado en la Referencia por medio del cual considera pertinente y viable la solicitud de reinicio al contrato de obra N° 1.310.02-59.8-0581, es necesario sobre el particular realizar las siguientes precisiones: Mediante comunicado CVV-056-2022 del 29 de agosto de 2022 el señor JOHN JAIRÓ CONDE CARRERA, Representante Legal del CONSORCIO VIAS DEL VALLE, en calidad de contratista del contrato citado en la Referencia, argumentó lo siguiente: "(...)Por medio del presente documento solicitamos a ustedes de la manera más formal, se dé el reinicio de las actividades del Contrato de obra No. 1.310.02-59.8-0581 cuyo objeto esta mencionado en la referencia, el cual se suspendió desde el primero (01) de junio según el Acta de Suspensión No. 01 hasta el treinta (30) agosto del presente año según la Prorroga a la suspensión. Por otro lado, solicitamos a ustedes el acta de reinicio del día treinta y uno (31) de agosto con la nueva fecha de terminación del día diez (10) de noviembre debidamente firmada para solicitar la actualización de las pólizas a la aseguradora. (...)". Consecuentemente con el oficio No. VR4-072A-2022 del 30 de agosto del año en curso emitido por el representante legal de Martínez & Manrique Arquitectura e Ingeniería S.A.S., en el que viabiliza la solicitud hecha por el contratista de obra. (...) "Mediante la presente, notificamos a la entidad que hemos recibido una comunicación de parte del contratista de obra por medio de oficio CW-056-2022, en el cual solicita se reinicie actividades del contrato de obra. En la comunicación, el contratista expone el siguiente motivo. "Por medio del presente documento solicitamos a ustedes de la manera más formal, se dé el reinicio de las actividades del Contrato de obra No. 1.310.02-59.8-0581 cuyo objeto esta mencionado en la referencia, el cual se suspendió desde el primero (01) de junio según el Acta de Suspensión No. 01 hasta el treinta (30) agosto del presente año según la Prorroga a la suspensión. Por otro lado, solicitamos a ustedes el acta de reinicio del día treinta y uno (31) de agosto con la nueva fecha de terminación del día diez (10) de noviembre debidamente firmada para solicitar la actualización de las pólizas a la aseguradora." Por lo anterior, esta interventoría recomienda a la entidad proceder con el reinicio del Contrato de Obra No. 1.310.02-59.8-581 dentro de las siguientes fechas. Fecha de Reinicio No. 1 Contrato No. 1.310.02.59.8-0581: 31 de agosto de 2022. Nueva Fecha de Terminación contrato No. 1.310.02.59.8-0581: 10 de noviembre de 2022" (...). En este orden, me permito manifestarle que, una vez revisado lo anteriormente expuesto, como supervisor considero procedente el reinicio del contrato el día 31 de agosto de 2022, con nueva fecha de terminación el día 10 noviembre de 2022. (...)

Por consiguiente:

ACORDAMOS

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	ACTA DE REINICIO	Código: FO-M9-P2-06
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 4 de 4

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato de obra pública No. .310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021 a partir del 31 de agosto de 2022

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, la fecha de finalización será el día 10 de noviembre de 2022.


TERCERO: A partir de la fecha de reinicio, el Contratista se obliga a ajustar la Garantía Única que ampara el Contrato, acorde a los términos del contrato y de esta Acta.


CUARTO: Las partes declaran que el reinicio del contrato de obra pública No. 1. .310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021 no genera daño en contra del contratista.

QUINTO: Que el reinicio del contrato no genera costos adicionales para el Departamento del Valle del Cauca.

En constancia se firma en la ciudad de Cali, (2) días del mes de Jul de dos mil veintidós (2022).


 FRANK ALEXANDER RAMÍREZ ORDÓÑEZ
 Secretario de Infraestructura
 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA


 LACIDES SEGOVIA TABARES
 CC: 19.375.976
 Representante Legal Suplente
 CONSORCIO VIAS DEL VALLE
 ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
 Contratista Obra


 CARLOS DAVID MARTÍNEZ VELEZ
 CC: 94.372.004 de Cali Valle.
 Representante Legal
 MARTÍNEZ & MANRIQUE
 Interventoría

Reviso: Doris Yazmin Larrotta –Abogada contratista SIV

Aprobó Aspectos jurídicos: Juliana Álvarez Ordoñez – Jefe Oficina Jurídica SIV

Revisión	Aprobación	
Reviso aspectos Técnicos: Ing. Adriana Garcés Contratista. SI Aprobó: Elaboración		
Nombre: Juan Gabriel Rojas Girón, Angela Garcia	Nombre: Diana Lorena Vanegas Cajiao	Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión Acta N. 006
Cargo: Subdirector de Contratación, Contratista	Cargo: Directora Jurídica	
Firma:	Firma:	
Fecha: 10/08/2018	Fecha: 10/08/2018	Fecha: 15/08/2018

1.310.10.52-

Santiago de Cali, 30 de agosto de 2022

Ingeniero

FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ

Secretario de Infraestructura

REFERENCIA: Contrato de obra No. 1.310.02-59.8-0581 que tiene por objeto:
"MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS
PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

ASUNTO: Aval a la solicitud de reinicio de los contrato citado en la referencia

En atención al comunicado VR4-072A-2022 del 30 de agosto de 2022 suscrito por el señor CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ, representante legal de Martínez & Manrique Arquitectura e Ingeniería S.A.S. del contrato citado en la Referencia por medio del cual considera pertinente y viable la solicitud de reinicio al contrato de obra N° 1.310.02-59.8-0581, es necesario sobre el particular realizar las siguientes precisiones:

Mediante comunicado CVV-056-2022 del 29 de agosto de 2022 el señor JOHN JAIRO CONDE CARRERA, Representante Legal del CONSORCIO VIAS DEL VALLE, en calidad de contratista del contrato citado en la Referencia, argumentó lo siguiente:

"(...)Por medio del presente documento solicitamos a ustedes de la manera más formal, se dé el reinicio de las actividades del Contrato de obra No. 1.310.02-59.8-0581 cuyo objeto esta mencionado en la referencia, el cual se suspendió desde el primero (01) de junio según el Acta de Suspensión No. 01 hasta el treinta (30) agosto del presente año según la Prorroga a la suspensión. Por otro lado, solicitamos a ustedes el acta de reinicio del día treinta y uno (31) de agosto con la nueva fecha de terminación del día diez (10) de noviembre debidamente firmada para solicitar la actualización de las pólizas a la aseguradora.(...)"

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax:
Sitio WEB: www.valledelcauca.gov.co e-mail: @valledelcauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia

Consecuentemente con el oficio No. VR4-072A-2022 del 30 de agosto del año en curso emitido por el representante legal de Martínez & Manrique Arquitectura e Ingeniería S.A.S., en el que viabiliza la solicitud hecha por el contratista de obra.

(...) "Mediante la presente, notificamos a la entidad que hemos recibido una comunicación de parte del contratista de obra por medio de oficio CW-056-2022, en el cual solicita se reinicie actividades del contrato de obra. En la comunicación, el contratista expone el siguiente motivo.

"Por medio del presente documento solicitamos a ustedes de la manera más formal, se dé el reinicio de las actividades del Contrato de obra No. 1.310.02-59.8-0581 cuyo objeto esta mencionado en la referencia, el cual se suspendió desde el primero (01) de junio según el Acta de Suspensión No. 01 hasta el treinta (30) agosto del presente año según la Prorroga a la suspensión. Por otro lado, solicitamos a ustedes el acta de reinicio del día treinta y uno (31) de agosto con la nueva fecha de terminación del día diez (10) de noviembre debidamente firmada para solicitar la actualización de las pólizas a la aseguradora."

Por lo anterior, esta interventoría recomienda a la entidad proceder con el reinicio del Contrato de Obra No. 1.310.02-59.8-581 dentro de las siguientes fechas.

Fecha de Reinicio No. 1 Contrato No. 1.310.02.59.8-0581: 31 de agosto de 2022.

Nueva Fecha de Terminación contrato No. 1.310.02.59.8-0581: 10 de noviembre de 2022" (...)

En este orden, me permito manifestarle que, una vez revisado lo anteriormente expuesto, como supervisor considero procedente el reinicio del contrato el día 31 de agosto de 2022, con nueva fecha de terminación el día 10 noviembre de 2022

Atentamente,



ALFREDO BAYARDO ALMEIDA GARCÍA

Subsecretario de Infraestructura del Transporte

Proyecto: Ingeniera Adriana María Garcés P-Profesional de Apoyo a la Supervisión



Martínez & Manrique
arquitectura e ingeniería

NIT: 900.596.808-6

VR4-072A-2022

Santiago de Cali, 30 de agosto de 2022

SEÑORES
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ATN: DRA. DORIS YAZMIN LARROTA
ABOGADA
L.C.

ASUNTO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1.310.02.59.1-0582 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2021.
CON OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA."
SOLICITUD REINICIO CONTRATO DE OBRA No. 1.310.02.-59.8-581 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021

Cordial saludo,

Mediante la presente, notificamos a la entidad que hemos recibido una comunicación de parte del contratista de obra por medio de oficio CVV-056-2022, en el cual solicita se reinicie actividades del contrato de obra. En la comunicación, el contratista expone el siguiente motivo.

"Por medio del presente documento solicitamos a ustedes de la manera más formal, se dé el reinicio de las actividades del Contrato de obra No. 1.310.02-59.8-0581 cuyo objeto esta mencionado en la referencia, el cual se suspendió desde el primero (01) de junio según el Acta de Suspensión No. 01 hasta el treinta (30) agosto del presente año según la Prorroga a la suspensión. Por otro lado, solicitamos a ustedes el acta de reinicio del día treinta y uno (31) de agosto con la nueva fecha de terminación del día diez (10) de noviembre debidamente firmada para solicitar la actualización de las pólizas a la aseguradora."

Por lo anterior, esta interventoría recomienda a la entidad proceder con el reinicio del Contrato de Obra No. 1.310.02-59.8-581 dentro de las siguientes fechas.

Fecha de Reinicio No. 1 Contrato No. 1.310.02.59.8-0581: 31 de agosto de 2022.

Nueva Fecha de Terminación Contrato No. 1.310.02.59.8-0581: 10 de noviembre de 2022

Saludos,


CARLOS DAVID MARTÍNEZ VELEZ
Representante Legal
Martínez & Manrique Arquitectura e Ingeniería S.A.S.

Anexo lo enunciado

c.c.: Dr. Frank Alexander Ramírez – Secretario de Infraestructura – Gobernación del Valle
Ing. Alfredo Bayardo Almelda – Sub Secretario de Infraestructura del Transporte – Gobernación del Valle.
Ing. Adriana Marian Garcés – Apoyo a la Supervisión – Gobernación de Valle.
*Archivo.



CVV-056-2022

Santiago de Cali, agosto 29 de 2022

Señor(es)
MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.
Contratista de Interventoría.
Calle 18 # 106 – 98 OF 304, Centro Comercial Ciudad Jardín.
Santiago de Cali.

Ref. Contrato de obra No. 1.310.02-59.8-0581 – “MEJORAMIENTO A NIVEL DE
SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.”

Asunto: Reinicio Actividades en Obra.

Cordial saludo,

Por medio del presente documento solicitamos a ustedes de la manera más formal, se dé el reinicio de las actividades del Contrato de obra No. 1.310.02-59.8-0581 cuyo objeto esta mencionado en la referencia, el cual se suspendió desde el primero (01) de junio según el Acta de Suspensión No. 01 hasta el treinta (30) agosto del presente año según la Prorroga a la suspensión. Por otro lado, solicitamos a ustedes el acta de reinicio del día treinta y uno (31) de agosto con la nueva fecha de terminación del día diez (10) de noviembre debidamente firmada para solicitar la actualización de las pólizas a la aseguradora.


Atentamente,


JOHN JAIRO CONDE CARRERA
R.L. CONSORCIO VIAS DEL VALLE
CONTRATISTA

Copia:
Elaboró: VConde.

CONSORCIO VIAS DEL VALLE Carrera 6 No.89-25 Apto 101 Telefono:3153680947

13102

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA	Código: FO-M9-P2-22
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 1 de 3

No. 1.310.02.59.8-002 ✓

CONTRATO NÚMERO: 1.310.02-59.2-8-0581 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021

MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO SE APRUEBA LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTATO DE OBRA No. 1.310.02-59.2-8-0581 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL VALLE ✓

OBJETO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VIAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

VALOR: \$ 5.219.088.659 ✓

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

GARANTÍA NÚMERO: CBC-100033048 ✓
 CERTIFICADO: 270081406
 FECHA: 28 de diciembre de 2021
 COMPAÑÍA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. ✓

AMPARO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
 VALOR ASEGURADO: \$ 521.908.865,90
 VIGENCIA: Desde el 23 de diciembre de 2021 hasta el 23 de octubre de 2022

AMPARO: BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO
 VALOR ASEGURADO: \$ 1.565.726.597,70
 VIGENCIA: Desde el 23 de diciembre de 2021 hasta el 23 de octubre de 2022 ✓

AMPARO: PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA	Código: FO-M9-P2-22
		Versión:01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 2 de 3

No. 1.310.02.59.8-002
VALOR ASEGURADO:
VIGENCIA:

\$ 260.954.432,95
Desde el 23 de diciembre de 2021 hasta el 23 de
junio de 2025

AMPARO:
VALOR ASEGURADO:
VIGENCIA:

ESTABILIDAD DE LA OBRA
\$ 1.565.726.597,70
Desde el 23 de diciembre de 2021 hasta el 23 de
junio de 2027

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

GARANTÍA NÚMERO:
CERTIFICADO:
FECHA:
COMPAÑÍA:

CBC-100004725 ,
270081421
✓ 29 de diciembre de 2021/
COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A./

AMPARO:
VALOR ASEGURADO:
VIGENCIA:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
✓ \$ 454.263.000
Desde el 23 de diciembre de 2021 hasta el 23 de
junio de 2022

La jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaria de Infraestructura con base en lo reglamentado en el Manual de Contratación Pública de la Gobernación del Valle del Cauca en el punto 6.1.3 referente a la aprobación de la garantía establece: "corresponderá al Departamento Administrativo de Jurídica o a quien haga sus veces de cada dependencia, aprobar la garantía y sus modificaciones cualquiera que sea la cuantía del proceso. La garantía se aprobará mediante acta debidamente suscrita por el área encargada, siempre que la misma se ajuste a lo requerido por el Departamento del Valle del Cauca y o a las condiciones de vigencia y suficiencia de las garantías contenidas en el Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo adicione, modifique o complemente" y en cumplimiento del artículo 41 de la ley 80 de 1993 el cual dispone que para la ejecución de un contrato se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de contratación con vigencias futuras de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Presupuesto. En este sentido y de conformidad con el Manual de Contratación de la Gobernación del Valle del Cauca verificará que el monto, vigencias y amparo de las garantías aportadas correspondan a los requerimientos exigidos en el contrato y en consecuencia aprobará las garantías antes del inicio y como requisito previo para la ejecución del contrato, diligenciando el formato establecido para tal efecto, y al verificar, que la Póliza aquí


Departamento del Valle del Cauca	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA	Código: FO-M9-P2-22
		Versión: 01
Gobernación		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 3 de 3


No. 1.310.02.59.8-002

señalada reúne los requisitos exigidos en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y el Título III, la Sección 3 del Decreto 1082 de 2015.

APRUEBA LA GARANTÍA ANTES MENCIONADA

Dada en Santiago de Cali, a los doce (12) días del mes de enero de dos mil veintidós. (2022).


JULIANA ALVAREZ ORDONEZ
 Jefe Oficina Asesora de Jurídica -SI

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA	Código: FO-M9-P2-22
Versión: 01		
Fecha de Aprobación: 15/08/2018		
Página: 1 de 3		

No. 1.310.02.59.8-020

CONTRATO NÚMERO: 1.310.02-59.2-8-0581 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021

MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO SE APRUEBA EL ANEXO No. 02 A LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y EL ANEXO No. 03 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DEL CONTATO DE OBRA No. 1.310.02-59.2-8-0581 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL VALLE

OBJETO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VIAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.


VALOR: \$ 5.219.088.659

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

GARANTÍA NÚMERO: CBC-100033048
 ANEXO: 02
 FECHA: 18 de febrero de 2022
 COMPAÑÍA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

AMPARO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
 VALOR ASEGURADO: \$ 521.908.865,90
 VIGENCIA: Desde el 11 de febrero de 2022 hasta el 12 de diciembre de 2022

AMPARO: BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO
 VALOR ASEGURADO: \$ 1.565.726.597,70
 VIGENCIA: Desde el 11 de febrero de 2022 hasta el 12 de diciembre de 2022

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA	Código: FO-M9-P2-22
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 2 de 3

No. 1.310.02.59.8-020

AMPARO:

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES
SOCIALES

VALOR ASEGURADO:

\$ 260.954.432,95

VIGENCIA:

✓ Desde el 11 de febrero de 2022 hasta el 12 de
Agosto de 2025

AMPARO:

ESTABILIDAD DE LA OBRA

VALOR ASEGURADO:

\$ 1.565.726.597,70

VIGENCIA:

✓ Desde el 11 de febrero de 2022 hasta el 12 de
Agosto de 2027

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

GARANTÍA NÚMERO:

CBC-100004725

ANEXO:

03

FECHA:

21 de febrero de 2022

COMPañIA:

COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

AMPARO:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL


VALOR ASEGURADO:

\$ 500.000.000

VIGENCIA:

✓ Desde el 11 de febrero de 2022 hasta el 12 de
Agosto de 2022

La jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Infraestructura con base en lo reglamentado en el Manual de Contratación Pública de la Gobernación del Valle del Cauca en el punto 6.1.3 referente a la aprobación de la garantía establece. "corresponderá al Departamento Administrativo de Jurídica o a quien haga sus veces de cada dependencia, aprobar la garantía y sus modificaciones cualquiera que sea la cuantía del proceso. La garantía se aprobará mediante acta debidamente suscrita por el área encargada, siempre que la misma se ajuste a lo requerido por el Departamento del Valle del Cauca y o a las condiciones de vigencia y suficiencia de las garantías contenidas en el Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo adicione, modifique o complemente" y en cumplimiento del artículo 41 de la ley 80 de 1993 el cual dispone que para la ejecución de un contrato se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de contratación con vigencias futuras de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Presupuesto. En este sentido y de conformidad con el Manual de Contratación de la Gobernación del Valle del Cauca verificará que el monto, vigencias y amparo de las garantías aportadas correspondan a los requerimientos exigidos en el contrato y en consecuencia aprobará las garantías antes del inicio y como requisito previo para la ejecución del contrato, diligenciando el formato establecido para tal efecto, y al verificar, que la Póliza aquí


 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA	Código: FO-M9-P2-22
		Versión:01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 3 de 3

No. 1.310.02.59.8-020

señalada reúne los requisitos exigidos en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y el Título III, la Sección 3 del Decreto 1082 de 2015.

APRUEBA LA GARANTÍA ANTES MENCIONADA

Dada en Santiago de Cali, a los veintiún (21) días del mes de febrero de dos mil veintidós (2022).


JULIANA ALVAREZ ORDONEZ
Jefe Oficina Asesora de Jurídica -SI

Proyecto: Claudia Ines Marin Ballesteros - Abogada Contratista

NIT 860037 013 6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: ACX1gr10d1e126jd/rMgrrw==

Nº PÓLIZA	CBC-100004725	Nº ANEXO	3	Nº CERTIFICADO	278885333	Nº RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/02/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTÁ CHAPINERO
VIGENCIA DESDE	12/02/2022	VIGENCIA HASTA	12/08/2022	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	CONSORCIO VIAS DEL VALLE			Nº DOC. IDENTIDAD	901.545.310-6		
DIRECCIÓN	CR 6 09 25 AP 101 ED CHICO ORIENTAL			TELÉFONO	3153660947		
ASEGURADO	CONSORCIO VIAS DEL VALLE			Nº DOC. IDENTIDAD	901.545.310-6		
DIRECCIÓN	CR 6 09 25 AP 101 ED CHICO ORIENTAL			TELÉFONO	3153660947		
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS			Nº DOC. IDENTIDAD			
DIRECCIÓN				TELÉFONO			

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DE LOS AMPAROS DE ACUERDO AL SMMLV DEL 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
NO. 1.110.82-59.8-0581, CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUORASANTE EN LAS VIAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 900192981 (PART. 10,0000 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901309817 (PART. 50,0000 %)

HOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BÁSICO - FORTES, LABORES Y OPERACIONES	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	43,105.56
PATROAL	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00

INTERMEDIARIOS		AGENCIAS		DISTRIBUCIÓN COASEGURO		TOTAL ASEGURADO		PRIMA BRUTA	
AGENCIA DE SEGUROS OUTDOORS LTDA						\$ 500,000,000.00		\$ 43,105.56	
								DESCUENTOS	
								EXTRA PRIMA	
								PRIMA NETA	
								GASTOS EXP.	
								IVA	
								TOTAL A PAGAR	

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/02/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTO MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VERIFICA LA EXISTENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 7327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADemás QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.



Cumplimos los sueños de nuestra planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

[Firma]
TOMADOR



Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



la compañía siempre

VT 860.017 013-6

MODOS GRANDES CONTRIBUYENTES
LA ECONOMÍA COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRA CONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R00000027-0001

No. POLIZA	CAC-180004725	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	270005333	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	21/02/2022	SUC. EXPEDIDORA	LEN BOGOTÁ CHAPINERO		
		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A		
00.00 Horas Del	11/02/2022	24:00 Horas Del	12/08/2022				

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 3 - CC: 19375916 (PART. 40,000 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAS DEL VALLE) , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA COMO ASEGURADO
ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS
UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAS DEL VALLE, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA BENEFICIARIO ADICIONAL: ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA COMO
BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCCIONES:

AMPARO

DEDUCCIONES

AMPARO BASICO - PREMIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
CBC-168833848	2	27885238	
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTÁ CHIAPINERO
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del 11/02/2022	24:00 Horas Del 12/11/2022	N/A	N/A
TOMADOR	CONSORCIO VIAS DEL VALLE	No. DOC. IDENTIDAD	901.545.310-6
DIRECCIÓN	CA 6 89 25 AP 101 ED CHICO ORIENTAL	TELÉFONO	315368947
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	No. DOC. IDENTIDAD	890.399.829-5
DIRECCIÓN	EDIF. PALACIO DE SAN FRANCISCO ENTRE CRA 6 CON CALLE 9 V10	TELÉFONO	8985355
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	No. DOC. IDENTIDAD	808.399.829-1
DIRECCIÓN	EDIF. PALACIO DE SAN FRANCISCO ENTRE CRA 6 CON CALLE 9 V10	TELÉFONO	8985355

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE TRASLADA VIGENCIA DE ACUERDO A ACTA DE INICIO CON FECHA 11 DE FEBRERO 2022.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 1.310 02-59.8-0581, CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 908192981 (PART. 10,000B %)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 11/01/2022	24:00 Horas Del 12/11/2022	521.988.865,90	869.371,48
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 11/01/2022	24:00 Horas Del 12/11/2022	1.565.726.597,78	2.688.114,44
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 11/02/2022	24:00 Horas Del 12/08/2025	268.954.433,95	1.827.395,97
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 11/02/2022	24:00 Horas Del 12/08/2027	1.565.726.597,78	17.227.282,34

INTERMEDIARIOS	TIPO	TOTAL ASEGURADO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	DESCUENTOS	EXTRA PRIMA	PRIMA NETA	GASTOS EXP.	IVA	TOTAL A PAGAR
AGENCIA DE SEGUROS GUIBONS LTDA	AGENCIAS	100,00		\$ 3.914.316.498,25	\$ 22.532.164,13		\$ 22.532.164,13	\$ 5.000,00	\$ 4.282.061,18	\$ 26.819.225,31
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN						

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/02/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CUENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTENSA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PROYECTO MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VÁLIDA LA EXISTENCIA DE ESTAS ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 327 4713

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDIAN CON FUNDAMENTO EN ELA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADemás, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

TOMADOR



Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

No. PÓLIZA	CBC-108831848	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	278885238	No. RIESGO		
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN		18/02/2022		SUC. EXPEDIDORA			GEN BOGOTÁ CHAPINERO
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 11/02/2022	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 12/02/2022	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A	
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A	
TOMADOR	CONSORCIO VIAS DEL VALLE					No. DOC. IDENTIDAD	901.545.318-6	
DIRECCIÓN	CR 6 89 25 AP 181 ED CHICO ORIENTAL					TELÉFONO	3153860947	
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA					No. DOC. IDENTIDAD	090.399.029-5	
DIRECCIÓN	EDIF. PALACIO DE SAN FRANCISCO ENTRE CRA 5 CON CALLE 9 Y18					TELÉFONO	8985355	
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA					No. DOC. IDENTIDAD	890.399.029-5	
DIRECCIÓN	EDIF. PALACIO DE SAN FRANCISCO ENTRE CRA 5 CON CALLE 9 Y18					TELÉFONO	8985355	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE TRASLADA VIGENCIA DE ACUERDO A ACTA DE INICIO CON FECHA 11 DE FEBRERO 2022.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 1.310.82-59.8-0581, CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VÍAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 980192981 (PART. 10,0000 %)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 11/02/2022	24:00 Horas Del 12/12/2022	521.988.865,00	869.371,48
BUEN MANEJO DEL AMPARO	00:00 Horas Del 11/02/2022	24:00 Horas Del 12/12/2022	1.565.726.597,78	2.608.134,44
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 11/02/2022	24:00 Horas Del 12/08/2025	268.954.432,95	1.827.305,97
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 11/02/2022	24:00 Horas Del 12/08/2027	1.565.726.597,78	17.227.282,24

TOTAL ASEGURADO \$ 3.934.316.404,25

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$
AGENCIA DE SEGUROS GUARDONS LTDA	AGENCIAS	288,88		22.532.164,13
DISTRIBUCIÓN COASEGURO			BENEFICIARIOS	\$
COMPANHIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	EXTRA PRIMA	
		CERTIF. LÍDER	PRIMA NETA	\$ 22.532.164,13
		% PARTICIPACIÓN	GASTOS EXP.	\$ 5.888,80
			IVA	\$ 4.282.061,18
CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/02/2022			TOTAL A PAGAR	\$ 26.119.225,31

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2000 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INICIANDO A PRODUCTOS MUNDIAL SEGUROS CON CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESEÑALADO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O AL 327 4712-327 4713.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA HORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANHIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENCADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADemás, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANHIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Angela Pulido Muñoz Martínez CC. 51.64.070
Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 285 5600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1882

VERSION CLAUSULADO 86-84-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	CBC-188833848	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	278885238	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	18/82/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTÁ CHAPINERO		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
08:00 Horas Del	11/82/2022	24:00 Horas Del	12/88/2027			N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 2 - NIT: 901389817 (PART. 50,0000 %)
INTEGRANTE 3 - CC: 19375916 (PART. 40,0000 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VÍAS DEL VALLE)





tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados



CÁMARA COLOMBIANA
DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA API
Asociación Promotora de Seguros
Paseiros en Safety Ambiental

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza CBC-100033048 y endoso, 2 cuyo afianzado es:
CONSORCIO VIAS DEL VALLE Asegurado o Beneficiario: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA / DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA, expedida por la Compañía en 18/02/2022, no expirará por falta de pago de la prima de
la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación
unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN BOGOTÁ CHAPINERO a los 18 días del mes FEBRERO del año 2022.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.





RECIBO ELECTRONICO No. 187146003

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 2022/01/18 14:28:26

VALOR TOTAL: 27.364.267,25

RECIBO DE: CONSORCIO VIAS DEL VALLE

NUMERO DE IDENTIFICACION: NIT 901545310

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. De Autorización	Entidad	Valor
PSE	20229900032639	1289771983	BANCO DE BOGOTA	545.041 94
PSE	20229900032639	1289771983	BANCO DE BOGOTA	26.819 225.31

OBSERVACIONES:

Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100033048 Certificado(s): 270081406; Ramo:
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL Póliza(s): 100004725 Certificado(s):
270081421

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 CORREO:

TES-08N-05/2019

