

PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1 FASE 2

En Bogotá D.C. a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), se reunieron las siguientes personas: MARÍA CAROLINA CAMARGO, quien se desempeña como Coordinador Regional de la UG del PA-FFIE en su calidad de Supervisor y MANUEL ANDRÉS ROMÁN, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal de la firma Consorcio Educativo Cinco Opciona con NIT 901.361.416-7 en su condición de Contratista de Interventoría, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir la prórroga 2 a la Suspensión No.1 del Contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019 de 28 de enero, Fase 2 del año 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que :

1. Que el día 28 de enero de 2020 y de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario del PA FFIE se suscribió el Contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019 cuyo objeto contractual es "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1061-2019, que comprende la elaboración de diseños, estudios técnicos y obras de infraestructura educativa para la institución educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ ubicada en el distrito espacial de Cali, departamento Valle del Cauca requeridos por el FFIE en el desarrollo del PNIE".
2. Que el día 27 de julio de 2020, mediante comité de seguimiento desarrollado entre el FFIE - La interventoría y el contratista de obra se definió dar suspensión al contrato de obra e interventoría bajo el argumento de "realizar diferentes visitas y revisiones pertinentes del alcance de la fase 2 en la Institución Educativa Antonio José Camacho Sede Republica del Perú."
3. Que el Contratista de Obra UT GMP, mediante comunicación de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-089, solicitó a la interventoría la suspensión de la fase 2 por el término de treinta (30) días calendario, tiempo en el cual se estimaba que pudieran darse las respectivas aclaraciones y revisiones sobre el alcance contractual a ejecutar en la IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ.
4. Que, en la misma comunicación, se manifestó que la solicitud de suspensión podría llegar a ser ampliada en el evento en que no se logran superar los motivos que la generaron.
5. Que el Contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 24 de julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006, avaló la suspensión No 1 a la fase 2 del Contrato de Obra .
6. Que el Contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 24 de julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006, solicitó ante el FFIE dar suspensión No. 1 a la fase 2 del Contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019.
7. Que el Supervisor del contrato de Interventoría, una vez estudiadas las solicitudes presentadas por el Contratista de Obra UT GMP y el Contratista de Interventoría, avaló la suspensión No 1 del contrato desde el día 27 de julio de 2020 hasta el día 26 de agosto de 2020.
8. Que, a la fecha, las razones por las cuales se solicitó la suspensión contractual concierne a prestar las respectivas aclaraciones y revisiones sobre el alcance a ejecutar en la IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, persisten. Razón por la cual, el contratista UT GMP, acorde a los Presupuestos de Obra entregados vía correo electrónico el día 22 de Agosto del 2020 y Oficio 2020-GMP-FFIE-TOL-EV-EX-CO-134 del 13 de Agosto del 2020, se encuentra imposibilitado para continuar dando trámite a sus gestiones, hasta tanto se aclaren los criterios solicitados que dieron lugar a la suspensión contractual y que impiden el normal desarrollo de las actividades de la Fase a ejecutar.
9. Que el contratista de obra mediante comunicado de la fecha 25 de agosto de 2020 con radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-169, solicitado a la interventoría la prórroga de la suspensión de fase 2, por el término de sesenta (60) días calendario tiempo en el cual se esperaba se tenga claridad del alcance de obra.
10. Que el contratista de Interventoría mediante comunicación del 25 de agosto del 2020 con radicado 2020-COP-1061-011, avaló la prórroga de la suspensión No.01 del contrato de obra.
11. Que el Contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 25 de agosto de 2020 con radicado 2020-COP-1061-012 solicitó ante el FFIE dar prórroga a la suspensión No. 01 a la fase 2 del Contrato de Interventoría No 1380-1061-2019.
12. Que el Supervisor del contrato de Interventoría, una vez estudiadas las solicitudes presentadas por el Contratista de Obra y el Contratista de Interventoría, avaló la prórroga de la suspensión No 01 del contrato desde el día 26 de agosto de 2020 hasta el día 24 de octubre de 2020 (60 días calendario).
13. Que el Contratista de Obra mediante comunicación del día 23 de octubre de 2020, de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-411, solicitó a la interventoría la prórroga 2 de la suspensión No.1 de fase 2, por el término de treinta (30) días calendario tiempo en el cual se esperará se tengan las aprobaciones del Presupuesto de Obra de la Institución Educativa Antonio José Camacho, según el consecutivo 2020-COP-1061-012 del 07 de octubre del 2020.
14. Que el contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 24 de octubre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-015 solicitó ante el FFIE dar prórroga 2 a la suspensión No. 1 a la Fase 2 del contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019.
15. Que el contratista de Interventoría mediante comunicación del 24 de octubre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-016, avaló la prórroga 2 de la suspensión No. 1 del contrato de obra.
16. Que el Supervisor del contrato de Interventoría, una vez estudiadas las solicitudes presentadas por el Contratista de Obra y el Contratista de Interventoría, avaló la prórroga 2 de la suspensión No 1 del contrato desde el día 25 de octubre del 2020 hasta el día 23 de noviembre del 2020.

CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA
LOCALIZACIÓN	Cali - Valle del Cauca
PLAZO INICIAL	2 MESES
FECHA DE INICIO	30 de junio de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 de agosto de 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	27 de julio de 2020
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1	30 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSIÓN No. 1	26 de agosto de 2020
FECHA DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	26 de agosto de 2020
TIEMPO DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	60 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	25 de octubre de 2020
FECHA DE PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	25 de octubre de 2020

"Vo. Bo. CONSORCIO
FFIE ALIANZA BBVA"





FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1380-1061-2019 DE 2020
FORMATO FE-1-035

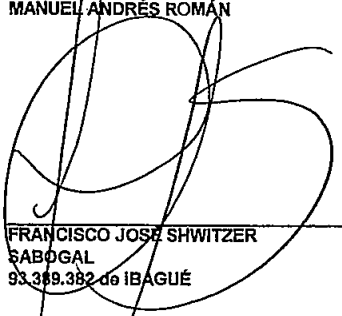
PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1 FASE 2

TIEMPO DE PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1 30 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1 24 de noviembre de 2020
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 28 de diciembre de 2020
SUPERVISIÓN MARÍA CAROLINA CAMARGO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta , a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), por los que en ella intervinieron.


INTERVENTOR Consorcio Educativo Cinco Opciona
NIV 901.361.416-7
REP. LEGAL MANUEL ANDRÉS ROMÁN


SUPERVISOR UG-FFIE MARÍA CAROLINA CAMARGO
NIV C:C 52.516.156
UG del PA FFIE SUPERVISIÓN


PA-FFIE FRANCISCO JOSÉ SHWITZER
REP. LEGAL SABOGAL
NIV C:C 93.389.382 de IBAGUÉ
REP. LEGAL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, que actúa
única y exclusivamente como vocero y administrador
del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE.

FE-1-015
V-01

"Vo. Bo. CONSORCIO
FFIE ALIANZA BBVA" 
