		FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)										FE-XXX							
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES														VERSIÓN					
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:		Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DE PERÚ, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE										N° CONTRATO DE OBRA: No. 1380-1061-2019							
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		Realizar la interventoría, técnica, administrativa, financiera, jurídica, y ambiental al contrato de obra No. 1380-1061-2019, que comprenden la elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la I.E ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPÚBLICA DE PERÚ – SEDE PRINCIPAL, en el distrito especial de Cali, Valle del Cauca.										N° CONTRATO DE INTERV: No. 1380-1061-2019							
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		Cl. 9e #2312, Cali, Valle del Cauca																	
CONTRATISTA:		UT GMP						INTERVENTOR:		Consortio Educativo Cinco Opciona									
FECHA DE REPORTE:		19-ene-21		NÚMERO DEL REPORTE:		31		AVANCE DIARIO (%):		0,40%		AVANCE ACUMULADO (%):		4,00%		ATRASO EN DIAS		32	
PERSONAL EN OBRA																			
PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA										PERSONAL INTERVENTORIA									
DESCRIPCION		CANTIDAD		DESCRIPCION		CANTIDAD		DESCRIPCION		CANTIDAD		DESCRIPCION		CANTIDAD					
OBRA CIVIL		No	% de	PROFESIONALES ESPECIALISTAS		No	% de	OBRA CIVIL		No	% de	PROFESIONALES ESPECIALISTAS		# visitas					
DIRECTOR DE OBRA				ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS				DIRECTOR DE INTERVENTORIA		1	10	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS							
RESIDENTE DE OBRA		1	100	ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA				RESIDENTE DE INTERVENTORIA		1	50	ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA							
INSPECTOR DE OBRA				ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD				INSPECTOR DE INTERVENTORIA		1	100	ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD							
ING AMBIENTAL		1	40	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA				ING AMBIENTAL		1	40	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA							
PROFESIONAL SST		1	100					PROFESIONAL SST		1	40								
PROFESIONAL SOCIAL		1	50					PROFESIONAL SOCIAL		1	10								
ALMACENISTA								ALMACENISTA											
MAESTRO GENERAL								MAESTRO GENERAL											
CONTRAMAESTRO								CONTRAMAESTRO											
OFICIAL DE OBRA		3	100					OFICIAL DE OBRA											
PERSONAL DE OBRA								PERSONAL DE OBRA											
AUXILIAR PAPSO																			
PERSONAL DE ALTURAS (PINTURA)		3	100																
CADENERO																			
ELECTRICO - VOZ Y DATOS		4	100																
TOTAL PERSONAL		14		TOTAL PERSONAL		0		TOTAL PERSONAL		6		TOTAL PERSONAL		0					
CONDICIONES CLIMÁTICAS																			
MAÑANA:		SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIA LEVE		LLUVIA FUERTE											
TARDE:		SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIA LEVE		LLUVIA FUERTE											
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA																			
COMPONENTE DE CALIDAD																			
ENSAYOS DE LABORATORIO																			
TIPO		HORAS		TIPO DE ENSAYO		NUMERO DE MUESTRAS		FECHA DE TOMA		ENTREGA RESULTADOS									
		DIARIO		ACUMULADO		NA													
1		LLUVIAS DURANTE EL HORARIO DE TRABAJO		0															
2		PAROS O INCONVENIENTES CON LA COMUNIDAD		0															
3		INCAPACITADOS		0															
4		OTROS		0															
TOTAL TIEMPO PERDIDO				0															
OBSERVACIONES GENERALES																			
COMPONENTE DE SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)																			
ELEMENTOS		CUMPLE		NO CUMPLE		OBSERVACIÓN													
KIT DE EMERGENCIAS		X																	
KIT SEÑALIZACIÓN SST		X																	
USO DE EPP POR EL PERSONAL DE OBRA										ACCIDENTE DE TRABAJO		HOY		ACUM.					
EPP		Cumple		No Cumple		OBSERVACIÓN		SIGNIFICATIVO											
Casco		X						IMPORTANTE											
Guantes		X						LEVE											
Gafas		X																	
Tapa oídos		X						OBSERVACIÓN											
Peto						N/A													
Kit trabajo en altura		X																	
Otro						N/A													
USO DE DOTACIÓN POR EL PERSONAL DE OBRA										TEMA DE CAPACITACIÓN									
DOTACIÓN		Cumple		No Cumple		OBSERVACIÓN		IMPACTOS AMBIENTALES											
Uniforme		N/A																	
Botas		N/A						DURACIÓN:		10 minutos									

COMPONENTE AMBIENTAL			
ELEMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
KIT SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL	X		
KIT DESPERDICIOS SÓLIDOS	X		
CÁNCERAS LAVADO DE HERRAMIENTAS	X		
CUBRIMIENTO DE MATERIAL GRANULAR			N/A
BAÑOS EN OBRA			N/A

ACTIVIDADES PLANIFICADAS MAÑANA:[illegible]

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 Libertad y Orden	REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código

OBJETO DEL CONTRATO:		Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DE PERÚ, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE							
LOCALIZACION DEL PROYECTO:		Cl. 9e #2312, Cali, Valle del Cauca							
CONTRATISTA:		UT GMP					CONTRATO N°	N° CONTRATO DE OBRA: No. 1380-1061-2019	
INTERVENTOR		Consorcio Educativo Cinco Opciona					CONTRATO N°	N° CONTRATO DE INTERV: No. 1380-1061-2019	
FECHA DE REPORTE:	19-ene-21	NÚMERO DEL REPORTE:	31	AVANCE DIARIO (%):	0,40%	AVANCE ACUMULADO (%):	4,00%	ATRAZO EN DIAS	32

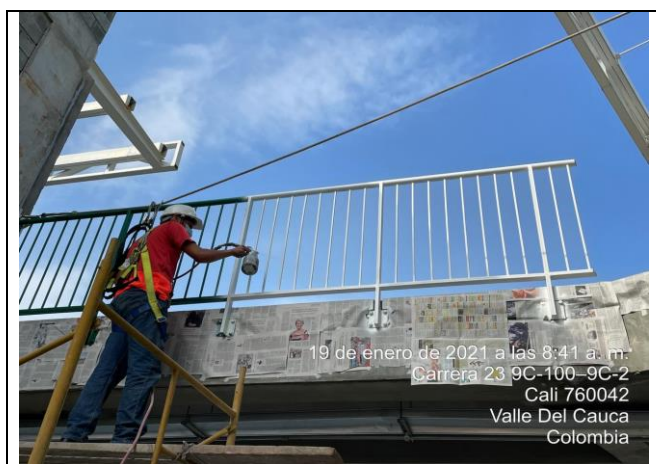


FOTO No 1 PINTURA DE ESCALERAS METÁLICAS EN ALTURAS

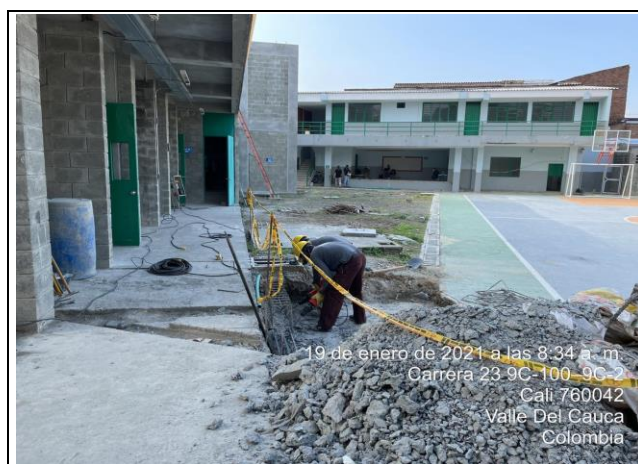



FOTO No 2 DEMOLICIONES EN FOSO DEL ELEVAPERSONAS



FOTO No 3 LAVADO DE GRANITO



FOTO No 4 PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD


CONTRATISTA


INTERVENTORIA
