

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	6/05/2024	PERIODO REPORTADO DEL:	1/04/2024	AL:	6/05/2024		
CONTRATO N°	094-00-B-COFAC-BACOF-2023	CONTRATISTA	SAFRID INGENIERIA SAS				
OBJETO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE - GACAS.						
FECHA DE INICIO	9/11/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	29/02/2024				
VALOR INICIAL	\$ 1.067.200.499,39	VALOR ADICIONAL (Si aplica)	\$ 0,00	VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)	\$ 81.993,34	VALOR TOTAL	\$ 1.067.118.506,05

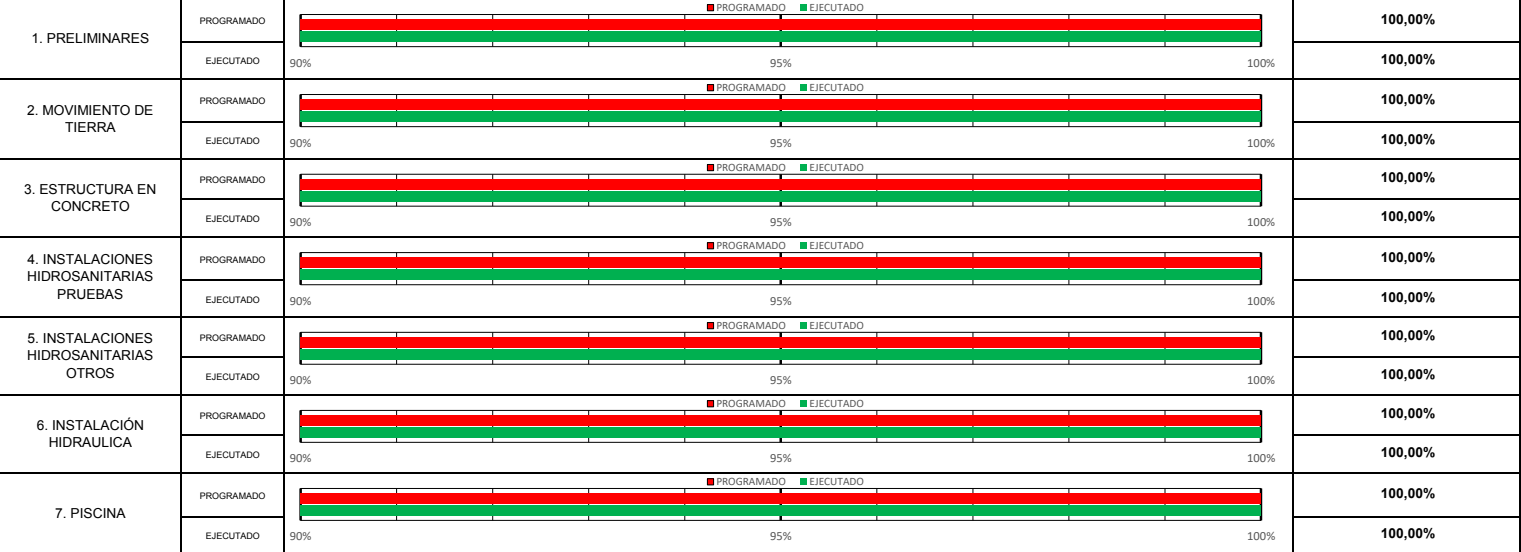
EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2023; EL CUAL SE ENCUENTRA PERFECCIONADO Y CON FECHA DE INICIO DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023. EL NÚMERO DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ES 340-74-99400006530 DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Y LA DE RCE ES 340-74-994000006530 DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. HASTA LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, SIN NOVEDADES, SE CONSTITUYÓ UNA RESERVA PRESUPUESTAL POR VALOR DE \$347.869.867,38 Y SE AMPLIÓ EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2024, DE ACUERDO A LO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. FAC-S-2023-234865-CI DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL MODIFICATORIO NO. 01 DEL 28-12-2023, SE REALIZÓ UN SEGUNDO MODIFICATORIO EL DÍA 15 DE FEBRERO, AMPLIANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN E INCLUYENDO ACTIVIDADES NO PREVISTAS, QUEDANDO COMO PLAZO DE EJECUCIÓN EL DÍA 29 DE FEBRERO DE 2024.
















Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicación contractual	Dedicación ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
TOTAL							0				


PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA				
% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	100,00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
		100,00%	100,00%	0,00%

AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO	Legend: PROGRAMADO (green), EJECUTADO (purple) The chart displays two categories, PROGRAMADO and EJECUTADO, both reaching 100% completion. The x-axis represents the percentage from 0% to 100% in 5% increments. The y-axis lists the categories. The bars are colored green for PROGRAMADO and purple for EJECUTADO.	100,00%
EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	100,00%

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
ALOJAMIENTO SOLDADOS			



8. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
9. SISTEMAS DE GAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
10. PAÑETES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
11. CIELO RASO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
12. PISOS Y PARED	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
13. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
14. ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
15. REJILLAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
16. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
17. CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
18. CUBIERTAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
19. MANTO E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
20. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
21. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%

22. CERRADURAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
23. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
24. URBANISMO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
25. AGUAS LLUVIAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
26. CARPINTERIA EN MADERA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
27. ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
NP 1. Mantenimiento de filtro para piscina de 4" por 1,4 alto, diámetro de 1,5m , incluye accesorios para su correcta instalación; incluye válvulas de inyección, incluye arena para filtrado, el recubrimiento del filtro es de doble pared con divisiones internas, incluye niples, tubería, acoples y válvulas	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
NP 2. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA INSTALACION DE MALLA DE NYLON	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
NP 3. MANTENIMIENTO DE DIVISIONES EN ACERO DE BAÑOS DE ALOJAMIENTOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
NP 4. SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES DE BAÑO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
NP 5. SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA TIPO ANGE0 0,33 X 1,54 PARA VENTANAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
NP 6.SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA LAVAMANOS DE INCRUSTAR, INCLUYE LAVAMANOS ,INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%

5- PLAZO (DÍAS)				6- REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL			
Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes				
Contractual	113	113	0				
Proyección	113	113	0				
7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN							
Días transcurridos de la obra	Días (atraso/adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada					
113	0	29/02/2024					
8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO				9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS			
				Actividad atrasada		Atribuible al contratista?	
					SI		NO
					SI		NO
OBSERVACIONES:							
10- CONTROL DE COSTOS							
Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar		
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	\$	%	\$	%	
Directos+AIU+IVA	\$ 1.067.200.499,39	\$ 1.067.200.499,39	\$ 1.067.118.506,05	100,00%	\$ 0,00	0%	
Adiciones	N/A	\$ 0,00					
Reducciones		\$ 81.993,34					
TOTAL	\$ 1.067.200.499,39	\$ 1.067.118.506,05					
11- CONTROL PAGOS							
DETALLE DE PAGO		VALOR		OBSERVACIONES			
VALOR INICIAL		\$ 1.067.200.499,39					
VALOR ADICIONAL (Si aplica)		\$ 0,00					
VALOR REDUCIDO (Si aplica)		\$ 81.993,34					
VALOR TOTAL		\$ 1.067.118.506,05					
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR		\$ 377.826.472,21		Se pagaron mediante orden de pago No. 37371724 del 20-02-2024			
SEGUNDO PAGO PAC CUENTAS POR PAGAR		\$ 341.504.159,80		Se pagaron mediante orden de pago No. 43494924 del 26-02-2024			
PAGO FINAL PAC ABRIL		\$ 347.787.874,04		Se pagaron mediante orden de pago No. 111172724 del 19-04-2024			
TOTAL PAGADO A LA FECHA		\$ 1.067.118.506,05					
12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)							
ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES			
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI				
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI				
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI				
PRESENTACION ESTUDIOS DE SEGURIDAD	SI	SI	SI				
13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES							
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ AL 100% LA EJECUCIÓN DE SU CONTRATO, SE TRAMITO OFICIO No. FAC-S-2024-007097-CE DE FECHA 04 DE MARZO DE 2024, SOLICITANDO LA SOLUCION DE NOVEDADES POSTCONTRACTUALES, COMO LEVANTAMIENTO DE PISO EN GRANITO DE PISCINA, AJUSTE DE VENTILADORES EN GIMNASIO Y OFICIO No. FAC-S-2024-009905-CE DE FECHA 27 DE MARZO, RECABANDO EL OFICIO ANTERIORMENTE ENUNCIADO; DE ACUERDO A ESOS OFICIOS, EL CONTRATISTA ESTÁ SOLVENTANDO LAS POVEDADES DE PISO DEL GRANITO, EL CUAL TUVO PLAZO 02 DE MAYO PARA LA SOLUCION DE MENCIONADAS NOVEDADES, YA SE AJUSTARON LOS VENTILADORES DE TECHO DEL GIMNASIO, SE HICIERON ARREGLOS EN EL PISO DE LA PISCINA, SIN EMBARGO, AUN PERSISTE LA CALIDAD EN QUE HA SIDO INSTALADO, NOVEDADES QUE SE LES HA PEDIDO AL CONTRATISTA PARA LA CORRECTA EJECUCION D ELAS MISMAS MEDIANTE OFICIO No. FAC-S-2024-014530-CE del 6 de mayo de 2024; EN EL CONTRATO YA SE EFECTUARON LOS PAGOS ESTIPULADOS, PENDIENTE REALIZAR EL ACTA DE LIQUIDACION.							
14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climáticas):							
ELABORO:				REVISOR:			
							
MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO Residente de Interventoría/Supervisor Firma y Posfirma				TC. MOSQUERA DIAZ FELIX ANDRES Gerente de Proyecto Firma y Posfirma			
15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO							

****FAC-S-2024-007097-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-007097-CE del 4 de marzo de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESALO

Señor Abogado

MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA

Representante Legal



Bogotá, D.C.

Contraseña:gzMwWflqWY

Asunto: Garantía contrato 094-00-B-COFAC-BACOF-2023

En referencia al contrato No. 094-00-B-COFAC-BACOF-2023, que tiene como objeto "OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE - GACAS", respetuosamente me permito informar al señor Representante Legal de la empresa SAFRID INGENIERIA SAS, la novedad con el desprendimiento en algunas partes del granito lavado del área del centro de entrenamiento acuático, así, como la garantía del cielo raso del alojamiento Charlie y Bar soldados.

- Desprendimiento granito lavado centro de entrenamiento acuático.



"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

- Cielo raso alojamiento Charlie y bar soldados.



Por lo anterior, haciendo uso de la garantía de este contrato en el amparo Estabilidad y Calidad de la Obra, solicito se intervenga de manera inmediata esta novedad a más tardar el día martes 05 de marzo de 2024 y se dé respuesta a este oficio informando una fecha estimada no superior a 15 días, para el arreglo de esta novedad.



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES
Comandante Escuadrón de Apoyo Logístico (E)

Anexo: Número de folios (si los hay)

Elaboró: MY. SANCHEZ / ESALO Revisó: Aprobó: MY. SANCHEZ / ESALO



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

****FAC-S-2024-009905-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 6, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-009905-CE del 27 de marzo de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESALO

Señor Abogado

MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA

Representante Legal



Bogotá, D.C.

Contraseña: CeYl5dpK4p

Asunto: Recabo solicitud garantía contrato 094-00-B-COFAC-BACOF-2023

En referencia al contrato No. 094-00-B-COFAC-BACOF-2023, que tiene como objeto "OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE - GACAS", respetuosamente me permito informar al señor Representante Legal de la empresa SAFRID INGENIERIA SAS, la novedad con el desprendimiento en algunas partes del granito lavado del área del centro de entrenamiento acuático:

- Ausencia de caucho molido en cancha sintética, lo cual provoca el levantamiento de la grama.



"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

- Falta de compra e instalación de vidrio templado en cerramiento de piscina.



- Ajuste de ventiladores de techo en gimnasio, se encuentran sueltos.



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



- Levantamiento de granito lavado en área externa de piscina.



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



- Instalación puertas en bar soldados.




“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



Por lo anterior, haciendo uso de la garantía de este contrato en el amparo Estabilidad y Calidad de la Obra, solicito se intervenga de manera inmediata esta novedad a más tardar el día 01 de abril de 2024 y se de respuesta a este oficio informando una fecha estimada no superior a 15 días para el arreglo de mencionadas actividades; además de recordar el envío del listado de personal con número de cédulas 03 días antes de iniciar la solución de las garantías, para el respectivo ingreso a la Unidad.



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES
Comandante Escuadrón de Apoyo Logístico (E)

Anexo: Número de folios (si los hay)
TC. DIAZ / SECOM

Elaboró: MY. SANCHEZ / ESALO Revisó: Aprobó: MY. SANCHEZ / ESALO



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



****FAC-S-2024-014530-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 9, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-014530-CE del 6 de mayo de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESALO-INSTA

Señor Abogado

MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA

Representante Legal

SAFRID INGENIERIA SAS

Bogotá, D.C.



Contraseña: BdqQS0J5fl

Asunto: Garantía contrato 094-00-B-COFAC-BACOF-2023

En referencia a contrato No. 094-00-B-COFAC-BACOF-2023, que tiene como objeto "OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL GRUPO AÉREO DLE CASANARE - GACAS", respetuosamente me permito informar al señor Representante Legal de la empresa SAFRID INGENIERIA SAS, las novedades presentadas con la mala instalación del piso en granito pulido y baldosa del centro de entrenamiento acuático, la guaya de soporte de la malla en la nylon de la cancha de fútbol y las divisiones de baño en 02 habitaciones de la barraca de Suboficiales.



Foto 1: Tabletas manchadas de mortero

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



Foto 2: Mala aplicación de granito



Foto 3: Tabletas manchadas de mortero

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



Foto 4: Dilatación en unión de materiales (granito y tableta)



Foto 5: Dilatación en unión de materiales (granito y tableta)

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

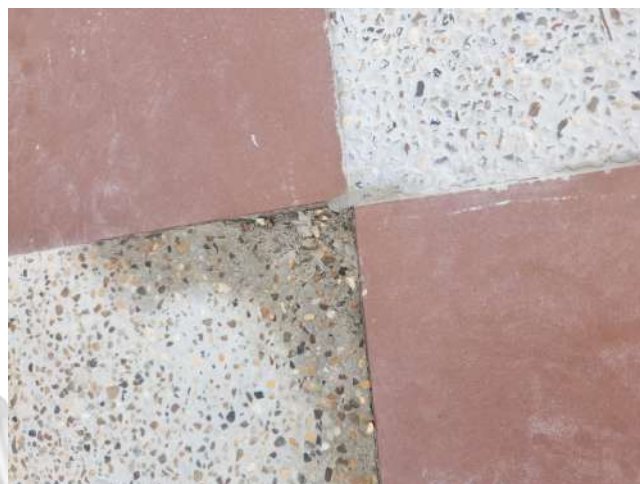


Foto 6: Desprendimiento de granito



Foto 7: Dilatación en unión de materiales (granito y tableta)

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



Foto 8: Dilatación en unión de materiales (granito y tableta)



Foto 9: Dilatación en unión de materiales (granito y tableta)

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



Foto 10: fisura en granito

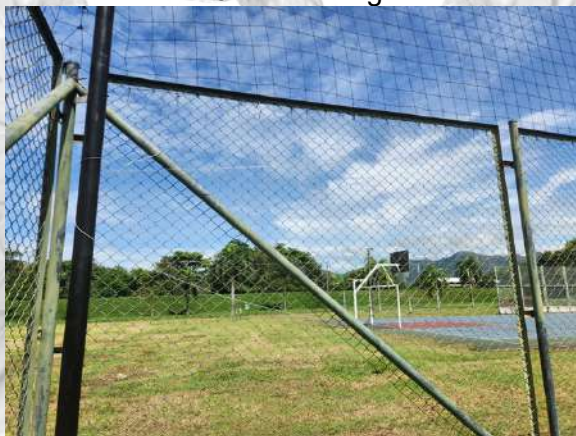


Foto 11: Desprendimiento de guaya en cancha sintética

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



Foto 12: Ausencia de guaya en cancha sintética

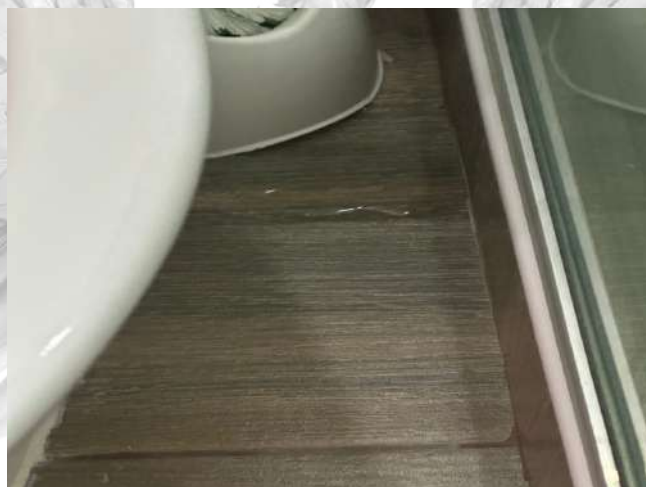


Foto 14: Humedad en divisiones de baño

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



Foto 15: Empozamiento de agua debido a falta de nivelación en piso de piscina



Foto 16: Empozamiento de agua debido a falta de nivelación en piso de piscina

Por lo anterior, haciendo uso de la garantía de este contrato en el amparo Estabilidad y Calidad de la Obra; solicito se intervenga de manera inmediata y se de respuesta a este oficio informando una fecha estimada no superior a 15 días, para el arreglo de mencionadas novedades.

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES
Comandante Escuadrilla Instalaciones

Anexo: Número de folios (si los hay)
TC. MOSQUERA / SECOM; ST. HURTADO / SECOP

Elaboró: MY. SANCHEZ / INSTA Revisó: Aprobó: MY. SANCHEZ / INSTA



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

****FAC-S-2024-007097-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-007097-CE del 4 de marzo de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESALO

Señor Abogado

MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA

Representante Legal



Bogotá, D.C.

Contraseña:gzMwWflqWY

Asunto: Garantía contrato 094-00-B-COFAC-BACOF-2023

En referencia al contrato No. 094-00-B-COFAC-BACOF-2023, que tiene como objeto "OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE - GACAS", respetuosamente me permito informar al señor Representante Legal de la empresa SAFRID INGENIERIA SAS, la novedad con el desprendimiento en algunas partes del granito lavado del área del centro de entrenamiento acuático, así, como la garantía del cielo raso del alojamiento Charlie y Bar soldados.

- Desprendimiento granito lavado centro de entrenamiento acuático.



"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

- Cielo raso alojamiento Charlie y bar soldados.



Por lo anterior, haciendo uso de la garantía de este contrato en el amparo Estabilidad y Calidad de la Obra, solicito se intervenga de manera inmediata esta novedad a más tardar el día martes 05 de marzo de 2024 y se dé respuesta a este oficio informando una fecha estimada no superior a 15 días, para el arreglo de esta novedad.



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES
Comandante Escuadrón de Apoyo Logístico (E)

Anexo: Número de folios (si los hay)

Elaboró: MY. SANCHEZ / ESALO Revisó: Aprobó: MY. SANCHEZ / ESALO



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

****FAC-S-2024-009905-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 6, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-009905-CE del 27 de marzo de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESALO

Señor Abogado

MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA

Representante Legal



Bogotá, D.C.

Contraseña: CeYl5dpK4p

Asunto: Recabo solicitud garantía contrato 094-00-B-COFAC-BACOF-2023

En referencia al contrato No. 094-00-B-COFAC-BACOF-2023, que tiene como objeto "OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE - GACAS", respetuosamente me permito informar al señor Representante Legal de la empresa SAFRID INGENIERIA SAS, la novedad con el desprendimiento en algunas partes del granito lavado del área del centro de entrenamiento acuático:

- Ausencia de caucho molido en cancha sintética, lo cual provoca el levantamiento de la grama.



"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

- Falta de compra e instalación de vidrio templado en cerramiento de piscina.



- Ajuste de ventiladores de techo en gimnasio, se encuentran sueltos.



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



- Levantamiento de granito lavado en área externa de piscina.



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



- Instalación puertas en bar soldados.




“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



Por lo anterior, haciendo uso de la garantía de este contrato en el amparo Estabilidad y Calidad de la Obra, solicito se intervenga de manera inmediata esta novedad a más tardar el día 01 de abril de 2024 y se de respuesta a este oficio informando una fecha estimada no superior a 15 días para el arreglo de mencionadas actividades; además de recordar el envío del listado de personal con número de cédulas 03 días antes de iniciar la solución de las garantías, para el respectivo ingreso a la Unidad.



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES
Comandante Escuadrón de Apoyo Logístico (E)

Anexo: Número de folios (si los hay)
TC. DIAZ / SECOM

Elaboró: MY. SANCHEZ / ESALO Revisó: Aprobó: MY. SANCHEZ / ESALO



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



****FAC-S-2024-014530-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 9, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-014530-CE del 6 de mayo de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESALO-INSTA

Señor Abogado

MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA

Representante Legal

SAFRID INGENIERIA SAS

Bogotá, D.C.



Contraseña: BdqQS0J5fl

Asunto: Garantía contrato 094-00-B-COFAC-BACOF-2023

En referencia a contrato No. 094-00-B-COFAC-BACOF-2023, que tiene como objeto "OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL GRUPO AÉREO DLE CASANARE - GACAS", respetuosamente me permito informar al señor Representante Legal de la empresa SAFRID INGENIERIA SAS, las novedades presentadas con la mala instalación del piso en granito pulido y baldosa del centro de entrenamiento acuático, la guaya de soporte de la malla en la nylon de la cancha de fútbol y las divisiones de baño en 02 habitaciones de la barraca de Suboficiales.



Foto 1: Tabletas manchadas de mortero

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



Foto 2: Mala aplicación de granito



Foto 3: Tabletas manchadas de mortero

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



Foto 4: Dilatación en unión de materiales (granito y tableta)



Foto 5: Dilatación en unión de materiales (granito y tableta)

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

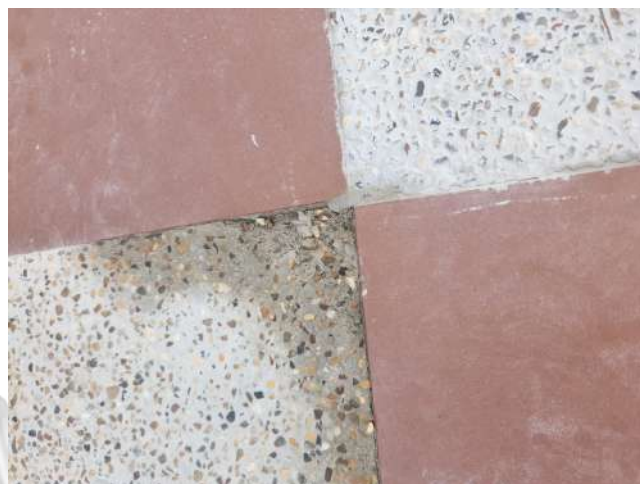


Foto 6: Desprendimiento de granito



Foto 7: Dilatación en unión de materiales (granito y tableta)

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



Foto 8: Dilatación en unión de materiales (granito y tableta)



Foto 9: Dilatación en unión de materiales (granito y tableta)

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



Foto 10: fisura en granito

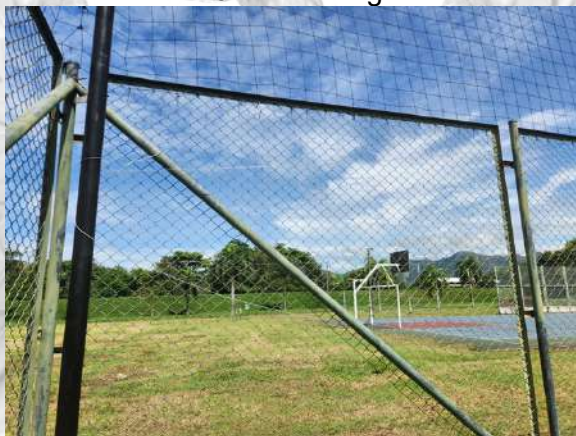


Foto 11: Desprendimiento de guaya en cancha sintética

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



Foto 12: Ausencia de guaya en cancha sintética

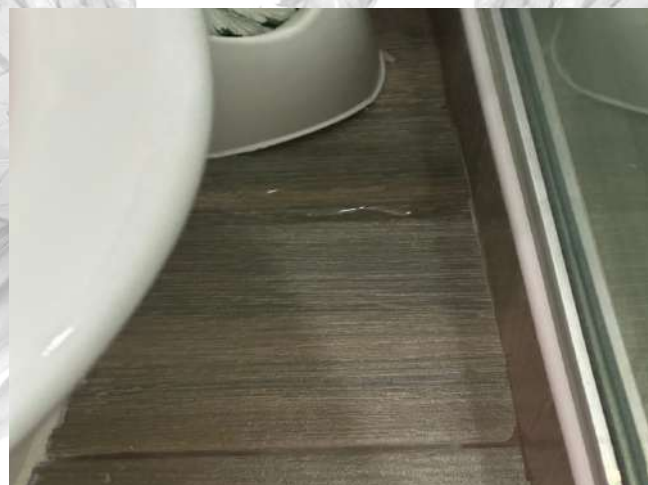


Foto 14: Humedad en divisiones de baño

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



Foto 15: Empozamiento de agua debido a falta de nivelación en piso de piscina



Foto 16: Empozamiento de agua debido a falta de nivelación en piso de piscina

Por lo anterior, haciendo uso de la garantía de este contrato en el amparo Estabilidad y Calidad de la Obra; solicito se intervenga de manera inmediata y se de respuesta a este oficio informando una fecha estimada no superior a 15 días, para el arreglo de mencionadas novedades.

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES
Comandante Escuadrilla Instalaciones

Anexo: Número de folios (si los hay)
TC. MOSQUERA / SECOM; ST. HURTADO / SECOP

Elaboró: MY. SANCHEZ / INSTA Revisó: Aprobó: MY. SANCHEZ / INSTA



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800 Yopal Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co
