

|                                                                                   |                        |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|
|  | <p>ACTA DE REUNION</p> | <p>Versión: 1</p> | <p>AGAFF50</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|

ACTA No. \_\_\_\_

|                          |               |       |      |
|--------------------------|---------------|-------|------|
| OBRA:                    | Otoño Etapa 2 |       |      |
| FECHA:                   | 26-12-23      | HORA: | 9:00 |
| ASISTENTES               |               |       |      |
| Silvio Gonzales R.L. MC. |               |       |      |
| Sebastián Celis          |               |       |      |
| Francisco Arango         |               |       |      |
| Andrés Galarza           |               |       |      |

TEMAS:

1. Seguimiento de compromisos
- 2.
- 3.
- 4.

| Actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. El 27-01-23 se radican completo los documentos del SST. El 28-01-23 se contará con el SST en campo.</p> <p>2. No se cumplió con la excavación total de la vía al 30-12-23. El nuevo compromiso es para iniciar el 27-01-23 hasta 4-01-24.</p> <p>• El cerramiento paralelo al rancho se termina el 29-12-23</p> <p>• No se cumplió con la instalación de rasón, sello y geotextil al 10-12-23.</p> <p>• MR solicita si se puede suministrar los granulares por parte de Amarillo, se realizará un balance para determinar los m<sup>3</sup> que falta por instalar.</p> <p>• Se enviará las fechas de reprogramación de granulares. Se propone que para el 15 de febrero se tenga determinado los granulares.</p> |

o Tramo Pluvial 72H - 72 no se cumplió  
 el 21-11-23. Nuevo compromiso 2-01-24.

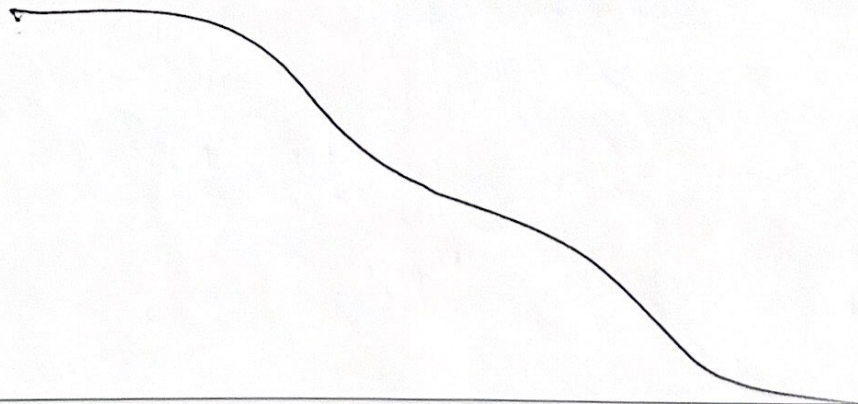
Tramo Pluvial 70-70A → 24-11-23 No se cumplió  
 → 9-01-24

II 70H-102 → 28-11-23 No se cumplió  
 → 12-01-24

II 100-102 → 15-12-23 No se cumplió  
 → 29-01-24.

3. MR informa que no tiene los recursos  
 disponibles para poder ejecutar las redes  
 que van por las alamedas. Proponen que  
 Amarillo suministre los materiales y que  
 ellos ejecuten la mano de obra de la instalación  
 de los mismos. Amarillo registrará la  
 propuesta.

4. Amarillo informa que por parte de MR  
 se ha incumplido teniendo en cuenta los  
 compromisos del comité del 15-11-23.

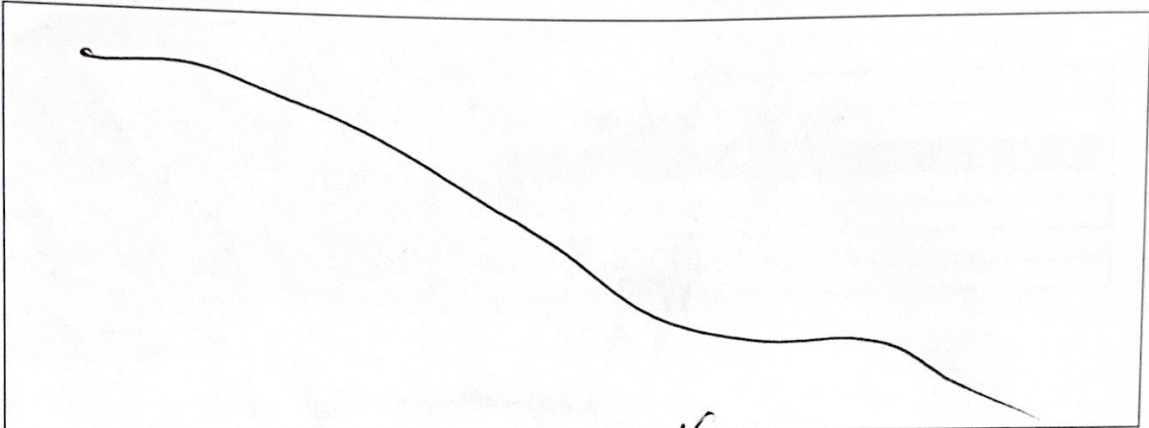







# ACTA DE REUNION

Versión: 1

AGAFF50



## FIRMAS DE APROBACION

|                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Andres Felya Galante D.O.  |  |
| Sebastian Parada Celis    |  |
| Andres Gonzalez          |  |
| Francisco Llanco         |  |
|                                                                                                              |  |
|                                                                                                              |  |
