

CONSORCIO INTER-HUILA 2021

NIT. 901.552.336-6

Carrera 4 No. 9-25 Oficina 509 – Edificio Diego de Ospina
Teléfono: (098) 866 68 43 – 316 467 99 67
Correo electrónico: consorciointerhuila2270@hotmail.com
Neiva - Huila

OFICIO CIH-2022-149

Bogotá, julio 06 de 2024

Ingeniero

YEISON ALONSO CARDENAS

R.L. UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023

Email: infraestructura@bbingenieros.com

Email: ut.sanpablo2023@gmail.com

Carrera 15 No. 49-84 oficina 303 Bogotá – Tel: 7312249

REF: CONTRATO No. 2270-2021 "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE PAIME Y CAPARRAPI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ASUNTO: PRIMERA SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO A PLAN DE CONTINGENCIA Y PLAN DE REPARACIÓN DE PLACA HUELLAS – CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LP-009-2021.

El Consorcio Inter- Huila 2021 quien ejerce funciones de interventor externo bajo el contrato citado en la referencia al contrato de obra pública No. LP-009-2021 derivado del Convenio 1197 de 2021 con objeto “**AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA COLOMBIA RURAL NACIONAL**”, requiere se de estricto cumplimiento en la puesta en marcha del Plan de contingencia y el plan de reparación de placa huellas aprobado con fecha 11 de junio de 2024, que a probada la documentación citada, han transcurrido 20 días calendario, en donde atendiendo la documentación aprobada deberían estar en ejecución los siguientes tramos:

PLAN DE CONTINGENCIA:

CUADRILLAS POR TRAMOS Y POR ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN	PERSONAL DE OBRA	
TRAMO 4: PIO QUINTO		
CUADRILLA #1 - PLACA HUELLA	MAESTRO	1
	OFICIAL	1
	AYUDANTES	2
CUADRILLA #2 - PLACA HUELLA	MAESTRO	1
	OFICIAL	1

CONSORCIO INTER-HUILA 2021**NIT. 901.552.336-6**

Carrera 4 No. 9-25 Oficina 509 – Edificio Diego de Ospina
 Teléfono: (098) 866 68 43 – 316 467 99 67
 Correo electrónico: consorciointerhuila2270@hotmail.com
 Neiva - Huila

TRAMO 11: EL TOSTADO - SAN PABLO		
CUADRILLA #3 - PLACA HUELLA	MAESTRO	1
	OFICIAL	1
	AYUDANTES	8
CUADRILLA #4 ADOQUIN	MAESTRO	1
	AYUDANTES	3
TRAMO 10: EL TOSTADO - SAN PABLO		
CUADRILLA #5 - PLACA HUELLA	MAESTRO	1
	OFICIAL	1
	AYUDANTES	8
TRAMO 9: EL TOSTADO - SAN PABLO		
CUADRILLA #6 - PLACA HUELLA	MAESTRO	1
	OFICIAL	1
	AYUDANTES	8

8. TIEMPO CONTEMPLADO PARA LA EJECUCIÓN POR TRAMO DE PLACA HUELLA

ESTADO ACTUAL DE LOS TRAMOS				
TRAMO/SECTOR	LONG. TRAMO	LONG. AVANCE	POR EJEC.	ESTADO
CENTRAL DE MIELES	457.6	452.66	4.94	EN EJECUCIÓN
PIO QUINTO – EL SILENCIO	1715.8	1338.32	377.48	EN EJECUCIÓN
PARRI	159.8	153.60	0.00	FINALIZADO
EL TOSTAO – SAN PABLO	388.35	163.18	225.17	EN EJECUCIÓN
EL TOSTAO – SAN PABLO	936	406.22	529.78	EN EJECUCIÓN
EL TOSTAO – SAN PABLO	841.1	569.93	271.17	EN EJECUCIÓN
TOTALES	4498.65	3083.92	1408.53	

PERIODO DE TIEMPO DE EJECUCIÓN POR TRAMOS DE PLACA HUELLA				
TRAMO/SECTOR	POR EJEC. ML	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	OBSERVACIONES
T 3 CENTRAL DE MIELES	0.75	13/06/2024	13/06/2024	Fundición de rampa de aproximación
T 4 PIO QUINTO – EL SILENCIO	377.48	03/06/2024	24/08/2024	Tramo en ejecución
T 6 PARRI	0.00	00	00	Finalizado
T11 EL TOSTAO – SAN PABLO	271.17	03/06/2024	20/08/2024	Tramo en ejecución
T 10 EL TOSTAO – SAN PABLO	529.78	03/06/2024	28/09/2024	Tramo en ejecución
T 9 EL TOSTAO – SAN PABLO	225.17	03/06/2024	20/08/2024	Tramo en ejecución
TOTALES	1408.53			

CONSORCIO INTER-HUILA 2021

NIT. 901.552.336-6

Carrera 4 No. 9-25 Oficina 509 – Edificio Diego de Ospina
Teléfono: (098) 866 68 43 – 316 467 99 67
Correo electrónico: consorciointerhuila2270 @hotmail.com
Neiva - Huila

=====

Que actualmente se encuentra el siguiente personal, organizado de la siguiente manera:

Tramo # 4:

- 1. Maestro
- 4. Ayudantes
- 1. Paletera.

El personal no esta integrado, ni organizado de acuerdo a lo contemplado para completar las actividades pendientes sobre el tramo 4.

Tramo # 11:

- 2. maestros de obra.
- 12. ayudantes.
- 1. Siso
- 2. Paleteros

El personal mencionado obedece a dos cuadrillas de trabajo de, 1 maestro, 6 ayudantes.

Tramo # 10:

No se encuentra personal laborando a la fecha.

Tramo # 9:

No se encuentra personal laborando a la fecha.

Tramo # 3:

No se encuentra personal laborando a la fecha. Pendiente por terminar de fundir una rampa de aproximación.

PLAN DE REPARACIÓN DE PLACA HUELLAS:

CUADRILLA PARA REPARACIONES

DESCRIPCIÓN	PERSONAL DE OBRA	
TRAMO 3: CENTRAL DEMIELES Y TRAMO 4: PIO QUINTO		
CUADRILLA #1 – REPARACION DE PLACA HUELLA	MAESTRO	1
	OFICIAL	1
	AYUDANTES	3

CONSORCIO INTER-HUILA 2021

NIT. 901.552.336-6

Carrera 4 No. 9-25 Oficina 509 – Edificio Diego de Ospina
Teléfono: (098) 866 68 43 – 316 467 99 67
Correo electrónico: consorciointerhuila2270@hotmail.com
Neiva - Huila

CUADRILLA PARA REPARACIONES

DESCRIPCIÓN	PERSONAL DE OBRA	
TRAMO 4: PIO QUINTO		
CUADRILLA #2 – REPARACION DE PLACA HUELLA	MAESTRO	1
	OFICIAL	1
	AYUDANTES	3

CUADRILLA PARA REPARACIONES

DESCRIPCIÓN	PERSONAL DE OBRA	
TRAMO 6: PARRÍ – TRAMO 9 y 10: EL TOSTAO - SAN PABLO		
CUADRILLA #3 – REPARACION DE PLACA HUELLA	MAESTRO	1
	OFICIAL	1
	AYUDANTES	3

CUADRILLA PARA REPARACIONES

DESCRIPCIÓN	PERSONAL DE OBRA	
TRAMO 11: EL TOSTAO - SAN PABLO		
CUADRILLA #4 – REPARACION DE PLACA HUELLA	MAESTRO	1
	OFICIAL	1
	AYUDANTES	3

8.1 PROGRAMACIÓN PARA REPARACIÓN DE PLACA HUELLAS POR TRAMOS

TRAMO/SECTOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	OBSERVACIONES
T3 CENTRAL DE MIELES	24/06/2024	12/07/2024	18 días Calendario para la ejecución de reparaciones.
T 4 PIO QUINTO – EL SILENCIO	13/07/2024	10/09/2024	60 días Calendario para la ejecución de reparaciones.
T 6 PARRÍ	18/06/2024	2/07/2024	15 días Calendario para la ejecución de reparaciones.
T11 EL TOSTAO – SAN PABLO	18/06/2024	31/07/2024	44 días Calendario para la ejecución de reparaciones.
T 10 EL TOSTAO – SAN PABLO	26/07/2024	12/08/2024	18 días Calendario para la ejecución de reparaciones.
T 9 EL TOSTAO – SAN PABLO	03/07/2024	25/07/2024	23 días Calendario para la ejecución de reparaciones.

CONSORCIO INTER-HUILA 2021

NIT. 901.552.336-6

Carrera 4 No. 9-25 Oficina 509 – Edificio Diego de Ospina
Teléfono: (098) 866 68 43 – 316 467 99 67
Correo electrónico: consorciointerhuila2270 @hotmail.com
Neiva - Huila

=====

Actualmente no se encuentra personal de reparación de placa huellas en el tramo 3; tramo 6 y tramo 11, los cuales ya deberían haber sido iniciados de acuerdo a la programación aprobada con fecha 11 de junio de 2024, es claro que pasados 20 días calendario, y la Unión Temporal Vía San Pablo 2023, no ha dado cumplimiento a lo estipulado en el documento denominado “PLAN DE MEJORAMIENTO PARA REPARACION DE PLACA HUELLA”.

CONCLUSIONES:

Concluye la interventoría externa, que aprobados los documentos denominados PLAN DE CONTINGENCIA Y PLAN DE MEJORAMIENTO PARA REPARACION DE PLACA HUELLA con fecha 11/06/2024, se debió dar estricto cumplimiento desde la fecha de aprobación, que es claro que planteadas las cuadrillas de intervención y las fechas de inicio y fin para el cumplimiento de la meta física para cada uno de los tramos contemplados, estas no se están cumpliendo; con el fin de que el contrato LP-009-2021 llegue a feliz término el 30 de septiembre de 2024, dando cumplimiento al objeto contractual, se solicita al contratista de obra acatar lo contemplado en los documentos anteriormente citados, que en vista del presunto incumplimiento a lo referido, este grupo interventor hace el primer llamado a la Unión Temporal Vía San Pablo 2023 para que atienda y de cumplimiento a lo establecido en dicho documentos.

De antemano se agradece la atención prestada.

Cordialmente,



JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER – HUILA 2021.

C.C

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPOS
DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA (E)
E-mail: gcepeda@invias.gov.co

LUIS FERNADO ROJAS CRUZ
GESTOR - INVIAS
E-mail: lrojasc@invias.gov.co

DR. ANDRÉS ARDILA SÁNCHEZ
Alcalde Municipal de Caparrapí
E-mail: alcaldia@caparrapí-cundinamarca.gov.co

CONSORCIO INTER-HUILA 2021

NIT. 901.552.336-6

Carrera 4 No. 9-25 Oficina 509 – Edificio Diego de Ospina
Teléfono: (098) 866 68 43 – 316 467 99 67
Correo electrónico: consorciointerhuila2270@hotmail.com
Neiva - Huila

=====

ING. EDWIN ORTEGA PAVA
Secretario de Planeación
E-mail: planeacion@caparrapi-cundinamarca.gov.co

Dr. RUBÉN CASTRO
Dr. RICSON CARDENAS
E-mail: juridica@caparrapi-cundinamarca.gov.co

ANEXOS



CONSORCIO INTER-HUILA 2021

NIT. 901.552.336-6

Carrera 4 No. 9-25 Oficina 509 – Edificio Diego de Ospina
Teléfono: (098) 866 68 43 – 316 467 99 67
Correo electrónico: consorciointerhuila2270 @hotmail.com
Neiva - Huila

=====



Registros Fotográficos tramo # 11: Se anexan los registros fotográficos de las actividades que se vienen desarrollando en el tramo, Sector El Tostao – San Pablo.



Registros Fotográficos tramo # 10: no se registran actividades, Sector El Tostao – San Pablo.


CONSORCIO INTER-HUILA 2021

NIT. 901.552.336-6

Carrera 4 No. 9-25 Oficina 509 – Edificio Diego de Ospina
Teléfono: (098) 866 68 43 – 316 467 99 67
Correo electrónico: consorciointerhuila2270@hotmail.com
Neiva - Huila



Registros Fotográficos tramo # 9: no se registran actividades, Sector El Tostao – San Pablo.

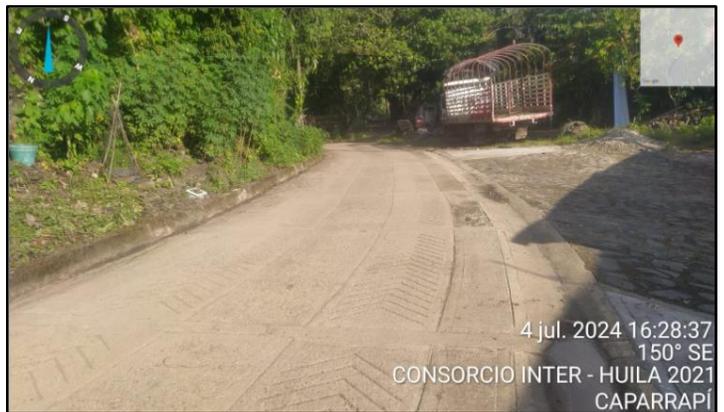

CONSORCIO INTER-HUILA 2021

NIT. 901.552.336-6

Carrera 4 No. 9-25 Oficina 509 – Edificio Diego de Ospina
Teléfono: (098) 866 68 43 – 316 467 99 67
Correo electrónico: consorciointerhuila2270 @hotmail.com
Neiva - Huila

=====

Registros Fotográficos tramo # 6: no se registran actividades, Sector El Tostao – San Pablo.



Registros Fotográficos tramo # 4: registros de actividades realizadas en el tramo, Sector Pio Quinto – El Silencio.



Registros Fotográficos tramo # 3: no se registran actividades, Sector Central de Mieles.

CONSORCIO INTER-HUILA 2021

NIT. 901.552.336-6

Carrera 4 No. 9-25 Oficina 509 – Edificio Diego de Ospina
Teléfono: (098) 866 68 43 – 316 467 99 67
Correo electrónico: consorciointerhuila2270 @hotmail.com
Neiva - Huila



Registros Fotográficos tramo # 3: no se registran actividades, Sector Central de Mieles.
