



Con el fin de cumplir con las metas establecidas en el plan de desarrollo 2016- 2019, fue necesario abrir este proceso de adquisición.

Tabla 42 – Suministro de Materiales.

BP 18028917							
CONTRATO							
SUMINISTRO DE MATERIALES PREFABRICADOS PARA ADECUACIÓN DE VÍAS Y ANDEN							
ADOQUINES EN SANTIAGO DE CALI							
Valor Inicial	Valor Adicionado	Valor Actualizado	Valor ejecutado	Porcentaje ejecutado	Acta de Inicio	Plazo Inicial	Ac
\$1.078.546.243	N/A	\$1.078.546.243	\$345.134.798	32.00	9-nov-18	31-dic-18	3

Fuente: Secretaría de Infraestructura.

### COMPRA DE VOLQUETAS, CAMIONES, CAMIONES GRUA Y MAQUINARIA PESADA REQUERIDOS POR EL PROGRAMA DE ADOQUINES Y EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

Los equipos de maquinaria para la construcción tienen un desgaste continuo que aun a pesar de hacer un mantenimiento adecuado, las piezas van fallando y finalmente es necesario reemplazarlas. A medida que la maquinaria aumenta su uso, el reemplazo de sus partes se hace más seguido, lo que finalmente, en términos de costos, el precio de los repuestos llega a superar el valor de una nueva maquinaria, haciendo una proyección en el tiempo. Es decir, que cuando se prevea que, en el futuro, el costo por hora de poseer y operar una unidad va a ser mayor que el costo hora promedio, entonces, en este punto la maquinaria ha llegado al final de su vida económica y es necesario reemplazarla por una nueva. Siguiendo el “Manual del usuario sobre las tarifas de arrendamiento para equipos de construcción” de la Cámara Colombiana de Infraestructura, se observa que la vida útil de maquinaria pesada para la construcción, mantenimiento y/o rehabilitación varía entre 7 y 10 años. La edad del parque automotor propiedad del Municipio - Secretaría de infraestructura asciende a un promedio de vida entre 7 y 10 años. A la fecha, el 43% de la flota de volquetas, camiones y el 38% de maquinaria amarilla ya han cumplido con este tiempo, motivo por el cual se adquirieron la nueva flota de maquinaria.

Por tal motivo, se eligió mediante la modalidad de selección abreviada por Subasta inversa a un proponente que le oferte en las condiciones mas favorables a la Administración Municipal de Santiago de Cali los equipos y maquinaria pesada aquí mencionados. Dicha modalidad se ajusta al presente proceso al tratarse de una adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes. La





maquinaria y equipos requeridos son los bienes y servicios de común utilización con especificaciones técnicas y patrones de desempeño y calidad iguales o similares, que en consecuencia pueden ser agrupados como bienes y servicios homogéneos para su adquisición tal como para el caso que nos ocupa (3 GRUPOS), mencionados a continuación

*Tabla 43 – Activos – Relación de Maquinaria Amarilla.*

GRUPO	OBJETO	CANTIDAD
1	VOLQUETAS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 7 M3	7
GRUPO	OBJETO	CANTIDAD
2	CAMIONES DE ESTACAS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 4 TON.	1
	CAMIONES CON PLANCHÓN GRÚA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 8 TON	2
GRUPO	OBJETO	CANTIDAD
3	RETROEXCAVADORA.	2
	MINICARGADOR	4
	VIBRO COMPACTADOR DOBLE RODILLO	1
	VIBRO COMPACTADOR RODILLO - LLANTA	2

Fuente: Secretaría de Infraestructura.

**EL PRESENTE CUADRO NOS MUESTRA LOS GRUPOS Y LOS VALORES DE ADJUDICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LA MAQUINARIA.**

*Tabla 44 – Relación proceso Maquinaria Amarilla.*

<b>BP 18028917</b>
<b>CONTRATO</b>
<b>COMPRA DE VOLQUETAS, CAMIONES, CAMIONES GRUA Y MAQUINARIA PESADA REQUERIDOS POR EL PROGRAMA DE ADOQUINES Y EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>




**Infraestructura**

	Valor Inicial	Valor Actualizado	Valor ejecutado	Porcentaje ejecutado	Acta de Inicio	Plazo Inicial	Plazo Actualizado
<b>GRUPO 1 NAVITRANS S.A.S</b>	\$2.090.975.135	\$2.090.975.135	\$2.090.975.135	100%	27-Ago-18	26-Oct-18	25-Nov-18
<b>GRUPO 2 AUTOPACIFICO S.A.</b>	\$909.712.865	\$909.712.865	\$909.712.865	100%	27-Ago-18	26-Oct-18	25-Nov-18
<b>GRUPO 3 GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A GECOLSA</b>	\$1.735.290.043	\$1.735.290.043	\$1.735.290.043	100%	27-Ago-18	26-Oct-18	15-abr-19

Fuente: Secretaria de Infraestructura.

# **k. PROGRAMA ADOQUINES.**

FICHA BP- 18028917



## **PAGOS**

Ítems	Pagos	%	Disponible	%
Prestación de servicios	\$ 838.163.000	54.42	\$700.446.683	45.58
Materiales	\$ 376.515.957	21.31	\$ 1.390.735.633	78.69
Maquinaria	\$ 4.610.591.449	97.35	\$ 125.386.594	2.65

## **INVERSIÓN**

PRESTACION DE SERVICIOS	Valor total de los Contratos por P.S	838.163.000
PROCESO No 1 ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS MENORES	Valor Total Adjudicado	688.705.347


PROCESO No 2 MATERIALES PREFABRICADOS	Valor Total Adjudicado	1.078.546.243
PROCESO No 3 MAQUINARIA AMARILLA	Valor Total Adjudicado	4.735.978.043
<b>Valor Total inversiones</b>		<b>7.341.392.633</b>

## **ACTIVOS**

<b>MAQUINARIA AMARILLA</b> \$ 4.735.978.043	VOLQUETAS Cap. min 7m3.	7 UND
	CAMIONES DE ESTACAS Carga 4 Ton.	1 UND
	CAMION CON PLANCHÓN GRÚA Cap. Carga Min. 8 Ton	2 UND
	RETROEXCAVADORA.	2 UND
	MINICARGADOR	4 UND
	VIBRO COMPACTADOR DOBLE RODILLO	1 UND
<b>MATERIALES PREFABRICADO</b> \$ 1.078.546.243	VIBRO COMPACTADOR RODILLO - LLANTA	2 UND
	ADOQUIN EN CONCRETO	20.000 M2
	BORDILLO	1.600 ML
<b>MATERIALES Y EQUIPOS MENORES</b> \$ 688.705.347	CUNETAS	1.500ML
	ARENA	2.900 M3
	CEMENTO	1934 bulto
	GEOTEXTIL	12 rollos
	GRAVA ¾	281 M3

**META PLAN DE DESARROLLO AL 2019 66.000 m2**

PERIODO	AREA INTERVENIDA m2	RESTANTES m2
Enero de 2016 a diciembre de 2016	4.323	61.677
Enero de 2017 a diciembre de 2017	1.912	59.765
Enero de 2018 a diciembre de 2018	20.000	39.765
Enero de 2019 a junio de 2019	4.270	35.495
<b>TOTAL</b>	<b>30.505</b>	<b>35.495</b>

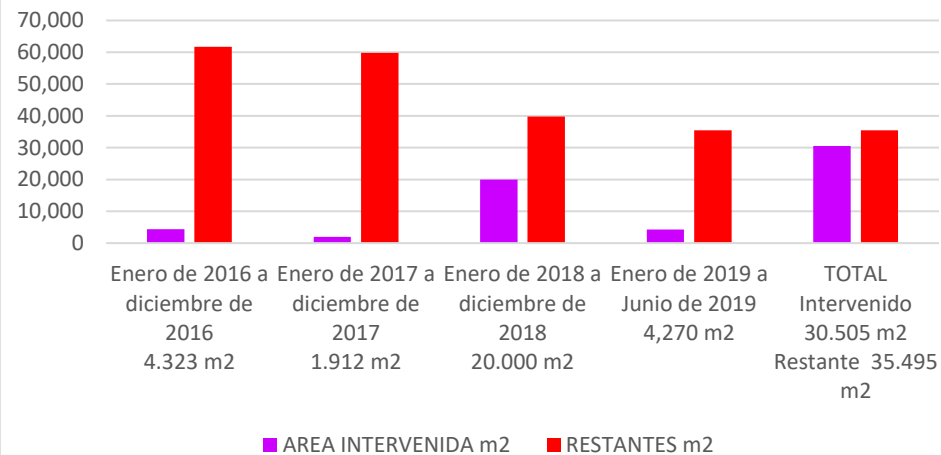**Gráfico 15- – Panorama Actual Programa Adoquines.**
**PANORAMA ACTUAL**

**CRONOGRAMA AVANCE FISICO**

Actividad		Ene 2019	Feb 2019	Mar 2019	Abr 2019	May 2019	Jun 2019	Jul 2019	Ago 2019
Programa do	P						37.00		
Ejecutado	E						12.00		

**NOTA:** El avance físico programado no se ha cumplido ya que el mes de MAYO del presente año no hubo personal y a la fecha no se han completado la contratación de todo el personal.

**TEMAS DE GESTION**

TEMA	ENTIDAD	OBSERVACIONES
Adquisición De Predios	EMRU	No aplica
Licencia ambiental	ANLA	No aplica
Diseño Redes Húmedas	EMCALI	No aplica
Diseño Redes Secas	EMCALI	No aplica




i. REGISTRO FOTOGRAFICO.

---



# 11. PROYECTOS NO VIABLES

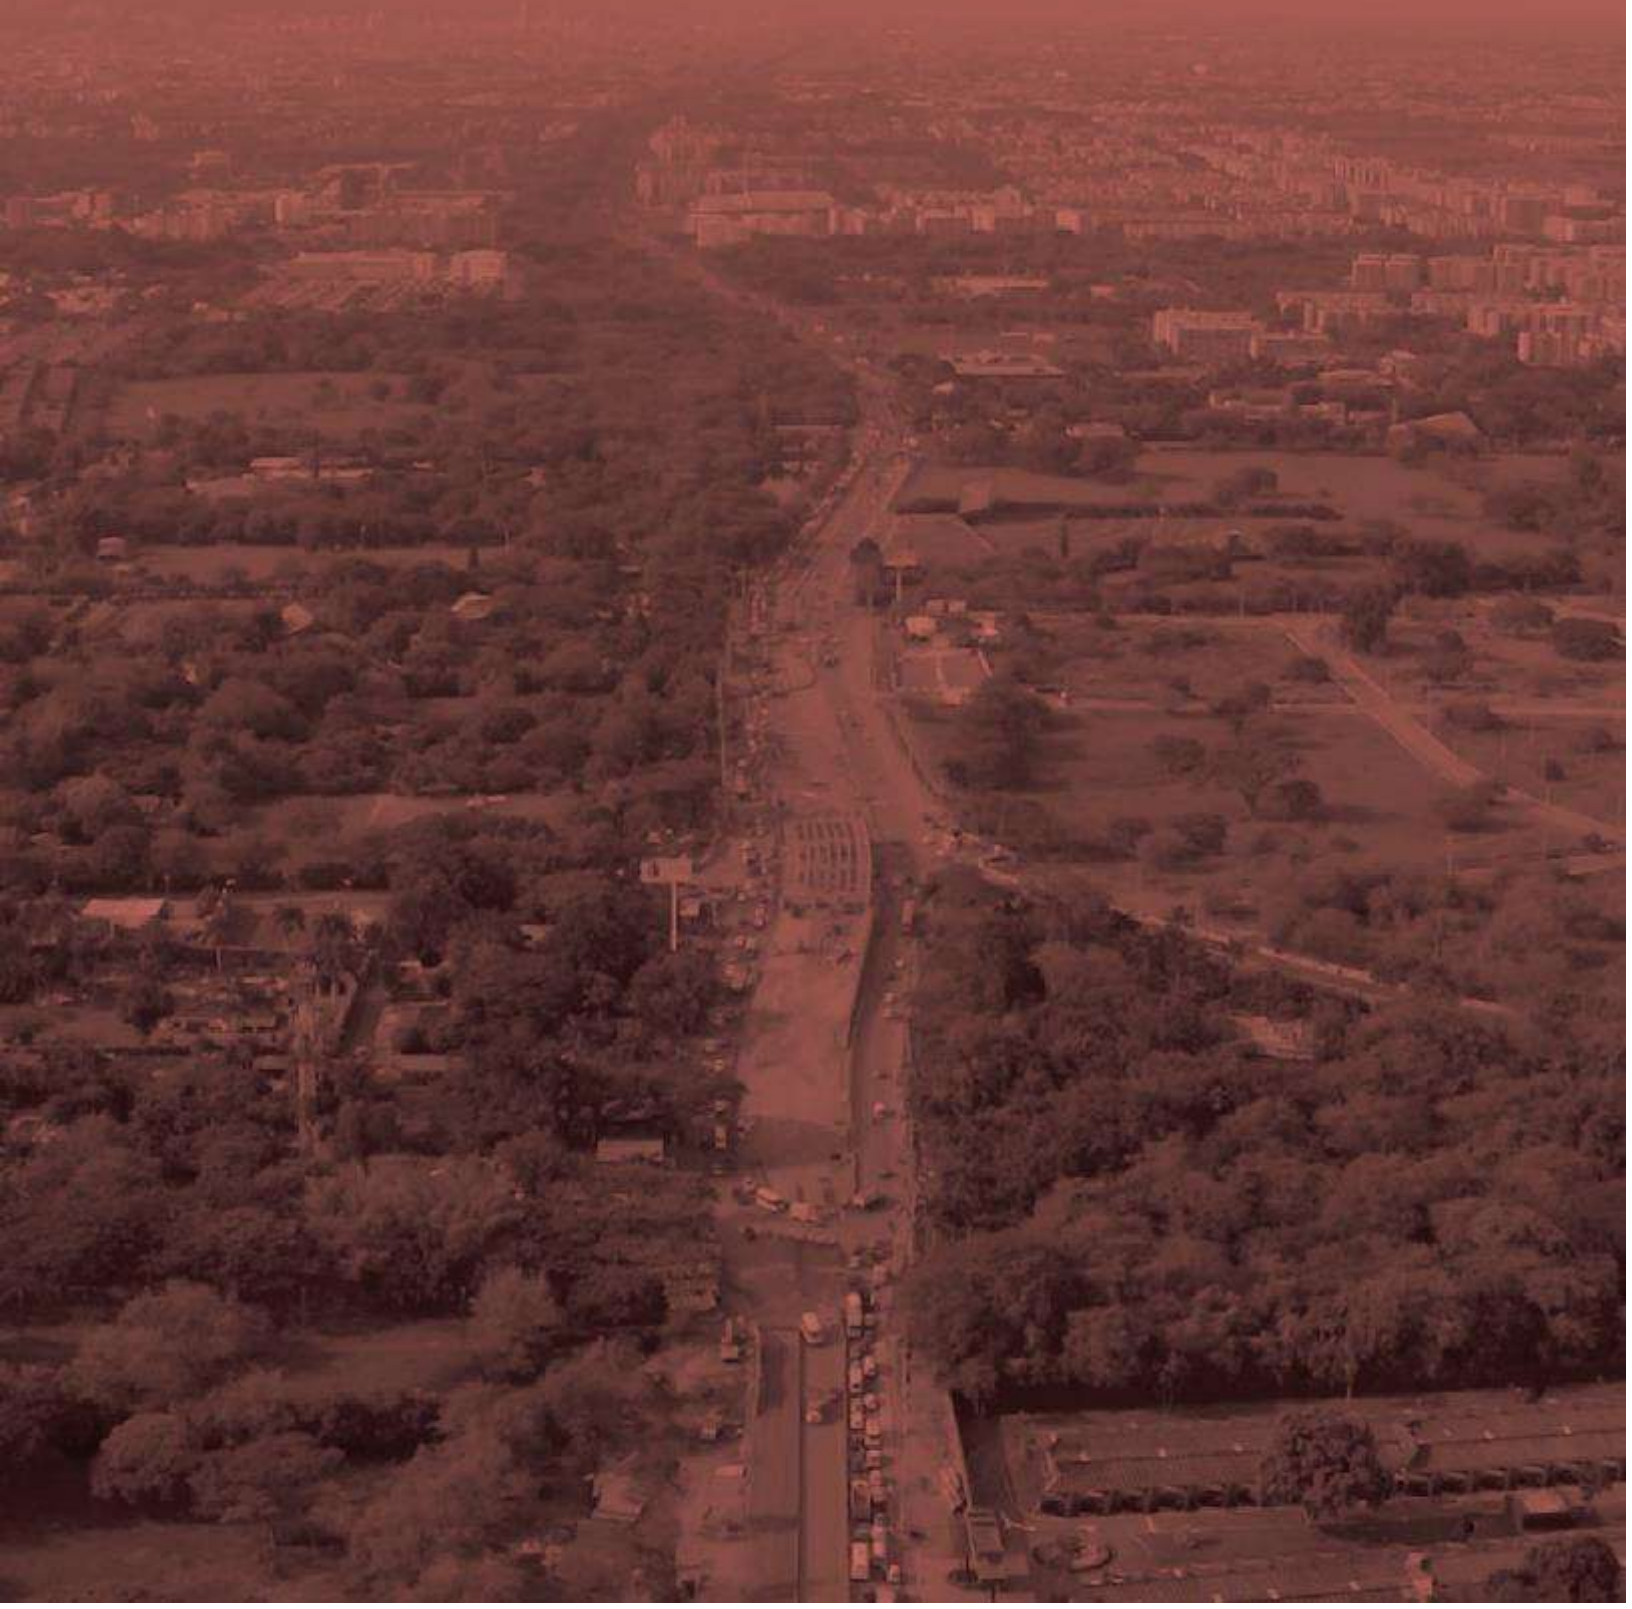



## 10. PROYECTOS NO VIABLES.

### a. CICLO - INFRAESTRUCTURA

Para la ejecución de este proyecto se dividió en dos actividades CONSTRUCCIÓN y MANTENIMIENTO.

Para la primera actividad de **CONSTRUCCIÓN** la Secretaria de Infraestructura saco el proceso No 4151.0.32.45.2018 para la obra y el proceso No 4151.010.32.48.2018 para la interventoría, el estado actual del proyecto se encuentra en ejecución.

La segunda actividad de **MANTENIMIENTO**, la secretaria tenía orientado los diseños a la ciclovía existente de la autopista simón bolívar, no se pudo ejecutar debido a que **METROCALI** va desarrollar el proyecto de la construcción de la estación de parada del troncal oriente del sistema **MIO**, dicho proyecto va intervenir en el separador de la autopista Simón Bolívar y por no tener los diseños definitivos de las estaciones de parada se acordó con **METROCALI** que la ciclo infraestructura será ejecutada conjuntamente con la construcción de la troncal.

### b. INTERSECCIÓN A DESNIVEL CALLE 70 CON AV. 3N - SAMECO

Por tratarse de una vía que involucra el territorio de los municipios de Cali Y yumbo no era posible su ejecución solo con los recursos apropiados por el concejo de Cali, razón por la cual con el apoyo de la bancada parlamentaria se gestionó ante el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Infraestructura **ANI**, que este proyecto fuera incluido en la estructuración de la concesión para la **NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA**.

### **C. DISEÑO AV CIUDAD DE CALI.**

---

Que mediante oficio 2017-4173010-1122296-2 del 08 de septiembre de 2017, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitando que el valor solicitado del acuerdo 0415 de 2017 sean ajustadas, **“la destinación de los recursos para “Estudios y Diseños Avenida Ciudad de Cali”, al parecer no corresponde a un gasto de inversión que se pueda financiar mediante operaciones de crédito publico, de acuerdo a lo manifestado por la Dirección General de Apoyo Fiscal de este Ministerio.”**<sup>11</sup>.

En este orden de ideas, conceptuó el Ministerio “...que dichos gastos deben ser incluidos dentro de la estructuración del proyecto, para poder ser considerados como gastos de inversión, pues si no se incluyen en la estructuración del mismo, no se estará efectuando una debida programación integral del programa presupuestal y, en consecuencia, serán analizados individualmente y deberán ser considerados como gastos de funcionamiento”<sup>12</sup>, por ese motivo se tuvo que eliminar el proyecto identificado “Estudios y Diseños Avenida Ciudad de Cali” de los componentes a financiar con los recursos del EMPRÉSTITO, en atención a la observación realizada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y como requisito para la inclusión en la Base Única de Datos las operaciones de crédito publico.

**FERNEY CAMACHO**  
INGENIERO CIVIL  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

---


<sup>11</sup> DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL RAD 2-2017-028762 Bogotá D.C., 5 de septiembre de 2017 15:30 / oficio 2017-4173010-1122296-2 del 08 de septiembre de 2017.

<sup>12</sup> Consulta gastos de inversión. Interventorías, estudios, diseños. Luis Fernando Villota Quiñones. Subdirector de Fortalecimiento Territorial. Dirección de Apoyo Fiscal.

<b>Elaborado por:</b> <b>Piter Basto Porras</b> - Contratista S.I. <b>Juan Carlos Giraldo</b> - Contratista S.I.	<b>Área:</b> Apoyo Secretaria de Infraestructura	<b>Firma:</b>
<b>Proyectado por:</b> <b>Enrique Martínez Arciniegas</b> - Contratista S.I.	<b>Área:</b> Asesor de Despacho	<b>Firma:</b>
<b>Revisado por:</b> <b>Sandra Milena Satizabal R.</b> - Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial	<b>Área:</b> Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial	<b>Firma:</b>
<b>Revisado por:</b> <b>William Nobu tanaka tanaka</b> - Subsecretario de Apoyo Técnico	<b>Area:</b> Subsecretario de Apoyo Técnico	<b>Firma:</b>
<b>Revisado por:</b> <b>Lourdes Salamanca Carrillo</b> - Contratista S.I. <b>Wilmer Forero Girón</b> - Contratista S.I.	<b>Área:</b> Asesor de Despacho	<b>Firma:</b>

## 1 AREAS ADMINISTRATIVAS

Esta dependencia se encuentra distribuida por las siguientes áreas, en la cual se incluye el talento humano contratado mediante prestación de servicios:



### 2.1 ADMINISTRATIVO

Corresponde a las actividades administrativas de expedientes contractuales en carpetas de aproximadamente 727 prestadores de servicio, trámite de afiliaciones a la ARL, trámite de cuentas de cobro, trámite de aprobación de fichas técnicas y trámite de registro en SAP de proveedores nuevos, así mismo se incluye las actividades de secretariado en las áreas de Defensa de lo Público, Despacho del secretario, presupuesto, sistemas, calidad y control, planeación, comunicaciones, conserjes, centro de correspondencia y gestión documental archivo.



## 2.2 CENTRO DE CORRESPONDENCIA - GESTION DOCUMENTAL ORFEO

La gestión realizada por éste área corresponde al control, monitoreo y evaluación del flujo de las comunicaciones recibidas y el trámite de las comunicaciones de salida del sistema de gestión documental Orfeo dentro de los términos de ley, como también la custodia de los documentos físicos en gestión siendo estos preparados para la transferencia del área de Gestión Documental.

El área apoya la actividad del ingreso de las encuestas de satisfacción y atención realizadas por QAP Megaobras.

Para lo cual se realizan las siguientes actividades durante el periodo de julio 01 a septiembre 30 del año 2019:

ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
Oficios de monitoreo y seguimiento.	Se realizaron oficios dirigidos a los supervisores de contrato y usuarios de la herramienta informando el número de radicados a cargo vencidos y próximos a vencer, recordando los temidos de la ley 1755 del 2015, las políticas de Orfeo, explicando la condición para respuesta preliminar, consecuencias de la respuesta no oportuna y situaciones que se pueden presentar y como subsanarlas.
Capacitaciones	Se realizaron nueve (16) capacitaciones en las diferentes áreas de la Secretaria de Infraestructura.
Análisis de bandejas	Se realizaron análisis y verificación de todas las bandejas de la Herramienta Orfeo asignada a los usuarios de la Secretaria de Infraestructura.
Mesas de trabajo	Se asistió a mesas de trabajo con los diferentes Organismo relacionados con PQRS.
Acompañamiento	Se realizaron acompañamientos a los usuarios de la Herramienta Orfeo. Guiándoles para el cierre oportuno.
Paz y Salvo Certiorfeo	Verificación de las bandejas de la Herramienta para la generación mensual de Paz y Salvo Certiorfeo mediante el link <a href="http://172.18.12.181/certiorfeo">http://172.18.12.181/certiorfeo</a> , el cual debe ir adjunto en las cuentas de cobro. Para esto se difundió circulares con las condiciones referentes al Orfeo para el cobro de estas.
Planes de trabajo	Se elaboró planes de trabajo con el área Centro de correspondencia para optimizar los resultados.
Informes quincenales	Se realizaron informes quincenales de los estados de bandeja clasificando tipo, años, áreas y usuarios.
Coordinación	Se realizaron todas las actividades correspondientes a la coordinación de Centro de correspondencia.
Cierre de PQRS en el	

tercer trimestre 2019	Se realizó el escaneo de 16.646 oficios con sus respectivos folios de soporte de documentos en salida de la Secretaría.
Archivo de radicados	Se archivaron 3.081 radicados (PQRS e informativo) de la Secretaría.
Encuestas de Atención	Se ingresaron 7.245 encuestas al link: <a href="http://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas_ciudadano/view_encuesta_atencion_presencial.php">http://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas_ciudadano/view_encuesta_atencion_presencial.php</a>
Encuestas de Satisfacción	Se ingresan 552 encuestas al link: <a href="http://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas_ciudadano/view_encuesta_satisfaccion.php">http://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas_ciudadano/view_encuesta_satisfaccion.php</a>
Se recepcionaron documentos en la Secretaría	Se recibieron 20.467 folios para la Secretaría.
Documentos en gestión	Se organizaron y se encarpitaron 22.897 folios de documentos en custodia y gestión.
Transferencia de carpetas	Se armaron 100 carpetas para ser transferidos al Área de Gestión Documental para el archivo de lo físico.

ORGANISMO	I TRIMESTRE 2019	II TRIMESTRE 2019	III TRIMESTRE 2019	%DIFERENCIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (CUMPLIMIENTO)	72%	67%	71%	↑ 4 %

En el tercer trimestre del año 2019 la Secretaria presenta un aumento en el cumplimiento de PQRS respondidas a tiempo y vencidas.

Dependencia	Total Recibidos	Total Atendidos a tiempo y vencidos	Radicados sin cerrar	Variación	CIERRE A
Subsecretaría de Apoyo Técnico	4095	3394	701	-82.89%	Sep./30/2019
Subsecretaría de Mantenimiento Vial	9710	8167	1543	-84.11%	Sep./30/2019

Para el tercer trimestre del 2019 del total de PQRS que ingresaron a la Secretaría de Infraestructura hasta la fecha, se dio respuesta a un promedio de 83.5% que equivale a 2.223 radicados.

A pesar que la estadística de cumplimiento fue de aumento, aun se evidencia un 16.5% de PQRS sin responder y/o sin su respectivo cierre. Para normalizar la gestión en la atención de las solicitudes, se solicitó a los Subsecretarios mediante acta de compromisos la pronta gestión y cierre de los

mismos; así como el acompañamiento, y capacitación por áreas a los usuarios de las diferentes bandejas para aclaración de dudas en el manejo del Orfeo.

DEPENDENCIA	PQRS VENCIDAS		DIFERENCIA	% VARIACION
	Años ≤ 2018 A JUN 2019	Años ≤ 2018 A SEP 2019		
SUBSECRETARIA APOYO TECNICO	244	208	-36	-14.75%
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL	113	210	97	85.84%

La Subsecretaria de mantenimiento vial presenta aumento en las PQRS vencidas del año 2018 y años anteriores la cual fue de 85.84%, a pesar que muestra variación en el cumplimiento respuesta, se evidencia que estos radicados no están siendo atendidos, por lo contrario, se asignaron y se dejaron vencer para este periodo.

La Subsecretaria de Apoyo Técnico tuvo una variación de -14.75% de solicitudes vencidas de años anteriores, evidenciando gestión y cierre de estos radicados.

## 2.3 CONTRATACIÓN

El siguiente cuadro resume la gestión realizada por el área de contratación durante el segundo trimestre de 2019:

PROCESOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
OTRO SI	12	18	5	35
POLIZAS	22	19	9	50
ACTAS DE LIQUIDACIÓN	3	8	12	23
ACTAS DE SUSPENSIÓN	4	4	1	9
ACTAS DE PRORROGA	1	2	2	5
INICIO DE PROCESO POR INCUMPLIMIENTO	0	2	0	2
ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS	0	0	1	1
ACTA DE REANUDACIÓN	0	0	1	1
LICITACIÓN PÚBLICA	0	2	2	4
CONCURSO DE MERITOS	0	2	3	5
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	1	2	5	8
SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	3	2		5
MÍNIMA CUANTÍA	4	4	4	12
CONTRATOS ADJUDICADOS				18

CONTRATOS ELABORADOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	50	471	267	788
PRIMER PROCESO CANCELADO PRESTACIÓN DE SERVICIOS			90	90

## 2.4 DEFENSA DE LO PÚBLICO

### TRÁMITE Y SERVICIOS

-ACTOS ADMINISTRATIVOS: revisión, proyección, elaboración de actos administrativos: decretos, resoluciones y conceptos jurídicos.

MES	CANTIDAD
JULIO-SEPTIEMBRE	22

-RESPUESTA A DERECHOS DE PETICION: respuestas a derechos de petición: suministrando información y/o documentación sobre asuntos que guardan relación con la administración municipal.

MES	CANTIDAD
JULIO	32
AGOSTO	35
SEPTIEMBRE	30
TOTAL	97

Los temas de las peticiones son los siguientes:

- Prescripción de la contribución por valorización.
- Exoneración y/o exclusión de la contribución por valorización.
- Judiciales.
- Huecos en la vía.
- Cobro coactivo

### -TUTELAS

MES	CANTIDAD
JULIO	13
AGOSTO	7
SEPTIEMBRE	5
TOTAL	25

Las acciones de tutela que se presentan son interpuestas por las siguientes causas:



- No contestación de derechos de petición.
- No respuesta de fondo derecho de petición.

En términos generales el resultado de estas acciones es favorable a los intereses de este Ente territorial municipal, es decir, no se tutela el derecho fundamental al accionante, pues se reconoce la ausencia de su vulneración. En aquellas acciones en las que se ha llegado al trámite previo al incidente de desacato, se ha demostrado que efectivamente se ha cumplido con la orden judicial impartida, sin que se haya sancionado algún funcionario de la Administración Municipal de Cali por desacato.

-**REPRESENTACION LEGAL:** representación judicial y extrajudicial, ante los despachos judiciales y procuraduría representando los intereses de la administración municipal.

#### -PROCURADURIA

MES	CANTIDAD
JULIO	6
AGOSTO	4
SEPTIEMBRE	5
TOTAL	15

#### -JUDICIALES

MES	CANTIDAD
ABRIL	203
MAYO	221
JUNIO	240
TOTAL	256

#### -Listado de procesos por abogado y total de procesos.

AREA	ABOGADOS	TOTAL PROCESOS
JURIDICA	1. LINA MARIA ARIA	42
	2. GUEVARA PENA	44
	3. HERNANDEZ RO	41
	4. MURILLO CASTIL	22
	5. YAZMIN CASTRO	4
	6. ROMAN QUIROGA	26
	7. RUIZ BENITEZ WI	18
	8. TRONCOSO OSSA	23
	9. VELASCO CAMP	22
	10. ALEXANDER LOP	26
	11. KRISTIAN VALEN	18
TOTAL PROCESOS		286

AREA	ABOGADOS	REPARACION ES DIRECTAS	ACCIONES POPULARES	ORDINARIO	NULIDAD SIMPLE	NULIDAD Y REESTABLECI MIENTO DEL DERECHO	DIVISORIO	EJECUTIVO	ACCION DE GRUPO	ACCION DE CUMPLIMIEN TO	CONTRACTUAL	TOTAL
JURIDICA	1 LINA MARIA ARIAS MORENO	37	3		1						1	42
	2 GUEVARA PENAGOS MANUEL FRANCISCO	29	6	2		5	1			1		44
	3 HERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDO	32	5	1		2	1					41
	4 MURILLO CASTILLO JORGE ANDRES	15	6			1						22
	5 ALEXANDER LOPEZ	19	2		3					2		26
	6 ROMAN QUIROGA ADRIANA MARCELA	9		4	3	4		1	1		4	26
	7 RUIZ BENITEZ WILFRAN YAIR	13	3			1					1	18
	8 TRONCOSO OSSA LORENA	19	4									23
	9 VELASCO CAMPOS LILIANA	12	7	2		1						22
	10 KRISTHIN VALENCIA MARIN	15	2	1								18
	11 JAZMIN CASTRO BUTRON	4										4
	<b>TOTAL</b>	<b>204</b>	<b>38</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>286</b>

## 2.5 GESTION DOCUMENTAL - ARCHIVO

Las siguientes actividades corresponden a lo realizado por el grupo de contratistas distribuidos en el CAM Piso 12, Talleres, Cañaveralejo y Centro Comercial Santiago de Cali:

- ✓ Apoyo al área de contratación en la elaboración y tramite de 271 contratos por prestación de Servicios.
- ✓ Apoyo al área Administrativa en la organización, foliación (108.438 folios), encarpetación, alineación de 1.366 contratos por PS
- ✓ Se enviaron a digitalizar 718 expedientes de la serie Contratos por prestación de Servicio.
- ✓ Elaboración de 136 certificaciones del personal de la secretaria adscrita por prestación de servicios.
- ✓ Envío de cajas con propuestas para Talleres del Municipio
- ✓ Apoyo al Área de presupuesto en organización, foliación de 13 contratos de Obras.
- ✓ Prestamos documentales 45 expedientes.
- ✓ Revisión de Inventario de 1.105 carpetas del depósito de Talleres ubicadas en las estanterías 8 a la 9.
- ✓ Escuela y Capacitación e inducción al personal en gestión documental por parte de líder del proceso.
- ✓ Asistencia a las Reuniones del Equipo Técnico de Archivo.
- ✓ Proceso nuevo programa ORFEO asistencia a reuniones
- ✓ Elaboración y proyección de respuestas a 13 solicitudes por Orfeo

### ○ PLANEACIÓN

Gestión realizada por el Área de Planeación y Banco de Proyectos:

Se realizaron trámites de adición de recursos al presupuesto anual de inversiones POAI 2019 siguientes:

CONSOLIDADO SOLICITUD DE APROBACIÓN ADICIONES PRESUPUESTALES A COMFIS

ID	NOMBRE	FONDO	VALOR	JUSTIFICACIÓN	MODIFICACIÓN
BP-26000150	Construcción infraestructura Vial y peatonal en Santiago de Cali	4-1253	\$ 445.795.175	REALIZAR COMPRA DE PREDIOS - AMPLIACIÓN VÍA PANCE	ADICIÓN PRESUPUESTAL
BP-26000150	Construcción infraestructura Vial y peatonal en Santiago de Cali	4-1253	\$ 6.827.820.510	CONSTRUIR OBRA CIVIL - AMPLIACIÓN VIA PANCE HASTA LA VORAGINE.	ADICIÓN PRESUPUESTAL
BP-26000150	Construcción infraestructura Vial y peatonal en Santiago de Cali	4-1253	\$ 98.845.920	IMPLEMENTAR PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA- AMPLIACIÓN VÍA PANCE HASTA LA VORAGINE	ADICIÓN PRESUPUESTAL
BP-26000150	Construcción infraestructura Vial y peatonal en Santiago de Cali	4-1253	\$ 522.255.300	REALIZAR ADICIÓN A CONTRATO DE INTERVENTORÍA - AMPLIACIÓN VÍA PANCE HASTA LA VORAGINE	ADICIÓN PRESUPUESTAL
BP-26000150	Construcción infraestructura Vial y peatonal en Santiago de Cali	4-1253	\$ 24.755.161.540	CONSTRUIR OBRAS PARQUE RIO CALI, ETAPA II, ZONA CENTRAL	ADICIÓN PRESUPUESTAL
BP-26000150	Construcción infraestructura Vial y peatonal en Santiago de Cali	4-1253	\$ 112.160.500	IMPLEMENTAR PROGRAMA DE PROSPECCIÓN, MONITOREO Y RESCATE ARQUEOLÓGICO - INCIVA, PARQUE RIO CALI, ETAPA II, ZONA CENTRAL	ADICIÓN PRESUPUESTAL
BP-26000150	Construcción infraestructura Vial y peatonal en Santiago de Cali	4-1253	\$ 279.114.212	REALIZAR INTERVENTORÍA DE OBRA, PARQUE RIO CALI, ETAPA II, ZONA CENTRAL	ADICIÓN PRESUPUESTAL
TOTAL ADICIÓN			\$ 33.041.153.157		
BP-26000790	Construcción de Retornos Vía Cali – Jamundí, Santiago de Cali	0-6203	\$ 298.903.484	REALIZAR COMPRA DE PREDIOS - CONSTRUCCIÓN RETORNO NORTE -	ADICIÓN PRESUPUESTAL

				NORTE VÍA CALI - JAMUNDÍ	
TOTAL ADICIÓN 0-6203			\$ 298.903.484		Aprobado en COMFIS Acta No. 005-2019
BP-26000150	Construcción infraestructura Vial y peatonal en Santiago de Cali	4-1253	\$ 1.052.820.945	CONSTRUIR OBRAS - PARQUE RIO CALI ETAPA I, ZONA LINEAL, ENTRE LAS CALLES 15 Y LA CALLE 25 SOBRE EL RIO CALI	ADICIÓN PRESUPUESTAL
BP-26000150	Construcción infraestructura Vial y peatonal en Santiago de Cali	4-1253	\$ 38.510.640	IMPLEMENTAR PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA- RIO CALI ETAPA I, ZONA LINEAL, ENTRE LAS CALLES 15 Y LA CALLE 25 SOBRE EL RIO CALI	ADICIÓN PRESUPUESTAL
BP-26000150	Construcción infraestructura Vial y peatonal en Santiago de Cali	4-1253	\$ 40.128.400	REALIZAR INTERVENTORÍA DE OBRA- PARQUE RIO CALI ETAPA I, ZONA LINEAL	ADICIÓN PRESUPUESTAL
TOTAL ADICIÓN			\$ 1.131.459.985		Aprobado en COMFIS Acta No. 006-2019
BP-18028925	Mejoramiento vía Cascajal entre vía Cali-Jamundí y vía Puerto Tejada, Santiago de Cali	0-6203	\$ 1.016.334.307	Ejecutar Obras para el Mejoramiento de la Vía Cascajal entre vía Cali-Jamundí y Vía Puerto Tejada, Santiago de Cali (Adición a Contrato No.4151.010.26.1.98 5.2018)	ADICIÓN PRESUPUESTAL ACUERDO 415 DE 2017
BP-18028926	Construcción corredor vial Vuelta de Occidente, zona rural Municipio Santiago de Cali	0-6203	\$ 54.600.000	Realizar evaluaciones para Aprobación y Permisos de Ocupación de Cauces, Obras Hidráulicas, Aprovechamiento Forestal y de Explanación , visitas de seguimiento por la CVC y por el DBBSE (Tramo II), Construcción Vuelta De Occidente	ADICIÓN PRESUPUESTAL ACUERDO 415 DE 2017
			\$ 25.000.000	Realizar Compra de Predios - Construcción Vuelta de Occidente - Tramo II	
			\$ 50.000.000	Realizar visitas de seguimiento por La ANLA (Tramo I) , Construcción de Vuelta de Occidente	

BP-18028927	Ampliación de infraestructura vía Cali Jamundí entre río Lili y carrera 127, Santiago de Cali	0-6203	\$ 16.400.000	Realizar Evaluaciones para permisos de aprovechamiento Forestal y visitas de Seguimiento por parte de La ANLA - Construcción de Tercer Carril Vía Cali - Jamundí, Santiago de Cali	ADICIÓN PRESUPUESTAL ACUERDO 415 DE 2017
			\$ 6.102.610.083	Realizar Compra de Predios - Ampliación de Infraestructura Vía Cali Jamundí entre Río Lili y Carrera 127, Santiago de Cali	
BP-26000781	Construcción de Puente Vehicular a Desnivel en la Carrera 100 con Calle 25, Santiago de Cali	0-6203	\$ 13.200.000	Realizar evaluaciones para la Aprobación, Permisos de Ocupación de Cauces, Obras Hidráulicas y Visitas de Seguimiento por la ANLA - Construcción Intersección a desnivel Carrera 100 Con Calle 25, Santiago de Cali	ADICIÓN PRESUPUESTAL ACUERDO 415 DE 2017
BP-26000790	Construcción de Retornos Vía Cali – Jamundí, Santiago de Cali	0-6203	\$ 29.600.000	Realizar Evaluaciones para la aprobación permisos de Ocupación de Cauces, Obras Hidráulicas, Aprovechamiento Forestal, de Explanación y Visitas de Seguimiento por la CVC - Construcción Retorno Norte - Norte Vía Cali Jamundí Santiago de Cali	ADICIÓN PRESUPUESTAL ACUERDO 415 DE 2017
			\$ 44.296.499	Realizar Compra de Predios - Construcción Retorno Norte - Norte Vía Cali Jamundí Santiago de Cali	
		TOTAL ADICIÓN 0-6203	\$ 7.352.040.889		Aprobado en COMFIS Acta No. 008-2019
BP-26000150	Construcción infraestructura Vial y peatonal en Santiago de Cali	4-7806	\$ 26.400.000	Realizar evaluaciones para aprobación aprovechamiento Forestal, permisos ocupación de Cauces, obras Hidráulicas y visitas de Seguimiento Por Parte de la ANLA - Prolongación Avda. Circunvalar (MG-01)	Adición Certificado No.4131.4.6.10.01 1-2019

BP-26000150	Construcción infraestructura Vial y peatonal en Santiago de Cali	4-1253	\$ 8.937.490.644	Se requiere ejecutar obras faltantes: Avda. Circunvalación entre carreras 76 y 83 (MG-01); y Ampliación Carrera 80 Avda. Circunvalación y 1A1 Oeste (MG-04)	Adición presupuestal Certificado No.4131.4.6.10.00 8-2019
BP-26000150	Construcción infraestructura Vial y peatonal en Santiago de Cali	4-1253	\$ 472.150.000	Se requieren ajuste a los diseños en la Ampliación vía Pance (MG-03)	Adición presupuestal Certificado No.4131.4.6.10.00 8-2019
BP-26000150	Construcción infraestructura Vial y peatonal en Santiago de Cali	4-1253	\$ 137.824.240	Se requiere realizar interventoría prolongación Avenida Ciudad de Cali (MG-21) entre carreras 50 y 80 -adicción contrato No.4151.0.26.1.413-2016	Adición presupuestal No.4131.4.6.10.00 8-2019
BP-26000150	Construcción infraestructura Vial y peatonal en Santiago de Cali	4-7830	\$ 2.000.000.000	Avalúo y compra Predios Avda. Circunvalación entre carreras 76 y 83 (MG-01); y Ampliación Carrera 80 Avda. Circunvalación y 1A1 Oeste (MG-04)	Adición presupuestal Certificado No.4131.4.6.10.00 8-2019
TOTAL MEGABOBRAS			\$ 11.573.864.884		Aprobado en COMFIS Acta No. 009-2019
BP-18028925	Mejoramiento vía Cascajal entre vía Cali-Jamundí y vía Puerto Tejada, Santiago de Cali	0-6203	\$ 133.017.000	Se requiere realizar adición al contrato de interventoría de obra - Rehabilitación vía Cascajal entre vía Cali - Jamundí y vía a Puerto Tejada - (Contrato No.4151.010.26.1.10 10.2018)	Acuerdo 415 de 2017
BP-18028918	Construcción de puente vehicular sobre río Lili - Vía Cali - Jamundí, Santiago de Cali	0-6203	\$ 658.948.220	Se requiere realizar adición al contrato de interventoría integral - Construcción infraestructura vía Cali-Jamundí entre río Lili y carrera 127	Acuerdo 415 de 2017
BP-18028950	Construcción de Infraestructura vial Avenida Ciudad de Cali entre carrera 80 y Vía a Puerto Tejada, Santiago de Cali	0-6203	\$ 236.238.800	Se requiere realizar adición al contrato de interventoría - Construcción de puente sobre el río Lili en la Avenida ciudad de Cali	Acuerdo 415 de 2017

Total Empréstito			\$ 1.028.204.020		Aprobado en COMFIS Acta No. 013-2019.03.27
BP- 18028879	CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	4-1206	\$ 1.390.523.079	Se requiere ejecutar obras - Construcción tramo I, Carrera 8 entre calles 44 y 70 - Corredor verde	Certificado No.4131.4.6.10.01 1-2019
		4-1206	\$ 185.425.800	Se requiere realizar interventoría de obra - Construcción tramo I Corredor verde	
		4-7822	\$ 304.279.619	Se requiere ejecutar obras - Construcción tramo II, Carrera 8 entre calles 26 y 44 - Corredor verde	
		4-7822	\$ 57.000.000	Se requiere realizar interventoría de obra - Construcción tramo II Corredor verde	
		4-7822	\$ 336.142.000	Implementar programa de arqueología preventiva por INCIVA en los tramos I y II, Corredor verde	
		4-7822	\$ 296.763.546	Ejecutar obras complementaria en el tramo II, Corredor verde	
BP- 18028903	Construcción Muros de Contención en la ciudad de Santiago de Cali	4-1206	\$ 437.985.215	Se requiere realizar construcción de obras de estabilización y contención en zona rural de Santiago de Cali	Adición presupuestal No.4131.4.6.10.01 1-2019
BP- 26000874	Mejoramiento de la Malla Vial en el Municipio Santiago de Cali	4-1206 4-7822	\$ 3.689.648.478	Obra e interventoría - mantenimiento vial	Adición presupuestal No.4131.4.6.10.01 1-2019
		4-4312	\$ 1.119.483.536	Realizar reposición de redes en la comuna 11 – Convenio Interadministrativo con EMCALI No.0760-2014, para posterior ejecución de rehabilitación vial.	

BP-18028908	Mejoramiento de la Red Peatonal en zona Urbana y Rural, Santiago de Cali	4-1206	\$ 241.624.170	Es necesario realizar mantenimiento de andenes en las comunas 11 y 20 de la Ciudad de Cali	Adición presupuestal No.4131.4.6.10.01 1-2019
BP-26000192	CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES PEATONALES EN SANTIAGO DE CALI	4-1201	\$ 1.290.000.000	Para construir un puente peatonal sobre el río Cali, conexión Tertulia - casa Obeso	Certificado No.4131.4.6.10.03 8-2019
Total			\$ 9.348.875.443		Aprobado en COMFIS Acta No. 011-2019.03.13
ID	NOMBRE	FONDO	VALOR	JUSTIFICACIÓN	MODIFICACIÓN
BP-18028951	Construcción de vías zona urbana y rural, Santiago de Cali	4-4313	\$ 152.607.294	Realizar reposición de redes en la comuna 15 – Convenio Interadministrativo con EMCALI No.0606-2015, para posterior construcción de la vía.	Certificado No.4131.4.6.10.01 1-2019
Total			\$ 152.607.294		Aprobado en COMFIS Acta No. 011-2019.03.13
BP-26000150	Construcción infraestructura Vial y peatonal en Santiago de Cali	4-7830	\$ 108.862.759	Se requiere adición al contrato de Interventoría - Parque río Cali, Etapa I, zona Lineal	Certificado No.4131.4.6.10.00 8-2019
BP-26000150	Construcción infraestructura Vial y peatonal en Santiago de Cali	4-1253	\$ 708.062.376	Implementar programa de arqueología preventiva- Parque río Cali etapa 2, zona Central.	Certificado No.4131.4.6.10.00 8-2019
Total			\$ 816.925.135		Aprobado en COMFIS Acta No. 017-2019
BP-26000150	Construcción infraestructura Vial y peatonal en Santiago de Cali	4-1209	\$ 401.051.040	Se requiere realizar interventoría - parque río Cali etapa II: zona central	Adición Certificado No.4131.4.6.10.01 1-2019
BP-26000150	Construcción infraestructura Vial y peatonal en Santiago de Cali	4-1209	34.963.128	Se requiere adición al contrato de Interventoría - Parque río Cali, Etapa I, zona Lineal	Adición Certificado No.4131.4.6.10.01 1-2019
BP-26000150	Construcción infraestructura Vial y peatonal en Santiago de Cali	0-1104	\$ 10.250.000.000	Se requiere adición a contratos de obra e interventoría - ampliación Vía a Pance (MG-03)	Adición recursos ICLD
Total			\$ 12.319.864.438		Aprobado en COMFIS Acta No. 022-2019

ID	NOMBRE	FONDO	VALOR	JUSTIFICACIÓN	MODIFICACIÓN
BP-26001584	Estudios Consulta Previa a las Comunidades Negras para la Construcción Avenida Ciudad de Cali, entre la Carrera 109 y Río Jamundí, Municipio Santiago de Cali	0-1104	\$ 1.000.000.000	Se requiere realizar una consulta previa para la construcción Avenida Ciudad de Cali, entre la Carrera 109 y Río Jamundí, Municipio Santiago de Cali	Adición recursos ICLD
Total			\$ 24.005.878.606		Aprobado en COMFIS Acta No. 022-2019
ID	NOMBRE	FONDO	VALOR	JUSTIFICACIÓN	MODIFICACIÓN
BP 26000823	ADECUACIÓN MEDIANTE EL USO DE ADOQUINES EN VÍAS Y ANDENES, SANTIAGO DE CALI	0-1104	\$ 800.000.000	Se requiere apoyar la ejecución de actividades necesarias para la adecuación de vías y andenes en Santiago de Cali	Adición recursos ICLD
BP 26000824	APOYO EN LA RECUPERACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR OCUPACIONES IRREGULARES EN EL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	0-1104	\$ 900.000.000	Se requiere apoyar la ejecución de actividades necesarias para la recuperación de sectores afectados del PJC.	Adición recursos ICLD
BP 18028920	ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN OBRAS POR CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACION, SANTIAGO DE CALI.	0-1104	\$ 421.074.452	Se requiere apoyar la ejecución de actividades requeridas para el recaudo de contribución por Valorización.	Adición recursos ICLD
BP-26000874	Mejoramiento de la Malla Vial en el Municipio Santiago de Cali	0-1104	\$ 4.828.896.486	Se requiere apoyar la ejecución de actividades necesarias para realizar mantenimiento de vías con el Grupo Operativo de Talleres del Municipio	Adición recursos ICLD
Total			\$ 6.949.970.938		Aprobado en COMFIS Acta No. 022-2019

BP-26001801	Construcción obras de estabilización y contención en el Municipio Santiago de Cali	4-1201	\$ 402.198.380	Muros parque CIDES	Certificado No.4131.4.6.10.03 8-2019 Aprobado No.201941310200 006614
BP-26000192	CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES PEATONALES EN SANTIAGO DE CALI	4-1201	\$ 753.779.742	Construir puente Obeso - Tertulia	Certificado No.4131.4.6.10.03 8-2019 Aprobado No.201941310200 006614 del 22/04/2019
Total			\$ 1.155.978.122		

Se cumplió con el cronograma de ejecución presupuestal, y efectuado las modificaciones necesarias al Plan Anual de Adquisiciones PAA, conforme a los requerimientos presupuestales y administrativos.

Acción presupuestal y Financiera:

POAI 2019:Se adicionó recursos al POAI 2019 por un valor de \$ 45.695.118.862, pasando de un valor inicial de \$ 257.045.966.479 a \$ 316.519.194.731 discriminado en los siguientes proyectos:

POAI 2019		jun-19
ID	Denominación	Valor Planeado
BP-18028879	Construcción del Corredor verde en el municipio de Santiago de Cali	2.570.134.044
BP-18028903	Construcción muros de contención en la Ciudad de Santiago de Cali	473.735.215
BP-18028904	Mantenimiento rutinario de vías rurales realizado con Participación Ciudadana de Santiago de Cali	1.690.748.490
BP-18028908	Mejoramiento de la red peatonal en zona urbana y rural, Santiago de Cali	2.307.387.094
BP-18028917	Adecuación de vías y andenes con adoquines en Santiago de Cali	3.500.000.000
BP-18028918	Construcción de puente vehicular sobre rio Lili - Vía Cali - Jamundí, Santiago de Cali	4.955.492.030
BP-18028920	Estudios Diseños y Construcción obras por contribución de Valorización, Santiago de Cali	3.175.463.023
BP-18028921	Construcción de intersección a desnivel en la calle 70 con Avenida 3N, Santiago de Cali	0

BP-18028925	Mejoramiento vía Cascajal entre vía Cali-Jamundí y vía Puerto Tejada, Santiago de Cali	1.205.662.107
BP-18028926	Construcción Corredor Vial Vuelta de Occidente, zona rural Municipio Santiago de Cali	3.434.158.617
BP-18028927	Ampliación de infraestructura vía Cali Jamundí entre rio Lili y carrera 127, Santiago de Cali	38.371.687.739
BP-18028941	Diseño y construcción del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Santiago de Cali.	65.378.797.485
BP-18028950	Construcción de Infraestructura vial Avenida Ciudad de Cali entre carrera 80 y Vía a Puerto Tejada, Santiago de Cali	8.637.431.197
BP-18028951	Construcción de vías zona urbana y rural, Santiago de Cali.	3.787.411.259

POAI 2019

jun-19

ID	Denominación	Valor Planeado
BP-18028955	Construcción de ciclo infraestructura en la ciudad de Santiago de Cali.	7.587.566.240
BP-26000150	Construcción de Infraestructura vial y peatonal en Santiago de Cali	56.651.404.433
BP-26000192	Construcción de Soluciones Peatonales en Santiago de Cali	800.176.243
BP-26000329	Reparación de Andenes en la Comuna 7, Santiago de Cali	90.334.106
BP-26000352	Construcción de Andenes en la Comuna 22, Santiago de Cali	116.565.755
BP-26000367	Construcción de Vías en la Comuna 15, Santiago de Cali	310.395.390
BP-26000368	Mantenimiento de vías de la comuna 13, Santiago de Cali	274.430.254
BP-26000398	Construcción de vías en la comuna 14 de Santiago de Cali	399.988.790
BP-26000429	Mejoramiento de la red peatonal en la Comuna 6 del Municipio de Santiago de Cali	54.431.680
BP-26000430	Construcción de vías en la Comuna 6 de Santiago de Cali	200.000.000
BP-26000434	Mantenimiento de Puentes Peatonales de la Comuna 1, Santiago de Cali	20.200.000
BP-26000462	Mantenimiento de Vías en la Comuna 18, Santiago de Cali	95.550.000
BP-26000477	Construcción de vías en la Comuna 18, Santiago de Cali	323.750.000
BP-26000529	Construcción de puente sobre el canal Interceptor CVC sur, Corregimiento de Navarro, Cali	0
BP-26000550	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA COMUNA 20 SANTIAGO DE CALI	293.258.657
BP-26000553	REHABILITACION DE ANDENES EN LA COMUNA 20 SANTIAGO DE CALI	116.668.641

BP-26000781	Construcción puente vehicular a desnivel en la carrera 100 con calle 25, Santiago de Cali	48.866.569.118
BP-26000790	Construcción de Retornos vía Cali – Jamundí, Santiago de Cali	4.662.273.840
BP-26000823	Adecuación de Infraestructura Vial y Peatonal mediante el uso de Adoquines en Santiago de Cali	1.800.000.000

POAI 2019

jun-19

ID	Denominación	Valor Planeado
BP-26000824	Apoyo en la Recuperación de zonas afectadas por Ocupaciones Irregulares en el Municipio Santiago de Cali	2.100.369.796
BP-26000840	Mantenimiento de puentes peatonales en Santiago de Cali	166.792.629
BP-26000874	Mejoramiento de la malla vial en el Municipio Santiago de Cali	46.257.662.663
BP-26000917	Construcción de obras de drenaje en el Corregimiento Villacarmelo del Municipio de Santiago de Cali.	100.000.000
BP-26000918	Construcción de Andenes y obras de drenaje en el Corregimiento de Golondrinas en el Municipio de Santiago de Cali	39.935.758
BP-26000919	REHABILITACIÓN DE LA RED PEATONAL Y OBRAS DE DRENAJE EN EL CORREGIMIENTO DE GOLONDRINAS, MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	60.064.242
BP-26000940	MANTENIMIENTO DE VÍAS MEDIANTE HUELLAS VEHICULARES Y OBRAS DE DRENAJE EN EL CORREGIMIENTO PICHINDE, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	80.000.000
BP-26000961	Mejoramiento de la malla vial en el Corregimiento de Felidia en Santiago de Cali	30.000.000
BP-26000962	Mejoramiento de la Malla Vial en el Corregimiento Los Andes, Municipio Santiago de Cali	48.796.012
BP-26000963	Mejoramiento vial en el corregimiento Saladito, municipio Santiago de Cali	37.870.569
BP-26000964	Rehabilitación de andenes en el corregimiento El Hormiguero del Municipio de Santiago de Cali	50.000.000
BP-26000965	Construcción de Grada Anden en el Corregimiento La Leonera, Municipio de Santiago de Cali	66.199.002
BP-26000966	Rehabilitación de puente peatonal en el Corregimiento La Castilla, Santiago de Cali	80.000.000
BP-26001584	Estudios Consulta Previa a las comunidades negras para la construcción Avenida Ciudad de Cali, entre la Carrera 109 y río Jamundí, Municipio Santiago de Cali	1.000.000.000
BP-26001800	Construcción obras de Infraestructura Vial y Peatonal en el Municipio Santiago de Cali	3.722.100.491
BP-26001801	Construcción obras de estabilización y contención en el Municipio Santiago de Cali	527.732.122
POAI 2019 - TOTAL AL 28/06/2019		316.519.194.731

POAI 2020:

Se tramitó el Anteproyecto del POAI 2020, conforme a los Proyectos presentados por las Subsecretarías de Mantenimiento vial y Apoyo técnico, el cual actualmente es el siguiente:

<b>ANTEPROYECTO POAI 2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA</b>		
<b>ID</b>	<b>Denominación</b>	<b>Proyecto Actual</b>
<b>BP-18028903</b>	Construcción muros de contención en la Ciudad de Santiago de Cali	\$ 589.033.504
<b>BP-18028904</b>	Mantenimiento rutinario de vías rurales realizado con Participación Ciudadana de Santiago de Cali	\$ 1.842.174.000
<b>BP-18028908</b>	Mejoramiento de la red peatonal en zona urbana y rural, Santiago de Cali	\$ 285.161.472
<b>BP-18028920</b>	Estudios Diseños y Construcción obras por contribución de Valorización, Santiago de Cali	\$ 2.228.756.556
<b>BP-18028923</b>	Reparación de puentes vehiculares en Santiago de Cali	\$ 1.504.213.435
<b>BP-18028941</b>	Diseño y construcción del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Santiago de Cali.	\$ 60.784.451.562
<b>BP-18028951</b>	Construcción de vías zona urbana y rural, Santiago de Cali.	\$ 5.548.565.016
<b>BP-26000150</b>	Construcción de Infraestructura vial y peatonal en Santiago de Cali	\$ 9.264.033.377
<b>BP-26000192</b>	Construcción Soluciones Peatonales en Santiago de Cali	\$ 0
<b>BP-26000823</b>	Adecuación de Infraestructura Vial y Peatonal mediante el uso de Adoquines en Santiago de Cali	\$ 6.565.569.905
<b>BP-26000824</b>	Apoyo en la Recuperación de zonas afectadas por Ocupaciones Irregulares en el Municipio Santiago de Cali	\$ 1.975.695.840
<b>BP-26000840</b>	Mantenimiento de puentes peatonales en Santiago de Cali	\$ 1.583.012.004
<b>BP-26000874</b>	Mejoramiento de la malla vial en el Municipio Santiago de Cali	\$ 52.988.956.232
<b>TOTAL PROYECTADO POAI 2020</b>		<b>\$ 145.159.622.903</b>

## ANTEPROYECTO 2020- SITUADO FISCAL

SGP OTROS SECTORES ZONA URBANA - POAI 2020			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
ID	DESCRIPCION	COMUNA	VALOR 2020
BP-26001802	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA COMUNA 6, MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI Cra 4N entre Calles 78 y 81 lado impar Cra 3N entre Calles 78 y 81 lado par Cra 3N entre Calles 78 y 81 lado impar	comuna 6	544.018.931
BP-26001884	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN LA COMUNA 6, SANTIAGO DE CALI	comuna 6	208.415.641
BP-26001924	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA COMUNA 12, SANTIAGO DE CALI Calle 36 entre Carreras 28 y 28B Carrera 28G entre Calles 46 y 50 Carrera 28E1 entre Calles 34D y 43A Calle 33G entre Carreras 25 y 26 Carrera 25 entre 48 y 49 Carrera 24 entre Calles 42 y 43	comuna 12	504.385.622
BP-26001861	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA COMUNA 13, SANTIAGO DE CALI	comuna 13	497.188.763
BP-26001803	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA COMUNA 14, MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI Diag 26P8 entre Transv. 93 y 103	comuna 14	205.669.664
BP-26001804	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN LA COMUNA 15, SANTIAGO DE CALI Carrera 28 E6 entre Calles 79 y 83 Calle 52 A entre Carreras 39G y 40., comuna 15	comuna 15	393.828.445
BP-26001883	MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA COMUNA 16, SANTIAGO DE CALI Carrera 41F entre Calles 44 y 46 Carrera 42A1 entre Calles 42 y 45 Carrera 43 B entre Calles 43 y 48	comuna 16	946.217.017
BP-26001806	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN LA COMUNA 18, SANTIAGO DE CALI Calle 4 con Carreras 85 y 91	comuna 18	85.564.025
BP-2600XXX	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN LA COMUNA 20, SANTIAGO DE CALI	comuna 20	
BP-2600XXX	MANTENIMIENTO DE ANDENES EN LA COMUNA 20, SANTIAGO DE CALI	comuna 20	
BP-2600XXX	MANTENIMIENTO DE VIAS EN LA COMUNA 20, SANTIAGO DE CALI	comuna 20	
BP-2600XXX	Mantenimiento DE PUENTES PEATONALES DE LA COMUNA 20 DE SANTIAGO DE Cali	comuna 20	
TOTAL			3.385.288.108

SGP OTROS SECTORES ZONA RURAL - POAI 2020



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
ID	DESCRIPCION	COMUNA	VALOR 2020
	CONSTRUCCION DE CUNETAS SECTOR CAMPOALEGRE, Corregimiento de Montebello	Corregimiento 64	85.564.025
	CONSTRUCCION ANDEN SECTOR ESCUELA SAN PEDRO APOSTOL, Corregimiento de Montebello	Corregimiento 64	14.801.959
	PAVIMENTO FLEXIBLE VIA DE LA POLICIA, Corregimiento Hormiguero	Corregimiento 52	187.000.000
	REHABILITACION ANDEN VEREDA LA FONDA Y CABECERA, Corregimiento Villacarmelo	Corregimiento 55	50.000.000
	REHABILITACION ANDEN FELIDIA CABECERA, Corregimiento de Felidia	Corregimiento 59	35.000.000
	HUELLAS Y CUNETAS SECTOR LA TORRE , Vereda Montañuelas Corregimiento Saladito	Corregimiento 60	25.000.000
TOTAL			5.102.131.284

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

A continuación presentamos el formato de seguimiento al Plan de Desarrollo 2016-2019 con fecha de corte Junio 30 de 2019:

	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</p> <p><b>SEGUIMIENTO PLAN INDICATIVO</b> Metas de producto y recursos del Plan de Desarrollo <b>CUADRO 3S</b></p>
--	--



Secretaría de Infraestructura			
		Unidad	Ejecución

## SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:

El Plan Anual de Adquisiciones permanentemente, requiere actualización conforme al desarrollo de los procesos y a la inclusión de nuevos proyectos al Banco de proyectos.

El siguiente es el balance al Plan Anual de Adquisiciones 2019, con fecha de corte Junio 30 , el avance del mismo es el siguiente:

Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	No. Proceso
MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE GEOTECNIA (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	Mayo	2 Meses	Mínima Cuantía	Inversión con Recursos propios	16.485.800	4151.010.32.00 23.2019
MANTENIMIENTO DE PUENTES COMUNAS 1, 5, 6, 9, 13, Y 16 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	Julio	4 Meses	Selección abreviada menor cuantía	Inversión - Sistema General de Participaciones	171829663	
CONTRATACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN	Enero	12 Meses	Contratación directa - Prestación de servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión	Inversión con Recursos propios	18.254.111.494	Contratos PS
REALIZAR PAVIMENTACIÓN VÍAS COMUNA 14 Y 15 DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	Julio	4 Meses	Selección abreviada menor cuantía	Inversión - Sistema General de Participaciones	710.384.180	
REALIZAR MANTENIMIENTO VIAL COMUNAS 13, 18 Y 20 DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	Mayo	4 Meses	Selección abreviada menor cuantía	Inversión con Recursos propios	663.238.911	4151.010.32.00 20.2019

CONTRATAR LA COMPRA DE INDUMENTARIA DE DOTACIÓN INDUSTRIAL (CHALECOS, GORRAS, CAMISETAS TIPO POLO), PARA EL EQUIPO OPERATIVO DEL MANTENIMIENTO VIAL, DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	Abril	2 Meses	Mínima Cuantía	Inversión con Recursos propios	46.010.000	4151.010.32.00 15.2019
CONTRATAR LA COMPRA DE ARENA GRUESA, GRAVA DE ¾", CEMENTO GRIS Y ACERO DE REFUERZO DE ½", PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	Marzo	4 Meses	Selección abreviada menor cuantía	Inversión con Recursos propios	224.700.000	4151.010.32.00 06.2019
MEJORAMIENTO VIAL EN LOS CORREGIMIENTOS DE GOLONDRINAS, CASTILLA, EL SALADITO, FELIDIA, LA LEONERA, PICHINDÉ, ANDES, VILLA CARMELO, Y EL HORMIGUERO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	Mayo	3 Meses	Selección abreviada menor cuantía	Inversión - Sistema General de Participaciones	592.865.583	4151.010.32.00 21.2019
SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	Marzo	2 Meses	Selección abreviada menor cuantía	Inversión con Recursos propios	115.938.215	4151.010.32.00 19.2019
COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS QUE UTILIZA EL GRUPO OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	Marzo	2 Meses	Selección abreviada menor cuantía	Inversión con Recursos propios	164.585.543	4151.010.32.00 16.2019
REALIZAR PAVIMENTACIÓN VIAL COMUNA 6 Y 18 DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	Julio	4 Meses	Selección abreviada menor cuantía	Inversión - Sistema General de Participaciones	523.750.000	
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI A CARGO DE LA	Febrero	6 Meses	Selección abreviada subasta inversa	Inversión con Recursos propios	3.882.580.204	4151.010.32.00 05.2019

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL						
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS	Febrero	10 Meses	Selección abreviada - Acuerdo Marco de Precios	Inversión con Recursos propios	727.733.038	Orden de Compra Convenio marco
CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN VÍA SALADITO-FELIDIA EN K0+100 Y EN K0+200 ( IGLESIA SALADITO K0+000), CORREGIMIENTO SALADITO	Junio	3 Meses	Selección abreviada menor cuantía	Funcionamiento o con Recursos propios	323.883.000	En Contratación para publicar
REALIZAR OBRAS DE REHABILITACIÓN VIAL Y PEATONAL EN VARIOS SECTORES DE LA COMUNA 20 DE CALI	Junio	3 Meses	Licitación pública (Obra pública)	Funcionamiento o con Recursos propios	1.173.990.929	Pasar a Julio porque EMCALI no ha ejecutado, pendiente que Mantenimiento defina
REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DERIVADAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE REHABILITACIÓN VIAL Y PEATONAL EN VARIOS SECTORES DE LA COMUNA 20 DE CALI	Junio	4 Meses	Concurso de Méritos Abierto	Funcionamiento o con Recursos propios	144.622.128	Pasar a Julio porque EMCALI no ha ejecutado, pendiente que Mantenimiento defina
REALIZAR OBRAS DE REHABILITACIÓN VÍA EN LA CARRERA 40 A ENTRE CALLES 29 Y DIAGONAL 28 C, COMUNA 11 Y MANTENIMIENTO DE ANDENES EN LA DIAGONAL 28C ENTRE CARRERAS 40 Y 40A COMUNA 11 MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - INCLUYE REPOSICIÓN DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS CONVENIO EMCALI	Junio	4 Meses	Licitación pública (Obra pública)	Funcionamiento o con Recursos propios	2.163.616.119	En Contratación para publicar
