

Montería – Córdoba, 03 de noviembre de 2017

Señores
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Atn. Ing. ALBERTO AUGUSTO RODRIGUEZ ORTIZ
Gerente de Proyectos Carreteros VGC
Calle 26 N° 59-51 Edificio T3
Bogotá D.C.

CAB - CORRESPONDENCIA ENVIADA - RUTA AL MAR
Radicado: 48-147-20171103002665
Fecha: 03/11/2017 01:35:31 p.m.
Usuario: clara.sotomayor
ASUNTO: INFORME GERENCIAL N. 23 DE OCTUBRE 2017
CATEGORÍA: CONTRACTUAL

REFERENCIA: Contrato de Concesión bajo esquema de APP N° 016 del 14 de octubre de 2015 "Construcción, Mejoramiento, Operación y Mantenimiento y Reversión del sistema vial para la conexión de los Departamentos Antioquia – Bolívar".

ASUNTO: Informe Gerencial N°23 – octubre 2017.

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Rad No. 2017-409-118612-2

Fecha: 07/11/2017 11:07:07 >300

OEM: CONCESION RUTA AL MAR S.A.S

Anexos: 1 CARPETA+1 CD



Cordial saludo:

En atención a la obligación contractual preceptuada en el Apéndice Técnico 2 del contrato de la referencia, adjunto hacemos entrega del informe Gerencial N° 23.

***4.2.1. Informes Mensuales**

A más tardar el Quinto (5°) Día calendario de cada mes, o el siguiente Día Hábil en el caso que este cayera en Día Inhábil, el Concesionario deberá presentar dos (2) copias (una a la ANI y otra a la Interventoría) del "Informe Gerencial Mensual", que contendrá como mínimo ..."

Cordialmente,


ADRIANA PARRA CARASCAL

Representante legal para asuntos judiciales, administrativos y laborales

Anexo: Lo enunciado en 155 folios adicionales y un CD.

CC: Ingeniero. Yolanda Traslaviña. Supervisor ANI.

Ingeniero Oscar H. Solórzano - Director de Interventoría

Archivo.

Elaboró: GOCF

Revisó: APPC



**CONCESIÓN
Ruta al Mar**

**INFORME GERENCIAL MENSUAL
OCTUBRE 2017**

CONCESIÓN VIAL RUTA AL MAR S.A.

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

OCTUBRE 2017

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	4
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	5
1.1.1 ESTACIONES DE PEAJE.....	6
1.1.2 BASES OPERACIONALES.....	8
1.1.3 CONTRATO PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO	13
2. OPERACIÓN.....	15
2.1 TRÁFICO Y RECAUDO DE LAS ESTACIONES DE PEAJES.....	15
2.1.1 ESTACION DE PEAJE LA APARTADA.....	17
2.1.2 ESTACION DE PEAJE MATA DE CAÑA.....	18
2.1.3 ESTACION DE PEAJE SAN ONOFRE	19
2.1.8 RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL	23
2.1.9 ANALISIS DE LOS VEHICULOS EXCENTOS (LEY 787) DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	23
2.2.0 ANALISIS DE VEHICULOS ESPECIALES.	25
2.1.9 INFORME PASO DE VEHÍCULOS ESPECIALES EN LOS PEAJES CAIMANERA Y LOS MANGUITOS (ANEXO 5).....	26
2.2 ATENCIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y NOVEDADES A LOS USUARIOS DE LA VIA.....	27
2.2.1 SERVICIO DE AMBULANCIA.....	30
2.2.2 ACCIDENTALIDAD	36
2.2.3 MORTALIDAD.	42
2.2.4 ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD ACUMULADA.	43
2.2.5 SERVICIO DE GRÚAS.....	46
2.2.5.1 SERVICIO DE GRÚAS DE PLATAFORMA	46
2.2.5.2 SERVICIO DE GRÚAS DE GANCHO.....	49
2.2.6 SERVICIO MECÁNICO (CARRO TALLER)	54
2.3 REGISTRO DE EVENTOS, NOVEDADES E INCIDENTES.....	58
2.3.1 INCIDENTES EN EL MES DE OCTUBRE	58
2.3.2 NOVEDADES EN EL MES DE OCTUBRE	60

2.3.3 TRANSPORTES ESPECIALES.....	63
3. MANTENIMIENTO	63
3.1 ACTUACIONES SOBRE ELEMENTOS FÍSICOS DEL SISTEMA VIAL.....	63
3.3 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.....	66
5. INFORMACIÓN DE PESAJE.....	79
6. CONDICIONES METEOROLÓGICAS.....	81
8. CONTROL DE INDICADORES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	83
8.1 INDICADOR DEL SERVICIO DE AMBULANCIA.....	83
8.2 INDICADOR DEL SERVICIO DE GRÚA DE PLATAFORMA.....	96
8.3 INDICADOR DEL SERVICIO DE GRÚA DE GANCHO	111
8.4 INDICADOR DEL SERVICIO DE CARRO TALLER	120
8.4 REGISTRO FOTOGRAFICO.....	139

1. INTRODUCCIÓN

La sociedad **CONCESION RUTA AL MAR S.A.S**, se constituyó el día 14 de Septiembre de 2015, por documento privado de Asamblea General de Accionistas, inscrita el día 2 de Octubre de 2015, bajo el número 30735 del libro 9, en la Cámara de Comercio de Medellín,

La sociedad **CONCESION RUTA AL MAR S.A.S**, suscribe con la ANI el Contrato de Concesión No. 016, del día 14 de octubre de 2015, cuyo objeto es el siguiente: "el otorgamiento de una concesión para la Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento, Operación y, Mantenimiento Del Sistema Vial Para La Conexión de los departamentos Antioquia – Bolívar"

Una vez cumplidas las obligaciones derivadas del contrato de Concesión de acuerdo a lo previsto en el Capítulo II, Aspectos Generales del Contrato, Sección 2.3, *perfeccionamiento e inicio de ejecución del contrato* para la suscripción del Acta de Inicio, esta se suscribe por las partes el 27 de Noviembre de 2015; en esta misma fecha es entregado el corredor concesionado, mediante Acta de Entrega y Recibo suscrita por las partes.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el Apéndice Técnico 2 – Condiciones para la Operación y Mantenimiento, sección 4.2.1, del Contrato 016, presentamos el Informe Gerencial No. 23.

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto corresponde al corredor denominado sistema vial para la conexión de los Departamentos de Antioquia y Bolívar el cual se divide en 8 Unidades Funcionales:

Tabla 1. Unidades Funcionales

UNIDAD FUNCIONAL INTEGRAL (UFI)	RUTA	SUBSECTOR	ORIGEN (Nombre, abscisa, coordenadas)	DESTINO (Nombre, abscisa, coordenadas)	LONGITUD APROX.	INTERVENCIÓN PREVISTA
UFI1	2513	1	Caucasia PR 03 + 350	Planeta Rica PR 63 + 845	60,1	Mejoramiento
UFI2		1	Cereté PR 10 + 764	Lorica PR 48 + 222	37,0	Construcción de la segunda Calzada
UFI3		1	Variante Planeta Rica PK 00+ 000	Variante Planeta Rica PK 03+ 500	3,5	Construcción
		2	El 15 PK 00 + 000	Via El 15 - San Carlos 10 + 000	10	Mejoramiento
		3	Via El 15 - San Carlos PK 10 + 000	San Carlos PK 22 + 500	12,5	Construcción
		4	San Carlos PK 22 + 500	Cereté PK 31 + 990	9,5	Mejoramiento
		5	Variante Cereté 00 + 000	Variante Cereté PK 05 + 600	5,6	Construcción
UFI4	2310	1	Montería PR 49 + 500	Planeta Rica PR 0 + 000	49,5	Operación y mantenimiento
		2	Montería PR 49 + 731	El 15 PR 34 + 950	15	Operación y mantenimiento
UFI5	7401	1	Puerto Rey (Arboletes) PR 00 + 000	Montería PR 64 + 000	63,5	Operación y mantenimiento
		2	Santa Lucia	San Pelayo	26	

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

UNIDAD FUNCIONAL INTEGRAL (UFI)	RUTA	SUBSECTOR	ORIGEN (Nombre, abscisa, coordenadas)	DESTINO (Nombre, abscisa, coordenadas)	LONGITUD APROX.	INTERVENCIÓN PREVISTA
			PK 00+ 000	PK 26 + 000		Operación y mantenimiento
UFI6	2103	1	Cereté PR 10 + 764	Lorica PR 48 + 222	37	Mejoramiento
	9004	2	Lorica PR 05 + 847	Coveñas PR 23 + 309	17	Mejoramiento
		3	Coveñas PR 41 + 000	Tolú PR 46 + 100	5,1	Mejoramiento
UFI7		1	Variante Lorica PK 00 + 000	Variante Lorica PK 07 + 779	7,8	Construcción
		2	Variante Coveñas PK 00 + 000	Variante Coveñas PK 20 + 671	20,7	Construcción
	9004	3	Tolú PK 00 + 000	Pueblito PK 24 + 594	24,6	Construcción
UFI8	9004	1	Tolú PR 49 + 453	Tolú Viejo PR 65 + 937	16,5	Mejoramiento
	9004	2	El Pueblito PR 93 + 683	San Onofre PR 104 + 820	11,2	Mejoramiento
	9005	3	San Onofre PR 00 + 023	Cruz de Viso PR 59 + 352	59,3	Mejoramiento

1.1.1 ESTACIONES DE PEAJE.

Las estaciones de Peaje del Proyecto recibidas por la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI como parte de la infraestructura a su cargo son:

Tabla 2. Fecha de entrega de peajes

Caseta de Peaje	Fecha de Entrega Estimada
La Apartada	30 de Mayo de 2016
Mata de caña	30 de Mayo de 2016
San Onofre	30 de Julio de 2016

Las Estaciones de Peaje del Sistema Vial Existente Transversal de las Américas, fueron entregados por la ANI al Concesionario como parte de la infraestructura, el día 23 de agosto de 2017, una vez hecha efectiva la reversión del contrato de concesión No. 008 de 2010.

Tabla 3. Fecha de entrega de peajes

Caseta de Peaje	Fecha de Entrega
Los Cedros (*)	23 de agosto de 2017
Purgatorio (*)	23 de agosto de 2017

(*) Las estaciones de peaje Purgatorio y Cedros serán reubicados por el Concesionario. El peaje Purgatorio quedará en el Km 38+300 y el Peaje Los Cedros quedará en el Km 38+100 en el mismo tramo donde se encuentran actualmente.

De conformidad con el otrosí N° 4 al Contrato de Concesión, suscrito el 23 de mayo de 2015, a partir de la suscripción del Acta de Inicio, el Concesionario tiene un plazo máximo para instalar y comenzar a operar la Estación de Peaje **Los Manguitos** de 210 días y de 240 para la Estación de Peaje **La Caimanera**. En cuanto al traslado de la Estación de Peaje **Carimagua**, y conforme al otrosí en comento, el Concesionario deberá realizar en un plazo máximo de 90 días contados a partir de la notificación del acto administrativo o documento mediante el cual el INVIAS autorice su traslado. La Estación de Peaje nueva de **San Carlos** será instalada por el Concesionario y comenzará a operarse una vez se haya invertido un valor equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total de las Intervenciones estimadas para la Unidad Funcional en la cual se ubica la Estación de Peaje nueva de acuerdo con el Apéndice Técnico 1.

Con base en lo anterior, podemos afirmar que el inicio de operación de las Estaciones de Peajes Los Manguitos y Caimanera se estableció de la siguiente manera:

Tabla 4. Fecha de entrega de peajes

Caseta de Peaje	Fecha de Inicio Operación
Los Manguitos	24 de Junio de 2016
Caimanera	30 de Julio de 2016

1.1.2 BASES OPERACIONALES.

✓ **Base de Operación 1:**

EQUIPOS: Grúa de Gancho - Grúa de Plataforma-Carro-Taller - Cama Baja.
Bascula de Manguitos PR: 60+000
COBERTURA: Caucasia – Planeta Rica – Montería, El 15 – San Carlos.

EQUIPOS: Ambulancia - Moto de Inspección Vial.
Peaje Manguitos PR: 52+200
COBERTURA: Caucasia – Planeta Rica.

✓ **Base de Operación 2:**

EQUIPOS: Grúa de Gancho - Grúa de Plataforma-Carro-Taller
Peaje Los Cedros PR: 47+000,
COBERTURA: Puerto Rey – Montería – Santa Lucia -San Pelayo.

EQUIPOS: Ambulancia - Moto de Inspección Vial.
Peaje Los Cedros PR: 47+000,
COBERTURA: Puerto Rey – Montería – Santa Lucia -San Pelayo – Cereté -
Mata de Caña.

✓ **Base de Operación 3:**

EQUIPOS: Grúa de Gancho - Grúa de Plataforma-Carro-Taller.
Peaje Mata de Caña PR: 32+500.
COBERTURA: San Carlos – Cerete - Loricá – Porvenir, Coveñas – Tolú
Tolú – Tolú Viejo.

EQUIPOS: Ambulancia - Moto de Inspección Vial.
Ruta 9004, PR: 19+000.
COBERTURA: Peaje Mata de Caña - Loricá – Porvenir, Coveñas – Tolú
Tolú – Tolú Viejo.

✓ **Base de Operación 4:**

EQUIPOS: Ambulancia-Grúa de Pluma-Grúa de Plataforma-Carro-Taller-
Moto de Inspección Vial
Peaje San Onofre PR: 21+500.
COBERTURA: El Pueblito – San Onofre – María la Baja – Cruz del Viso

✓ **Unidad Satelital:**

EQUIPOS: Ambulancia - Moto de Inspección Vial.

Peaje Purgatorio PR: 32+800.

COBERTURA: Planeta Rica – Montería – El 15 – San Carlos – Cerete.

1 Ambulancia

1 Moto de Inspección Vial.

Tabla 5. Bases Operacionales.

EQUIPOS DE OPERACIONES (AMBULANCIAS E INSPECTOR VIAL)								
UFI	Sub sector	RUTA	Origen (nombre, abscisa)	Destino (nombre, abscisa)	Longitud aproximada origen destino (1)	AMBULANCIAS	MOTOS DE INSPECCIÓN	UBICACIÓN DE EQUIPOS
						CANTIDADES	CANTIDADES	BASE OPERACIONAL
UFI1	1	2513	Caucasia PR 03+350	Planeta Rica PR 62+000	58.65	1	1	AMBULANCIA 1 UBICADA EN EL PR: 52+200 PEAJE LOS MANGUITOS
UFI5	1	7401	Puerto Rey PR:00+000	Montería PR: 63+340	63.34	1	1	AMBULANCIA 2 UBICADA EN EL PR: 47+000 PEAJE LOS CEDROS
UFI5	2	N/A	Variante Santa Lucía PR: 00+000	San Pelayo 25+400	25.4			
UFI6	1	2103	Cerete PR: 10+764	PR: 32+500 Peaje Mata de Caña	21.74			
UFI6 Y 8, 1	3	9004	PR: 23+309 El Porvenir	Tolú Viejo PR 65+937	42.628	1	1	AMBULANCIA 3 UBICADA EN EL PR: 23+309 DE LA RUTA 9004 EN EL PORVENIR (COVEÑAS)
UFI6	1 Y 2	9004	PR: 23+309 El Porvenir	PR: 32+500 Peaje Mata de Caña	39.34			

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

EQUIPOS DE OPERACIONES (AMBULANCIAS E INSPECTOR VIAL)								
UFI	Sub sector	RUTA	Origen (nombre, abscisa)	Destino (nombre, abscisa)	Longitud aproximada origen destino (1)	AMBULANCIAS	MOTOS DE INSPECCIÓN	UBICACIÓN DE EQUIPOS
						CANTIDADES	CANTIDADES	BASE OPERACIONAL
UFI8	2	9004	Pueblito PR 93+683	San Onofre PR 104+820	11.2	1	1	AMBULANCIA 4 UBICADA EN EL PR: 21+500 PEAJE SAN ONOFRE
	3	9005	San Onofre PR 0+023	Cruz del Viso PR 59+352	59.3			
UFI4	1	2310	Planeta Rica PR: 00+000	Montería PR: 49+500	49.5	1	1	AMBULANCIA SATELITAL UBICADA EN EL PEAJE PURGATORIO PR: 32+800 DE LA RUTA 2310 PLANETA RICA-MONTERÍA
UFI3	3	N/A	EL 15 K 00+000	Cerete PR: 10+764	10.764			
UFI3	4	2310	San Carlos PR: 22+500	Cerete PR: 31+990	9.5			
TOTALES						5	5	5

EQUIPOS DE OPERACIONES (GRÚAS Y CARRO TALLER)									
UFI	Subsector	RUTA	Origen (nombre, abscisa)	Destino (nombre, abscisa)	Longitud aproximada origen destino (1)	Carro-Taller	Grúa de Plataforma	Grúa de Gancho	UBICACIÓN DE EQUIPOS
						CANTIDADES	CANTIDADES	CANTIDADES	BASE OPERACIONAL
UFI 1	1	2513	Caucasia PR 03+350	Planeta Rica PR 62+000	58.65	1	1	1	BASE DE OPERACIONES No. 1 EQUIPOS UBICADOS EN EL PR: 60+000
UFI 4	1	2310	Planeta Rica PR: 00+000	Montería PR: 49+500	49.5				

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

EQUIPOS DE OPERACIONES (GRÚAS Y CARRO TALLER)									
UFI	Subsector	RUTA	Origen (nombre, abscisa)	Destino (nombre, abscisa)	Longitud aproximada origen destino (1)	Carro-Taller	Grúa de Plataforma	Grúa de Gancho	UBICACIÓN DE EQUIPOS
						CANTIDADES	CANTIDADES	CANTIDADES	BASE OPERACIONAL
UFI 3	2	N/A	EL 15 K 00+000	Cerete PR: 10+764	10.764				BASCULA LOS MANGUITOS
UFI 5	1	7401	Puerto Rey PR:00+000	Montería PR: 63+340	63.34	1	1	1	BASE DE OPERACIONES No. 2 EQUIPOS UBICADOS EN EL PR: 47+000 PEAJE LOS CEDROS
UFI 5	2	N/A	Variante Santa Lucía PR: 00+000	San Pelayo 25+400	25.4				
UFI 6	1	2103	Cerete PR: 10+764	PR: 32+500 Peaje Mata de Caña	21.74				
UFI 6 Y 8, 1	3	9004	PR: 32+500 Peaje Mata de Caña	Cerete PR: 10+990	42.628	1	1	1	BASE DE OPERACIONES No. 3 EQUIPOS UBICADOS EN EL PEAJE DE MATA DE CAÑA PR: 32+500 DE LA RUTA 2103
UFI 6	1 Y 2	9004	PR: 32+500 Peaje Mata de Caña	PR: 23+309 El Porvenir	39.34				
UFI 3	4	2310	San Carlos PR: 22+500	Cerete PR: 31+990	9.5				
UFI 8	2	9004	Pueblito PR 93+683	San Onofre PR 104+820	11.2	1	1	1	BASE DE OPERACIONES No.4 EQUIPOS UBICADOS EN EL PR: 21+500 PEAJE SAN ONOFRE
	3	9005	San Onofre PR 0+023	Cruz del Viso PR 59+352	59.3				
TOTALES						4	4	4	4

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Tabla 6. Ubicación de equipos de la Policía de Carreteras.

UBICACIÓN EQUIPOS POLICIA DE CARRETERAS				
EQUIPOS	TIPO	PLACA	UBICACIÓN	TRAMO
CHEVROLET DMAX	Camioneta Doble Cabina Diésel	INQ750	CORDOBA	CERETE - PORVENIR
CHEVROLET DMAX	Camioneta Doble Cabina Diésel	INQ774	CORDOBA	CAUCASIA - PLANETA RICA
MOTO	Motocicleta 645 c.c. VERDE, MODELO 2016	EIP01E	CORDOBA	CERETE - PORVENIR
MOTO	Motocicleta 645 c.c. VERDE, MODELO 2016	EIP02E	CORDOBA	CERETE - PORVENIR
MOTO	Motocicleta 645 c.c. VERDE, MODELO 2016	EIP03E	CORDOBA	CERETE - PORVENIR
MOTO	Motocicleta 645 c.c. VERDE, MODELO 2016	EIP04E	CORDOBA	CERETE - PORVENIR
MOTO	Motocicleta 645 c.c. VERDE, MODELO 2016	EIP05E	CORDOBA	CAUCASIA - PLANETA RICA
MOTO	Motocicleta 645 c.c. VERDE, MODELO 2016	EIP06E	CORDOBA	CAUCASIA - PLANETA RICA
MOTO	Motocicleta 645 c.c. VERDE, MODELO 2016	EIP07E	CORDOBA	CAUCASIA - PLANETA RICA
MOTO	Motocicleta 645 c.c. VERDE, MODELO 2016	EIP08E	CORDOBA	CAUCASIA - PLANETA RICA
MOTO	Motocicleta 645 c.c. VERDE, MODELO 2016	EIP09E	SUCRE	COVEÑAS - SAN ONOFRE

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

UBICACIÓN EQUIPOS POLICIA DE CARRETERAS				
EQUIPOS	TIPO	PLACA	UBICACIÓN	TRAMO
MOTO	Motocicleta 645 c.c. VERDE, MODELO 2016	EIP10E	SUCRE	COVEÑAS - SAN ONOFRE
MOTO	Motocicleta 645 c.c. VERDE, MODELO 2016	EIP11E	SUCRE	COVEÑAS - MARIA LA BAJA
MOTO	Motocicleta 645 c.c. VERDE, MODELO 2016	EIP12E	BOLIVAR	MARIA LA BAJA - CRUZ DEL VISO

1.1.3 CONTRATO PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO

Para los mantenimientos rutinarios se cuenta con el apoyo de cinco empresas de servicios de limpieza descritas a continuación:

Tabla 7. Cooperativas de Mantenimiento

CONCESIÓN RUTA AL MAR LONGITUD Y TRAMO DE OPERACIÓN						EMPRESA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO				
Unidad Funcional Integral (UFI)	Ruta	Origen (nombre, abscisa)	Destino (nombre, abscisa)	Longitud aproximada origen destino (1)	Long. Intervenir	EMPRESAS				
						CANT	INTEGRANTES MINIMOS	INTEGRANTES ACTUALES	RAZON SOCIAL	NOMBRE DEL REPRESENTANTE
UFI1	2513	Caucasia PR 03+350	Planeta Rica PR 63+845	60,4	60,4	1	12	12	CONMA SVIAS S.A.S.	OCTAVIO MONTOYA
UFI4	2310	Planeta Rica PR 00+000	Montería PR 49+000	49,0	49,00	1	10	10	MULTIA CTIVO S.A.S	LUIS EDUARDO VIDAL MORA
UFI5	7401	Puerto Rey PR 00+000	Montería PR 64+000	64,0	64,00	1	18	18	MANTE NIMIENT O VIAL DE LA COSTA S.A.S	CALIXTO MARTINEZ
		Santa Lucía PR 00+000	San Pelayo PR 26+000	26,0	26,0					

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

CONCESIÓN RUTA AL MAR LONGITUD Y TRAMO DE OPERACIÓN						EMPRESA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO				
Unidad Funcional Integral (UFI)	Ruta	Origen (nombre, abscisa)	Destino (nombre, abscisa)	Longitud aproximada origen destino (1)	Long. Intervenir	EMPRESAS				
						CANT	INTEGRANTES MINIMOS	INTEGRANTES ACTUALES	RAZON SOCIAL	NOMBRE DEL REPRESENTANTE
UFI3	--	San Carlos PR 22+500	Cerete PR 31+990	9,5	9,5	1	2	2	MULTISERVICIOS EN MANTENIMIENTO VIAL S.A.S	MANUEL PAEZ CORCHO
UFI6	2103	Cereté PR 10+764	Lorica PR 48+222	37	37		8	9		
UFI6	9004	Lorica PR 5+847	Coveñas PR 23+309	17	38.6	1	8	9	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIAS S.A.S.	EDILBERTO ALVAREZ PINTO
		Coveñas PR 41+000	Tolú PR 46+100	5.1						
UFI8		Tolú PR 49+453	Tolú Viejo PR 65+937	16.5						
UFI8	9004	Pueblito PR 93+683	San Onofre PR 104+820	11.2	70.5	1	14	14	TRAVIA MAR S.A.S.	VICTOR CARO BARRIOS
	9005	San Onofre PR 0+023	Cruz del Viso PR 59+352	59.3						
TOTALES				226	226	5	46	48		

2. OPERACIÓN

2.1 TRÁFICO Y RECAUDO DE LAS ESTACIONES DE PEAJES

Con relación a la información de tráfico del mes, clasificados por Día y hora, Tramo, sentido de circulación y categoría de vehículo, a continuación, se relaciona en el presente informe la información de Tráfico y Recaudo de septiembre de 2017 de los Peajes de La Apartada, Los Manguitos, Mata de Caña, Caimanera, San Onofre, Los Cedros y Purgatorio.

Para el mes de septiembre de 2017 se recaudó un total de **\$ 8.718.652.100** por concepto de recaudo de las tarifas de peaje, incluye sobrantes y fondo de seguridad vial.

Tabla 8. Tráfico y Recaudo

TRAFICO Y RECAUDO DE LAS ESTACIONES DE PEAJES 2016		
MES	TRAFICO TOTAL 2016	RECAUDO BRUTO
ACUMULADO	4.473.695	\$ 60.480.191.100

TRÁFICO Y RECAUDO DE LAS ESTACIONES DE PEAJES 2017		
MES	TRÁFICO TOTAL DEL MES	RECAUDO TOTAL + SOBRANTES
ENERO	586.447	\$ 8.806.680.900
FEBRERO	346.300	\$ 6.230.679.600
MARZO	384.552	\$ 6.895.237.600
ABRIL	467.718	\$ 7.778.110.950
MAYO	367.976	\$ 6.746.680.750
JUNIO	409.064	\$ 7.178.873.150
JULIO	410.557	\$ 7.126.953.850
AGOSTO	442.243	\$ 7.726.054.450
SEPTIEMBRE	499.566	\$ 8.718.652.100
ACUMULADO	3.914.423	\$ 67.207.923.350

Sin embargo el recaudo en este mes excluyendo el fondo de seguridad vial, ascendió a la suma de **\$ 8.618.738.900** Según tabla 9.

Tabla 9 Total Tráfico y Recaudo todas las estaciones y FOSEVI.

TRAFICO Y RECAUDO DE LAS ESTACIONES DE PEAJES 2016						
MES	TRAFICO TOTAL DEL 2016	RECAUDO TOTAL	TOTAL CONSIGNADO CONCESIONARIO ODINSA 19,70%	COMPENSACIÓN TARIFARIA CONSIGNADO ODINSA (IPS)	SEGURIDAD VIAL DICIEMBRE \$260 Y ENERO \$ 278	RECAUDO NETO
ACUMULADO	4.473.695	\$ 60.480.191.100	\$ 3.411.111.746	\$ 97.300.029	\$ 1.026.662.332	\$ 55.945.116.993

TRÁFICO Y RECAUDO DE LAS ESTACIONES DE PEAJES 2017				
MES	TRÁFICO TOTAL DEL MES	RECAUDO TOTAL	SEGURIDAD VIAL 2017 \$ 200	RECAUDO NETO
ENERO	586.447	\$ 8.806.680.900	\$ 117.289.400	\$ 8.689.391.500
FEBRERO	346.300	\$ 6.230.679.600	\$ 69.260.000	\$ 6.161.419.600
MARZO	384.552	\$ 6.895.237.600	\$ 76.910.400	\$ 6.818.327.200
ABRIL	467.718	\$ 7.778.110.950	\$ 93.543.600	\$ 7.684.567.350
MAYO	367.976	\$ 6.746.680.750	\$ 73.595.200	\$ 6.673.085.550
JUNIO	409.064	\$ 7.178.873.150	\$ 81.812.800	\$ 7.097.060.350
JULIO	410.557	\$ 7.126.953.850	\$ 82.111.400	\$ 7.044.842.450
AGOSTO	442.243	\$ 7.726.054.450	\$ 88.448.600	\$ 7.637.605.850
SEPTIEMBRE	499.566	\$ 8.718.652.100	\$ 99.913.200	\$ 8.618.738.900
ACUMULADO	3.914.423	\$ 67.207.923.350	\$ 782.884.600	\$ 66.425.038.750

2.1.1 ESTACION DE PEAJE LA APARTADA

Tabla 10 Tráfico y Recaudo La Apartada.

TRAFICO Y RECAUDO DE LA APARTADA 2016						
MES	TRAFICO TOTAL DEL 2016	RECAUDO TOTAL	TOTAL CONSIGNADO CONCESIONARIO ODINSA 19,70%	COMPENSACIÓN TARIFARIA CONSIGNADO ODINSA (IPS)	SEGURIDAD VIAL DICIEMBRE \$260 , ENERO \$ 278 Y JUNIO \$ 200	RECAUDO NETO
ACUMULADO	1.508.503	\$ 24.331.703.500	\$ 1.526.718.826	\$ 44.305.086	\$ 356.315.754	\$ 22.404.363.834

TRAFICO Y RECAUDO DE LA APARTADA 2017				
MES	TRÁFICO TOTAL DEL MES	RECAUDO TOTAL	SEGURIDAD VIAL 2017 \$ 200	RECAUDO NETO
ENERO	140.572	\$ 2.787.817.500	\$ 28.114.400	\$ 2.759.703.100
FEBRERO	85.719	\$ 2.177.677.400	\$ 17.143.800	\$ 2.160.533.600
MARZO	92.460	\$ 2.344.824.200	\$ 18.492.000	\$ 2.326.332.200
ABRIL	107.173	\$ 2.442.400.700	\$ 21.434.600	\$ 2.420.966.100
MAYO	86.664	\$ 2.278.668.100	\$ 17.332.800	\$ 2.261.335.300
JUNIO	95.572	\$ 2.352.045.100	\$ 19.114.400	\$ 2.332.930.700
JULIO	95.346	\$ 2.325.983.100	\$ 19.069.200	\$ 2.306.913.900
AGOSTO	100.223	\$ 2.402.708.600	\$ 20.044.600	\$ 2.382.664.000
SEPTIEMBRE	89.194	\$ 2.278.156.300	\$ 17.838.800	\$ 2.260.317.500
ACUMULADO	892.923	\$ 21.390.281.000	\$ 178.584.600	\$ 21.211.696.400

2.1.2 ESTACION DE PEAJE MATA DE CAÑA

Tabla 11 Tráfico y Recaudo Mata de Caña.

TRAFICO Y RECAUDO DE MATA DE CAÑA 2016						
MES	TRAFICO TOTAL DEL 2016	RECAUDO TOTAL	TOTAL CONSIGNADO CONCESIONARIO ODINSA 19,70%	COMPENSACIÓN TARIFARIA CONSIGNADO ODINSA (IPS)	SEGURIDAD VIAL DICIEMBRE \$260 , ENERO \$ 278 Y JUNIO \$ 200	RECAUDO NETO
ACUMULADO	1.109.128	\$ 11.108.332.450	\$ 869.828.820	\$ 26.115.768	\$ 263.257.256	\$ 9.949.130.606

TRAFICO Y RECAUDO DE MATA DE CAÑA 2017				
MES	TRÁFICO TOTAL DEL MES	RECAUDO TOTAL	SEGURIDAD VIAL 2017 \$ 200	RECAUDO NETO
ENERO	110.160	\$ 1.320.860.500	\$ 22.032.000	\$ 1.298.828.500
FEBRERO	55.024	\$ 720.857.800	\$ 11.004.800	\$ 709.853.000
MARZO	64.130	\$ 837.182.000	\$ 12.826.000	\$ 824.356.000
ABRIL	85.588	\$ 1.107.623.100	\$ 17.117.600	\$ 1.090.505.500
MAYO	61.921	\$ 806.559.100	\$ 12.384.200	\$ 794.174.900
JUNIO	73.349	\$ 941.225.550	\$ 14.669.800	\$ 926.555.750
JULIO	76.197	\$ 968.318.600	\$ 15.239.400	\$ 953.079.200
AGOSTO	72.051	\$ 933.511.700	\$ 14.410.200	\$ 919.101.500
SEPTIEMBRE	62.401	\$ 814.192.600	\$ 12.480.200	\$ 801.712.400
ACUMULADO	660.821	\$ 8.450.330.950	\$ 132.164.200	\$ 8.318.166.750

2.1.3 ESTACION DE PEAJE SAN ONOFRE

Tabla 12 Tráfico y Recaudo San Onofre.

TRAFICO Y RECAUDO DE SAN ONOFRE 2016						
MES	TRAFICO TOTAL DEL 2016	RECAUDO TOTAL	TOTAL CONSIGNADO CONCESIONARIO ODINSA 19,70%	COMPENSACIÓN TARIFARIA CONSIGNADO ODINSA (IPS)	SEGURIDAD VIAL DICIEMBRE \$260 ENERO \$ 278 JULIO \$ 200	RECAUDO NETO
ACUMULADO	783.644	\$ 10.134.414.000	\$ 1.014.564.100	\$ 26.879.175	\$ 192.530.122	\$ 8.900.440.603

TRAFICO Y RECAUDO DE SAN ONOFRE 2017				
MES	TRÁFICO TOTAL DEL MES	RECAUDO TOTAL	SEGURIDAD VIAL 2017 \$ 200	RECAUDO NETO
ENERO	73.001	\$ 1.122.703.000	\$ 14.600.200	\$ 1.108.102.800
FEBRERO	49.834	\$ 866.742.000	\$ 9.966.800	\$ 856.775.200
MARZO	55.942	\$ 973.912.200	\$ 11.188.400	\$ 962.723.800
ABRIL	67.678	\$ 1.114.992.000	\$ 13.535.600	\$ 1.101.456.400
MAYO	54.902	\$ 969.873.400	\$ 10.980.400	\$ 958.893.000
JUNIO	59.828	\$ 1.040.132.700	\$ 11.965.600	\$ 1.028.167.100
JULIO	58.460	\$ 1.011.385.400	\$ 11.692.000	\$ 999.693.400
AGOSTO	55.679	\$ 976.759.400	\$ 11.135.800	\$ 965.623.600
SEPTIEMBRE	53.267	\$ 953.451.700	\$ 10.653.400	\$ 942.798.300
ACUMULADO	528.591	\$ 9.029.951.800	\$ 105.718.200	\$ 8.924.233.600

2.1.4 ESTACION DE PEAJE LOS MANGUITOS

Tabla 13 Tráfico y Recaudo Los Manguitos.

TRAFICO Y RECAUDO DE MANGUITOS 2016						
MES	TRAFICO TOTAL DEL 2016	RECAUDO TOTAL	TOTAL CONSIGNADO CONCESIONARIO ODINSA 19,70%	COMPENSACIÓN TARIFARIA CONSIGNADO ODINSA (IPS)	SEGURIDAD VIAL JUNIO \$200	RECAUDO NETO
ACUMULADO	816.921	\$ 12.492.257.750	\$ -	\$ -	\$ 163.384.200	\$ 12.328.873.550

TRAFICO Y RECAUDO DE MANGUITOS 2017				
MES	TRÁFICO TOTAL DEL MES	RECAUDO TOTAL	SEGURIDAD VIAL 2017 \$ 200	RECAUDO NETO
ENERO	170.218	\$ 2.637.728.850	\$ 34.043.600	\$ 2.603.685.250
FEBRERO	112.716	\$ 2.051.017.900	\$ 22.543.200	\$ 2.028.474.700
MARZO	124.282	\$ 2.270.883.000	\$ 24.856.400	\$ 2.246.026.600
ABRIL	136.833	\$ 2.356.884.300	\$ 27.366.600	\$ 2.329.517.700
MAYO	121.875	\$ 2.270.363.000	\$ 24.375.000	\$ 2.245.988.000
JUNIO	128.900	\$ 2.315.760.100	\$ 25.780.000	\$ 2.289.980.100
JULIO	128.470	\$ 2.300.498.500	\$ 25.694.000	\$ 2.274.804.500
AGOSTO	124.884	\$ 2.307.800.400	\$ 24.976.800	\$ 2.282.823.600
SEPTIEMBRE	119.937	\$ 2.266.569.700	\$ 23.987.400	\$ 2.242.582.300
ACUMULADO	1.168.115	\$ 20.777.505.750	\$ 233.623.000	\$ 20.543.882.750

2.1.5 ESTACION DE PEAJE CAIMANERA

Tabla 14 Tráfico y Recaudo Caimanera.

TRAFICO Y RECAUDO DE CAIMANERA 2016						
MES	TRAFICO TOTAL DEL 2016	RECAUDO TOTAL	TOTAL CONSIGNADO CONCESIONARIO ODINSA 19,70%	COMPENSACIÓN TARIFARIA CONSIGNADO ODINSA (IPS)	SEGURIDAD VIAL JUNIO \$200	RECAUDO NETO
ACUMULADO	255.875	\$ 2.379.032.000	\$ -	\$ -	\$ 51.175.000	\$ 2.327.857.000

TRAFICO Y RECAUDO DE CAIMANERA 2017				
MES	TRÁFICO TOTAL DEL MES	RECAUDO TOTAL	SEGURIDAD VIAL 2017 \$ 200	RECAUDO NETO
ENERO	92.496	\$ 937.571.050	\$ 18.499.200	\$ 919.071.850
FEBRERO	43.007	\$ 414.384.500	\$ 8.601.400	\$ 405.783.100
MARZO	47.738	\$ 468.436.200	\$ 9.547.600	\$ 458.888.600
ABRIL	70.446	\$ 756.210.850	\$ 14.089.200	\$ 742.121.650
MAYO	42.614	\$ 421.217.150	\$ 8.522.800	\$ 412.694.350
JUNIO	51.415	\$ 529.709.700	\$ 10.283.000	\$ 519.426.700
JULIO	52.084	\$ 520.768.250	\$ 10.416.800	\$ 510.351.450
AGOSTO	48.415	\$ 487.806.950	\$ 9.683.000	\$ 478.123.950
SEPTIEMBRE	40.387	\$ 398.811.200	\$ 8.077.400	\$ 390.733.800
ACUMULADO	488.602	\$ 4.934.915.850	\$ 97.720.400	\$ 4.837.195.450

2.1.6 ESTACION DE PEAJE CEDROS

Tabla 15 Tráfico y Recaudo Caimanera.

TRAFICO Y RECAUDO DE CEDROS 2017				
MES	TRÁFICO TOTAL DEL MES	RECAUDO TOTAL	SEGURIDAD VIAL 2017 \$ 200	RECAUDO NETO
ENERO	0	\$ -	\$ -	\$ -
FEBRERO	0	\$ -	\$ -	\$ -
MARZO	0	\$ -	\$ -	\$ -
ABRIL	0	\$ -	\$ -	\$ -
MAYO	0	\$ -	\$ -	\$ -
JUNIO	0	\$ -	\$ -	\$ -
JULIO	0	\$ -	\$ -	\$ -
AGOSTO	15.646	\$ 230.606.300	\$ 3.129.200	\$ 227.477.100
SEPTIEMBRE	51.544	\$ 745.050.000	\$ 10.308.800	\$ 734.741.200
ACUMULADO	67.190	\$ 975.656.300	\$ 13.438.000	\$ 962.218.300

2.1.7 ESTACION DE PEAJE PURGATORIO

Tabla 16 Tráfico y Recaudo Caimanera.

TRAFICO Y RECAUDO DE PURGATORIO 2017				
MES	TRÁFICO TOTAL DEL MES	RECAUDO TOTAL	SEGURIDAD VIAL 2017 \$ 200	RECAUDO NETO
ENERO	0	\$ -	\$ -	\$ -
FEBRERO	0	\$ -	\$ -	\$ -
MARZO	0	\$ -	\$ -	\$ -
ABRIL	0	\$ -	\$ -	\$ -
MAYO	0	\$ -	\$ -	\$ -
JUNIO	0	\$ -	\$ -	\$ -
JULIO	0	\$ -	\$ -	\$ -
AGOSTO	25.345	\$ 386.861.100	\$ 5.069.000	\$ 381.792.100
SEPTIEMBRE	82.836	\$ 1.262.420.600	\$ 16.567.200	\$ 1.245.853.400
ACUMULADO	108.181	\$ 1.649.281.700	\$ 21.636.200	\$ 1.627.645.500

2.1.8 RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL

Tabla 17 FOSEVI.

RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL 2016												
MES	LA APARTADA		MATA DE CAÑA		SAN ONOFRE		MANGUITOS		CAIMANERA		ESTACIONES	
	TRAFICO	RECAUDO	TRAFICO	RECAUDO	TRAFICO	RECAUDO	TRAFICO	RECAUDO	TRAFICO	RECAUDO	TRAFICO	RECAUDO
TOTAL	1.508.503	\$ 356.315.754	1.109.128	\$ 263.257.256	783.656	\$ 192.530.122	816.921	\$ 163.384.200	255.875	\$ 51.175.000	4.474.083	\$ 1.026.662.332

RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL 2017																
MES	LA APARTADA		MATA DE CAÑA		SAN ONOFRE		CAIMANERA		LOS MANGUITOS		LOS CEDROS		PURGATORIO		TOTAL ESTACIONES	
	TRAFICO	RECAUDO	TRAFICO	RECAUDO	TRAFICO	RECAUDO	TRAFICO	RECAUDO	TRAFICO	RECAUDO	TRAFICO	RECAUDO	TRAFICO	RECAUDO	TRAFICO	RECAUDO
ENERO	140.572	\$ 28.114.400	110.160	\$ 22.032.000	73.001	\$ 14.600.200	92.496	\$ 18.499.200	170.218	\$ 34.043.600	0	\$ -	0	\$ -	586.447	\$ 117.289.400
FEBRERO	85.719	\$ 17.143.800	55.024	\$ 11.004.800	49.834	\$ 9.966.800	43.007	\$ 8.601.400	112.716	\$ 22.543.200	0	\$ -	0	\$ -	346.300	\$ 69.260.000
MARZO	92.460	\$ 18.492.000	64.130	\$ 12.826.000	55.942	\$ 11.188.400	47.738	\$ 9.547.600	124.282	\$ 24.856.400	0	\$ -	0	\$ -	384.552	\$ 76.910.400
ABRIL	107.173	\$ 21.434.600	85.588	\$ 17.117.600	67.678	\$ 13.535.600	70.446	\$ 14.089.200	136.833	\$ 27.366.600	0	\$ -	0	\$ -	467.718	\$ 93.543.600
MAYO	86.664	\$ 17.332.800	61.921	\$ 12.384.200	54.902	\$ 10.980.400	42.614	\$ 8.522.800	121.875	\$ 24.375.000	0	\$ -	0	\$ -	367.976	\$ 73.595.200
JUNIO	95.572	\$ 19.114.400	73.349	\$ 14.669.800	59.828	\$ 11.965.600	51.415	\$ 10.283.000	128.900	\$ 25.780.000	0	\$ -	0	\$ -	409.064	\$ 81.812.800
JULIO	95.346	\$ 19.069.200	76.197	\$ 15.239.400	58.460	\$ 11.692.000	52.084	\$ 10.416.800	128.470	\$ 25.694.000	0	\$ -	0	\$ -	410.557	\$ 82.111.400
AGOSTO	100.223	\$ 20.044.600	72.051	\$ 14.410.200	55.679	\$ 11.135.800	48.415	\$ 9.683.000	124.884	\$ 24.976.800	15.646	\$ 3.129.200	25.345	\$ 5.069.000	442.243	\$ 88.448.600
SEPTIEMBRE	89.194	\$ 17.838.800	62.401	\$ 12.480.200	53.267	\$ 10.653.400	40.387	\$ 8.077.400	119.937	\$ 23.987.400	51.544	\$ 10.308.800	82.836	\$ 16.567.200	499.566	\$ 99.913.200
TOTAL	892.923	\$ 178.584.600	660.821	\$ 132.164.200	528.591	\$ 105.718.200	488.602	\$ 97.720.400	1.168.115	\$ 233.623.000	\$ 67.190	\$ 13.438.000	\$ 108.181	\$ 21.636.200	3.914.423	\$ 782.884.600

2.1.9 ANALISIS DE LOS VEHICULOS EXCENTOS (LEY 787) DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

A raíz de la promulgación de la ley 787 de 2002, los vehículos oficiales, son clasificados como exentos del pago de la tarifa de peaje. Estos son relacionados a continuación por estación de peajes:

Tabla 18 Vehículos Exentos

TRÁFICO VEHÍCULOS OFICIALES LEY 787 PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2017								
ESTACIONES DE PEAJES	CATEGORIAS							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	TOTAL
LA APARTADA	580	54	180	74	8	1	0	897
LOS MANGUITOS	1.252	8	239	52	8	0	1	1.560
MATA DE CAÑA	1.150	51	46	17	13	0	0	1.277
CAIMANERA	939	1	282	2	26	0	0	1.250
SAN ONOFRE	271	25	43	14	33	0	1	387
CEDROS	1.033	4	66	10	5	3	0	1.121
PURGATORIO	1.756	51	187	58	0	0	0	2.052
TOTAL	6.981	194	1.043	227	93	4	2	8.544

Para el mes de **Septiembre**, el no pago de tarifas de peaje por parte de los vehículos oficiales ascendió a: \$ **108.878.200** cuantificado de la siguiente manera:

Tabla 19 Equivalente en Dinero Septiembre 2017.

ESTACIÓN DE PEAJE	DEJADO DE RECIBIR POR LEY 787							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	TOTAL
LA APARTADA	\$ 6.786.000	\$ 934.200	\$ 3.114.000	\$ 1.280.200	\$ 250.400	\$ 50.000	\$ -	\$ 12.414.800
LOS MANGUITOS	\$ 14.648.400	\$ 138.400	\$ 4.134.700	\$ 899.600	\$ 250.400	\$ -	\$ 34.300	\$ 20.105.800
MATA DE CAÑA	\$ 13.110.000	\$ 861.900	\$ 777.400	\$ 287.300	\$ 236.600	\$ -	\$ -	\$ 15.273.200
CAIMANERA	\$ 10.704.600	\$ 16.900	\$ 4.765.800	\$ 33.800	\$ 473.200	\$ -	\$ -	\$ 15.994.300
SAN ONOFRE	\$ 3.170.700	\$ 432.500	\$ 743.900	\$ 242.200	\$ 1.032.900	\$ -	\$ 25.300	\$ 5.647.500
CEDROS	\$ 12.086.100	\$ 69.200	\$ 1.141.800	\$ 173.000	\$ 156.500	\$ 150.000	\$ -	\$ 13.776.600
PURGATORIO	\$ 20.545.200	\$ 882.300	\$ 3.235.100	\$ 1.003.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.666.000
TOTAL	\$ 48.419.700	\$ 2.383.900	\$ 13.535.800	\$ 2.743.100	\$ 2.243.500	\$ 50.000	\$ 59.600	\$ 108.878.200

Tabla 20 Dejado de Percibir por Estación 2017.

ESTACIONES DE PEAJES	VALOR
LA APARTADA	\$ 12.414.800
LOS MANGUITOS	\$ 20.105.800
MATA DE CAÑA	\$ 15.273.200
CAIMANERA	\$ 15.994.300
SAN ONOFRE	\$ 5.647.500
CEDROS	\$ 13.776.600
PURGATORIO	\$ 25.666.000
TOTAL	\$ 108.878.200
ACUMULADO	\$ 691.062.100

Valor Acumulado desde Noviembre 27 de 2015 hasta Diciembre 31 de 2016
Vehículos Oficiales **\$ 605.254.100**

VALOR TOTAL LEY 787 PARA EL 2016	
ESTACIONES DE PEAJES	VALOR
ACUMULADO	\$ 605.254.100

2.2.0 ANALISIS DE VEHICULOS ESPECIALES.

El Ministerio de transporte por medio de la Resolución 0002820 del 11 de julio 2016 establece tarifa diferencial en la estación de peaje "Los Manguitos" categoría 1E para vehículos Públicos y particulares. Al igual en la misma Resolución establece tarifa diferencial a los vehículos de servicio público de categoría IIE en la estación de peaje "Mata de Caña".

la Resolución 0003119 del 29 de julio 2016 establece tarifa diferencial en la estación de peaje "Caimanera" a todas las categoría para vehículos Públicos y particulares.

En la tabla 18 se muestra la cantidad de TIE instaladas y por instalar de cada una de las estaciones de peaje.

Tabla 18 Resumen de TIE por Estaciones de Peajes.

Estación	Inicio Tarifa		Aprobadas ANI	TIE Instalada Activas		TIE Retiradas Por Pasos		TIE Por Instalar		Rechazadas	Sin Documentos	TIE Pendientes Por Retirar	
	Fecha	Cantidad		Público	Particulares	Público	Particulares	Público	Particulares	Cantidad	Cantidad	Público	Particulares
Manguitos	26/12/2016	320	142	56	44	0	34	5	3	165	0	2	12
Caimanera	30/07/2016	1034	607	84	179	43	148	33	120	326	0	0	101
Mata de Caña	22/07/2016	103	50	32	0	0	0	18	0	0	53	0	0
Total		1457	799	172	223	43	182	56	123	491	53	2	113

2.1.9 INFORME PASO DE VEHÍCULOS ESPECIALES EN LOS PEAJES CAIMANERA Y LOS MANGUITOS (ANEXO 5)

2.2 ATENCIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y NOVEDADES A LOS USUARIOS DE LA VÍA.

La operación de atención de accidentes, incidentes y novedades a los usuarios de la vía se está realizando con los equipos de emergencia ubicados en los diferentes sectores del proyecto.

A continuación, se presentan cuadros estadísticos que reflejan los accidentes, incidencias y novedades presentados y atendidos durante el mes de octubre de 2017 con relación al tránsito de los usuarios de la vía.

Tabla 20. Servicios atendidos en el mes por Categoría.

Categoría	Servicios de Ambulancia	Ayudas Mecánicas	Servicios de Grúa de Plataforma	Servicios de Grúa de Gancho	TOTAL
CAT. 1	18	87	171	5	281
CAT. 2	6	70	9	78	163
CAT. 3	0	1	0	4	5
CAT. 4	0	0	0	1	1
CAT. 5	3	20	0	10	33
CAT. 6	0	0	0	0	0
CAT. 7	0	0	0	0	0
Motos	12	6	6	0	24
Otros	0	0	0	0	0
Bicicleta	0	0	0	0	0
Comunidad	56	0	0	0	56
Solucionado por usuario	0	0	0	1	1
Totales	95	184	186	99	564

Como se puede observar en la tabla 20, la mayor demanda de los servicios es atendida por los servicios de Grúas de Plataforma con el (33%), al igual que las Ayudas Mecánicas, seguido de los servicios de Grúas de Gancho (17%), concentrándose en atención a la categoría II y al igual que los servicios de Ambulancia (17%).

Figura 1. Atención al Usuario



Tabla 21. Servicios atendidos por Ruta, Unidad Funcional y Subsector.


Como se puede observar en la tabla 21, la mayor demanda de los servicios es atendida en la Unidad funcional 1, subsector 1 (Caucasia – Planeta Rica) con 120 atenciones, la Unidad Funcional 4, subsector 1 (Planeta Rica – Montería) con 117 atenciones, seguido de la Unidad Funcional 5, subsector 1 (Puerto Rey – Montería) con 116 atenciones, la Unidad Funcional 8, subsector 3 (San Onofre – Cruz del viso) con 92 atenciones, la Unidad Funcional 6, subsector 1 (Cere te – Lórica) con 72 atenciones.

Tabla 22. Servicios atendidos el mes de octubre 2017.

Total Atenciones por Unidad Funcional y Subsectores				
RUTA	UFI	SUBSECTOR	TRAMO	Total
2513	1	1	CAUCASIA - PLANETA RICA	120
-	3	2	EL 15 - SAN CARLOS	3
		4	SAN CARLOS - CERETE	3

Total Atenciones por Unidad Funcional y Subsectores				
RUTA	UFI	SUBSECTOR	TRAMO	Total
2310	4	1	PLANETA RICA - MONTERÍA	117
7401	5	1	PUERTO REY - MONTERÍA	116
-		2	SANTA LUCIA - SAN PELAYO	9
2103	6	1	CERETE - LORICA	72
9004		2	LORICA - PORVENIR	19
		3	COVEÑAS - TOLÚ	2
	8	1	TOLÚ - TOLÚ VIEJO	3
2		PUEBLITO - SAN ONOFRE	8	
9005		3	SAN ONOFRE - CRUZ DEL VISO	92
Total general				564

Figura 2. Atención al Usuario por Unidad Funcional

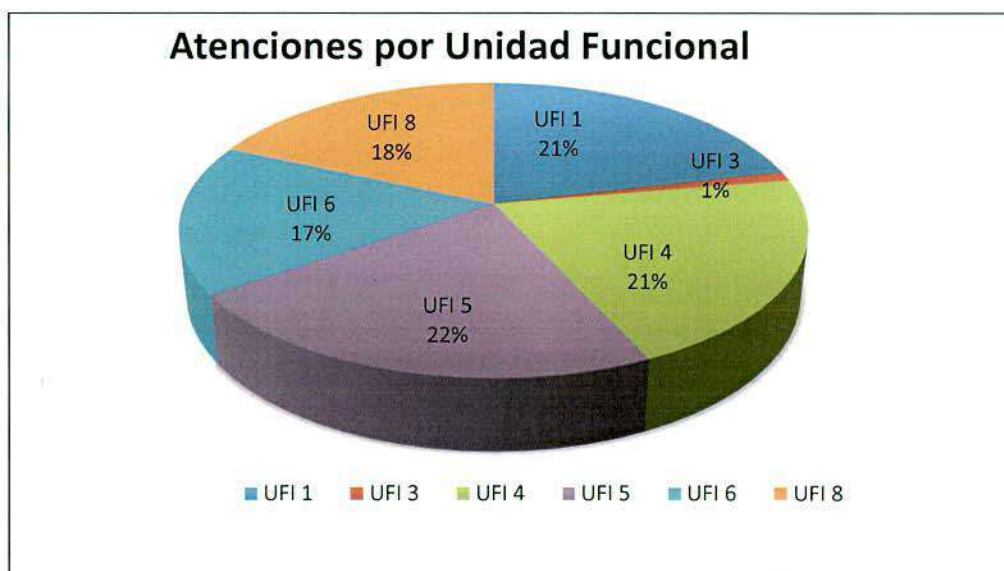

Como se puede observar en la Figura 2, la mayor atención se prestó en la Unidades Funcional Integral 5, con un porcentaje del 22%, la Unidad Funcional Integral 4 y 1, con un porcentaje del 21% cada una, seguido de la Unidad

Funcional 8 con un porcentaje del 18% y la Unidad Funcional 6 con un porcentaje del 17%.

2.2.1 SERVICIO DE AMBULANCIA

Los servicios médicos y traslados con las ambulancias han obedecido a servicios a la comunidad con un 55%, al igual que los accidentes de tránsito con un 37%, y servicio no encontrado con un 8%.

Tabla 23. Servicios de ambulancia octubre 2017

Servicios	Participación
ACCIDENTE DE TRANSITO	38
SERVICIO A LA COMUNIDAD	57
SERVICIO NO ENCONTRADO	8
TOTAL	103

Analizando los servicios de ambulancia prestados durante el mes de octubre por tipo de vehículos, se encontró que están relacionados a la atención de vehículos de categoría I con el 19%, Motociclistas con un 13%, seguido de los vehículos de categoría II con el 6%.

A continuación, se describe el servicio de ambulancia del periodo por Unidad Funcional, subsectores y por categorías:

Tabla 24. Servicio de Ambulancia por UFI, Subsectores y Categorías

SERVICIO DE AMBULANCIA														
Unidad Funcional Integral	UFI 1		UFI 3		UFI 4	UFI 5		UFI 6			UFI 8			TOTALES
Subsector	1	2	4	1	1	2	1	2	3	1	2	3		
Categoría I	2	1	0	7	2	0	2	0	0	0	1	3	18	
Categoría II	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	2	6	
Categoría III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SERVICIO DE AMBULANCIA														
Unidad Funcional Integral	UFI 1		UFI 3		UFI 4	UFI 5		UFI 6			UFI 8			TOTALES
Subsector	1	2	4	1	1	2	1	2	3	1	2	3		
Categoría IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Categoría V	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
Categoría VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Categoría VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Motos	3	0	0	6	1	1	1	0	0	0	0	0	12	
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bicicleta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Comunidad	3	0	0	25	12	0	2	0	0	0	0	14	56	
TOTALES	12	1	0	39	15	1	6	0	0	0	2	19	95	

Tabla 25. Servicio de Ambulancia no encontrados por UFI, y Subsectores


Unidad Funcional Integral	UFI 1	UFI 3		UFI 4	UFI 5		UFI 6			UFI 8			TOTALES
Subsector	1	2	4	1	1	2	1	2	3	1	2	3	
Servicio no encontrado	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	

Tabla 26. Servicio de Ambulancia por UFI y Categorías

Serv. de Ambulancia	UFI 1	UFI 3	UFI 4	UFI 5	UFI 6	UFI 8	TOTALES
Categoría I	2	1	7	2	2	4	18
Categoría II	1	0	1	0	1	3	6
Categoría III	0	0	0	0	0	0	0
Categoría IV	0	0	0	0	0	0	0
Categoría V	3	0	0	0	0	0	3

Serv. de Ambulancia	UFI 1	UFI 3	UFI 4	UFI 5	UFI 6	UFI 8	TOTALES
Categoría VI	0	0	0	0	0	0	0
Categoría VII	0	0	0	0	0	0	0
Motos	3	0	6	2	1	0	12
Otros	0	0	0	0	0	0	0
Bicicleta	0	0	0	0	0	0	0
Comunidad	3	0	25	12	2	14	56
TOTALES	12	1	39	16	6	21	95

Figura 3. Servicio de ambulancias discriminadas por UFI

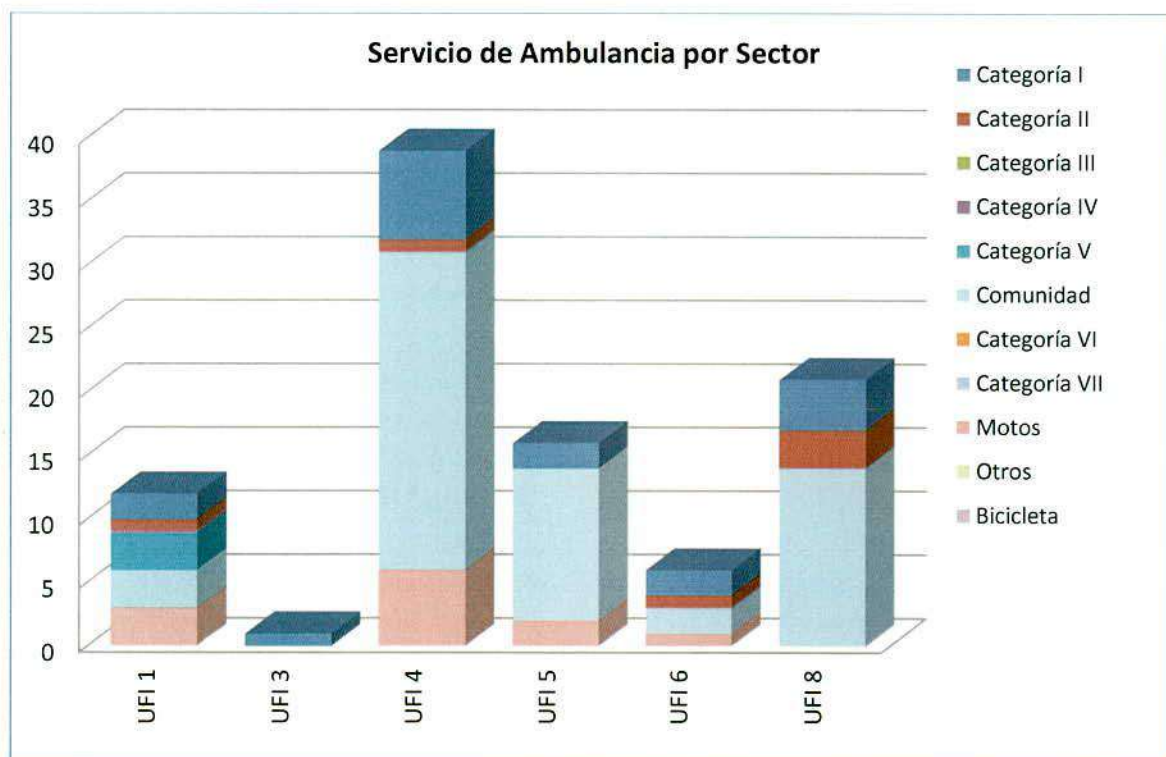


A continuación, se presenta la Figura 4, de los servicios médicos y traslado atendidos con ambulancias por tipo de vehículos en la siguiente figura:

Figura 4. Servicios de Ambulancia por Tipo



Con relación al mes anterior, se tiene que los servicios de ambulancia prestados por la Concesión aumentaron el 12%, pasando de 92 a 103 servicios.

Figura 5. Servicio Ambulancia.

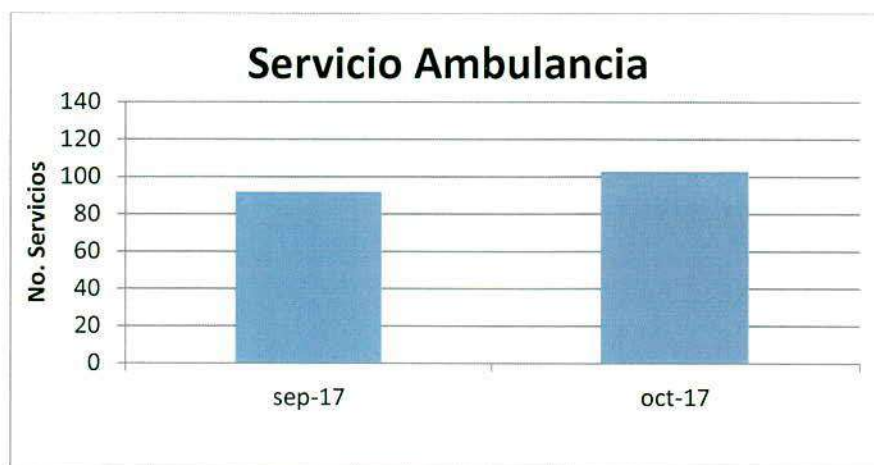



CONCESIÓN
Ruta al Mar

INFORME GERENCIAL MENSUAL OCTUBRE 2017

34

Con relación al mismo mes en el año anterior, se tiene que los servicios del presente mes aumentaron en un 124%, pasando de 46 a 103 servicios.

Figura 6. Comportamiento respecto Año Anterior.

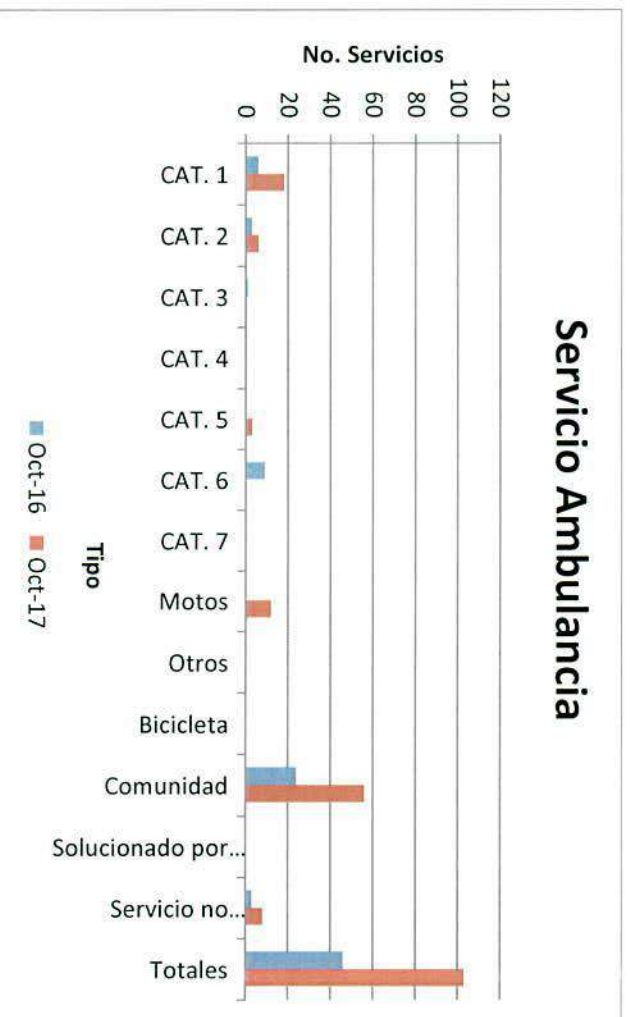


Tabla 27. Numero de servicios de ambulancia por Ruta, Unidad Funcional y Subsector.

Total servicios de Ambulancia por Unidad Funcional				
RUTA	UFI	SUBSECTOR	TRAMO	Total
2513	1	1	CAUCASIA - PLANETA RICA	12
-	3	2	EL 15 - SAN CARLOS	1
		4	SAN CARLOS - CERETE	0
2310	4	1	PLANETA RICA - MONTERÍA	39
7401	5	1	PUERTO REV - MONTERÍA	15
-		2	SANTA LUCIA - SAN PELAYO	1
2103		1	CERETE - LORICA	6

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.

Contiguo a la planta de Bavaria.

Montería - Córdoba

Total servicios de Ambulancia por Unidad Funcional				
RUTA	UFI	SUBSECTOR	TRAMO	Total
9004	8	2	LORICA - PORVENIR	0
		3	COVEÑAS - TOLÚ	0
		1	TOLÚ - TOLÚ VIEJO	0
		2	PUEBLITO - SAN ONOFRE	2
9005		3	SAN ONOFRE - CRUZ DEL VISO	19
Total general				95


Como se puede observar en la tabla 27, las mayores demandas de los servicios de ambulancia son prestados en la Unidad 4, Subsector 1 (Planeta Rica – Montería) con 39 eventos, seguido de la Unidad 8, subsector 3 (San Onofre – Cruz del Viso) con 19 eventos, la Unidad Funcional 5, subsector 1 (Puerto Rey – Montería) con 15 eventos, la Unidad Funcional 1, subsector 1 (Caucasia – Planeta Rica) con 12 eventos.

Tabla 28. Numero de servicios de ambulancia por unidad funcional

Total servicios de Ambulancia por Unidad Funcional		
UFI	TRAMO	Total
UFI 1	CAUCASIA - PLANETA RICA	12
UFI 3	EL 15 - SAN CARLOS-CERETE	1
UFI 4	PLANETA RICA - MONTERÍA	39
UFI 5	PUERTO REY - MONTERÍA, SANTA LUCIA - SAN PELAYO	16
UFI 6	CERETE - TOLÚ	6
UFI 8	TOLÚ - CRUZ DEL VISO	21
Total general		95

Teniendo en cuenta la distribución por cada una de las unidades funcionales se tiene que los porcentajes mayores corresponden a: el 41% UFI 4: Planeta Rica – Montería, el 22% UFI8: San Onofre – Cruz del Viso, el 17% UFI5: Puerto Rey - Montería, Santa Lucia - San Pelayo, el 13% UFI 1: Caucasia – Planeta Rica.


Figura 7. Servicio Ambulancia por Unidad Funcional.

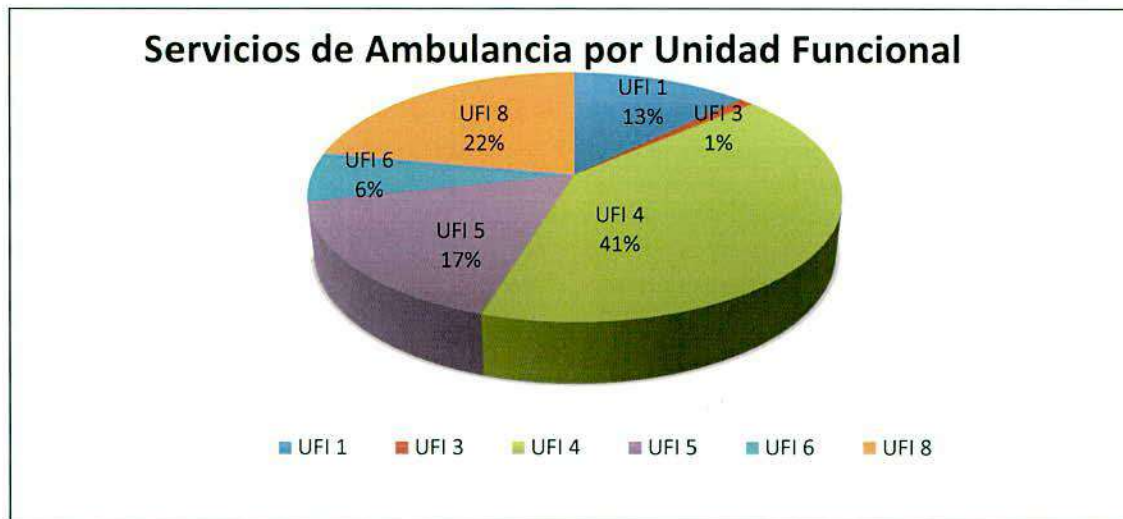

2.2.2 ACCIDENTALIDAD

La accidentalidad reportada en este mes aumento en un 35% respecto al mes anterior, pasando de 46 a 62 accidentes.

Figura 8. Accidentes Mes de octubre.

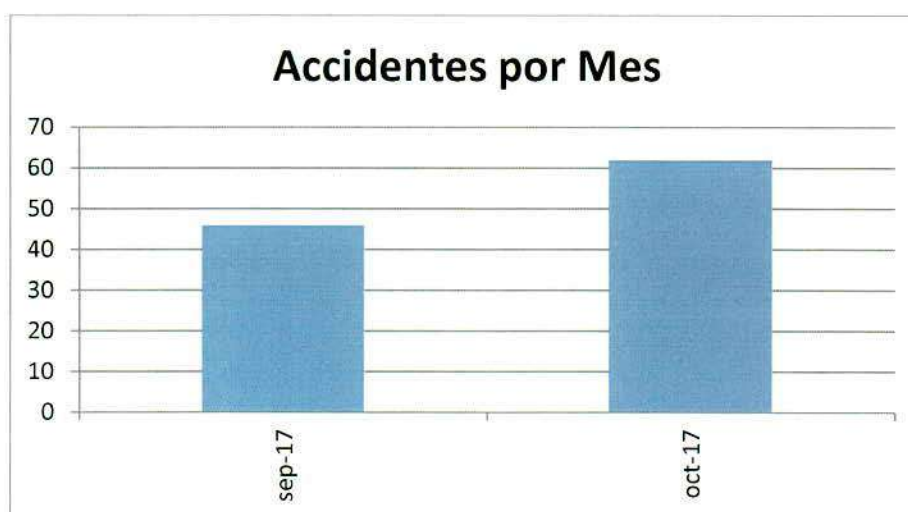



CONCESIÓN
Ruta al Mar

INFORME GERENCIAL MENSUAL OCTUBRE 2017

37

Con relación al mismo mes en el año anterior, se tiene que los accidentes atendidos del presente mes aumentan en un 170%, pasando de 23 a 62 accidentes.

Figura 8. Comportamiento respecto Año Anterior.


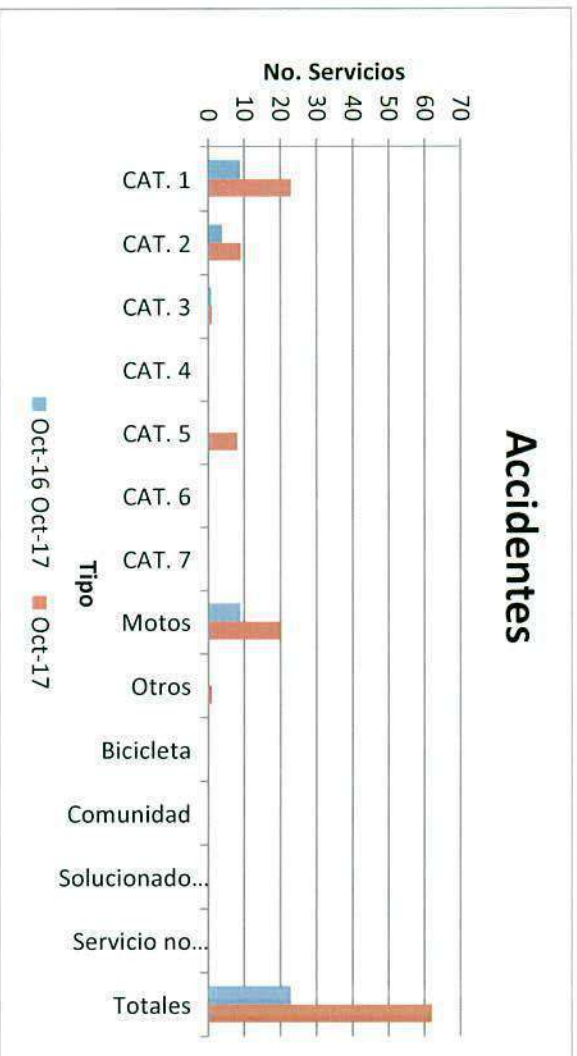


Figura 9. Accidentes año 2015-2016 y corrido del 2017

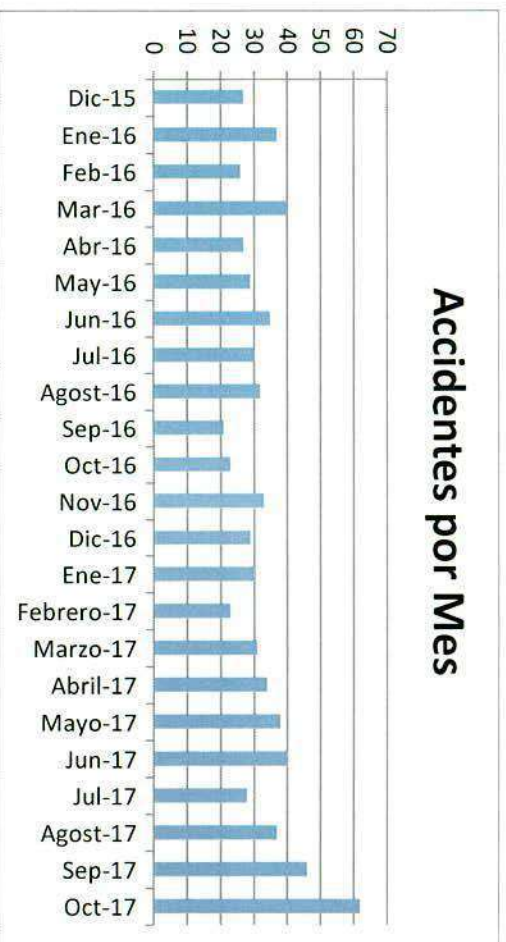

En la siguiente Tabla 29, se muestra accidentes por sector y categorías:

Tabla 29. Accidentes por UFI, Subsector y categorías

ACCIDENTALIDAD																
Unidad Funcional Integral	UFI 1		UFI 3		UFI 4		UFI 5		UFI 6			UFI 8				TOTALES
Subsector	1	2	4	1	1	2	1	2	3	1	2	3				
Categoría I	4	1	0	11	1	0	4	0	0	0	0	0	2		23	
Categoría II	1	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0	1	2		9	
Categoría III	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	
Categoría IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Categoría V	5	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0		8	
Categoría VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Categoría VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Motos	6	1	0	5	1	1	3	2	0	0	0	0	1		20	
Bicicleta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1	
Comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
TOTALES	17	2	0	18	3	1	11	3	0	0	0	1	6		62	

Tabla 30. Accidentes no encontrados por UFI y Subsector.


ACCIDENTALIDAD														
Unidad Funcional Integral	UFI 1		UFI 3		UFI 4		UFI 5		UFI 6			UFI 8		TOTALES
Subsector	1	2	4	1	1	2	1	2	3	1	2	3		
Servicio no encontrado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabla 31. Accidentes por Unidad Funcional y categorías.

Accidentalidad	UFI 1	UFI 3	UFI 4	UFI 5	UFI 6	UFI 8	TOTALES
Categoría I	4	1	11	1	4	2	23
Categoría II	1	0	2	0	3	3	9
Categoría III	1	0	0	0	0	0	1
Categoría IV	0	0	0	0	0	0	0
Categoría V	5	0	0	1	2	0	8
Categoría VI	0	0	0	0	0	0	0
Categoría VII	0	0	0	0	0	0	0
Motos	6	1	5	2	5	1	20
Otros	0	0	0	0	0	0	0
Bicicleta	0	0	0	0	0	1	1
Comunidad	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	17	2	18	4	14	7	62

Analizando la Tabla 31, la accidentalidad del mes de octubre por tipo de vehículos, se encontraron %, los vehículos de categoría I con el 37%, los motociclistas con el 32%, los vehículos de categoría II con el 14%, y los vehículos de categoría V con el 13%.

Figura 10. Accidentalidad mes por sector

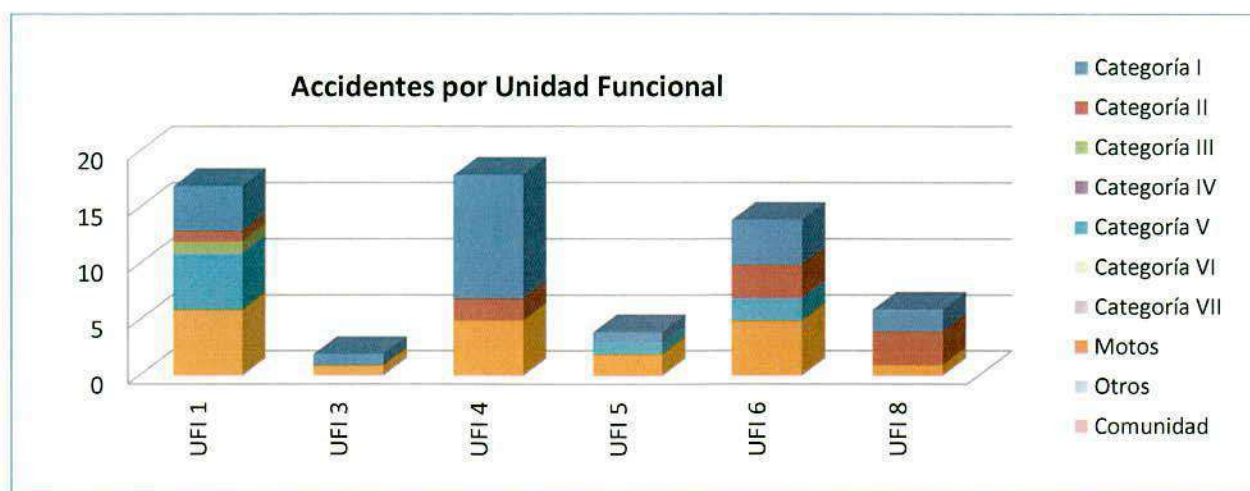


Con relación a la accidentalidad en Tabla 32, se muestra el comportamiento por cada una de las unidades funcionales.

Tabla 32. Accidentalidad por Ruta, Unidad Funcional y Subsector.

Total Accidentalidad por Unidad Funcional				
RUTA	UFI	SUBSECTOR	TRAMO	Total
2513	1	1	CAUCASIA - PLANETA RICA	17
-	3	2	EL 15 - SAN CARLOS	2
		4	SAN CARLOS - CERETE	0
2310	4	1	PLANETA RICA - MONTERÍA	18
7401	5	1	PUERTO REY - MONTERÍA	3
-		2	SANTA LUCIA - SAN PELAYO	1
2103	6	1	CERETE - LORICA	11
9004		2	LORICA - PORVENIR	3
		3	COVEÑAS - TOLÚ	0
	8	1	TOLÚ - TOLÚ VIEJO	0
2		PUEBLITO - SAN ONOFRE	1	
9005		3	SAN ONOFRE - CRUZ DEL VISO	6
Total general				62

Como se puede observar en la tabla 32, la mayor accidentalidad corresponde a la Unidad Funcional 4, subsector 1 (Planeta Rica – Montería) con 18 eventos, seguido de la Unidad funcional 1, subsector 1 (Caucasia – Planeta Rica) con 17 eventos, la Unidad Funcional 6, subsector 1 (Cerete – Lórica) con 11 eventos, la Unidad Funcional 8, subsector 3 (San Onofre – Cruz del Viso) con 6 eventos.

Figura 11. Accidentalidad por Unidad Funcional

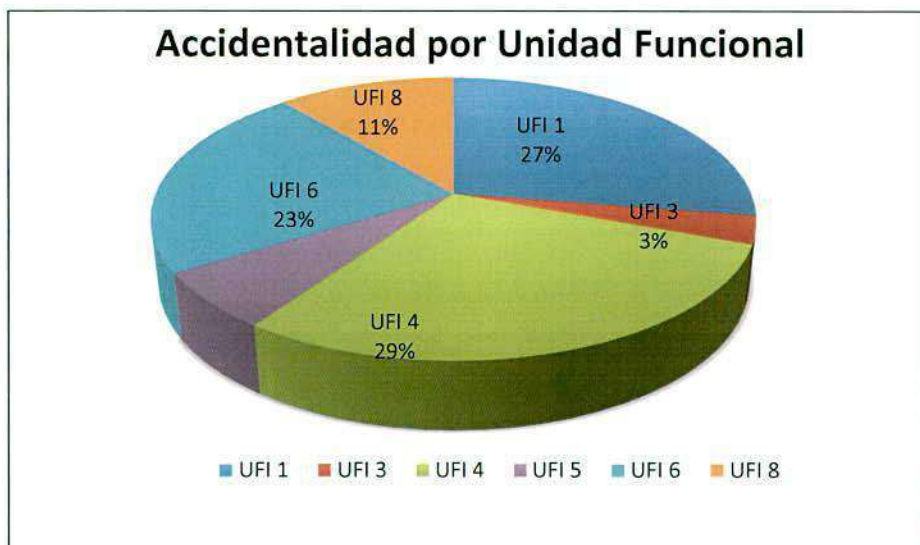

En cuanto a la accidentalidad, se observó y según la Figura 11, que la mayor accidentalidad, se presentó en la Unidad Funcional 4 con el 29%, la Unidad Funcional Integral 1 con 27%, la Unidad Funcional 6 con 23%.

Causas de la accidentalidad. En cuanto a las causas de accidentalidad que se presentaron para el mes de octubre, las más recurrentes se encuentran, Imprudencia del conductor con un 39%, Imprudencia en el Manejo con el 13%, Animal en la vía y Exceso de Velocidad con el 8%.

Tabla 33. Causas de Accidentalidad.

Causas de Accidentes	No. Accidentes	% Accidentes
Imprudencia del conductor	24	39%
Impericia en el Manejo	8	13%
Animal en la vía	5	8%
Desconocida	5	8%
Exceso de velocidad	4	6%
Cansancio	4	6%
Falla Mecánica	3	5%



CONCESIÓN
Ruta al Mar

INFORME GERENCIAL MENSUAL OCTUBRE 2017

42

Causas de Accidentes	No. Accidentes	% Accidentes
Imprudencia del peaton	3	5%
Invasion de carril	2	3%
Embriaguez del conductor	2	3%
Factor Climatico	1	2%
Imprudencia de un Tercero	1	2%
Total	62	100%

Figura 12. Causas de Accidentalidad.



2.2.3 MORTALIDAD.

En el mes de octubre se presentó seis (6) víctima mortal aumentando en un 50% respecto al mes anterior, pasando de 4 a 6, a causa de accidentes de tránsito en nuestro corredor vial, las posibles causas de los accidentes se deben a Imprudencia del Conductor, Embriaguez del Conductor y Falla Mecánica; con respecto a los anteriores meses el mes de mayo de 2017, es el mes con mayor número de víctimas mortales (7), desde Diciembre de 2015.

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.

Contiguo a la planta de Bavaria.


Montería - Córdoba

Tabla 34. Víctima mortal en las vías concesionadas mes de octubre

	VICTIMAS	FEMENINO	MASCULINO	PROMEDIO EDADES
N° MUERTOS	6	1	5	25
N° HERIDOS GRAVES	11	8	3	27
N° HERIDOS LEVES	57	45	12	33
TOTALES	74	54	20	28

Figura 13. Mortalidad del 2015 – 2016 y corrido del 2017.

MORTALIDAD

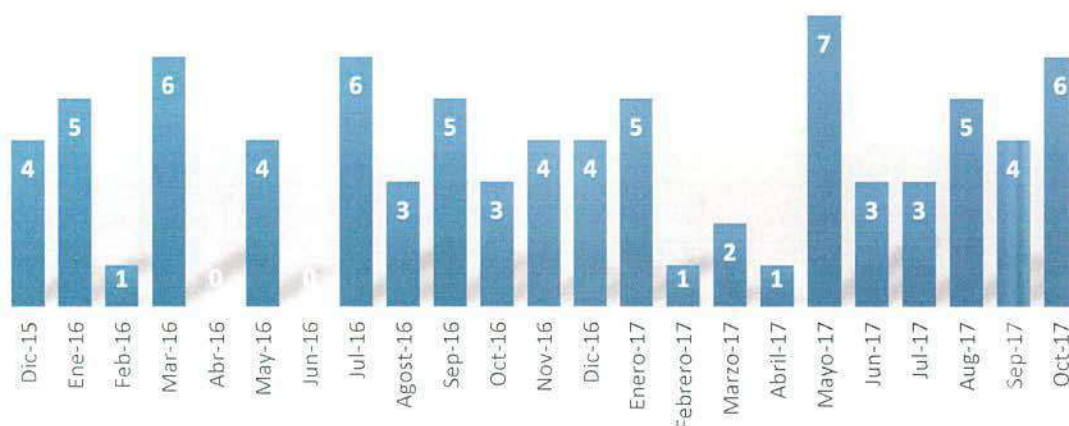

2.2.4 ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD ACUMULADA.

La concesión ha recopilado registros de la accidentalidad desde el mes de diciembre de 2015, hasta el mes del presente informe, con el fin de mantener un registro estadístico de los sitios de mayor riesgo para los usuarios de las vías:




CONCESIÓN
Ruta al Mar

INFORME GERENCIAL MENSUAL


OCTUBRE 2017

44


CAUCASIA - PLANETA RICA, RUTA 2513

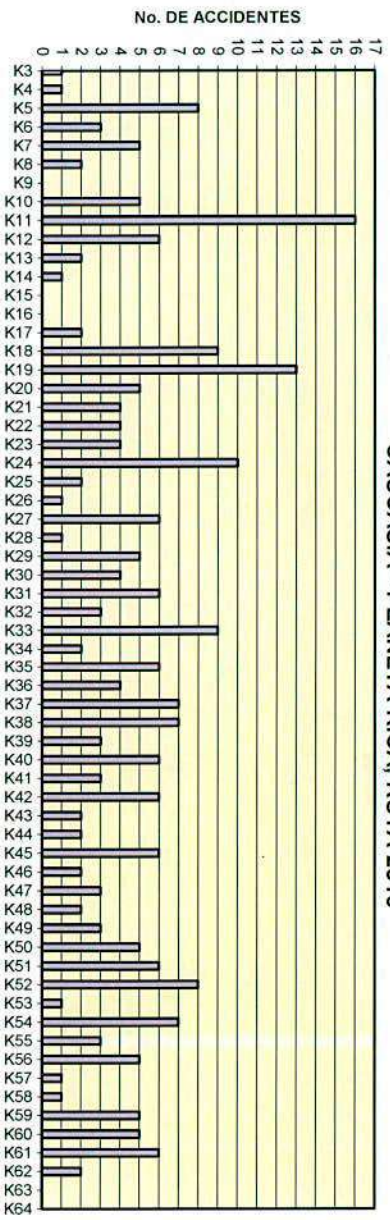

PLANETA RICA - MONTERÍA, RUTA 2310

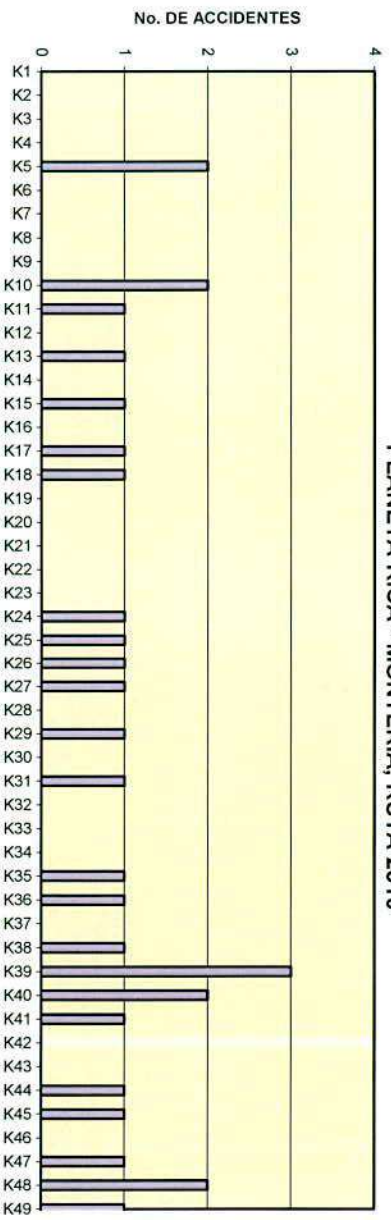

PUERTO REY - MONTERÍA, RUTA 7401

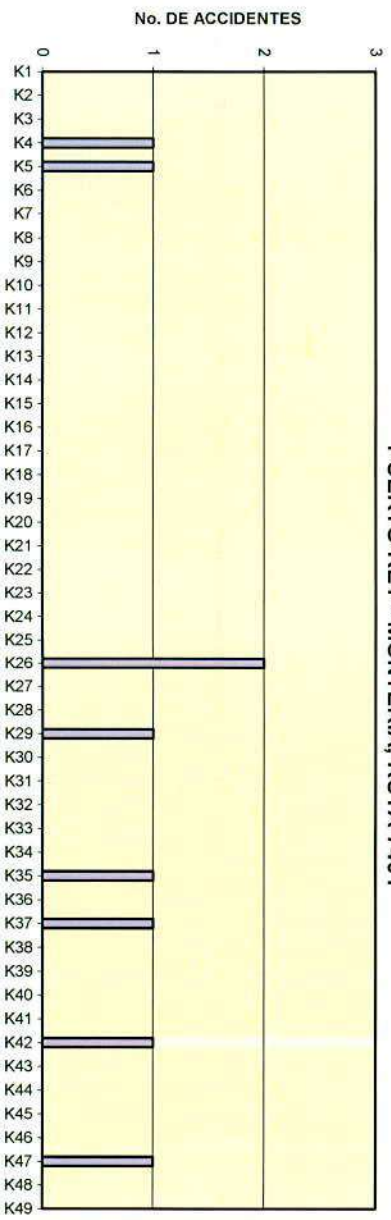

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería - Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba




CONCESIÓN
Ruta al Mar

INFORME GERENCIAL MENSUAL


OCTUBRE 2017

43


CERETE - LORICA RUTA 2103

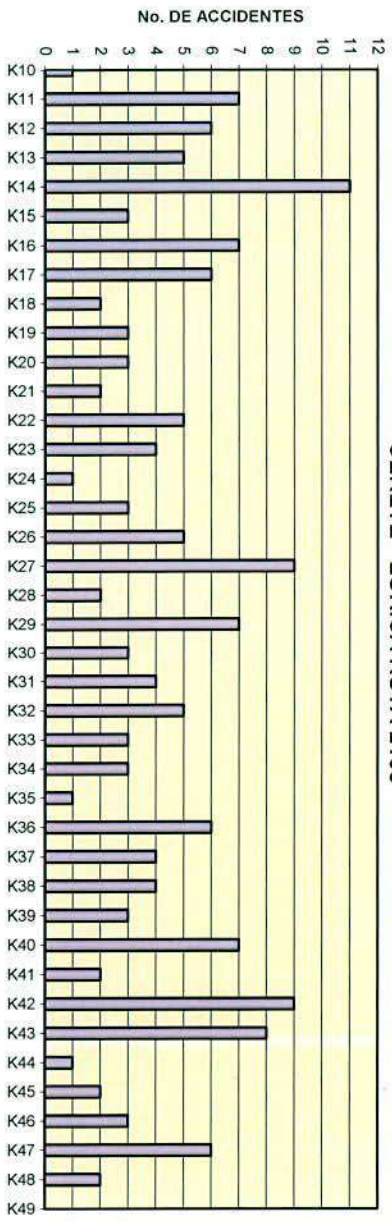

LORICA-SAN ONOFRE RUTA 9004

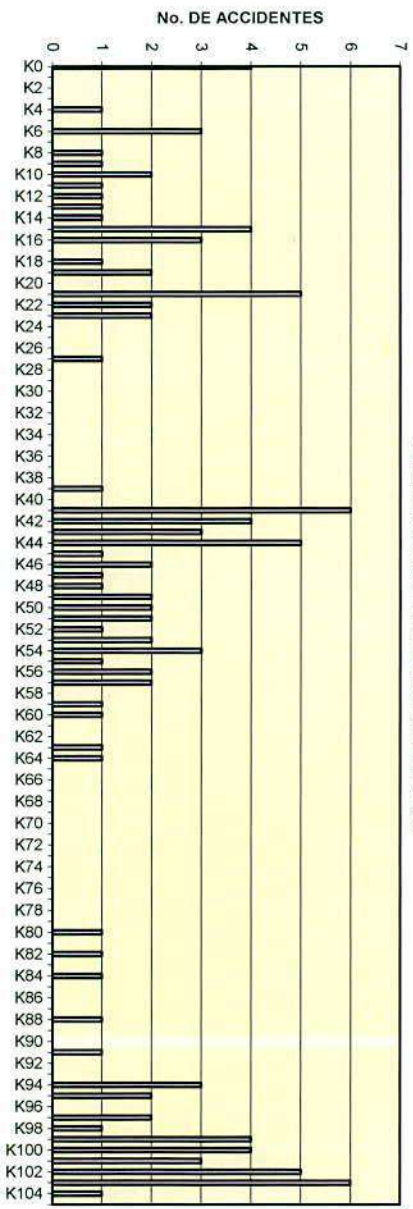

SAN ONOFRE - CRUZ DEL VISO RUTA 9005

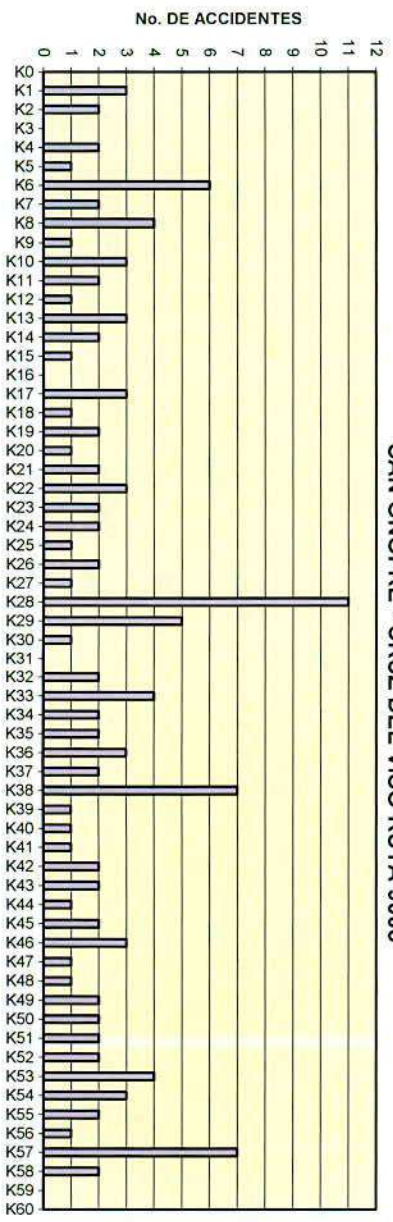

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.

Contiguo a la planta de Bavaria.

Montería - Córdoba

2.2.5 SERVICIO DE GRÚAS

2.2.5.1 SERVICIO DE GRÚAS DE PLATAFORMA

En cuanto a los análisis de los resultados del servicio de grúas prestado este mes tenemos: que el 27% de los servicios se realizan en la Unidad Funcional 5 (Puerto Rey – Montería, Santa Lucía- San Pelayo), la Unidad Funcional 4 (Planeta Rica – Montería) con el 26%, seguido de la Unidad Funcional 6 Cerete – Tolú con el 18%, la Unidades Funcional 1 (Caucasia – Planeta Rica) con un 17% y la Unidad Funcional 8 (Tolú – Cruz del viso) con un 10%.


Tabla 35. Servicio de Grúa de Plataforma por Ruta, Unidad Funcional y Subsector.

Total Servicios de Grúas Plataforma por Unidad Funcional				
RUTA	UFI	SUBSECTOR	TRAMO	Total
2513	1	1	CAUCASIA - PLANETA RICA	32
-	3	2	EL 15 - SAN CARLOS	1
		4	SAN CARLOS - CERETE	2
2310	4	1	PLANETA RICA - MONTERÍA	49
7401	5	1	PUERTO REY - MONTERÍA	48
-		2	SANTA LUCIA - SAN PELAYO	3
2103	6	1	CERETE - LORICA	25
9004		2	LORICA - PORVENIR	7
		3	COVEÑAS - TOLÚ	1
	8	1	TOLÚ - TOLÚ VIEJO	2
2		PUEBLITO - SAN ONOFRE	2	
9005		3	SAN ONOFRE - CRUZ DEL VISO	14
Total general				186

Tabla 36. Total Servicios de Grúas Plataforma por Unidad Funcional

Total Servicios de Grúas Plataforma por Unidad Funcional		
UFI	TRAMO	Total
UFI 1	CAUCASIA - PLANETA RICA	32
UFI 3	EL 15 - SAN CARLOS-CERETE	3
UFI 4	PLANETA RICA - MONTERÍA	49
UFI 5	PUERTO REY - MONTERÍA, SANTA LUCIA - SAN PELAYO	51
UFI 6	CERETE - TOLÚ	33
UFI 8	TOLÚ - CRUZ DEL VISO	18
Total general		186

Figura 12. Servicio de Grúa de Plataforma por Unidad Funcional.

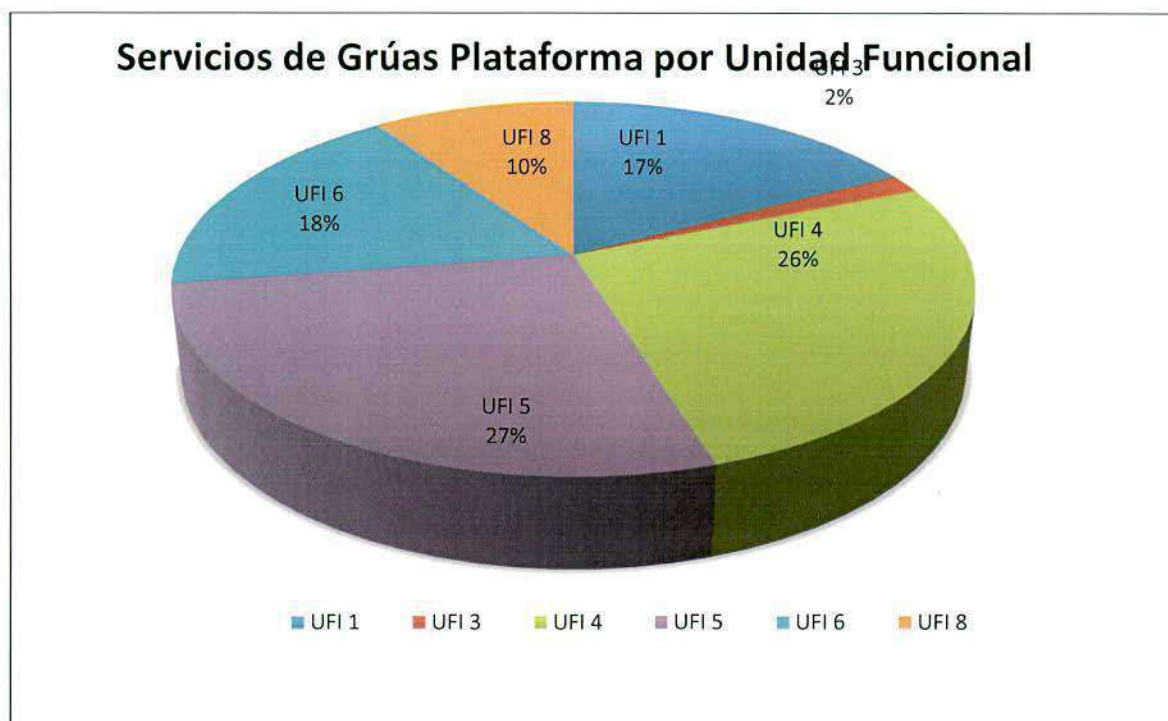

De los servicios prestados por las Grúas de Plataforma, el 92% corresponden a vehículos tipo camioneta, automóviles y camperos Categoría I, le sigue con el 5% la Categoría II que son buses, camiones y busetas.


Tabla 37. Servicios de Grúas por sector y categorías

Servicios de Grúas Plataforma													
Unidad Funcional Integral	UFI 1	UFI 3		UFI 4	UFI 5		UFI 6			UFI 8			TOTALES
Subsector	1	2	4	1	1	2	1	2	3	1	2	3	
Categoría I	28	1	2	46	46	2	21	6	1	2	2	14	171
Categoría II	2	0	0	1	2	0	3	1	0	0	0	0	9
Categoría III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoría IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoría V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoría VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoría VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motos	2	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	6
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solucionado por usuario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	32	1	2	49	48	3	25	7	1	2	2	14	186

Tabla 38. Servicios de Grúas Plataforma no encontrados

Servicios de Grúas Plataforma no encontrados													
Unidad Funcional Integral	UFI 1	UFI 3		UFI 4	UFI 5		UFI 6			UFI 8			TOTALES
Subsector	1	2	4	1	1	2	1	2	3	1	2	3	
Servicio no encontrado	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3

Figura 13. Servicio de Grúa por Categorías.

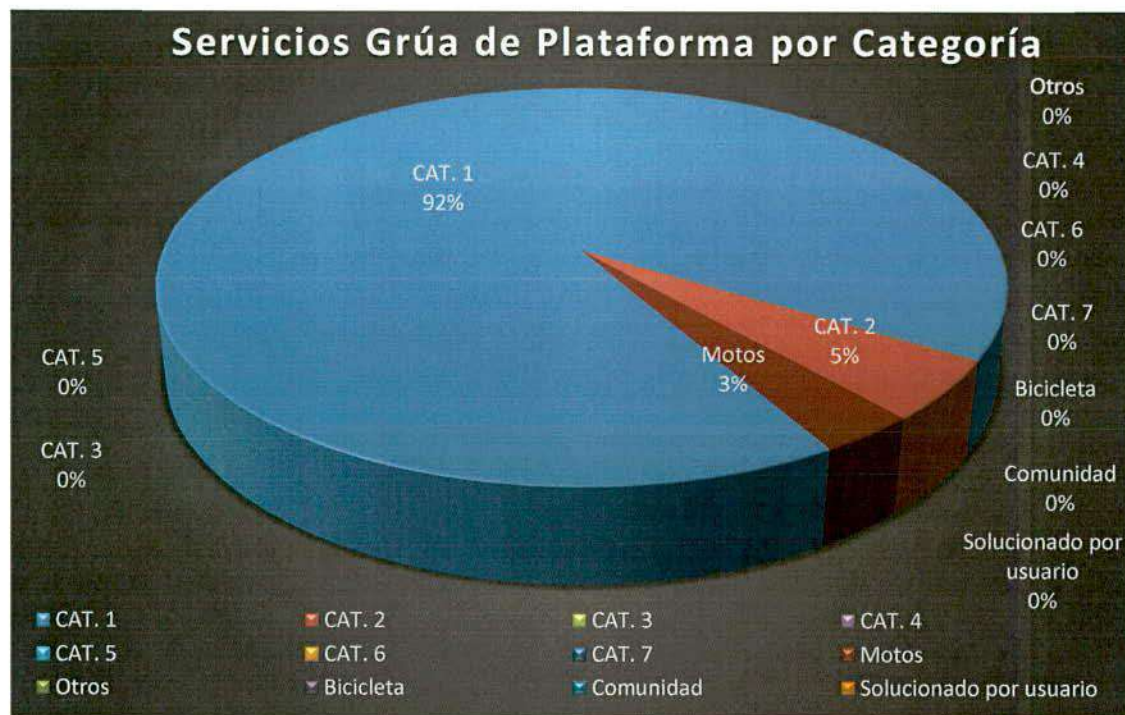

2.2.5.2 SERVICIO DE GRÚAS DE GANCHO

En cuanto a los análisis de los resultados del servicio de grúas de gancho prestado este mes tenemos: que el 30% de los servicios se realizaron en la Unidad Funcional 1 (Caucasia-Planeta Rica) seguido de la Unidad Funcional 5 (Puerto Rey – Montería – Santa Lucía – San Pelayo) con el 23%, la Unidad Funcional 8 Tolú – Cruz del Viso con el 19%, la Unidad Funcional 6, Cerete – Tolú con el 17% y la Unidad Funcional 4 (Planeta Rica – Montería) con el 10%.


Tabla 39. Total Servicios de Grúas Gancho por Ruta, Unidad Funcional y Subsector.

Total Servicios de Grúas Gancho por Unidad Funcional				
RUTA	UFI	SUBSECTOR	TRAMO	Total
2513	1	1	CAUCASIA - PLANETA RICA	29
-	3	2	EL 15 - SAN CARLOS	1
		4	SAN CARLOS - CERETE	0
2310	4	1	PLANETA RICA - MONTERÍA	10
7401	5	1	PUERTO REY - MONTERÍA	23
-		2	SANTA LUCIA - SAN PELAYO	0
2103	6	1	CERETE - LORICA	12
9004		2	LORICA - PORVENIR	5
		3	COVEÑAS - TOLÚ	0
	8	1	TOLÚ - TOLÚ VIEJO	0
2		PUEBLITO - SAN ONOFRE	2	
9005		3	SAN ONOFRE - CRUZ DEL VISO	17
Total general				99

Tabla 40. Total Servicios de Grúas Gancho por Unidad Funcional

Total Servicios de Grúas Gancho por Unidad Funcional		
UFI	TRAMO	Total
UFI 1	CAUCASIA - PLANETA RICA	29
UFI 3	EL 15 - SAN CARLOS-CERETE	1
UFI 4	PLANETA RICA - MONTERÍA	10
UFI 5	PUERTO REY - MONTERÍA, SANTA LUCIA - SAN PELAYO	23
UFI 6	CERETE - TOLÚ	17
UFI 8	TOLÚ - CRUZ DEL VISO	19
Total general		99

Figura 14. Servicio de Grúa de Gancho por Unidad Funcional.

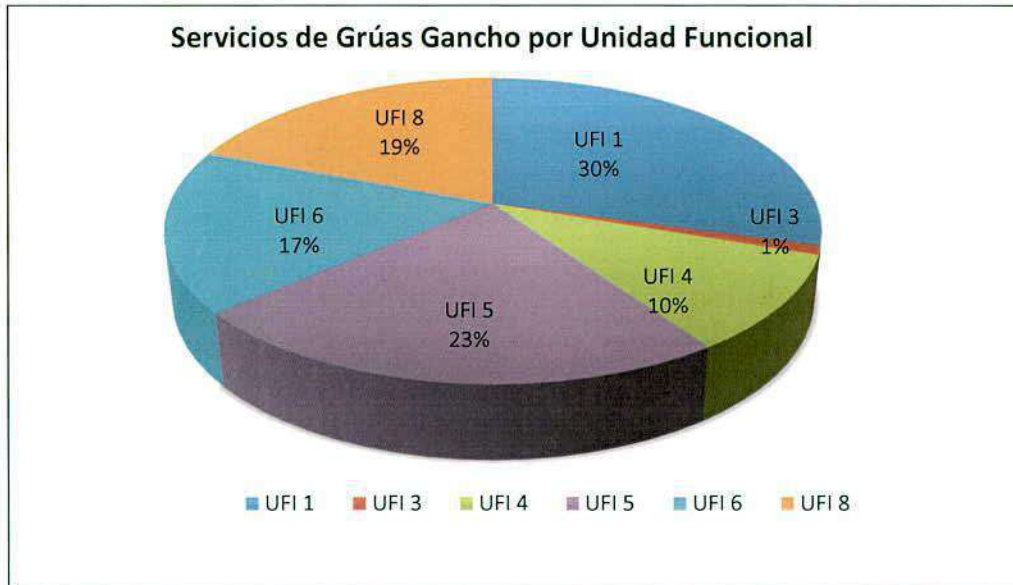

De los servicios prestados por las Grúas de Gancho, el 79% corresponden a vehículos Categoría II que son buses, camiones y busetas, seguido los vehículos de Categoría V con el 10%, seguidos los de Categoría I con el 5%, y los vehículos de categoría III con el 4%.

Tabla 41. Servicios de Grúas de gancho por sector y categorías

Servicios de Grúas Gancho															
Unidad Funcional Integral	UFI 1		UFI 3		UFI 4	UFI 5		UFI 6			UFI 8				TOTALES
Subsector	1	2	4	1	1	2	1	2	3	1	2	3			
Categoría I	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
Categoría II	20	0	0	10	18	0	10	3	0	0	2	15	78		
Categoría III	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	4		
Categoría IV	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		

Servicios de Grúas Gancho													
Unidad Funcional Integral	UFI 1	UFI 3		UFI 4	UFI 5		UFI 6			UFI 8			TOTALES
Subsector	1	2	4	1	1	2	1	2	3	1	2	3	
Categoría V	7	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	10
Categoría VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoría VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solucionado por usuario	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTALES	29	1	0	10	23	0	12	5	0	0	2	17	99

Tabla 42. Servicios de Grúas Gancho no encontrados

Servicios de Grúas Gancho no encontrados													
Unidad Funcional Integral	UFI 1	UFI 3		UFI 4	UFI 5		UFI 6			UFI 8			TOTALES
Subsector	1	2	4	1	1	2	1	2	3	1	2	3	
Servicio no encontrado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

Figura 15. Servicio de Grúa por Categorías.



Con relación al mes anterior, se tiene que los servicios de Grúas prestados por la Concesión se mantienen en 289 servicios.

Figura 16. Servicio de Grúas.



Con relación al mismo mes en el año anterior, se tiene que los servicios del presente mes aumentaron en un 86%, pasando de 155 a 289 servicios.

Figura 6. Comportamiento respecto Año Anterior.



2.2.6 SERVICIO MECÁNICO (CARRO TALLER)

En cuanto a los análisis de los resultados del servicio de ayudas mecánicas prestadas este mes de octubre, tenemos que; el 26% de los servicios se realizaron en la Unidad Funcional 1, (Caucasia – Planeta Rica), seguido de la Unidad Funcional 8, (Tolú – Cruz del Viso), con un 24%, la Unidad Funcional 6 (Cerete – Lorica) con el 20%, la Unidad Funcional 5 (Puerto Rey – Montería – Santa Lucía San Pelayo) con el 19% y la Unidad Funcional 4, (Planeta Rica - Montería) con un 10%.


Tabla 43. Atención mecánica por Ruta, Unidad Funcional y Subsector.

Total Ayudas Mecánicas por Unidad Funcional				
RUTA	UFI	SUBSECTOR	TRAMO	Total
2513	1	1	CAUCASIA - PLANETA RICA	47
-	3	2	EL 15 - SAN CARLOS	0
		4	SAN CARLOS - CERETE	1
2310	4	1	PLANETA RICA - MONTERÍA	19
7401	5	1	PUERTO REY - MONTERÍA	30
-		2	SANTA LUCIA - SAN PELAYO	5
2103	6	1	CERETE - LORICA	29
9004		2	LORICA - PORVENIR	7
		3	COVEÑAS - TOLÚ	1
	8	1	TOLÚ - TOLÚ VIEJO	1
2		PUEBLITO - SAN ONOFRE	2	
9005		3	SAN ONOFRE - CRUZ DEL VISO	42
Total general				184

Tabla 44. Total Ayudas Mecánicas por Unidad Funcional

Total Ayudas Mecánicas por Unidad Funcional		
UFI	TRAMO	Total
UFI 1	CAUCASIA - PLANETA RICA	47
UFI 3	EL 15 - SAN CARLOS-CERETE	1
UFI 4	PLANETA RICA - MONTERÍA	19
UFI 5	PUERTO REY - MONTERÍA, SANTA LUCIA - SAN PELAYO	35
UFI 6	CERETE - TOLÚ	37
UFI 8	TOLÚ - CRUZ DEL VISO	45
Total general		184

Figura 17. Atención mecánica por Unidad Funcional

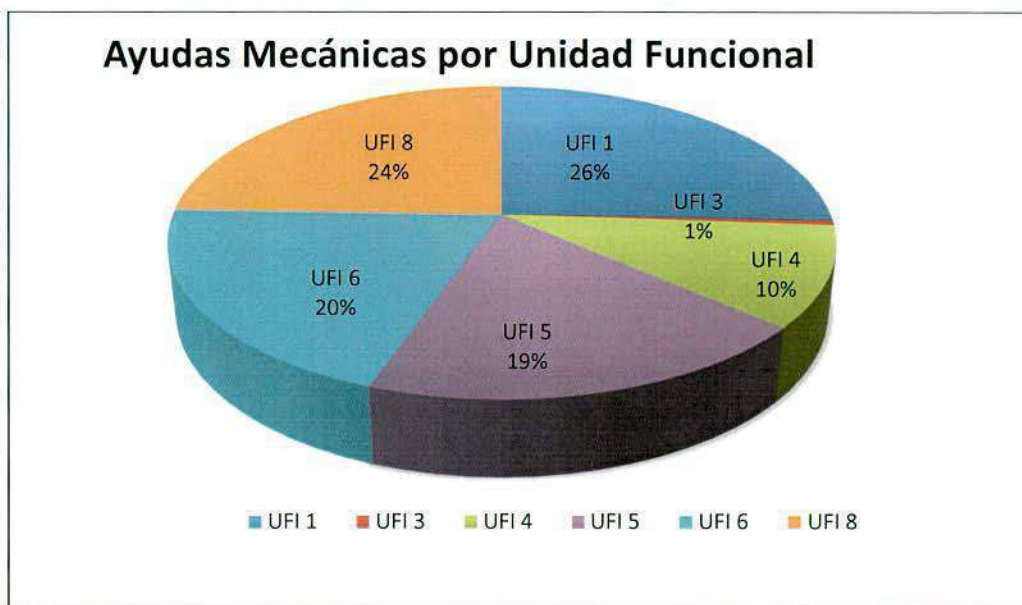

En cuanto a los análisis de los resultados de las ayuda mecánicas prestadas en el período, se tiene que el 47% de las ayudas mecánicas se realizaron a vehículos de Categoría I, el 38% para los vehículos de Categoría II, el 11% a vehículos de Categoría V.

Tabla 45. Servicios de Ayudas Mecánicas por sector y categorías

Ayudas Mecánicas														
Unidad Funcional Integral	UFI 1		UFI 3		UFI 4	UFI 5		UFI 6			UFI 8			TOTALES
Subsector	1	2	4	1	1	2	1	2	3	1	2	3		
Categoría I	21	0	1	12	18	3	13	5	0	1	1	12	87	
Categoría II	14	0	0	7	11	1	12	2	1	0	1	21	70	
Categoría III	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Categoría IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Categoría V	9	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	9	20	
Categoría VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Categoría VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Motos	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	6	
Bicicleta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Solucionado por usuario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALES	47	0	1	19	30	5	29	7	1	1	2	42	184	

Tabla 46. Ayudas Mecánicas no encontrados


Ayudas Mecánicas no encontrados														
Unidad Funcional Integral	UFI 1		UFI 3		UFI 4		UFI 5		UFI 6			UFI 8		TOTALES
Subsector	1	2	4	1	1	2	1	2	3	1	2	3		
Servicio no encontrado	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	8	

Tabla 47. Ayudas Mecánicas por UFI

Ayudas Mecánicas	UFI 1	UFI 3	UFI 4	UFI 5	UFI 6	UFI 8	TOTALES
Categoría I	21	1	12	21	18	14	87
Categoría II	14	0	7	12	15	22	70
Categoría III	1	0	0	0	0	0	1
Categoría IV	0	0	0	0	0	0	0
Categoría V	9	0	0	0	2	9	20
Categoría VI	0	0	0	0	0	0	0
Categoría VII	0	0	0	0	0	0	0
Motos	2	0	0	2	2	0	6
Otros	0	0	0	0	0	0	0
Bicicleta	0	0	0	0	0	0	0
Comunidad	0	0	0	0	0	0	0
Solucionado por usuario	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	47	1	19	35	37	45	184

Con relación al mes anterior, se tiene que los servicios de Ayudas Mecánicas prestados por la Concesión aumentaron en un 8%, pasando de 178 a 192 servicios.

Figura 18. Atención mecánica.

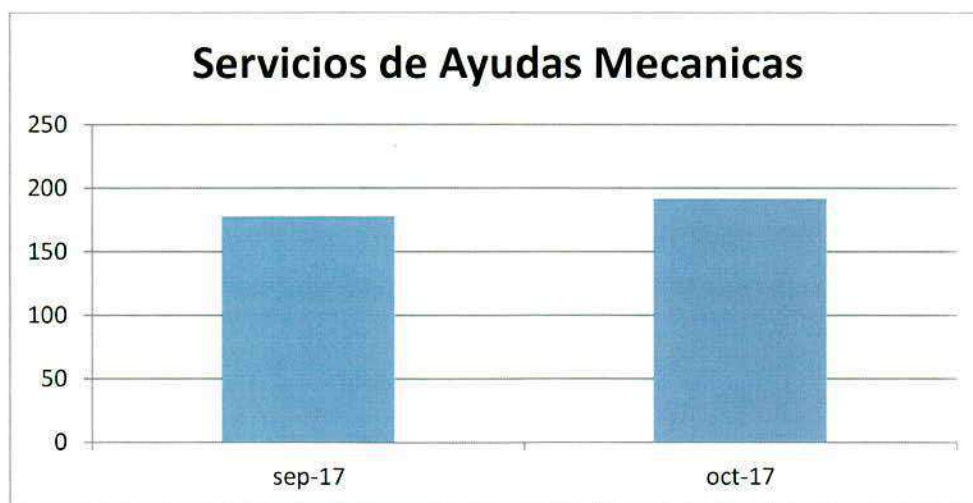




CONCESIÓN
Ruta al Mar

INFORME GERENCIAL MENSUAL OCTUBRE 2017

58

Con relación al mismo mes en el año anterior, se tiene que los servicios del presente mes aumentaron en un 96%, pasando de 91 a 178 servicios.

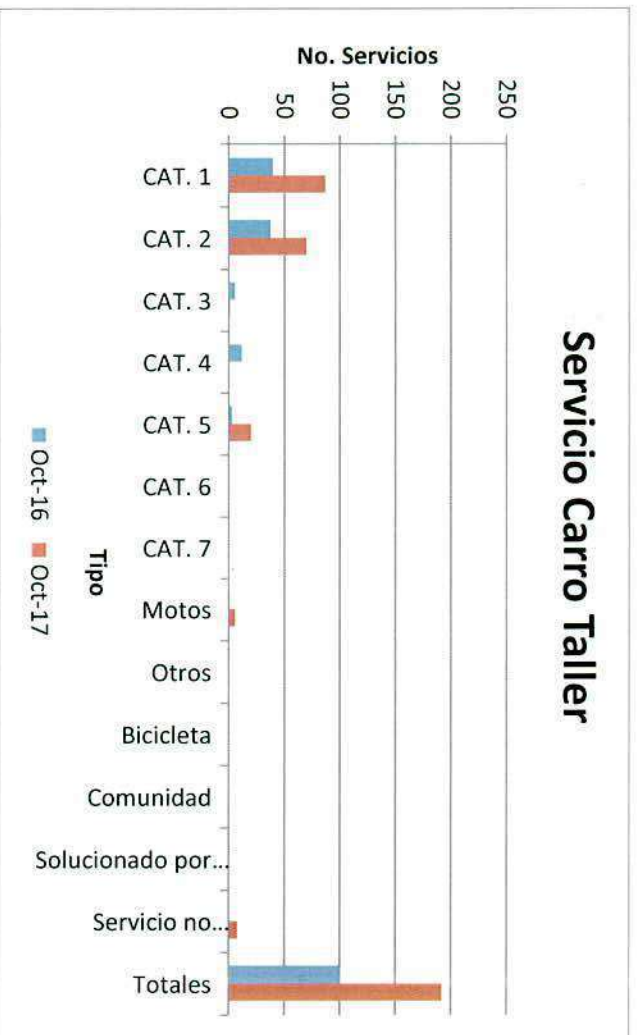

2.3 REGISTRO DE EVENTOS, NOVEDADES E INCIDENTES

2.3.1 INCIDENTES EN EL MES DE OCTUBRE

Durante el mes de Octubre se presentaron los siguientes incidentes en la vía a lo largo de la concesión.

FECHA	RADIO OPERADOR EN TURNO E INSPECTOR	PR	SECTOR	TIPO DE EVENTO	HORA REPORTE	HORA LLEGADA	HORA FINAL	OBSERVACIONES
03/10/2017	Y.MORENO-J.QUEVEDO	49+700	9004	ARBOL CAIDO	18:45	18:50	20:10	ARBOLES EN VIA

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.

Contiguo a la planta de Bavaria.

Montería - Córdoba

FECHA	RADIO OPERADOR EN TURNO E INSPECTOR	PR	SECTOR	TIPO DE EVENTO	HORA REPORTE	HORA LLEGADA	HORA FINAL	OBSERVACIONES
10/10/2017	E.MADRID-M.NAVARRO	53+600	7401	ARBOL CAIDO	07:45	07:52	08:45	ARBOLES EN VIA
19/10/2017	A.DONADO-L.CAUSIL	31+450	2310	ARBOL CAIDO	08:00	08:10	9:15	ARBOLES EN VIA

RUTA	PR 06+750	FECHA
9005	ARBOL CAIDO	06/09/017
 		

RUTA	PR 06+750	FECHA
9005	ARBOL CAIDO	06/09/017
		

2.3.2 NOVEDADES EN EL MES DE OCTUBRE

Durante el mes de Octubre se presento la siguiente novedad en la vía a lo largo de la concesión.

FECHA	RADIO OPERADOR DE TURNO E INSPECTOR	PR	SECTOR	TIPO DE EVENTO	HORA REPORTE	HORA LLEGADA	HORA FINAL	OBSERVACIONES
3/10/2017	J.QUEVEDO-J.RUIZ	12+450	9005	BLOQUEO	17:15	17:15	19:30	BLOQUEO
06/10/2017	J.QUEVEDO-J.MUÑOZ	19+100	9005	BLOQUEO	19:00	19:04	22:30	BLOQUEO
10/10/2017	L.CAUSIL/J.MUÑOZ	29+000	9005	BLOQUEO	02:35	02:45	4:30	BLOQUEO
14/10/2017	M.NAVARRO-J.RUIZ	32+200	9005	BLOQUEO	03:00	03:08	08:00	BLOQUEO
18/10/2017	M.NAVARRO-Y.MORENO	11+500	9004	BLOQUEO	18:45	18:55	20:00	BLOQUEO

21/10/2017	M.NAVARRO- J.RUIZ	23+000	9005	BLOQUEO	19:00	19:10	21:00	BLOQUEO
29/10/2017	M.NAVARRO- Y.MORENO	42+500	9004	BLOQUEO	19:00	19:15	20:00	BLOQUEO

NOVEDADES EN LA VIA OCTUBRE 2017

RUTA	PR 23+000	FECHA
9005	BLOQUEO	03-10-2017
		

RUTA	PR 19+100	FECHA
9005	BLOQUEO	21-10-2017
18/10/2017 Ruta 90-04   21.10.2017 19:09		
 21.10.2017 19:10  21.10.2017 19:10		

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

2.3.3 TRANSPORTES ESPECIALES

Durante el mes de octubre se recibió una solicitud de permiso de transporte de cargas extra dimensionadas y/o extra pesadas y/o peligrosas para transitar en las vías de la Concesión Ruta al Mar S.A.S, de la empresa, TRANSPORTES MASA LTDA, El Concesionario emitió concepto técnico favorable, recalcando la importancia de dar cumplimiento a las indicaciones y recomendaciones contenidas en el Plan de Seguridad Vial y Manejo de Tránsito presentado por el peticionario

3. MANTENIMIENTO

3.1 ACTUACIONES SOBRE ELEMENTOS FÍSICOS DEL SISTEMA VIAL

Se realizaron actividades de parcheo técnico en la UF 8.2 El Pueblito -San Onofre y UF 8.3 San Onofre – Cruz el Viso.

Se adjunta al informe el listado de las intervenciones con abscisa inicial y final.

Fecha	UF	Abscisa inicial	Abscisa Final	Descripción
05-oct-17	8.2	K 101+090.0	K 101+097.2	Parcheo Técnico
05-oct-17	8.2	K 101+120.0	K 101+123.7	Parcheo Técnico
05-oct-17	8.2	K 101+150.0	K 101+154.7	Parcheo Técnico
05-oct-17	8.2	K 101+180.0	K 101+191.2	Parcheo Técnico
05-oct-17	8.2	K 101+200.0	K 101+206.9	Parcheo Técnico
05-oct-17	8.2	K 101+210.0	K 101+215.8	Parcheo Técnico
06-oct-17	8.2	K 101+050.0	K 101+057.1	Parcheo Técnico
06-oct-17	8.2	K 101+210.0	K 101+213.7	Parcheo Técnico
06-oct-17	8.2	K 101+230.0	K 101+234.4	Parcheo Técnico
06-oct-17	8.2	K 101+250.0	K 101+254.8	Parcheo Técnico
06-oct-17	8.2	K 101+280.0	K 101+285.1	Parcheo Técnico
06-oct-17	8.2	K 101+300.0	K 101+304.9	Parcheo Técnico
06-oct-17	8.2	K 101+320.0	K 101+333.3	Parcheo Técnico
06-oct-17	8.2	K 101+330.0	K 101+336.8	Parcheo Técnico

Fecha	UF	Abscisa inicial	Abscisa Final	Descripción
06-oct-17	8.2	K 101+350.0	K 101+354.2	Parcheo Técnico
06-oct-17	8.2	K 101+380.0	K 101+385.9	Parcheo Técnico
06-oct-17	8.2	K 101+400.0	K 101+405.4	Parcheo Técnico
06-oct-17	8.2	K 101+410.0	K 101+413.4	Parcheo Técnico
07-oct-17	8.2	K 100+350.0	K 100+354.8	Parcheo Técnico
07-oct-17	8.2	K 100+370.0	K 100+377.5	Parcheo Técnico
07-oct-17	8.2	K 100+400.0	K 100+403.6	Parcheo Técnico
07-oct-17	8.2	K 100+410.0	K 100+416.6	Parcheo Técnico
07-oct-17	8.2	K 100+440.0	K 100+444.1	Parcheo Técnico
07-oct-17	8.2	K 100+495.0	K 100+501.8	Parcheo Técnico
08-oct-17	8.2	K 100+620.0	K 100+651.9	Parcheo Técnico
08-oct-17	8.2	K 100+890.0	K 100+907.0	Parcheo Técnico
09-oct-17	8.2	K 101+110.0	K 101+114.5	Parcheo Técnico
09-oct-17	8.2	K 101+130.0	K 101+135.9	Parcheo Técnico
09-oct-17	8.2	K 101+150.0	K 101+154.1	Parcheo Técnico
09-oct-17	8.2	K 101+160.0	K 101+166.1	Parcheo Técnico
09-oct-17	8.2	K 101+175.0	K 101+183.3	Parcheo Técnico
09-oct-17	8.2	K 101+190.0	K 101+195.2	Parcheo Técnico
09-oct-17	8.2	K 101+220.0	K 101+223.0	Parcheo Técnico
09-oct-17	8.2	K 101+235.0	K 101+240.5	Parcheo Técnico
09-oct-17	8.2	K 101+250.0	K 101+258.5	Parcheo Técnico
09-oct-17	8.2	K 101+270.0	K 101+274.2	Parcheo Técnico
09-oct-17	8.2	K 101+300.0	K 101+305.3	Parcheo Técnico
09-oct-17	8.2	K 101+320.0	K 101+326.3	Parcheo Técnico
10-oct-17	8.2	K 101+670.0	K 101+679.7	Parcheo Técnico
10-oct-17	8.2	K 101+680.0	K 101+683.6	Parcheo Técnico
10-oct-17	8.2	K 101+700.0	K 101+704.6	Parcheo Técnico
10-oct-17	8.2	K 101+712.0	K 101+719.3	Parcheo Técnico
10-oct-17	8.2	K 101+725.0	K 101+733.6	Parcheo Técnico
10-oct-17	8.2	K 101+740.0	K 101+743.8	Parcheo Técnico
10-oct-17	8.2	K 101+790.0	K 101+803.0	Parcheo Técnico
11-oct-17	8.2	K 101+810.0	K 101+823.2	Parcheo Técnico
11-oct-17	8.2	K 101+830.0	K 101+847.6	Parcheo Técnico
12-oct-17	8.2	K 101+850.0	K 101+859.3	Parcheo Técnico
12-oct-17	8.2	K 101+890.0	K 101+894.3	Parcheo Técnico
12-oct-17	8.2	K 101+910.0	K 101+927.0	Parcheo Técnico
12-oct-17	8.2	K 101+955.0	K 101+958.2	Parcheo Técnico

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UF	Abscisa inicial	Abscisa Final	Descripción
13-oct-17	8.2	K 101+740.0	K 101+756.4	Parcheo Técnico
13-oct-17	8.2	K 101+760.0	K 101+770.0	Parcheo Técnico
13-oct-17	8.2	K 101+800.0	K 101+806.2	Parcheo Técnico
13-oct-17	8.2	K 101+820.0	K 101+831.4	Parcheo Técnico
17-oct-17	8.2	K 101+800.0	K 101+812.4	Parcheo Técnico
17-oct-17	8.2	K 101+900.0	K 101+916.2	Parcheo Técnico
18-oct-17	8.2	K 101+900.0	K 101+903.2	Parcheo Técnico
18-oct-17	8.2	K 102+000.0	K 102+018.6	Parcheo Técnico
20-oct-17	8.2	K 101+900.0	K 101+910.0	Parcheo Técnico
20-oct-17	8.2	K 102+100.0	K 102+109.8	Parcheo Técnico
20-oct-17	8.2	K 102+200.0	K 102+218.5	Parcheo Técnico
21-oct-17	8.2	K 94+800.0	K 94+806.5	Parcheo Técnico
21-oct-17	8.2	K 94+840.0	K 94+850.0	Parcheo Técnico
21-oct-17	8.2	K 95+000.0	K 95+003.6	Parcheo Técnico
23-oct-17	8.2	K 95+500.0	K 95+519.2	Parcheo Técnico
23-oct-17	8.3	K 52+200.0	K 53+000.0	Parcheo Técnico
23-oct-17	8.3	K 52+600.0	K 52+800.0	Parcheo Técnico
26-oct-17	8.3	K 0+100.0	K 0+104.7	Parcheo Técnico
26-oct-17	8.3	K 0+120.0	K 0+134.5	Parcheo Técnico
26-oct-17	8.3	K 0+140.0	K 0+150.0	Parcheo Técnico
27-oct-17	8.3	K 1+000.0	K 1+013.0	Parcheo Técnico
27-oct-17	8.3	K 1+500.0	K 1+508.0	Parcheo Técnico
27-oct-17	8.3	K 1+200.0	K 1+207.4	Parcheo Técnico
28-oct-17	8.3	K 1+200.0	K 1+208.5	Parcheo Técnico
28-oct-17	8.3	K 1+250.0	K 1+256.5	Parcheo Técnico
28-oct-17	8.3	K 1+400.0	K 1+407.4	Parcheo Técnico
29-oct-17	8.3	K 1+260.0	K 1+265.6	Parcheo Técnico
29-oct-17	8.3	K 1+300.0	K 1+309.7	Parcheo Técnico
30-oct-17	8.3	K 1+310.0	K 1+334.3	Parcheo Técnico
30-oct-17	8.3	K 1+370.0	K 1+388.0	Parcheo Técnico
30-oct-17	8.3	K 1+400.0	K 1+418.0	Parcheo Técnico
31-oct-17	8.3	K 1+460.0	K 1+500.0	Parcheo Técnico

3.3 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Durante el mes de septiembre se realizó el mantenimiento rutinario en las diferentes unidades funcionales del proyecto, actividades que consistieron en limpieza de señales, defensas metálicas, cunetas, obras de arte, señales verticales, PRs, rocería, retiro de árboles, entre otras.


A continuación, se relaciona un registro fotográfico de estas actividades:

✓ **Unidad Funcional 1: Caucasia – Planeta Rica**

RUTA	PR	COSTADO
2513	3+350 – 63+500	Izq/Der
		

RUTA	PR	COSTADO
2513	3+350 – 63+500	Izq/Der
 Oct. 4, 2017 10:37:22 AM pr 14+700 limpieza de alcantarillas		
 Oct. 3, 2017 9:45:55 AM pr 10+380 limpieza de cunetas y alcantarillas		
 Oct. 7, 2017 8:19:42 AM personal de mantenimiento ruta 2513		
 Oct. 7, 2017 8:15:24 AM personal de mantenimiento ruta 2513		

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

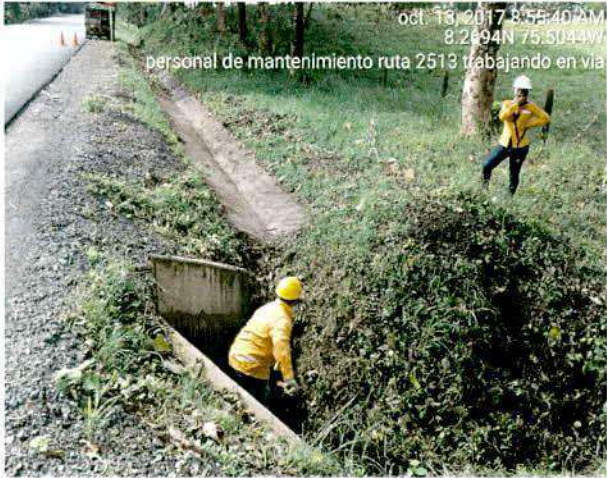RUTA	PR	COSTADO
2513	3+350 – 63+500	Izq/Der
		
		

✓ *Unidad Funcional 3: San Carlos - Cerete*

RUTA	PR	COSTADO
San Carlos - Cerete	22+500 – 31+990	Izq/Der
		
		

✓ **Unidad Funcional 4: Planeta Rica-Montería**

RUTA	PR	COSTADO
2310	49+000 - 00+000	Izq/Der
		
		

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

RUTA	PR	COSTADO
2310	49+000 - 00+000	Izq/Der
		
		

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

✓ **Unidad Funcional 5 Puerto Rey-Montería**

RUTA	PR	COSTADO
7401	00+000 – 64+000	lq/Der
		
		

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

RUTA	PR	COSTADO
7401	00+000 – 64+000	lzq/Der
 		
 		

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

✓ *Unidad Funcional 6 y 8: Lorica-Tolú Viejo*

RUTA	PR	COSTADO
9004		Izq/Der
		
		

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba


RUTA	PR	COSTADO
9004		Izq/Der
 9 oct. 2017 PR / RUTA 21-03		 9 oct. 2017 PR / RUTA 21-03

✓ **Unidad Funcional 8: Pueblito a San Onofre y San Onofre a Cruz del Viso**

RUTA	PR	COSTADO
9005	PR 93+683-104+820 PR 00+023-59+352	Izq/Der
 25.10.2017 08:49		 12 10 2017

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

RUTA	PR	COSTADO
9005	PR 93+683-104+820 PR 00+023-59+352	Izq/Der
		

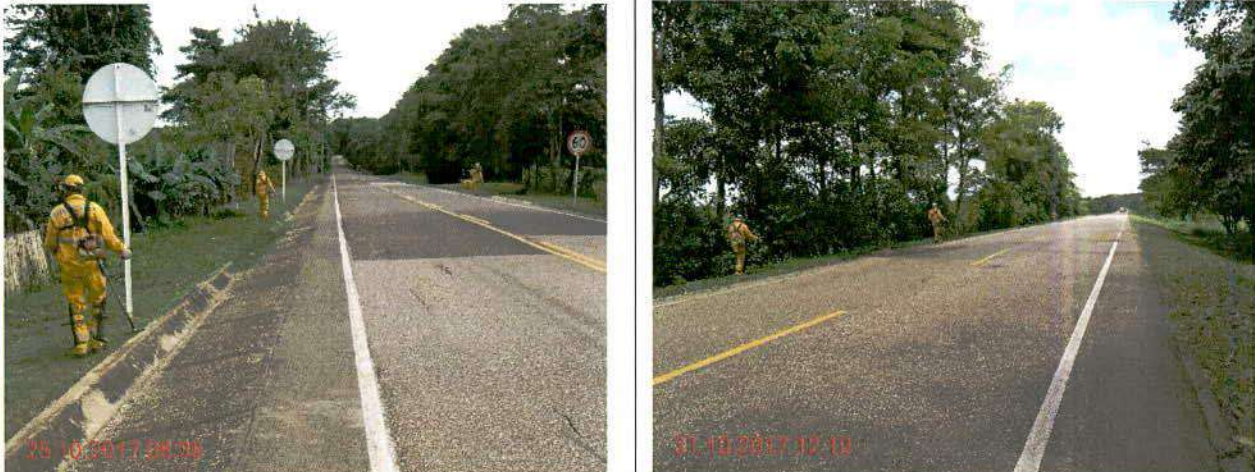RUTA	PR	COSTADO
9005	PR 93+683-104+820 PR 00+023-59+352	Izq/Der
		

RUTA	PR	COSTADO
9005	PR 93+683-104+820 PR 00+023-59+352	Izq/Der
 		

4. INFORME CONTABLE

RECAUDO DE PEAJES CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Concepto	Total	La Apartada	Mata de Caña	San Onofre	Cedros	Purgatorio	Manguitos	Caimanera
Recaudado	\$ 8,717,321,400	\$ 2,277,975,900	\$ 814,127,200	\$ 953,418,300	\$ 744,879,700	\$ 1,262,303,600	\$ 2,266,106,300	\$ 398,510,400
Sobrante	\$ 1,330,700	\$ 180,400	\$ 65,400	\$ 33,400	\$ 170,300	\$ 117,000	\$ 463,400	\$ 300,800
Ajustes por Sistema	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Seguridad Vial	\$ 99,913,200	\$ 17,838,800	\$ 12,480,200	\$ 10,653,400	\$ 10,308,800	\$ 16,567,200	\$ 23,987,400	\$ 8,077,400
Cta por Cobrar	\$ 401,079,700	\$ 74,856,100	\$ 28,402,700	\$ 32,068,100	\$ 26,578,000	\$ 49,424,200	\$ 161,365,800	\$ 28,384,800
Consignación Mes Anterior	\$ 997,392,800	\$ 165,361,300	\$ 51,268,600	\$ 63,812,800	\$ 203,026,200	\$ 339,191,800	\$ 162,513,100	\$ 12,219,000

A la fecha no existen ingresos por explotación comercial ni vigencia futuras.

DETALLE GASTOS DE OPERACIÓN MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

GASTOS DE OPERACIÓN MES SEP-2017	VALOR
INTERESES CRÉDITOS DE BA	533,082.00
COMISIONES	673,064.00
IMPUESTOS Y TASAS	272,847,218.17
DEPRECIACIÓN DE LA PPE	59,045,221.50
DIVERSOS	0.01
ESTUDIOS Y DISEÑOS	18,296,250.00
GASTOS DE OPERACIÓN Y AD	1,844,983,322.97
INVERSION EN INFRAESTRUC	12,985,989,417.17
MANTENIMIENTO VIAL	791,808,130.00
GESTION PREDIAL	185,494,389.00
PROYECTOS INTERVENTORI	1,102,486,719.96
COSTOS DE OPERACIÓN	511,874,730.99
GESTION SOCIAL	100,235,992.02
GESTION AMBIENTAL	434,005,325.01
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,815,210,398.00
COSTOS DE ESTRUCTURACION	(2,145,348,318.04)
CIERRE FINANCIERO	218,370,206.25
TOTAL GASTOS OPERACIONALES SEP - 2017	18,196,505,149.01

- Se Adjuntan Estados Financieros bajo NIIF con corte a Septiembre 30 de 2017 del Patrimonio Autónomo Concesión Ruta al Mar administrado por la Fiduciaria Bancolombia.

5. INFORMACIÓN DE PESAJE

La Estación de Pesaje Manguitos 1 y 2 fue recibida por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI el día 30 de Mayo de 2016 desde las 06:00 a.m., fecha desde la cual iniciamos operación de dicha estación de manera continua las 24 horas del día como lo establece el Contrato, a continuación relacionamos los resultados del pesaje realizado durante el mes de Octubre 2017.

Tabla 46 Total Vehículos pesados

HISTORIAL BASCULA MANGUITOS 1 Y 2 2016			
CATEGORIA	VEHICULOS SIN SOBRE PESO	VEHICULOS CON SOBRE PESO	TOTAL VEHICULOS PESADOS
TOTAL	341.297	273	341.570

BASCULA MANGUITOS 1 Y 2 OCTUBRE			
CATEGORIA	VEHICULOS SIN SOBRE PESO	VEHICULOS CON SOBRE PESO	TOTAL VEHICULOS PESADOS
2	25.848	29	25.877
3	1.953	2	1.955
4	31	0	31
2S1	60	0	60
2S2	2.875	1	2.876
2S3	680	0	680
3S1	45	0	45
3S2	5.745	3	5.748
3S3	15.763	18	15.781
2R2	15	0	15
2R3	0	0	0
3R2	4	0	4
3R3	0	0	0
3R4	260	0	260
2B1	19	1	20
2B2	2	0	2
TOTAL	53.300	54	53.354


Nota: durante el mes de Octubre se realizaron 54 comparendos, lo anterior se puede evidenciar en la tabla 47 donde se tiene el respectivo informe de comparendos realizados durante el mes.

Tabla 47 de Comparendos por Categorías.

	CAT 2	CAT 3	CAT 4	CAT 2S1	CAT 2S2	CAT 2S3	CAT 3S1	CAT 3S2	CAT 3S3	CAT 2R2	CAT 2R3	CAT 3R2	CAT 3R3	CAT 3R4	CAT 2B1	CAT 2B2	
	PLACA # COMPRA	PLACA # COMPRA	PLACA # COMPRA	PLACA # COMPRA	PLACA # COMPRA	PLACA # COMPRA	PLACA # COMPRA	PLACA # COMPRA	PLACA # COMPRA	PLACA # COMPRA	PLACA # COMPRA	PLACA # COMPRA	PLACA # COMPRA	PLACA # COMPRA	PLACA # COMPRA	PLACA # COMPRA	
1	TRG855	450328	WLC261	2943247					TRJ026	2943259	TJ2014	2943222				TRH024	2943271
2	TDZ101	450327	SME253	450340					TRJ880	450325	SCX591	2943238					
3	TNB773	2943227							TRJ485	2943267	WHR245	2943281					
4	SWO121	2943243									SPN641	2943242					
5	CMG401	2943229									UNC171	2943244					
6	CMG401	2943231									JAN172	450331					
7	JAC237	450329									WGP176	2943268					
8	WSS594	2943249									TOP952	2943261					
9	STZ299	2100443									TAL044	450324					
10	SC2678	NO COMP									TKF901	2943264					
11	UNAR2	2943246									TRC200	2943274					
12	VFA474	450338									STB32	2943272					
13	SWI2100	2943263									UPSE11	2943270					
14	TDY481	2943265									WCP186	450335					
15	SW4034	2943267									TJY254	2943263					
16	TW658	2943268									ST444	2943281					
17	CAG317	2943269									TKS32	450341					
18	SC2678	2943273									SHY32	450344					
19	VSS332	2943264															
20	SMT074	2943265															
21	SWK558	2943263															
22	EXU245	2943290															
23	TTR770	450333															
24	TEH173	450333															
25	WJ2688	2943292															
26	TXA905	450342															
27	YAH168	2943287															
28	WCH677	450345															
29	TNC009	2943274															
30																	
TOTALES x CATEGORIA	29	2	0	0	1	0	0	3	18	0	0	0	0	0	1	0	TOTAL GENERAL 54

6. CONDICIONES METEOROLÓGICAS

De acuerdo con el boletín N 34, agroclimático informativo del Ideam del mes de octubre, se estima un comportamiento ligeramente por debajo de lo normal en los municipios del centro y sur de Córdoba con una probabilidad del 41% y una normalidad del 35%; contrario a lo esperado para el norte de la región, en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena y sureste de Sucre, donde se estima un comportamiento por encima de lo normal, con una probabilidad del 48%, seguida de un comportamiento de las precipitaciones cercano a los promedios históricos del orden del 35% y un comportamiento deficitario del orden del 17%. Para el resto de la región, se prevé un comportamiento dentro de los valores históricos.

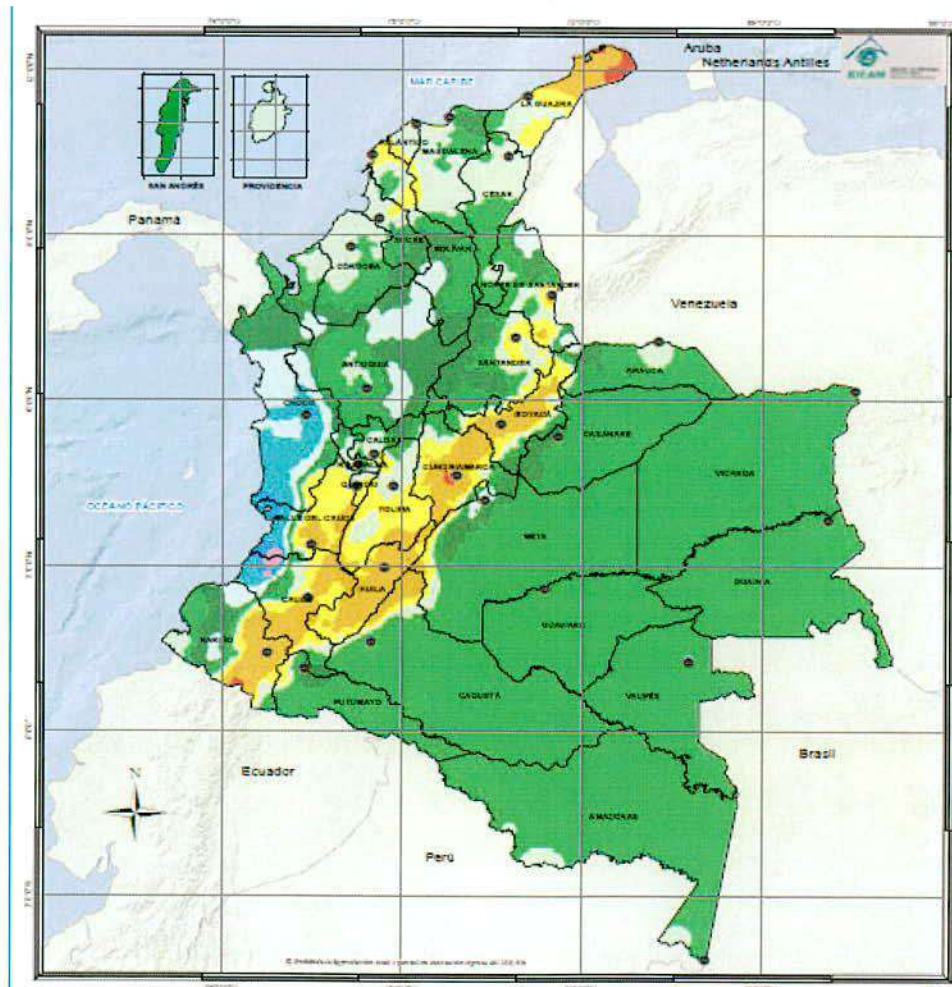

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba



A continuación, se relaciona el control meteorológico que se lleva a cabo en nuestro corredor concesionado:

	Control Meteorológico																	
	2513			2310			2103			7401			9004			9005		
	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N
1-oct			X															
2-oct																		
3-oct			X								X							X
4-oct							X											
5-oct														X				
6-oct			X						X									
7-oct														X				
8-oct																		
9-oct																		
10-oct			X						X									X
11-oct													X					
12-oct																		
13-oct									X									
14-oct				X														
15-oct														X				
16-oct								X		X								
17-oct																		
18-oct			X															
19-oct																		X
20-oct			X															
21-oct																		
22-oct																		

	Control Meteorológico																	
	2513			2310			2103			7401			9004			9005		
	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N
23-oct																		X
24-oct													X					
25-oct			X															
26-oct																		
27-oct											X							
28-oct																		
29-oct			X		X													
30-oct											X							
31-oct																		

Nota: x significa lluvia.

8. CONTROL DE INDICADORES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

8.1 INDICADOR DEL SERVICIO DE AMBULANCIA

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
1/10/2017	4.1	1	32+650	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	COMUNIDAD	0	30
1/10/2017	4.1	1	44+000	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	8	30
2/10/2017	8.3	3	21+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	COMUNIDAD	0	30

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
2/10/2017	4.1	1	32+650	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	MOTO	0	30
2/10/2017	1.1	1	33+420	2513	CAUCASIA-PLANETA RICA	I	11	30
3/10/2017	4.1	1	10+050	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	MOTO	18	30
4/10/2017	6.1	1	31+740	2103	CERETE-LORICA	II	25	30
4/10/2017	8.2	2	95+720	9004	LORICA-SAN ONOFRE	II	25	30
4/10/2017	4.1	1	32+650	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	COMUNIDAD	0	30
6/10/2017	1.1	1	33+520	2513	CAUCASIA-PLANETA RICA	MOTO	14	30
6/10/2017	3.2	2	01+600	EL 15-SAN CARLOS	EL 15-SAN CARLOS	SERVICIO NO ENCONTRADO	3	30

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
6/10/2017	8.3	3	27+000	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	SERVICIO NO ENCONTRADO	7	30
6/10/2017	1.1	1	06+300	2513	CAUCASIA-PLANETA RICA	SERVICIO NO ENCONTRADO	27	30
6/10/2017	1.1	1	09+500	2513	CAUCASIA-PLANETA RICA	COMUNIDAD	0	30
6/10/2017	5.1	1	47+000	7401	PLANETA RICA-MONTERIA	COMUNIDAD	0	30
7/10/2017	6.1	1	43+600	2103	CERETE-LORICA	COMUNIDAD	24	30
7/10/2017	8.3	3	21+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	COMUNIDAD	0	30
7/10/2017	6.1	1	15+220	2103	CERETE-LORICA	COMUNIDAD	28	30

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
8/10/2017	8.3	3	27+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	0	30
8/10/2017	8.3	3	33+950	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	17	30
8/10/2017	8.3	3	21+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	COMUNIDAD	0	30
8/10/2017	4.1	1	32+650	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	COMUNIDAD	0	30
9/10/2017	5.1	1	47+000	7401	PUERTO REY-MONTERIA	COMUNIDAD	0	30
9/10/2017	5.1	1	30+000	7401	PUERTO REY-MONTERIA	COMUNIDAD	27	30
9/10/2017	4.1	1	00+320	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	COMUNIDAD	28	30

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicad or Medido	Indicador a Medir
9/10/2017	8.3	3	21+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	COMUNIDAD	0	30
10/10/2017	4.1	1	11+800	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	COMUNIDAD	18	30
10/10/2017	4.1	1	32+650	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	COMUNIDAD	0	30
10/10/2017	4.1	1	32+650	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	COMUNIDAD	0	30
11/10/2017	4.1	1	32+650	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	COMUNIDAD	0	30
11/10/2017	3.2	1	01+040	EL 15-SAN CARLOS	EL 15-SAN CARLOS	I	4	30
12/10/2017	8.3	3	21+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	COMUNIDAD	0	30

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
12/10/2017	8.3	3	21+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	SERVICIO NO ENCONTRADO	28	30
13/10/2017	4.1	1	32+650	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	COMUNIDAD	0	30
14/10/2017	4.1	1	29+500	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	5	30
15/10/2017	4.1	1	13+940	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	MOTO	26	30
15/10/2017	8.3	3	21+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	COMUNIDAD	0	30
16/10/2017	8.3	3	21+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	SERVICIO NO ENCONTRADO	15	30
16/10/2017	4.1	1	32+650	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	COMUNIDAD	0	30

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
16/10/2017	4.1	1	32+650	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	COMUNIDAD	0	30
16/10/2017	8.3	3	21+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	COMUNIDAD	0	30
17/10/2017	6.1	1	40+540	2103	CERETE-LORICA	MOTO	26	30
17/10/2017	8.3	3	21+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	COMUNIDAD	0	30
17/10/2017	4.1	1	24+700	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	MOTO	7	30
17/10/2017	8.3	3	53+000	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	SERVICIO NO ENCONTRADO	25	30

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
18/10/2017	5.1	1	47+000	7401	PUERTO REY-MONTERIA	COMUNIDAD	5	30
18/10/2017	4.1	1	32+650	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	COMUNIDAD	0	30
18/10/2017	4.1	1	39+450	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	3	30
18/10/2017	4.1	1	05+900	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	II	21	30
18/10/2017	1.1	1	23+700	2513	CAUCASIA-PLANETA RICA	COMUNIDAD	22	30
19/10/2017	5.1	1	29+910	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	14	30
19/10/2017	4.1	1	45+570	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	MOTO	8	30
20/2018	1.1	1	29+770	2513	CAUCASIA-PLANETA RICA	V	20	30

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
20/10/2017	5.1	1	47+000	7401	PUERTO REY-MONTERIA	COMUNIDAD	0	30
20/10/2017	6.1	1	38+250	2103	CERETE-LORICA	I	28	30
21/10/2017	8.3	3	21+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	COMUNIDAD	0	30
21/10/2017	4.1	1	32+650	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	COMUNIDAD	23	30
21/10/2017	4.1	1	32+650	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	COMUNIDAD	10	30
22/10/2017	4.1	1	15+030	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	MOTO	15	30
22/10/2017	5.1	1	47+000	7401	PUERTO REY-MONTERIA	COMUNIDAD	5	30
22/10/2017	8.3	1	21+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	COMUNIDAD	0	30
22/10/2017	8.3	3	21+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	COMUNIDAD	0	30
22/10/2017	8.3	3	21+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	COMUNIDAD	0	30

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
22/10/2017	4.1	1	32+650	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	COMUNIDAD	0	30
22/10/2017	4.1	1	32+650	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	COMUNIDAD	0	30
23/10/2017	5.1	1	47+000	7401	PUERTO REY-MONTERIA	COMUNIDAD	7	30
23/10/2017	5.2	2	06+670	7401	SATA LUCIA SAN PELAYO	MOTO	13	30
23/10/2017	4.1	1	32+650	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	COMUNIDAD	0	30
23/10/2017	5.1	1	47+000	7401	PUERTO REY-MONTERIA	COMUNIDAD	5	30
23/10/2017	5.1	1	42+340	7401	PUERTO REY-MONTERIA	MOTO	10	30
24/10/2017	5.1	1	47+000	7401	PUERTO REY-MONTERIA	COMUNIDAD	0	30
24/10/2017	4.1	1	39+450	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	6	30
25/10/2017	4.1	1	32+650	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	COMUNIDAD	0	30
25/10/2017	4.1	1	27+050	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	0	30

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
25/10/2017	4.1	1	32+650	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	COMUNIDAD	0	30
25/10/2017	6.1	1	32+600	2103	CERETE-LORICA	I	6	30
25/10/2017	1.1	1	54+380	2513	CAUCASIA-PLANETA RICA	II	6	30
25/10/2017	1.1	1	06+200	2513	CAUCASIA-PLANETA RICA	I	25	30
25/10/2017	4.1	1	32+650	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	COMUNIDAD	0	30
25/10/2017	5.1	1	47+000	7401	PUERTO REY-MONTERIA	COMUNIDAD	0	30
25/10/2017	4.1	1	32+650	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	COMUNIDAD	0	30
26/10/2017	1.1	1	40+040	2513	CAUCASIA-PLANETA RICA	V	11	30
26/10/2017	8.3	3	54+900	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	I	28	30

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
26/10/2017	5.1	1	47+000	7401	PUERTO REY-MONTERIA	COMUNIDAD	0	30
26/10/2017	4.1	1	32+650	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	COMUNIDAD	0	30
27/10/2017	8.3	3	21+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	COMUNIDAD	0	30
26/10/2017	8.2	2	13+600	9004	LORICA-SAN ONOFRE	I	5	30
27/10/2017	4.1	1	48+350	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	12	30
27/10/2017	1.1	1	12+890	2513	CAUCASIA-PLANETA RICA	MOTO	26	30
28/10/2017	1.1	1		2513	CAUCASIA-PLANETA RICA	SERVICIO NO ENCONTRADO	23	30
28/10/2017	8.3	3	21+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	COMUNIDAD	0	30
28/10/2017	1.1	1	33+100	2513	CAUCASIA-PLANETA RICA	V	17	30
28/10/2017	4.1	1	10+764	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	COMUNIDAD	21	30

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
28/10/2017	5.1	1	47+000	7401	PUERTO REY-MONTERIA	COMUNIDAD	0	30
29/10/2017	4.1	1	32+650	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	COMUNIDAD	0	30
29/10/2017	5.1	1	47+000	7401	PUERTO REY-MONTERIA	SERVICIO NO ENCONTRADO	27	30
29/10/2017	1.1	1	22+970	2513	CAUCASIA-PLANETA RICA	MOTO	24	30
29/10/2017	1.1	1	52+300	2513	CAUCASIA-PLANETA RICA	COMUNIDAD	3	30
30/10/2017	8.3	3	53+900	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	I	28	30
30/10/2017	8.3	3	47+220	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	I	26	30
30/10/2017	4.1	1	32+650	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	0	30
30/10/2017	5.1	1	47+000	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	0	30
30/10/2017	4.1	1	32+650	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	COMUNIDAD	0	30

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
PROMEDIO							9	30

8.2 INDICADOR DEL SERVICIO DE GRÚA DE PLATAFORMA

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
1/10/2017	4.1	1	18+600	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	27	60
1/10/2017	8.2	2	103+550	9004	LORICA-SAN ONOFRE	I	30	60
1/10/2017	5.1	1	47+230	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	7	60
1/10/2017	5.1	1	54+000	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	18	60
1/10/2017	5.1	1	47+000	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	4	60
2/10/2017	5.1	1	42+080	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	8	60
2/10/2017	5.1	1	04+000	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	35	60
2/10/2017	1.1	1	04+500	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	58	60

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
2/10/2017	4.1	1	10+500	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	35	60
2/10/2017	4.1	1	40+690	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	58	60
2/10/2017	1.1	1	10+850	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	48	60
2/10/2017	8.2	2	104+000	9004	LORICA-SAN ONOFRE	I	33	60
2/10/2017	6.1	1	32+600	2103	CERETE-LORICA	I	1	60
3/10/2017	6.1	1	12+700	2103	CERETE-LORICA	I	20	60
3/10/2017	8.3	3	08+600	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	I	21	60
3/10/2017	4.1	1	10+050	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	57	60
4/10/2017	6.1	1	33+900	2103	CERETE-LORICA	I	4	60
4/10/2017	6.1	1	31+740	2103	CERETE-LORICA	MOTO	10	60
4/10/2017	4.1	1	21+500	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	28	60
4/10/2017	6.1	1	34+310	2103	CERETE-LORICA	I	6	60
4/10/2017	5.1	1	06+000	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	32	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
5/10/2017	1.1	1	03+700	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	47	60
5/10/2017	1.1	1	16+000	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	2	60
5/10/2017	6.1	1	32+630	2103	CERETE-LORICA	I	1	60
5/10/2017	6.1	1	33+000	2103	CERETE-LORICA	I	5	60
5/10/2017	4.1	1	29+200	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	35	60
5/10/2017	1.1	1	33+520	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	20	60
6/10/2017	5.1	1	47+000	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	5	60
6/10/2017	1.1	1	43+900	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	3	60
6/10/2017	4.1	1	39+550	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	42	60
6/10/2017	5.1	1	34+810	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	35	60
6/10/2017	5.1	1	33+680	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	56	60
6/10/2017	4.1	1	28+900	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	37	60
7/10/2017	1.1	1	07+500	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	56	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
7/10/2017	6.1	1	43+600	2103	CERETE-LORICA	II	14	60
7/10/2017	1.1	1	05+500	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	SERVICIO NO ENCONTRADO	55	60
7/10/2017	1.1	1	51+100	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	10	60
7/10/2017	5.1	1	48+380	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	6	60
7/10/2017	1.1	1	35+100	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	31	60
7/10/2017	8.3	3	09+430	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	I	22	60
7/10/2017	1.1	1	07+700	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	13	60
7/10/2017	4.1	1	22+200	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	52	60
7/10/2017	6.1	1	21+100	2103	CERETE-LORICA	II	14	60
8/10/2017	5.1	1	42+800	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	11	60
8/10/2017	4.1	1	17+800	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	30	60
8/10/2017	4.1	1	19+500	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	30	60
8/10/2017	6.2	2	06+100	9004	LORICA-SAN ONOFRE	I	33	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
8/10/2017	4.1	1	36+050	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	56	60
8/10/2017	1.1	1	06+500	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	57	60
9/10/2017	5.1	1	30+150	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	37	60
9/10/2017	5.1	1	44+200	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	23	60
9/10/2017	6.1	1	21+500	2103	CERETE-LORICA	I	20	60
9/10/2017	4.1	1	00+340	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	18	60
9/10/2017	5.1	1	49+200	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	11	60
9/10/2017	4.1	1	31+950	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	40	60
10/10/2017	8.1	1	53+900	9004	LORICA-SAN ONOFRE	I	55	60
10/10/2017	4.1	1	29+200	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	38	60
10/10/2017	1.1	1	63+000	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	8	60
10/10/2017	1.1	1	05+200	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	52	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
11/10/2017	1.1	1	22+440	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	43	60
11/10/2017	3.2	2	01+040	EL 15-SAN CARLOS	EL 15-SAN CARLOS	I	39	60
11/10/2017	1.1	1	27+500	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	0	60
11/10/2017	6.1	1	21+500	2103	CERETE-LORICA	I	13	60
11/10/2017	1.1	1	49+900	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	15	60
12/10/2017	5.1	1	51+800	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	8	60
12/10/2017	8.3	3	21+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	I	0	60
12/10/2017	5.1	1	29+650	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	21	60
12/10/2017	1.1	1	11+850	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	50	60
13/10/2017	5.1	1	25+000	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	23	60
13/10/2017	4.1	1	11+200	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	28	60
14/10/2017	4.1	1	29+500	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	34	60
14/10/2017	8.3	3	33+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	I	19	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
14/10/2017	8.3	3	49+200	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	I	0	60
14/10/2017	5.1	1	26+700	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	30	60
14/10/2017	8.3	3	50+000	9005	SERVICIO NO ENCONTRADO	SERVICIO NO ENCONTRADO	21	60
14/10/2017	1.1	1	22+250	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	52	60
14/10/2017	8.3	3	29+200	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	I	0	60
14/10/2017	8.3	3	28+950	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	I	18	60
15/10/2017	4.1	1	37+700	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	42	60
15/10/2017	1.1	1	42+000	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	20	60
15/10/2017	6.2	2	23+100	9004	LORICA-SAN ONOFRE	I	45	60
15/10/2017	5.1	1	30+300	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	20	60
15/10/2017	4.1	1	13+940	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	MOTO	18	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
15/10/2017	1.1	1	19+400	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	MOTO	43	60
15/10/2017	5.1	1	51+850	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	11	60
16/10/2017	4.1	1	10+200	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	22	60
16/10/2017	6.1	1	25+200	2103	CERETE-LORICA	I	12	60
16/10/2017	1.1	1	40+100	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	25	60
16/10/2017	8.1	1	48+600	9004	LORICA-SAN ONOFRE	I	56	60
16/10/2017	5.1	1	10+600	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	36	60
16/10/2017	4.1	1	41+300	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	35	60
16/10/2017	6.1	1	22+500	2103	CERETE-LORICA	I	33	60
16/10/2017	4.1	1	41+030	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	35	60
16/10/2017	4.1	1	36+700	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	30	60
16/10/2017	6.2	2	09+400	9004	LORICA-SAN ONOFRE	I	28	60
16/10/2017	6.1	1	26+200	2103	CERETE-LORICA	I	15	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
17/10/2017	4.1	1	35+660	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	53	60
17/10/2017	5.1	1	25+300	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	45	60
17/10/2017	4.1	1	40+250	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	48	60
17/10/2017	8.3	3	56+887	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	I	42	60
18/10/2017	4.1	1	19+800	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	57	60
18/10/2017	6.2	2	12+500	9004	LORICA-SAN ONOFRE	I	36	60
18/10/2017	5.1	1	15+260	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	33	60
18/10/2017	8.3	3	05+300	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	I	26	60
18/10/2017	5.1	1	49+200	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	13	60
18/10/2017	5.1	1	33+650	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	57	60
18/10/2017	5.1	1	47+000	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	10	60
18/10/2017	4.1	1	05+900	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	0	60
18/10/2017	6.1	1	17+150	2103	CERETE-LORICA	I	0	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
18/10/2017	6.1	1	36+600	2103	CERETE-LORICA	I	0	60
18/10/2017	1.1	1	24+000	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	42	60
19/10/2017	4.1	1	7+800	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	25	60
19/10/2017	4.1	1	36+000	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	12	60
19/10/2017	5.1	1	29+910	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	24	60
20/10/2017	8.3	3	21+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	I	0	60
20/10/2017	3.4	4	26+100	SAN CARLOS-CERETE	SAN CARLOS-CERETE	I	40	60
20/10/2017	1.1	1	51+700	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	9	60
20/10/2017	1.1	1	36+400	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	19	60
20/10/2017	5.1	1	53+100	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	55	60
20/10/2017	6.3	3	65+500	9004	LORICA-SAN ONOFRE	I	55	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
20/10/2017	4.1	1	32+700	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	41	60
20/10/2017	6.1	1	38+250	2103	CERETE-LORICA	I	54	60
21/10/2017	6.1	1	32+600	2103	CERETE-LORICA	I	0	60
21/10/2017	5.1	1	53+400	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	10	60
21/10/2017	5.1	1	45+280	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	10	60
21/10/2017	1.1	1	52+400	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	12	60
21/10/2017	5.1	1	00+000	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	48	60
21/10/2017	4.1	1	26+000	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	34	60
22/10/2017	4.1	1	15+030	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	MOTO	20	60
22/10/2017	6.1	1	20+800	2103	CERETE-LORICA	I	19	60
22/10/2017	6.1	1	32+600	2103	CERETE-LORICA	I	4	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
23/10/2017	5.2	2	06+070	—	SANTA LUCIA-SAN PELAYO	MOTO	20	60
23/10/2017	6.1	1	12+210	2103	CERETE-LORICA	I	23	60
23/10/2017	1.1	1	52+000	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	13	60
23/10/2017	5.1	1	47+050	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	4	60
23/10/2017	4.1	1	17+490	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	28	60
23/10/2017	4.1	1	48+100	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	25	60
23/10/2017	4.1	1	32+600	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	42	60
24/10/2017	1.1	1	46+000	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	24	60
24/10/2017	4.1	1	32+050	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	46	60
24/10/2017	6.1	1	32+400	2103	CERETE-LORICA	I	3	60
24/10/2017	4.1	1	39+450	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	13	60
24/10/2017	8.3	3	28+830	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	I	14	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Absci sa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
24/10/2017	5.2	2	21+000	SANTA LUCIA-SAN PELAYO	SANTA LUCIA-SAN PELAYO	I	30	60
24/10/2017	1.1	1	56+000	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	11	60
24/10/2017	8.3	3	39+200	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	I	31	60
25/10/2017	4.1	1	31+200	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	5	60
25/10/2017	4.1	1	27+050	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	35	60
25/10/2017	4.1	1	42+900	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	SERVICIO NO ENCONTRADO	15	60
25/10/2017	5.1	1	43+900	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	6	60
25/10/2017	5.1	1	06+050	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	39	60
25/10/2017	5.1	1	31+700	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	40	60
25/10/2017	4.1	1	16+250	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	25	60
25/10/2017	5.1	1	30+280	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	38	60
25/10/2017	6.1	1	16+000	2103	CERETE-LORICA	II	28	60
25/10/2017	5.1	1	42+350	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	11	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
25/10/2017	4.1	1	29+500	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	34	60
26/10/2017	6.1	1	42+900	2103	CERETE-LORICA	I	14	60
26/10/2017	5.1	1	21+910	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	30	60
26/10/2017	8.3	3	54+900	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	I	37	60
26/10/2017	1.1	1	51+000	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	15	60
26/10/2017	4.1	1	32+700	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	35	60
27/10/2017	5.1	1	42+200	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	18	60
27/10/2017	6.2	2	13+800	9004	LORICA-SAN ONOFRE	II	40	60
27/10/2017	5.1	1	24+700	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	30	60
27/10/2017	6.2	2	49+200	9004	LORICA-SAN ONOFRE	I	51	60
27/10/2017	5.1	1	55+500	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	15	60
27/10/2017	5.1	1	47+000	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	4	60
27/10/2017	4.1	1	48+350	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	35	60
27/10/2017	1.1	1	12+890	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	MOTO	48	60
28/10/2017	3.4	4	N/NA	SAN CARLOS-CERETE	SAN CARLOS-CERETE	I	47	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
29/10/2017	5.2	2	23+980	SANTA LUCIA-SAN PELAYO	SANTA LUCIA-SAN PELAYO	I	35	60
29/10/2017	4.1	1	29+100	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	34	60
29/10/2017	5.1	1	39+300	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	35	60
29/10/2017	4.1	1	42+500	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	25	60
30/10/2017	8.3	3	53+900	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	I	43	60
30/10/2017	1.1	1	46+050	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	16	60
30/10/2017	6.1	1	39+200	2103	CERETE-LORICA	I	10	60
30/10/2017	4.1	1	13+000	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	22	60
30/10/2017	5.1	1	22+500	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	0	60
30/10/2017	5.1	1	4+700	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	14	60
30/10/2017	4.1	1	00+800	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	15	60
30/10/2017	5.1	1	33+700	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	20	60
31/10/2017	5.1	1	33+000	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	39	60
31/10/2017	1.1	1	25+700	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	42	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
31/10/2017	6.2	2	09+500	9004	LORICA-SAN ONOFRE	I	27	60
31/10/2017	4.1	1	32+600	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	40	60
31/10/2017	4.1	1	25+500	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	II	25	60
31/10/2017	5.1	1	31+240	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	23	60
PROMEDIO							26	60

8.3 INDICADOR DEL SERVICIO DE GRÚA DE GANCHO

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
1/10/2017	6.2	2	21+400	9004	LORICA-SAN ONOFRE	II	48	60
1/10/2017	1.1	1	51+600	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	17	60
2/10/2017	5.1	1	06+050	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	41	60
2/10/2017	4.1	1	40+700	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	II	25	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
2/10/2017	5.1	1	24+310	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	26	60
3/10/2017	1.1	1	30+300	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	35	60
3/10/2017	8.2	2	98+200	9004	LORICA-SAN ONOFRE	II	36	60
3/10/2017	8.3	3	21+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	0	60
3/10/2017	5.1	1	39+450	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	10	60
3/10/2017	4.1	1	15+200	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	II	27	60
3/10/2017	6.2	2	15+100	9004	LORICA-SAN ONOFRE	II	49	60
4/10/2017	8.2	2	95+720	9004	LORICA-SAN ONOFRE	II	38	60
4/10/2017	6.1	1	48+250	2103	CERETE-LORICA	II	13	60
5/10/2017	6.1	1	13+800	2103	CERETE-LORICA	II	51	60
6/10/2017	1.1	1	15+500	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	56	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
6/10/2017	1.1	1	15+100	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	0	60
6/10/2017	6.1	1	38+200	2103	CERETE-LORICA	II	11	60
6/10/2017	5.1	1	42+300	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	11	60
6/10/2017	8.3	3	07+000	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	24	60
7/10/2017	1.1	1	49+500	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	25	60
7/10/2017	6.1	1	15+220	2103	CERETE-LORICA	V	29	60
7/10/2017	6.1	1	15+220	2103	CERETE-LORICA	II	37	60
7/10/2017	6.1	1	35+800	2103	CERETE-LORICA	II	15	60
8/10/2017	8.3	3	39+900	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	20	60
9/10/2017	5.1	1	47+000	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	2	60
9/10/2017	1.1	1	19+900	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	50	60

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
9/10/2017	1.1	1	55+850	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	15	60
10/10/2017	5.1	1	46+350	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	4	60
10/10/2017	4.1	1	11+800	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	II	52	60
10/10/2017	4.1	1	11+800	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	II	25	60
10/10/2017	8.3	3	50+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	36	60
10/10/2017	6.2	2	41+100	9004	LORICA-SAN ONOFRE	II	58	60
11/10/2017	3.2	2	01+040	EL 15-SAN CARLOS	EL 15-SAN CARLOS	I	44	60
12/10/2017	6.1	1	27+050	2103	CERETE-LORICA	II	11	60
12/10/2017	8.3	3	24+450	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	10	60
12/10/2017	5.1	1	56+000	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	13	60
12/10/2017	5.1	1	29+650	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	55	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
12/10/2017	4.1	1	05+500	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	II	0	60
12/10/2017	1.1	1	11+850	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	55	60
13/10/2017	4.1	1	28+000	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	II	34	60
13/10/2017	8.3	3	16+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	12	60
13/10/2017	5.1	1	49+600	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	8	60
13/10/2017	5.1	1	30+000	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	30	60
13/10/2017	1.1	1	11+800	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	V	47	60
13/10/2017	1.1	1	38+100	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	16	60
13/10/2017	1.1	1	41+000	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	2	60
13/10/2017	4.1	1	06+300	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	II	14	60
13/10/2017	1.1	1	05+720	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	V	50	60
14/10/2017	1.1	1	26+000	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	48	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
14/10/2017	5.1	1	35+460	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	20	60
15/10/2017	5.1	1	43+950	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	46	60
15/10/2017	1.1	1	35+000	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	35	60
15/10/2017	1.1	1	41+500	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	27	60
15/10/2017	5.1	1	51+850	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	10	60
15/10/2017	8.3	3	21+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	4	60
16/10/2017	6.1	1	43+050	2103	CERETE-LORICA	II	21	60
16/10/2017	6.1	1	36+000	2103	CERETE-LORICA	II	0	60
18/10/2017	5.1	1	31+800	7401	PUERTO REY-MONTERIA	V	19	60
18/10/2017	1.1	1	43+500	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	29	60
19/10/2017	8.3	3	17+740	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	III	14	60
19/10/2017	1.1	1	09+600	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	31	60
19/10/2017	1.1	1	50+900	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	V	55	60
19/10/2017	1.1	1	26+600	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	V	0	60
19/10/2017	6.1	1	15+500	2103	CERETE-LORICA	II	25	60
20/10/2017	1.1	1	29+770	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	V	40	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
20/10/2017	1.1	1	29+770	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	V	0	60
20/10/2017	8.3	3	14+400	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	20	60
20/10/2017	5.1	1	01+050	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	55	60
20/10/2017	5.1	1	42+100	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	0	60
20/10/2017	6.1	1	35+200	2103	CERETE-LORICA	II	15	60
20/10/2017	8.3	3	16+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	10	60
20/10/2017	8.3	3	55+600	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	V	50	60
21/10/2017	1.1	1	50+600	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	22	60
21/10/2017	6.2	2	12+500	9004	LORICA-SAN ONOFRE	IV	35	60
21/10/2017	5.1	1	42+500	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	7	60
22/10/2017	5.1	1	49+710	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	5	60
23/10/2017	8.3	3	53+630	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	49	60

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
23/10/2017	4.1	1	20+500	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	II	41	60
23/10/2017	1.1	1	16+400	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	III	45	60
24/10/2017	1.1	1	60+000	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	0	60
24/10/2017	8.3	3	21+000	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	0	60
24/10/2017	8.3	3	47+300	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	40	60
25/10/2017	4.1	1	32+600	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	II	44	60
25/10/2017	8.3	3	45+050	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	44	60
26/10/2017	1.1	1	40+400	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	V	27	60
26/10/2017	5.1	1	31+380	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	22	60
26/10/2017	5.1	1	21+910	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	35	60
26/10/2017	5.1	1	24+720	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	0	60
26/10/2017	1.1	1	51+000	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	7	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
25/10/2017	4.1	1	38+650	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	II	33	60
27/10/2017	5.1	1	31+000	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	30	60
27/10/2017	6.2	2	29+500	9004	LORICA-SAN ONOFRE	III	10	60
27/10/2017	8.1	1	49+600	9004	LORICA-SAN ONOFRE	SERVICIO NO ENCONTRADO	50	60
27/10/2017	6.1	1	32+600	2103	CERETE-LORICA	III	2	60
29/10/2017	5.1	1	24+000	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	27	60
29/10/2017	1.1	1	52+600	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	12	60
30/10/2017	8.3	3	47+220	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	36	60
30/10/2017	1.1	1	45+000	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	13	60
31/10/2017	1.1	1	26+450	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	SERVICIO SOLUCIONADO POR EL USUARIO	33	60
31/10/2017	8.3	3	5+000	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	31	60
PROMEDIO							26	60

8.4 INDICADOR DEL SERVICIO DE CARRO TALLER

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
1/10/2017	8.2	2	103+550	9004	LORICA-SAN ONOFRE	I	25	60
1/10/2017	8.3	3	33+460	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	20	60
1/10/2017	1.1	1	43+100	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	14	60
1/10/2017	4.1	1	36+940	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	30	60
1/10/2017	1.1	1	51+600	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	4	60
2/10/2017	5.1	1	42+080	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	8	60
2/10/2017	5.1	1	04+000	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	15	60
2/10/2017	1.1	1	38+300	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	33	60
2/10/2017	5.1	1	24+310	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	29	60
3/10/2017	1.1	1	25+500	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	48	60
3/10/2017	6.1	1	12+700	2103	CERETE-LORICA	I	0	60
3/10/2017	1.1	1	30+300	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	40	60
3/10/2017	6.1	1	37+700	2103	CERETE-LORICA	II	11	60
3/10/2017	8.3	3	24+700	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	10	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
3/10/2017	5.1	1	47+140	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	0	60
3/10/2017	1.1	1	54+500	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	V	9	60
3/10/2017	4.1	1	10+050	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	14	60
3/10/2017	8.3	3	53+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	SERVICIO NO ENCONTRADO	38	60
3/10/2017	5.1	1	24+590	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	15	60
3/10/2017	6.1	1	19+650	2103	CERETE-LORICA	MOTO	3	60
4/10/2017	1.1	1	50+800	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	38	60
4/10/2017	6.1	1	31+740	2103	CERETE-LORICA	MOTO	5	60
4/10/2017	4.1	1	33+000	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	30	60
4/10/2017	4.1	1	21+500	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	1	60
4/10/2017	4.1	1	12+300	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	II	0	60
4/10/2017	8.2	2	95+720	9004	LORICA-SAN ONOFRE	II	32	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
4/10/2017	8.3	3	21+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	0	60
4/10/2017	6.1	1	34+310	2103	CERETE-LORICA	I	5	60
4/10/2017	1.1	1	35+500	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	II	39	60
4/10/2017	8.3	3	7+100	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	18	60
5/10/2017	1.1	1	03+700	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	10	60
5/10/2017	5.1	1	42+400	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	8	60
5/10/2017	6.1	1	13+800	2103	CERETE-LORICA	II	24	60
5/10/2017	4.1	1	29+200	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	37	60
5/10/2017	8.3	3	49+200	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	0	60
6/10/2017	8.3	3	53+260	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	V	32	60
6/10/2017	1.1	1	15+100	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	35	60
6/10/2017	5.1	1	52+020	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	9	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
6/10/2017	8.3	3	27+000	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	SERVICIO NO ENCONTRADO	9	60
6/10/2017	6.1	1	38+200	2103	CERETE-LORICA	II	11	60
6/10/2017	8.3	3	07+000	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	15	60
6/10/2017	8.3	3	57+200	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	SERVICIO NO ENCONTRADO	35	60
7/10/2017	6.1	1	43+600	2103	CERETE-LORICA	II	25	60
7/10/2017	8.3	3	21+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	V	0	60
7/10/2017	8.3	3	57+050	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	40	60
7/10/2017	6.1	1	15+230	2103	CERETE-LORICA	V	0	60
7/10/2017	4.1	1	35+500	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	33	60
7/10/2017	5.2	2	15+820	SANTA LUCIA-SAN PELAYO	SANTA LUCIA-SAN PELAYO	II	15	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
7/10/2017	8.3	3	60+000	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	I	0	60
8/10/2017	8.3	3	09+800	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	0	60
8/10/2017	4.1	1	22+900	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	II	24	60
8/10/2017	5.1	1	42+800	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	20	60
8/10/2017	6.2	2	06+100	9004	LORICA-SAN ONOFRE	I	35	60
8/10/2017	1.1	1	06+500	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	50	60
9/10/2017	4.1	1	21+600	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	28	60
9/10/2017	6.1	1	21+500	2103	CERETE-LORICA	I	13	60
9/10/2017	1.1	1	55+850	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	9	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
9/10/2017	4.1	1	32+520	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	58	60
10/10/2017	8.1	1	53+900	9004	LORICA-SAN ONOFRE	I	54	60
10/10/2017	4.1	1	32+750	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	II	26	60
10/10/2017	8.3	3	50+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	42	60
10/10/2017	5.1	1	27+800	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	0	60
10/10/2017	6.3	3	41+100	9004	LORICA-SAN ONOFRE	II	45	60
11/10/2017	1.1	1	28+300	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	V	38	60
11/10/2017	8.3	3	21+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	0	60
11/10/2017	6.1	1	42+350	2103	CERETE-LORICA	I	16	60

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
11/10/2017	8.3	3	21+300	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	0	60
11/10/2017	5.1	1	53+310	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	9	60
11/10/2017	8.3	3	21+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	0	60
11/10/2017	8.3	3	13+000	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	5	60
11/10/2017	1.1	1	49+900	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	20	60
12/10/2017	6.1	1	27+050	2103	CERETE-LORICA	II	11	60
12/10/2017	1.1	1	52+400	9004	LORICA-SAN ONOFRE	SERVICIO NO ENCONTRADO	55	60
12/10/2017	1.1	1	34+000	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	SERVICIO NO ENCONTRADO	40	60
12/10/2017	6.2	2	10+800	9004	LORICA-SAN ONOFRE	I	35	60
13/10/2017	8.3	3	12+960	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	I	10	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
13/10/2017	8.3	3	17+400	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	V	6	60
13/10/2017	1.1	1	16+200	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	III	19	60
14/10/2017	5.1	1	32+350	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	19	60
14/10/2017	1.1	1	44+700	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	19	60
14/10/2017	1.1	1	45+500	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	18	60
14/10/2017	8.3	3	49+200	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	I	25	60
14/10/2017	1.1	1	33+200	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	38	60
14/10/2017	1.1	1	08+000	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	SERVICIO NO ENCONTRADO	56	60
14/10/2017	5.1	1	35+460	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	14	60
14/10/2017	8.3	3	29+200	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	I	18	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
14/10/2017	1.1	1	36+900	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	0	60
15/10/2017	4.1	1	09+700	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	29	60
15/10/2017	4.1	1	29+200	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	24	60
15/10/2017	5.1	1	30+630	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	18	60
15/10/2017	1.1	1	29+500	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	47	60
15/10/2017	1.1	1	19+400	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	MOTO	46	60
15/10/2017	5.1	1	51+730	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	10	60
16/10/2017	8.3	3	38+220	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	25	60
16/10/2017	8.3	3	2+900	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	I	0	60
16/10/2017	6.2	2	41+250	9004	LORICA-SAN ONOFRE	II	40	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
16/10/2017	6.1	1	43+050	2103	CERETE-LORICA	II	0	60
16/10/2017	8.3	3	06+700	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	17	60
16/10/2017	6.1	1	37+100	2103	CERETE-LORICA	I	5	60
16/10/2017	1.1	1	52+250	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	20	60
16/10/2017	6.1	1	36+000	2103	CERETE-LORICA	II	20	60
17/10/2017	5.1	1	35+660	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	14	60
17/10/2017	6.1	1	29+400	2103	CERETE-LORICA	II	6	60
18/10/2017	1.1	1	26+600	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	25	60
18/10/2017	5.1	1	15+260	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	41	60
18/10/2017	8.3	3	21+400	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	V	0	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
18/10/2017	6.1	1	17+150	2103	CERETE-LORICA	I	12	60
18/10/2017	6.1	1	36+600	2103	CERETE-LORICA	I	23	60
18/10/2017	4.1	1	15+200	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	II	33	60
19/10/2017	1.1	1	52+700	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	10	60
19/10/2017	6.1	1	45+000	2103	CERETE-LORICA	I	15	60
19/10/2017	5.1	1	11+000	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	10	60
19/10/2017	4.1	1	26+050	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	II	45	60
19/10/2017	8.3	3	17+740	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	V	0	60
19/10/2017	6.1	1	42+200	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	8	60
19/10/2017	1.1	1	26+600	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	V	23	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
20/10/2017	6.1	1	15+500	2103	CERETE-LORICA	II	43	60
20/10/2017	1.1	1	29+770	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	V	10	60
20/10/2017	8.3	3	14+400	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	0	60
20/10/2017	8.3	3	21+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	I	0	60
20/10/2017	3.4	4	26+100	SAN CARLOS-CERETE	SAN CARLOS-CERETE	I	50	60
20/10/2017	5.1	1	01+150	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	40	60
20/10/2017	1.1	1	51+700	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	20	60
20/10/2017	1.1	1	36+400	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	13	60
20/10/2017	5.1	1	19+910	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	26	60
20/10/2017	6.1	1	35+280	2103	CERETE-LORICA	II	5	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
20/10/2017	8.3	3	55+600	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	V	31	60
20/10/2017	5.1	1	53+100	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	11	60
20/10/2017	1.1	1	9+300	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	33	60
20/10/2017	6.1	1	38+250	2103	CERETE-LORICA	I	5	60
20/10/2017	8.3	3	06+100	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	18	60
21/10/2017	6.1	1	31+900	2103	CERETE-LORICA	I	13	60
21/10/2017	6.2	2	12+500	9004	LORICA-SAN ONOFRE	II	46	60
21/10/2017	5.1	1	45+280	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	15	60
22/10/2017	1.1	1	52+500	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	V	6	60

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
22/10/2017	5.1	1	53+000	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	11	60
22/10/2017	8.3	3	53+000	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	I	30	60
22/10/2017	5.2	2	06+670	7401	SANTA LUCIA-SAN PELAYO	MOTO	22	60
22/10/2017	6.1	1	12+210	2103	CERETE-LORICA	I	23	60
23/10/2017	1.1	1	52+000	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	0	60
23/10/2017	1.1	1	05+700	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	V	0	60
23/10/2017	4.1	1	17+490	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	36	60
23/10/2017	5.1	1	10+240	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	44	60
23/10/2017	4.1	1	20+500	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	II	12	60
23/10/2017	8.3	3	15+900	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	10	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
23/10/2017	5.1	1	42+340	7401	PUERTO REY-MONTERIA	MOTO	11	60
24/10/2017	1.1	1	29+600	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	25	60
24/10/2017	1.1	1	46+000	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	42	60
24/10/2017	6.1	1	44+250	2103	CERETE-LORICA	V	13	60
24/10/2017	1.1	1	29+300	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	57	60
24/10/2017	8.3	3	28+830	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	I	8	60
24/10/2017	5.2	2	21+100	SANTA LUCIA-SAN PELAYO	SANTA LUCIA-SAN PELAYO	I	22	60
24/10/2017	1.1	1	23+000	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	SERVICIO NO ENCONTRADO	57	60
24/10/2017	8.3	3	21+000	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	2	60
25/10/2017	1.1	1	47+380	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	30	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
25/10/2017	6.2	2	10+100	9004	LORICA-SAN ONOFRE	I	30	60
25/10/2017	6.1	1	32+600	2103	CERETE-LORICA	I	0	60
25/10/2017	4.1	1	08+000	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	SERVICIO NO ENCONTRADO	28	60
25/10/2017	1.1	1	54+380	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	8	60
25/10/2017	5.1	1	30+280	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	29	60
25/10/2017	1.1	1	40+040	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	V	8	60
25/10/2017	5.1	1	31+380	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	34	60
26/10/2017	6.1	1	42+900	2103	CERETE-LORICA	I	12	60
26/10/2017	8.3	3	21+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	V	0	60
26/10/2017	5.1	1	21+950	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	23	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
26/10/2017	1.1	1	11+800	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	V	44	60
26/10/2017	5.1	1	24+720	7401	PUERTO REY-MONTERIA	II	5	60
26/10/2017	8.3	3	37+200	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	V	0	60
26/10/2017	4.1	1	32+700	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	I	45	60
27/10/2017	5.2	2	16+500	SANTA LUCIA-SAN PELAYO	SANTA LUCIA-SAN PELAYO	I	29	60
27/10/2017	4.1	1	34+500	2310	PLANETA RICA-MONTERIA	II	50	60
27/10/2017	1.1	1	12+890	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	MOTO	35	60
28/10/2017	8.3	3	21+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	I	0	60
28/10/2017	8.3	3	29+000	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	9	60
28/10/2017	8.3	3	21+500	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	II	0	60
28/10/2017	5.2	2	23+980	SANTA LUCIA-SAN PELAYO	SANTA LUCIA-SAN PELAYO	I	30	60

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
29/10/2017	1.1	1	43+350	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	19	60
29/10/2017	1.1	1	22+970	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	19	60
29/10/2017	6.2	2	18+700	9004	LORICA-SAN ONOFRE	I	41	60
29/10/2017	8.3	3	11+000	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	I	22	60
30/10/2017	8.3	3	55+000	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	I	28	60
30/10/2017	8.3	3	26+450	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	I	6	60
30/10/2017	6.1	1	24+900	2103	CERETE-LORICA	II	9	60
30/10/2017	5.1	1	40+700	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	9	60
30/10/2017	8.3	3	01+200	9005	SAN ONOFRE-CRUZ DEL VISO	V	30	60
30/10/2017	1.1	1	35+500	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	20	60

Fecha	UFI	Sub sector	Abscisa	Ruta	Tramo	Categoría	Indicador Medido	Indicador a Medir
30/10/2017	6.2	2	18+500	9004	LORICA-SAN ONOFRE	I	38	60
31/10/2017	1.1	1	26+450	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	V	30	60
31/10/2017	1.1	1	57+300	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	II	4	60
31/10/2017	1.1	1	52+300	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	11	60
31/10/2017	1.1	1	6+130	2513	CAUCACIA-PLANETA RICA	I	31	60
31/10/2017	5.1	1	31+240	7401	PUERTO REY-MONTERIA	I	21	60
PROMEDIO							21	60

8.4 REGISTRO FOTOGRAFICO.

REGISTROS FOTOGRAFICOS DE GRÚA



Servicio de Grúa de Plataforma Ruta 2513



Servicio de Grúa de Plataforma Ruta 2513



Servicio de Grúa de Plataforma Ruta 2513



Servicio de Grúa de Plataforma Ruta 2513



Servicio de Grúa de Gancho ruta 2513



Servicio de Grúa de Gancho ruta 2513




Servicio de Grúa de Gancho ruta 2513



Servicio de Grúa de Gancho ruta 2513



Servicio de Grúa de Plataforma Ruta 2310

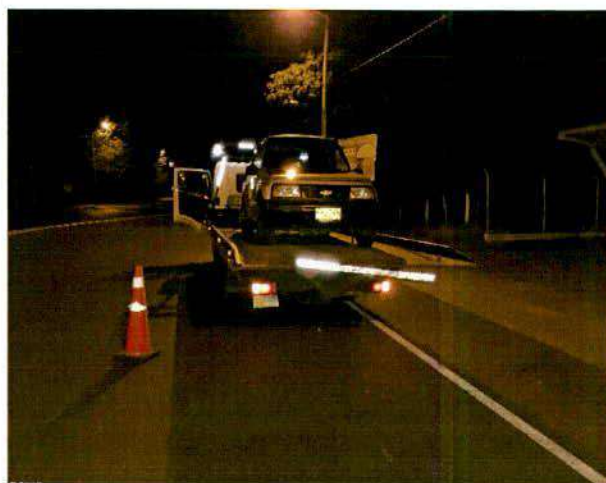

Servicio de Grúa de Plataforma Ruta 2310



Servicio de Grúa de Plataforma Ruta 2310



Servicio de Grúa de Plataforma Ruta 2310

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba



Servicio de Grúa de Gancho ruta 2310



Servicio de Grúa de Gancho ruta 2310



Servicio de Grúa de Gancho ruta 2310



Servicio de Grúa de Gancho ruta 2310



Servicio de Grúa de Plataforma Ruta 7401



Servicio de Grúa de Plataforma Ruta 7401



Servicio de Grúa de Plataforma Ruta 7401



Servicio de Grúa de Plataforma Ruta 7401



Servicio de Grúa de Gancho ruta 7401



Servicio de Grúa de Gancho ruta 7401



Servicio de Grúa de Gancho ruta 7401



Servicio de Grúa de Gancho ruta 7401



Servicio de Grúa de Plataforma de la Ruta 2103



Servicio de Grúa de Plataforma de la Ruta 2103



Servicio de Grúa de Plataforma Ruta 2103



Servicio de Grúa de Plataforma Ruta 2103



Servicio de Grúa de Gancho Ruta 2103



Servicio de Grúa de Gancho Ruta 2103



Servicio de Grúa de Gancho Ruta 9004



Servicio de Grúa de Gancho Ruta 9004

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba



Servicio de Grúa de Plataforma Ruta 9005



Servicio de Grúa de Plataforma Ruta 9005



Servicio de Grúa de Plataforma Ruta 9005



Servicio de Grúa de Plataforma de la Ruta 9005



Servicio de Grúa de Gancho Ruta 9005



Servicio de Grúa de Gancho de la Ruta 9005



Servicio de Grúa de Gancho Ruta 9005



Servicio de Grúa de Gancho de la Ruta 9005

REGISTROS FOTOGRAFICOS DE CARRO TALLER



Servicio Mecánico Base Operacional 1



Servicio Mecánico Base Operacional 1



Servicio Mecánico Base Operacional 1



Servicio Mecánico Base Operacional 1

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba



Servicio Mecánico Base Operacional 2



Servicio Mecánico Base Operacional 2



Servicio Mecánico Base Operacional 2



Servicio Mecánico Base Operacional 2

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba



Servicio Mecánico Base Operacional 3



Servicio Mecánico Base Operacional 3



Servicio Mecánico Base Operacional 3



Servicio Mecánico Base Operacional 3



Servicio Mecánico Base Operacional 4



Servicio Mecánico Base Operacional 4



Servicio Mecánico Base Operacional 4



Servicio Mecánico Base Operacional 4

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba

REGISTROS FOTOGRAFICOS DE AMBULANCIA



Servicio Ambulancia Base Operacional 1



Servicio Ambulancia Base Operacional 1



Servicio Ambulancia Base Operacional 2



Servicio Ambulancia Base Operacional 2

Centro Logístico Industrial San Jerónimo Km 3 Vía Montería – Planeta Rica. Bodega # 4 Calle B Etapa 1.
Contiguo a la planta de Bavaria.
Montería - Córdoba



Servicio Ambulancia Base Operacional 3



Servicio Ambulancia Base Operacional 3



Servicio Ambulancia Base Operacional 4



Servicio Ambulancia Base Operacional 4



Servicio Ambulancia Purgatorio



Servicio Ambulancia Purgatorio
