	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **ACTA DE EJECUCIÓN DE OBRA**	CÓDIGO:	PM-FO-600-013
INDERVALLE		VERSIÓN:	3
		APROBACIÓN:	18/OCT/23

ACTA No.	4		FECHA DEL ACTA	10 DE DICIEMBRE DE 2024	PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 09 DE MAYO DE 2025
CONTRATO No.	IND-23-5027					
OBJETO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"					
CONTRATISTA	CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC			NIT - CC	901526894-4	CDP: N°. 1023 del 25/07/23 CDP DEL 31 de octubre de 2024 y CDP 6246 DEL 31 de octubre 2024
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	CONSORCIO GRUPO G3 JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ			NIT - CC	901769200-8	RPC: No. 1223 del 26/12/23 RP 424 del 03 de diciembre 2024 y RP 19008 del 03 de diciembre de 2024

PERÍODO A PAGAR: DEL 03 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024

Mediante el presente documento INDERVALLE, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR, dejan constancia de las actividades ejecutadas por el contratista en las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNID	CONTRATO. CONDICIONES ACTUALIZADAS				CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD INICIAL CONTRATADA	CANTIDAD ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE BALANCE No. 2	VALOR UNITARIO $	VALOR TOTAL $	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR $	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL $	CANT	VALOR $
1	PRELIMINARES													
1.1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	666,81	666,76	4.390	2.927.076,00	666,76		666,76	2.927.076	-	2.927.076	-	-
1.1.2	EXCAVACION MANUAL TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	35,55	30,06	21.850	656.811,00	30,06		30,06	656 811	-	656.811	-	-
1.1.3	DEMOL. CONCRETO REFORZADO	M3	0,88	1,44	177.170	255.125,00	1,44		1,44	255.125	-	255.125	-	-
1.1.4	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	37,93	40,95	19.780	809.991,00	40,95		40,95	809.991	-	809.991	-	-
1.1.5	PODA DE ARBOLES	UND	1,00	1,00	126.280	126.280,00	-		-	-	-	-	1,00	126.280,00
1.1.6	DESMONTE JUEGO	UND	2,00	2,00	53.270	106.540,00	2,00		2,00	106.540	-	106.540	-	-
					SUBTOTAL CAP. 1.1 PRELIMINARES:	4.881.823,00				4.755.543	-	4.755.543		126.280
1.2	CIMENTACION													
1.2.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	25,91	50,84	21.850	1.110.864,00	50,84		50,84	1.110 864	-	1.110.864	-	-
1.2.2	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	64,58	66,09	19.780	1.307.293,00	66,09		66,09	1.307.296	-	1.307.296	-	-
1.2.3	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	38,00	37,00	27.600	1.021.200,00	37,00		37,00	1.021.200	-	1.021.200	-	-
1.2.4	PILOTE CONCRETO REFORZADO	M3	23,75	23,75	630.870	14.983.440,00	23,75		23,75	14.983.440	-	14.983.440	-	-
1.2.5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	4.141,87	3.932,45	6.200	24.381.207,00	3.932,45		3.932,45	24.381.207	-	24.381.207	-	-
1.2.6	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	6,00	6,00	491.180	2.947.080,00	6,00		6,00	2.947.080	-	2.947.080	-	-
1.2.7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	402,28	401,76	6.200	2.490.912,00	401,76		401,76	2.490.912	-	2.490.912	-	-
1.2.8	VIGA CIMIENTO ENLACE 4000 PSI 28.0MPA	M3	13,00	13,00	865.180	11.247.340,00	13,00		13,00	11.247.340	-	11.247.340	-	-
1.2.9	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	1.802,64	1.795,60	6 200	11.132.720,00	1.795,60		1.795,60	11.132.720	-	11.132.720	-	-
1.2.10	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	6,29	6,14	551.830	3.390.444,00	6,14		6,14	3.390.444	-	3.390.444	-	-
1.2.11	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	2.211,28	2.853,02	6 200	17.688.749,00	2.853,02		2.853,02	17.688.749	-	17.688.749	-	-
1.2.12	SIKAGROUT PARA ANCLAJES	KG	731,86	614,40	29.540	18.149.376,00	-		-	-	-	-	614,40	18,149.376,00
					SUBTOTAL CAP. 1.2 CIMENTACION:	109.850.625,00				91.701.252	-	91.701.252		18.149.376
1.3	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA													

1.3.1	ACERO ESTRUCTURAL	KLS	30.550,40	30.423,53	17.260	525.110.054,00	15.512,66	3.482,36	18.995,01	267.748.449	60.105.493,49	327.853.942	11.428,51	197.256.111,67
	SUBTOTAL CAP. 1,3 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA:					525.110.054,00				267.748.449	60.105.493	327.853.942		197.256.112
1,4	CUBIERTA													
1.4.1	TEJA TERMOACUSTICA UPVC	KLS	607,21	607,52	79.540	48.322.340,00			-	-	-	-	607,52	48.322.339,65
	SUBTOTAL CAP. 1,3 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA:					48.322.340,00				-	-	-		48.322.340
2	CANCHA MULTIPLE													
2,1	GEOTEXTIL REPAV 450	M2	544,14	-	5.340	-			-	-	-	-	-	-
2,2	CARPETA ASFALTICA [ST]	M3	27,64	-	673.200	-			-	-	-	-	-	-
2,3	IMPRIMACION	M2	544,14	-	3.190	-			-	-	-	-	-	-
2,4	ACARREO ASFALTO VOLUMEN COMPCTADO	M3K	3.317,08	-	1.920	-			-	-	-	-	-	-
2,5	TRANSPORTE DE EQUIPO 31KM A 50 KM	T/K	6.000,00	-	1.090	-			-	-	-	-	-	-
2,6	LINEA DEMARCACION ACRILICA A=12CM	ML	345,39	345,02	2.530	872.888,00			-	-	-	-	345,02	872.888,48
2,7	PORTERIA MULT.FIJA MICROF. BALONC.TIPO 2 SIN CONCRI	JGO	1,00	1,00	5.915.850	5.915.850,00			-	-	-	-	1,00	5.915.850,00
2,8	SOPORTE PARA VOLEIBOL TRES POSICIONES + TUBO AUX	JGO	1,00	1,00	1.212.600	1.212.600,00			-	-	-	-	1,00	1.212.600,00
	ITEMS ADICIONALES					-			-	-	-	-	-	-
2.9 (1.1.3)	DEMOL. CONCRETO REFORZADO	M3		63,60	177.170	11.268.012,00	7,01	56,59	63,60	1.241.982	10.026.050,30	11.268.012	-	-
2.10 (1.2.1)	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3		362,52	21.850	7.921.062,00		362,52	362,52	-	7.921.062,00	7.921.062	-	-
2.11 (1,2,2)	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3		547,33	19.780	10.826.108,00	5,62	541,71	547,33	111.172	10.714.935,92	10.826.108	-	-
2.12 (5.2.5)	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3		267,12	31.670	8.459.690,00		267,12	267,12	-	8.459.690,40	8.459.690	-	-
2.13 (1.2.11)	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS		461,44	6.200	2.860.928,00		461,44	461,44	-	2.860.928,00	2.860.928	-	-
2.14 (4,5)	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS		1.590,00	7.910	12.576.900,00		1.590,00	1.590,00	-	12.576.900,00	12.576.900	-	-
2.15 (INP 001)	LOSA CONCRE.CANCHA MULTIP E=10CM 3000PSI	M2		636,00	120.998	76.954.728,00		636,00	636,00	-	76.954.728,00	76.954.728	-	-
2.16 (INP 002)	REVESTIMIENTO ACRILICO SOBRE PISO EN CONCRETO	M2		636,00	125.640	79.907.040,00			-	-	-	-	636,00	79.907.040,00
2.17 (INP 003)	TIERRA PARA SIEMBRA Y NIVELACION	M3		44,52	71.848	3.198.673,00			-	-	-	-	44,52	3.198.672,96
2.18 (INP 004)	S.E.I. PRADO TRENZA. INCLUYE RIEGO DE PRENDIMIENTO	M2		445,20	43.238	19.249.558,00			-	-	-	-	445,20	19.249.557,60
2.19 (2,14)	ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT	M3K		14.882,40	1.990	29.615.976,00		14.882,40	14.882,40	-	29.615.976,00	29.615.976	-	-
2.20 (INP 005)	GAVION DE CONTENCION DE ESTRUCTURA CANCHA MUL	M3		8,00	327.890	2.623.120,00		8,00	8,00	-	2.623.120,00	2.623.120	-	-
2.21 (INP 006)	SUB-BASE COMP.MAT.SELECC.	M3		95,40	83.743,00	7.989.082,00		95,40	95,40	-	7.989.082,20	7.989.082	-	-
2.22 (INP 007)	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOCELDA PARA MEJOR	M2		636,00	52.583,00	33.442.788,00		636,00	636,00	-	33.442.788,00	33.442.788	-	-
	SUBTOTAL CAP. 2 CANCHA MULTIPLE:					314.895.003,00				1.353.134	161.753.391	163.106.525		110.356.609
3,00	PANTALLAS DE PROTECCIÓN													
3,1	PRELIMINARES													
3.1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	ML	25,90	25,91	2.210	57.266,00	25,91		25,91	57.266	-	57.266	-	-
	SUBTOTAL CAP. 3,1 PRELIMINARES:					57.266,00				57.266	-	57.266		-
3,2	MOVIMIENTOS DE TIERRRA													
3.2.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	1,99	6,42	21.850	140.336,00	6,42		6,42	140.336	-	140.336	-	-
3.2.2	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	5,95	7,60	19.780	150.240,00	7,60		7,60	150.240	-	150.240	-	-
	SUBTOTAL CAP. 3,2 MOVIMIENTOS DE TIERRRA:					290.576,00				290.576		290.576		-
3,3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA													

3.3.1	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	9,26	9,77	27.600	269.751,00	9,77		9,77	269.751	-	269.751	-	-
3.3.2	VIGA CIMIENTO ENLACE 4000 PSI 28.0MPA	M3	3,71	2,20	865.180	1.904.227,00	2,20		2,20	1.904.227	-	1.904.227	-	-
3.3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	207,40	206,94	6.200	1.283.028,00	206,94		206,94	1.283.028	-	1.283.028	-	-
3.3.4	PILOTE CONCRETO REFORZADO	M3	3,96	2,51	630.870	1.585.549,00	2,51		2,51	1.585.549	-	1.585.549	-	-
3.3.5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	615,96	364,59	6.200	2.260.451,00	364,59		364,59	2.260.451	-	2.260.451	-	-
3.3.6	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	0,50	0,26	551.830	141.268,00	-		-	-	-	-	0,26	141.268,48
3.3.7	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	0,60	0,80	491.180	392.944,00	0,80		0,80	392.944	-	392.944	-	-
3.3.8	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	104,40	49,22	6.200	305.139,00	49,22		49,22	305.139	-	305.139	-	-
					SUBTOTAL CAP. 3.3 CIMENTACION Y ESTRUCTURA:	8.142.387,00				8.001.089	-	8.001.089		141.268
3,4	MAMPOSTERIA													
3.4.1	MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C	M2	9,26	9,60	61.280	588.288,00			-	-	-	-	9,60	588.288,00
3.4.2	CINTA CONFINAMIENTO MURO	ML	23,16	25,50	28 330	722.415,00			-	-	-	-	25,50	722.415,00
3.4.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	31,82	40,70	6 200	252.328,00			-	-	-	-	40,70	252.327,60
					SUBTOTAL CAP. 3.4 MAMPOSTERIA:	1.563.031,00				-	-	-		1.563.031
3,5	MALLA													
3.5.1	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"	M2	102,32	102,40	29.450	3 015.680,00			-	-	-	-	102,40	3.015 680,00
3.5.2	POSTE TUBO GALV. 2" x2,3MM C.13	ML	119,44	143,70	30.950	4.447.515,00			-	-	-	-	143,70	4.447.515,00
3.5.3	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 1,1/2"	ML	112,64	34,08	16.640	567.091,00			-	-	-	-	34,08	567.091,20
3.5.4	ANGULO HIERRO 1 1/2"X3/16"	ML	25,58	25,50	19.980	509.490,00			-	-	-	-	25,50	509.490,00
					SUBTOTAL CAP. 3,5 MALLA:	8.539.776,00				-	-	-		8.539.776
4	ANDENES													
4,1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	7,91	8,06	21.850	176.029,00			-	-	-	-	8,06	176.029,06
4,2	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	7,91	10,47	19.780	207.158,00			-	-	-	-	10,47	207.158,41
4,3	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	M3	6,32	6,45	29.990	193 286,00			-	-	-	-	6,45	193.285,55
4,4	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	26,16	30,94	68.220	2.110.454,00			-	-	-	-	30,94	2.110.453,92
4,5	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	50,70	61,87	7.910	489.408,00			-	-	-	-	61,87	489.407,52
4,6	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	5,46	30,94	27.600	853.834,00			-	-	-	-	30,94	853.833,60
4,7	CORDON CONCRETO 3100 PSI	M3	1,09	1,55	1.039.620	1.608 084,00			-	-	-	-	1,55	1.608.084,22
4,8	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	135,23	135,13	6.200	837.829,00			-	-	-	-	135,13	837.828,94
4,9	ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT	M3K	78,42	216,55	1.990	430.938,00			-	-	-	-	216,55	430 938,48
					SUBTOTAL CAP. 4 ANDENES:	6.907.020,00				-	-	-		6.907.020
5,00	DRENAJE PLUVIAL													
5,1	PRELIMINARES													
5.1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	133,65	127,50	2.070	263.925,00	133,65		133,65	276.656	-	276.656	- 6,15	- 12.730,50
					SUBTOTAL CAP. 5,1 PRELIMINARES:	263.925,00				276.656	-	276.656		-12.731
5,2	MOVIMIENTOS TIERRA, DEMOLICIONES Y RELLENOS													
5.2.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	76,26	120,46	21.850	2.631.993,00	120,46		120,46	2.631.993	-	2.631.993	-	-
5 2.2	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	76,26	156,59	19.780	3 097.441,00	156,59		156,59	3.097.441	-	3.097.441	-	-
5.2.3	RELLENO ARENA MEDIANA (ST)	M3	2,40	3,99	75.050	299.450,00	4,01		4,01	300.608	-	300.608	- 0,02	- 1.158,02
5.2.4	RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO COMPACTAD	M3	4,16	12,02	98.470	1.183.117,00	12,02		12,02	1.183.117	-	1.183.117	-	-

5.2.5	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	33,52	34,04	31.670	1.078.125,00	34,04		34,04	1.078.125	-	1.078.125	-	-
5.2.6	RELLENO TIERRA-NIVELACION	M3	3,09	8,01	26.370	211.224,00	8,01		8,01	211.224	-	211.224	-	-
5.2.7	ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT	M3K	535,46	688,27	1.990	1.369.667,00	688,27		688,27	1.369.666	-	1.369.666	-	-
	SUBTOTAL CAP. 5.2 MOVIMIENTOS TIERRA, DEMOLICIONES Y RELLENOS:					9.871.018,00				9.872.173		9.872.173		1.158
5.3	FILTRO													
5.3.1	GRAVA TRITURAD DE 1/2"	M3	1,73	1,84	87.010	160.142,00	1,84		1,84	160.142	-	160.142	-	-
5.3.2	GRAVA TRITURAD DE 1"	M3	1,73	1,84	69.340	127.620,00	1,84		1,84	127.620	-	127.620	-	-
5.3.3	GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	28,35	32,72	5.340	174.725,00	32,72		32,72	174.725	-	174.725	-	-
5.3.4	TUB PVC 6 DREN.SF NOVAFOR	ML	20,45	20,45	51.680	1.056.856,00	20,45		20,45	1.056.856	-	1.056.856	-	-
	SUBTOTAL CAP. 5.3 FILTRO:					1.519.343,00				1.519.343		1.519.343		-
5.4	DRENAJE PLUVIAL													
5.4.1	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	1,00	1,00	340.150	340.150,00	1,00		1,00	340.150	-	340.150	-	-
5.4.2	CAJA INSPECCION 100X100 CM [CONCRETO]	UND	1,00	1,00	504.070	504.070,00	1,00		1,00	504.070	-	504.070	-	-
5.4.3	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	UND	1,00	1,00	406.850	406.850,00	1,00		1,00	406.850	-	406.850	-	-
5.4.4	CAJA INSPECCION 120x120 CM [CONCRETO]	UND	1,00	1,00	794.450	794.450,00	1,00		1,00	794.450	-	794.450	-	-
5.4.5	CAJA INSPECCION 175x 80 CM DOM[CONCRETO]	UND	1,00	1,00	997.970	997.970,00	-		-	-	-	-	1,00	997.970,00
5.4.6	CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.01-2.50 MTS	UND	1,00	1,00	1.930.280	1.930.280,00	1,00		1,00	1.930.280	-	1.930.280	-	-
5.4.7	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	30,65	30,65	27.600	845.940,00	30,65		30,65	845.940	-	845.940	-	-
5.4.8	CANAL CONCRETO PISO 50x25x08 CM DOBLE	ML	61,30	61,30	93.150	5.710.095,00	-		-	-	-	-	61,30	5.710.095,00
5.4.9	TAPA CANAL CONCRETO PERFORADA PREF. ESP.8CM	UND	103,00	103,00	52.800	5.438.400,00	-		-	-	-	-	103,00	5.438.400,00
5.4.10	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	273,58	518,40	6.200	3.214.082,00	-		-	-	-	-	518,40	3.214.082,48
5.4.11	DESCOLMATACION CUNETAS,ZANJAS,DESCOLES (MANUA	ML	6,04	32,00	2.440	78.080,00	32,00		32,00	78.080	-	78.080	-	-
5.4.12	TUBERIA.PVC 4 RDE 21 - 200 PSI	ML	111,24	111,24	92.360	10.274.126,00	-		-	-	-	-	111,24	10 274.126,40
5.4.13	TUB PVC NOVAFORT 8"	ML	1,14	1,14	77.250	88.065,00	1,14		1,14	88.065	-	88.065	-	-
5.4.14	TUB PVC NOVAFORT 10"	ML	20,58	20,58	83.890	1.726.456,00	20,58		20,58	1.726.456	-	1.726.456	-	-
5.4.15	TUB PVC NOVAFORT 12"	ML	24,31	24,31	164.460	3.998.023,00	24,31		24,31	3.998.023	-	3.998 023	-	-
5.4.16	CODO PVC-UM 4 x 90	UND	36,00	36,00	113.210	4.075.560,00	-		-	-	-	-	36,00	4.075.560,00
5.4.17	TRAGANTE LOSA TCI 4 ATRAPA MANTO-ALUM	UND	12,00	12,00	376.500	4.518.000,00	-		-	-	-	-	12,00	4.518 000,00
5.4.18	ABRAZADERA SANITARIA 4"	UND	48,00	48,00	20.750	996.000,00	-		-	-	-	-	48,00	996.000,00
5.4.19	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	60,60	61,00	98.660	6.018.260,00	-		-	-	-	-	61,00	6 018 260,00
5.4.20	VÁLVULA ANTIRRETORNO PVC DE 300 MM, CLAPETA DE POLIPROPILENO, JUNTA LABIADA Y REGISTRO SUPERIOR	UND	1,00	1,00	2.595.090	2.595.090,00	-		-	-	-	-	1,00	2.595.090,00
5.4.21	EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	27,00	13,00	120.250	1.563 250,00	27,00		27,00	3.246.750	-	3.246.750	- 14,00	- 1.683.500,00
5.4.22	BATEA EN CONCRETO 3000 PSI	M3	2,11	2,14	523.130	1.116.883,00	2,14		2,14	1.116.883	-	1.116.883	-	-
	SUBTOTAL CAP. 5.4 DRENAJE PLUVIAL:					57.230.060,00				15.075.996		15.075.996		42.154.064
6	SISTEMA DE ILUMINACION													
6,1	EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	7,20	7,20	21.850	157.320,00			-	-	-	-	7,20	157.320,00
6,2	ACOM E.3F(3# 6+1# 8) 2"	ML	36,00	36,00	80.610	2.901.960,00			-	-	-	-	36,00	2.901.960,00
6,3	CAPACETE GALV 2	UND	1,00	1,00	14.280	14.280,00			-	-	-	-	1,00	14.280,00
6,4	CURVA PVC 2	ML	1,00	1,00	23.690	23.690,00			-	-	-	-	1,00	23.690,00
6,5	TUBO GALV 2 X3 MTS	UND	2,00	2,00	109.510	219.020,00			-	-	-	-	2,00	219.020,00
6,6	CONTADOR 3F-TRIFASICO 120/208V M DIRECTA	UND	1,00	1,00	633.630	633.630,00			-	-	-	-	1,00	633.630,00

6,7	CAJA CONTADOR 3F POLICARB C/PORTABREAKER	UND	1,00	1,00	154.770	154.770,00			-	-	-	-	1,00	154.770,00
6,8	CAJA ELECTRICA 0,8 X 0,8 X 1 MT	UND	2,00	2,00	438.928	877.856,00			-	-	-	-	2,00	877.856,00
6,9	MALLA A TIERRA 3 VARILLAS-PERNADA	UND	1,00	1,00	1.154.310	1.154.310,00			-	-	-	-	1,00	1.154.310,00
6,10	TABLERO DE BAJA TENSION ILUMINACIÓN 220 V	UND	1,00	1,00	1.889.190	1.889.190,00			-	-	-	-	1,00	1.889.190,00
6,11	ACOM.E.3F(3# 10+1#10) 1" EMT"	ML	70,00	70,00	38 510	2.695.700,00			-	-	-	-	70,00	2.695.700,00
6,12	SAL LAMP EMT	UND	12,00	12,00	97.970	1.175.640,00			-	-	-	-	12,00	1.175.640,00
6,13	LUMINARIA LED 150 W 13074 LUMENS INDUSTRIAL	UND	12,00	12,00	1.697.530	20.370 360,00			-	-	-	-	12,00	20.370.360,00
6,14	PUNTA CAPTORA ACERO GAL	UND	12,00	12,00	87.300	1.047.600,00			-	-	-	-	12,00	1.047.600,00
6,15	CONECTOR PARALELO BIMETALICO	UND	6,00	6,00	39.970	239.820,00			-	-	-	-	6,00	239.820,00
6,16	CAJA RAWELT 3/4"	UND	6,00	6,00	22.540	135.240,00			-	-	-	-	6,00	135.240,00
6,17	GRAPA SUJECION PUNTA CAPTORA	UND	12,00	12,00	40.930	491.160,00			-	-	-	-	12,00	491.160,00
6,18	GRAPA CRUCE CABLE -PUNTA CAPTORA	UND	12,00	12,00	53.360	640.320,00			-	-	-	-	12,00	640.320,00
6,19	GRAPA SOPORTE BAJANTE	UND	40,00	40,00	35.870	1.434.800,00			-	-	-	-	40,00	1.434.800,00
6,20	MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE	UND	1,00	1,00	271.690	271.690,00			-	-	-	-	1,00	271.690,00
6,21	MOLDE SOLDADURA CABLE-CABLE (1/0 A 4/0)	UND	1,00	1,00	271.690	271.690,00			-	-	-	-	1,00	271.690,00
6,22	SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM	UND	16,00	16,00	29.160	466.560,00			-	-	-	-	16,00	466.560,00
6,23	ALAMBRON DE ALUMINIO DE 8 MM	ML	242,00	242,00	16.670	4 034.140,00			-	-	-	-	242,00	4 034.140,00
6,24	VARILLA CU-CU 9/16X 2.40	UND	6,00	6,00	190.140	1.140.840,00			-	-	-	-	6,00	1.140.840,00
6,25	CAJA ELECTRICA 0,3 X 0,3 X 0,5 MT + TAPA	UND	6,00	6,00	162.530	975.180,00			-	-	-	-	6,00	975.180,00
				SUBTOTAL CAP. 6 SISTEMA DE ILUMINACION:		43.416.766,00					-	-		43.416.766
											242.574.819,16	242.574.819	-	476.918.772,71
7	ASEO Y LIMPIEZA													
7,1	LIMPIEZA GENERAL	M2	544,14	585,00	2.070	1.210.950,00			-	-	-	-	585,00	1.210.950,00
8	INCREMENTO POR TRANSPORTE Y GRADO DE DIFICULTAD (6% PARA L		0,06	0,06		68.524.317,00				24.039.089	14.554.489,15	38.593.578		29.930.739,23
9	ICOCIV (Construcción de obras civiles) - estimada por el DANE,	%	0,14	0,14		162.859.460,00				57.132.901	34.591.169,21	91.724.070		71.135.390,18
				SUBTOTAL CAP. 7 ASEO Y LIMPIEZA:		232.594.726,00				81.171.989	49.145.658	130.317.648		102.277.079
	SUBTOTAL CAP. P2 ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA:					1.373.455.731				481.823.353	291.720.478	773.543.831		599.911.900

	COSTOS INDIRECTOS											
	VALOR COSTOS DIRECTOS		1.373.455.731				481.823.353	291.720.478	773.543.831	-	599.911.900,00	
	ADMINISTRACION	29%	398.302.162				139.728.772	84.598.938	224.327.710	-	173.974.451,00	
	IMPREVISTOS	1%	13.734.557				4.818.234	2.917.205	7.735.439	-	5.999.119,00	
	UTILIDAD	6%	82.407.344				28.909.401	17.503.229	46.412.630	-	35.994.714,00	
	TOTAL AIU	36%	494.444.064				173.456.407	105.019.372	278.475.779	-	215.968.285,00	
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	0%					-	-	-	-	-	
	COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS		1.867.899.795				655.279.760	396.739.850	1.052.019.610		815.880.185	

AMORTIZACION ANITICIPO												
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA												

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	1.426.801.042,00			V/R ANTICIPO:		-		
V/R ADICIONES:	441.098.753			% ANTICIPO :		-		
V/R ACTUAL CONTRATO:	1.867.899.795			% RETEGARANTIA :		-		

NO.	DESCRIPCIÓN ACTAS PARCIALES	FECHA	VALOR ACTA	AMORTIZACIÓ	RETENCIÓN GARANTÍA	ACUMULADO AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR ACUMULADO ACTAS
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	11/03/24	172.520.031	0	0	0	0	172.520.031
2	ACTA PARCIAL DE OBRA No 2	11/05/24	300.060.416	0	0	0	0	472.580.447
3	ACTA PARCIAL DE OBRA No 3	02/12/24	182.699.313	0	0	0	0	655.279.760
4	ACTA PARCIAL DE OBRA No 4	10/12/24	396.739.850	0	0	0	0	1.052.019.610
TOTALES			1.052.019.610	0	0	0	0	1.052.019.610

El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales por parte del contratista

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoria y/o supervisión y el contratista realizan las mediciones en campo y de las revisiones efectuadas por la Interventoría.

La presente acta no exime al contratista de reparar, y/o enmendar las obras aquí contempladas o resarcir los daños por causas que le sean imputadas al contratista y queda sujeta en un todo a la liquidación del contrato.

EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

EL INTERVENTOR:
Firma:
Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ
REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

VB. INDERVALLE
Firma:
Nombre: JUAN CARLOS RUEDA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CG3

CONSORCIO GRUPO 3
INTERVENTORIA

Distrito Santiago de Cali, Diciembre 10 de 2024 CG3B-056O-2024

Arquitecto
JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
Supervisor Contrato de Interventoría No. IND – 23 - 4484
Instituto del Deporte, la Educación Física y La Recreación
INDERVALLE
La Ciudad

Referencia: Contrato de obra **IND-23-5027**, cuyo objeto es: " CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES GRUPO 2 FRENTE 1: ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "

Asunto: Acta de Obra No. 04

CONTRATO No.	IND – 23 - 5027
FECHA DEL CONTRATO:	DICIEMBRE 2023
OBJETO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES GRUPO 2 FRENTE 1: ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FISICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE
CONTRATISTA:	CONSTRUPACICOL S.A. S ZOMAC - NIT 901.526.894-4 Representante Legal BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
INTERVENTOR:	CONSORCIO GRUPO 3 - NIT. 901.769.200-6 Representante Legal JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ
VALOR CONTRATO:	$ 1.426. 801.042.oo – INCLUIDO AIU (MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.)
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	$ 172.520.031.oo
VALOR ACTA PARCIAL No. 02	$ 300.060.416.oo
VALOR ACTA PARCIAL No. 03	$ 182.699.313.oo
FECHA ACTA DE INICIO:	28/12/2023
VALOR ADICIONADO SEGUN OTROSI No.02:	$ 441.098.753.oo
VALOR TOTAL:	$ 1.867.899.795.oo – INCLUIDO AIU (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE.)
FECHA DE SUSPENSION No. 01:	14 DE JUNIO DE 2024

CALLE 18 N # 3N-70
OFICINA 401
EDIFICIO NOYRA
CALI-COLOMBIA

consorciogrupo3@gmail.com
cardenascivil99@gmail.com

301-2759200; 316-4918891, 602 668 55 24

FECHA DE AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION No. 01:	22 DE JULIO DE 2024
FECHA DE REINICIÓ No.01:	23 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE SUSPENSION No. 02:	26 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION No. 02:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIÓ No.02:	15 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSION No. 03:	23 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE REINICIÓ No.03:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
PRORROGA SEGUN OTROSI No. 02	HASTA EL 09 DE MAYO DE 2025
PORCENTAJE ACUMULADO EJECUTADO:	56.32 %

En el Distrito de Santiago de Cali, el día 10 de Diciembre de 2024, en la oficina de la interventoría, se reunieron: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1006.166.501, en calidad de Representante Legal del **CONSTRUPACICOL S.A.S ZOMAC** NIT. 901. 526.894-4, como contratista y JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.700.426 en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO GRUPO 3** NIT. 901.769.200-6, como Interventor del Contrato No. IND – 23 - 5027, con el propósito de elaborar y suscribir la presente acta, en los siguientes términos:

En mi calidad de interventor del Contrato No. IND – 23 - 5027, manifiesto que he recibido por parte del Contratista y a entera satisfacción, el resultado en la obra realizada en el frente de obra que hace parte del Contrato:

FOTO No. 01	DESCRIPCIÓN: ADECUACION TERRENO PARA LOSA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA	FOTO No. 02	DESCRIPCIÓN: ADECUACION TERRENO PARA LOSA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA
		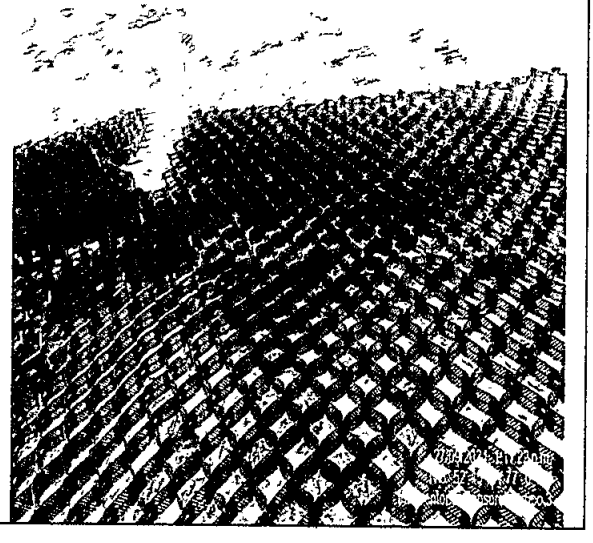	

FOTO No. 03	DESCRIPCIÓN: ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA.

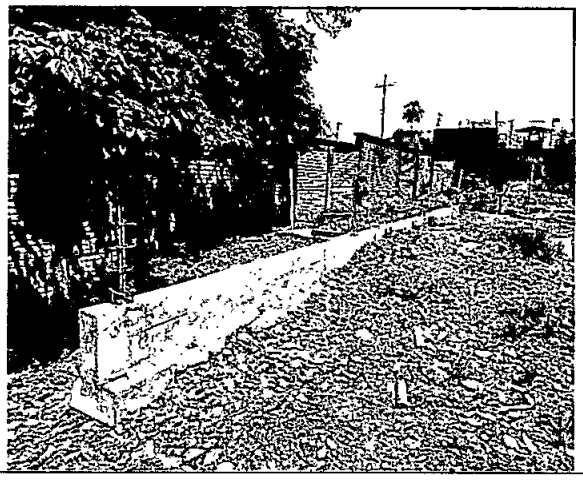

FOTO No. 04	DESCRIPCIÓN: ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA.

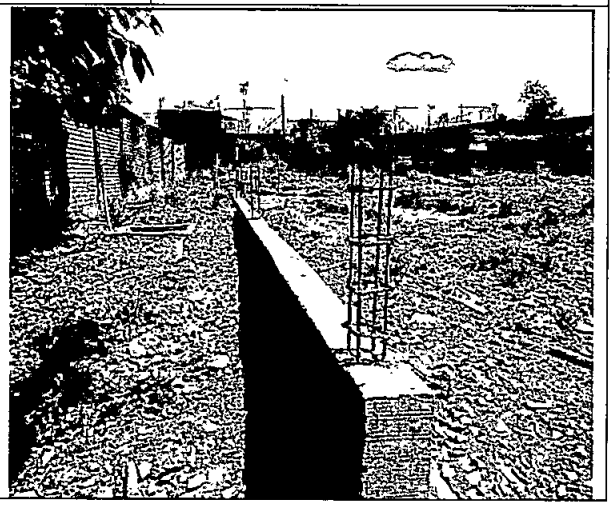

FOTO No. 05	DESCRIPCIÓN: ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA.

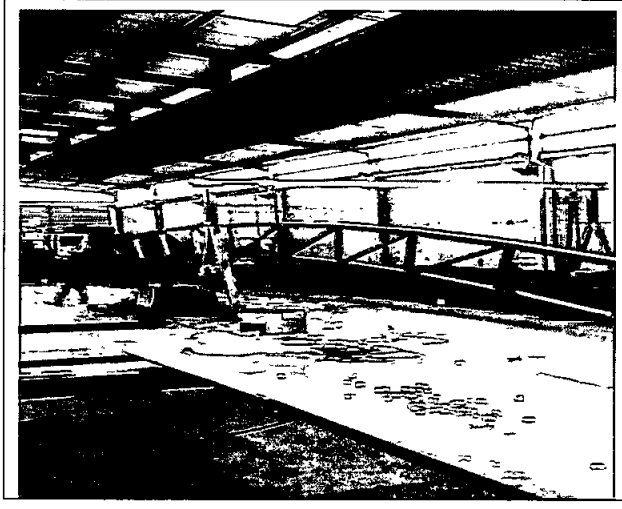

FOTO No. 06	DESCRIPCIÓN: ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA.

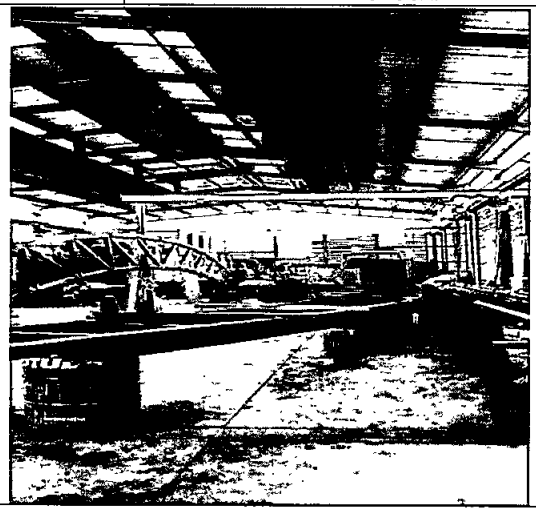

FOTO No. 07	DESCRIPCIÓN: ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA.	FOTO No. 08	DESCRIPCIÓN: ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA.

El detalle de liquidación de la presente acta parcial se encuentra en el paquete de informe del contratista y en el acta de avance de obra.

Que el Contratista ha entregado los informes de avance correspondiente a los períodos del:

Del 3 de diciembre al 10 de diciembre de 2024

EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRA:

ACTA	FECHA ACTA	VALOR DEL ACTA	VALOR ACUMULADO
ACTA 1	11/03/2024	$ 172.520.031.oo	$ 172.520.031.oo
ACTA 2	11/05/2024	$ 300.060.416.oo	$ 472.580.447.oo
ACTA 3	2/12/2024	$ 182.699.313.oo	$ 655.279.760.oo
ACTA 4	10/12/2024	$ 396.739.850.oo	$ 1.052.019.610.oo

Que el Contratista acreditó el pago de los aportes de sus empleados, al sistema de Seguridad Social y Parafiscales mediante certificación firmada por el Representante Legal.

Que, a la fecha de la presente acta, considero procedente en mi calidad de INTERVENTOR, autorizar el pago, por valor DE TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 396.739.850..oo) al CONTRATISTA CONSTRUPACICOL S.A. S ZOMAC con NIT. 901.526.894-4.

Para constancia se firma a los diez (10) días de Diciembre de 2024, la presente acta por quienes en ella intervinieron:

El Interventor,

JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO 3

El Contratista de Obra,

BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
Representante Legal
CONSTRUPACICOL S.A. S ZOMAC

Copia: Archivo

Espacio para Logo Corporativo

CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC
NIT 901.526.894-4
MZ H14A BARRIO HUASIPANGA
Tel: (undefined) 3218005123 - Ext. undefined
Mocoa - Colombia
construpacificosaszomac@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 14

Señores	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA		
NIT	805.012.896-4	**Teléfono**	(602) 5560112 - Ext. 000
Dirección	CR 36 5B 3 65 BRR SAN FERNANDO	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2024, 17:48
Expedición	18/12/2024, 17:56
Vencimiento	17/01/2025

Ítem	Descripción	Valor Impto.Rete.	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	396,739,850.00	396,739,850.00

Total ítems: 1

Total Bruto	396,739,850.00
Total a Pagar	396,739,850.00

Valor en Letras:
Trescientos noventa y seis millones setecientos treinta y nueve mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-17 por $ 396,739,850.00

Observaciones:
RETENCIONES EN LA FUENTE:
CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC NIT 901.526.894-4 TIENE BENEFICIO DE ACUERDO AL DECRETO 1650 DE 2017 ARTÍCULO 1.2.1.23.1.10. la tarifa de retención en la fuente se calculará en forma proporcional al porcentaje de la tarifa del impuesto sobre la renta y complementario de la sociedad beneficiaria, así: MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA: AÑO 2024 25%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068699036 aprobado en 20240409 prefijo FV desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

- Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa

CUFE: e519081c5525afaf8ba586e2a49d3e65dcc20882e0267952ac4a167936ef7b6d29a74e1bdaf61305c1fb0896a4c9a323

INDERVALLE

ORTE, LA EDUCACION FISICA Y RECREACION DEL

NIT

COMPROBANTE EGRESO No: 32087

CON AFECTACIÓN FECHA: 24/12/2024

A FAVOR DE: CONSTRUPACICOL S.A.S ZOMAC **CEDULA O NIT: 901526894**

DESCRIPCION: RP-19008-2024 PAGO FACT FV14 ACTA NO. 4 POR VALOR 396.739.850 OTROSI No. 02 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA IND-23-5027 (CJ-7141)

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
31612	1159309	396,739,850.00	58,320,756.00	1,983,699.00	0.00	336,435,395.00
	TOTAL	396,739,850.00	58,320,756.00	1,983,699.00	0.00	336,435,395.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO BENEFICIARIO		VALOR
246784	Traslado	105	16500330-2 AV VILLAS	901526894	CONSTRUPACICOL S.A.S ZOMAC	336,435,395.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
244023001	CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD 5%	19,836,992.00
244024004	TASA PRODEPORTE 2,5% DEC. 1405-2020	9,918,496.00
244035001	EST. PROUNIVALLE: 2%	7,934,797.00
244035002	EST, PRODESARROLLO: 2%	7,934,797.00
244035003	EST. PROHOSPITALES: 1%	3,967,398.00
244035004	EST. PROCULTURA: 1%	3,967,398.00
244035006	EST. PROUCEVA: 0,5%	1,983,699.00
244035007	EST. PROUPACIFICO: 0,5%	1,983,699.00
244035022	EST. PRO ELECTRIFICACION RURAL: 0.2%	793,480.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243626001	RETEFUENTE 2% CONSTRUC OBRA PUBLICA	1,983,699.00

TESORERÍA

ELABORADO POR:CLAUDIA MILENA ORTEGA DORADO

CONSTRUPACICOL S.A.S
ZOMAC

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES

Yo, **CARLOS ALBERTO ANACONA ORTEGA**, identificado con C.C. No. 5.348.778 de Colón Putumayo, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la Empresa **CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC** con Nit 901526894-4 de la cual soy el Revisor Fiscal ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de seguridad social (Salud y Pensiones), ARL señalados en el artículo 50 de la Ley 789 de 2022, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por sus conceptos.

La empresa se encuentra exonerado del pago de parafiscales y salud de conformidad a lo preceptuado por la Ley 1429 y Ley 607.

La presente certificación, se firma a los nueve (9) días mes de diciembre de 2024.

CARLOS ALBERTO ANACONA ORTEGA
C.C. No.5.348.778 de Colón
T.P.- No. 109371-T
Revisor Fiscal

321 449 8859
PROYECTOS.CONSTRUPACICOL@GMAIL.COM
construpacificosaszomac@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
5.348.778

APELLIDOS
ANACONA ORTEGA

NOMBRES
CARLOS ALBERTO

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-OCT-1970

COLON
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

20-ENE-1989 COLON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-6400700-00168911-M-0005348778-20090813 0014871721A 1 26647128

BBVA

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **CONSTRUPACICOL S.A.SZOMAC**, identificado(a) con NIT número **901.526.894-4** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA CORRIENTE** No. **0598027217** aperturada el **4 de mayo del 2023**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **8 de noviembre del 2024.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0598027217**
Cuenta de 16 dígitos:**0598000100027217**
Cuenta de 20 dígitos:**00130598000100027217**

Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ALBERTO ANACONA ORTEGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 5348778 de COLON (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 109371-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
109371-T
CARLOS ALBERTO
ANACONA ORTEGA
C.C. 5346778
RESOLUCION INSCRIPCION 031
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DEL AREA ANDINA

28000
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

CG3

CONSORCIO GRUPO 3
INTERVENTORIA

Distrito de Santiago de Cali, 06 de agosto de 2024

CG3B-052-2024

Arquitecto
JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
Supervisor contrato de Interventoría No. IND-23-4484
INDERVALLE
e-mail: infraestructura@indervalle.gov.co infra.indervalle@gmail.com
La Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. IND-23-4484

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURIDICA E INTEGRAL DE LAS OBRAS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJUDICACION: **GRUPO 3.** CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: **MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS** PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

Asunto: ALCANCE A REMISIÓN ACTA DE MODIFICACION 02.

El suscrito, JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ en mi calidad de representante legal del CONSORCIO GRUPO 3, interventoría del contrato de obra No. IND-23-5027, cuyo objeto es: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", me dirijo a ustedes de la manera más respetuosa, con el fin de dar alcance a la entrega del ACTA DE MODIFICACION 02 remitida por el contratista CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC, en la cual, se presenta un análisis de mayores y menores cantidades referentes a actividades como el acero de la estructura metálica, el volumen de rellenos y materiales pétreos, así como, la presentación de actividades no previstas necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato.

De acuerdo con lo manifestado por el contratista en el oficio del 05 de agosto del 2024, se esboza que luego de realizar las excavaciones requeridas para la realización de la cimentación profunda de la estructura de la cubierta, y luego de realizar la demolición parcial de una franja de la placa existente (Actividad necesaria luego de realizar la reimplantación inicial del proyecto y aprobada en el balance de mayores y menores cantidades No. 01).*La situación descrita por el contratista plantea el requerimiento de ejecución de una obra necesaria dentro del contrato, como lo es la demolición total de la placa y su reconstrucción, esto como consecuencia de un hecho sobreviniente ocasionado por la infiltración de agua de lluvias y escorrentías naturales a la estructura de la placa existente, condición que se enmarca dentro de hechos de carácter de imprevisibles, intempestivos, irresistibles, extraordinarios o inminentes.*

Al respecto, cabe mencionar que la adición propuesta por el contratista de obra se enmarca dentro del concepto de una obra necesaria para cumplir con el fin del contrato que no es otro que entregar un escenario deportivo a la comunidad que redunde en su propio beneficio, logrando que el Estado cumpla su fin esencial a través de dicha contratación.

Sobre ello, la Sala de Consulta y Servicio Civil, del Consejo de Estado, mediante Concepto del 23 de agosto de 2013, Rad. 2148, al referirse al "concepto de adición en los contratos estatales", indicó que: "[d]e la jurisprudencia y la doctrina citadas se puede concluir que la adición de los contratos estatales consiste en una modificación a los mismos, efectuada por las partes, de común acuerdo, o unilateralmente por la entidad estatal, para: (i) agregar al objeto inicial del contrato bienes, obras, servicios o actividades no previstas inicialmente en dicho objeto, pero que guardan una estrecha relación con el mismo y se requieren para su debida ejecución y, en últimas, para el logro de la finalidad perseguida con el contrato (...)". negrilla fuera de texto.

Así mismo, la Sala de Consulta y Servicio Civil ha dicho que "las expresiones 'adicionar' y 'valor inicial', tienen un significado común: es el caso de un contrato que requiere de modificaciones que inciden en su valor original, no porque correspondan al simple resultado de multiplicar cantidades de obra y precios originalmente pactados, sino porque se trata de obras nuevas o distintas respecto de las contratadas, y que son indispensables para que el objeto contractual cumpla la finalidad buscada por la entidad estatal contratante". (Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 9 de septiembre de 2008, Rad. 1.920). Negrilla y subrayado fuera de texto.

Tal como lo manifiesta el contratista en su oficio, debido a las propiedades del suelo del proyecto, las cuales se pueden evidenciar en el estudio de suelos donde se expresa qué: *"(...) Capa 2: Arcilla Color café oscuro, suelos elásticos Es un suelo*

(MH) según la carta de plasticidad. Limo de alta plasticidad, limo elástico, desde los -0.40m a -10m (...)"

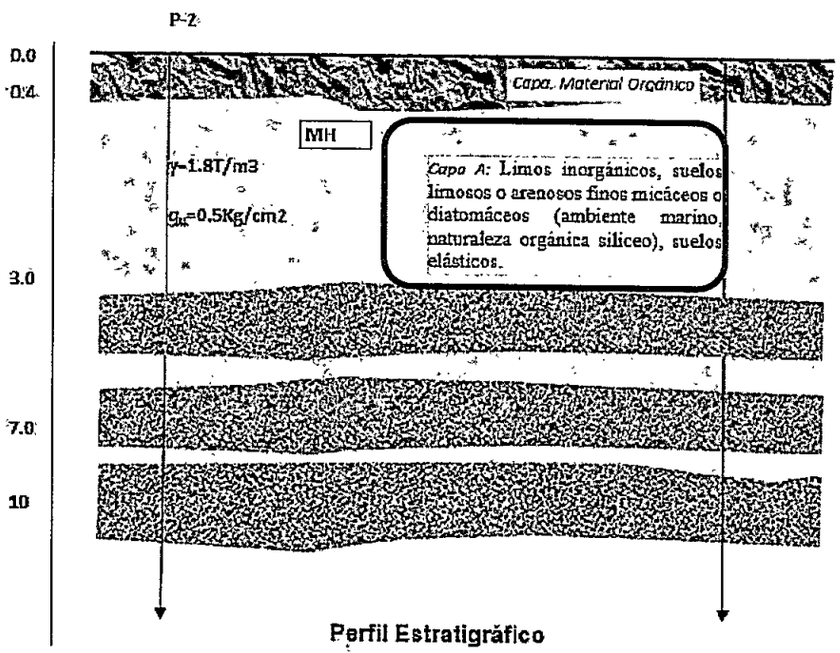

Perfil Estratigráfico

La evidenciada plasticidad de la segunda capa del terreno, aunado a la infiltración natural de agua por las condiciones de pluviosidad de la región ocasionaron fisuras en la loza existente, haciendo necesaria la demolición de la placa polideportiva que la deterioran y afectan su funcionalidad; condición que hace necesaria la intervención de la misma, con el fin de garantizar el uso adecuado del escenario deportivo.

En el oficio radicado por el contratista el día 05 de agosto de 2024, se aporta los informes hidrológicos de lluvia y registro fotográfico, que demuestran la presencia frecuente de lluvias en el lugar de la obra. Dando soporte a la solicitud realizada por parte del contratista de la necesidad de mayores cantidades e items no previstos.

Debido a esto, se genera la mayor cantidad de los ítems ya creados en el ACTA DE MODIFICACION 01, las actividades 2.9 (1.1.3) DEMOL. CONCRETO REFORZADO (M3) y 2.11 (1,2,2) RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM. (M3) y la implementación del ítem adicional 2.15 (INP 001) LOSA CONCRE.CANCHA MULTIP E=10CM 3000PSI LOSA CONCRE.CANCHA MULTIP E=10CM 3000PSI LOSA CONCRE. CANCHA MULTIP E=10CM 3000PSI (M2), este último con la cantidad total del área de la cancha múltiple, más las zonas de aislamiento.

Por lo anterior, esta interventoría avala y por lo tanto, recomienda al Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación (INDERVALLE), considerar las siguientes actividades adicionales:

- Demoler la losa existente y construir una nueva en concreto que permita restituir las condiciones del escenario para lograr una intervención integral y suplir la necesidad que se ha suscitado por el mal comportamiento del suelo ante la gran cantidad de agua acumulada, acelerando el deterioro de la placa polideportiva. Para complementar el escenario se propone generar un acabado a esta nueva superficie en concreto a realizarse, utilizando para esto una resina o recubrimiento sintético, con el ánimo de integrar las nuevas características de la superficie y entregar un escenario deportivo completo mejorando las condiciones existentes para que las personas de la comunidad tengan un espacio recreativo más cómodo y adecuado para la práctica deportiva.

- En la parte posterior de la obra colindante con la vía de acceso del municipio, debido a la nivelación y reemplazo de terreno para la estructura de la losa nueva y el ajuste a la implantación de la cancha múltiple, se presenta la necesidad de realizar un relleno lo que genera una mayor cantidad en el suministro de rocamuerta entre el eje D y F, con una altura promedio de 65 centímetros adicionales al nivel normal del relleno propuesto en el diseño estructural. Para sostener este relleno es necesario realizar una obra de contención mediante un pequeño muro tipo gavión que garantiza la estabilidad de toda la estructura.

- Complementario a esto y una vez realizadas las actividades de excavaciones, y rellenos en la red pluvial y las perforaciones profundas de las pantallas de protección y cubierta (que hacen parte del contrato), se sugiere a la entidad, el suministro de prado y recuperación paisajística en estas áreas anexas a la placa polideportiva, debido a que, el impacto mismo de la obra, ha dejado una huella de terreno desnivelado con arcillas no fértiles expuestas, el cual, visual y físicamente, no tendrá el aspecto esperado al momento de la entrega del escenario deportivo y desmejora las condiciones de este.

Se adjunta el ACTA DE MODIFICACION No.02, donde se considera los siguientes items adicionales:

INP002 REVESTIMIENTO ACRILICO SOBRE PISO EN CONCRETO M2, con el área total correspondiente a la cancha múltiple, más las zonas de seguridad.

INP 005 GAVION DE CONTENCION DE ESTRUCTURA CANCHA MULTIPLE. INCLUYE MALLA, PIEDRA RAJON, TRANSPORTE, LLENADO DE CANASTA Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

INP 003 TIERRA PARA SIEMBRA Y NIVELACION

INP 004 S.E.I. PRADO TRENZA. INCLUYE RIEGO DE PRENDIMIENTO .

Con base a lo planteado líneas atrás, se requiere para la ejecución de las actividades adicionales una prórroga del plazo de ejecución de la obra, de ciento ocenta (180) días sustentada en la realización de mayores cantidades proveniente de los ítems no previstos, sumado al proceso constructivo de la placa en concreto de la cancha múltiple, para la cual se requiere la fundición del concreto en paños cuadrados de 3x3 metros, con el fin de evitar fisuras, grietas o contracciones en el mismo concreto, por lo que, todo el proceso debe ser seccionado. Igualmente, una vez se encuentre terminada la placa en concreto se requiere para su acabado final (REVESTIMIENTO ACRILICO SOBRE PISO EN CONCRETO) una humedad especifica menor al 4% el cual, por condiciones climáticas del sitio de la obra se debe de dar el tiempo prudente para el secado del concreto y acatar las recomendaciones que realizan los instaladores de este producto que son las siguientes:

- La placa debe tener una pendiente mínima (1%) para evacuación de agua y así garantizar el empozamiento.
- La superficie debe tener algo de rugosidad, lo cual nos va a permitir tener una mejor adherencia del revestimiento.
- Las juntas de dilatación deben ser manejadas con un producto sellante flexible; aplicando de manera continua y realizando las dilataciones con disco de corte, cuidando que queden de 2 a 3 mm x debajo del nivel de la superficie.

Las demás actividades allí expuestas y según lo mostrado en los ítems adiciones el ACTA DE MODIFICACION II indica que se debe efectuar una adición presupuestal por un valor de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE $ 441.098.753,00** con el fin de lograr el alcance final del contrato, dejando claridad que, de acuerdo con lo expuesto en los comités técnicos de seguimiento se hace necesario demoler la totalidad de la cancha múltiple existente y se deberá realizar

una superficie nueva que cumpla con todos los requerimientos técnicos adheridos en la práctica de los deportes inmersos en el escenario deportivo.

Una vez expuestas las condiciones y los puntos de vista que se revisó y se concilió con el contratista Construpacicol S.A.S. ZOMAC, la interventoría Consorcio Grupo 3, recomienda a la entidad adelantar los trámites administrativos necesarios para realizar la adición y prórroga expuesta en el presente documento por los argumentos expuestos en el mismo, y considerando que se presenta como un hecho sobreviniente al desarrollo de las actividades que motivan una actividad necesario no imputable a ninguna de las partes.

De acuerdo al documento remisorio, el contratista Construpacicol S.A.S. ZOMAC, sugiere para la ejecución de las nuevas actividades, una prórroga de 180 días calendario, fijando las siguientes

CONSIDERACIONES PARA LA PRÓRROGA

En base a lo planteado líneas atrás, se requiere para la ejecución de las actividades adicionales una prórroga al plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario sustentada en la realización de mayores cantidades proveniente de los ítems no previstos, sumado al proceso constructivo de la placa en concreto de la cancha múltiple, la cual, el proceso constructivo de la fundición del concreto, se realiza en paños cuadrados de 3x3 metros, con el fin de evitar fisuras, grietas o contracciones en el mismo concreto, por lo que, todo el proceso debe ser seccionado. Igualmente, una vez se encuentre terminada la placa en concreto se requiere para su acabado final (REVESTIMIENTO EN RESINA SOBRE PISO EN CONCRETO) una humedad especifica menor al 4% el cual, por condiciones climáticas del sitio de la obra se debe de dar el tiempo prudente para el secado del concreto y acatar las recomendaciones que realizan los instaladores de este producto que son.

Estas recomendaciones se realizan debido a la humedad que se debe de garantizar en el proceso de instalación que debe de poseer la superficie, más cuando se aplicaría sobre una zona costera donde la humedad es alta.

Según lo expuesto, la Interventoría Consorcio Grupo 3 considera que son válidas las apreciaciones del contratista, teniendo en cuenta los tiempos de ejecución de la placa en concreto y los tiempos de fraguado del mismo elemento y las condiciones para la aplicación de la resina acrílica.

Se deberá dar espera a que las condiciones contractuales de los tiempos estén por agotarse y evaluar en el mes de junio, las condiciones de la ejecución del proceso, con el fin de otorgar la prórroga en tiempo al contrato de obra, sin embargo, esta interventoría, considera pertinente y viable la solicitud efectuada por el contratista.

Estaremos atentos a sus comentarios, con el fin de efectuar la impresión de los documentos y la presentación de manera física.

Cordialmente,

CONSORCIO GRUPO 3
Interventoría
JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ
Representante Legal

Copia: Ing. Álvaro José Bazurto – Profesional apoyo supervisión de Interventoria
Ing. Guillermo Villegas González – Director de Obra
Archivo

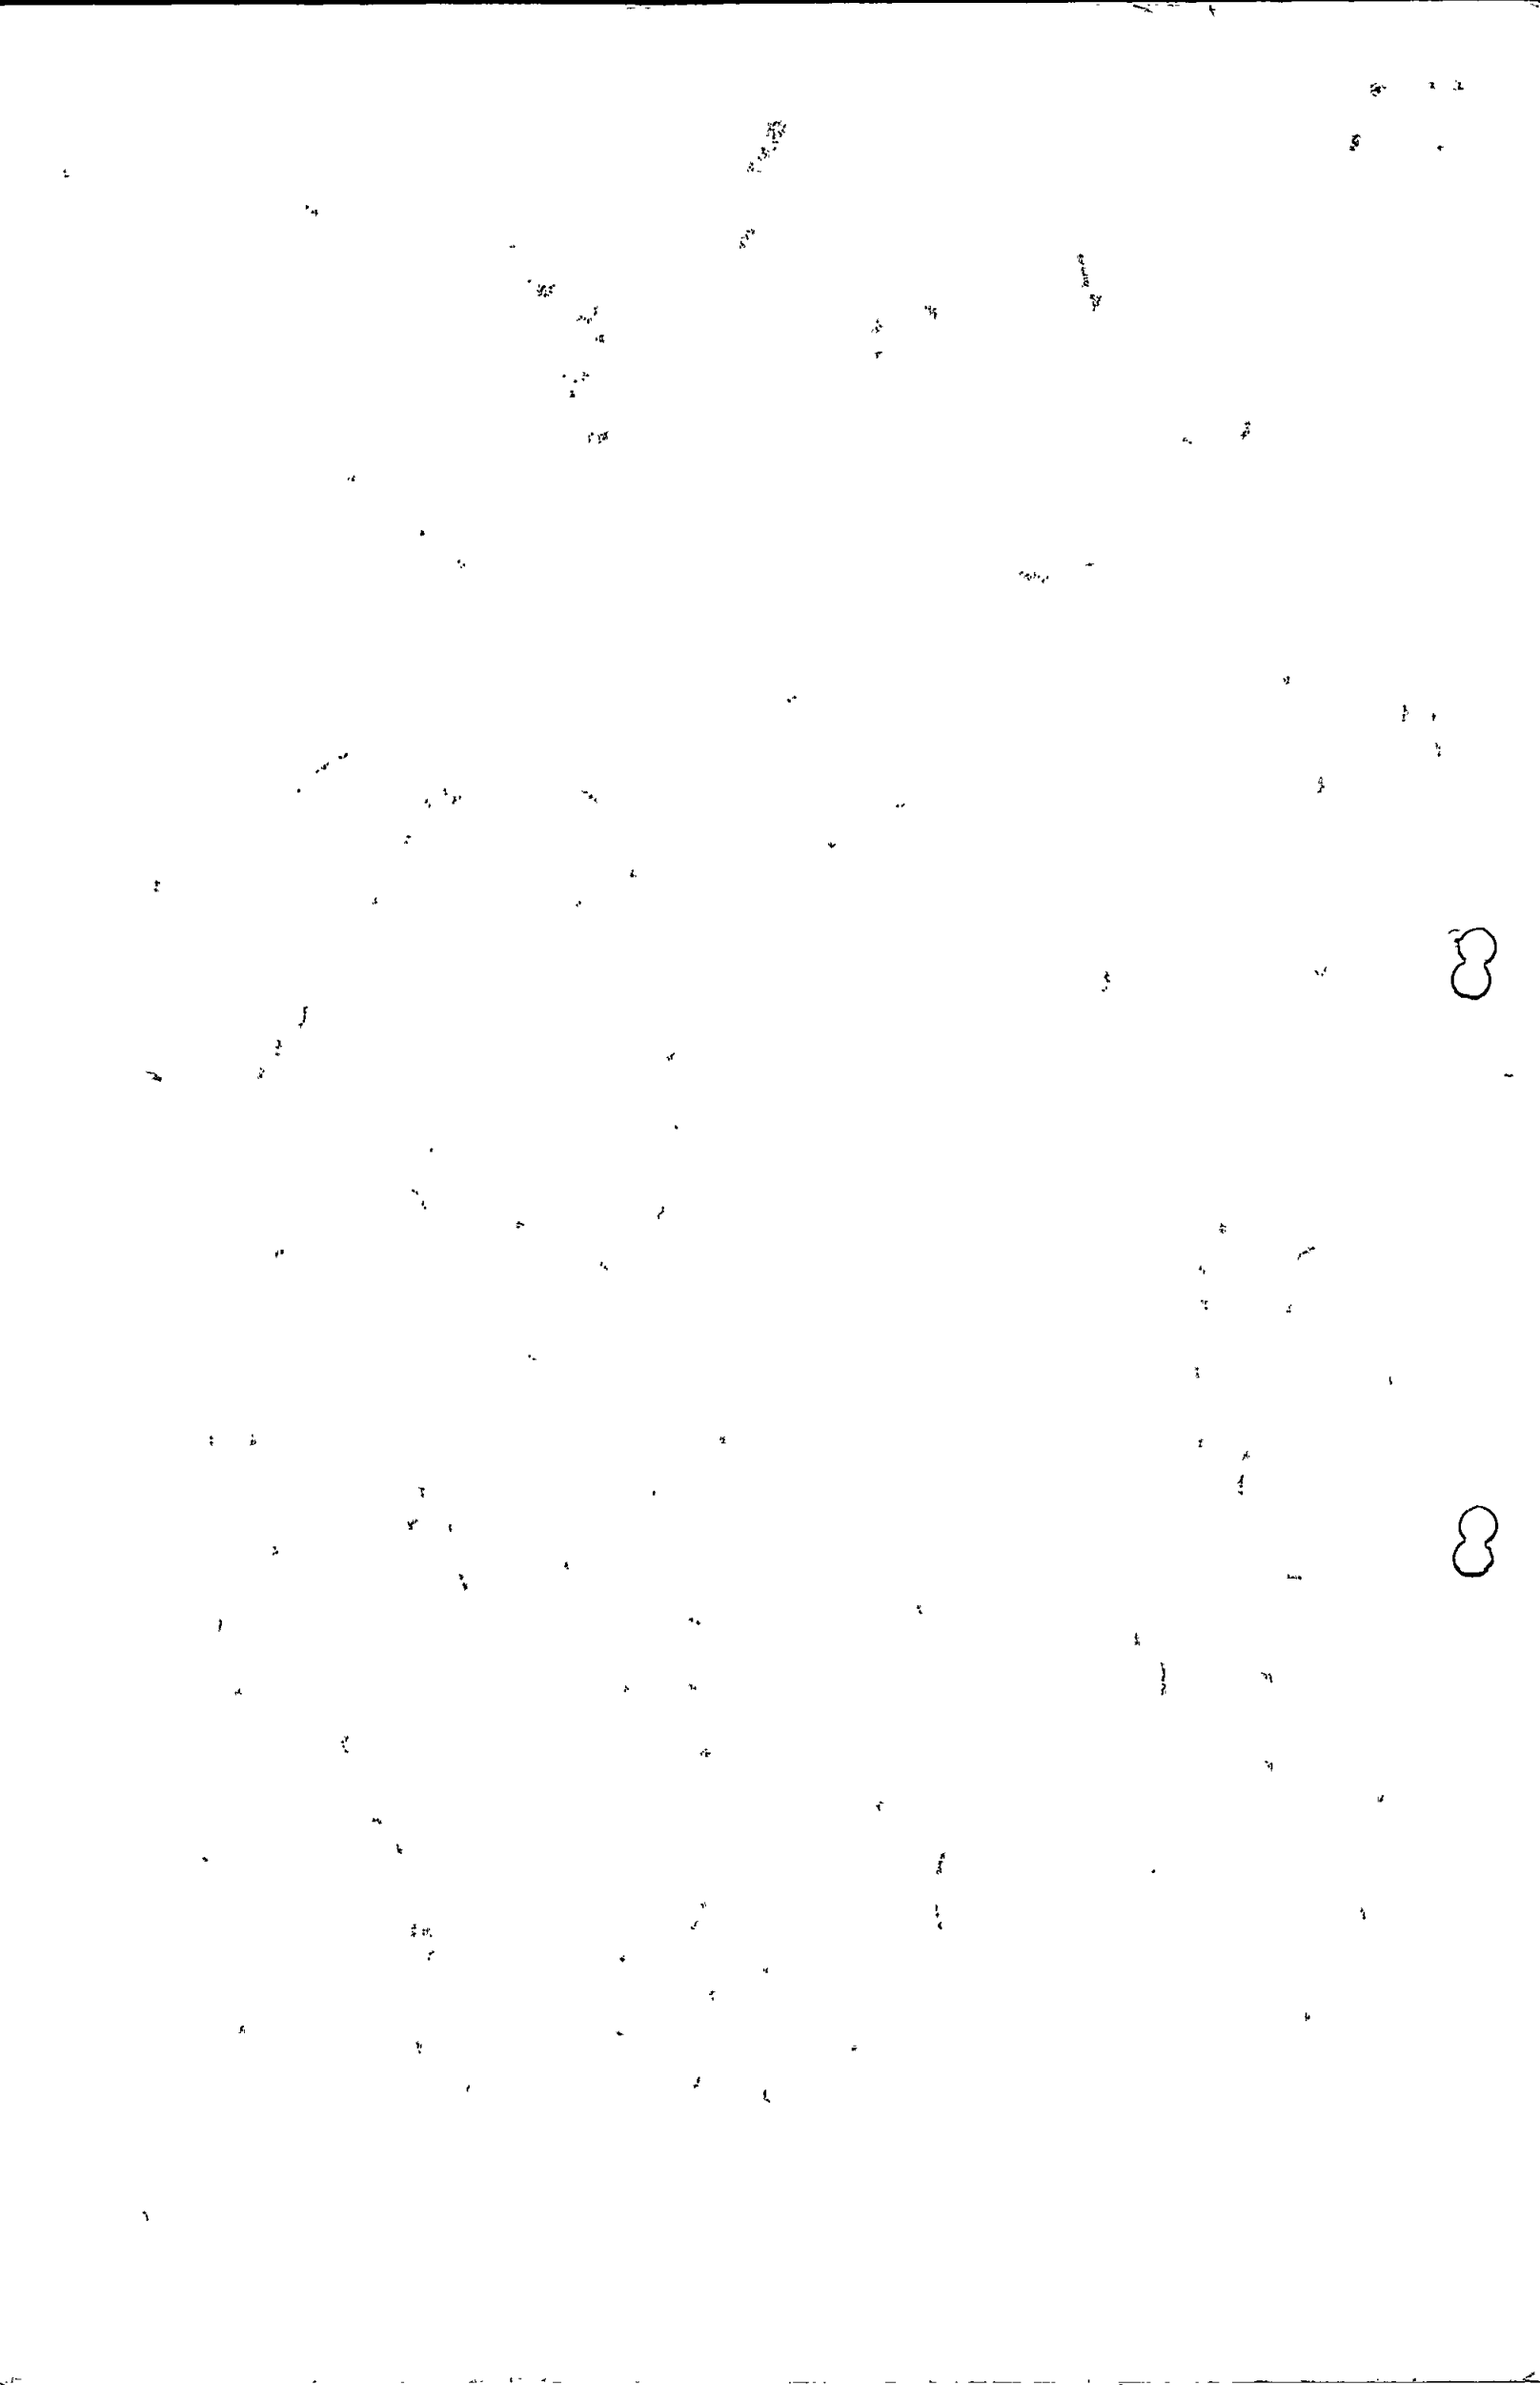

Departamento del Valle del Cauca
Gobernación

paraíso de todos

INDERVALLE

2024-09-27 10:50:00 GOBERNACION DEL VALLE
ASUNTO: PRESENTACION AJUSTE AL PROYECTO DE INVERSION
CLASE CORRES.: PQRS-PETICION DE INTERES N° COMUNICACION: SN
DESTINATARIO: MARIA DEL PILAR CARABALI REMITENTE: INDERVALLE
DEPENDENCIA: SUB TECNICA DE APOYO A LA GESTION- PLAN
RADICADO POR: NMUNOZL N°FOLIO: 2
2024043263
RECIBIDO

PE-FO-220-016

200.16.01
200-477-2024

Santiago de Cali, 25 de septiembre de 2024

Doctor
Ricardo Jose Castro Iragorri
Director
Departamento Administrativo de Planeación
Gobernación Valle del Cauca
Cali

REFERENCIA: Presentación ajuste al proyecto de inversión "**MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**", identificado con código BPIN **2022003760006**

Cordial saludo,

En mi calidad de representante legal del Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca-Indervalle, entidad designada como ejecutora por el OCAD Región Pacifico para el proyecto de inversión denominado "**MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**", identificado con código BPIN **2022003760006**, aprobado mediante Acuerdo No. 019 del 21 de abril del 2023 del OCAD Región Pacifico, presento a consideración el ajuste que tiene como objetivo realizar un incremento en el valor total del proyecto con recursos propios de INDERVALLE, por un valor de MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA PESOS M/CTE ($1.209.195.090), los cuales equivalen a un 27,14% del valor total del proyecto inicialmente aprobado y una ampliación en el horizonte de ejecución del proyecto por 180 días calendarios adicionales al horizonte inicial.

Por lo tanto, manifiesto que se ha realizado un análisis de la situación del proyecto viabilizado, generándose la necesidad de realizar modificaciones de las variables definidas en el Acuerdo 07 del 26 de mayo de 2022, en su Capítulo 5, Ajustes y Liberaciones, Sección 1, Ajustes, Subsección 2, Ajustes a proyectos de inversión aprobados, Artículo 4.5.1.2.1. Literales a, b y d; y Artículo 4.5.1.2.3.; y con lo referente a la Ley 2056 del 2020 y el Decreto 1821 del 2020 por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías.

Tabla 1. Fuentes de financiación del proyecto y valor del ajuste

Entidad	Valor Inicial (Aprobado)	Valor de Ajuste Solicitado (+/-)	Valor Total
VALLE DEL CAUCA - Asignación para la inversión regional 60%	4.454.666.158	0	4.454.666.158
INDERVALLE - Propios	0	1.209.195.090	1.209.195.090
Total General	4.454.666.158	1.209.195.090	5.663.861.248

Para ampliar la información referente al presente ajuste, se anexa toda la documentación establecida en la normatividad del Sistema General de Regalías y demás soportes correspondientes:

- Formato de identificación de trámites.
- Certificado de Balance de Ejecución Física y Financiera.
- Certificado de No Altera Viabilidad.
- Documento Soporte Técnico, Jurídico y Financiero que soporta el ajuste.
- Anexos Técnicos del Proyecto.

Dado en Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

ANA MILENA OROZCO CAÑAS
Gerente Indervalle

Elaboró: Jose Alexander Torres Rengifo	Cargo: Contratista Formulación	Firma:
Revisó: Isabela Gutiérrez Zamora	Cargo: Contratista Apoyo a la supervisión	Firma:
Revisó: Álvaro José Bazurto Cubillos	Cargo: Contratista Apoyo a la supervisión	Firma:
Revisó: Diana Santos	Cargo: Abogada contratista	Firma:
Revisó: Juan Carlos Rueda Ángel	Cargo: Supervisor del contrato	Firma:
Revisó: Ana Yibi Erazo Hurtado	Cargo: Contratista Líder apoyo a la supervisión	Firma:
Revisó: Sandra Patricia Ospina Valencia	Cargo: Secretaria General	Firma:
Aprobó: Nicolas Triana Castillo	Cargo: Subgerente Infraestructura Deportiva	Firma:

Departamento del
Valle del Cauca
Gobernación
Despacho

paraíso de todos

1.01.23- 2024044185

Santiago de Cali, 09 de octubre de 2024

Doctora
LINA MARIA JORDÁN
Secretaria Privada (E)
Despacho de la Gobernadora

Asunto: Solicitud de firma para acta de aprobación No. 040

Cordial saludo,

De manera atenta, solicito para la firma de la Señora Gobernadora DILIAN FRANCISCA TORO TORRES, acta de aprobación No. 040 del 09 de octubre del presente año para el proyecto "MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" BPIN 2022003760006.

Agradezco por la atención prestada.

Atentamente,

MARIA LUCERO TURRIAGO CERQUERA
Asesora de Despacho
Gobernación del Valle del Cauca

Transcribió: Ruby Esmeralda Velez Toro, Apoyo a la Gestión

1.01.23- 2024043797

Departamento del
Valle del Cauca
Gobernación
Departamento
Administrativo de Planeación

paraíso de todos

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
DEL VALLE DEL CAUCA
ACTA No. 040

El Departamento Administrativo de Planeación del Valle del Cauca, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 2056 de 2020, el Decreto 1821 de 2020 convocó a los miembros del Comité Técnico para la Aprobación Directa de los Proyectos del Sistema General de Regalías – SGR de la Gobernación de Valle del Cauca a participar de la sesión presencial programada para realizarse el día 9 de octubre de 2024.

MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO PARA LA APROBACION DE PROYECTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

Participaron en la sesión presencial los siguientes miembros:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
Dilian Francisca Toro Torres	Departamento del Valle del Cauca	Gobernadora
Ricardo José Castro Iragorri	Departamento del Valle del Cauca	Director del Departamento Administrativo de Planeación
Jean Paul Cutiva Durán	Departamento del Valle del Cauca	Asesor del despacho

DESARROLLO DE LA SESIÓN

El Departamento Administrativo de Planeación del Valle del Cauca, dio la bienvenida a los miembros del Comité Técnico para la Aprobación Directa de los Proyectos del Sistema General de Regalías – SGR de la Gobernación de Valle del Cauca a la sesión presencial No.40, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 2056 de 2020, Decreto 1821 de 2021.

1. ORDEN DEL DIA

1. Lectura del Orden del dia.
2. Presentación de proyectos en trámite y saldos disponibles por fuente de financiación.
3. Someter a consideración de los miembros del Comité Técnico de Aprobación de los Proyectos del Sistema General de Regalías – SGR de la Gobernación del Valle del Cauca, ajustes que deben de ser decididos por la entidad o instancia que aprobó el proyecto de inversión según articulo 4.5.1.2.3 del acuerdo 07 de 2022 de la comisión rectora.

No	No. BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETO
3.1	2022003760006	Mejoramiento a escenarios deportivos y recreativos para los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el Departamento del Valle del Cauca	Realizar un incremento en el valor total del proyecto con recursos propios de INDERVALLE, por un valor total de **MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA PESOS M/CTE ($1.209.195.090)** los cuales equivalen a un **27,14%** del valor total del proyecto inicialmente aprobado y una ampliación en el horizonte de ejecución del proyecto por 180 días calendarios adicionales al horizonte inicial.

2. PRESENTACIÓN DE INFORMES:

El Departamento administrativo de planeación del Valle del Cauca, realizó la presentación de los proyectos en trámite y los saldos disponibles por fuente de financiación.

3. **SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DE APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR DE LA GOBERNACIÓN DE VALLE DEL CAUCA, AJUSTES QUE DEBEN DE SER DECIDIDOS POR LA ENTIDAD O INSTANCIA QUE APROBÓ EL PROYECTO DE INVERSIÓN SEGÚN ARTÍCULO 4.5.1.2.3 DEL ACUERDO 07 DE 2022 DE LA COMISIÓN RECTORA.**

No	No. BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETO
3.1	2022003760006	Mejoramiento a escenarios deportivos y recreativos para los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el Departamento del Valle del Cauca	Realizar un incremento en el valor total del proyecto con recursos propios de INDERVALLE, por un valor total de **MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA PESOS M/CTE ($1.209.195.090)** los cuales equivalen a un **27,14%** del valor total del proyecto inicialmente aprobado y una ampliación en el horizonte de ejecución del proyecto por 180 días calendarios adicionales al horizonte inicial.

El Departamento administrativo de planeación del Valle del Cauca antes de someter a consideración el siguiente ajuste realizó las siguientes observaciones:

- El ajuste que se somete a consideración del comité técnico para la aprobación de los proyectos del Sistema General de Regalías – SGR de la Gobernación de Valle del Cauca, cuenta con cumplimiento de requisitos establecidos en el acuerdo 7 de la comisión rectora del 26 de mayo de 2022 "por el cual se adiciona el Acuerdo Único del Sistema General de Regalías definiendo los lineamientos para la priorización y aprobación y el trámite de los ajustes y liberaciones de los proyectos de inversión y se dictan otras disposiciones", Capítulo 5 Ajustes y Liberaciones, Ajustes a Proyectos de Inversión Aprobados, Artículo 4.5.1.2.1 y Artículo 4.5.1.2.3 trámite para los ajustes que deben ser decididos

por la entidad o instancia que aprobó el proyecto de inversión. Las certificaciones y soportes que en este acuerdo se mencionan fueron cargados en el Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías (SUIFP) el día **4 de octubre de 2024.**

- Que El Decreto 1821 de 2020, en el artículo 1.2.1.2.14 determina que, con posterioridad a su registro, los proyectos podrán ser susceptibles de ajuste, siempre y cuando las modificaciones introducidas no cambien el alcance del mismo, entendido como los objetivos generales y específicos, los productos y la localización, conforme con los lineamientos que defina el Departamento Nacional de Planeación y adopte la Comisión Rectora.

- Que El Decreto 1821 de 2020, en el artículo 1.2.1.2.14 establece que los ajustes, previo trámite y aprobación, deberán registrarse por la instancia que presentó el proyecto, en el Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías, previo a la ejecución presupuestal.

- Que la Viabilidad, para el Sistema General de Regalías es entendida como el cumplimiento de las condiciones y criterios jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y sociales requeridos.

- Que la gerente del Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación del Valle del Cauca INDERVALLE la señora **Ana Milena Orozco Cañas** con base en lo establecido en el Artículo 4.5.1.2.4 del Acuerdo 7 del 26 de mayo de 2022 de la Comisión Rectora, emitió concepto técnico de Viabilidad **FAVORABLE** del ajuste al proyecto de inversión el día **4 de octubre de 2024.**

- Que en el marco del Artículo 1.2.1.2.24 del Decreto 1821 de 2020, la ejecución de los proyectos de inversión se adelantará, con estricta sujeción al régimen presupuestal definido en la Ley 2056 de 2020, al de contratación pública y las demás normas legales vigentes. La entidad designada como ejecutora del proyecto de inversión, garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información requerida por el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control.

El Comité Técnico sometió a decisión el ajuste del proyecto antes citado, obteniendo el siguiente resultado:

NOMBRE	APRUEBA
Dilian Francisca Toro Torres	POSITIVO
Ricardo José Castro Iragorri	POSITIVO
Jean Paul Cutiva Duran	POSITIVO

Con base en la anterior votación, el comité Técnico **APRUEBA** el ajuste que tiene por objeto Realizar un incremento en el valor total del proyecto con recursos propios de INDERVALLE, por un valor total de **MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA PESOS M/CTE ($1.209.195.090)** los cuales equivalen a un **27,14%** del valor total del proyecto inicialmente aprobado y una ampliación en el horizonte de ejecución del proyecto por 180 días calendarios adicionales al horizonte inicial.

CÓDIGO BPIN	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	FASE	VALOR TOTAL
2022003760006	Mejoramiento a escenarios deportivos y recreativos para los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el Departamento del Valle del Cauca	ID 59 - DEPORTE Y RECREACIÓN	FACTIBILIDAD - FASE 3	$5.663.861.248

Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor
Departamento – Valle del Cauca	SGR – Asignación para la Inversión Regional (60%)	2023	$ 4.454.666.158
Valor Aprobado	$ 4.454.666.158		

COFINANCIACIÓN			
Fuentes	**Tipo de recurso**	**Cronograma MGA**	**Valor**
Empresas Públicas - INDERVALLE	Propios	2024	$ 1.209.195.090

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	**Tipo de recurso**	**Vig. Presupuestal SGR**	**Valor Aprobado**	**Vig. Futura Aprobada**	**Vr Aprobado Vig. Futura**	**Bienio en el que se recibe el bien o servicio:**
Departamentos – VALLE DEL CAUCA	Fuente homologada Asignación para la inversión regional 60%	2023 - 2024	$ 4.454.666.158	N/A	N/A	N/A
Empresas Públicas - INDERVALLE	Propios	2024	$ 1.209.195.090	N/A	N/A	N/A
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	INDERVALLE NIT 805012896-4			Valor	$ 5.015.449.543	
Entidad pública designada para contratar la interventoría del proyecto	INDERVALLE NIT 805012896-4			Valor	$ 648.411.705	

Con fundamento en lo anterior y lo dispuesto en el Decreto 1821 de 2020, el comité técnico para la aprobación de proyectos:

DECIDE:

1. **APROBAR** el ajuste al proyecto de inversión identificado con el BPIN 2022003760006 denominado Mejoramiento a escenarios deportivos y recreativos para los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el Departamento del Valle del Cauca el cual tiene por objeto Realizar un incremento en el valor total del proyecto con recursos propios de INDERVALLE, por un valor total de **MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA PESOS M/CTE ($1.209.195.090)** los cuales equivalen a un **27,14%** del valor total del proyecto inicialmente aprobado y una ampliación en el horizonte de ejecución del proyecto por 180 días calendarios adicionales al horizonte inicial.
2. **COMUNICAR** al Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación del Valle del Cauca INDERVALLE identificado con el NIT 805012896-4 como ejecutor del proyecto Mejoramiento a escenarios deportivos y recreativos para los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el Departamento del Valle del Cauca el contenido de la presente Acta.
3. **PUBLICAR** el contenido del presente acto administrativo a través de la plataforma SUIFP SGR dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la aprobación del ajuste al proyecto de inversión, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 07 de 2022 expedido por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.

En constancia, se firma la presente el acto administrativo a los 9 días del mes de octubre de 2024.

DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Gobernadora del Valle del Cauca

RICARDO JOSÉ CASTRO TRAGORRI
Director del Departamento Administrativo de Planeación

JEAN PAUL CUTIVA DURAN
Asesor del Despacho de la Gobernadora

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:	PM-FO-600-012
INDERVALLE		VERSIÓN:	2
	ACTA DE MAYORES, MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS, BALANCE DE OBRA PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	APROBACIÓN	18/OCT/23

FECHA PRESENTE ACTA	5/08/2024	ACTA No.	2
CONTRATO No.	IND-23-5027		
OBJETO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"		
CONTRATISTA :	CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	NIT - CC	901526894-4
VALOR:	$ 1.426.801.042,00		
PLAZO DE EJECUCION	185 DIAS		
FECHA DE INICIO	28 DE DICIEMBRE DE 2023		
PRORROGAS	N/A		
SUSPENSION No. 01	14 DE JUNIO DE 2024		
AMPLIACION SUSPENSION No. 01	22 DE JULIO DE 2024		
REINICIO	N/A		
FECHA DE TERMINACION	08 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
INTERVENTOR:	CONSORCIO GRUPO G3	NIT - CC	901769200-8
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL		

Mediante el presente

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO. CONDICIONES ACTUALES			CONDICIONES SEGUN ACTA MODIFICACION 1		CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL, NUEVAS CONDICIONES CONTRACTUALES	VALOR TOTAL
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL $	CANTIDAD	VALOR TOTAL $	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1.1	PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	666,81	4.390	2.927.296,00	668,76	2.927.076,00	-	-	-	-	666,76	2.927.076,00
1.1.2	EXCAVACION MANUAL TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	35,55	21.850	776.768,00	30,06	656.811,00	-	-	-	-	30,06	656.811,00
1.1.3	DEMOL. CONCRETO REFORZADO	M3	0,88	177.170	155.910,00	1,44	255.125,00	-	-	-	-	1,44	255.125,00
1.1.4	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	37,93	19.780	750.255,00	40,95	809.991,00	-	-	-	-	40,95	809.991,00
1.1.5	PODA DE ARBOLES	UND	1,00	126.280	126.280,00	1,00	126.280,00	-	-	-	-	1,00	126.280,00
1.1.6	DESMONTE JUEGO	UND	2,00	53.270	106.540,00	2,00	106.540,00	-	-	-	-	2,00	106.540,00
				SUBTOTAL CAP. 1.1 PRELIMINARES:	4.843.049		4.881.823						4.881.823
1.2	CIMENTACION												
1.2.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	25,91	21.850	566.184,00	50,84	1.110.864,00	-	-	-	-	50,84	1.110.864,00
1.2.2	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	64,56	19.780	1.276.997,00	66,09	1.307.293,00	-	-	-	-	66,09	1.307.293,00
1.2.3	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	38,00	27.600	1.048.800,00	37,00	1.021.200,00	-	-	-	-	37,00	1.021.200,00
1.2.4	PILOTE CONCRETO REFORZADO	M3	23,75	630.870	14.983.163,00	23,75	14.983.440,00	-	-	-	-	23,75	14.983.440,00
1.2.5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	4141,87	6.200	25.679.594,00	3.932,45	24.381.207,00	-	-	-	-	3.932,45	24.381.207,00
1.2.6	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	6,00	491.180	2.947.080,00	6,00	2.947.080,00	-	-	-	-	6,00	2.947.080,00
1.2.7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	402,28	6.200	2.494.136,00	401,76	2.490.912,00	-	-	-	-	401,76	2.490.912,00
1.2.8	VIGA CIMIENTO ENLACE 4000 PSI 28.0MPA	M3	13,00	865.180	11.247.340,00	13,00	11.247.340,00	-	-	-	-	13,00	11.247.340,00
1.2.9	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	1802,64	6.200	11.176.368,00	1.795,60	11.132.720,00	-	-	-	-	1.795,60	11.132.720,00
1.2.10	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	6,29	551.830	3.471.011,00	6,14	3.390.444,00	-	-	-	-	6,14	3.390.444,00
1.2.11	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	2211,28	6.200	13.709.936,00	2.853,02	17.688.749,00	-	-	-	-	2.853,02	17.688.749,00
1.2.12	SIKAGROUT PARA ANCLAJES	KG	731,86	29.540	21.619.144,00	614,40	18.149.376,00	-	-	-	-	614,40	18.149.376,00
				SUBTOTAL CAP. 1.2 CIMENTACION:	110.219.703		109.850.625,00						109.850.625,00
1.3	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA												
1.3.1	ACERO ESTRUCTURAL	KLS	90550,40	17.260	527.299.904,00	32.416,82	559.514.287,00	-	1.993,29	-	34.404.232,52	30.423,53	525.110.054,00
				SUBTOTAL CAP. 1.3 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA:	527.299.904		559.514.287				34.404.233		525.110.054

1.4	CUBIERTA													
1.4.1	TEJA TERMOACUSTICA UPVC	M2	607,21	79.540	48.297.483,00	607,52	48.322.340 00			-	-	-	607,52	48.322.340 00
				SUBTOTAL CAP. 1.4 CUBIERTA:	48.297.483		48.322.340							48.322.340
2	CANCHA MULTIPLE													
2.1	GEOTEXTIL REPAV 450	M2	544,14	5.340	2.905.708,00	-	-			-	-	-	-	-
2.2	CARPETA ASFALTICA [ST]	M3	27,64	673.200	18.607.248,00	-	-			-	-	-	-	-
2.3	IMPRIMACION	M2	544,14	3.190	1.735.807,00	-	-			-	-	-	-	-
2.4	ACARREO ASFALTO VOLUMEN COMPCTADO	M3K	3317,08	1.920	6.368.794,00	-	-			-	-	-	-	-
2.5	TRANSPORTE DE EQUIPO 31KM A 50 KM	T/K	6000,00	1.090	6.540.000,00	-	-			-	-	-	-	-
2.6	LINEA DEMARCACION ACRILICA A=12CM	ML	345,39	2.530	873.837,00	345,02	872.888,00			-	-	-	345,02	872.888,00
2.7	PORTERIA MULT.FIJA MICROF. BALONC.TIPO 2 SIN CONCRETO	JGO	1,00	5.915.850	5.915.850,00	1,00	5.915.850,00			-	-	-	1,00	5.915.850,00
2.8	SOPORTE PARA VOLEIBOL TRES POSICIONES + TUBO AUX	JGO	1,00	1.212.600	1.212.600,00	1,00	1.212.600,00			-	-	-	1,00	1.212.600,00
	ITEMS ADICIONALES													
2.9 (1.1.3)	DEMOL. CONCRETO REFORZADO	M3		177.170	-	7,01	1.241.962,00	56,59	-	10.026.050,30	-	63,60	11.268.012,00	
2.10 (1.2.1)	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3		21.850	-	-	-	362,52	-	7.921.062,00	-	362,52	7.921.062,00	
2.11 (1.2.2)	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3		19.780	-	5,82	111.172,00	541,71	-	10.714.935,92	-	547,33	10.826.108,00	
2.12 (5 2.5)	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3		31.670	-			267,12	-	8.459.690,40	-	267,12	8.459.690,00	
2.13 (1.2.11)	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS		6.200	-			461,44	-	2.860.928,00	-	461,44	2.860.928,00	
2.14 (4,5)	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS		7.910	-			1.590,00	-	12.578.900,00	-	1.590,00	12.578.900,00	
2.15 (INP 001)	LOSA CONCRE.CANCHA MULTIP E=12CM 3500PSI	M2		120.998	-			636,00	-	76.954.728,00	-	636,00	76.954.728,00	
2.16 (INP 002)	REVESTIMIENTO ACRILICO SOBRE PISO EN CONCRETO	M2		125.640	-			636,00	-	79.907.040,00	-	636,00	79.907.040,00	
2.17 (INP 003)	TIERRA PARA SIEMBRA Y NIVELACION	M3		71.848				44,52	-	3.198.672,96	-	44,52	3.198.673,00	
2.18 (INP 004)	S.E.I. PRADO TRENZA, INCLUYE RIEGO DE PRENDIMIENTO	M2		43.238				445,20	-	19.249.557,60	-	445,20	19.249.558,00	
2.19 (2,14)	ACARREO MATERIAL PETREO,VOL.COMPACT	M3K		1.990				14.882,40	-	29.615.976,00	-	14.882,40	29.615.976,00	
2.20 (INP 005)	GAVION DE CONTENCION DE ESTRUCTURA CANCHA MULTIPLE. INCLUYE MALLA, PIEDRA RAJON, TRANSPORTE, LLENADO DE CANASTA Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M3		327.890				8,00	-	2.623.120,00	-	8,00	2.623.120,00	
2.21 (INP 006)	SUB-BASE COMP.MAT.SELECC.	M3		83.743				95,40	-	7.989.082,20	-	95,40	7.989.082,00	
2.22 (INP 007)	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOCELDA PARA MEJORAMIENTO DEL	M2		52.583				636,00	-	33.442.788,00	-	636,00	33.442.788,00	
				SUBTOTAL CAP. 2 CANCHA MULTIPLE:	44.159.844		9.354.472			305.540.531				314.895.003
3	PANTALLAS DE PROTECCION													
3.1	PRELIMINARES													
3.1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	ML	25,90	2.210	57.239,00	25,91	57.266,00			-	-	25,91	57.266,00	
				SUBTOTAL CAP. 3,1 PRELIMINARES:	57.239		57.266							57.266
3.2	MOVIMIENTOS DE TIERRRA													
3.2.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	1,99	21.850	43.482,00	6,42	140.336,00			-	-	6,42	140.336,00	
3.2.2	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	5,95	19.780	117.691,00	7,60	150.240,00			-	-	7,60	150.240,00	
				SUBTOTAL CAP. 3.2 MOVIMIENTOS DE TIERRRA:	161.173		290.576							290.576
3.3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA													
3.3.1	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	9,26	27.600	255.576,00	9,77	269.751,00			-	-	9,77	269.751,00	
3.3.2	VIGA CIMIENTO EMLACE 4000 PSI 28.0MPA	M3	3,71	865.180	3.209.818,00	2,20	1.904.227,00			-	-	2,20	1.904.227,00	
3.3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	207,40	6.200	1.285.880,00	206,94	1.283.028,00			-	-	206,94	1.283.028,00	
3.3.4	PILOTE CONCRETO REFORZADO	M3	3,96	630.870	2.498.245,00	2,51	1.585.549,00			-	-	2,51	1.585.549,00	
3.3.5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	615,96	6.200	3.818.952,00	364,59	2.260.451,00			-	-	364,59	2.260.451,00	
3.3.6	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	0,50	551.830	275.915,00	0,26	141.268,00			-	-	0,26	141.268,00	
3.3.7	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	0,60	491.180	294.708,00	0,80	392.944,00			-	-	0,80	392.944,00	
3.3.8	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	104,40	6.200	647.280,00	49,22	305.139,00			-	-	49,22	305.139,00	
				SUBTOTAL CAP. 3.3 CIMENTACION Y ESTRUCTURA:	12.286.374		8.142.357							8.142.357
3.4	MAMPOSTERIA													
3.4.1	MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C	M2	9,26	61.280	567.453,00	9,60	588.288,00			-	-	9,60	588.288,00	
3.4.2	CINTA CONFINAMIENTO MURO	ML	23,16	28.330	656.123,00	25,50	722.415,00			-	-	25,50	722.415,00	
3.4.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	31,82	6.200	197.284,00	40,70	252.328,00			-	-	40,70	252.328,00	
				SUBTOTAL CAP. 3.4 MAMPOSTERIA:	1.420.860		1.563.031							1.563.031

3,5	MALLA													
3.5.1	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"	M2	102,32	29.450	3.013.324,00	102,40	3.015.680,00	-	-	-	-	-	102,40	3.015.680,00
3.5.2	POSTE TUBO GALV. 2" x2,3MM C.13	ML	119,44	30.950	3.696.668,00	143,70	4.447.515,00	-	-	-	-	-	143,70	4.447.515,00
3.5.3	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 1.1/2"	ML	112,64	16.640	1.874.330,00	34,08	567.091,00	-	-	-	-	-	34,08	567.091,00
3.5.4	ANGULO HIERRO 1 1/2"X3/16"	ML	25,58	19.980	511.088,00	25,50	509.490,00	-	-	-	-	-	25,50	509.490,00
	SUBTOTAL CAP. 3,5 MALLA:				9.095.410		8.539.776							8.539.776
4	ANDENES													
4,1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	7,91	21.850	172.834,00	8,06	176.029,00	-	-	-	-	-	8,06	176.029,00
4,2	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	7,91	19.780	156.460,00	10,47	207.158,00	-	-	-	-	-	10,47	207.158,00
4,3	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	M3	6,32	29.990	189.537,00	6,45	193.286,00	-	-	-	-	-	6,45	193.286,00
4,4	ANDEN CONCRETO 10CM.3000 PSI	M2	26,16	68.220	1.784.635,00	30,94	2.110.454,00	-	-	-	-	-	30,94	2.110.454,00
4,5	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	50,70	7.910	401.037,00	61,87	489.408,00	-	-	-	-	-	61,87	489.408,00
4,6	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	5,46	27.600	150.696,00	30,94	853.834,00	-	-	-	-	-	30,94	853.834,00
4,7	CORDON CONCRETO 3100 PSI	M3	1,09	1.039.620	1.133.186,00	1,55	1.608.064,00	-	-	-	-	-	1,55	1.608.064,00
4,8	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	135,23	6.200	838.426,00	135,13	837.829,00	-	0,00	-	0,00	-	135,13	837.829,00
4,9	ACARREO MATERIAL PETREO,VOL.COMPACT	M3K	78,42	1.990	156.056,00	216,55	430.938,00	-	-	-	-	-	216,55	430.938,00
	SUBTOTAL CAP. 4 ANDENES:				4.982.867		8.907.020							8.907.020
5	DRENAJE PLUVIAL													
5,1	PRELIMINARES													
5.1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	133,65	2.070	276.656,00	133,65	276.656,00	-	6,15	-	12.730,50	127,50	263.925,00	
	SUBTOTAL CAP. 5,1 PRELIMINARES:				276.656		276.656				12.731,00			263.925
5,2	MOVIMIENTOS TIERRA, DEMOLICIONES Y RELLENOS													
5.2.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	76,26	21.850	1.666.281,00	120,48	2.631.993,00	-	-	-	-	120,48	2.631.993,00	
5.2.2	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	76,26	19.780	1.508.423,00	158,59	3.097.441,00	-	-	-	-	158,59	3.097.441,00	
5.2.3	RELLENO ARENA MEDIANA (ST)	M3	2,40	75.050	180.120,00	4,01	300.575,00	-	0,0150	-	1.125,75	3,99	299.450,00	
5.2.4	RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO COMPACTAD	M3	4,16	98.470	409.635,00	12,02	1.183.117,00	-	-	-	-	12,02	1.183.117,00	
5.2.5	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	33,52	31.670	1.061.578,00	34,04	1.078.126,00	-	-	-	-	34,04	1.078.126,00	
5.2.6	RELLENO TIERRA-NIVELACION	M3	3,09	26.370	81.483,00	8,01	211.224,00	-	-	-	-	8,01	211.224,00	
5.2.7	ACARREO MATERIAL PETREO,VOL.COMPACT	M3K	535,46	1.990	1.065.565,00	688,28	1.369.677,00	-	0,0046	-	9,25	688,28	1.369.667,00	
	SUBTOTAL CAP. 5,2 MOVIMIENTOS TIERRA, DEMOLICIONES Y RELLENOS:				5.973.085		9.872.153				1.135			9.871.018
5,3	FILTRO													
5.3.1	GRAVA TRITURAD DE 1/2"	M3	1,73	87.010	150.527,00	1,84	160.142,00	-	-	-	-	1,84	160.142,00	
5.3.2	GRAVA TRITURAD DE 1"	M3	1,73	69.340	119.958,00	1,84	127.620,00	-	-	-	-	1,84	127.620,00	
5.3.3	GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	28,35	5.340	151.389,00	32,72	174.725,00	-	-	-	-	32,72	174.725,00	
5.3.4	TUB.PVC 6 OREN.SF NOVAFOR	ML	20,45	51.680	1.056.856,00	20,45	1.056.856,00	-	-	-	-	20,45	1.056.856,00	
	SUBTOTAL CAP. 5,3 FILTRO:				1.478.730		1.519.343							1.519.343
5,4	DRENAJE PLUVIAL													
5.4.1	CAJA INSPECCION 60x 60 CM (CONCRETO)	UND	1,00	340.150	340.150,00	1,00	340.150,00	-	-	-	-	1,00	340.150,00	
5.4.2	CAJA INSPECCION 100X100 CM (CONCRETO)	UND	1,00	504.070	504.070,00	1,00	504.070,00	-	-	-	-	1,00	504.070,00	
5.4.3	CAJA INSPECCION 80x 80 CM (CONCRETO)	UND	1,00	406.850	406.850,00	1,00	406.850,00	-	-	-	-	1,00	406.850,00	
5.4.4	CAJA INSPECCION 120x120 CM (CONCRETO)	UND	1,00	794.450	794.450,00	1,00	794.450,00	-	-	-	-	1,00	794.450,00	
5.4.5	CAJA INSPECCION 175x 80 CM DOM(CONCRETO)	UND	1,00	997.970	997.970,00	1,00	997.970,00	-	-	-	-	1,00	997.970,00	
5.4.6	CAMARA INSPECCION TIPO B H=2,01-2,50 MTS	UND	1,00	1.930.280	1.930.280,00	1,00	1.930.280,00	-	-	-	-	1,00	1.930.280,00	
5.4.7	SOLADO ESPESOR E=0,05M 3000 PSI 210 MPA	M2	30,65	27.600	845.940,00	30,65	845.940,00	-	-	-	-	30,65	845.940,00	
5.4.8	CANAL CONCRETO PISO 50x25x08 CM DOBLE	ML	61,30	93.150	5.710.095,00	61,30	5.710.095,00	-	-	-	-	61,30	5.710.095,00	
5.4.9	TAPA CANAL CONCRETO PERFORADA PREF. ESP:8CM	UND	103,00	52.800	5.438.400,00	103,00	5.438.400,00	-	-	-	-	103,00	5.438.400,00	
5.4.10	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	273,56	6.200	1.696.072,00	518,40	3.214.082,00	-	-	-	-	518,40	3.214.082,00	
5.4.11	DESCOLMATACION CUNETAS,ZANJAS,DESCOLES (MANUAL)	ML	6,04	2.440	14.738,00	32,00	78.080,00	-	-	-	-	32,00	78.080,00	
5.4.12	TUBERIA,PVC 4 RDE 21 - 200 PSI	ML	111,24	92.360	10.274.126,00	111,24	10.274.126,00	-	-	-	-	111,24	10.274.126,00	
5.4.13	TUB PVC NOVAFORT 8"	ML	1,14	77.250	88.065,00	1,14	88.065,00	-	-	-	-	1,14	88.065,00	
5.4.14	TUB PVC NOVAFORT 10"	ML	20,58	83.890	1.726.456,00	20,58	1.726.456,00	-	-	-	-	20,58	1.726.456,00	
5.4.15	TUB PVC NOVAFORT 12"	ML	24,31	164.460	3.998.023,00	24,31	3.998.023,00	-	-	-	-	24,31	3.998.023,00	
5.4.16	CODO PVC-UM 4 x 90	UND	36,00	113.210	4.075.560,00	36,00	4.075.560,00	-	-	-	-	36,00	4.075.560,00	
5.4.17	TRAGANTE LOSA TCI 4 ATRAPA MANTO.ALUM	UND	12,00	376.500	4.518.000,00	12,00	4.518.000,00	-	-	-	-	12,00	4.518.000,00	
5.4.18	ABRAZADERA SANITARIA 4"	UND	48,00	20.750	996.000,00	48,00	996.000,00	-	-	-	-	48,00	996.000,00	
5.4.19	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	60,60	98.660	5.978.796,00	61,00	6.018.260,00	-	-	-	-	61,00	6.018.260,00	
5.4.20	VALVULA ANTIRRETORNO PVC DE 300 MM, CLAPETA DE POLIPROPILENO, JUNTA LABIADA Y REGISTRO SUPERIOR	UND	1,00	2.595.090	2.595.090,00	1,00	2.595.090,00	-	-	-	-	1,00	2.595.090,00	
5.4.21	EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	27,00	120.250	3.246.750,00	27,00	3.248.750,00	-	14,00	-	1.683.500,00	13,00	1.563.250,00	
5.4.22	BATEA EN CONCRETO 3000 PSI	M3	2,11	523.130	1.103.804,00	2,14	1.116.883,00	-	-	-	-	2,14	1.116.883,00	
	SUBTOTAL CAP. 5,4 DRENAJE PLUVIAL:				57.279.685		58.913.580				1.683.500,00			57.230.080

6	SISTEMA DE ILUMINACION													
6,1	EXCAVACION MANUAL TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	7,20	21.850	157.320,00	7,20	157.320,00				-	-	7,20	157.320,00
6,2	ACOM.E.3F(3# 6+1# 8) 2"	ML	36,00	80.610	2.901.960,00	36,00	2.901.960,00				-	-	36,00	2.901.960,00
6,3	CAPACETE GALV 2	UND	1,00	14.280	14.280,00	1,00	14.280,00				-	-	1,00	14.280,00
6,4	CURVA PVC 2	ML	1,00	23.690	23.690,00	1,00	23.690,00				-	-	1,00	23.690,00
6,5	TUBO GALV 2 X3 MTS	UND	2,00	109.510	219.020,00	2,00	219.020,00				-	-	2,00	219.020,00
6,6	CONTADOR 3F-TRIFASICO 120/208V M.DIRECTA	UND	1,00	633.630	633.630,00	1,00	633.630,00				-	-	1,00	633.630,00
6,7	CAJA CONTADOR 3F POLICARB C/PORTABREAKER	UND	1,00	154.770	154.770,00	1,00	154.770,00				-	-	1,00	154.770,00
6,8	CAJA ELECTRICA 0,8 X 0,8 X 1 MT	UND	2,00	438.928	877.856,00	2,00	877.856,00				-	-	2,00	877.856,00
6,9	MALLA A TIERRA 3 VARILLAS-PERNADA	UND	1,00	1.154.310	1.154.310,00	1,00	1.154.310,00				-	-	1,00	1.154.310,00
6,10	TABLERO DE BAJA TENSION ILUMINACION 220 V	UND	1,00	1.889.190	1.889.190,00	1,00	1.889.190,00				-	-	1,00	1.889.190,00
6,11	ACOM.E.3F(3# 10+1#10) 1" EMT"	ML	70,00	38.510	2.695.700,00	70,00	2.695.700,00				-	-	70,00	2.695.700,00
6,12	SAL LAMP EMT	UND	12,00	97.970	1.175.640,00	12,00	1.175.640,00				-	-	12,00	1.175.640,00
6,13	LUMINARIA LED 150 W 13074 LUMENS INDUSTRIAL	UND	12,00	1.697.530	20.370.360,00	12,00	20.370.360,00				-	-	12,00	20.370.360,00
6,14	PUNTA CAPTORA ACERO GAL	UND	12,00	87.300	1.047.600,00	12,00	1.047.600,00				-	-	12,00	1.047.600,00
6,15	CONECTOR PARALELO BIMETALICO	UND	6,00	39.970	239.820,00	6,00	239.820,00				-	-	6,00	239.820,00
6,16	CAJA RAWELT 3/4"	UND	6,00	22.540	135.240,00	6,00	135.240,00				-	-	6,00	135.240,00
6,17	GRAPA SUJECION PUNTA CAPTORA	UND	12,00	40.930	491.160,00	12,00	491.160,00				-	-	12,00	491.160,00
6,18	GRAPA CRUCE CABLE -PUNTA CAPTORA	UND	12,00	53.360	640.320,00	12,00	640.320,00				-	-	12,00	640.320,00
6,19	GRAPA SOPORTE BAJANTE	UND	40,00	35.870	1.434.800,00	40,00	1.434.800,00				-	-	40,00	1.434.800,00
6,20	MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE	UND	1,00	271.690	271.690,00	1,00	271.690,00				-	-	1,00	271.690,00
6,21	MOLDE SOLDADURA CABLE-CABLE (1/0 A 4/0)	UND	1,00	271.690	271.690,00	1,00	271.690,00				-	-	1,00	271.690,00
6,22	SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM	UND	16,00	29.160	466.560,00	16,00	466.560,00				-	-	16,00	466.560,00
6,23	ALAMBRON DE ALUMINIO DE 8 MM	ML	242,00	16.670	4.034.140,00	242,00	4.034.140,00				-	-	242,00	4.034.140,00
6,24	VARILLA CU-CU 9/16X 2.40	UND	6,00	190.140	1.140.840,00	6,00	1.140.840,00				-	-	6,00	1.140.840,00
6,25	CAJA ELECTRICA 0,3 X 0,3 X 0,5 MT + TAPA	UND	6,00	162.530	975.180,00	6,00	975.180,00				-	-	6,00	975.180,00
				SUBTOTAL CAP: 6 SISTEMA DE ILUMINACION:	43.416.766		43.416.766				-	-		43.416.766
7	ASEO Y LIMPIEZA													
7,1	LIMPIEZA GENERAL	MZ	544,14	2.070	1.126.370,00	544,28	1.126.668,00	40,86			84.580,20	-	585,00	1.210.950,00
8	INCREMENTO POR TRANSPORTE Y GRADO DE DIFICULTAD (6% PARA LA Z		6%		52.342.511,88		52.352.924,34				16.171.392,84	-		68.524.317,18
9	ICOCIV (Construcción de obras civiles) - estimada por el DANE, segun publicación	%	14%		124.400.703,23		124.216.749,66				38.642.710,84	-		162.859.460,50
				SUBTOTAL CAP: 7 ASEO Y LIMPIEZA:	177.869.585		177.696.342				54.898.684			232.594.728
	SUBTOTAL CAP: P2 ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA				1.049.118.413		1.049.118.413				360.438.918	36.101.599		1.373.455.731
	COSTOS INDIRECTOS													
				VALOR COSTOS DIRECTOS	1.049.118.413,11		1.049.118.413,00				360.438.918,00	36.101.599,00		1.373.455.730,68
				ADMINISTRACION	29%	304.244.340,00		304.244.340,00			104.527.286,00	10.469.464,00		398.302.162,00
				IMPREVISTOS	1%	10.491.184,00		10.491.184,00			3.604.389,00	361.016,00		13.734.557,00
				UTILIDAD	6%	62.947.105,00		62.947.105,00			21.626.335,00	2.166.096,00		82.407.344,00
				TOTAL AIU	36%	377.682.629,00		377.682.629,00			129.758.010,00	12.996.576,00		494.444.063,00
				IVA SOBRE LA UTILIDAD	0%	-		-			-	-		-
	COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				1.426.801.042		1.426.801.042				490.196.928	49.098.175		1.867.899.794
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO				1.426.801.042		1.426.801.042				490.196.928	49.098.175		1.867.899.794
					DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS									441.098.753
	SUBTOTAL CAP: P00 ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA MAS ITEMS NO PREVISTOS				1.426.801.042		1.426.801.042				490.196.928	49.098.175		1.867.899.794

Nota: Con la presente acta se deja constancia que las mayores y menores cantidades de obra aquí contenidas, se encuentran comprometidas directamente con el objeto y naturaleza del contrato de obra y que son requeridas para garantizar la calidad y cumplimento de los trabajos a ejecutar.

Brenda Murillo B

EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

EL INTERVENTOR:
Firma:
Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ
REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

VB. INDERVALLE
Firma:
Nombre: JUAN CARLOS RUEDA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO	PM-FO-600-011
		VERSION	2
	ACTA DE FIJACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	APROBADO	18/OCT/23

TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
CONTRATO No.	IND-23-5027
OBJETO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES GRUPO 2 FRENTE 1: ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
PLAZO INICIAL	Hasta 30 de junio de 2024
FECHA INICIACIÓN	28 de diciembre de 2023
PRORROGA 1	N/A
PRORROGA 2	N/A
PRORROGA 3	N/A
SUSPENSION 1	DESDE 14 DE JUNIO DE 2024 HASTA 21 DE JULIO DE 2024
AMPLIACION 1 SUSPENSION 1	DESDE 22 DE JULIO DE 2024 HASTA 22 DE AGOSTO DE 2024
REINICIO	N/A
SUSPENSION 2	N/A
REINICIO	N/A
SUSPENSION 3	N/A
REINICIO	N/A
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	8 de septiembre de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.426.801.042,00
ADICION 1	N/A
ADICION 2	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 1.426.801.042,00
CONTRATISTA - NIT - CC	CONSTRUPACICOL S.A.S ZOMAC NIT:901.526.894-4
INTERVENTOR - NIT - CC	CONSORCIO GRUPO 3 NIT:901.769.200-8
SUPERVISOR	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	05 de agosto de 2024

Mediante el presente documento INDERVALLE, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR, fijan precios unitarios a los siguientes items no previstos en el contrato

ITEM	DESCRIPCION	CANT. APROX.	UNIDAD	VALOR UNITARIO $
INP 001	LOSA CONCRE.CANCHA MULTIP E=12CM 3500PSI	636,00	M2	$ 120.998,00
INP 002	REVESTIMIENTO ACRILICO SOBRE PISO EN CONCRETO	636,00	M2	$ 125.640,00
INP 003	TIERRA PARA SIEMBRA Y NIVELACION	44,52	M3	$ 71.848,00
INP 004	S.E.I PRADO TRENZA. INCLUYE RIEGO DE PRENDIMIENTO	445,20	M2	$ 43.238,00
INP 005	GAVION DE CONTENCION DE ESTRCUTURA CANCHA MULTIPLE. INCLUYE MALLA, PIEDRA RAJON, TRANSPORTE, LLENADO DE CANASTA Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	8,00	M3	$ 327.890,00
INP 006	SUB-BASE COMP.MAT.SELECC	95,40	M3	$ 83.743,00
INP 007	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOCELDA PARA MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEL AREA DE LA CANCHA	636,00	M2	$ 52.583,00

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO	PM-FO-600-011
		VERSION	2
	ACTA DE FIJACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	APROBADO	18/OCT/23

Se anexan y hacen parte de la presente acta los análisis de precios unitarios (en caso de aplicar) de cada uno de los items no previstos y su respectivo estudio de mercado con soportes.

NOTAS:

1.- Es responsabilidad del Contratista la presentación de los items no previstos, con los documentos anexos que permitan verificar su utilización y justificación, manteniendo los precios aprobados en desarrollo del contrato.

2.- Es responsabilidad de la Interventoría avalar el análisis del precio unitario, la cantidad y la justificación técnica, económica y jurídica presentada al Instituto, recomendando su aprobación por parte de la Entidad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONTRATISTA
Firma
Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORIA
Firma
Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

VoBo Profesional encargado
JUAN CARLOS RUEDA A.

INDERVALLE
Nombre: NICOLAS TRIANA CASTILLO
ORDENADOR DEL GASTO

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Código	PA-FO-350-001
		Versión	2
		Aprobado	18/OCT/23

INFORMACIÓN GENERAL

EPENDENCIA	*SUB IFRAESTRUCTURA DEPORTIVA*			TIPO PPTO	*REGALÍAS*
IPO DE GASTO	*INVERSIÓN*		TIPO DE SOLICITUD	*OTRO SI*	
ro. AUTORIZACION	**1116**	AUTORIZADO POR	*Gerencia*	FECHA AUTORIZACION	*oct-24*

CONCEPTO (Descripción de la Actividad a Ejecutar)

OTROSÍ No. 02 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA IND-23-5027

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RP	CÓDIGOS RUBROS	NOMBRES RUBROS	VALOR
	00AR-4301-1604-2022-003760006	Mejoramiento a escenarios deportivos y recreativos para los municipios de cartago, el distrito de buenaventura y el distrito especial de cali en el departamento del valle del cauca	44.358.903,00

VALOR TOTAL

EN NÚMEROS	EN LETRAS
44.358.903,00	*CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE*

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO INSTITUCIONAL (INVERSIÓN)

1-606-009-23	MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA OTRO SÍ

ro. Contrato	IND-23-5027	Ultima Fecha Final Contr		9/05/2025
dentificación Contratista	901526894-4	Valor Inicial Contrato	$	1.426.801.042,00
ombre Contratista	CONSTRUPACICOL S.A.S ZOMAC	Valor Adiciones	$	396.739.850,00
		Valor Total Contrato	$	**1.867.899.795,00**

Firma ORDENADOR DEL GASTO	
ombre:	Nicolás Triana Castillo
argo:	Subgerente Infraestructura
Firma Elaborado:	Isabella Clavijo.
laborado por:	Isabella Clavijo Gómez
Firma Revisado	
evisado por:	May Stiven Páramo

INDERVALLE PRESUPUESTO

31 OCT 2024

RECIBIDO

Hora: 10:10 am

Firma:

ESPACIO PARA USO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Código	PA-FO-350-001
		Versión	2
		Aprobado	18/OCT/23

INFORMACIÓN GENERAL

DEPENDENCIA	SUB IFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			TIPO PPTO	GENERAL
TIPO DE GASTO	INVERSIÓN		TIPO DE SOLICITUD	OTRO SI	
Nro. AUTORIZACION	1116	AUTORIZADO POR	Gerencia	FECHA AUTORIZACION	oct-24

CONCEPTO (Descripción de la Actividad a Ejecutar)

OTROSÍ No. 02 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA IND-23-5027

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RES	CÓDIGOS RUBROS	NOMBRES RUBROS	VALOR
6130	2.3.2.02.02.005.4301004.54270.61.6101.250	Cofinanciar Obras de Infraestructura Deportiva y Recreativa En Espacios Deportivos del Valle del Cauca	396.739.850,00

VALOR TOTAL

EN NÚMEROS	EN LETRAS
396.739.850,00	*TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE*

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO INSTITUCIONAL (INVERSIÓN)

1-601-005-24	CONTRIBUCIÓN AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA OTRO SÍ

Nro. Contrato	IND-23-5027	Ultima Fecha Final Contr	09/05/2025
Identificación Contratista	901526894-4	Valor Inicial Contrato	$ 1.426.801.042,00
Nombre Contratista	CONSTRUPACICOL S.A.S ZOMAC	Valor Adiciones	
		Valor Total Contrato	$ **1.823.540.892,00**

Firma ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre:	Nicolás Triana Castillo
Cargo:	Subgerente Infraestructura
Firma Elaborado:	Isabella Clavijo
Elaborado por:	Isabella Clavijo Gómez
Firma Revisado	
Revisado por:	May Stiven Páramo

INDERVALLE PRESUPUESTO

31 OCT 2024

RECIBIDO

Hora: 10:30

Firma: _____

ESPACIO PARA USO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfvalverd	FABIAN VALVERDE CORREA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-7600010	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-31-11:52 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	924	Fecha Registro:	2024-10-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-7600010 INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto		
Valor Inicial:	44.358.903,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	44.358.903,00	Saldo x Comprometer:	44.358.903,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	724	Fecha Registro:	2024-10-31	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

VIGENCIA ANTERIOR							
Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.
03-7600010 INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE	00AR-4301-1604-2022-00376-0006 MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Nación	AR76000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
2024-10-31				
Total:	44.358.903,00	0,00	44.358.903,00	44.358.903,00

Objeto:	OTROSI No. 02 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA IND-23-5027 (AUT-G1116)

Firma Responsable

INDERVALLE
REGISTRADO
PRESUPUESTO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfvalverd	FABIAN VALVERDE CORREA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-7600010	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-31-11:53 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	724	**Fecha Registro:**	2024-10-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-7600010 INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE			
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	44.358.903,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	44.358.903,00	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
03-7600010 INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE	00AR-4301-1604-2022-00376-0006 MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA				
		Total:	44.358.903,00	0,00	44.358.903,00

Objeto:	

Firma Responsable

INDERVALLE
REGISTRADO
PRESUPUESTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

NUMERO: 6246

Fecha: 31/10/2024

Vencimiento: 30 Dias

Dependencia: INFRAESTRUCTURA

Certifico disponibilidad por valor de $ 396,739,850.00

(TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ML

RUBRO	NOMBRE	C.COSTOS	VALOR
2.3.2.02.02.005.4301004.54270.61.6 101.250	Cofinanciar Obras De Infraestructura Deportiva Y Recreativa En Espacios Deportivos Del Valle Del Cauca	INFRAESTRUCTURA	396,739,850.00

Dentro del presupuesto de Egresos de la vigencia: 2024

Por concepto de: OTROSI No. 02 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA IND-23-5027 (AUT-G1116)

JEFE OFICINA DE PRESUPUESTO

INDERVALLE REGISTRADO PRESUPUESTO

ELABORADO POR: YESICA TROCHEZ

APROBADO POR: Fabian Valverde Correa

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS**	CÓDIGO	PE-FO-220-136
		VERSIÓN	1
		APROBADO	07/MAR/2024

Que, el Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca – INDERVALLE, suscribió el contrato de obra No. IND-23-5027, con CONSTRUPACICOL S.A.S ZOMAC, identificado con el NIT.901526894-4, representado legalmente por BRENDA LIZETH MURILLO BARCO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.006.166.501, cuyo objeto es "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", por valor de MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.426.801.042).

Que, en el marco de la ejecución del contrato, el día 05 de noviembre de 2024, se suscribieron los siguientes actos: i) acta de reanudación No. 2 del 15 de octubre de 2024, ii) acta de reanudación No. 3 del 05 de noviembre de 2024, y iii) Otrosí No. 2 de adición y prórroga del 08 de noviembre de 2024, por los cuales, se hizo necesario que el contratista actualizara las respectivas pólizas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato y la eventual responsabilidad civil extracontractual que pueda derivarse de la misma.

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución IND-SG-Nro. 734 del 23 de agosto de 2024, se presentó para aprobación los siguientes anexos:

- **Acta de reinicio No. 2** con fecha del 15-10-2024, correspondiente al Anexo No. 3, póliza de cumplimiento No. 420-74-994000042515, expedido el 22 de octubre de 2024 y Anexo No. 7, póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 420-74-994000010243 expedido el 26 de noviembre de 2024.

- **Acta de reinicio No. 3** con fecha del 05-11-2024, correspondiente al Anexo No. 4, póliza de cumplimiento No. 420-74-994000042515, expedido el 06 de noviembre de 2024 y Anexo No. 7, póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 420-74-994000010243 expedido el 26 de noviembre de 2024.

- **Otrosí No. 2 de adición y prórroga** con fecha del 09 de noviembre del 2024, correspondiente al anexo No. 6, póliza de cumplimiento No. 420-74-994000042515, expedido el 13 de noviembre de 2024 y Anexo No.7, póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 420-74-994000010243 expedido el 26 de noviembre de 2024.

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS**	CÓDIGO	PE-FO-220-136
		VERSIÓN	1
		APROBADO	07/MAR/2024

La cláusula décima octava relacionada con las garantías, el contratista se obligó a constituir y actualizar las respectivas garantías, las cuales garantizarán el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, las cuales deberán ser expedidas por compañía de seguros legalmente autorizadas, teniendo como asegurado y beneficiario al Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca – INDERVALLE, Departamento del Valle del Cauca, o quien corresponda, la cual cubrirá los amparos y vigencias de las garantías mencionadas en los anteriores considerandos y son los siguientes:

- **ACTA DE REINICIO No. 2:**

(PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO No. 3)

Aseguradora	**Nombre del amparo**	**Suma asegurada**	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 420-74-99400004251 5 **Anexo No. 3** (22-10-2024)	Cumplimiento	$286,787,009.44	22/12/2023	28/04//2025
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 420-74-99400004251 5 **Anexo No. 3** (22-10-2024)	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$115,570,884.40	22/12/2023	28/10/2027
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 420-74-99400004251 5 **Anexo No. 3** (22-10-2024)	Estabilidad y calidad de la obra	$286,787,009.44	Este amparo tiene vigencia de 05 años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante.	

- **ACTA DE REINICIO No.3:**

(PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO No. 4)

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS**	CÓDIGO	PE-FO-220-136
		VERSIÓN	1
		APROBADO	07/MAR/2024

Aseguradora	Nombre del amparo	Suma asegurada	Vigencia desde	Vigencia hasta
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 420-74-99400004251 5 **Anexo No. 4** (06-11-2024)	Cumplimiento	$286,787,009.44	22/12/2023	11/05//2025
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 420-74-99400004251 5 **Anexo No. 4** (06-11-2024)	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$115,570,884.40	22/12/2023	10/11/2027
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 420-74-99400004251 5 **Anexo No. 4** (06-11-2024)	Estabilidad y calidad de la obra	$286,787,009.44	Este amparo tiene vigencia de 05 años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante.	

- **OTROSÍ No. 2 DE ADICIÓN Y PRORROGA:**

(PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO No. 6)

Aseguradora	Nombre del amparo	Suma asegurada	Vigencia desde	Vigencia hasta
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 420-74-99400004251 5 **Anexo No. 6** (13-11-2024)	Cumplimiento	$375,447,858.80	22/12/2023	09/11//2025
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No.	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$151,299,883.40	22/12/2023	09/05/2028

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS**	CÓDIGO	PE-FO-220-136
		VERSIÓN	1
		APROBADO	07/MAR/2024

420-74-99400004251 5 **Anexo No. 6** (13-11-2024)				
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 420-74-99400004251 5 **Anexo No. 6** (13-11-2024)	Estabilidad y calidad de la obra	$375,447,858.80	Este amparo tiene vigencia de 05 años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante.	

- 9 May 2025

(PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO No. 7) Cabe aclarar que el presente anexo cubre la cobertura de los reinicios No. 2, No. 3 y el Otrosí No.2 de prórroga y adición.

Aseguradora	**Nombre del amparo**	**Suma asegurada**	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 420-74-99400001024 3 **Anexo No. 7** (26-11-2024)	Predios, labores y operaciones	260,000,000.00	Durante toda la ejecución del contrato IND-23-5027	
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 420-74-99400001024 3 **Anexo No. 7** (26-11-2024)	Contratistas y subcontratistas	260,000,000.00	Durante toda la ejecución del contrato IND-23-5027	
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 420-74-99400001024 3 **Anexo No. 7** (26-11-2024)	RCE Patronal	260,000,000.00	Durante toda la ejecución del contrato IND-23-5027	
Aseguradora Solidaria de Colombia	Vehículos propios y no propios	260,000,000.00	Durante toda la ejecución del contrato IND-23-5027	

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS**	CÓDIGO	PE-FO-220-136
		VERSIÓN	1
		APROBADO	07/MAR/2024

Póliza No. 420-74-99400001024 3 **Anexo No. 7** (26-11-2024)			

Que, con ocasión de la suscripción del contrato, así como también, requisito para la ejecución o modificación del mismo, y de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación del Instituto, se verificó que las especificaciones de las garantías descritas en el acápite anterior corresponden a los requerimientos exigidos en el contrato y se validó la correcta expedición en la plataforma de la aseguradora, aprobando las garantías que reunieron los requisitos exigidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes, y publicando en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP I y II.

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los 29 días del mes de noviembre del año 2024.

NICOLAS TRIANA CASTILLO
Subgerente de Infraestructura Deportiva

Proyectó: David Garcia – Abogado Contratista	Firma:
Revisó: Katherin Mera – Abogada Contratista	Firma:
Revisó: Paola Andrea Rojas Escobar – Abogada Contratista	Firma:

acta de reinicio # 2

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **ACTA DE REANUDACIÓN CONTRATO DE OBRA** PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CÓDIGO	PM-FO-600-024		
		VERSIÓN	2		
		APROBACIÓN	18/OCT/23		
		PÁGINA		DE	
		FECHA	15 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)

CONTRATO Nº	IND-23-5027
OBJETO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES GRUPO 2 FRENTE 1: ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
CONTRATANTE - NIT	INDERVALLE - NIT 805.012.896-4
REPRESENTANTE LEGAL - C.C	ANA MILENA OROZCO CAÑAS - C.C 31.974.731
CONTRATISTA - NIT	CONSTRUPACICOL S.A. S ZOMAC - NIT 901526894-4
REPRESENTANTE LEGAL - C.C	BRENDA LIZETH MURILLO BARCO - C.C: 1.006.166.501
INTERVENTOR - NIT	CONSORCIO GRUPO 3 - NIT 901.769.200-6
REPRESENTANTE LEGAL - C.C	JUAN CARLOS NARANJO - C.C. 16.700.426
PLAZO INICIAL	HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DE INICIO	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	30 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN Nº 1	14 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN Nº 1 AMPLIACIÓN Nº 1	22 DE JULIO DE 2024
FECHA DE REINICIO Nº 1	23 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN Nº 2	26 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN Nº 2 AMPLIACIÓN Nº 1	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO Nº 2	15 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN Nº 3	N/A
FECHA DE REINICIO Nº 3	N/A
PRÓRROGA Nº 1	N/A
PRÓRROGA Nº 2	N/A
PRÓRROGA Nº 3	N/A
PLAZO ACTUAL	HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL	28 DE OCTUBRE DE 2024

Por medio de la presente acta se deja constancia que fueron superados los motivos que dieron origen a la suspension del contrato de interventoria.
El contratista debera modificar las polizas del contrato de acuerdo con la nueva fecha de terminación.

FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 (Día) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 15 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2024 (Año)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 28 **DE** OCTUBRE **DE** 2024
(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación)

NOTA:

1. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el certificado de modificación de la garantía única, en el cual se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarreará el inicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar.

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

Firma
Nombre JUAN CARLOS NARANJO
Representante legal o su Apoderado
Interventoría
Consorcio Grupo 3

Firma
Nombre JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
Supervisor Contrato de Interventoría
INDERVALLE

Brenda Murillo B.

Firma
Nombre BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
Representante legal o su Apoderado
Contratista
CONSTRUPACICOL S.A. S ZOMAC

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4209405630

PÓLIZA No: 420-47-994000042515 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE | COD. AGENCIA: 420 | RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA | TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	10	2024	22	10	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC | IDENTIFICACIÓN: NIT 901.526.894-4

DIRECCIÓN: MZ H 1A BARRIO HUASIPANGA | CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO | TELÉFONO: 3204736672

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: . INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE | IDENTIFICACIÓN: NIT 805.012.896-4

BENEFICIARIO: . INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE | IDENTIFICACIÓN: NIT 805.012.896-4

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	22/12/2023	28/04/2025	286,787,009.44
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	22/12/2023	28/10/2027	115,570,884.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	286,787,009.44

BENEFICIARIOS
NIT 805012896 - INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE,

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO No. IND-23-5027 (CO1.PCCNTR.5581333), CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONTRATAR PÓR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATICOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2, FRENTE 1, ADECUACIÓN CUBIERTA DISTTITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DLE CAUCA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.
** CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA**

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***689,144,903.28	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
ASESORIAS Y SEGUROS JC LTDA	9126	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000420940563

Brenda Murillo B.

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADA2071070EFA7C58

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE COD. AGENCIA: 420 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000042515** ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.526.894-4**

ASEGURADO: **. INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE** IDENTIFICACIÓN: NIT **805.012.896-4**

BENEFICIARIO: **. INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE** IDENTIFICACIÓN: NIT **805.012.896-4**

TEXTO ITEM 1

POR DISPOSICIÓN DEL ARTIULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS, QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

****

NOTA ACLARATORIA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE APLICA DOCUMENTO ACTA DE REANUDACIÓN CONTRATO DE OBRA DE FECHA FIRMA EL 15/10/2024 DERIVADO DEL CONTRATO IND-23-5027 EN EL CUAL SE ESTABLECE LO SIGUIENTE:

EL PRESENTE CONTRATO SE SUSPENDIO EL 26/08/2024
EL PRESENTE CONTRATO SE REANUDO EL 15/10/2024
EL PRESENTE CONTRATO TIENE COMO NUEVA FECHA FIN DE VIGENCIA EL 28/10//2024

SE ACTUALIZAN LAS GARANTIAS.

LOS DEMAS TERMINOS DE LA POLIZA SIN MODIFICAR SE MANTIENEN EN VIGENCIA.

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2024
Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar ANDINA LATINA 2024

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4209405630

PÓLIZA No: 420-47-994000042515 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE COD. AGENCIA: 420 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	10	2024	28	11	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.526.894-4**

DIRECCIÓN: MZ H 1A BARRIO HUASIPANGA CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO TELÉFONO: 3204736672

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **. INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE** IDENTIFICACIÓN: NIT **805.012.896-4**

BENEFICIARIO: **. INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE** IDENTIFICACIÓN: NIT **805.012.896-4**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	22/12/2023	28/04/2025	286,787,009.44
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	22/12/2023	28/10/2027	115,570,884.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		286,787,009.44

BENEFICIARIOS
NIT 805012896 - INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE,
.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:
|
OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO No. IND-23-5027 (CO1.PCCNTR.5581333), CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONTRATAR PÓR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATICOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2, FRENTE 1, ADECUACIÓN CUBIERTA DISTTITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DLE CAUCA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.
** CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA**

Información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Recomendamos utilizar versiones de navegador: Internet Explorer 7 y Netscape 8.1.3 o superiores. Configuracion : 1024 x 768
Direccion: Calle 100 No. 9A - 45, Pisos 8 y 12. PBX : 6464330
Gerencia de Tecnología - Copyright Todos los Derechos Resevados

Aseguradora Solidaria de Colombia
Siempre junto a ti

MODULO

Consultar Póliza

Salir

DATOS DE LA POLIZA

Número de póliza:	**994000042515**	**Número de anexo:**	**3**
Agencia:	**CALI NORTE**	**Ramo:**	**CUMP. ENT. ESTATALES**
Asegurado / Beneficiario:	**INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE .**		
Tomador / Garantizado:	**CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC**		

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	viernes, 22 de diciembre de 2023	lunes, 28 de abril de 2025	$286,787,009.44
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	viernes, 22 de diciembre de 2023	jueves, 28 de octubre de 2027	$115,570,884.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	domingo, 30 de junio de 2024	domingo, 28 de octubre de 2029	$286,787,009.44

Nueva Consulta | Visualizar PDF

acta reinicio # 3.

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **ACTA DE REANUDACIÓN CONTRATO DE OBRA** PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CÓDIGO	PM-FÖ-600-024
		VERSIÓN	2
		APROBACIÓN	18/OCT/23
		PÁGINA	DE
		FECHA	5 (Día) 11 (Mes) 2024 (Año)

CONTRATO Nº	IND-23-5027
OBJETO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES GRUPO 2 FRENTE 1: ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
CONTRATANTE - NIT	INDERVALLE - NIT 805.012.896-4
REPRESENTANTE LEGAL - C.C	ANA MILENA OROZCO CANAS - C.C 31.974.731
CONTRATISTA - NIT	CONSTRUPACICOL S.A. S ZOMAC - NIT 901526894-4
REPRESENTANTE LEGAL - C.C	BRENDA LIZETH MURILLO BARCO - C.C: 1.006.166.501
INTERVENTOR - NIT	CONSORCIO GRUPO 3 - NIT 901.769.200-6
REPRESENTANTE LEGAL - C.C	JUAN CARLOS NARANJO - C.C. 16.700.426
PLAZO INICIAL	HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DE INICIO	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	30 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DE SUSPENSION Nº 1	14 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN Nº 1 AMPLIACIÓN Nº 1	22 DE JULIO DE 2024
FECHA DE REINICIO Nº 1	23 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN Nº 2	26 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN Nº 2 AMPLIACIÓN Nº 1	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO Nº 2	15 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN Nº 3	23 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO Nº 3	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
PRORROGA Nº 1	N/A
PRORROGA Nº 2	N/A
PRORROGA Nº 3	N/A
PLAZO ACTUAL	HASTA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL	10 DE NOVIEMBRE DE 2024

Por medio de la presente acta se deja constancia que fueron superados los motivos que dieron origen a la suspension del contrato de interventoria.
El contratista debera modificar las polizas del contrato de acuerdo con la nueva fecha de terminación.

FECHA DE SUSPENSION: 23 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 5 (Día) DE NOVIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación)

NOTA:

1. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el certificado de modificación de la garantía única, en el cual se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarreará el inicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar.

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

Firma
Nombre JUAN CARLOS NARANJO
Representante legal o su Apoderado
Interventoría
Consorcio Grupo 3

Firma
Nombre JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
Supervisor Contrato de Interventoría
INDERVALLE

Brenda Murillo B.
Firma
Nombre BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
Representante legal o su Apoderado
Contratista
CONSTRUPACICOL S.A. S ZOMAC

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4209405630

PÓLIZA No: 420-47-994000042515 ANEXO: 4

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE | COD. AGENCIA: 420 | RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA | TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	11	2024	06	11	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC | IDENTIFICACIÓN: NIT 901.526.894-4

DIRECCIÓN: MZ H 1A BARRIO HUASIPANGA | CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO | TELÉFONO: 3204736672

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: . INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE | IDENTIFICACIÓN: NIT 805.012.896-4

BENEFICIARIO: . INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE | IDENTIFICACIÓN: NIT 805.012.896-4

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	22/12/2023	11/05/2025	286,787,009.44
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	22/12/2023	10/11/2027	115,570,884.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		286,787,009.44

BENEFICIARIOS
NIT 805012896 - INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE,

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO No. IND-23-5027 (CO1.PCCNTR.5581333), CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONTRATAR PÓR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATICOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2, FRENTE 1, ADECUACIÓN CUBIERTA DISTTITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DLE CAUCA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

** CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA**

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL Á PAGAR:
$ ***689,144,903.28	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
ASESORIAS Y SEGUROS JC LTDA	9126	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000420940563

Brenda Murillo B.

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADA2071070CFC775F

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE COD. AGENCIA: 420 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000042515 ANEXO: 4

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC IDENTIFICACIÓN: NIT 901.526.894-4

ASEGURADO: . INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE IDENTIFICACIÓN: NIT 805.012.896-4

BENEFICIARIO: . INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE IDENTIFICACIÓN: NIT 805.012.896-4

TEXTO ITEM 1

POR DISPOSICIÓN DEL ARTIULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS, QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

NOTA ACLARATORIA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE APLICA DOCUMENTO ACTA DE REANUDACIÓN CONTRATO DE OBRA DE FECHA FIRMA EL 05/11/2024 DERIVADO DEL CONTRATO IND-23-5027 EN EL CUAL SE ESTABLECE LO SIGUIENTE:

EL PRESENTE CONTRATO SE SUSPENDIO EL 23/10/2024
EL PRESENTE CONTRATO SE REANUDO EL 05/11/2024
EL PRESENTE CONTRATO TIENE COMO NUEVA FECHA FIN DE VIGENCIA EL 10/11//2024

SE ACTUALIZAN LAS GARANTIAS.

LOS DEMAS TERMINOS DE LA POLIZA SIN MODIFICAR SE MANTIENEN EN VIGENCIA.

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4209405630

PÓLIZA No: 420-47-994000042515 ANEXO: 4

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE COD. AGENCIA: 420 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	06	11	2024
FECHA DE IMPRESIÓN	28	11	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC IDENTIFICACIÓN: NIT 901.526.894-4

DIRECCIÓN: MZ H 1A BARRIO HUASIPANGA CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO TELÉFONO: 3204736672

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: . INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE IDENTIFICACIÓN: NIT 805.012.896-4

BENEFICIARIO: . INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE IDENTIFICACIÓN: NIT 805.012.896-4

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO:. CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	22/12/2023	11/05/2025	286,787,009.44
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	22/12/2023	10/11/2027	115,570,884.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		286,787,009.44

BENEFICIARIOS
NIT 805012896 - INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE,

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO No. IND-23-5027 (CO1.PCCNTR.5581333), CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONTRATAR PÓR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATICOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2, FRENTE 1, ADECUACIÓN CUBIERTA DISTTITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DLE CAUCA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

** CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA**

Información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Recomendamos utilizar versiones de navegador: Internet Explorer 7 y Netscape 8.1.3 o superiores. Configuración : 1024 x 768
Dirección: Calle 100 No. 9A - 45, Pisos 8 y 12, PBX : 6464330
Gerencia de Tecnología - Copyright Todos los Derechos Reservados

Aseguradora Solidaria de Colombia
¡Siempre contigo a tu lado!

MODULO

Salir

Consultar Póliza

DATOS DE LA PÓLIZA

Número de póliza:	**994000042515**	**Número de anexo:**	**4**
Agencia:	**CALI NORTE**	**Ramo:**	**CUMP. ENT. ESTATALES**
Asegurado / Beneficiario:	**INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE .**		
Tomador / Garantizado:	**CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC**		

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	viernes, 22 de diciembre de 2023	domingo, 11 de mayo de 2025	$286,787,009.44
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	viernes, 22 de diciembre de 2023	miércoles, 10 de noviembre de 2027	$115,570,884.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	domingo, 30 de junio de 2024	sábado, 10 de noviembre de 2029	$286,787,009.44

Nueva Consulta | Visualizar PDF

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN OTROSÍ No. 02 DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA IND-23-5027 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA "INDERVALLE" y CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	CÓDIGO	PA-FO-240-001
		VERSIÓN	4
		APROBADO	14/AGOS/2023

ANA MILENA OROZCO CAÑAS, mayor de edad, domiciliada en Santiago de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.974.731, quien obra en nombre y representación del INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA – INDERVALLE, a través del Decreto No. 1-17-0002 del 01 de enero de 2024 y Acta de posesión No. 0022 de fecha 01 de enero de 2024, con facultad para la ordenación del gasto mediante Resolución IND SG No. 071 del 31 de enero de 2024, aclarada mediante la Resolución IND SG- 82 del 01 de febrero de 2024, la cual fue modificada por medio de la Resolución IND-SG 734 del 23 de agosto de 2024. Establecimiento Público del Orden Departamental creado mediante Ordenanza No. 022 del 26 de noviembre de 1997, con NIT. No. 805.012.896-4, en su calidad de Gerente, cumpliendo con el literal d) del Artículo 16, Ordenanza 022 del 26 de noviembre de 1997 y el Literal j) del Artículo 18 de los Estatutos Internos de INDERVALLE, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, y el Acuerdo Nro. 002 del 13 de diciembre de 2023 expedido por la Junta Directiva del Instituto, quien en adelante y para los efectos del mismo, se denominará EL CONTRATANTE y por la otra, BRENDA LIZETH MURILLO BARCO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.006.166.501 expedida en Cali, representante legal de CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC, identificado con el Nit No. 901.526.894-4, quien se denominará El CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el presente OTROSÍ No. 02 DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA al contrato de obra No. IND-23-5027, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que, con ocasión de la viabilización, priorización y aprobación del proyecto de inversión identificado con BPIN 2022003760006, denominado "MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión Región Pacífico (OCAD), en sesión del 21 de abril de 2023, soportada en acta No. 19 de la misma fecha, se designó como ejecutor al INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA (en adelante, INDERVALLE).

2. Que, el INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE elaboró los estudios previos, análisis del sector, matriz de riesgos, proyecto de pliego de condiciones, y demás documentación precontractual, surtiendo las etapas de publicación con el objeto de adelantar el proceso de contratación, mediante la modalidad de selección de licitación pública No. IND-23-ID-07-4469.

3. Que, mediante la Resolución IND-SG-1339 del 28 de septiembre de 2023, la entidad aperturó el proceso de contratación, mediante la modalidad de selección de licitación pública No. IND-23-ID-07-4469, cuyo objeto corresponde a: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES". GRUPO 1: FRENTE 1. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACIÓN LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE: 2. ADECUACIÓN CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1. FRENTE 3. ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

4. Que, mediante Resolución 1518 del 10 de noviembre de 2023, se adjudicó el siguiente grupo del proceso de contratación, mediante la modalidad de selección de licitación pública No. IND-23-ID-07-4469: "GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN OTROSÍ No. 02 DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA IND-23-5027 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA "INDERVALLE" y CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	CÓDIGO	PA-FO-240-001
		VERSIÓN	4
		APROBADO	14/AGOS/2023

5. Que, el día veintidós (22) de diciembre de 2023, INDERVALLE suscribió el contrato de obra No. IND-23-5027, con CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC, cuyo objeto es: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

6. Que, se firmó acta de inicio del contrato de obra No. IND-23-5027, el 28 de diciembre del año 2023, con un plazo inicial de 6 meses, es decir hasta el 30 de junio de 2024.

7. Que, a continuación se relacionan las suspensiones y reinicios contractuales acaecidos en el mismo:

NÚMERO Y FECHA	PERIODO	FECHA DE REANUDACIÓN	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
Acta de suspensión No. 1 del 14 de junio de 2024	Desde 14/06/2024 Hasta 21/07/2024	22/07/2024	08/08/2024
Acta de ampliación No. 1 de la suspensión No. 1 del 22 de julio de 2024	Desde 22/07/2024 Hasta 22/08/2024	23/08/2024	08/09/2024
Acta de reanudación No. 1 del 23 de agosto de 2024	No aplica	No aplica	08/09/2024
Acta de suspensión No. 2 del 26 de agosto de 2024	Desde 26/08/2024 Hasta 26/09/2024	27/09/2024	10/10/2024
Acta de ampliación No. 1 de la suspensión No. 2 del 27 de septiembre de 2024	Desde 27/09/2024 Hasta 14/10/2024	15/10/2024	28/10/2024
Acta de reanudación No. 2 del 15 de octubre de 2024	No aplica	No aplica	28/10/2024
Acta de Suspensión No. 3 del 23 de octubre de 2024	Desde 23/10/2024 Hasta 4/11/2024	5/11/2024	10/11/2024

8. Que, el 26 de diciembre de 2023, el contratista de obra CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC, a través de su Representante Legal, dirigió oficio con radicado No. 20230051201 a INDERVALLE, solicitando la modificación de la cláusula octava del contrato, en los siguientes términos:

"(...) por medio del presente oficio nos permitimos solicitar comedidamente a INDERVALLE realizar el cambio en la forma de pago, quedando de esta manera definitiva en un 95% correspondiente a pago en actas parciales y un 5% correspondiente a la liquidación, para soportar dicha petición se allega a ustedes un informe técnico donde se relacionan gastos fijos que se tendrán en el desarrollo de la obra (...)".

9. Que, a raíz de la solicitud efectuada por el contratista, el arquitecto Nicolás Triana Castillo, en su calidad de supervisor del contrato de interventoría No. IND-23-4484, procedió al análisis de la petición incoada por parte del contratista de obra, y en acto posterior dirigió oficio No. 600-17129-23 del 28 de diciembre de 2023 al Subgerente de Infraestructura Deportiva de INDERVALLE, el arquitecto Juan Carlos Rueda Ángel, en el que determinó que: *"(...) se hace necesario sin desconocer el principio de legalidad administrativa y dentro del marco del ejercicio de la autonomía de la voluntad, del interés general y del principio de conservación del contrato, suscribir el presente otrosí modificatorio (...)".*

10. Que, en virtud de la solicitud efectuada por el contratista de obra y la aprobación del arquitecto Nicolás Triana Castillo, en su calidad de supervisor del contrato de interventoría No. IND-23-4484, se procedió a la elaboración del otrosí número uno (1) al contrato de obra No. IND-23-5027, a través del cual se modificó la cláusula octava del contrato que hace referencia a la FORMA DE PAGO y el cual fue Aceptado por el

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN OTROSÍ No. 02 DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA IND-23-5027 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA "INDERVALLE" y CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	CÓDIGO	PA-FO-240-001
		VERSIÓN	4
		APROBADO	14/AGOS/2023

contratista en la plataforma SECOP II el 23 de enero de 2024 y validado en la plataforma el 25 de enero de 2024.

11. Que, el contratista de obra CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC, mediante oficio del 5 de agosto del año 2024, solicitó adición y prorroga al contrato de obra a su cargo, es decir el distinguido con el número IND-23-5027, argumentando que durante la ejecución de la obra se evidenció que se requieren algunas modificaciones, las cuales están enmarcadas dentro de mayores y menores cantidades, e ítems no previstos que generan una adición de recursos y ampliación del horizonte de ejecución del proyecto, de la siguiente manera:

"Por medio de la presente, me permito dar alcance al oficio aportado el día 18 de marzo del 2024, con los respectivos ajustes necesarios de acuerdo con el diseño ajustado por la entidad. Me permito así, hacer entrega de la remisión del ACTA DE MODIFICACIÓN 2 (Balance de obra), con su correspondiente balance de mayores y menores cantidades. El cual refleja como resultado el requerimiento un mayor valor de obra por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE $ 441.098.753,00 con el fin de lograr el alcance final del contrato.

(...) En base a lo planteado líneas atrás, se requiere para la ejecución de las actividades adicionales una prórroga del plazo de ejecución de la obra, de ciento ochenta (180) días calendario sustentada en la realización de mayores cantidades proveniente de los ítems no previstos, sumado al proceso constructivo de la placa en concreto de la cancha múltiple, para la cual se requiere la fundición del concreto en paños cuadrados de 3x3 metros, con el fin de evitar fisuras, grietas o contracciones en el mismo concreto, por lo que, todo el proceso debe ser seccionado. Igualmente, una vez se encuentre terminada la placa en concreto se requiere para su acabado final (REVESTIMIENTO ACRÍLICO SOBRE PISO EN CONCRETO) una humedad específica menor al 4% el cual, por condiciones climáticas del sitio de la obra se debe de dar el tiempo prudente para el secado del concreto y acatar las recomendaciones que realizan los instaladores de este producto que son las siguientes:

- *La placa debe tener una pendiente mínima (1%) para evacuación de agua y así garantizar el empozamiento.*
- *La superficie debe tener algo de rugosidad, lo cual nos va a permitir tener una mejor adherencia del revestimiento.*
- *Las juntas de dilatación deben ser manejadas con un producto sellante flexible; aplicando de manera continua y realizando las dilataciones con disco de corte, cuidando que queden de 2 a 3 mm x debajo del nivel de la superficie.*

Ponemos a consideración de la interventoría y de la entidad esta solicitud que está dada por la necesidad técnica que surge de la ejecución del contrato y es complementaria a la obra contratada permitiendo una intervención integral del escenario recreativo, al mejorar la placa polideportiva, lo que permite atender las necesidades de recreación de la comunidad dejando una instalación con mejores condiciones técnicas y mayor durabilidad en el tiempo".

12. Que, el interventor CONSORCIO GRUPO 3, por medio de oficio CG3B-052-2024 del 06 de agosto de 2024, conceptuó ante el supervisor del contrato de interventoría JUAN CARLOS RUEDA ÁNGEL, favorablemente la solicitud de adición, modificación y prórroga presentada por el contratista de obra, en los siguientes términos:

"(...) De acuerdo con lo manifestado por el contratista en el oficio del 05 de agosto del 2024, se esboza que luego de realizar las excavaciones requeridas para la realización de la cimentación profunda de la estructura de la cubierta, y luego de realizar la demolición parcial de una franja de la placa existente (Actividad necesaria luego de realizar la reimplantación inicial del proyecto y aprobada en el balance de mayores y menores cantidades No. 01). La situación descrita por el contratista plantea el requerimiento de ejecución de una obra necesaria dentro del contrato, como lo es la demolición total de la placa y su reconstrucción, esto como consecuencia de un hecho sobreviniente ocasionado por la infiltración de agua de lluvias y escorrentías naturales a la estructura de la placa existente, condición que se enmarca en hechos de carácter de imprevisibles, intempestivos, irresistibles, extraordinarios o inminentes.

Al respecto, cabe mencionar que la adición propuesta por el contratista de obra se enmarca dentro del concepto de una obra necesaria para cumplir con el fin del contrato que no es otro que entregar un escenario deportivo a la comunidad que redunde en su propio beneficio, logrando que el Estado cumpla su fin esencial a través de dicha contratación. (...)".

Adicionalmente, la interventoría manifiesta que: *"(...) Por lo anterior, esta interventoría avala y por lo tanto, recomienda al Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación (INDERVALLE), considerar las siguientes actividades adicionales:*

- *Demoler la losa existente y construir una nueva en concreto que permita restituir las condiciones del escenario para lograr una intervención integral y suplir la necesidad que se ha suscitado por el mal comportamiento del suelo ante la gran cantidad de agua acumulada, acelerando el deterioro de la placa polideportiva. Para complementar el escenario se propone generar un acabado a esta nueva superficie en concreto a realizarse, utilizando para esto una resina o recubrimiento sintético, con el ánimo de integrar las nuevas características de la superficie y entregar un escenario deportivo completo mejorando las condiciones existentes para que las personas de la comunidad tengan un espacio recreativo más cómodo y adecuado para la práctica deportiva.*
- *En la parte posterior de la obra colindante con la vía de acceso del municipio, debido a la nivelación y reemplazo de terreno para la estructura de la losa nueva y el ajuste a la implantación de la cancha múltiple, se presenta la necesidad de realizar un relleno lo que genera una mayor cantidad en el suministro de rocamuerta entre el eje D y F, con una altura promedio de 65 centímetros adicionales al nivel normal del relleno propuesto en el diseño estructural. Para sostener este relleno es necesario realizar una obra de contención mediante un pequeño muro tipo gavión que garantiza la estabilidad de toda la estructura.*
- *Complementario a esto y una vez realizadas las actividades de excavaciones, y rellenos en la red pluvial y las perforaciones profundas de las pantallas de protección y cubierta (que hacen parte del contrato), se sugiere a la entidad, el suministro de prado y recuperación paisajística en estas áreas anexas a la placa polideportiva, debido a que, el impacto mismo de la obra, ha dejado una huella de terreno desnivelado con arcillas no fértiles expuestas, el cual, visual y físicamente, no tendrá el aspecto esperado al momento de la entrega del escenario deportivo y desmejora las condiciones de este (...)".*

Finalmente, se concluye por parte del interventor *"(...) Con base a lo planteado líneas atrás, se requiere para la ejecución de las actividades adicionales una prórroga del plazo de ejecución de la obra, de ciento ochenta (180) días sustentada en la realización de mayores cantidades proveniente de los ítems no previstos, sumado al proceso constructivo de la placa en concreto de la cancha múltiple, para la cual se requiere la fundición del concreto en paños cuadrados de 3x3 metros, con el fin de evitar fisuras, grietas o contracciones en el mismo concreto, por lo que, todo el proceso debe ser seccionado. Igualmente, una vez se encuentre terminada la placa en concreto se requiere para su acabado final (REVESTIMIENTO ACRÍLICO SOBRE PISO EN CONCRETO) una humedad específica menor al 4% el cual, por condiciones climáticas del sitio de la obra se debe de dar el tiempo prudente para el secado del concreto y acatar las recomendaciones que realizan los instaladores de este producto que son las siguientes:*

- *La placa debe tener una pendiente mínima (1%) para evacuación de agua y así garantizar el empozamiento.*
- *La superficie debe tener algo de rugosidad, lo cual nos va a permitir tener una mejor adherencia del revestimiento.*
- *Las juntas de dilatación deben ser manejadas con un producto sellante flexible; aplicando de manera continua y realizando las dilataciones con disco de corte, cuidando que queden de 2 a 3 mm x debajo del nivel de la superficie.*

Las demás actividades allí expuestas y según lo mostrado en los ítems adiciones el ACTA DE MODIFICACIÓN II indica que se debe efectuar una adición presupuestal por un valor de ***CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($441.098.753.)*** *con el fin de lograr el alcance final del contrato, dejando claridad que, de acuerdo a lo expuesto en los comités técnicos de seguimiento, se deberá demoler la totalidad de la cancha múltiple*

existente y se deberá realizar una superficie nueva que cumpla con todos los requerimientos técnicos adheridos en la práctica de los deportes inmersos en el escenario deportivo.

Una vez expuestas las condiciones y los puntos de vista que se revisó y se concilió con el contratista Construpacicol S.A.S. ZOMAC, la interventoría Consorcio Grupo 3, recomienda a la entidad adelantar los trámites administrativos necesarios para realizar la adición y prórroga expuesta en el presente documento por los argumentos expuestos en el mismo, y considerando que se presenta como un hecho sobreviniente al desarrollo de las actividades que motivan una actividad necesario no imputable a ninguna de las partes (...)".

13. Que, en atención a la solicitud presentada por el contratista de obra, y dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la continuidad de la interventoría, se tramita en simultáneo la suscripción del otrosí No. 2 de adición de recursos por un valor total de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($247.561.682), y prórroga por ciento ochenta (180) días calendario al contrato de interventoría No. IND-23-4484, por conducto del cual, CONSORCIO GRUPO 3, ejerce la vigilancia y control de la ejecución de la obra, con el fin de que se prorrogue por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato de obra objeto de la presente modificación.

14. Que, para llevar a cabo la adición, modificación y prórroga al contrato de obra en mención, es necesaria la aprobación por parte del Departamento Administrativo de Planeación del Departamento del Valle del Cauca, de un ajuste al proyecto de inversión identificado con BPIN 2022003760006, del cual deriva el contrato de obra referido, lo cual daría lugar a la respectiva modificación contractual.

15. Que, debido a lo anterior, y con base en la solicitud y los soportes presentados por el contratista de obra, que fueron conceptuados favorablemente por el interventor, INDERVALLE expuso ante el Departamento Administrativo de Planeación del Departamento del Valle del Cauca, a través de oficio No. 200.16.01 200-477-2024 del 25 de septiembre de 2024, presentación de ajuste al proyecto de inversión en comento, con el objetivo de realizar una ampliación en el horizonte de ejecución del mismo por ciento ochenta (180) días calendario adicionales, y un incremento en su valor total por la suma de MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA PESOS M/CTE ($1.209.195.090), los cuales equivalen a un 27.14% del valor total del proyecto inicialmente aprobado y que serán aportados con recursos propios de INDERVALLE.

16. Que, en el oficio citado en el considerando anterior, se relacionaron las fuentes de financiación del proyecto y los valores de los ajustes efectuados, como se muestra a continuación:

FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR AJUSTE SOLICITADO	VALOR TOTAL CON AJUSTE
Departamento Valle del Cauca – Asignación para la inversión regional (60%)	$4.454.666.158	$0	$4.454.666.158
INDERVALLE – Recursos propios	$0	$1.209.195.090	$1.209.195.090
TOTAL GENERAL	$4.454.666.158	$1.209.195.090	$5.663.861.248

DESCRIPCIÓN	VALOR	% DE INCREMENTO CON RESPECTO AL PROYECTO APROBADO
PROYECTO APROBADO	$4.454.666.158	
AJUSTE SOLICITADO	$1.209.195.090	27,14%
TOTAL ADICIONES	$1.209.195.090	27,14%

17. Que, en efecto, en la sesión del 9 de octubre de 2024, soportada en el acta No. 40, el ajuste al proyecto de inversión identificado con BPIN 2022003760006, del cual deriva el contrato de obra No. IND-23-5027, fue aprobado y cargado al Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP) del Departamento

Nacional de Planeación, quedando debidamente autorizado por la Secretaría Técnica del Sistema General de Regalías.

18. Que, mediante oficio con consecutivo No. 220-016-600-10452-24 del 25 de octubre 2024 el señor Nicolas Triana Castillo, en su calidad de Subgerente de Infraestructura Deportiva, solicitó aval de legalidad a la Secretaría General y autorización de modificación de contrato a la Gerencia, para la suscripción de otrosí No. 2 de adición, modificación y prórroga del contrato de obra No. IND-23-5027.

19. Que, en atención a la solicitud efectuada por el Subgerente de Infraestructura Deportiva, y con el fin de obrar dentro del trámite de la referencia, la Secretaria General profirió aval de legalidad del 29 de octubre de 2024.

20. Que, debido a lo anterior, la Gerencia emitió autorización de modificación de contrato, a través de oficio con consecutivo de autorización No. 1116 del mes de octubre del año 2024.

21. Que, INDERVALLE cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 6246 del 31 de octubre de 2024, expedido por el Jefe de la Oficina de Presupuesto, por un valor total de **TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($396.739.850)**, para cubrir la adición al contrato de obra No. IND-23-5027

22. Que, INDERVALLE cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 924 del 31 de octubre de 2024, expedido por el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías, por un valor total de ***CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($44.358.903)***, para cubrir la adición al contrato de interventoría No. IND-23-5027

23. Que, conforme con lo anterior y para garantizar la correcta ejecución del contrato de obra, se requiere adicionar la suma de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($441.098.753.)**, y ampliar el término de ejecución por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario.

24. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el valor que se solicita adicionar no supera el 50% del valor inicial del contrato, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales vigentes.

25. Que, la adición de recursos y la prórroga del plazo solicitadas, se hacen necesarias para seguir garantizando el eficaz desarrollo y el cumplimiento del contrato, fines, metas y objetivos trazados desde el plan estratégico del Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca, y el Departamento del Valle del Cauca, a través de, y con los principios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia de la función administrativa.

26. Que, en virtud de lo anterior, se reconoce la importancia de atender esta solicitud, por lo cual se motiva la modificación al contrato de obra No. IND-23-5027, a través del presente otrosí No. 2, modificándose las siguientes cláusulas: *CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO, CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO y CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL,* de acuerdo con lo expresado anteriormente y de conformidad con lo estipulado en la siguiente normatividad y jurisprudencia:

- Que la contratación estatal busca satisfacer los fines estatales, de acuerdo con lo consignado en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, el cual refiere que *"los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines".*

- Que los numerales 1 y 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, señalan que *"para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato (...) podrán (...) interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas e introducir modificaciones a lo contratado".*

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN OTROSÍ No. 02 DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA IND-23-5027 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA "INDERVALLE" y CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	CÓDIGO	PA-FO-240-001
		VERSIÓN	4
		APROBADO	14/AGOS/2023

- Que la Ley 80 de 1993, en su articulo 40, establece que *"las partes podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran para el cumplimiento de los fines estatales".*

- Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado menciona:

  "(...) Roberto Dromi. Derecho Administrativo. Edición 5a, pág. 348. "El principio de mutabilidad de los contratos administrativos es una consecuencia impuesta por finalidades del interés público, dado que con ellos se tiende a lograr una más eficiente realización de la justicia distributiva (...) las modificaciones en el contrato pueden traducirse tanto en aumento (adicionales) como en una disminución (reducciones) de las prestaciones".

  (...) De lo anterior resulta claro que es un deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación; es un imperativo de su gestión, al cual no puede sustraerse so pena de incurrir en responsabilidad por omisión, pues iría en contra de lo previsto en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993"[1].

- La Corte Constitucional manifestó que *"por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la Ley 80, los facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos -como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 13 de agosto de 2009: "La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado"[2].*

- Que al respecto de los fines de la contratación estatal y las modificaciones a los contratos estatales el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han establecido lo siguiente: *"(...) El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos "instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas. El interés general, además de guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a regular el régimen de contratación administrativa, determina las actuaciones de la Administración, de los servidores que la representan y de los contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de las obligaciones generales de todo contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los fines del Estado (...)"*[3]. A su vez, el Consejo de Estado se ha pronunciado en el siguiente sentido: *"(...) Los cambios o ajustes a los contratos estatales que reúnan las siguientes condiciones pueden ser realizados válidamente, en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad y dando primacía al fin del contrato: (i) que resulten necesarios para la adecuada ejecución del contrato y el logro de la finalidad perseguida con el mismo, debido a hechos sobrevinientes y no previstos al momento de su celebración; (ii) que mejoren o amplíen la protección de los derechos, activos e intereses del Estado, sin generar un desequilibrio económico en contra del contratista; (ii) que no resulten contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres; (iv) que no modifiquen sustancialmente las condiciones esenciales del proceso de contratación y del contrato a celebrar, tales como el objeto principal del contrato (o "núcleo del objeto"), los factores de evaluación y selección, la clase o modalidad del contrato, etc., y (iv) que no supongan para el contratista una situación más ventajosa de la que tenía frente a los otros interesados (por ejemplo, los precalificados) y oferentes durante el proceso de contratación. Esta última situación podría darse si pudiera inferirse razonablemente que la modificación contractual que se pretenda*

[1] Consejo de Estado. (2002). Concepto 1439 del 18 de julio de 2002. Bogotá D.C.
[2] Corte Constitucional. (2012) Sentencia C-300 de 2012. Bogotá D.C.
[3] Corte Constitucional. (2009). Sentencia C-713 de 2009. Bogotá D.C.

efectuar, de haberse hecho durante el proceso de selección, hubiera implicado la participación de oferentes adicionales, o una variación en las condiciones de participación de los proponentes y/o en el orden de elegibilidad de sus ofertas, en relación con la que se tuvo en cuenta para la adjudicación (...)"[4]. Por lo tanto, es deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los contratos y el logro del fin perseguido con los trabajos, en este caso del contrato en comento.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se procede a la suscripción y perfeccionamiento del presente OTROSÍ No. 02 DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA del contrato de obra No. IND-23-5027, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR al valor del contrato de obra No. IND-23-5027, la suma de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($441.098.753.),** de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 924 del 31 de octubre de 2024 expedido por el Sistema de Presupuesto y giro de Regalías, y certificado de disponibilidad presupuestal No. 6246 del 31 de octubre de 2024, expedido por el Jefe de la Oficina de Presupuesto.

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)	
RUBRO	**DESCRIPCIÓN**
2.3.2.02.02.005.4301004.54270.61.6101.250	Cofinanciar Obras De Infraestructura Deportiva Y Recreativa En Espacios Deportivos Del Valle Del Cauca
00AR-4301-1604-2022-003760006	Mejoramiento a escenarios deportivos y recreativos para los municipios de cartago, el distrito de buenaventura y el distrito especial de cali en el departamento del valle del cauca

Por lo cual, la cláusula quinta del contrato con la presente modificación quedará así: **CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO** "El presupuesto oficial asignado por INDERVALLE, para la presente selección a través de licitación pública según el estudio del mercado es hasta por la suma de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO M/CTE ($ 1.867.899.795) incluido AIU, discriminado para cada grupo 2:
GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".
CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR la cláusula cuarta del contrato, la cuál quedará así: **CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO** "El plazo de ejecución para los dos grupos de adjudicación será hasta el 09 de mayo de 2025, contados a partir de la fecha de inicio del contrato una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución".
CLÁUSULA TERCERA: MODIFICAR la cláusula séptima del contrato, la cuál quedará así: **CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL** "Certificados de disponibilidad presupuestal del Sistema General de Regalías No. 1023 del 25 de julio de 2023, por valor de CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($4.053.381.399), de los cuales para el presente contrato se comprometen MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.426.801.042), certificados de disponibilidad del Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca No. 6246 del 31 de octubre de 2024, por valor de **TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE M/CTE ($396.739.850)"** y certificado de disponibilidad No. 924 del 31 de octubre de 2024 por valor de ***CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($44.358.903)***, expedido por el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías
CLÁUSULA CUARTA: Así mismo EL CONTRATISTA se compromete a actualizar las pólizas del contrato a su cargo de acuerdo a la modificación que se efectúa al mismo a través del presente Otrosí.

[4] Consejo de Estado. (2017). Radicación 11001-03-06-000-2017-00098-00 - 2346 del 15 de agosto de 2017. Bogotá D.C.

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN OTROSÍ No. 02 DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA IND-23-5027 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA "INDERVALLE" y CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	CÓDIGO	PA-FO-240-001
		VERSIÓN	4
		APROBADO	14/AGOS/2023

CLÁUSULA QUINTA: Las demás cláusulas y estipulaciones pactadas en el contrato que no han sido modificadas, se conservan tal como fueron convenidas.

CLÁUSULA SEXTA: El presente otrosí No. 2 se entiende perfeccionado con la aceptación de las partes en la plataforma SECOP II.

04/11/2024 – Secop II

Proyectó: Diana Marcela Santos Espinosa.	Abogado Contratista:	Firma:
Revisó: Paola Andrea Rojas Escobar.	Abogada Contratista:	Firma:
Revisó: Ana Yibi Erazo	Profesional Contratista	Firma:
Revisó: Alvaro Jose Bazurto	Profesional Contratista	Firma:
Revisó: Isabela Gutierrez	Profesional Contratista	Firma:
Revisión: Juan Carlos Rueda Ángel	Supervisor del Contrato	Firma:
Revisó: Karen Viviana Lozano Amaguaña	Jefe Oficina Jurídica (E)	Firma:
Revisó: Sandra Patricia Ospina Valencia	Secretaria General	Firma:
Aprobó: Nicolas Triana Castillo	Subgerente de Infraestructura Deportiva	Firma:
Suscribe: Ana Milena Orozco Cañas	Gerente	Firma:

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4209405630

PÓLIZA No: 420-47-994000042515 ANEXO: 6

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE COD. AGENCIA: 420 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	11	2024	13	11	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC IDENTIFICACIÓN: NIT 901.526.894-4

DIRECCIÓN: MZ H 1A BARRIO HUASIPANGA CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO TELÉFONO: 3204736672

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: . INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE IDENTIFICACIÓN: NIT 805.012.896-4

BENEFICIARIO: . INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE IDENTIFICACIÓN: NIT 805.012.896-4

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	22/12/2023	09/11/2025	375,447,858.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	22/12/2023	09/05/2028	151,299,883.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	375,447,858.80

BENEFICIARIOS
NIT 805012896 - INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE,

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO No. IND-23-5027 (CO1.PCCNTR.5581333), CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONTRATAR PÓR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATICOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2, FRENTE 1, ADECUACIÓN CUBIERTA DISTTITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DLE CAUCA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.
** CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA**

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***902,195,601.00	$ ********1,112,296	$*********0.00	$ ******211,336	$ ********1,323,632

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
ASESORIAS Y SEGUROS JC LTDA	9126	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/ws_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000420940563

Brenda Murillo B.
FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADA2071070CF97A5E

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * **Celular:** 310 223 4304 * **Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 791 91 80 * **Fax:** (601) 791 91 80 * **Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Compañía de Seguros
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE COD. AGENCIA: 420 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000042515** ANEXO: 6

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.526.894-4**

ASEGURADO: **. INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE** IDENTIFICACIÓN: NIT **805.012.896-4**

BENEFICIARIO: **. INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE** IDENTIFICACIÓN: NIT **805.012.896-4**

TEXTO ITEM 1

POR DISPOSICIÓN DEL ARTIULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS, QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

NOTA ACLARATORIA

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE GENERA PRORROGA DEL CONTRATO EN 180 DIAS QUEDANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 09/05/2025 SEGUN OTRO SÍ #2

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
¡Siempre junto a ti!

MODULO

Consultar Póliza

Salir

[redacted]

DATOS DE LA PÓLIZA

Número de póliza:	**994000042515**	**Número de anexo:**	**6**
Agencia:	**CALI NORTE**	**Ramo:**	**CUMP. ENT. ESTATALES**
Asegurado / Beneficiario:	**INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE .**		
Tomador / Garantizado:	**CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC**		

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	viernes, 22 de diciembre de 2023	domingo, 9 de noviembre de 2025	$375,447,858.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	viernes, 22 de diciembre de 2023	martes, 9 de mayo de 2028	$151,299,883.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	viernes, 9 de mayo de 2025	jueves, 9 de mayo de 2030	$375,447,858.80

Nueva Consulta | Visualizar PDF

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4209405630

PÓLIZA No: 420-47-994000042515 ANEXO: 6

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE COD. AGENCIA: 420 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	11	2024	28	11	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC IDENTIFICACIÓN: NIT 901.526.894-4

DIRECCIÓN: MZ H 1A BARRIO HUASIPANGA CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO TELÉFONO: 3204736672

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: . INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE IDENTIFICACIÓN: NIT 805.012.896-4

BENEFICIARIO: . INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE IDENTIFICACIÓN: NIT 805.012.896-4

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	22/12/2023	09/11/2025	375,447,858.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	22/12/2023	09/05/2028	151,299,883.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		375,447,858.80

BENEFICIARIOS
NIT 805012896 - INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE,
.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO No. IND-23-5027 (CO1.PCCNTR.5581333), CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONTRATAR PÓR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATICOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2, FRENTE 1, ADECUACIÓN CUBIERTA DISTTITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DLE CAUCA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.
** CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA**

Información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Recomendamos utilizar versiones de navegador: Internet Explorer 7.y Netscape 8.1.3 o superiores. Configuracion : 1024 x 768
Direccion: Calle 100 No. 9A - 45. Pisos 8 y 12. PBX : 6464330
Gerencia de Tecnología - Copyright Todos los Derechos Resevados

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Somos una de las compañías Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — COLOMBIA 2024

Somos una de las Mejores Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — AMERICA LATINA 2022

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4209405689

PÓLIZA No: 420 -74 - 994000010243 ANEXO:7

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE — COD. AGE: 420 — RAMO: 74 — PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DIA / MES / AÑO)	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN (DIA / MES / AÑO)
26 / 11 / 2024		22 / 12 / 2023	23:59	09 / 05 / 2025	23:59	504	26 / 11 / 2024

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACIÓN SIN COBRO DE PRIMA

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	DIAS
	22 / 12 / 2023	23:59	09 / 05 / 2025	23:59	504

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.526.894-4
DIRECCIÓN: MZ H 1A BARRIO HUASIPANGA — CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO — TELÉFONO: 3204736672

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.526.894-4
DIRECCIÓN: MZ H 1A BARRIO HUASIPANGA — CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO — TELÉFONO: 3204736672
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC NIT : 901526894

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA CIUDAD: BUENAVENTURA

DIRECCION: VIA No. 0-0

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA: AV.-0

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260,000,000.00		
	RCE PATRONAL	260,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No. IND-23-5027 CO1.PCCNTR.5581333) REFERENTE A CONTRATAR PÓR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATICOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2, FRENTE 1, ADECUACIÓN CUBIERTA DISTTITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DLE CAUCA.

SISTEMA BASE DE COBERTURA: OCURRENCIA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **********0.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
ASESORIAS Y SEGUROS JC LTDA	9126	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000420940568

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADA2071070AF97C5E

CLIENTE

PAOCAMELO 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE COD. AGENCIA: 420 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000010243** ANEXO: 7

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.526.894-4**

ASEGURADO: **CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.526.894-4**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

TEXTO ITEM 1

** AMPARO DE VEHÍCULOS PROPIOS O NO PROPIOS: OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL O CONTRACTUAL DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES CONTRATADA O NO, CON LÍMITES MÍNIMOS POR EVENTO DE $100.000.000 / $100.000.000 / $200.000.000. EN CASO DE SINIESTRO, SE DEBE DEMOSTRAR LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL VEHÍCULO SINIESTRADO Y EL CONTRATO AMPARADO BAJO LA PÓLIZA.

** AMPARO PATRONAL: OPERA EN EXCESO DE LA ARL

LA PRESENTE POLIZA EXCLUYE, ADEMÁS DE LAS EXCLUSIONES INDICADAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO, LAS SIGUIENTES COBERTURAS:
- TODA RC CONTRACTUAL
- RC PROFESIONAL MÉDICA
- RC PROFESIONAL CLINICAS Y HOSPITALES
- RC PRODUCTOS CUALQUIER OTRO TIPO DE RC PROFESIONAL

ASEGURADO: EL CONTRATISTA CONSTRUPACICOL S A S ZOMAC Y EL CONTRATANTE IMDERVALLE, LIMITADA LA COBERTURA DE LA PRESENTE PÓLIZA A ÚNICAMENTE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL CONTRATISTA CONSTRUPACICOL S A S ZOMAC CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO POR LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 994000042515 EXPEDIDA POR ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y/O IMDERVALLE, ESTÁ ÚLTIMA RESPECTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL OCASIONADA POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO MENCIONADO EN ESTA PÓLIZA.

NOTA ACLARATORIA

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CLARIDAD SOBRE LAS FECHAS EN LAS QUE HA TENIDO COBERTURA LA PÓLIZA DE RCE SEGUN ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN #1 14/06/2024 AL 21/07/2024 REANUDACIÓN 22/07/2024 TERMINACIÓN 08/08/2024
ACTA DE AMPLIACIÓN #1 22/07/2024 AL 22/08/2024 REANUDACIÓN 23/08/2024 TERMINACIÓN 08/09/2024
ACTA DE REANUDACIÓN #1 DEL 23 DE AGOSTO/2024
ACTA DE SUSPENSIÓN #2 26/08/2024 AL 26/09/2024 REANUDACIÓN 27/09/2024 TERMINACIÓN 10/10/2024
ACTA DE AMPLIACIÓN 27/09/2024 AL 14/10/2024 REANUDACIÓN 15/10/2024 TERMINACIÓN 28/10/2024
ACTA DE REANUDACIÓN DEL 15 DE OCTUBRE/2024
ACTA DE SUSPENSION #3 23/10/2024 AL 04/11/2024 REANUDACIÓN 05/11/2024 TERMINACIÓN 10/11/2024

NOTA ACLARATORIA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE APLICA DOCUMENTO ACTA DE REANUDACIÓN #3 CONTRATO DE OBRA DE FECHA FIRMA EL 05/11/2024 DERIVADO DEL CONTRATO IND-23-5027 EN EL CUAL SE ESTABLECE LO SIGUIENTE:

EL PRESENTE CONTRATO SE SUSPENDIO EL 23/10/2024
EL PRESENTE CONTRATO SE REANUDO EL 05/11/2024
EL PRESENTE CONTRATO TIENE FECHA FIN DE VIGENCIA EL 10/11/2024

POLIZA RCE # 994000010243, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL NUMERO 994000042515

SE ACTUALIZAN EL PLAZO DEL CONTRATO SEGUN OTRO SI #2 ENVIADO DONDE INDICAN EN LA CLAUSULA SEGUNDA LA MODIFICACION QUEDANDO EL NUEVO PLAZO DE EJECUCION SERA HASTA EL 9 DE MAYO DE 2025. / adicion Modificación

LOS DEMAS TERMINOS DE LA POLIZA SIN MODIFICAR SE MANTIENEN EN VIGENCIA

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000010243 ANEXO: 7 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3

TOMADOR: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC IDENTIFICACION: 901.526.894-4

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	901526894-4	VIA No. 0-0	BUENAVENTURA	0.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	0

Aseguradora Solidaria de Colombia
¡Siempre junto a ti!

MODULO

Consultar Póliza

Salir

DATOS DE LA PÓLIZA

Número de póliza:	**994000010243**	**Número de anexo:**	**7**
Agencia:	**CALI NORTE**	**Ramo:**	**RESP CIVIL EXT PATRI**
Asegurado / Beneficiario:	**CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC**		
Tomador / Garantizado:	**CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC**		

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	viernes, 22 de diciembre de 2023	viernes, 9 de mayo de 2025	$260,000,000.00

Nueva Consulta | Visualizar PDF

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4209405689

PÓLIZA No: 420 -74 - 994000010243 ANEXO:7

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE — COD. AGE: 420 — RAMO: 74 — PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DIA / MES / AÑO)	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN (DIA / MES / AÑO)
26 / 11 / 2024	22 / 12 / 2023 / 23:59	09 / 05 / 2025 / 23:59	504	28 / 11 / 2024

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACIÓN SIN COBRO DE PRIMA

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	DIAS
	22 / 12 / 2023 / 23:59	09 / 05 / 2025 / 23:59	504

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.526.894-4
DIRECCIÓN: MZ H 1A BARRIO HUASIPANGA — CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO — TELÉFONO: 3204736672

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.526.894-4
DIRECCIÓN: MZ H 1A BARRIO HUASIPANGA — CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO — TELÉFONO: 3204736672
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC NIT : 901526894

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA CIUDAD: BUENAVENTURA

DIRECCION: VIA No. 0-0

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA: AV.-0

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260,000,000.00		
	RCE PATRONAL	260,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

Para la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Recomendamos utilizar versiones de navegador: Internet Explorer 7 y Netscape 8.1.3 o superiores. Configuracion : 1024 x 768
Direccion: Calle 100 No. 9A - 45. Pisos 8 y 12. PBX : 6464330
Gerencia de Tecnología - Copyright Todos los Derechos Resevados

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° IND - 23 - 5027

CONTRATANTE: INDERVALLE NIT. 805.012.896-4 ORDENADOR DEL GASTO: JUAN CARLOS RUEDA ANGEL C.C. 94.501.292

CONTRATISTA: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC NIT. 901.526.894-4
REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO C.C. 1.006.166.501

INTERVENTOR: CONSORCIO GRUPO 3 NIT. 901.769.200-6 REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ. C.C. 16.700.426

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2, FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR TOTAL $	$1.426.801.042 M/CTE – INCLUIDO AIU			
PLAZO	6 MESES	180 DÍAS		
FECHA DE INICIO	28-dic-23			
PRORROGA 1	DEL:		HASTA:	
PRORROGA 2	DEL:		HASTA:	
PRORROGA 3	DEL:		HASTA:	
SUSPENSION 1	DEL:		HASTA:	
SUSPENSION 2	DEL:		HASTA:	
SUSPENSION 3	DEL:		HASTA:	

2. INFORMACION BASICA DEL FRENTE DE OBRA

FRENTE No. 01: CUBIERTA CANCHA MULTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO

VALOR COSTOS TOTALES: $1.426.801.042

Informe N°: 23 Fecha de informe. 27/05/2024 A 2/06/2024

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATISTA DE OBRA	
Valor frente de obra:	$1.426.801.042
Adiciones o mayor valor:	-
Valor total:	$1.426.801.042
Fecha de inicio	28/12/2023
Tiempo de prorrogas	-
Tiempo de suspensiones	-
Plazo estipulado:	185
Fecha de terminacion:	30/06/2024
Tiempo transcurrido contrato:	157 días

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	
Fecha de inicio:	28/12/2023
Tiempo de prorrogas:	-
Tiempo de suspensiones:	-
Plazo actualizado.	185
Fecha de terminacion:	30/06/2024
Tiempo transcurrido interventoria:	157 días

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FISICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso
% Programado	82,08%	1,00%	83,08%	-54
% Ejecutado	47,00%	2,00%	49,00%	0
Diferencia	35,08%	1,00%	-34,08%	

AVANCE FINANCIERO

				En %
Programado(%)	$1.171.089.759	$14.268.013	$1.185.357.773	83,08%
Ejecutado (%)	$670.596.490	$28.536.021	$699.132.511	49,00%
Diferencia	-$500.493.270	$14.268.007	-$486.225.262	-34,08%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	Ingeniero Residente e inspector
Contratista:	Arquitecto Residente de obra y cuatro obreros

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Herramienta menor

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	S/N/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	Interventor	S
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	Interventor	S
Normas ambientales	Interventor	S

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1: Limpieza de material caido en excavaciones existentes y retiro de lodo acumulado.

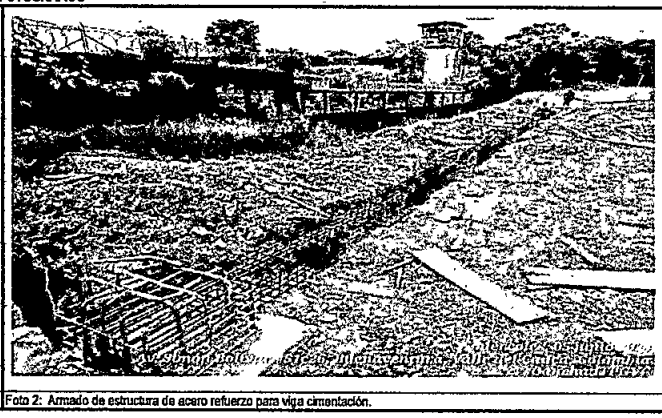

Foto 2: Armado de estructura de acero refuerzo para viga cimentación.

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Foto 3: Carpinteria en madera para encofrado de pedestales en concreto

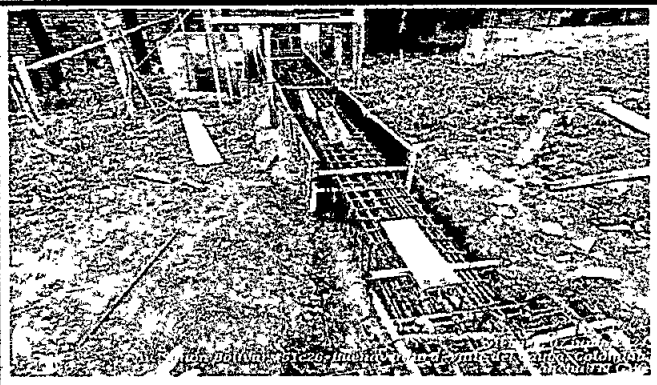

Foto 4: Encofrado de viga cimentacion con formaleta metálica y en madera

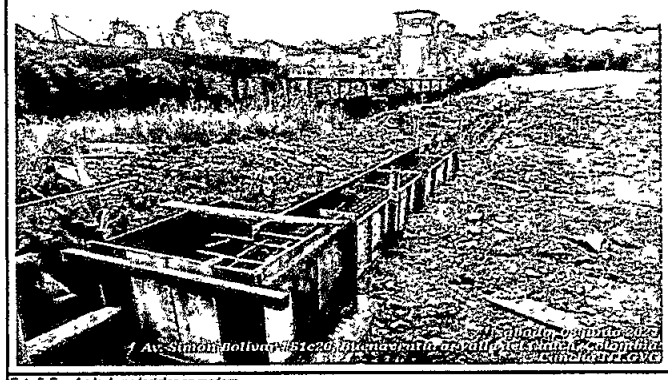

Foto 5: Encofrado de pedestales en madera.

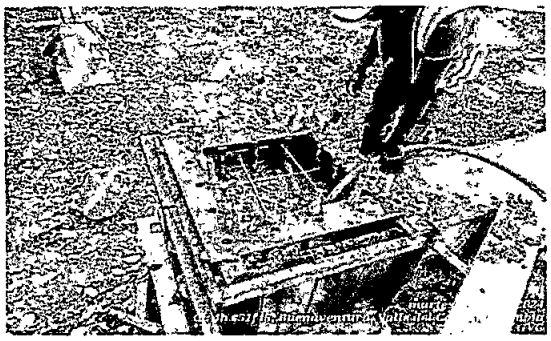

Foto 6: Fundicion de pedestal en concreto.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
LUNES: - No se realizaron trabajos por ser festivo.	*Colocación y ubicación de las guías de la platina para soporte de estructura metálica de la cubierta. *Corte, figurado y armado en sitio del acero refuerzo para vigas cimentación. *Encofrado en formaletería metálica para de vigas cimentación. *Carpintería en madera para encofrado de pedestales y vigas de cimentación. *Fundición de pedestales y vigas de cimentación.
MARTES: - No se realizaron trabajos por las fuertes precipitaciones en el transcurso de todo el día.	
MIERCOLES: - Se realizó evacuación de las aguas lluvias en excavaciones, limpieza de material caído en excavaciones existentes y retiro de lodo acumulado. Se continua con el armado de estructura de acero refuerzo para viga cimentación.	
JUEVES: - Se finaliza con el armado de la estructura de acero refuerzo para la viga cimentación del lado 2. Se realizó carpintería en madera para encofrado de pedestales en concreto.	
VIERNES: -Se continua con la carpintería en madera, encofrado de viga cimentacion con formaleta metálica y en madera y encofrado de pedestales en madera.	
SABADO: - Se continua con la carpintería en madera, encofrado de viga cimentacion del lado 1 y 2 con formaleta metálica y en madera y encofrado de pedestales en madera.	
DOMINGO: No se realizan actividades en la obra el día de hoy.	

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:

La obra presenta una ejecución 157 días con respecto al cronograma programado.

2. Disponibilidad de Recursos:

Se cuenta con la maquinaria y equipos menores necesarios para las actividades preliminares

3. Ejecución Financiera:

Se realiza actividades correspondientes a lo programado, donde se efectua una inversion total de $699.132.511

4. Calidad de los trabajos:

Hasta el momento los trabajos ejecutados son aceptados por la Interventoria.

5. Manejo Ambiental:

La obra ya cuenta con los certificados de botadero de residuos y materiales sobrantes.

6. Seguridad Industrial:

los trabajadores cuentan con sus elementos de seguridad industrial, tanto personal de la obra como los profesionales de campo

7. Programa salud ocupacional (si aplica):

Se cuenta con el profesional de seguridad y salud en el trabajo (SISO)

8. Aspectos sociales:

OBSERVACIONES:

* No se presentan observaciones de la obra para el periodo del presente informe.

Aprobado por:

FIRMA EL CONTRATISTA
NOMBRE: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
CARGO: REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

VoBo (FIRMA)
NOMBRE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° IND - 23 - 5027

CONTRATANTE: INDERVALLE **NIT. 805.012.896-4** ORDENADOR DEL GASTO: **JUAN CARLOS RUEDA ANGEL C.C. 94.501.292**

CONTRATISTA. CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC **NIT. 901.526.894-4**
REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO **C.C. 1.006.166.501**

INTERVENTOR: CONSORCIO GRUPO 3 **NIT. 901.769.200-6** REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ. **C.C. 16.700.426**

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES. GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR TOTAL $	$1.426.801.042 M/CTE – INCLUIDO AIU		
PLAZO	6 MESES	180 DÍAS	
FECHA DE INICIO	28-dic-23		
PRORROGA 1	DEL:	HASTA:	
PRORROGA 2	DEL:	HASTA:	
PRORROGA 3	DEL:	HASTA:	
SUSPENSION 1		HASTA:	
SUSPENSION 2	DEL:	HASTA:	
SUSPENSION 3	DEL:	HASTA:	

2. INFORMACION BASICA DEL FRENTE DE OBRA

FRENTE No. 01: CUBIERTA CANCHA MULTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO

VALOR COSTOS TOTALES: $1.426.801.042
Informe N°: 24 Fecha de informe. 3/06/2024 A 9/06/2024

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA DE OBRA

Valor frente de obra:	$1.426.801.042
Adiciones o mayor valor:	
Valor total:	$1.426.801.042
Fecha de Inicio	28/12/2023
Tiempo de prorrogas	-
Tiempo de suspensiones	-
Plazo estipulado:	185
Fecha de terminacion:	30/06/2024
Tiempo transcurrido contrato	164 días

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Fecha de Inicio:	28/12/2023
Tiempo de prorrogas:	-
Tiempo de suspensiones:	-
Plazo actualizado.	185
Fecha de terminacion:	30/06/2024
Tiempo transcurrido Interventoria:	164 días

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FISICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso
% Programado	83,08%	1,00%	84,08%	-54
% Ejecutado	49,00%	2,00%	51,00%	0
Diferencia	34,08%	1,00%	-33,08%	

AVANCE FINANCIERO — En %

Programado(%)	$1.185.357.770	$14.268.013	$1.199.625.783	84,08%
Ejecutado (%)	$699.132.511	$28.536.021	$727.668.531	51,00%
Diferencia	-$486.225.259	$14.268.007	-$471.957.252	-33,08%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	Ingeniero Residente e inspector
Contratista:	Arquitecto Residente de obra y cuatro obreros

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Herramienta menor

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	S/N/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	interventor	S
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	interventor	S
Normas ambientales	interventor	S

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1: Carpintería en madera

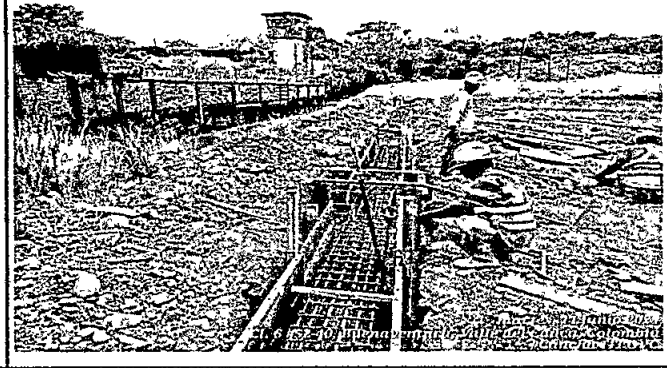

Foto 2: Encofrado de viga cimentacion con formaleta metálica y en madera.

INDERVALLE

CG3

CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

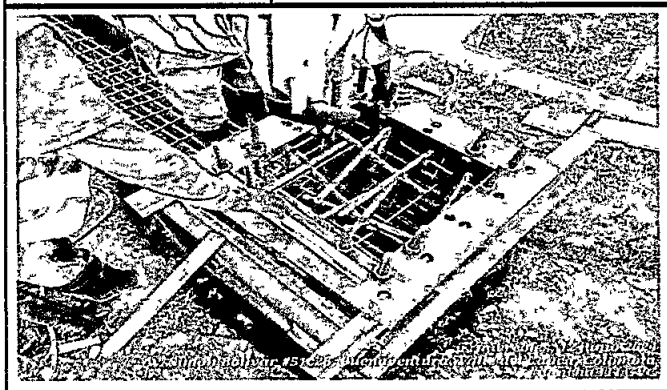

Foto 3: Ubicación y/o colocación de la guía de la platina a eje y nivelada para estructura metálica de la cubierta.

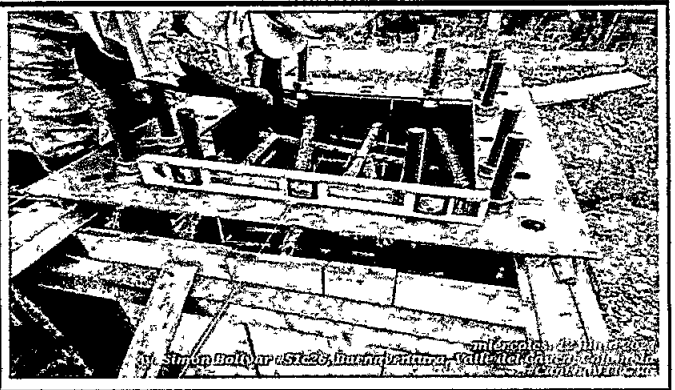

Foto 4: Ubicación y/o colocación de la guía de la platina a eje y nivelada para estructura metálica de la cubierta.

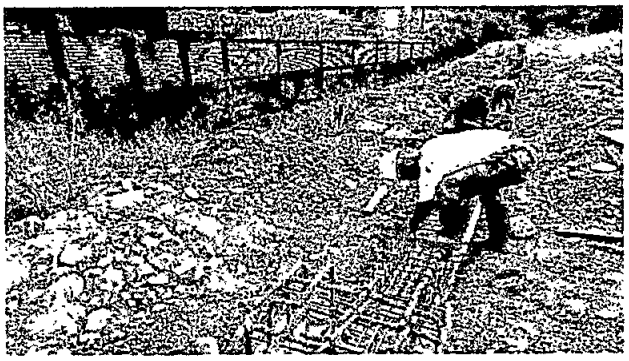

Foto 5: Fundición de viga cimentación y pedestales en concreto.

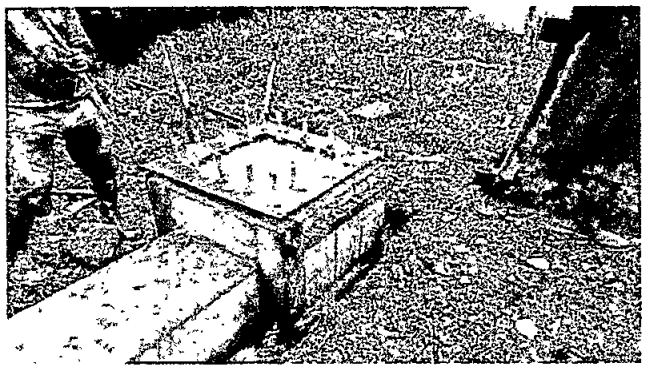

Foto 6: Fundición de viga cimentación y pedestales en concreto.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
LUNES: - No se realizaron trabajos por ser festivo.	*Montaje de estructura metálicas para cubierta de la cancha. *Encofrado en madera para aplicacion de Sikagrout. *Aplicación de Sikagrout para anclajes sobre mortero. *Excavación manual para construcción canal para drenajes de las aguas lluvias.
MARTES: -Se continua con la carpinteria en madera, encofrado de viga cimentacion del lado 2 con formaleta metálica y en madera y encofrado de pedestales en madera.	
MIERCOLES: - Se reinicia con la ubicación y/o colocación de la guia de la platina para estructura metálica de la cubierta.	
JUEVES: - Se continua con la ubicación y/o colocación de la guia de la platina para estructura metálica de la cubierta.	
VIERNES: -	
SABADO: -	
DOMINGO: No se realizan actividades en la obra el dia de hoy.	

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:
La obra presenta una ejecución 184 días con respecto al cronograma programado.

2. Disponibilidad de Recursos:
Se cuenta con la maquinaria y equipos menores necesarios para las actividades preliminares

3. Ejecución Financiera:
Se realiza actividades correspondientes a lo programado, donde se efectua una inversion total de $727.668.531

4. Calidad de los trabajos:
Hasta el momento los trabajos ejecutados son aceptados por la Interventoria.

5. Manejo Ambiental:
La obra ya cuenta con los certificados de botadero de residuos y materiales sobrantes.

6. Seguridad Industrial:
los trabajadores cuentan con sus elementos de seguridad industrial, tanto personal de la obra como los profesionales de campo

7. Programa salud ocupacional (si aplica):
Se cuenta con el profesional de seguridad y salud en el trabajo (SISO)

8. Aspectos sociales:

OBSERVACIONES:

*No se presentan observaciones de la obra para el periodo del presente informe.

FIRMA EL CONTRATISTA
NOMBRE: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
CARGO: REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

Aprobado por:
VoBo (FIRMA)
NOMBRE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° IND - 23 - 5027

CONTRATANTE: INDERVALLE NIT. 805.012.895-4 ORDENADOR DEL GASTO: JUAN CARLOS RUEDA ANGEL C.C. 94.501.292

CONTRATISTA: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC NIT. 901.526.894-4
REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO C.C. 1.006.166.501

INTERVENTOR: CONSORCIO GRUPO 3 NIT. 901.769.200-6 REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ. C.C. 16.708.426

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR TOTAL $	$1,426,801,042 M/CTE – INCLUIDO AIU			
PLAZO	6 MESES	180 DÍAS		
FECHA DE INICIO	28-dic-23			
PRORROGA 1		DEL:		HASTA:
PRORROGA 2		DEL:		HASTA:
PRORROGA 3		DEL:		HASTA:
SUSPENSION 1		DEL:	14 junio 2024	HASTA:
SUSPENSION 2		DEL:		HASTA:
SUSPENSION 3		DEL:		HASTA:

2. INFORMACION BASICA DEL FRENTE DE OBRA

FRENTE No. 01: CUBIERTA CANCHA MULTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO

VALOR COSTOS TOTALES: $1.426.801.042

Informe N°: 25 Fecha de informe: 10/06/2024 A 16/06/2024

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA DE OBRA

Valor frente de obra:	$1.426.801.042
Adiciones o mayor valor:	
Valor total:	$1.426.801.042
Fecha de Inicio	28/12/2023
Tiempo de prorrogas	-
Tiempo de suspensiones	-
Plazo estipulado:	185
Fecha de terminacion:	30/06/2024
Tiempo transcurrido contrato:	171 días

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Fecha de Inicio:	28/12/2023
Tiempo de prorrogas:	-
Tiempo de suspensiones:	-
Plazo actualizado:	185
Fecha de terminacion:	30/06/2024
Tiempo transcurrido Interventoria:	171 días

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FISICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso
% Programado	84,08%	1,00%	85,08%	-55
% Ejecutado	51,00%	2,00%	53,00%	0
Diferencia	33,08%	1,00%	-32,08%	

AVANCE FINANCIERO

				En %
Programado(%)	$1.199.625.780	$14.268.013	$1.213.893.794	85,08%
Ejecutado (%)	$727.668.531	$28.536.021	$756.204.552	53,00%
Diferencia	-$471.957.249	$14.268.007	-$457.689.241	-32,08%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	Ingeniero Residente e inspector
Contratista:	Arquitecto Residente de obra y cuatro obreros

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Herramienta menor

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	S/N/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	Interventor	S
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	Interventor	S
Normas ambientales	Interventor	S

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

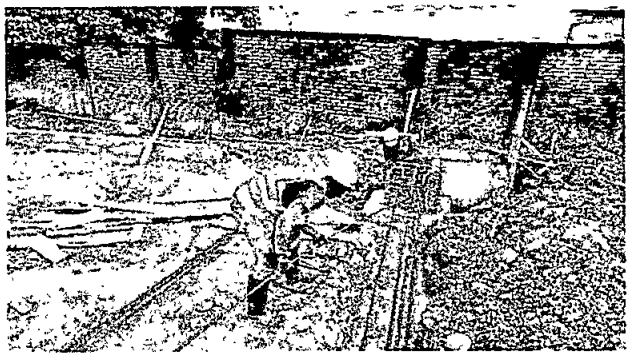

Foto 1: Carpinteria en madera

Foto 2: Encofrado de viga cimentacion con formaleta metálica y en madera.

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

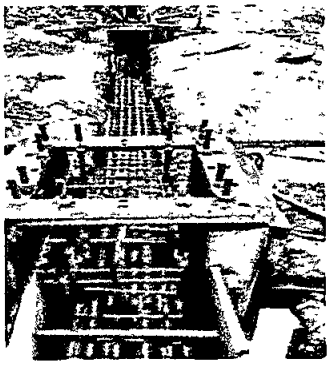

Foto 3: Ubicación y/o colocación de la guía de la platina a eje y nivelada para estructura metálica de la cubierta.

Foto 4: Ubicación y/o colocación de la guía de la platina a eje y nivelada para estructura metálica de la cubierta.

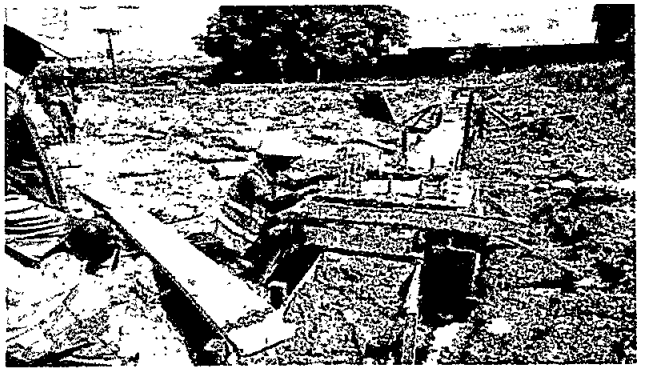

Foto 5: Fundición de viga cimentación y pedestales en concreto.

Foto 6: Fundición de viga cimentación y pedestales en concreto.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
LUNES: - No se realizaron trabajos por ser festivo.	*Montaje de estructura metálicas para cubierta de la cancha. *Encofrado en madera para aplicación de Sikagrout. *Aplicación de Sikagrout para anclajes sobre mortero. *Excavación manual para construcción canal para drenajes de las aguas lluvias.
MARTES: -Se continua con la carpintería en madera, encofrado de viga cimentacion del lado 2 con formaleta metálica y en madera y encofrado de pedestales en madera.	
MIERCOLES: - Se reinicia con la ubicación y/o colocación de la guía de la platina para estructura metálica de la cubierta.	
JUEVES: - Se continua con la ubicación y/o colocación de la guía de la platina para estructura metálica de la cubierta.	
VIERNES: se suspende la obra.	
SABADO: -	
DOMINGO:	

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:
La obra presenta una ejecución 171dias con respecto al cronograma programado.

2. Disponibilidad de Recursos:
Se cuenta con la maquinaria y equipos menores necesados para las actividades preliminares

3. Ejecución Financiera:
Se realiza actividades correspondientes a lo programado, donde se efectua una inversion total de $727.668.531

4. Calidad de los trabajos:
Hasta el momento los trabajos ejecutados son aceptados por la interventoría.

5. Manejo Ambiental:
La obra ya cuenta con los certificados de botadero de residuos y materiales sobrantes.

6. Seguridad Industrial:
los trabajadores cuentan con sus elementos de seguridad industrial, tanto personal de la obra como los profesionales de campo

7. Programa salud ocupacional (si aplica):
Se cuenta con el profesional de seguridad y salud en el trabajo (SISO)

8. Aspectos sociales:

OBSERVACIONES:

* No se presentan observaciones de la obra para el periodo del presente informe.

FIRMA EL CONTRATISTA
NOMBRE: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
CARGO: REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

Aprobado por:
Vobo (FIRMA)
NOMBRE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INDERVALLE

CG3 — CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° IND - 23 - 5027

CONTRATANTE: INDERVALLE NIT. 805.012.896-4 ORDENADOR DEL GASTO: JUAN CARLOS RUEDA ANGEL C.C. 94.501.292

CONTRATISTA: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC NIT. 901.526.894-4
REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO C.C. 1.006.166.501

INTERVENTOR: CONSORCIO GRUPO 3 NIT. 901.769.200-6 REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ. C.C. 16.700.426

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR TOTAL $	$1.426.801.042 M/CTE – INCLUIDO AIU							
PLAZO	6 MESES	180 DÍAS						
FECHA DE INICIO	28-dic-23							
		DEL:		HASTA:				
		DEL:		HASTA:				
SUSPENSION 1		DEL:	14 junio 2024	14/06/2024	HASTA:	22-agosto-24	22/08/2024	70
REINICIO N° 1		DEL:	23-agosto-24	23/08/2024	HASTA:	25-agosto-24	25/08/2024	2
SUSPENSION 3		DEL:			HASTA:			

2. INFORMACIÓN BÁSICA DEL FRENTE DE OBRA

FRENTE No. 01: CUBIERTA CANCHA MULTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO

VALOR COSTOS TOTALES:	$1.426.801.042				
Informe N°:	26	Fecha de Informe:	19/08/2024	A	25/08/2024

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATISTA DE OBRA	
Valor frente de obra:	$1.426.801.042
Adiciones o mayor valor:	-
Valor total:	$1.426.801.042
Fecha de Inicio	28/12/2023
Tiempo de prorrogas	-
Tiempo de suspensiones	-
Plazo estipulado:	185
Fecha de terminacion:	30/06/2024
Tiempo transcurrido contrato:	171 días
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	
Fecha de Inicio:	28/12/2023
Tiempo de prorrogas:	-
Tiempo de suspensiones:	-
Plazo actualizado:	185
Fecha de terminacion:	30/06/2024
Tiempo transcurrido Interventoria:	171 días

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FISICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso
% Programado	85,08%	1,00%	86,08%	-54
% Ejecutado	53,00%	1,22%	54,22%	0
Diferencia	32,08%	0,22%	-31,86%	

AVANCE FINANCIERO

				En %
Programado(%)	$1.213.893.791	$14.268.010	$1.228.161.801	86,08%
Ejecutado (%)	$756.204.552	$17.406.973	$773.611.525	54,22%
Diferencia	-$457.689.238	$3.138.962	-$454.550.276	-31,86%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	Ingeniero Residente e Inspector
Contratista:	Arquitecto Residente de obra y cuatro obreros

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Herramienta menor

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	S/N/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	Interventor	S
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	Interventor	S
Normas ambientales	Interventor	S

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

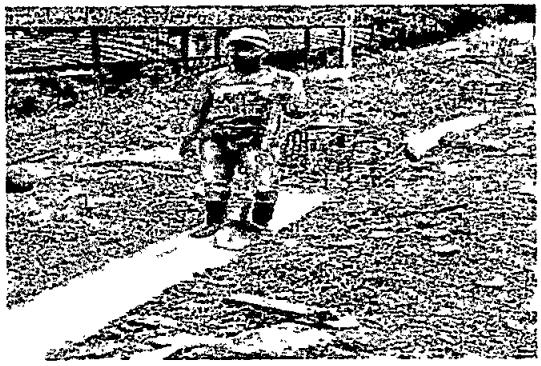

Foto 1: Limpieza de material caído en excavaciones existentes y retiro de lodo acumulado.

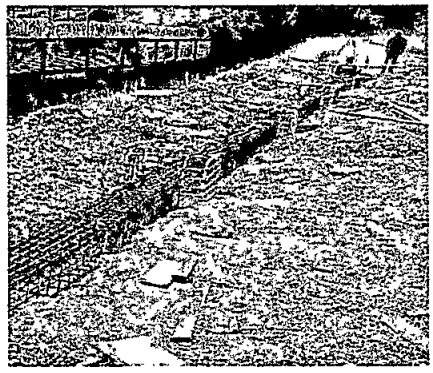

Foto 2: Armado de estructura de acero refuerzo para viga cimentación.

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

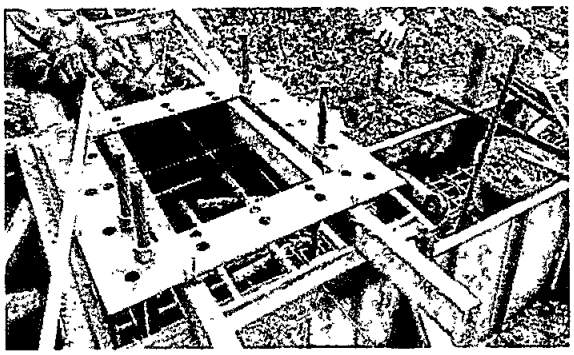

Foto 3: Carpintería en madera para encofrado de pedestales en concreto

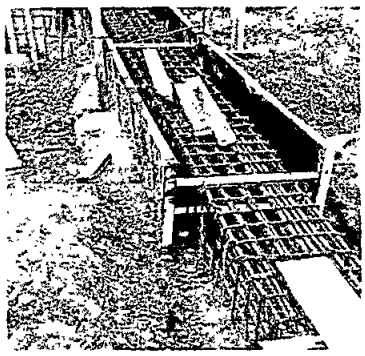

Foto 4: Encofrado de viga cimentacion con formaleta metálica y en madera

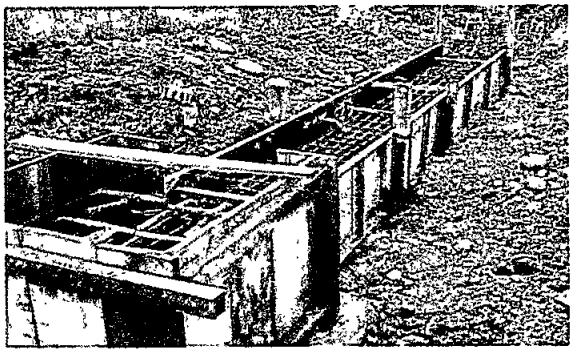

Foto 5: Encofrado de pedestales en madera.

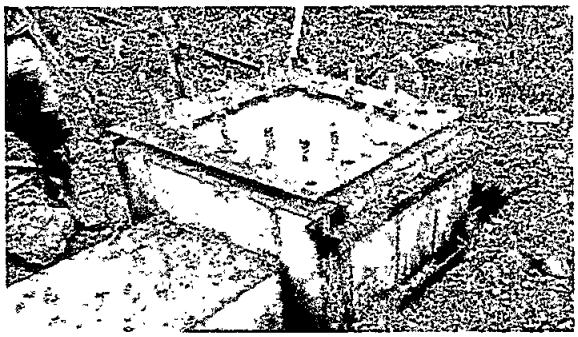

Foto 6: Desencofrado de viga cimentación y pedestales.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
LUNES: -	*Excavación a máquina, retiro de material sobrante y escombros. *Instalación de Geoceldá para mejoramiento de terreno. *Relleno con material de río seleccionado. *Compactación y nivelación del terreno. *Levantamiento topográfico (Comisión topográfica).
MARTES: -	
MIERCOLES: -	
JUEVES: -	
VIERNES: - Se reinicia la obra.	
SABADO: - Se realizó relleno con material de sitio en viga cimentación del lado 1.	
DOMINGO: Se suspende el contrato.	

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:
La obra presenta una ejecución 171 días con respecto al cronograma programado.

2. Disponibilidad de Recursos:
Se cuenta con la maquinaria y equipos menores necesarios para las actividades preliminares

3. Ejecución Financiera:
Se realiza actividades correspondientes a lo programado, donde se efectua una inversion total de $773.611.525

4. Calidad de los trabajos:
Hasta el momento los trabajos ejecutados son aceptados por la interventoria.

5. Manejo Ambiental:
La obra ya cuenta con los certificados de botadero de residuos y materiales sobrantes.

6. Seguridad Industrial:
los trabajadores cuentan con sus elementos de seguridad industrial, tanto personal de la obra como los profesionales de campo

7. Programa salud ocupacional (si aplica):
Se cuenta con el profesional de seguridad y salud en el trabajo (SISO)

8. Aspectos sociales:

OBSERVACIONES:

*No se presentan observaciones de la obra para el periodo del presente informe.

FIRMA EL CONTRATISTA
NOMBRE: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
CARGO: REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

Aprobado por:
VoBo (FIRMA)
NOMBRE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

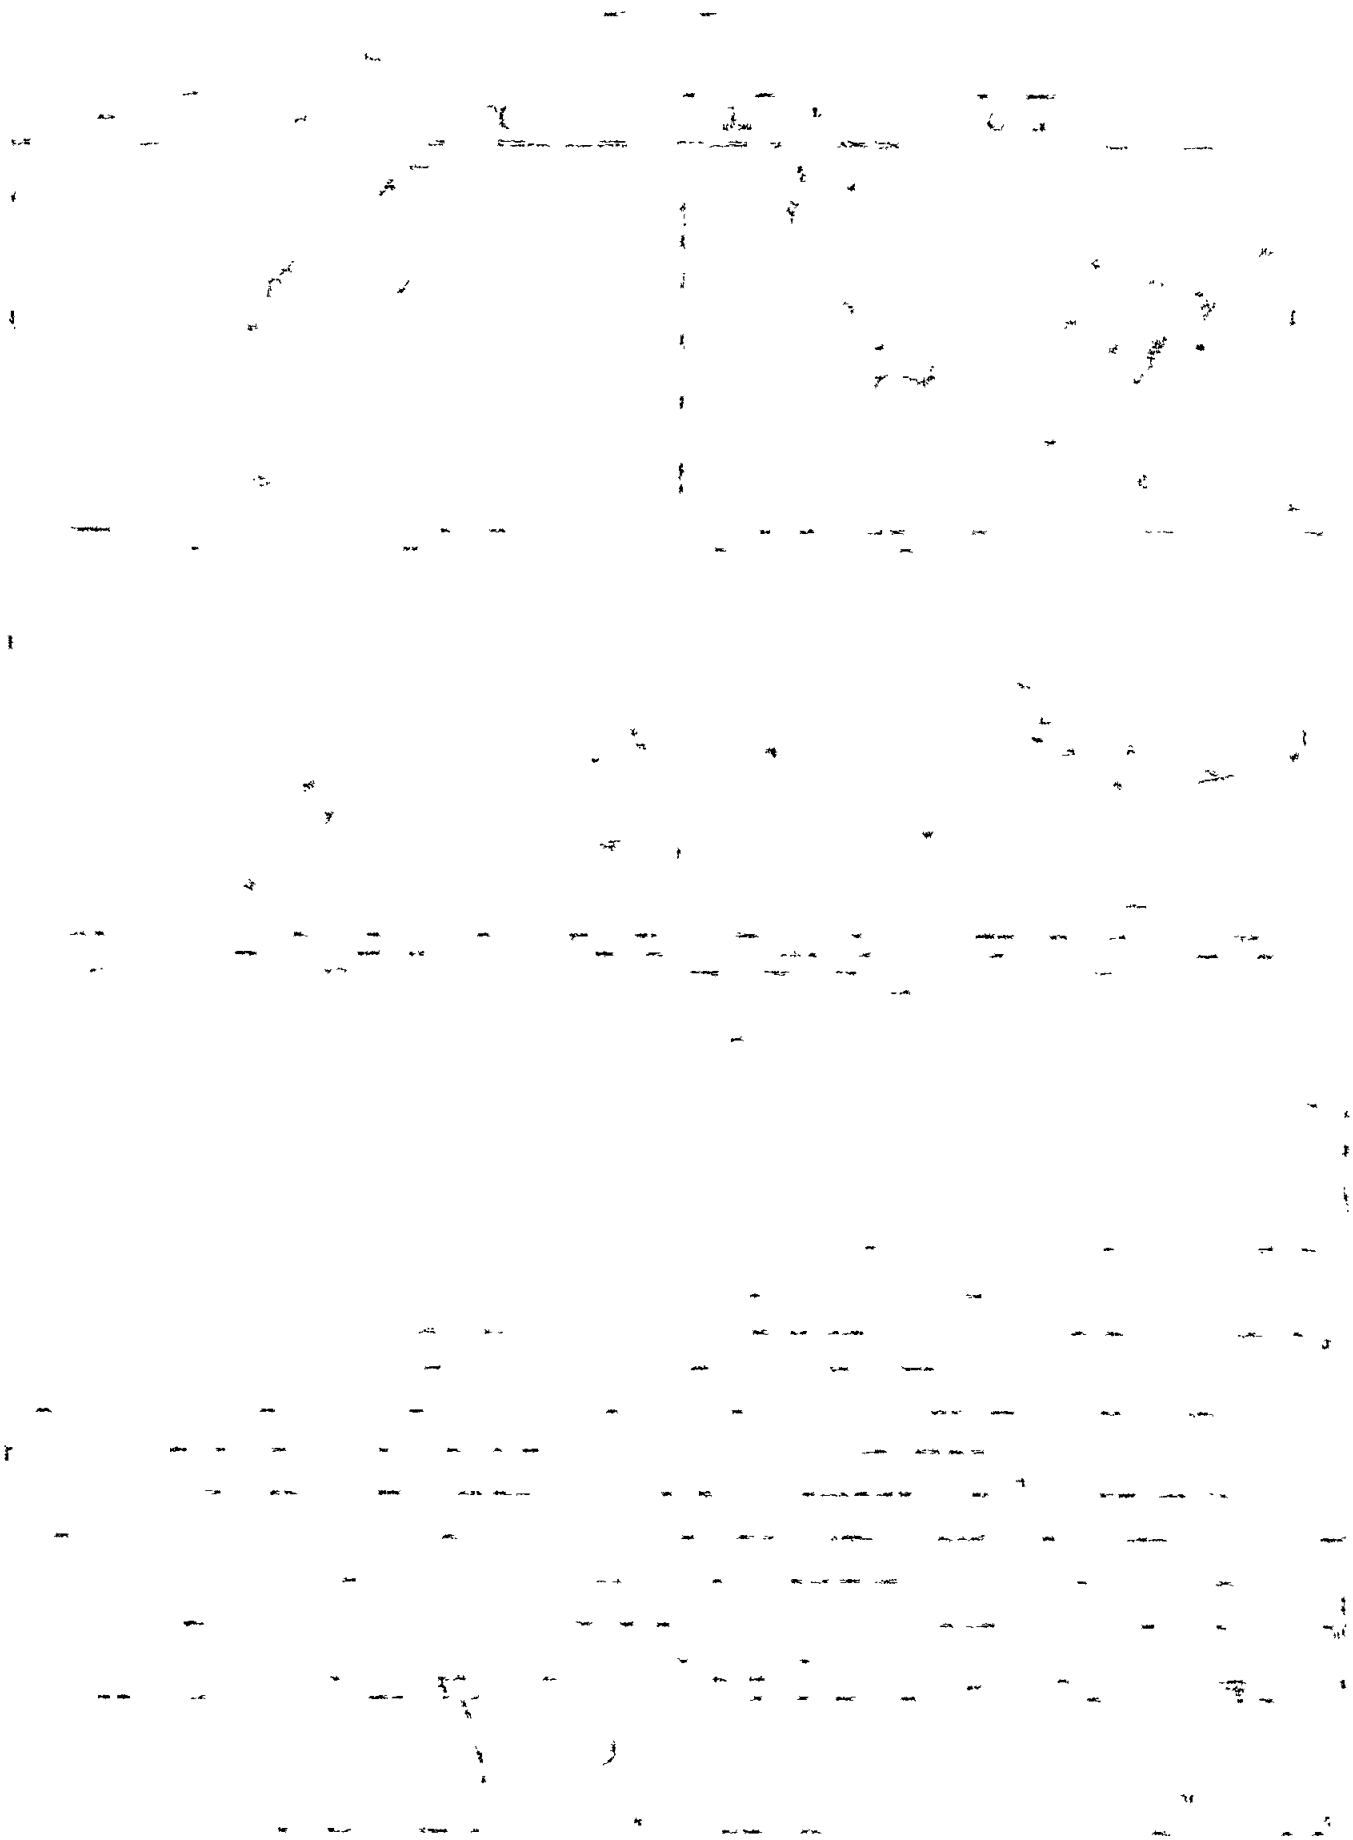

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACION BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° IND - 23 - 5027

CONTRATANTE: INDERVALLE NIT. 805.012.896-4 ORDENADOR DEL GASTO: JUAN CARLOS RUEDA ANGEL C.C. 94.501.292

CONTRATISTA: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC NIT. 901.526.894-4
REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO C.C. 1.006.166.501

INTERVENTOR: CONSORCIO GRUPO 3 NIT. 901.769.200-6 REPRESENTANTE LEGAL. JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ. C.C. 16.700.426

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS· MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR TOTAL $	$1.867.899.794 M/CTE – INCLUIDO AIU						
PLAZO							
FECHA DE INICIO	28-dic-23						
	DEL:		HASTA:				
SUSPENSION 1	DEL: 14 junio 2024	14/06/2024	HASTA:	22-agosto-24	22/08/2024		70
REINICIO N° 1	DEL: 23-agosto-24	23/08/2024	HASTA:	25-agosto-24	25/08/2024		3
SUSPENSION 2	DEL: 26-agosto-24	26/08/2024	HASTA:	14-octubre-24	14/10/2024		50
REINICIO N° 2	DEL: 15-octubre-24	15/10/2024	HASTA:	22-octubre-24	22/10/2024		8
	DEL:		HASTA:				

2. INFORMACION BASICA DEL FRENTE DE OBRA

FRENTE No. 01: CUBIERTA CANCHA MULTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO

VALOR COSTOS TOTALES: $1.426.801.042

Informe N°: 27 Fecha de informe. 14/10/2024 A 20/10/2024

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA DE OBRA.

Valor frente de obra:	$1.426.801.042
Adiciones o mayor valor:	
Valor total:	$1.426.801.042
Fecha de Inicio	28/12/2023
Tiempo de prorrogas	
Tiempo de suspensiones	-
Plazo estipulado:	185
Fecha de terminacion:	30/06/2024
Tiempo transcurrido contrato:	177 días

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Fecha de Inicio:	28/12/2023
Tiempo de prorrogas:	22/03/2025
Tiempo de suspensiones:	-
Plazo actualizado:	185
Fecha de terminacion:	30/06/2024
Tiempo transcurrido Interventoria:	177 días

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FISICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso
% Programado	86,08%	1,00%	87,08%	-54
% Ejecutado	54,22%	2,50%	56,72%	0
Diferencia	31,86%	1,50%	-30,36%	

AVANCE FINANCIERO

				En %
Programado(%)	$1.228.161.801	$14.268.010	$1.242.429.811	87,08%
Ejecutado (%)	$773.611.525	$35.670.026	$809.281.551	56,72%
Diferencia	-$454.550.276	$21.402.016	-$433.148.260	-30,36%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoria:	Ingeniero Residente e inspector
Contratista:	Arquitecto Residente de obra y cuatro obreros

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Herramienta menor
Mini cargador (Bobcat)
Retroexcavadora, volquetas

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	S/N/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	Interventor	S
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	Interventor	S
Normas ambientales	Interventor	S

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

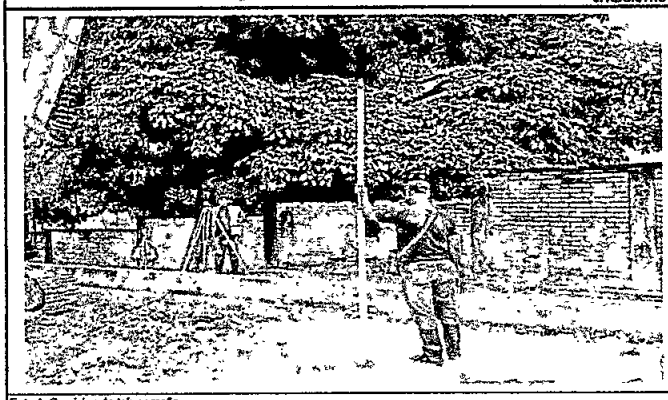

Foto 1: Comision de toppografia

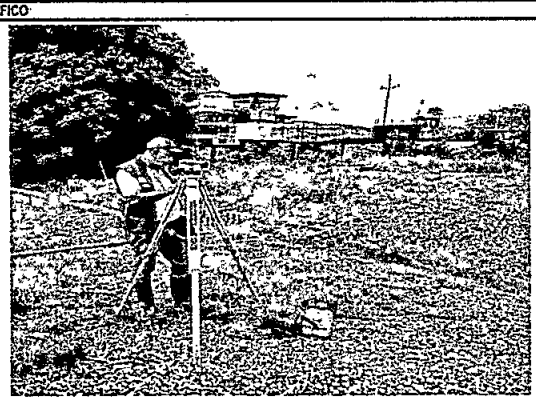

Foto 2: Encofrado de viga cimentacion con formaleta metálica y en madera.

INDERVALLE

CG3

CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

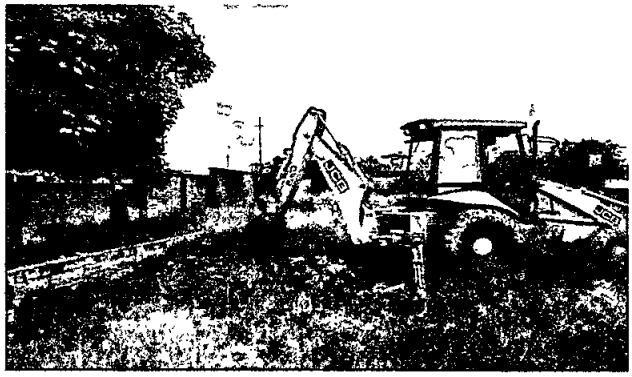

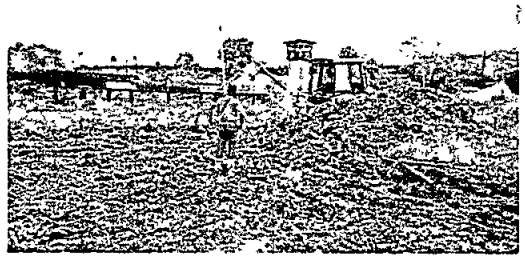

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Foto 3: excavacion con maquina y descapote.

Foto 4: Comision de topografia

Foto 5: Relleno con material para la compactacion del terreno.

Foto 6: Retiro de material de la excavacion.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
LUNES: -	*Compactación de material seleccionado.
MARTES: - Se reinicia la obra.	
MIERCOLES: - Se continua con la comisión topográfica, excavación a máquina, retiro de material sobrante de la excavación y escombros	
JUEVES: -Se continua con la construccion de la cimentacion, excavación a máquina, retiro de material sobrante de la excavación y escombros	
VIERNES: - Se inicia con el manejo de aguas lluvias y la fundicion de la cimentacion.	
SABADO: -Se continua con la fundicion de la cimentacion.	
DOMINGO: No se realizan actividades en la obra el dia de hoy.	

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:
La obra presenta una ejecución 177 dias con respecto al cronograma programado.

2. Disponibilidad de Recursos:
Se cuenta con la maquinaria y equipos menores necesarios para las actividades preliminares

3. Ejecución Financiera:
Se realiza actividades correspondientes a lo programado, donde se efectua una inversion total de $809.281.551

4. Calidad de los trabajos:
Hasta el momento los trabajos ejecutados son aceptados por la interventoria.

5. Manejo Ambiental:
La obra ya cuenta con los certificados de botadero de residuos y materiales sobrantes.

6. Seguridad Industrial:
los trabajadores cuentan con sus elementos de seguridad industrial, tanto personal de la obra como los profesionales de campo

7. Programa salud ocupacional (si aplica):
Se cuenta con el profesional de seguridad y salud en el trabajo (SISO)

8. Aspectos sociales:

OBSERVACIONES:

* No se presentan observaciones de la obra para el período del presente informe.

FIRMA EL CONTRATISTA
NOMBRE: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
CARGO: REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

Aprobado por:
VoBo (FIRMA)
NOMBRE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° IND - 23 - 5027

CONTRATANTE: INDERVALLE NIT. 805.012.896-4 ORDENADOR DEL GASTO: JUAN CARLOS RUEDA ANGEL C.C. 94.501.292

CONTRATISTA: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC NIT. 901.526.894-4
REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO C.C. 1.006.166.501

INTERVENTOR: CONSORCIO GRUPO 3 NIT. 901.769.200-6 REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ. C.C. 16.700.426

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR TOTAL $	$1.867.899.794 M/CTE – INCLUIDO AIU					
PLAZO						
FECHA DE INICIO	28-dic-23					
		DEL:		HASTA:		
SUSPENSION 1		DEL: 14 junio 2024	14/06/2024	HASTA: 22-agosto-24	22/08/2024	70
REINICIO N° 1		DEL: 23-agosto-24	23/08/2024	HASTA: 25-agosto-24	25/08/2024	3
SUSPENSION 2		DEL: 26-agosto-24	26/08/2024	HASTA: 14-octubre-24	14/10/2024	50
REINICIO N° 2		DEL: 15-octubre-24	15/10/2024	HASTA: 22-octubre-24	22/10/2024	8
		DEL:		HASTA:		

2. INFORMACION BASICA DEL FRENTE DE OBRA

FRENTE No. 01: CUBIERTA CANCHA MULTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO

VALOR COSTOS TOTALES: $1.426.801.042

Informe N°: 28 Fecha de informe: 21/10/2024 A 27/10/2024

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATISTA DE OBRA		SEGUIMIENTO DE OBRA AVANCE FISICO (%)				
Valor frente de obra:	$1.426.801.042	Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso
Adiciones o mayor valor:		% Programado	87,08%	1,00%	88,08%	-53
Valor total:	$1.426.801.042	% Ejecutado	56,72%	2,50%	59,22%	0
Fecha de Inicio	28/12/2023	Diferencia	30,36%	1,50%	-28,86%	
Tiempo de prorrogas		AVANCE FINANCIERO				En %
Tiempo de suspensiones	-	Programado(%)	$1.242.429.811	$14.268.010	$1.256.697.822	88,08%
Plazo estipulado:	184	Ejecutado (%)	$809.281.551	$35.670.026	$844.951.577	59,22%
Fecha de terminacion:	30/06/2024	Diferencia	-$433.148.260	$21.402.016	-$411.746.245	-28,86%
Tiempo transcurrido contrato:	184 dias	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		PERSONAL PROMEDIO EN OBRA			
		Interventoria:	Ingeniero Residente e inspector		
Fecha de Inicio:	28/12/2023	Contratista:	Arquitecto Residente de obra y cuatro obreros		
Tiempo de prorrogas:	22/03/2025	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA			
Tiempo de suspensiones:	-	Herramienta menor			
Plazo actualizado:	185	Mini cargador (Bobcat)			
Fecha de terminacion:	30/06/2024	Retroexcavadora, volquetas			
Tiempo transcurrido interventoria:	184 dias	SEGUIMIENTO OBLIGACIONES		VERIFICADO POR	S/N/NA
		Aportes a seguridad Social y parafiscales		Interventor	S
		Normas seguridad, higiene y salud ocupacional		Interventor	S
		Normas ambientales		Interventor	S

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

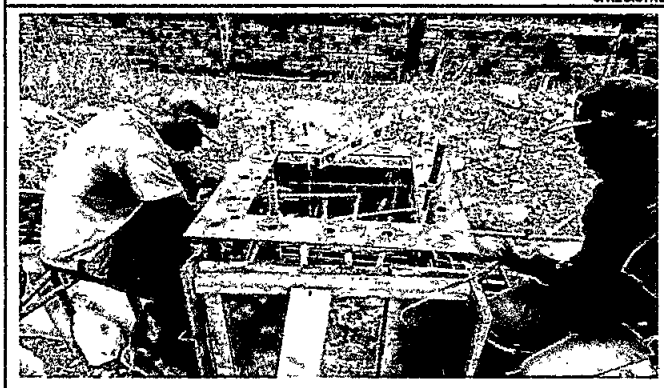

Foto 1: Ubicación y/o colocación de la guia de la platina a eje y nivelada para estructura metálica de la cubierta.

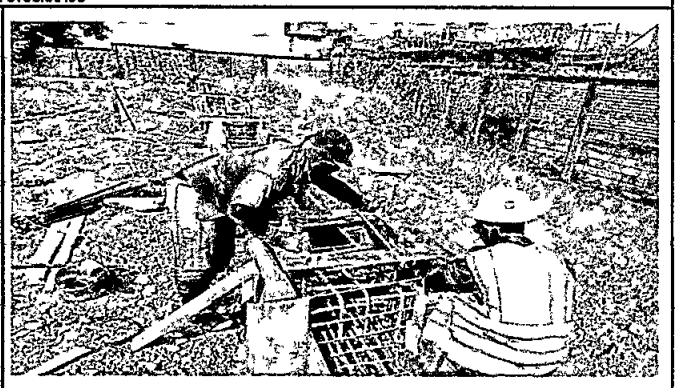

Foto 2: Ubicación y/o colocación de la guia de la platina a eje y nivelada para estructura metálica de la cubierta.

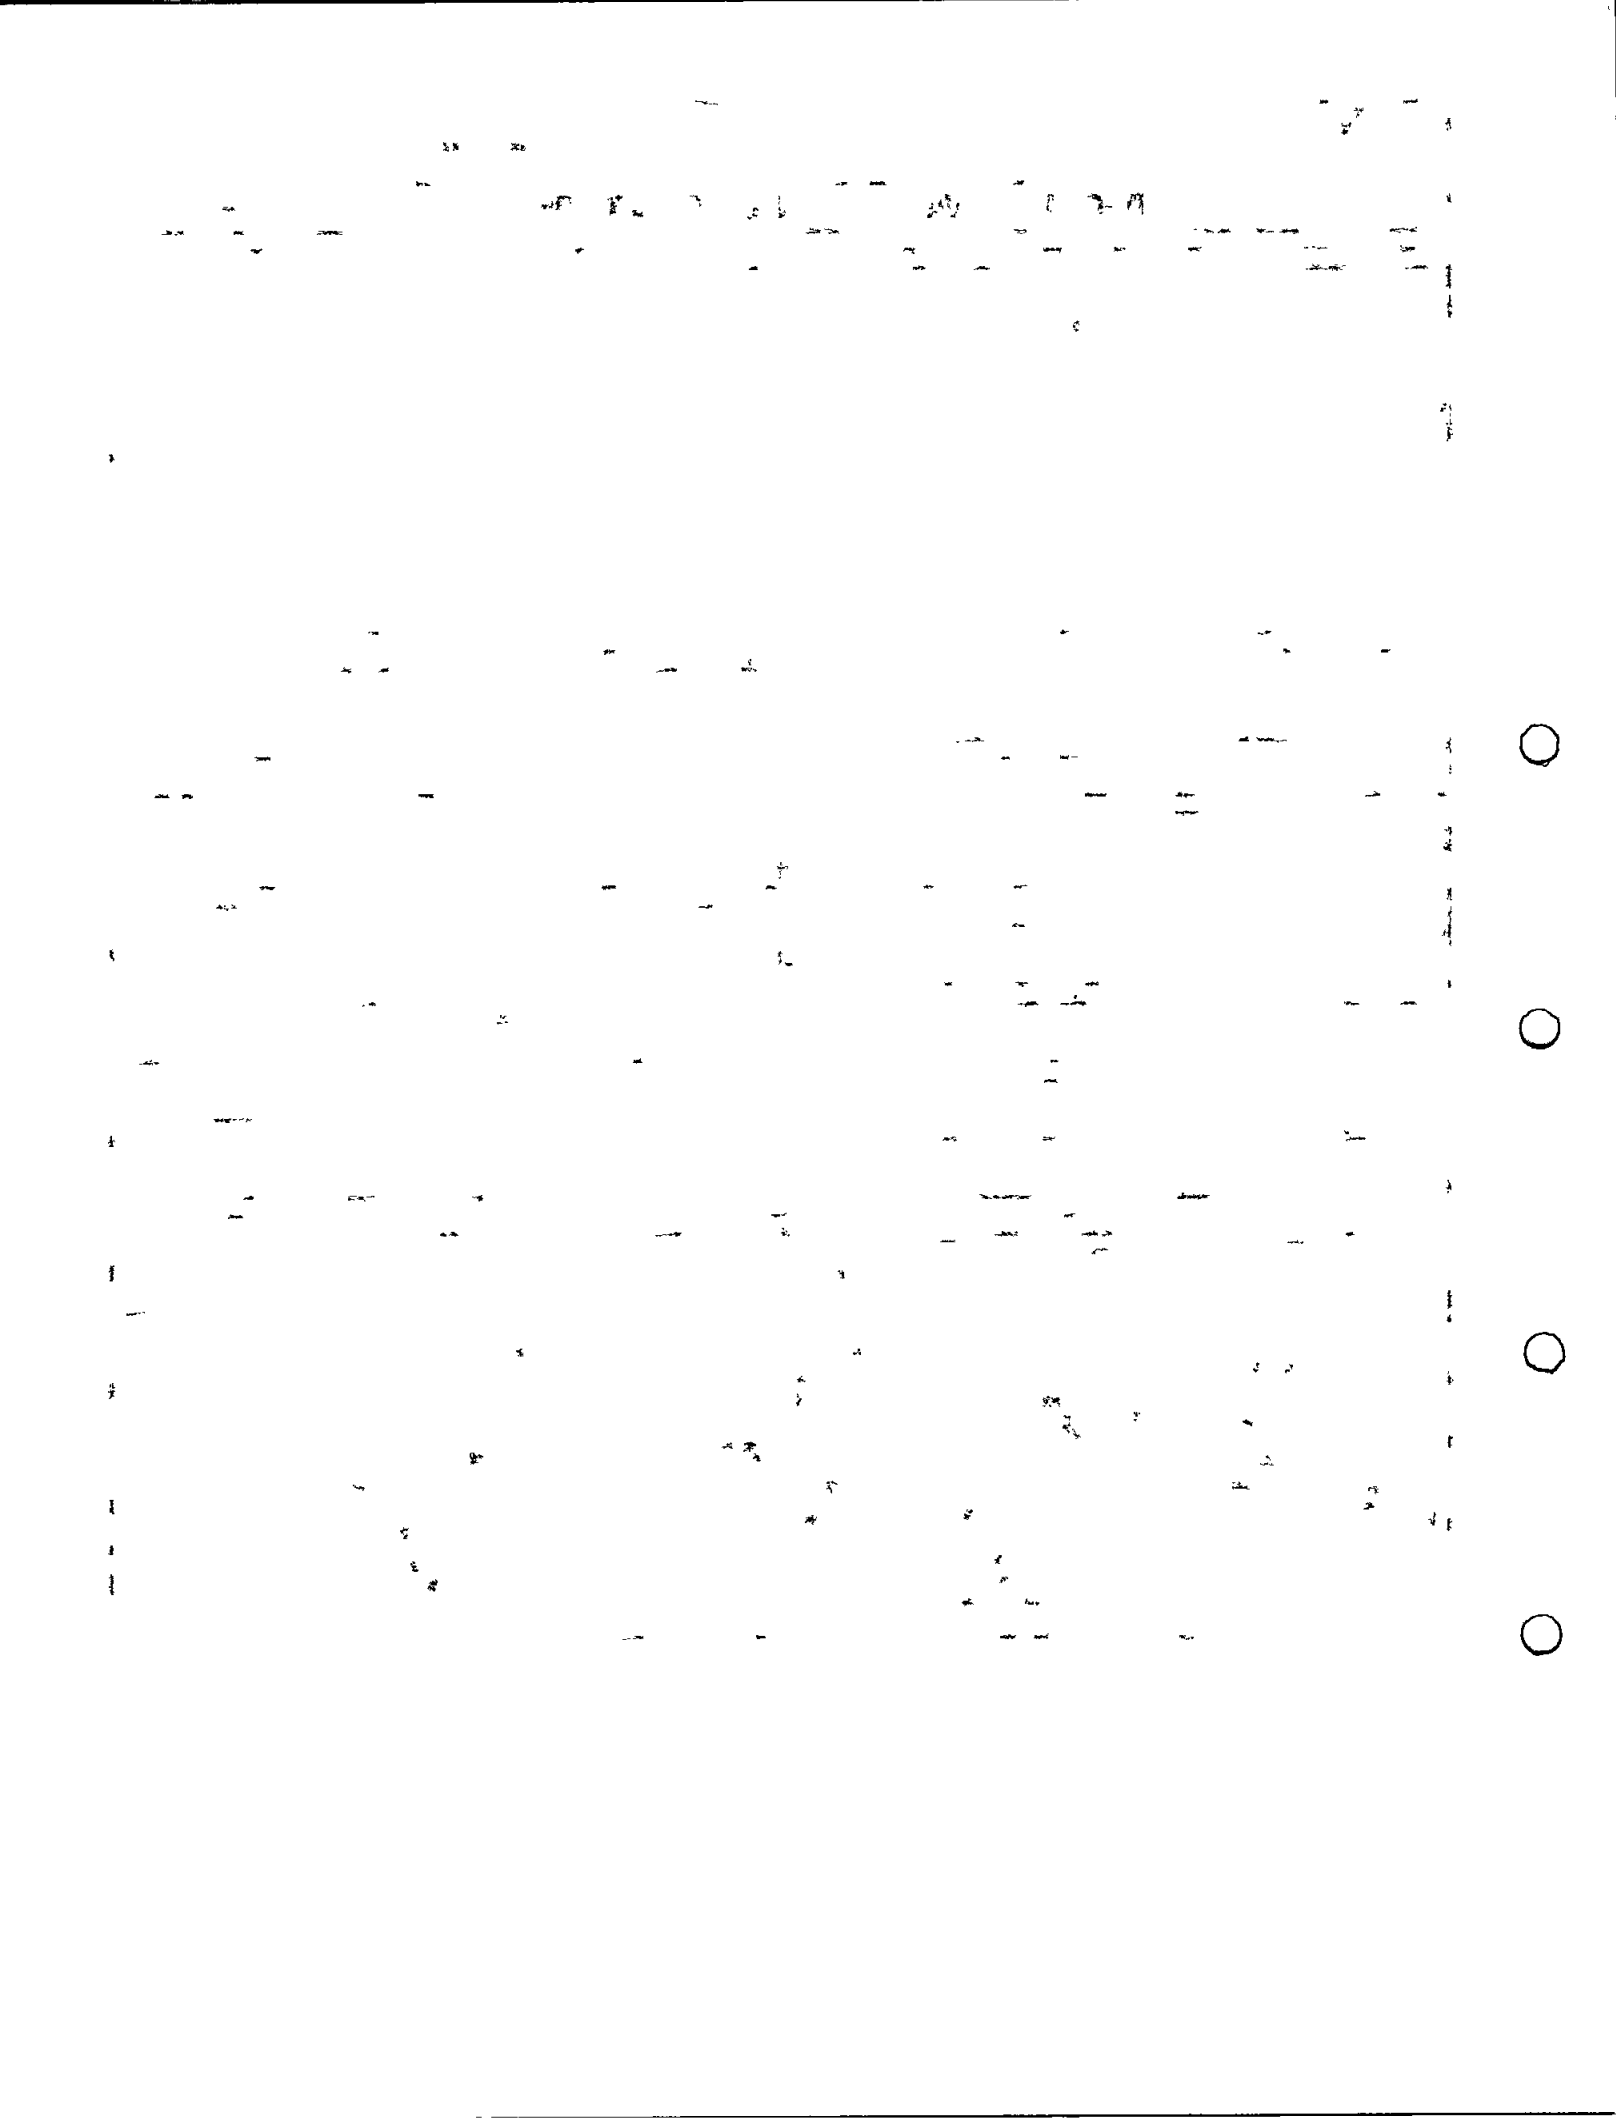

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

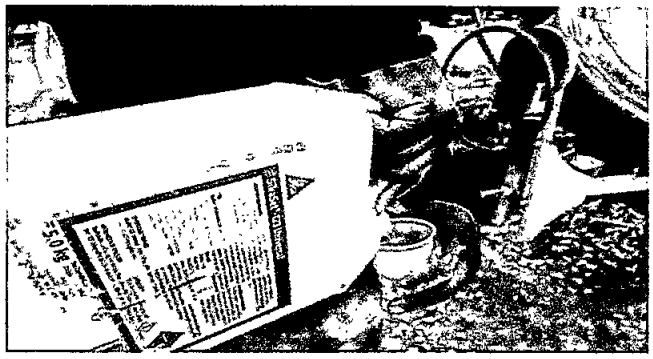

Foto 4: Aplicación de acelerante para concreto de la fundición pedestales en concreto.

Foto 4: Fundiccion de concreto para viga de cimentacion.

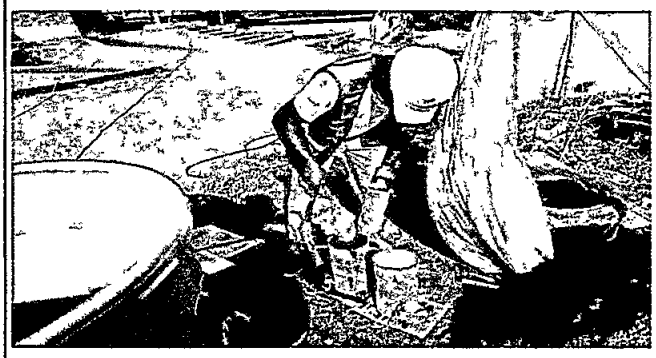

Foto 5: Toma de la muestra de concreto.

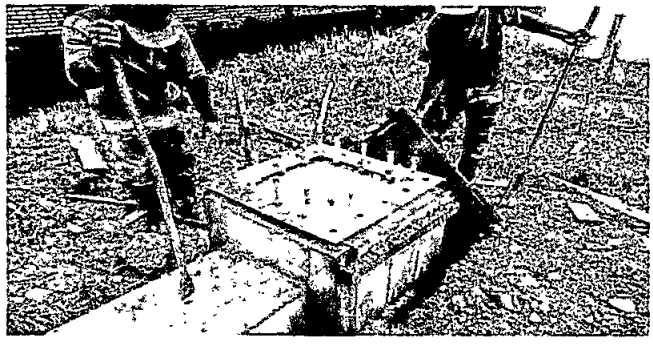

Foto 6: Desencofrado de vigas cimentación y pedestales.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
LUNES: - se continua con la fundicion de los cimientos, vigas y pedestales.	*Compactación de material seleccionado.
MARTES: - Se suspende la obra.	
MIERCOLES: -	
JUEVES: -	
VIERNES: -	
SABADO: -	
DOMINGO:	

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:
La obra presenta una ejecución 184 dias con respecto al cronograma programado.

2. Disponibilidad de Recursos:
Se cuenta con la maquinaria y equipos menores necesarios para las actividades preliminares

3. Ejecución Financiera:

4. Calidad de los trabajos:
Hasta el momento los trabajos ejecutados son aceptados por la interventoría.

5. Manejo Ambiental:
La obra ya cuenta con los certificados de botadero de residuos y materiales sobrantes.

6. Seguridad Industrial:
los trabajadores cuentan con sus elementos de seguridad industrial, tanto personal de la obra como los profesionales de campo

7. Programa salud ocupacional (si aplica):
Se cuenta con el profesional de seguridad y salud en el trabajo (SISO)

8. Aspectos sociales:

OBSERVACIONES:

* No se presentan observaciones de la obra para el periodo del presente informe.

Aprobado por:

FIRMA EL CONTRATISTA
NOMBRE: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
CARGO: REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

VoBo (FIRMA)
NOMBRE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° IND - 23 - 5027

CONTRATANTE: INDERVALLE NIT. 805.012.896-4 ORDENADOR DEL GASTO: JUAN CARLOS RUEDA ANGEL C.C. 94.501.292

CONTRATISTA: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC NIT. 901.526.894-4
REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO C.C. 1.006.166.501

INTERVENTOR: CONSORCIO GRUPO 3 NIT. 901.769.200-6 REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ. C.C. 16.700.425

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR TOTAL $	$1.867.899.794 M/CTE – INCLUIDO AIU					
PLAZO	6 MESES	180 DÍAS				
FECHA DE INICIO	28-dic-23					
	4-nov-24	186 DÍAS		HASTA: 9-mayo-25	9/05/2025	186
SUSPENSION 1	DEL: 14 junio 2024		14/06/2024	HASTA: 22-agosto-24	22/08/2024	70
REINICIO N° 1	DEL: 23-agosto-24		23/08/2024	HASTA: 25-agosto-24	25/08/2024	3
SUSPENSION 2	DEL: 26-agosto-24		26/08/2024	HASTA: 14-octubre-24	14/10/2024	50
REINICIO N° 2	DEL: 15-octubre-24		15/10/2024	HASTA: 22-octubre-24	22/10/2024	8
SUSPENSION 3	DEL: 22-octubre-24		22/10/2024	HASTA:4-noviembre-24	4/11/2024	13
REINICIO N° 3	DEL: 4-noviembre-24		4/11/2024	HASTA: 9-mayo-25	5/05/2025	182

2. INFORMACION BASICA DEL FRENTE DE OBRA

FRENTE No. 01: CUBIERTA CANCHA MULTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO

VALOR COSTOS TOTALES. $1.867.899.794

Informe N°: 29 Fecha de informe: 4/11/2024 A 10/11/2024

INFORMACION GENERAL

CONTRATISTA DE OBRA

Valor frente de obra:	$1.426.801.042
Adiciones o mayor valor:	$441.098.752
Valor total:	$1.867.899.794
Fecha de Inicio	28/12/2023
Tiempo de prorrogas	186
Tiempo de suspensiones	133 dias
Plazo estipulado:	367 dias
Fecha de terminacion:	9/05/2025
Tiempo transcurrido contrato:	185 dias

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Fecha de Inicio:	28/12/2023
Tiempo de prorrogas:	22/03/2025
Tiempo de suspensiones:	133 dias
Plazo actualizado:	367 dias
Fecha de terminacion:	9/05/2025
Tiempo transcurrido Interventoría:	185 dias

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FISICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso
% Programado	42,50%	2,24%	44,74%	0
% Ejecutado	38,90%	2,50%	41,40%	
Diferencia	3,60%	0,26%	-3,34%	

AVANCE FINANCIERO

				En %
Programado(%)	$793.857.412	$41.840.955	$835.698.368	44,74%
Ejecutado (%)	$726.613.020	$46.697.495	$773.310.515	41,40%
Diferencia	-$67.244.393	$4.856.539	-$62.387.853	-3,34%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	Ingeniero Residente e Inspector
Contratista:	Arquitecto Residente de obra y cuatro obreros

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Herramienta menor
Mini cargador (Bobcat)
Cilindro compactador

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	S/N/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	Interventor	S
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	Interventor	S
Normas ambientales	Interventor	S

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1: Comisión topográfica

Foto 2: Excavación a máquina.

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

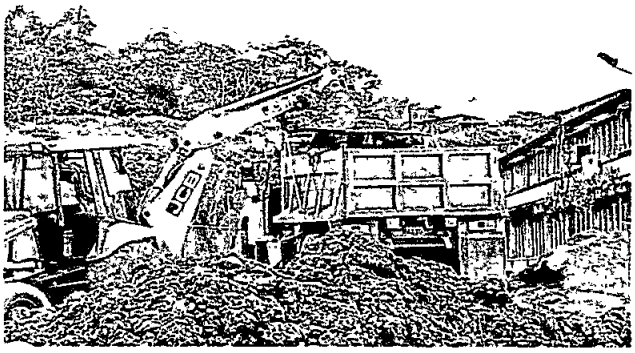

Foto 3. Retiro de material sobrante y escombros

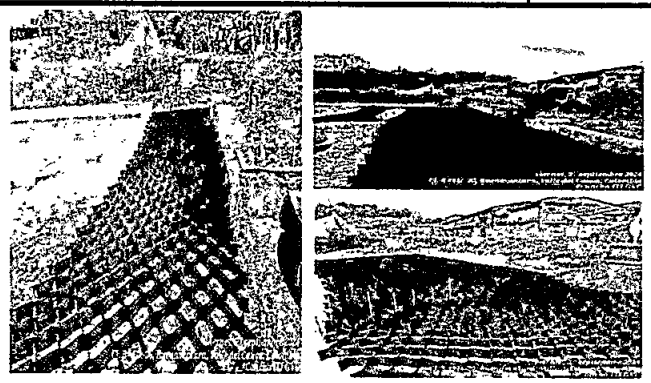

Foto 4: Instalación de Geoceldá

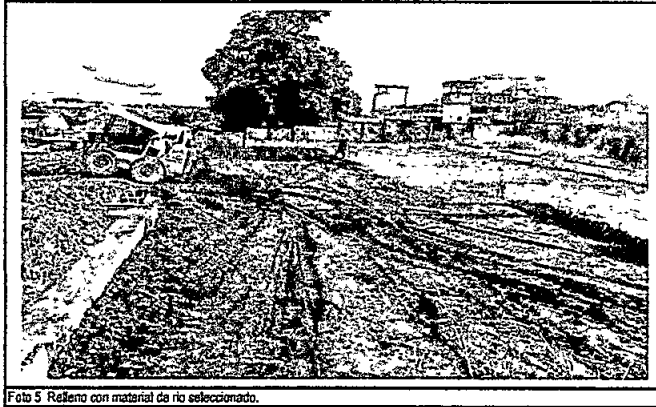

Foto 5 Relleno con material de rio seleccionado.

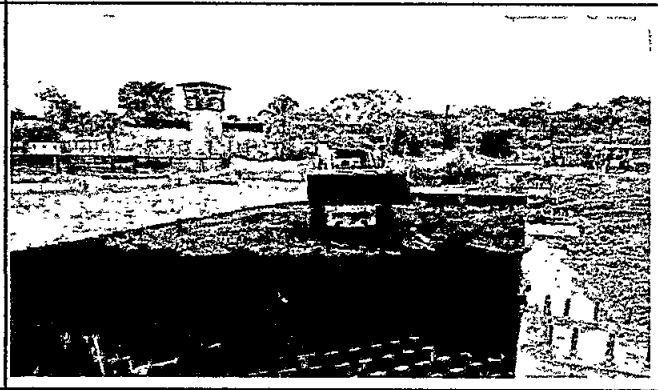

Foto 6: Relleno con material de rio seleccionado.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
LUNES: - Se remcia la obra.	
MARTES: - Se continua con la instalación de geoceldá, se continua con relleno de material de rio seleccionado para conformación de la base y se inicia la compactación de terreno.	
MIERCOLES: - Se continua con la instalación de geoceldá, de igual manera con relleno de material de rio seleccionado para conformación de la base, compactación y nivelación del terreno.	*Montaje de estructura metálicas para cubierta de la cancha. *Encofrado en madera para aplicación de Sikagrout. *Aplicación de Sikagrout para anclajes sobre mortero. *Excavación manual para construcción canal para drenajes de las aguas lluvias.
JUEVES: - Se continua con relleno para conformación de terreno, compactación y nivelación del terreno.	
VIERNES: - Se continua con relleno para conformación de terreno, compactación y nivelación del terreno	
SABADO: - Se continua con relleno para conformación de terreno, compactación y nivelación del terreno	
DOMINGO: No se realizan actividades en la obra el día de hoy.	

LOGROS Y/O DIFICULTADES
1. Cronograma:
La obra presenta una ejecución 184 días con respecto al cronograma programado.
2. Disponibilidad de Recursos:
Se cuenta con la maquinaria y equipos menores necesarios para las actividades preliminares
3. Ejecución Financiera:
Se realiza actividades correspondientes a lo programado, donde se efectua una inversion total de $773.310.515
4. Calidad de los trabajos:
Hasta el momento los trabajos ejecutados son aceptados por la interventoría.
5. Manejo Ambiental:
La obra ya cuenta con los certificados de botadero de residuos y materiales sobrantes.
6. Seguridad Industrial:
los trabajadores cuentan con sus elementos de seguridad industrial, tanto personal de la obra como los profesionales de campo
7. Programa salud ocupacional (si aplica):
Se cuenta con el profesional de seguridad y salud en el trabajo (SISO)
8. Aspectos sociales:

OBSERVACIONES:
* No se presentan observaciones de la obra para el periodo del presente informe.

Aprobado por:

FIRMA EL CONTRATISTA
NOMBRE: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
CARGO REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

VoBo (FIRMA)
NOMBRE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° IND - 23 - 5027

CONTRATANTE: INDERVALLE NIT. 805.012.896-4 ORDENADOR DEL GASTO: JUAN CARLOS RUEDA ANGEL C.C. 94.501.292

CONTRATISTA. CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC NIT. 901.526.894-4
REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO C.C. 1.006.166.501

INTERVENTOR: CONSORCIO GRUPO 3 NIT. 901.759.200-6 REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ. C.C. 16.700.425

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR TOTAL $	$1.426.801.042 M/CTE – INCLUIDO AIU					
PLAZO	6 MESES	180 DÍAS				
FECHA DE INICIO	28-dic-23					
	4-nov-24	186 DÍAS		HASTA: 9-mayo-25	9/05/2025	186
SUSPENSION 1		DEL: 14 junio 2024	14/06/2024	HASTA: 22-agosto-24	22/08/2024	70
REINICIO N° 1		DEL: 23-agosto-24	23/08/2024	HASTA: 25-agosto-24	25/08/2024	3
SUSPENSION 2		DEL: 26-agosto-24	26/08/2024	HASTA: 14-octubre-24	14/10/2024	50
REINICIO N° 2		DEL: 15-octubre-24	15/10/2024	HASTA: 22-octubre-24	22/10/2024	8
SUSPENSION 3		DEL: 22-octubre-24	22/10/2024	HASTA:4-noviembre-24	4/11/2024	13
REINICIO N° 3		DEL: 4-noviembre-24	4/11/2024	HASTA: 9-mayo-25	5/05/2025	182

2. INFORMACION BASICA DEL FRENTE DE OBRA

FRENTE No. 01: CUBIERTA CANCHA MULTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO

VALOR COSTOS TOTALES:	$1.867.899.794				
Informe N°:	30	Fecha de informe.	11/11/2024	A	17/11/2024

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA DE OBRA

Valor frente de obra:	$1.426.801.042
Adiciones o mayor valor:	$441.098.752
Valor total:	$1.867.899.794
Fecha de Inicio	28/12/2023
Tiempo de prorrogas	186 días
Tiempo de suspensiones	133 días
Plazo estipulado:	367 días
Fecha de terminacion:	9/05/2025
Tiempo transcurrido contrato:	192 días

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Fecha de Inicio:	28/12/2023
Tiempo de prorrogas:	22/03/2025
Tiempo de suspensiones:	133 días
Plazo actualizado:	367 días
Fecha de terminacion:	9/05/2025
Tiempo transcurrido Interventoria:	192 días

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FISICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso
% Programado	44,74%	2,24%	46,98%	
% Ejecutado	41,40%	3,00%	44,40%	
Diferencia	3,34%	0,76%	-2,58%	

AVANCE FINANCIERO

				En %
Programado(%)	$835.698.368	$41.840.955	$877.539.323	46,98%
Ejecutado (%)	$773.310.515	$56.036.994	$829.347.509	44,40%
Diferencia	-$62.387.853	$14.196.038	-$48.191.815	-2,58%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	Ingeniero Residente e inspector
Contratista:	Arquitecto Residente de obra y cuatro obreros

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Herramienta menor
Mini cargador (Bobcat)
Cilindro compactador

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	S/N/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	Interventor	S
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	Interventor	S
Normas ambientales	Interventor	S

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

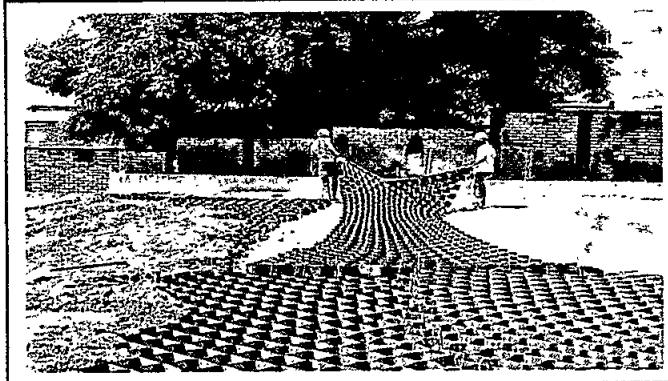

Foto 1: Instalación de Geoceldа

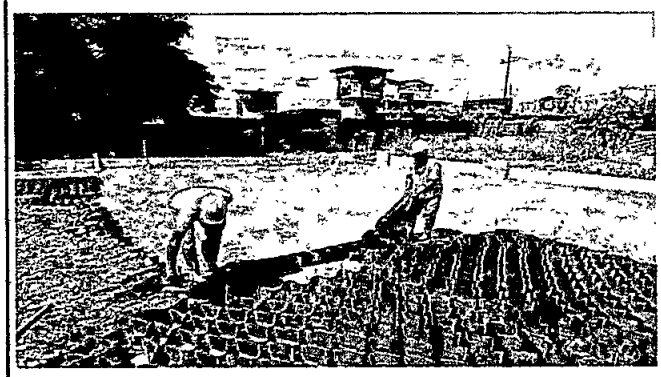

Foto 2: Instalación de Geoceldа

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Foto 3: Relleno con material de rio seleccionado.

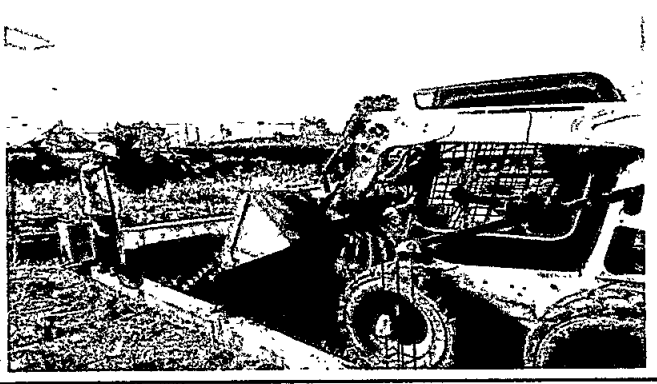

Foto 4: Relleno con material de rio seleccionado.

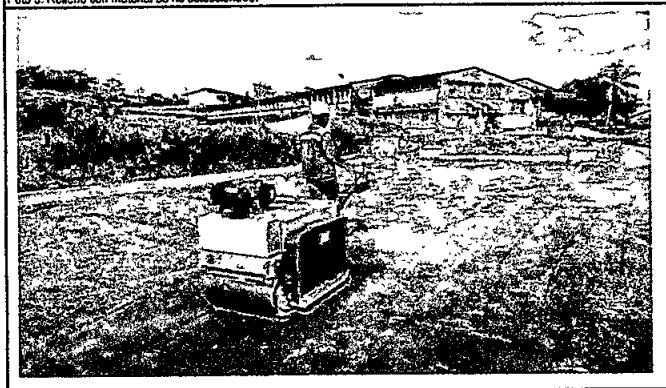

Foto 5. Compactación y nivelación de terreno.

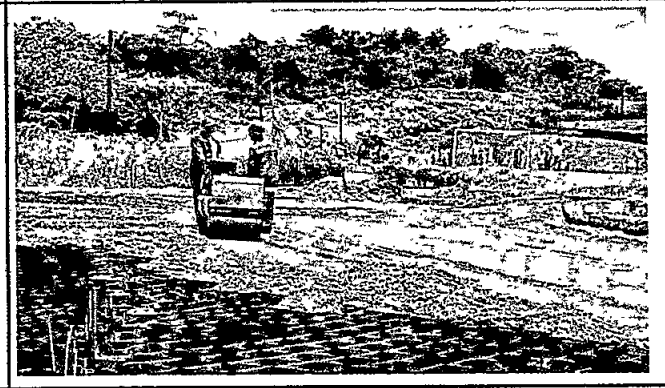

Foto 6: Compactación y nivelación de terreno.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
LUNES: - Se realizó ubicación de niveles para relleno de la sub-base por parte de la comisión topográfica.	*Montaje de estructura metálicas para cubierta de la cancha. *Encofrado en madera para aplicación de Sikagrout. *Aplicación de Sikagrout para anclajes sobre mortero. *Excavación manual para construcción canal para drenajes de las aguas lluvias.
MARTES: - No se realizaron actividades en campo por las fuertes lluvias durante todo el dia.	
MIERCOLES: - Se realizó manejo de aguas lluvias, se inicia con el relleno de material granular para sub-base y compatacion de terreno.	
JUEVES: - No se realizaron actividades en campo por las fuertes lluvias durante todo el dia.	
VIERNES: - Se continúa con el relleno de material granular para sub-base y compatacion de terreno.	
SABADO: - No se realizó actividades.	
DOMINGO: No se realizan actividades en la obra el dia de hoy.	

LOGROS Y/O DIFICULTADES
1. Cronograma:
La obra presenta una ejecución 192 dias con respecto al cronograma programado.
2. Disponibilidad de Recursos:
Se cuenta con la maquinaria y equipos menores necesarios para las actividades preliminares
3. Ejecución Financiera:
Se realiza actividades correspondientes a lo programado, donde se efectua una inversion total de $829,347,509
4. Calidad de los trabajos:
Hasta el momento los trabajos ejecutados son aceptados por la interventoria.
5. Manejo Ambiental:
La obra ya cuenta con los certificados de botadero de residuos y materiales sobrantes.
6. Seguridad Industrial:
los trabajadores cuentan con sus elementos de seguridad industrial, tanto personal de la obra como los profesionales de campo
7. Programa salud ocupacional (si aplica):
Se cuenta con el profesional de seguridad y salud en el trabajo (SISO)
8. Aspectos sociales:

OBSERVACIONES:
* No se presentan observaciones de la obra para el periodo del presente informe.

FIRMA EL CONTRATISTA
NOMBRE: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
CARGO. REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

Aprobado por:
VoBo (FIRMA)
NOMBRE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

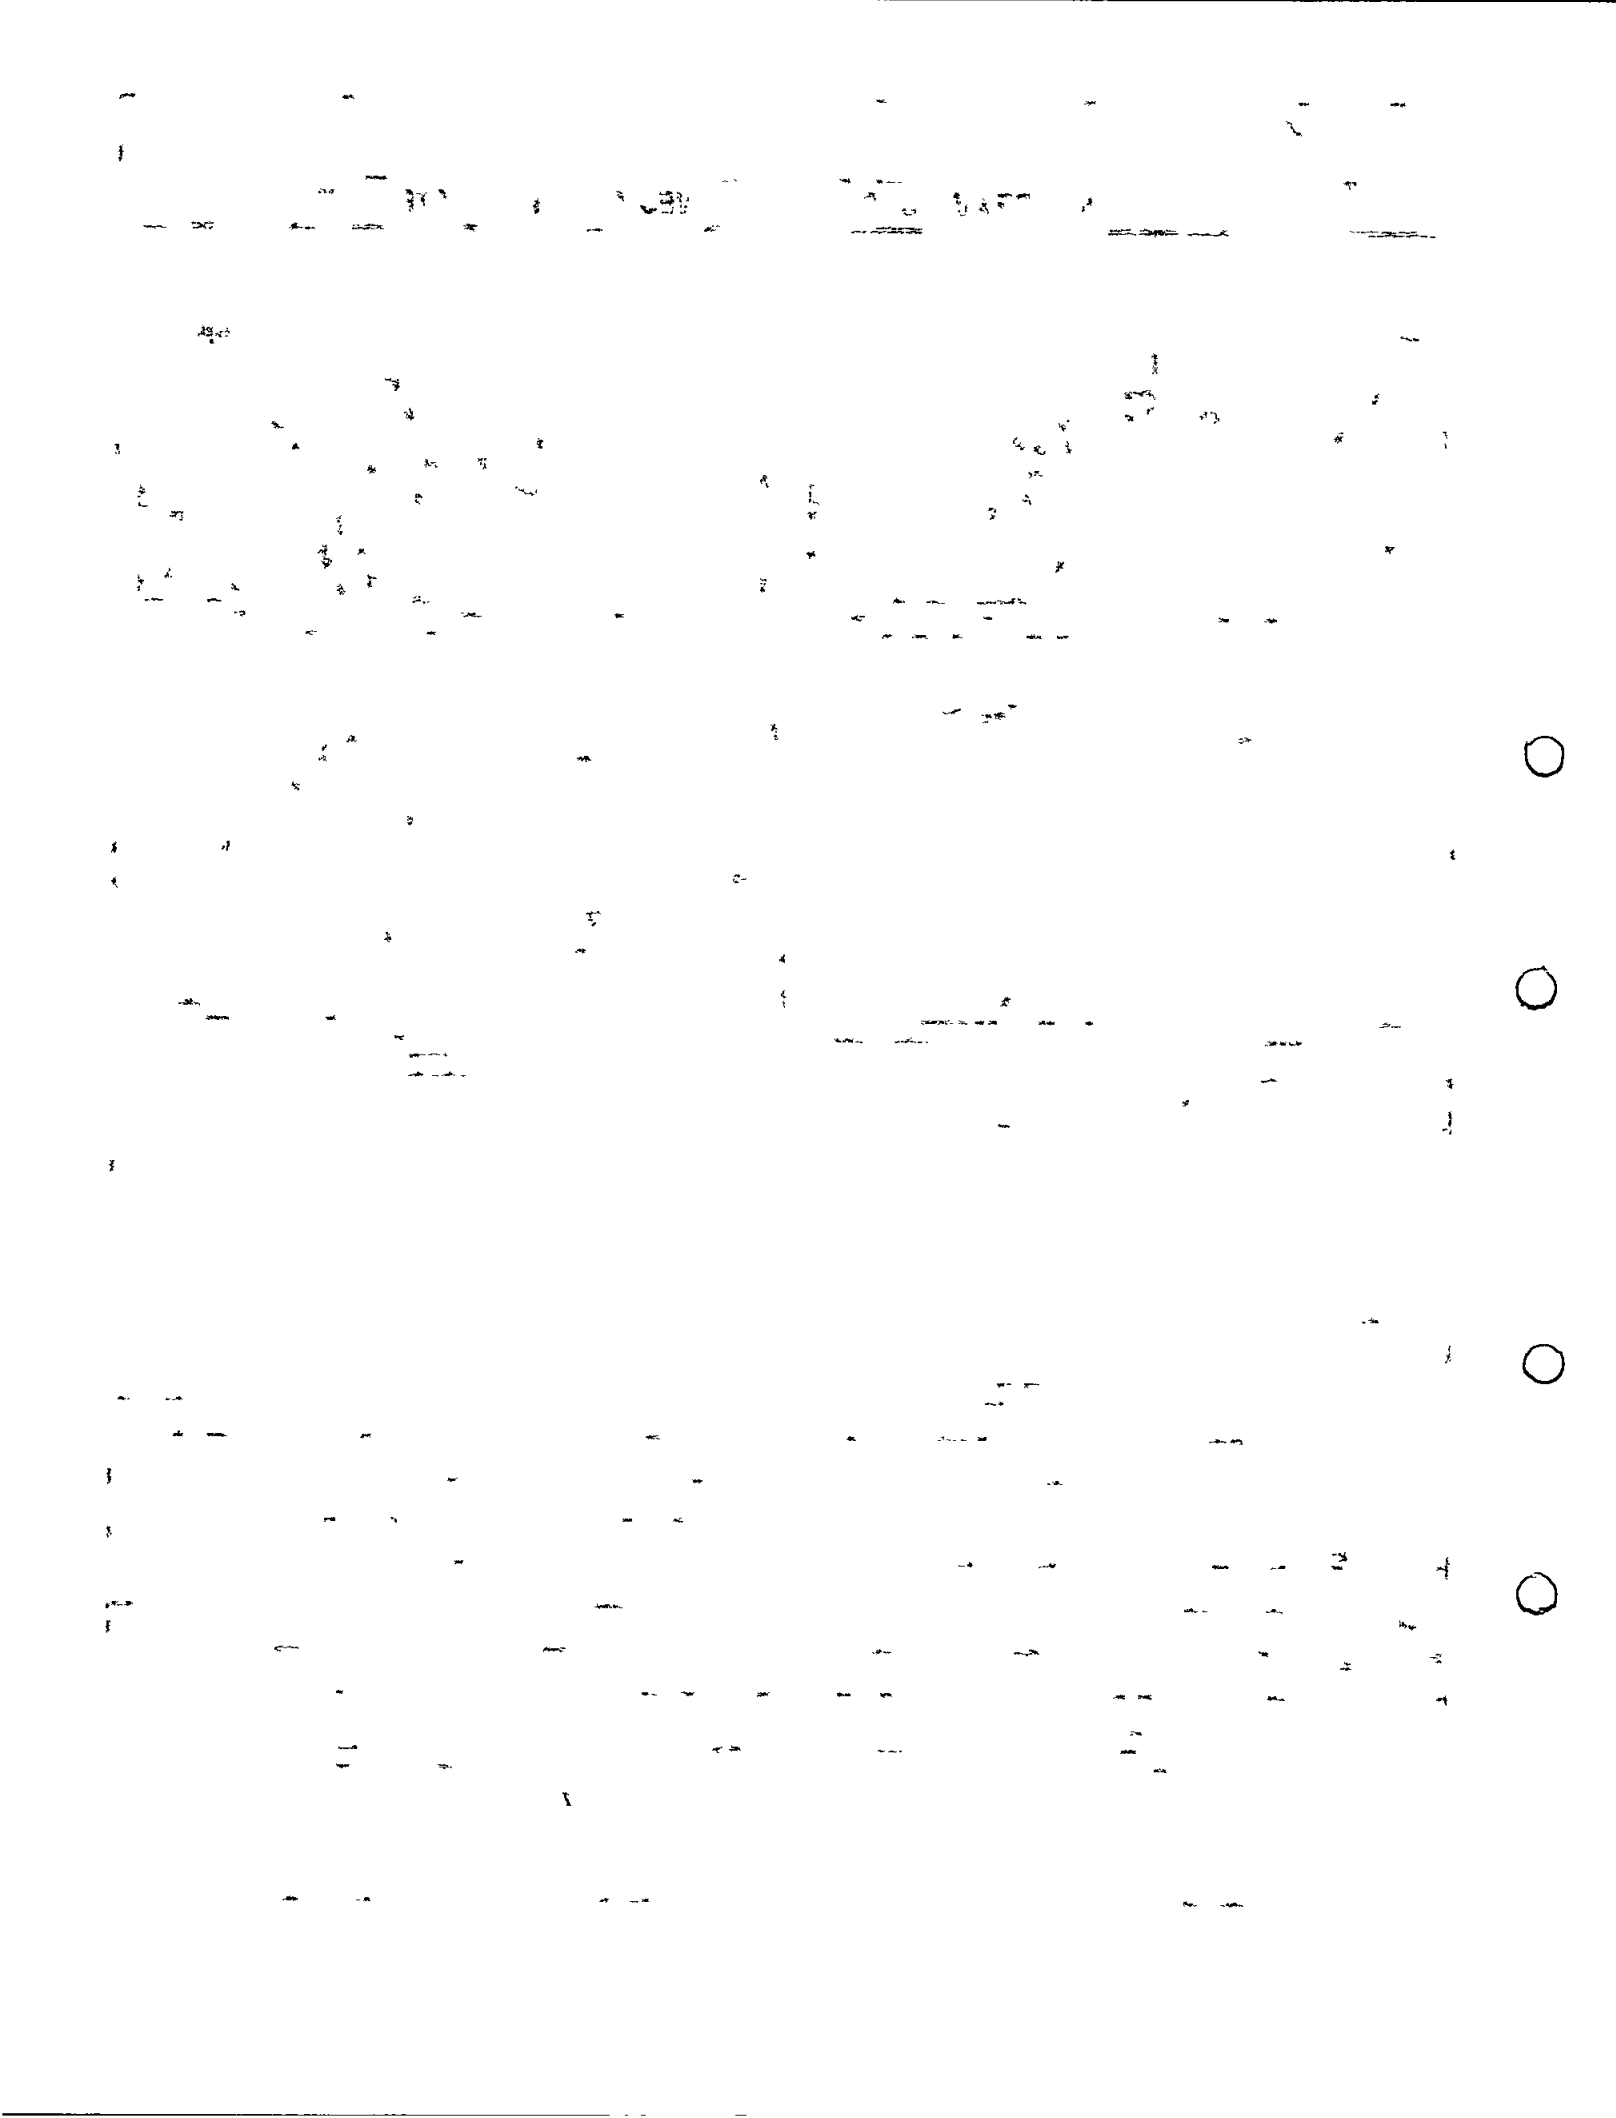

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° IND - 23 - 5027

CONTRATANTE: INDERVALLE NIT. 805.012.896-4 ORDENADOR DEL GASTO: JUAN CARLOS RUEDA ANGEL C.C. 94.501.292

CONTRATISTA CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC NIT. 901.526.894-4
REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO C.C. 1.006.166.501

INTERVENTOR. CONSORCIO GRUPO 3 NIT. 901.769.200-6 REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ. C.C. 16.700.426

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES. GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR TOTAL $	$1,426.801.042 M/CTE – INCLUIDO AIU					
PLAZO	6 MESES	180 DÍAS				
FECHA DE INICIO	28-dic-23					
	4-nov-24	186 DÍAS	HASTA:	9-mayo-25	9/05/2025	186
SUSPENSION 1	DEL:	14 junio 2024	14/06/2024	HASTA:	22-agosto-24	22/08/2024	70
REINICIO N° 1	DEL:	23-agosto-24	23/08/2024	HASTA:	25-agosto-24	25/08/2024	3
SUSPENSION 2	DEL:	26-agosto-24	26/08/2024	HASTA:	14-octubre-24	14/10/2024	50
REINICIO N° 2	DEL:	15-octubre-24	15/10/2024	HASTA:	22-octubre-24	22/10/2024	8
SUSPENSION 3	DEL:	22-octubre-24	22/10/2024	HASTA:	4-noviembre-24	4/11/2024	13
REINICIO N° 3	DEL:	4-nobviembre-24	4/11/2024	HASTA:	9-mayo-25	5/05/2025	182

2. INFORMACION BASICA DEL FRENTE DE OBRA

FRENTE No. 01: CUBIERTA CANCHA MULTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO

VALOR COSTOS TOTALES:	$1.867.899.794				
Informe N°:	31	Fecha de informe	18/11/2024	A	24/11/2024

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA DE OBRA

Valor frente de obra:	$1.426.801.042
Adiciones o mayor valor:	$441.098.752
Valor total:	$1.867.899.794
Fecha de Inicio	28/12/2023
Tiempo de prorrogas	182 días
Tiempo de suspensiones	133 días
Plazo estipulado:	367 días
Fecha de terminacion:	9/05/2025
Tiempo transcurrido contrato:	199 días

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Fecha de Inicio:	28/12/2023
Tiempo de prorrogas:	182 días
Tiempo de suspensiones:	133 días
Plazo actualizado.	367 días
Fecha de terminacion:	9/05/2025
Tiempo transcurrido interventoria:	199 días

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FISICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso
% Programado	46,98%	2,24%	49,22%	
% Ejecutado	44,40%	3,00%	47,40%	
Diferencia	2,58%	0,76%	-1,82%	

AVANCE FINANCIERO

				En %
Programado(%)	$877.539.323	$41.840.958	$919.380.282	49,22%
Ejecutado (%)	$829.347.509	$56.036.993,82	$885.384.502	47,40%
Diferencia	-$48.191.815	$14.196.035	-$33.995.779	-1,82%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	Ingeniero Residente e inspector
Contratista:	Arquitecto Residente de obra y cuatro obreros

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Herramienta menor
Mini cargador (Bobcat)
Cilindro compactador

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	S/N/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	interventor	S
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	interventor	S
Normas ambientales	interventor	S

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1: Comisión topografica para niveles de relleno de sub-base

Foto 2: Comisión topografica para niveles de relleno de sub-base

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Foto 3: Manejo de aguas lluvias

Foto 4: Relleno con material de no seleccionado para sub-base

Foto 5. Compactación y nivelación de terreno. (Sub-base)

Foto 6: Compactación y nivelación de terreno. (Sub-base)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
LUNES: - Se continúa con el relleno de material granular para sub-base y compatacion de terreno.	*Montaje de estructura metálicas para cubierta de la cancha. *Encofrado en madera para aplicación de Sikagrout *Aplicación de Sikagrout para anclajes sobre mortero. *Excavación manual para construcción canal para drenajes de las aguas lluvias.
MARTES: - Se continúa con el relleno de material granular para sub-base y compatacion de terreno.	
MIERCOLES: - Se continúa con el relleno de material granular para sub-base y compatacion de terreno.	
JUEVES: - Se continúa con el relleno de material granular para sub-base y compatacion de terreno.	
VIERNES: - Se continúa con el relleno de material granular para sub-base y compatacion de terreno.	
SABADO: - Se continúa con el relleno de material granular para sub-base y compatacion de terreno.	
DOMINGO: No se realizan actividades en la obra el dia de hoy.	

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:
La obra presenta una ejecución 204 dias con respecto el cronograma programado.

2. Disponibilidad de Recursos:
Se cuenta con la maquinaria y equipos menores necesarios para las actividades preliminares

3. Ejecución Financiera:
Se realiza actividades correspondientes a lo programado, donde se efectua una inversion total de $885.384.502

4. Calidad de los trabajos:
Hasta el momento los trabajos ejecutados son aceptados por la interventoria.

5. Manejo Ambiental:
La obra ya cuenta con los certificados de botadero de residuos y materiales sobrantes.

6. Seguridad Industrial:
los trabajadores cuentan con sus elementos de segundad industrial, tanto personal de la obra como los profesionales de campo

7. Programa salud ocupacional (si aplica):
Se cuenta con el profesional de segundad y salud en el trabajo (SISO)

8. Aspectos sociales:

OBSERVACIONES:

*No se presentan observaciones de la obra para el periodo del presente informe.

FIRMA EL CONTRATISTA
NOMBRE: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
CARGO. REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

Aprobado por:

VoBo (FIRMA)
NOMBRE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° IND - 23 - 5027

CONTRATANTE: INDERVALLE NIT. 805.012.896-4 ORDENADOR DEL GASTO: JUAN CARLOS RUEDA ANGEL C.C. 94.501.292

CONTRATISTA: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC NIT. 901.526.894-4
REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO C.C. 1.006.166.501

INTERVENTOR: CONSORCIO GRUPO 3 NIT. 901.769.200-6 REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ. C.C. 16.700.425

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR TOTAL $	$1,426,801,042 M/CTE – INCLUIDO AIU						
PLAZO	6 MESES	180 DÍAS					
FECHA DE INICIO	28-dic-23						
	4-nov-24	186 DÍAS		HASTA: 9-mayo-25	9/05/2025		186
SUSPENSION 1		DEL: 14 junio 2024		14/06/2024 HASTA: 22-agosto-24	22/08/2024		70
REINICIO N° 1		DEL: 23-agosto-24		23/08/2024 HASTA: 25-agosto-24	25/08/2024		3
SUSPENSION 2		DEL: 26-agosto-24		26/08/2024 HASTA: 14-octubre-24	14/10/2024		50
REINICIO N° 2		DEL: 15-octubre-24		15/10/2024 HASTA: 22-octubre-24	22/10/2024		8
SUSPENSION 3		DEL: 22-octubre-24		22/10/2024 HASTA:4-noviembre-24	4/11/2024		13
REINICIO N° 3		DEL: 4-noviembre-24		4/11/2024 HASTA: 9-mayo-25	5/05/2025		182

2. INFORMACION BASICA DEL FRENTE DE OBRA

FRENTE No. 01: CUBIERTA CANCHA MULTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO

VALOR COSTOS TOTALES: $1.867.899.794

Informe N°: 32 Fecha de informe: 25/11/2024 A 1/12/2024

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA DE OBRA

Valor frente de obra:	$1.426.801.042
Adiciones o mayor valor:	$441.098.752
Valor total:	$1.867.899.794
Fecha de Inicio	28/12/2023
Tiempo de prorrogas	186 días
Tiempo de suspensiones	133 días
Plazo estipulado:	367 días
Fecha de terminacion:	9/05/2025
Tiempo transcurrido contrato:	206 días

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Fecha de Inicio:	28/12/2023
Tiempo de prorrogas:	182 días
Tiempo de suspensiones:	133 días
Plazo actualizado:	367
Fecha de terminacion:	9/05/2025
Tiempo transcurrido interventoria:	206 días

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FISICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso
% Programado	49,22%	2,24%	51,46%	
% Ejecutado	47,40%	4,00%	51,40%	
Diferencia	1,82%	1,76%	-0,06%	

AVANCE FINANCIERO

				En %
Programado(%)	$919.380.279	$41.840.958	$961.221.237	51,46%
Ejecutado (%)	$885.384.502	$74.715.991,76	$960.100.494	51,40%
Diferencia	-$33.995.776	$32.875.033	-$1.120,743	-0,06%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	Ingeniero Residente e inspector
Contratista:	Arquitecto Residente de obra y cuatro obreros

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Herramienta menor
Mini cargador (Bobcat)
Cilindro compactador

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	S/N/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	Interventor	S
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	Interventor	S
Normas ambientales	Interventor	S

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

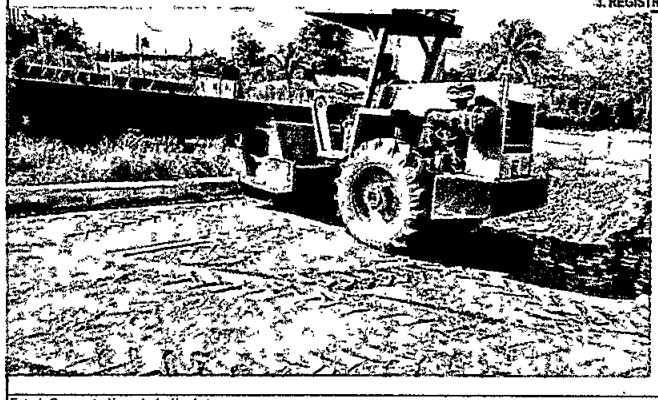

Foto 1: Compactación y nivelación de terreno.

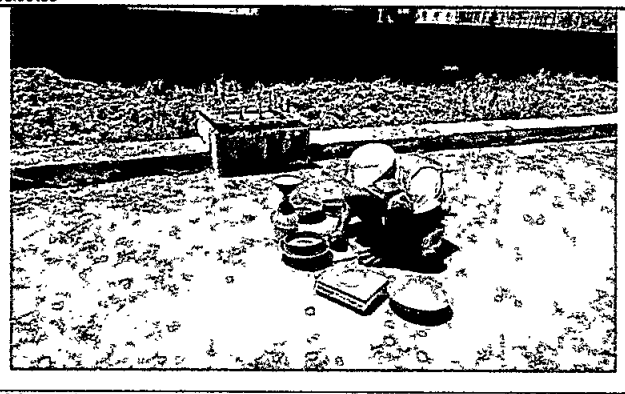

Foto 2: Compactacion

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

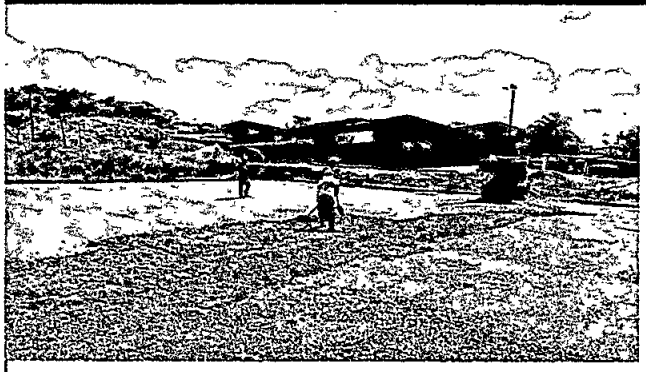

Foto 3: Relleno con material de no seleccionado.

Foto 4: Comisión topografica para niveles de relleno de sub-base

Foto 5. Compactación y nivelación de terreno.

Foto 6: Compactación y nivelación de terreno.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
LUNES: - Se continúa con el relleno de material granular para sub-base y compatacion de terreno.	
MARTES: - Se continúa con la compatacion de terreno.	
MIERCOLES: - Se continúa con la compatacion de terreno.	*Montaje de estructura metálicas para cubierta de la cancha. *Encofrado en madera para aplicación de Sikagrout *Aplicación de Sikagrout para anclajes sobre mortero. *Excavación manual para construcción canal para drenajes de las aguas lluvias.
JUEVES: - Se continúa con la compatacion de terreno.	
VIERNES: - Se continúa con la compatacion de terreno.	
SABADO: - Se continúa con la compatacion de terreno.	
DOMINGO: No se realizan actividades en la obra el dia de hoy.	

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:

La obra presenta una ejecución 211 dias con respecto al cronograma programado.

2. Disponibilidad de Recursos:

Se cuenta con la maquinaria y equipos menores necesarios para las actividades preliminares

3. Ejecución Financiera:

Se realiza actividades correspondientes a lo programado, donde se efectua una inversion total de $960.100.494

4. Calidad de los trabajos:

Hasta el momento los trabajos ejecutados son aceptados por la interventoria.

5. Manejo Ambiental:

La obra ya cuenta con los certificados de botadero de residuos y materiales sobrantes.

6. Seguridad Industrial:

los trabajadores cuentan con sus elementos de seguridad industrial, tanto personal de la obra como los profesionales de campo

7. Programa salud ocupacional (si aplica):

Se cuenta con el profesional de seguridad y salud en el trabajo (SISO)

8. Aspectos sociales:

OBSERVACIONES:

* No se presentan observaciones de la obra para el periodo del presente informe.

	Aprobado por:
FIRMA EL CONTRATISTA	VoBo FIRMA
NOMBRE: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO	NOMBRE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
CARGO. REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA	CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° IND - 23 - 5027

CONTRATANTE: INDERVALLE NIT. 805.012.896-4 ORDENADOR DEL GASTO: JUAN CARLOS RUEDA ANGEL C.C. 94.501.292

CONTRATISTA: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC NIT. 901.526.894-4
REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO C.C. 1.006.166.501

INTERVENTOR: CONSORCIO GRUPO 3 NIT. 901.769.200-8 REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ. C.C. 16.700.426

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR TOTAL $	$1,426,601,042 M/CTE – INCLUIDO AIU					
PLAZO	6 MESES	180 DÍAS				
FECHA DE INICIO	28-dic-23					
	4-nov-24	186 DÍAS		HASTA: 9-mayo-25	9/05/2025	186
SUSPENSION 1		DEL: 14 junio 2024	14/06/2024	HASTA: 22-agosto-24	22/08/2024	70
REINICIO N° 1		DEL: 23-agosto-24	23/08/2024	HASTA: 25-agosto-24	25/08/2024	3
SUSPENSION 2		DEL: 26-agosto-24	26/08/2024	HASTA: 14-octubre-24	14/10/2024	50
REINICIO N° 2		DEL: 15-octubre-24	15/10/2024	HASTA: 22-octubre-24	22/10/2024	8
SUSPENSION 3		DEL: 22-octubre-24	22/10/2024	HASTA:4-noviembre-24	4/11/2024	13
REINICIO N° 3		DEL: 4-noviembre-24	4/11/2024	HASTA: 9-mayo-25	5/05/2025	182

2. INFORMACION BASICA DEL FRENTE DE OBRA

FRENTE No. 01: CUBIERTA CANCHA MULTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO

VALOR COSTOS TOTALES: $1.867.899.794

Informe N°: 33 Fecha de informe. 2/12/2024 A 8/12/2024

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA DE OBRA

Valor frente de obra:	$1.426.601.042
Adiciones o mayor valor:	$441.098.752
Valor total:	$1.867.899.794
Fecha de Inicio	28/12/2023
Tiempo de prorrogas	186 días
Tiempo de suspensiones	133 días
Plazo estipulado:	367 días
Fecha de terminacion:	9/05/2025
Tiempo transcurrido contrato	213 días

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Fecha de Inicio:	28/12/2023
Tiempo de prorrogas:	182 días
Tiempo de suspensiones:	133 días
Plazo actualizado.	367
Fecha de terminacion:	9/05/2025
Tiempo transcurrido Interventoria:	213

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FISICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso
% Programado	51,46%	2,24%	53,70%	
% Ejecutado	51,40%	4,00%	55,40%	
Diferencia	0,06%	1,76%	1,70%	

AVANCE FINANCIERO

				En %.
Programado(%)	$961.221.234	$41.840.958	$1.003.062.192	53,70%
Ejecutado (%)	$960.100.494	$74.715.991,76	$1.034.816.486	55,40%
Diferencia	-$1.120.740	$32.875.033	$31.754.293	1,70%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	Ingeniero Residente e inspector
Contratista:	Arquitecto Residente de obra y cuatro obreros

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

- Herramienta menor
- Mini cargador (Bobcat)
- Cilindro compactador

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	S/N/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	interventor	S
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	interventor	S
Normas ambientales	interventor	S

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1: Compactación y nivelación de terreno.

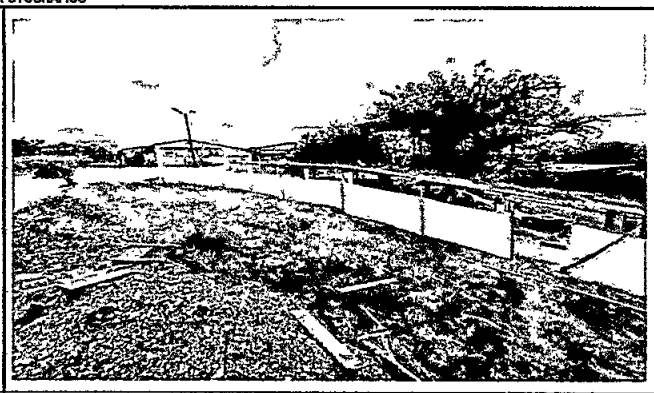

Foto 2: Icerramiento

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Foto 3. Construccion de gavion

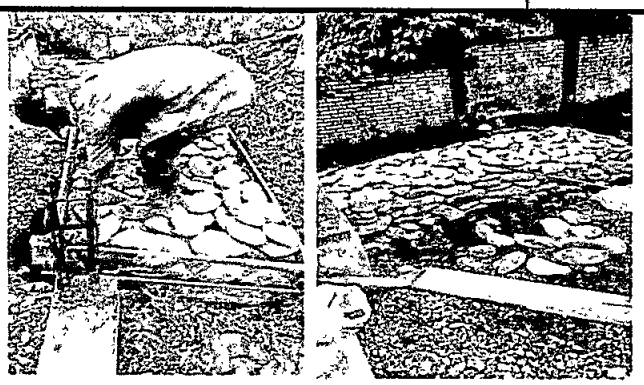

Foto 4: Comisión topografica para niveles de relleno de sub-base

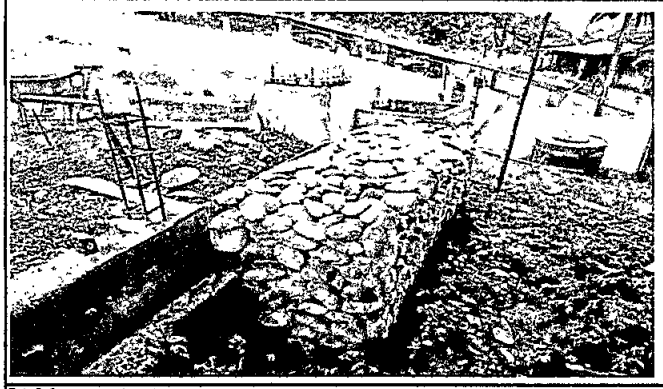

Foto 5: Construccion de gavion.

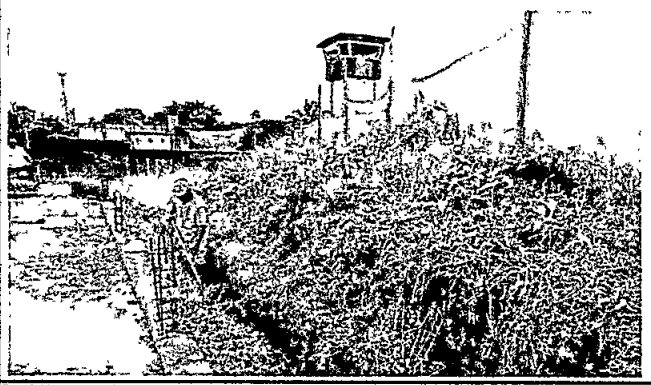

Foto 6: Limpieza y retiro de las aguas lluvias.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
LUNES: - Descapote de terreno (maleza), Excavacion manual para realizacion de muro de gavion.	
MARTES: - Reparacion de cerramiento provicional, construccion de muro de gavion.	
MIERCOLES: - Se continua con la construccion de muro de gavion	*Montaje de estructura metálicas para cubierta de la cancha. *Encofrado en madera para aplicación de Sikagrout. *Aplicación de Sikagrout para anclajes sobre mortero. *Excavación manual para construcción canal para drenajes de las aguas lluvias.
JUEVES: - Relleno con material de rio sobre muro de gavion.	
VIERNES: - Nivelacion del terreno donde se instalaron los gaviones con material del rio.	
SABADO: -Funcion de la restante de la demolicion de la caja de inspeccion y la limpieza del drenaja	
DOMINGO: No se realizan actividades en la obra el dia de hoy.	

LOGROS Y/O DIFICULTADES
1. Cronograma:
La obra presenta una ejecución 213 dias con respecto al cronograma programado.
2. Disponibilidad de Recursos:
Se cuenta con la maquinaria y equipos menores necesarios para las actividades preliminares
3. Ejecución Financiera:
Se realiza actividades correspondientes a lo programado, donde se efectua una inversion total de $1.034.816.486
4. Calidad de los trabajos:
Hasta el momento los trabajos ejecutados son aceptados por la interventoria.
5. Manejo Ambiental:
La obra ya cuenta con los certificados de botadero de residuos y materiales sobrantes.
6. Seguridad Industrial:
los trabajadores cuentan con sus elementos de seguridad industrial, tanto personal de la obra como los profesionales de campo
7. Programa salud ocupacional (si aplica):
Se cuenta con el profesional de seguridad y salud en el trabajo (SISO)
8. Aspectos sociales:

OBSERVACIONES:
* No se presentan observaciones de la obra para el periodo del presente informe.

Aprobado por:

FIRMA EL CONTRATISTA
NOMBRE: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
CARGO. REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

VoBo (FIRMA)
NOMBRE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

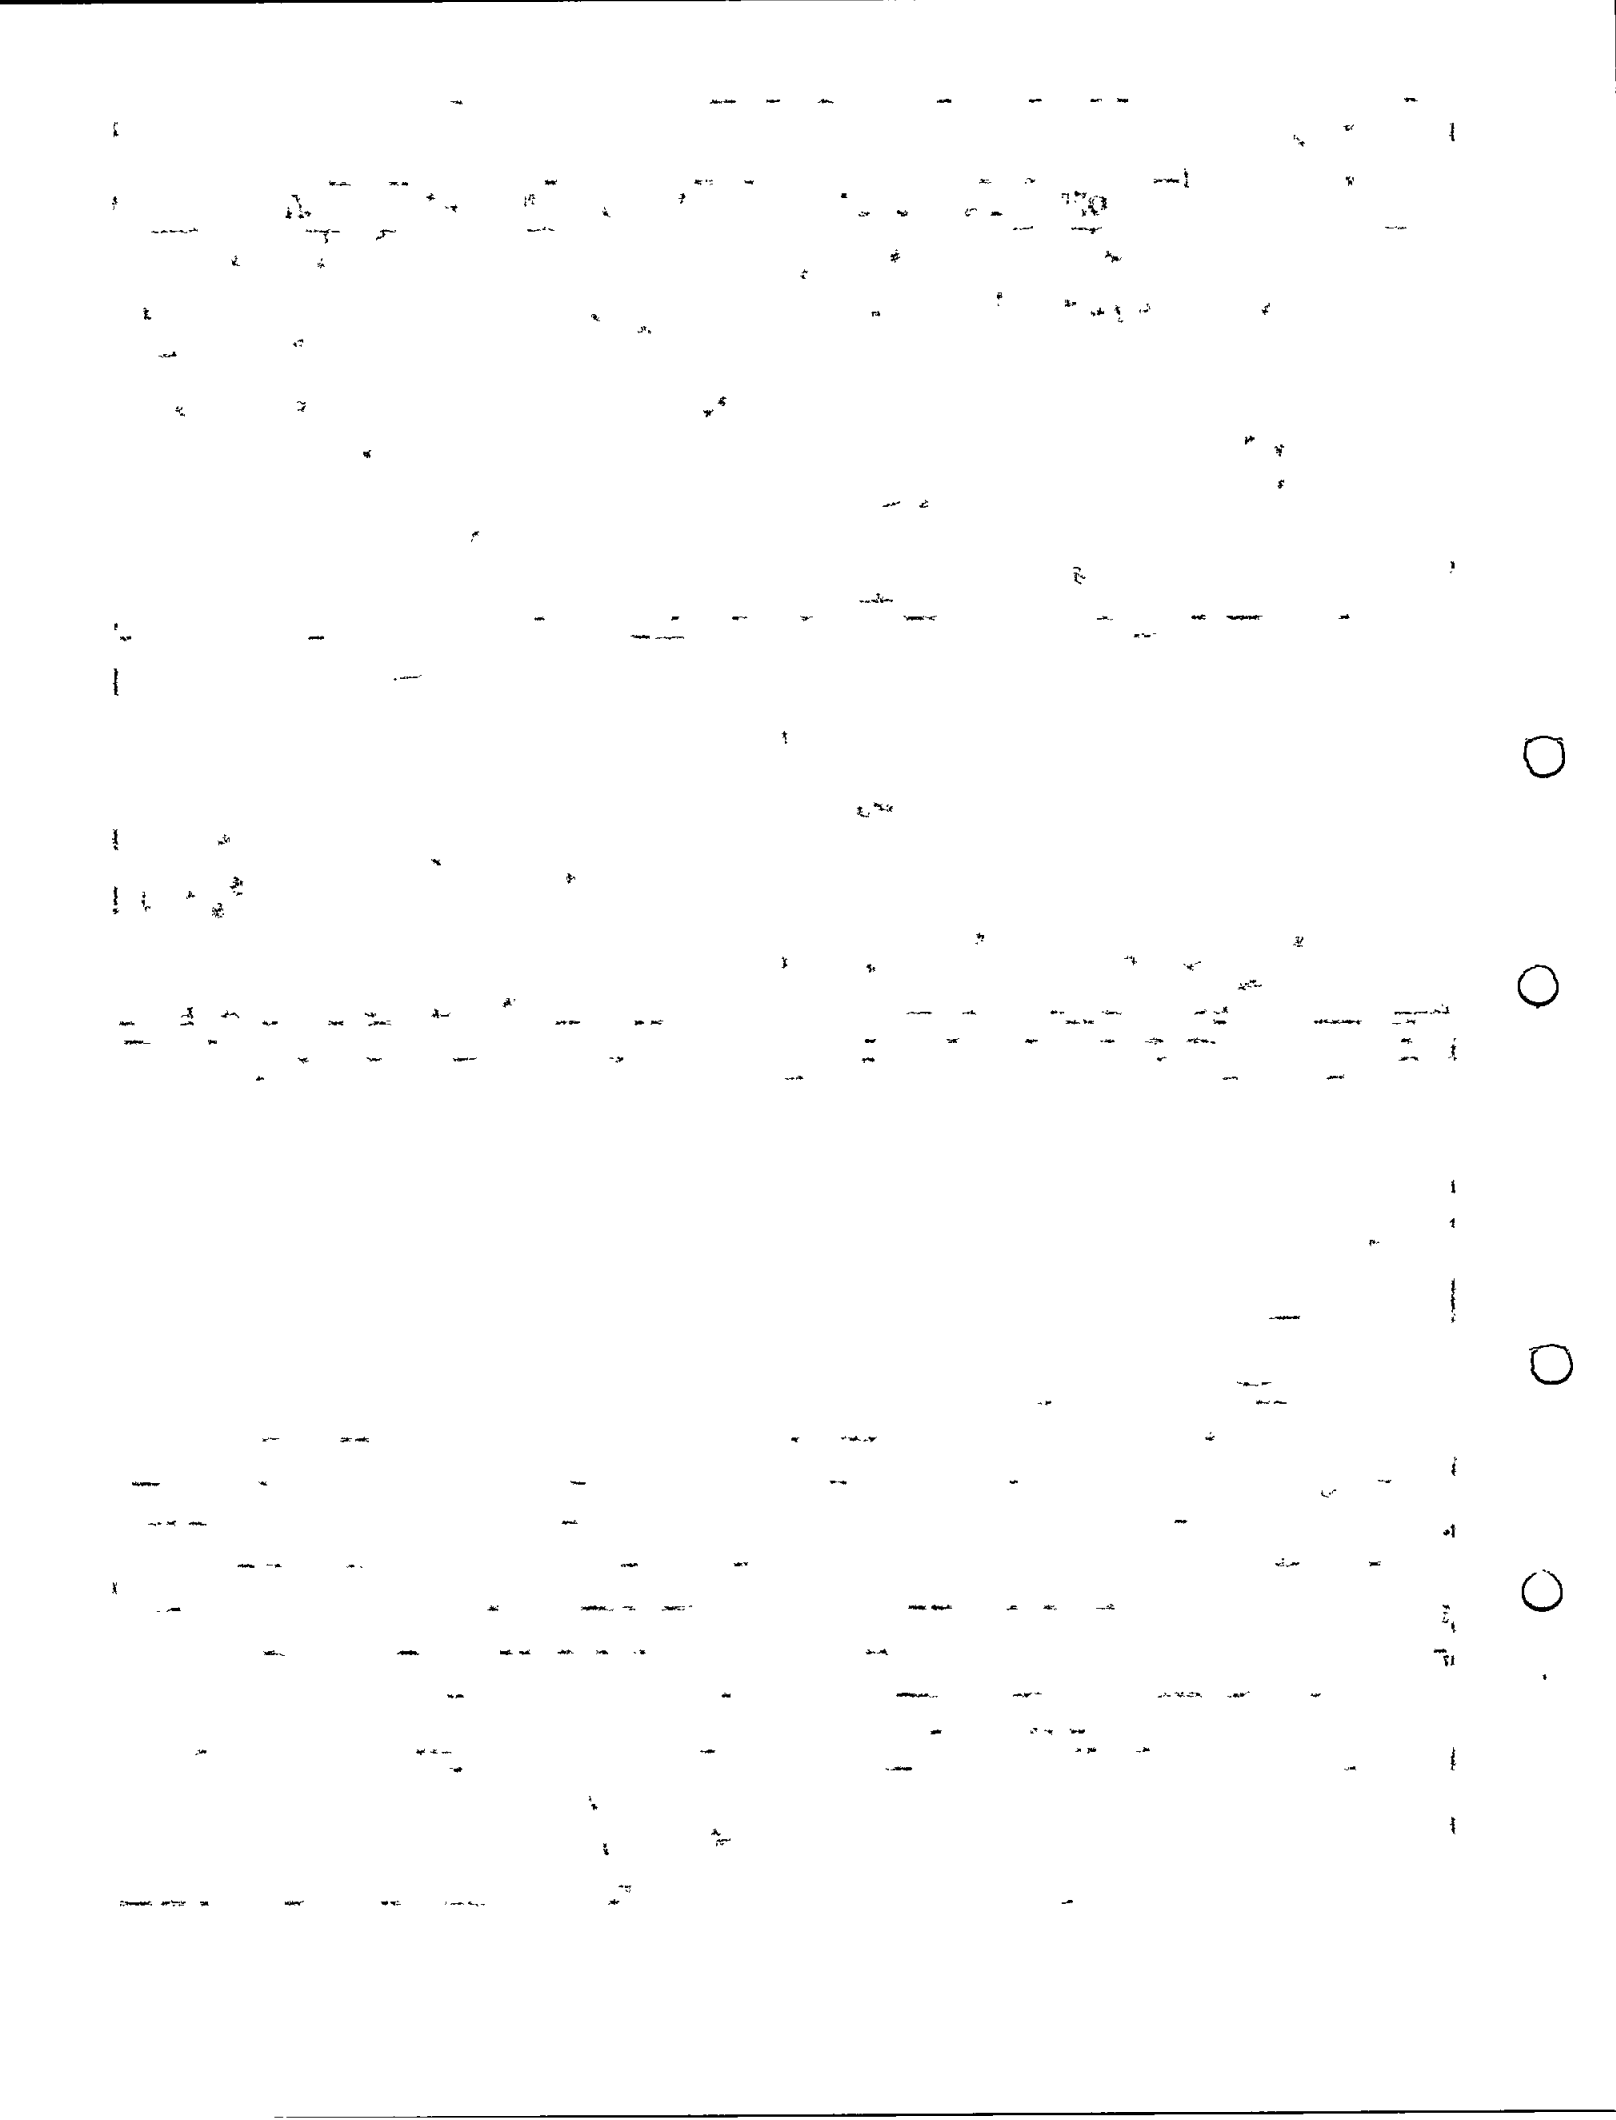

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° IND - 23 - 5027

CONTRATANTE: INDERVALLE NIT. 805.012.898-4 ORDENADOR DEL GASTO: JUAN CARLOS RUEDA ANGEL C.C. 94.501.292

CONTRATISTA CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC NIT. 901.526.694-4
REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO C.C. 1.006.166.501

INTERVENTOR: CONSORCIO GRUPO 3 NIT. 901.769.200-6 REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ. C.C. 16.700.426

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR TOTAL $	$1.426.801.042 M/CTE – INCLUIDO AIU					
PLAZO	6 MESES	180 DÍAS				
FECHA DE INICIO	28-dic-23					
	4-nov-24	186 DÍAS		HASTA: 9-mayo-25	9/05/2025	186
SUSPENSION 1		DEL: 14 junio 2024	14/06/2024	HASTA: 22-agosto-24	22/08/2024	70
REINICIO N° 1		DEL: 23-agosto-24	23/08/2024	HASTA: 25-agosto-24	25/08/2024	3
SUSPENSION 2		DEL: 26-agosto-24	26/08/2024	HASTA: 14-octubre-24	14/10/2024	50
REINICIO N° 2		DEL: 15-octubre-24	15/10/2024	HASTA: 22-octubre-24	22/10/2024	8
SUSPENSION 3		DEL: 22-octubre-24	22/10/2024	HASTA:4-noviembre-24	4/11/2024	13
REINICIO N° 3		DEL: 4-noviembre-24	4/11/2024	HASTA: 9-mayo-25	5/05/2025	182

2. INFORMACION BASICA DEL FRENTE DE OBRA

FRENTE No. 01: CUBIERTA CANCHA MULTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO

VALOR COSTOS TOTALES: $1.867.899.794

Informe N°: 34 Fecha de informe 9/12/2024 A 15/12/2024

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA DE OBRA

Valor frente de obra:	$1.426.801.042
Adiciones o mayor valor	$441.098.752
Valor total:	$1.867.899.794
Fecha de inicio	28/12/2023
Tiempo de prorrogas	186 días
Tiempo de suspensiones	133 días
Plazo estipulado:	367 días
Fecha de terminacion:	9/05/2025
Tiempo transcurrido contrato.	220 días

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Fecha de Inicio:	28/12/2023
Tiempo de prorrogas:	182 días
Tiempo de suspensiones:	133 días
Plazo actualizado	367 días
Fecha de terminacion:	9/05/2025
Tiempo transcurrido interventoría:	220 días

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FISICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso
% Programado	53,70%	2,24%	55,94%	
% Ejecutado	55,40%	4,00%	59,40%	
Diferencia	-1,70%	1,76%	3,46%	

AVANCE FINANCIERO

				En %
Programado(%)	$1.003.062.189	$41.840.958	$1.044.903.148	55,94%
Ejecutado (%)	$1.034.816.486	$74.715.992	$1.109.532.478	59,40%
Diferencia	$31.754.296	$32.875.033	$64.629.330	3,46%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	Ingeniero Residente e inspector
Contratista:	Arquitecto Residente de obra y cuatro obreros

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Herramienta menor
Mini cargador (Bobcat)
Cilindro compactador

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	S/N/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	interventor	S
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	interventor	S
Normas ambientales	interventor	S

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1: Excavacion a mano y nivelación de terreno.

Foto 2: Conformacion de formaletas para construccion de gaviones.

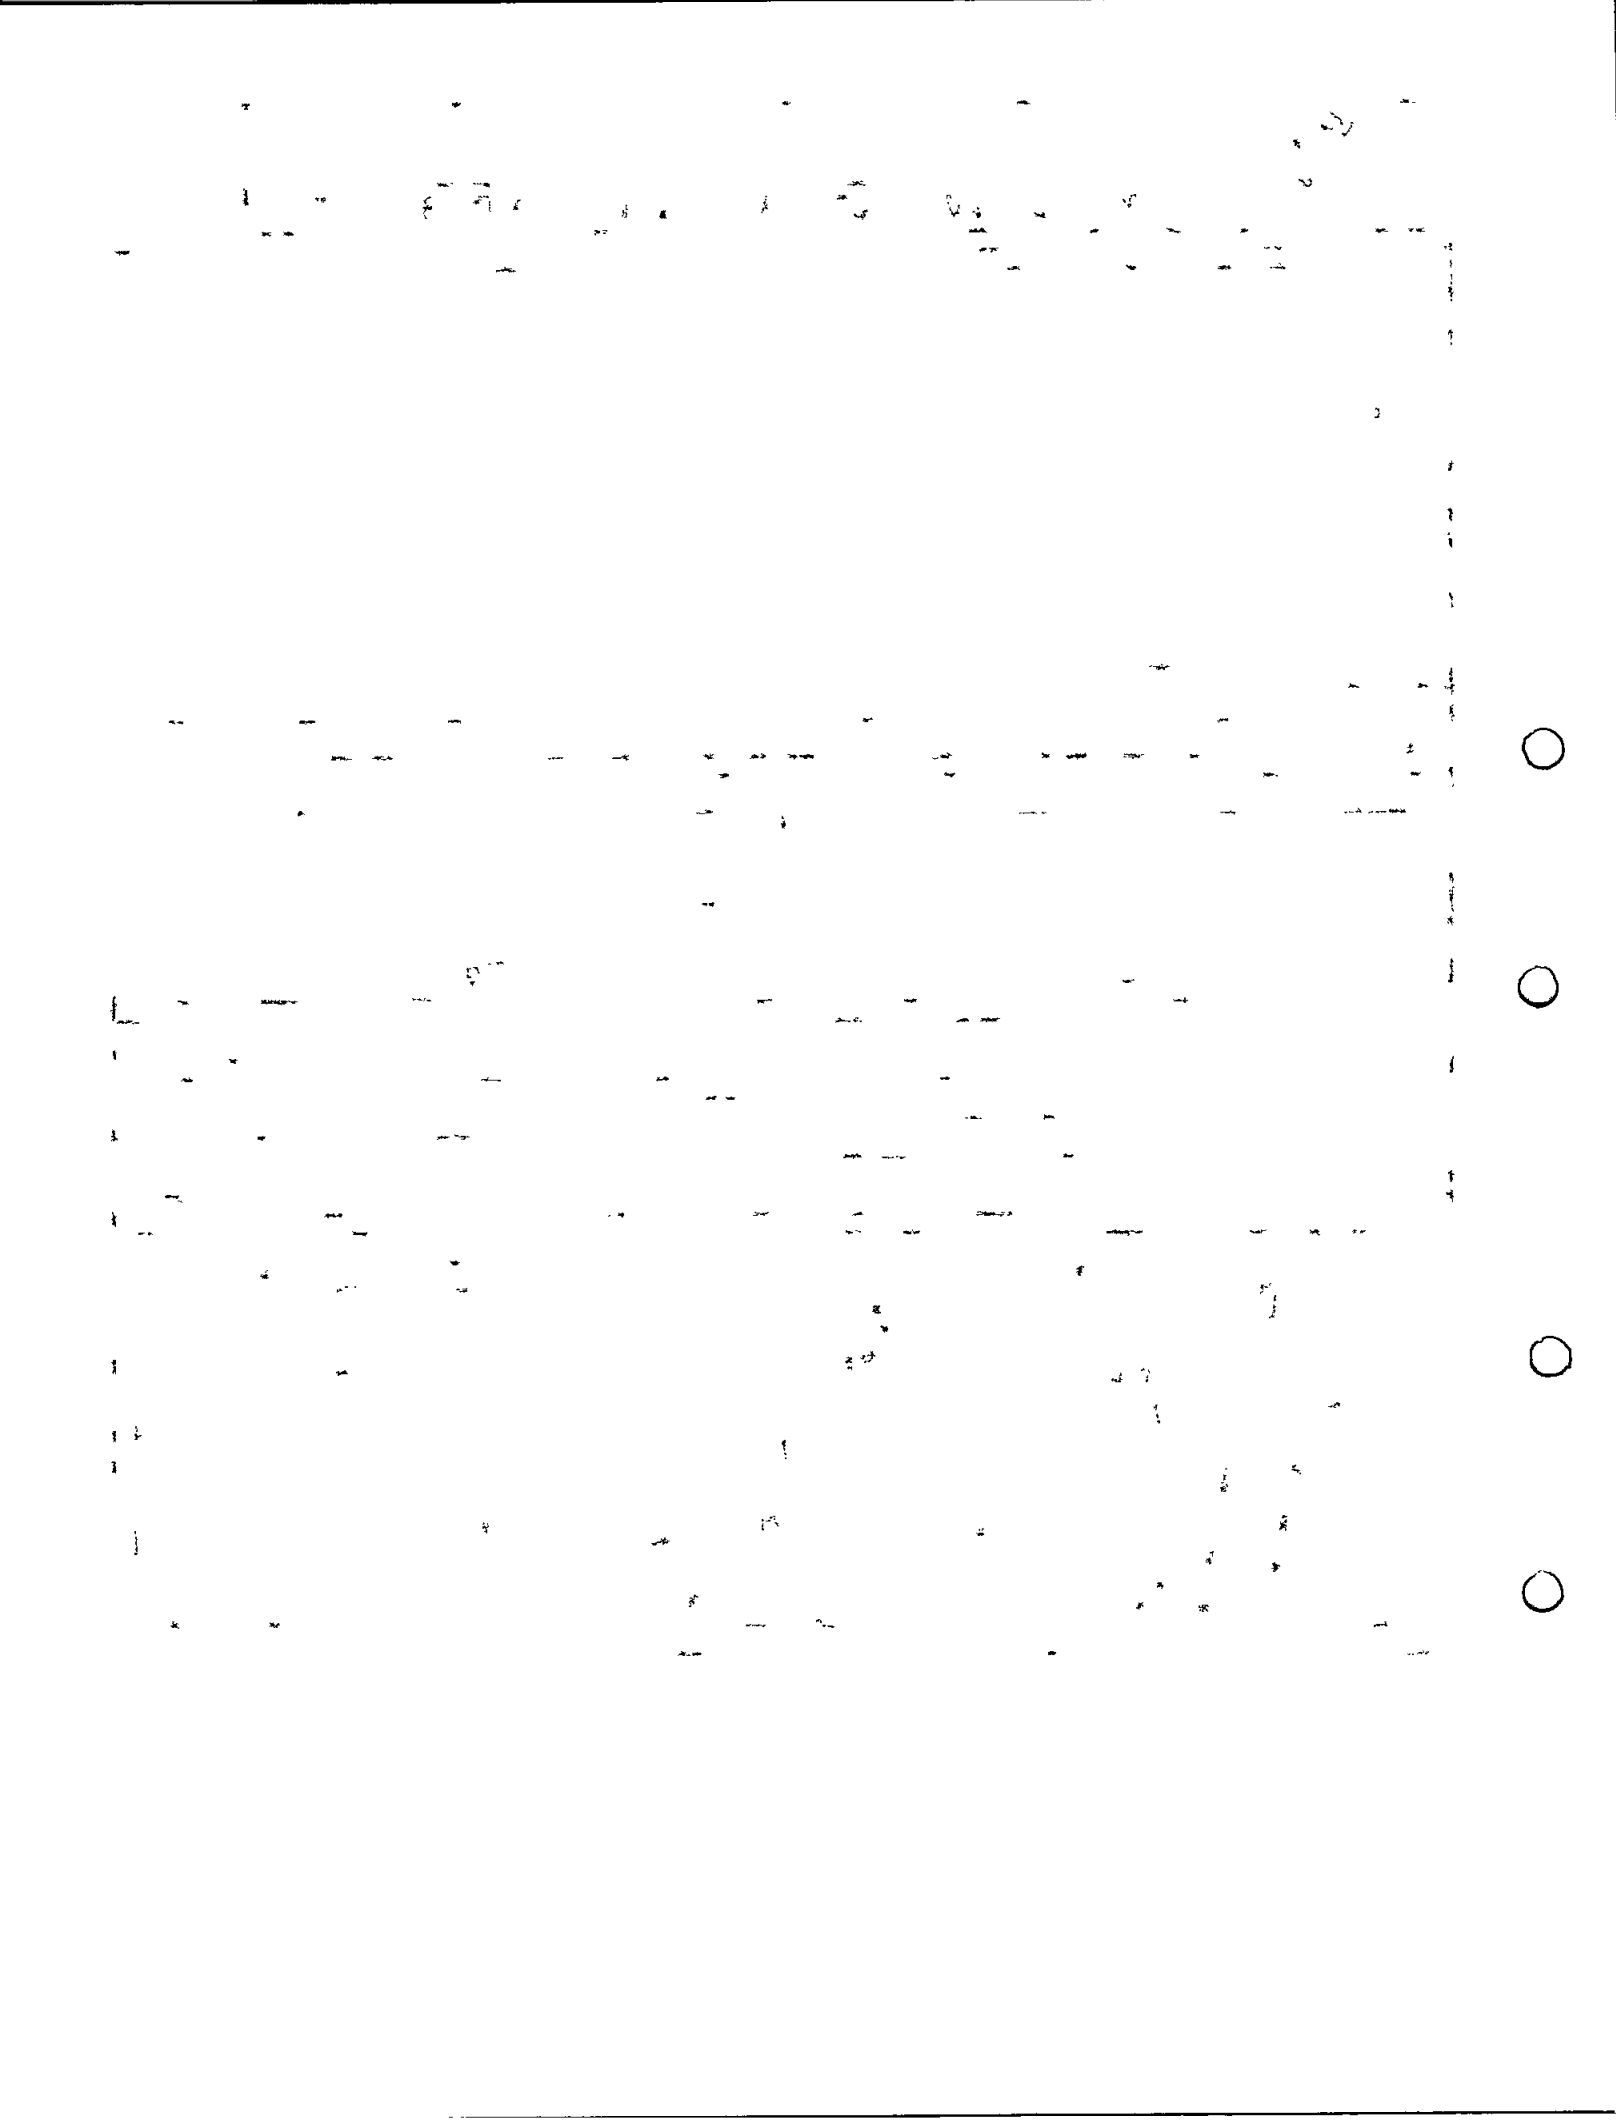

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

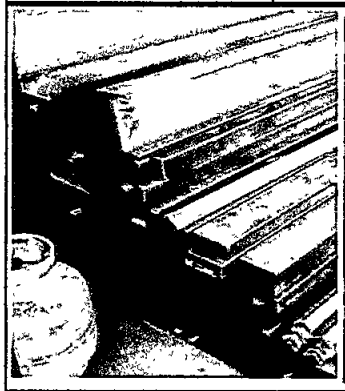

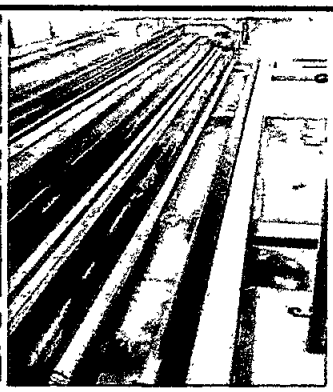

Foto 3: Material en acero para la construccion de la estructura, columnas, cerchas, vigas y correas.

Foto 4: Cerramiento de toda la construccion.

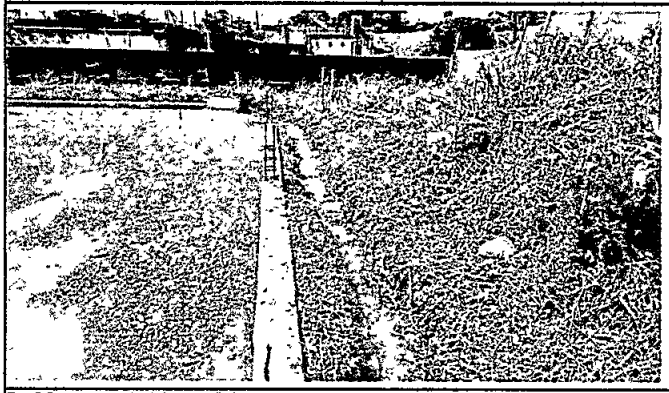

Foto 5: Descapote, y retiro de las aguas lluvias.

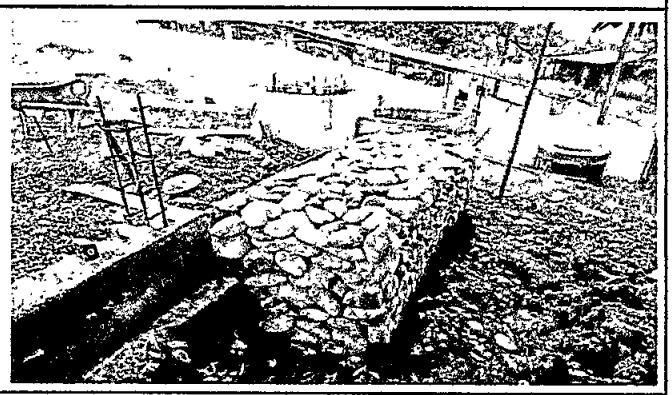

oto 6: Construccion de gaviones.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
LUNES: - Descapote de terreno (maleza), Excavacion manual para realizacion de muro de gavion.	
MARTES: - Reparacion de cerramiento provicional, construccion de muro de gavion.	

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

MIERCOLES: - Se continua con la construccion de muro de gavion	*Montaje de estructura metálicas para cubierta de la cancha. *Encofrado en madera para aplicación de Sikagrout. *Aplicación de Sikagrout para anclajes sobre mortero. *Excavación manual para construcción canal para drenajes de las aguas lluvias.
JUEVES: - Relleno con material de rio sobre muro de gavion.	
VIERNES: - Nivelacion del terreno donde se instalaron los gaviones con material del rio.	
SABADO: -Funcion de la restante de la demolicion de la caja de inspeccion y la limpieza del drenaja	
DOMINGO: No se realizan actividades en la obra el dia de hoy.	

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:

La obra presenta una ejecución 220 dias con respecto al cronograma programado.

2. Disponibilidad de Recursos:

Se cuenta con la maquinaria y equipos menores necesarios para las actividades preliminares

3. Ejecución Financiera:

Se realiza actividades correspondientes a lo programado, donde se efectua una inversion total de $1.109.532.478

4. Calidad de los trabajos:

Hasta el momento los trabajos ejecutados son aceptados por la Interventoria.

5. Manejo Ambiental:

La obra ya cuenta con los certificados de botadero de residuos y materiales sobrantes.

6. Seguridad Industrial:

los trabajadores cuentan con sus elementos de seguridad industrial, tanto personal de la obra como los profesionales de campo

7. Programa salud ocupacional (si aplica):

Se cuenta con el profesional de seguridad y salud en el trabajo (SISO)

8. Aspectos sociales:

OBSERVACIONES:

*No se presentan observaciones de la obra para el periodo del presente informe.

FIRMA EL CONTRATISTA	Aprobado por: VoBo (FIRMA)
NOMBRE: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO	NOMBRE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
CARGO: REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA	CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC
NIT 901526894-4

INFORME MENSUAL No. 06

CONTRATO DE OBRA No. IND - 23 - 5027

01 AL 30 JUNIO DEL 2024

GENERALIDADES

INTRODUCCION

El presente documento es elaborado por el contratista, CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC NIT. 901.526.894-4 mediante el contrato de obra No. IND – 23 – 5027, cuyo objeto es: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

En este informe mensual se resume el seguimiento técnico, administrativo, ambiental, financiero, jurídica de los aspectos más relevantes ocurridos durante la ejecución de la obra en el periodo comprendido entre el 01 de febrero al 30 de junio del 2024.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

DATOS BASICOS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CODIGO BPIN: 2022003760006

La Gobernación del Valle del Cauca realizó procesos de concertación y socialización del Plan Departamental de Desarrollo Departamental denominado: **VALLE INVENCIBLE 2020 – 2023,** dentro del cual se encuentra incluido el proyecto en asunto, con las poblaciones de los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el Departamento del Valle del Cauca.
Así mismo se realizaron mesas de trabajo con la comunidad beneficiaria del proyecto en relación con su alcance.

El proyecto general de: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES GRUPO 1 FRENTE 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES URBANIZACION LA CABAÑA MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1: FRENTE 2: ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1 : FRENTE 3 : ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, la Gobernación del Valle del Cauca y la Entidad promotora del Deporte, Educación Física y la Recreación - Indervalle, se ha basado en estudios donde se comprueba que la recreación, el deporte y la actividad física es un medio transversal que potencializa la calidad de vida de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores, convirtiéndose así en una ruta de primer nivel para la ocupación del tiempo libre, fomento de hábitos saludables y resolución de conflictos. En consecuencia, se quiere lograr que dentro de las políticas públicas locales y territoriales deportivas exista el compromiso de apoyar activamente estas iniciativas y generar espacios de encuentros diferentes que permitan explorar nuevas capacidades, transformar imaginarios, hacer uso adecuado del tiempo libre y fortalecer redes de apoyo.

Con la ejecución del proyecto, se propone articular la experiencia profesional con los conocimientos técnicos y profesionales que INDERVALLE ofrece, los cuales contribuyen al beneficio de la Comunidad y la recreación en los Distritos de: Cali y Buenaventura y Municipio de Cartago, Departamento del Valle del Cauca, a través de adecuación, construcción o dotación, e igualmente se canalizan las habilidades aprendidas en intervenciones anteriores.

Es importante resaltar que el proyecto consolida los procesos deportivos, recreativos y culturales en el Departamento del Valle del Cauca, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y construcción de tejido social en los sitios donde se desarrollan.

En resumen, tenemos:

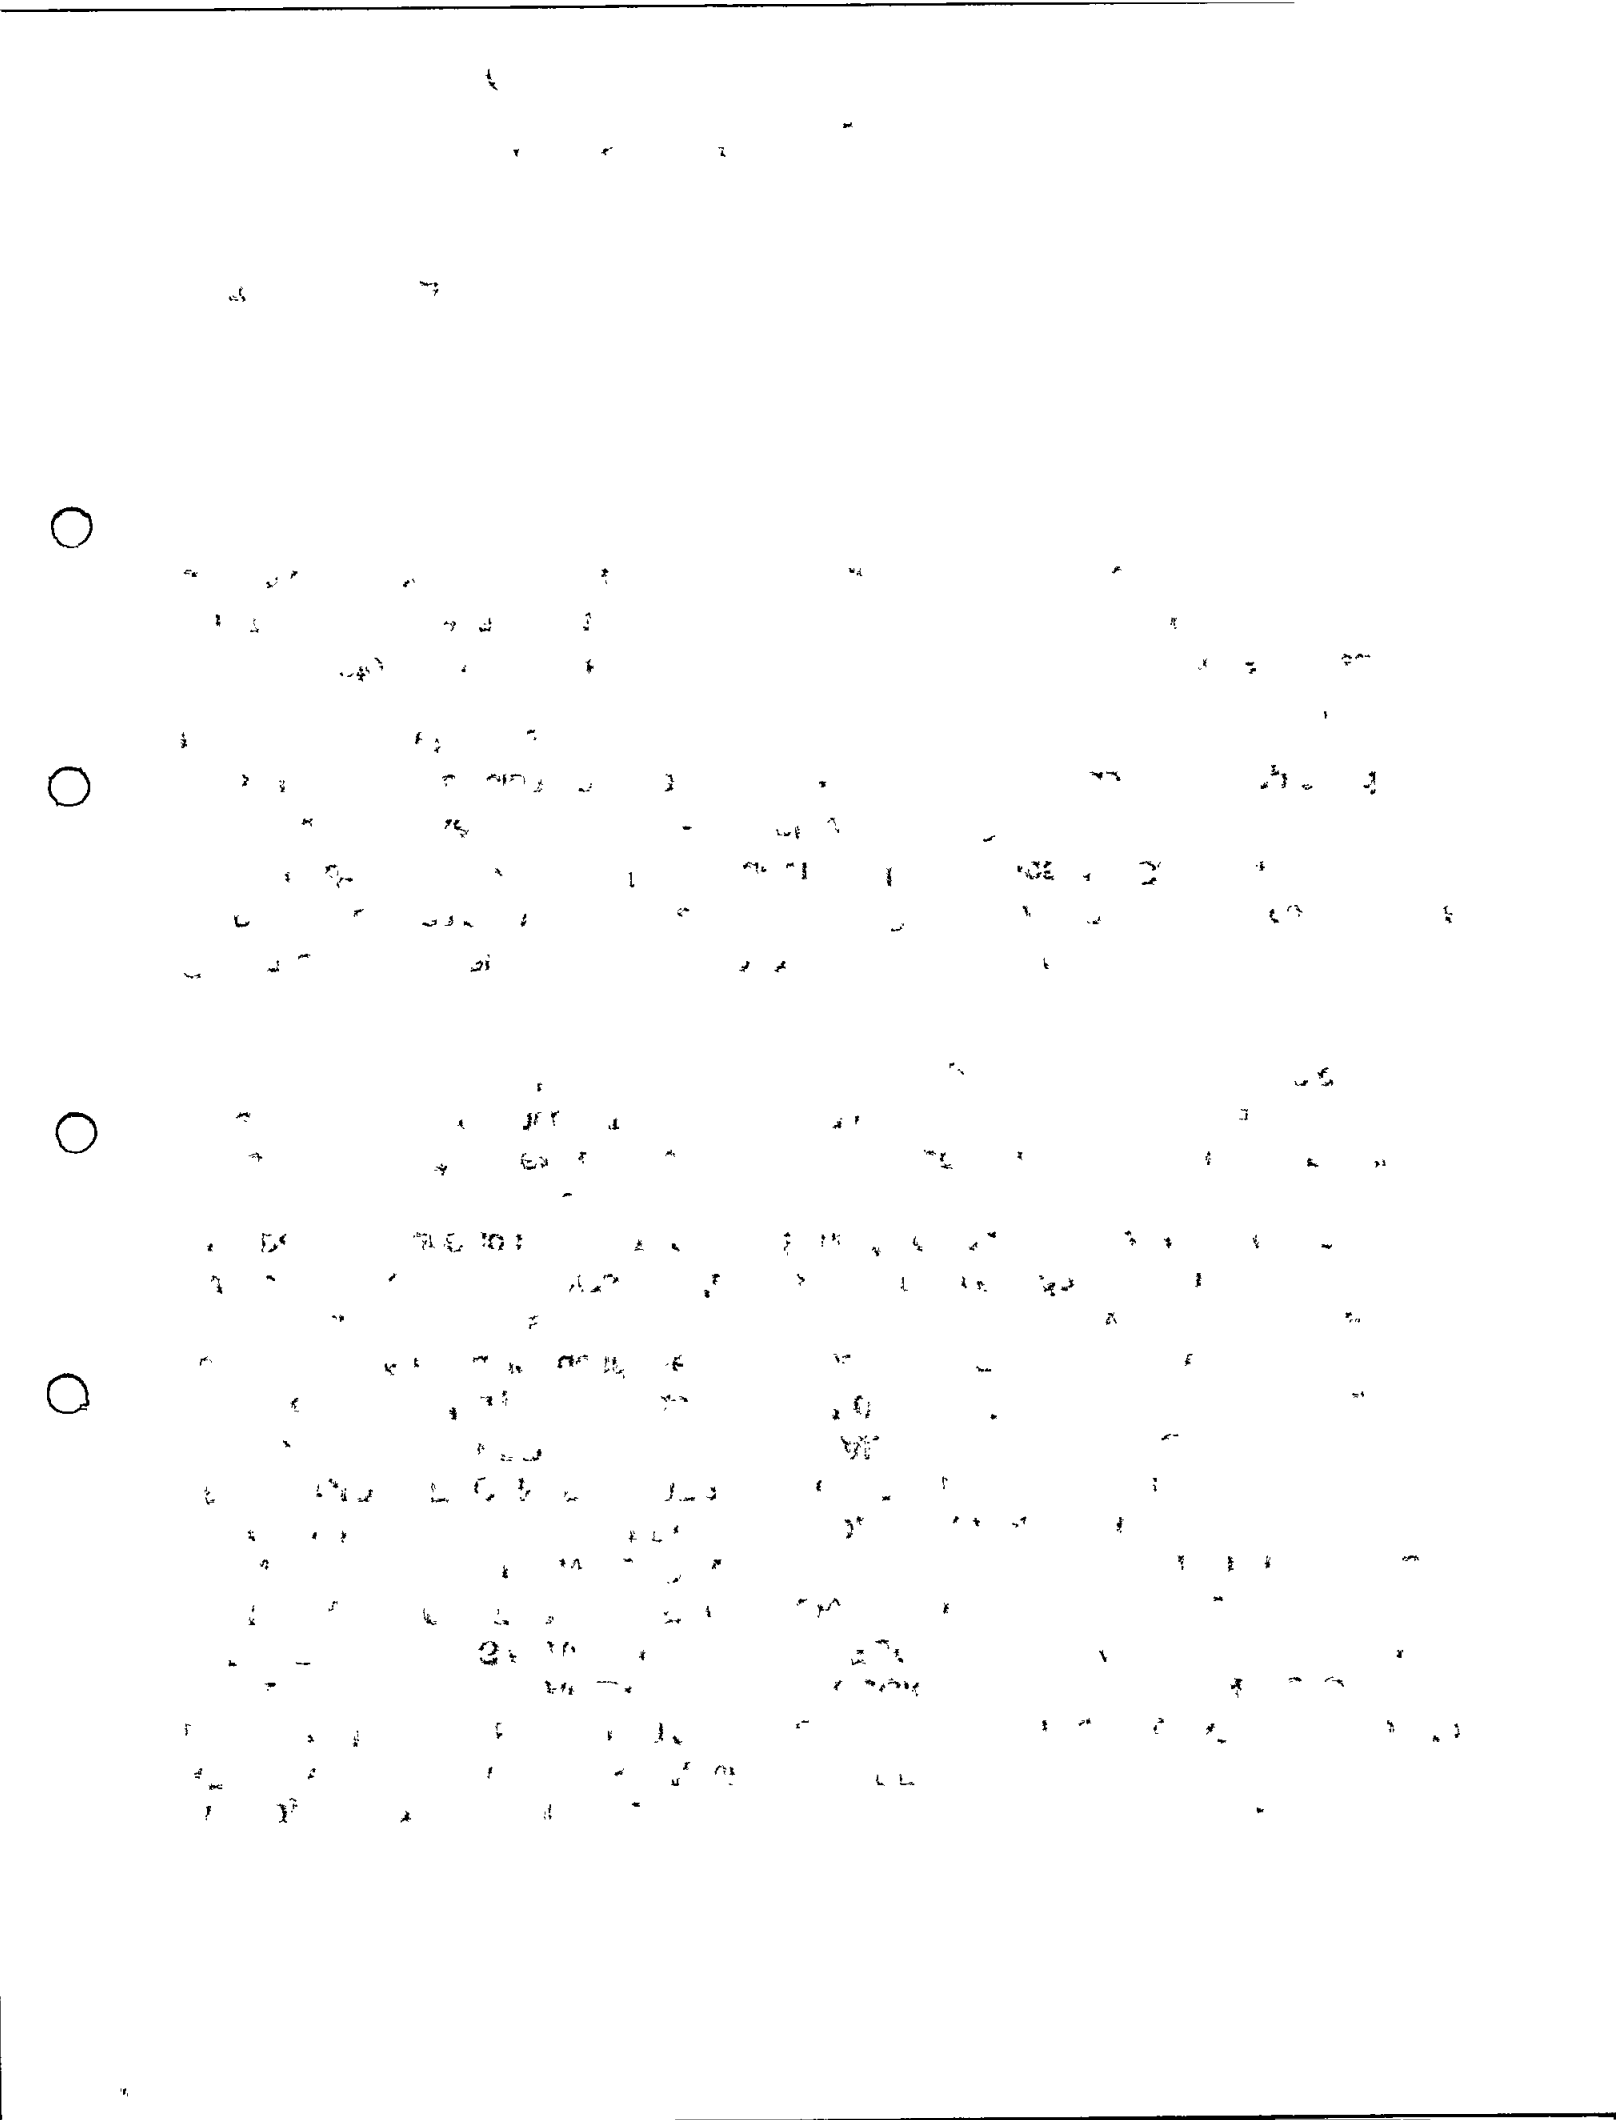

CONTRATO DE OBRA No. IND - 23 – 5027 GRUPO 2

INFORMACION DEL CONTRATO

1. TIPO DE CONTRATO	
OBRA [X]	INTERVENTORIA [ ]
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Informe Número: 6	Periodo desde el (01/06/2024) hasta el (30/06/2024)
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato / Aceptación de Oferta No. IND – 23 – 5027 GRUPO 2	
Nombre Completo del Contratista: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	
Cédula y/o Nit: 901.526.894-4	Correo Electrónico: construpacicolsaszomac.info@gmail.com
Dirección: manzana H 14ABarrio Huasipanga Mocoa - Putumayo	Teléfonos: 320 473 66 72
Nombre de interventoría: CONSORCIO GRUPO 3	
Dependencia: Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca - INDERVALLE	No. Teléfono y Extensión: (602) 25569242
Obra Física Ejecutada del Periodo: 4,00%	Obra Física Ejecutada Acumulada: **53.00%**
Objeto Contrato Obra: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	
3. INFORME JURÍDICO	

Fecha de Inicio	Plazo de Ejecución	Fecha terminación
28 DE DICIEMBRE DE 2023	185 DIAS	30 DE JUNIO DE 2024

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

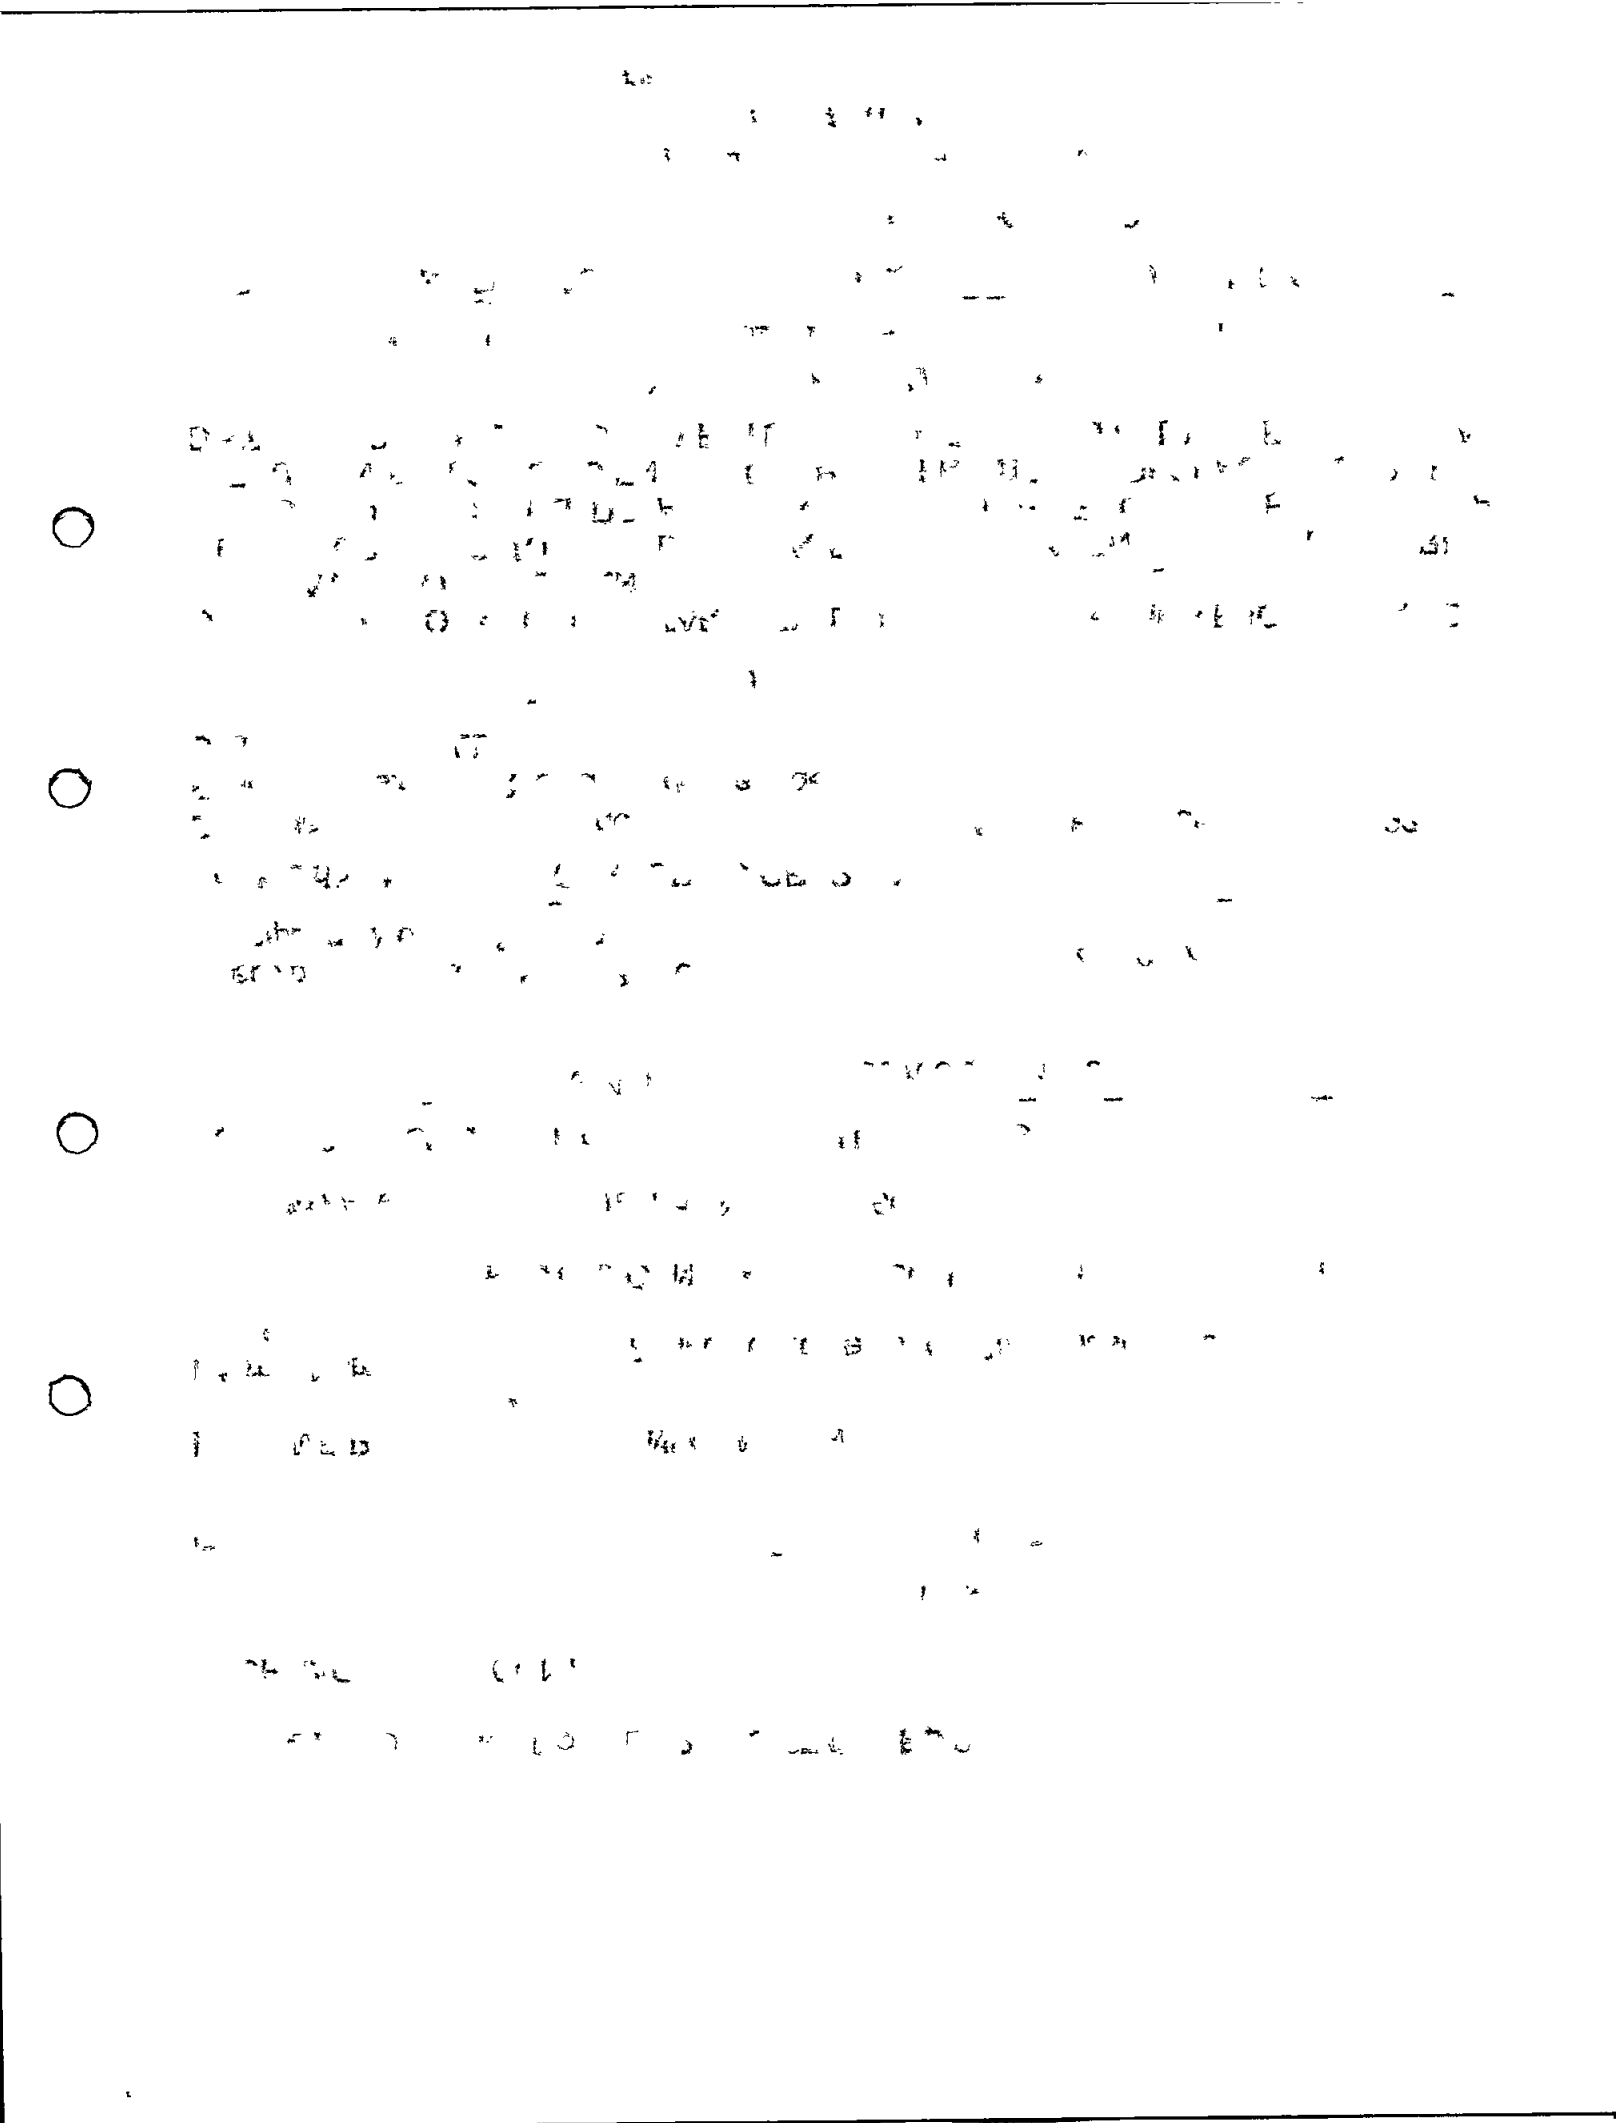

Valor del Contrato: Es hasta por la suma de: MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE **$ 1.426.801.042**
Adición No. 1: N/A
Prórroga No.: 1 | N/A
Prórroga No.: 2 | N/A
Prórroga No.: 3 | N/A
Prórroga No.: 4 | N/A
Suspensión No.: 1 | 16/06/2024 al 22/08/2024
Reinicio No.: 1 | N/A
Cesión: N.A.
Terminación Anticipada: N/A
Acta de recibo final de obra: N/A
Acta de liquidación: N/A
Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Adición 1	Valor Acumulado Contrato	Valor Anticipo
$ 1.426.801.042	$ 0.00	**$ 1.426.801.042**	$ 0.00

ACTA				RECIBO PARCIAL		VALOR NETO A PAGAR	
No.	Meses Ejecución			Ejecutado (Valor Bruto)	Acumulado	Amortización Anticipo	A pagar
1	12/23-03/24			172.520.031	172.520.031		172.520.031
2	04/24-05/24			300.060.416	472.580.447		472.580.447
3							
4							

POLIZAS

SEGÚN FECHA DE CONTRATO

GARANTE (Aseguradora, Banco o Fiduciaria)	No. GARANTÍA	FECHA DE EXPEDICION	AMPAROS	VIGENCIA		SUFICIENCIA (monto garantizado)
				Desde (d/m/a)	Hasta (d/m/a)	
Seguros del Estado	420-47-994000042515 Póliza de Garantía Única de Cumplimiento Estatal	27/12/2023	Cumplimiento del Contrato	22/12/2023	30/12/2024	$ 286.787.009,44
			Pago de salarios, prestaciones sociales	22/12/2023	30/06/2027	$ 115.570.884,40
			Calidad de la Obra	30/06/2024	30/12/2029	$ 286.787.009,44
Seguros del Estado	420-47-994000010243 Póliza Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual	27/12/2023	Predios labores y operaciones	22/12/2023	30/06/2024	$ 232.000.000.00

ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01 AL 14 DE JUNIO DEL 2024

Según la proyección de ejecución de obra, las actividades realizadas en este periodo corresponden a las actividades preliminares de la malla contra impacto y la estructura de la cubierta al mismo tiempo de actividades de cimentación como acero flejado para pilotes de la estructura de cubierta y drenajes en general.

- ✓ Se realizó manejo de las aguas lluvias.
- ✓ Se realizó corte y figurado de acero refuerzo para vigas de cimentación.
- ✓ Se realizó armado y colocación en sitio de estructura acero refuerzo para vigas de cimentación.
- ✓ Se realizó carpintería en madera y encofrado de pedestales.
- ✓ Carpintería en madera, encofrado en madera y metálica para vigas de cimentación.
- ✓ Colocación y/o ubicación y nivelación de guías de las platinas para estructura metálica de la cubierta para fundición de pedestales.
- ✓ Fundición de pedestales y viga cimentación.
- ✓ Aplicación de acelerante para mortero.
- ✓ Toma de la muestra de concreto.
- ✓ Desencofrado de pedestales y viga cimentación.

CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC
NIT 901526894-4

Manejo de las aguas lluvias.

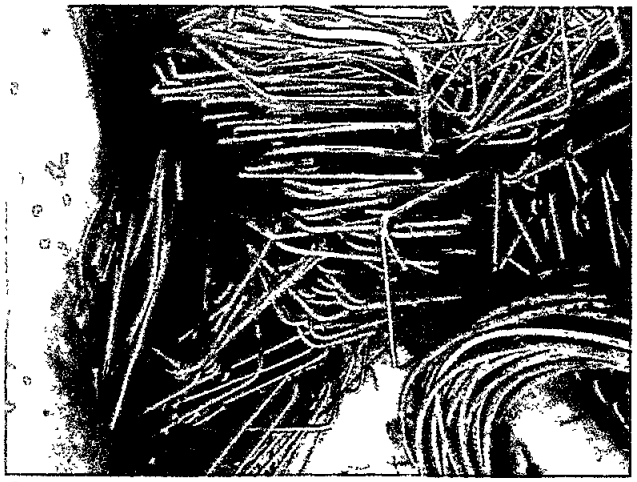

Corte y figurado de acero.

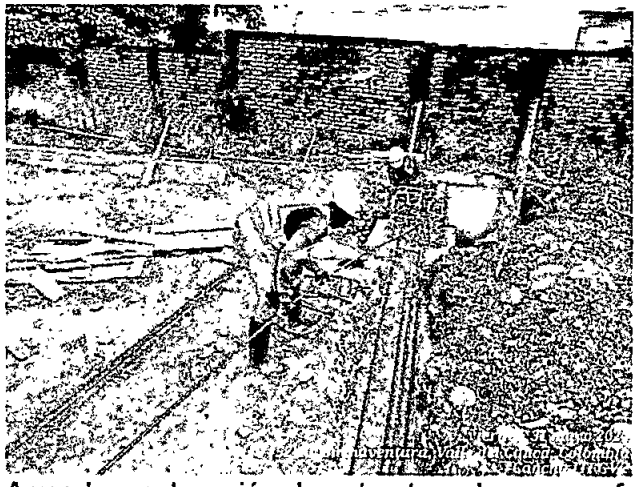

Armado y colocación de estructura de acero refuerzo para viga cimentación.

Dirección: Manzana H14- Barrio Huasipanga, Mocoa, Putumayo
Cel: 320 4736672
Correo Electrónico: construpacicolsaszomac.info@gmail.com

CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC
NIT 901526894-4

Carpintería en madera y encofrado de pedestales.

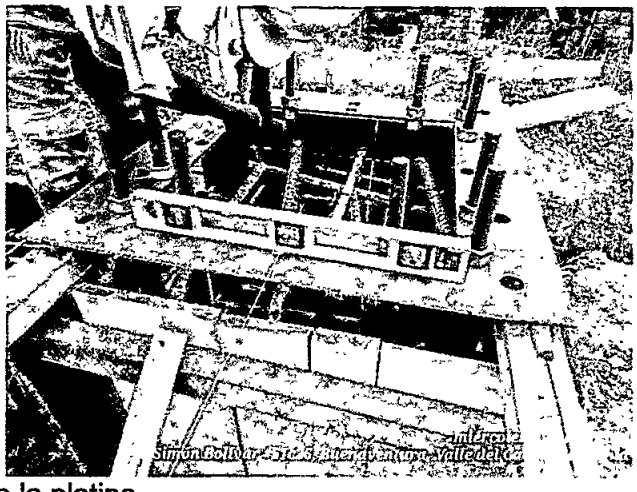

Colocación y/o ubicación y nivelación de guías de la platina.

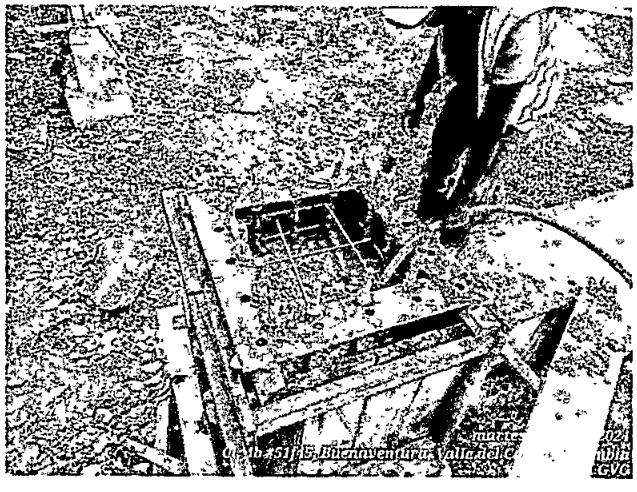

Fundición de pedestales y viga cimentación.

Dirección: Manzana H14- Barrio Huasipanga, Mocoa, Putumayo
Cel: 320 4736672
Correo Electrónico: construpacicolsaszomac.info@gmail.com

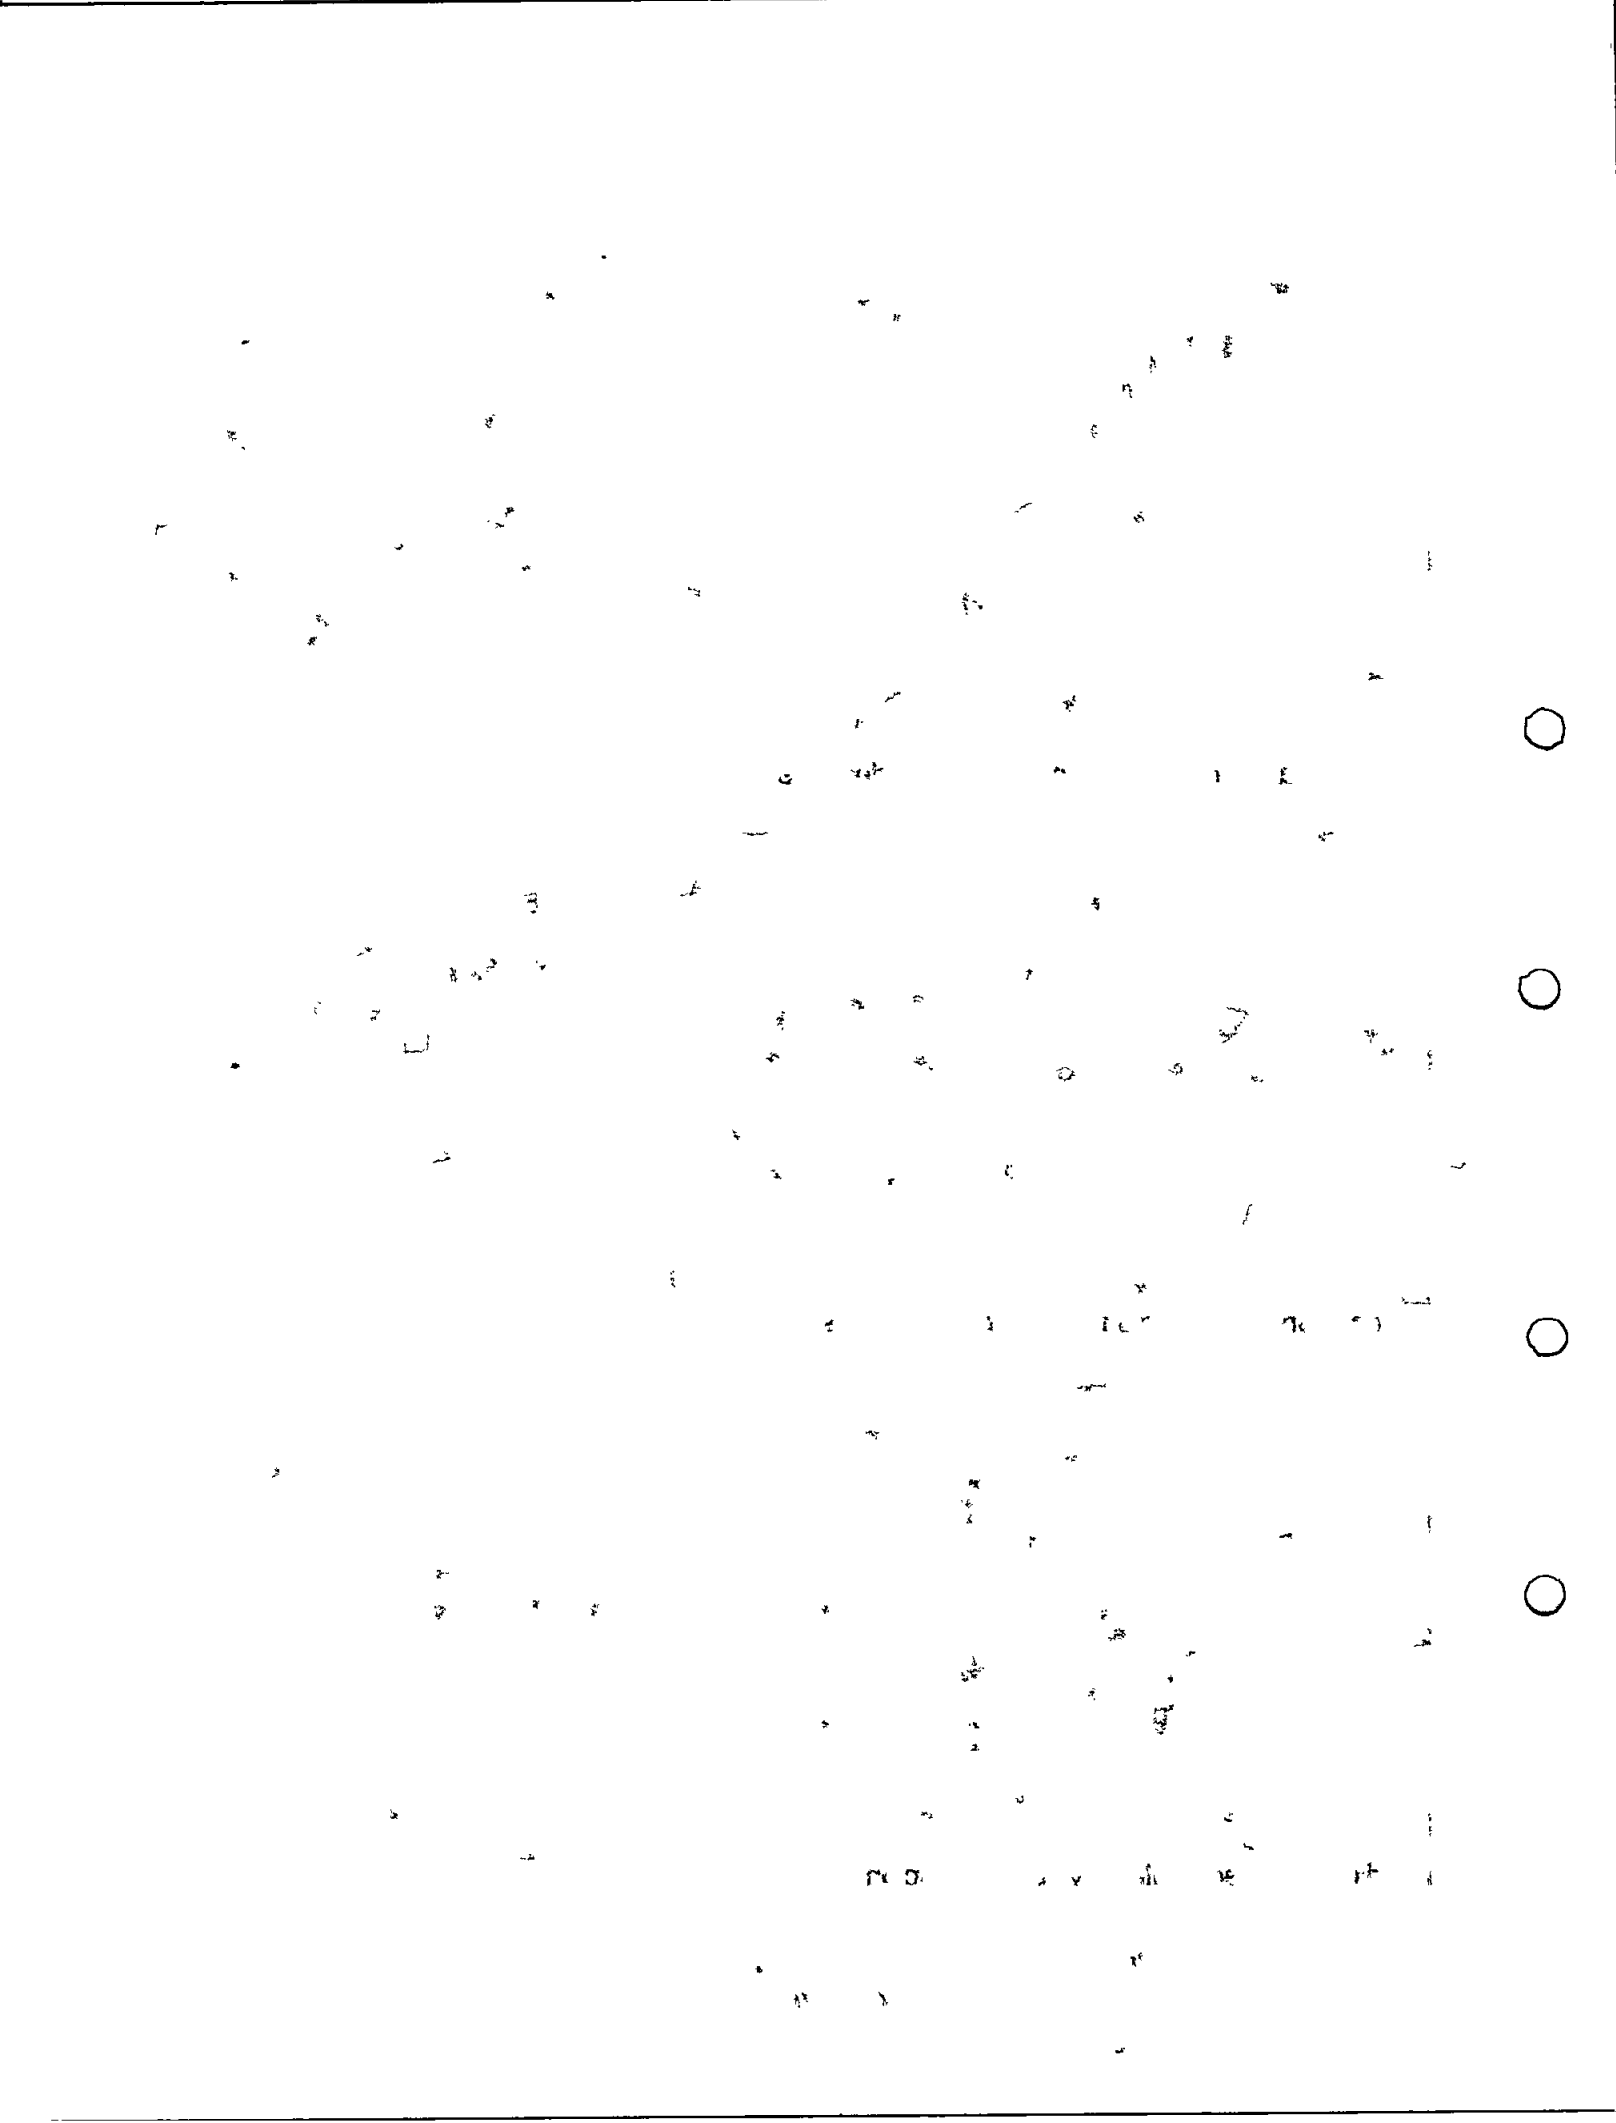

CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC
NIT 901526894-4

Aplicación de acelerante para mortero.

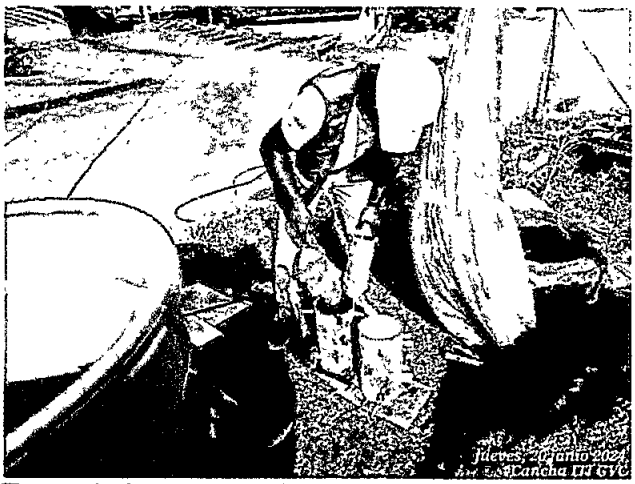

Toma de la muestra de concreto.

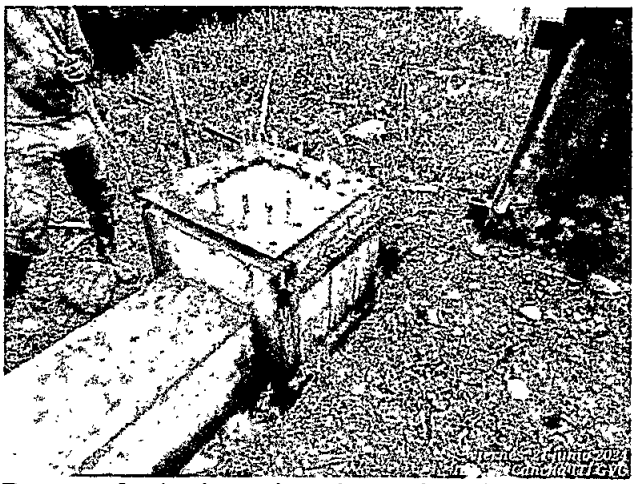

Desencofrado de pedestales y viga cimentación.

Dirección: Manzana H14- Barrio Huasipanga, Mocoa, Putumayo
Cel: 320 4736672
Correo Electrónico: construpacicolsaszomac.info@gmail.com

RECURSOS HUMANOS

Para la gestión y ejecución de las actividades de obra durante este periodo se contó con el apoyo del siguiente personal:

- Ing. Guillermo Villegas
- Arq. Beymar Panameño Angulo
- Profesional en SST Álvaro Tenorio
- Almacenista
- 1 Maestro de obra
- 1 Oficiales
- 2 Ayudantes

Revisión y Verificación de Pago de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscal (EPS, ARL y AFP)

Para el periodo informado contamos (CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC NIT) con las afiliaciones de todo el personal al Sistema General de Riesgos Laborales y los respectivos pagos de las planillas de aportes al sistema Integral de seguridad social, según los dos últimos dígitos del NIT, como lo establece el Art.3.2.2.1 del Decreto 923 de 2017 expedido por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud y Protección Social

REVISION DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Se realizaron tomas de muestras de concreto en obra, las cuales se deben llevar a laboratorio para sus respectivos fallos.

AVANCE DE OBRA

Ejecución del contrato

Porcentaje de Obra Proyectado Grupo 2: 85,08%

Porcentaje de obra Ejecutado: 53 %

CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC
NIT 901526894-4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista presenta atrasos en la obra, por causas no imputables a Él como son las condiciones climáticas y problemas de orden público.
- Durante el presente periodo se ha contratado personal del sector donde se ejecuta la obra.
- El contrato de obra presenta un avance del 51.00 %.
- El Contratista presentara para la primera semana de mayo de 2024, una segunda acta de cobro de la obra.

Hasta el corte del presente informe, nos disponemos a reiniciar las actividades de cimentación pendientes, continuar con las actividades de la cancha, empezar con la actividad del montaje de la estructura de cubierta y por último realizar las actividades complementarias, pero por problemas de inseguridad y precipitaciones a nivel nacional, por lo que estas actividades, no se han logrado iniciar.
Se espera que se inicien las excavaciones de las vigas de cimentación y se pueda transportar la piloteadora, con el fin empezar las perforaciones profundas y los anchos de acuerdo con los diseños estructurales

Atentamente,

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Dirección: Manzana H14- Barrio Huasipanga, Mocoa, Putumayo
Cel: 320 4736672
Correo Electrónico: construpacicolsaszomac.info@gmail.com

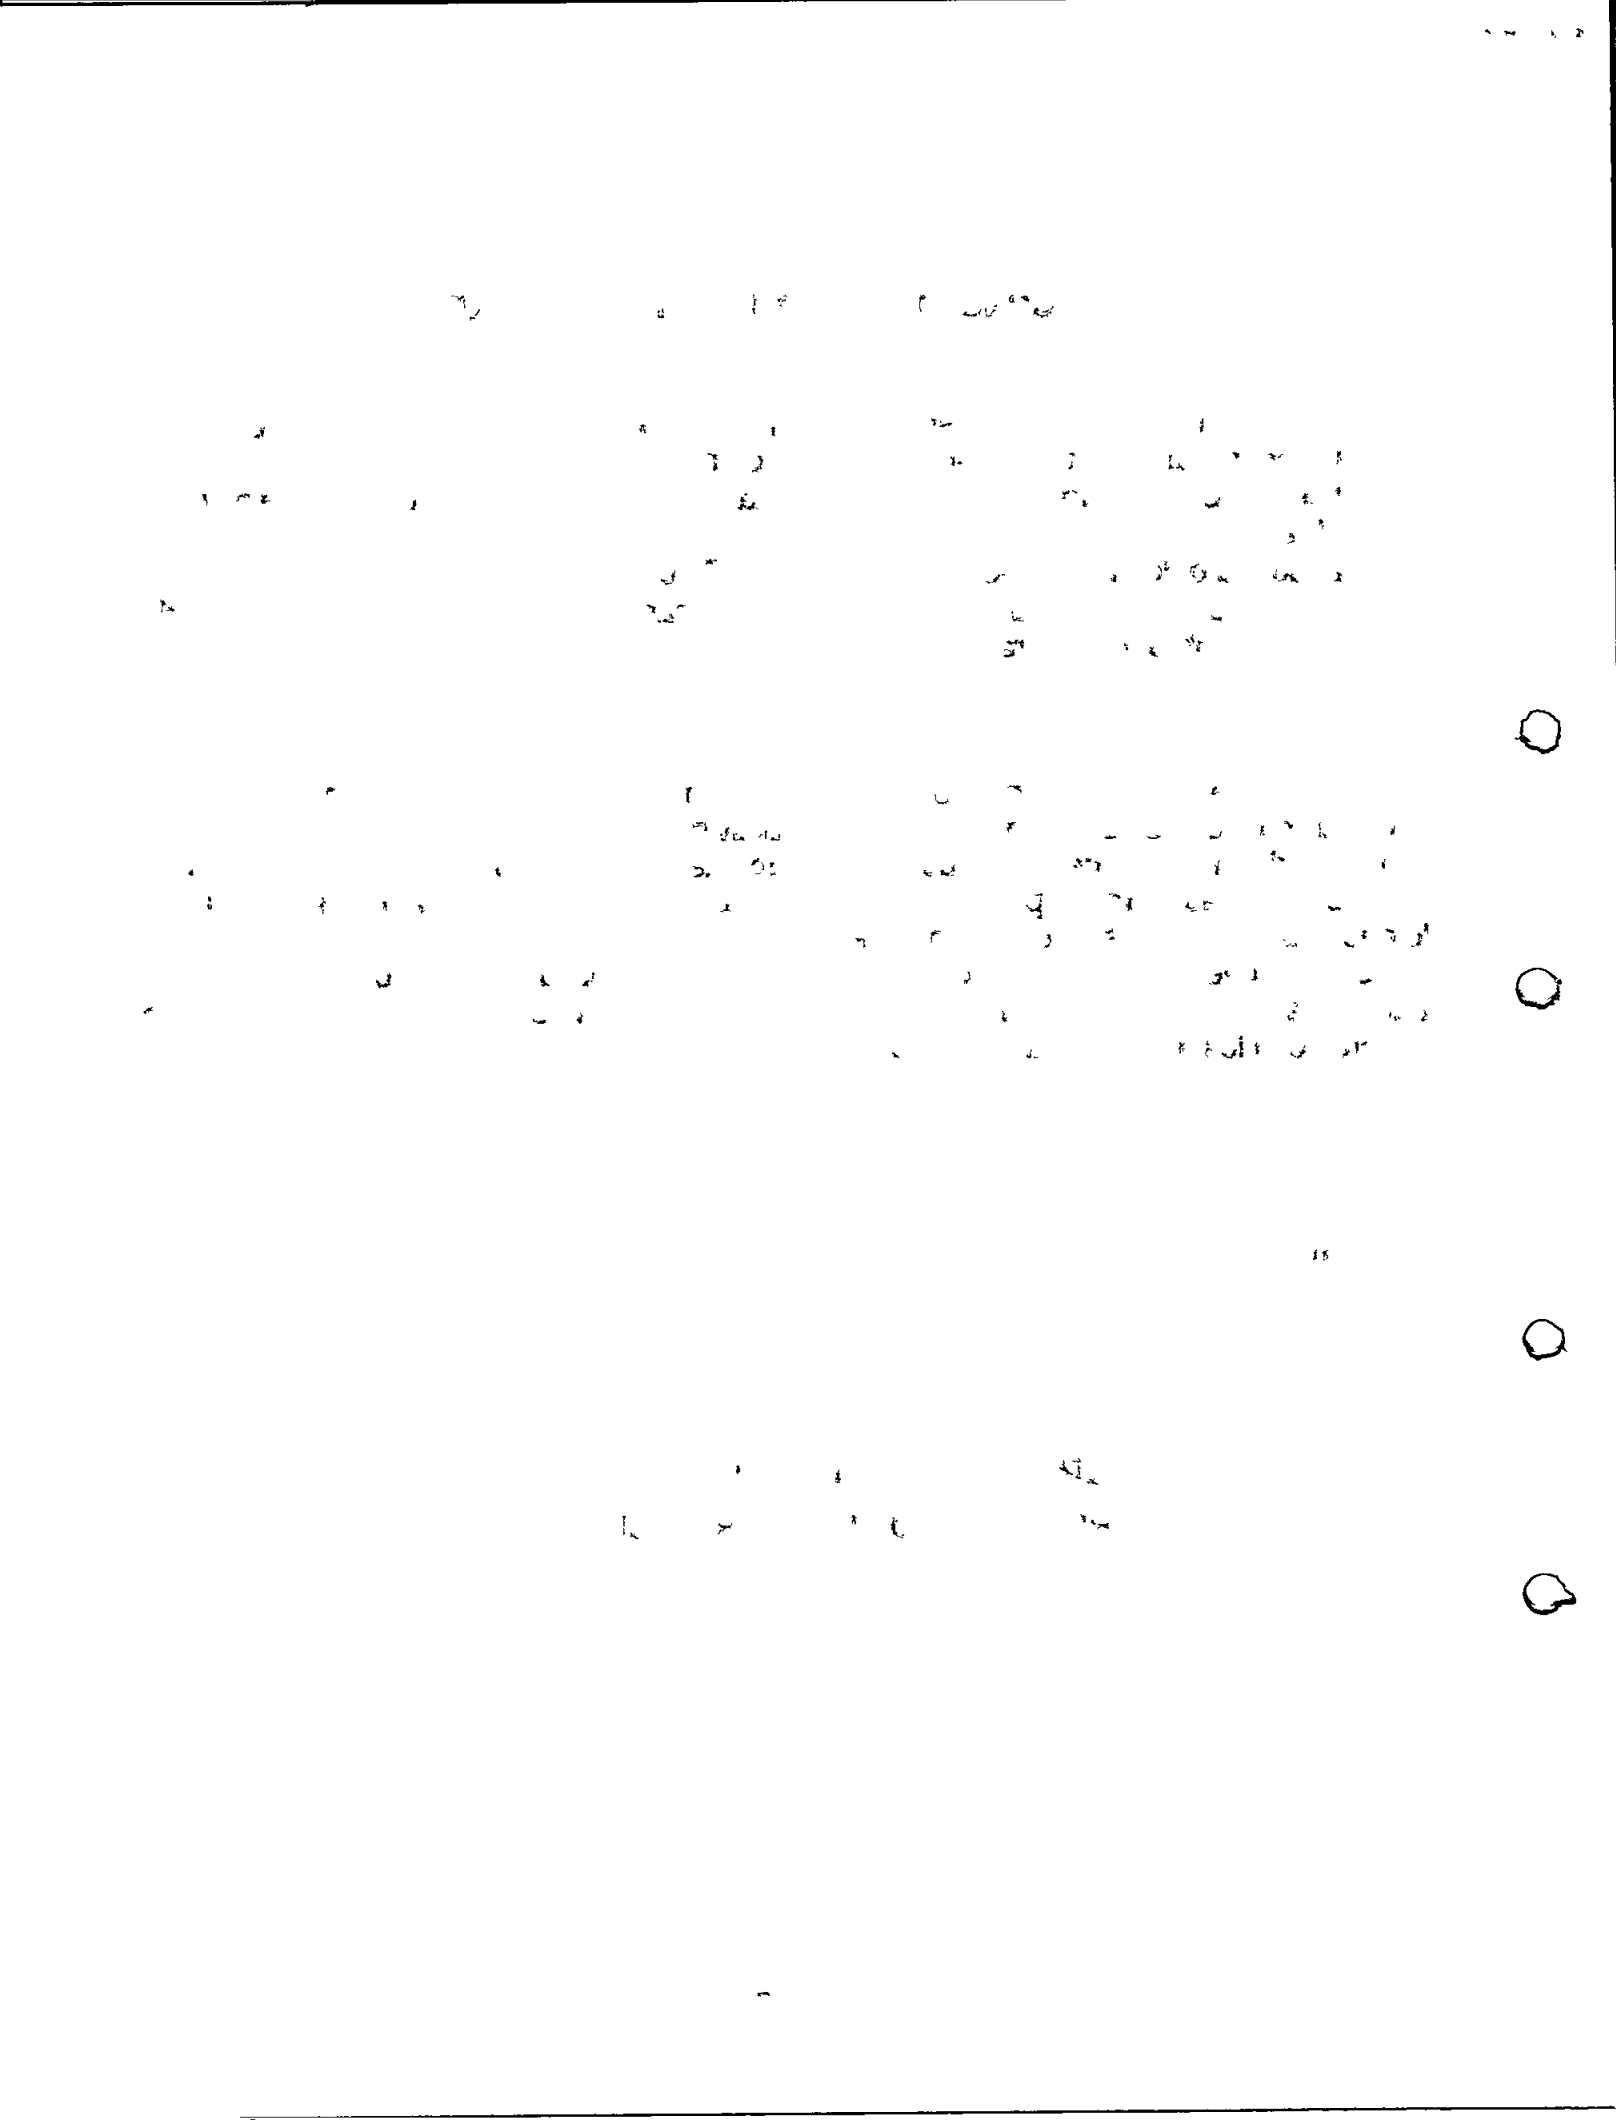

CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC
NIT 901526894-4

INFORME MENSUAL No. 09

CONTRATO DE OBRA No. IND - 23 - 5027

01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

GENERALIDADES

INTRODUCCION

El presente documento es elaborado por el contratista, CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC NIT. 901.526.894-4 mediante el contrato de obra No. IND – 23 – 5027, cuyo objeto es: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

En este informe mensual se resume el seguimiento técnico, administrativo, ambiental, financiero, jurídica de los aspectos más relevantes ocurridos durante la ejecución de la obra en el periodo comprendido entre el 01 de febrero al 29 de febrero del 2024.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

DATOS BASICOS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CODIGO BPIN: 2022003760006

La Gobernación del Valle del Cauca realizó procesos de concertación y socialización del Plan Departamental de Desarrollo Departamental denominado: **VALLE INVENCIBLE 2020 – 2023,** dentro del cual se encuentra incluido el proyecto en asunto, con las poblaciones de los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el Departamento del Valle del Cauca.
Así mismo se realizaron mesas de trabajo con la comunidad beneficiaria del proyecto en relación con su alcance.

El proyecto general de: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES GRUPO 1 FRENTE 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES URBANIZACION LA CABAÑA MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1: FRENTE 2: ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1 : FRENTE 3 : ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, la Gobernación del Valle del Cauca y la Entidad promotora del Deporte, Educación Física y la Recreación - Indervalle, se ha basado en estudios donde se comprueba que la recreación, el deporte y la actividad física es un medio transversal que potencializa la calidad de vida de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores, convirtiéndose así en una ruta de primer nivel para la ocupación del tiempo libre, fomento de hábitos saludables y resolución de conflictos. En consecuencia, se quiere lograr que dentro de las políticas públicas locales y territoriales deportivas exista el compromiso de apoyar activamente estas iniciativas y generar espacios de encuentros diferentes que permitan explorar nuevas capacidades, transformar imaginarios, hacer uso adecuado del tiempo libre y fortalecer redes de apoyo.

Con la ejecución del proyecto, se propone articular la experiencia profesional con los conocimientos técnicos y profesionales que INDERVALLE ofrece, los cuales contribuyen al beneficio de la Comunidad y la recreación en los Distritos de: Cali y Buenaventura y Municipio de Cartago, Departamento del Valle del Cauca, a través de adecuación, construcción o dotación, e igualmente se canalizan las habilidades aprendidas en intervenciones anteriores.

Es importante resaltar que el proyecto consolida los procesos deportivos, recreativos y culturales en el Departamento del Valle del Cauca, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y construcción de tejido social en los sitios donde se desarrollan.

En resumen, tenemos:

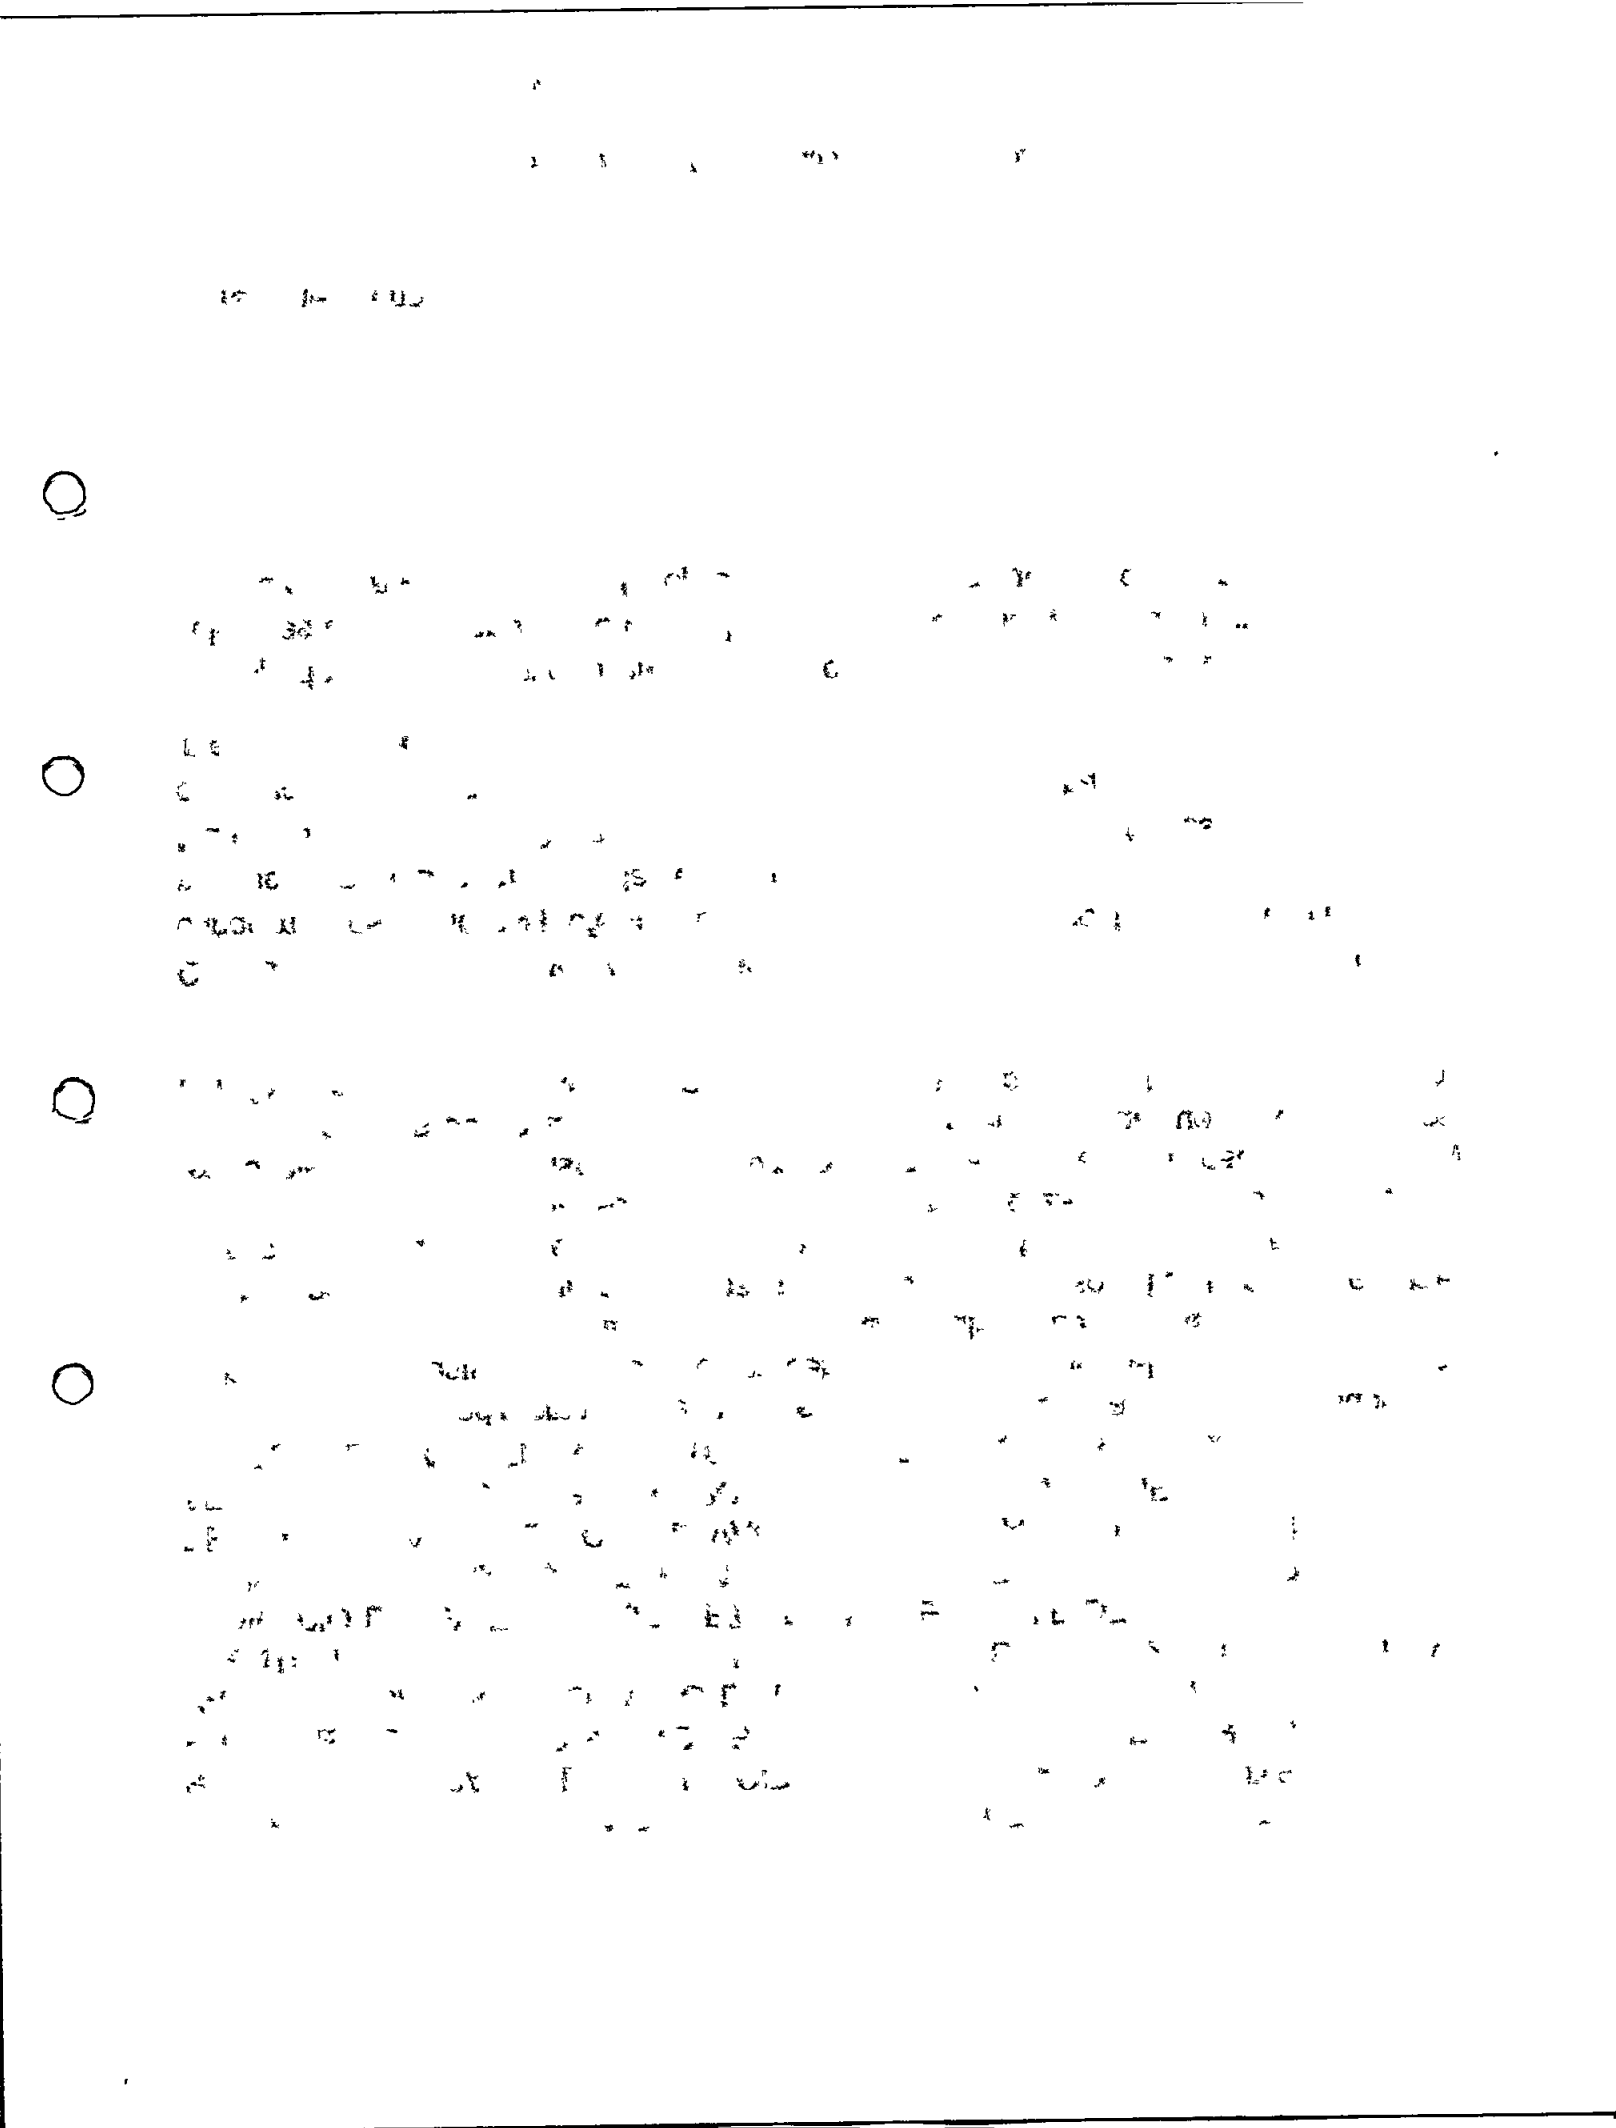

CONTRATO DE OBRA No. IND - 23 – 5027 GRUPO 2

INFORMACION DEL CONTRATO

1. TIPO DE CONTRATO		
OBRA [X]		INTERVENTORIA [ ]
INFORME PARCIAL [X]		INFORME FINAL [ ]
Informe Número: 9	Periodo desde el (01/11/2024) hasta el (10/12/2024)	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN		
Contrato / Aceptación de Oferta No. IND – 23 – 5027 GRUPO 2		
Nombre Completo del Contratista: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC		
Cédula y/o Nit: 901.526.894-4	Correo Electrónico: construpacicolsaszomac.info@gmail.com	
Dirección: manzana H 14ABarrio Huasipanga Mocoa - Putumayo	Teléfonos: 320 473 66 72	
Nombre de interventoría: CONSORCIO GRUPO 3		
Dependencia: Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca - INDERVALLE	No. Teléfono y Extensión: (602) 25569242	
Obra Física Ejecutada del Periodo: 12.50%	Obra Física Ejecutada Acumulada: **51.40%**	
Objeto Contrato Obra: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
3. INFORME JURÍDICO		
Fecha de Inicio	Plazo de Ejecución	Fecha terminación
28 DE DICIEMBRE DE 2023	367 DIAS	09 DE MAYO DE 2025
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO		

CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC
NIT 901526894-4

Valor del Contrato: Es hasta por la suma de: MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE **$ 1.426.801.042**
Adición No. 1: N/A
Prórroga No.: 1 | N/A
Prórroga No.: 2 | N/A
Prórroga No.: 3 | N/A
Prórroga No.: 4 | N/A
Suspensión No.: 1 | N/A
Reinicio No.: 1 | N/A
Cesión: N.A.
Terminación Anticipada: N/A
Acta de recibo final de obra: N/A
Acta de liquidación: N/A
Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Adición 1	Valor Acumulado Contrato	Valor Anticipo
$ 1.426.801.042	$ 441.098.752	**$ 1.867.899.794**	$ 0.00

ACTA				RECIBO PARCIAL		VALOR NETO A PAGAR	
No.	Meses Ejecución			Ejecutado (Valor Bruto)	Acumulado	Amortización Anticipo	A pagar
1	12/23-3/24			172.520.031	172.520.031	-0,00-	172.520.031
2	4/24-5/24			300.060.416	472.580.447	-0,00-	300.060.416
3	5/24-12/24			182.699.313	655.279.760	-0,00-	182.699.313
4							

Dirección: Manzana H14- Barrio Huasipanga, Mocoa, Putumayo
Cel: 320 4736672
Correo Electrónico: construpacicolsaszomac.info@gmail.com

POLIZAS

SEGÚN FECHA DE CONTRATO

GARANTE (Aseguradora, Banco o Fiduciaria)	No. GARANTÍA	FECHA DE EXPEDICION	AMPAROS	VIGENCIA		SUFICIENCIA (monto garantizado)
				Desde (d/m/a)	Hasta (d/m/a)	
Seguros del Estado	420-47-994000042515 Póliza de Garantía Única de Cumplimiento Estatal	27/12/2023	Cumplimiento del Contrato	22/12/2023	30/12/2024	$ 286.787.009,44
			Pago de salarios, prestaciones sociales	22/12/2023	30/06/2027	$ 115.570.884,40
			Calidad de la Obra	30/06/2024	30/12/2029	$ 286.787.009,44
Seguros del Estado	420-47-994000010243 Póliza Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual	27/12/2023	Predios labores y operaciones	22/12/2023	30/06/2024	$ 232.000.000.00

ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Según la proyección de ejecución de obra, las actividades realizadas en este periodo corresponden a las actividades preliminares de la cancha múltiple; como son relleno y nivelación de material de rio para base, sub-base y compactación de terreno.

- ✓ Se realizó levantamiento topográfico (Comisión topográfica).
- ✓ Se realizó manejo de aguas lluvias.
- ✓ Se realizó instalación de Geocelda para mejoramiento de terreno.
- ✓ Se realizó relleno can material de rio base.
- ✓ Se realizó relleno can material de rio sub-base.
- ✓ Se realizó compactación y nivelación de terreno.
- ✓ Se realizó el descapote y la excavación para gaviones.
- ✓ Se realizó la construcción de los gaviones.
- ✓ Se realizó la construcción de la estructura metálica.

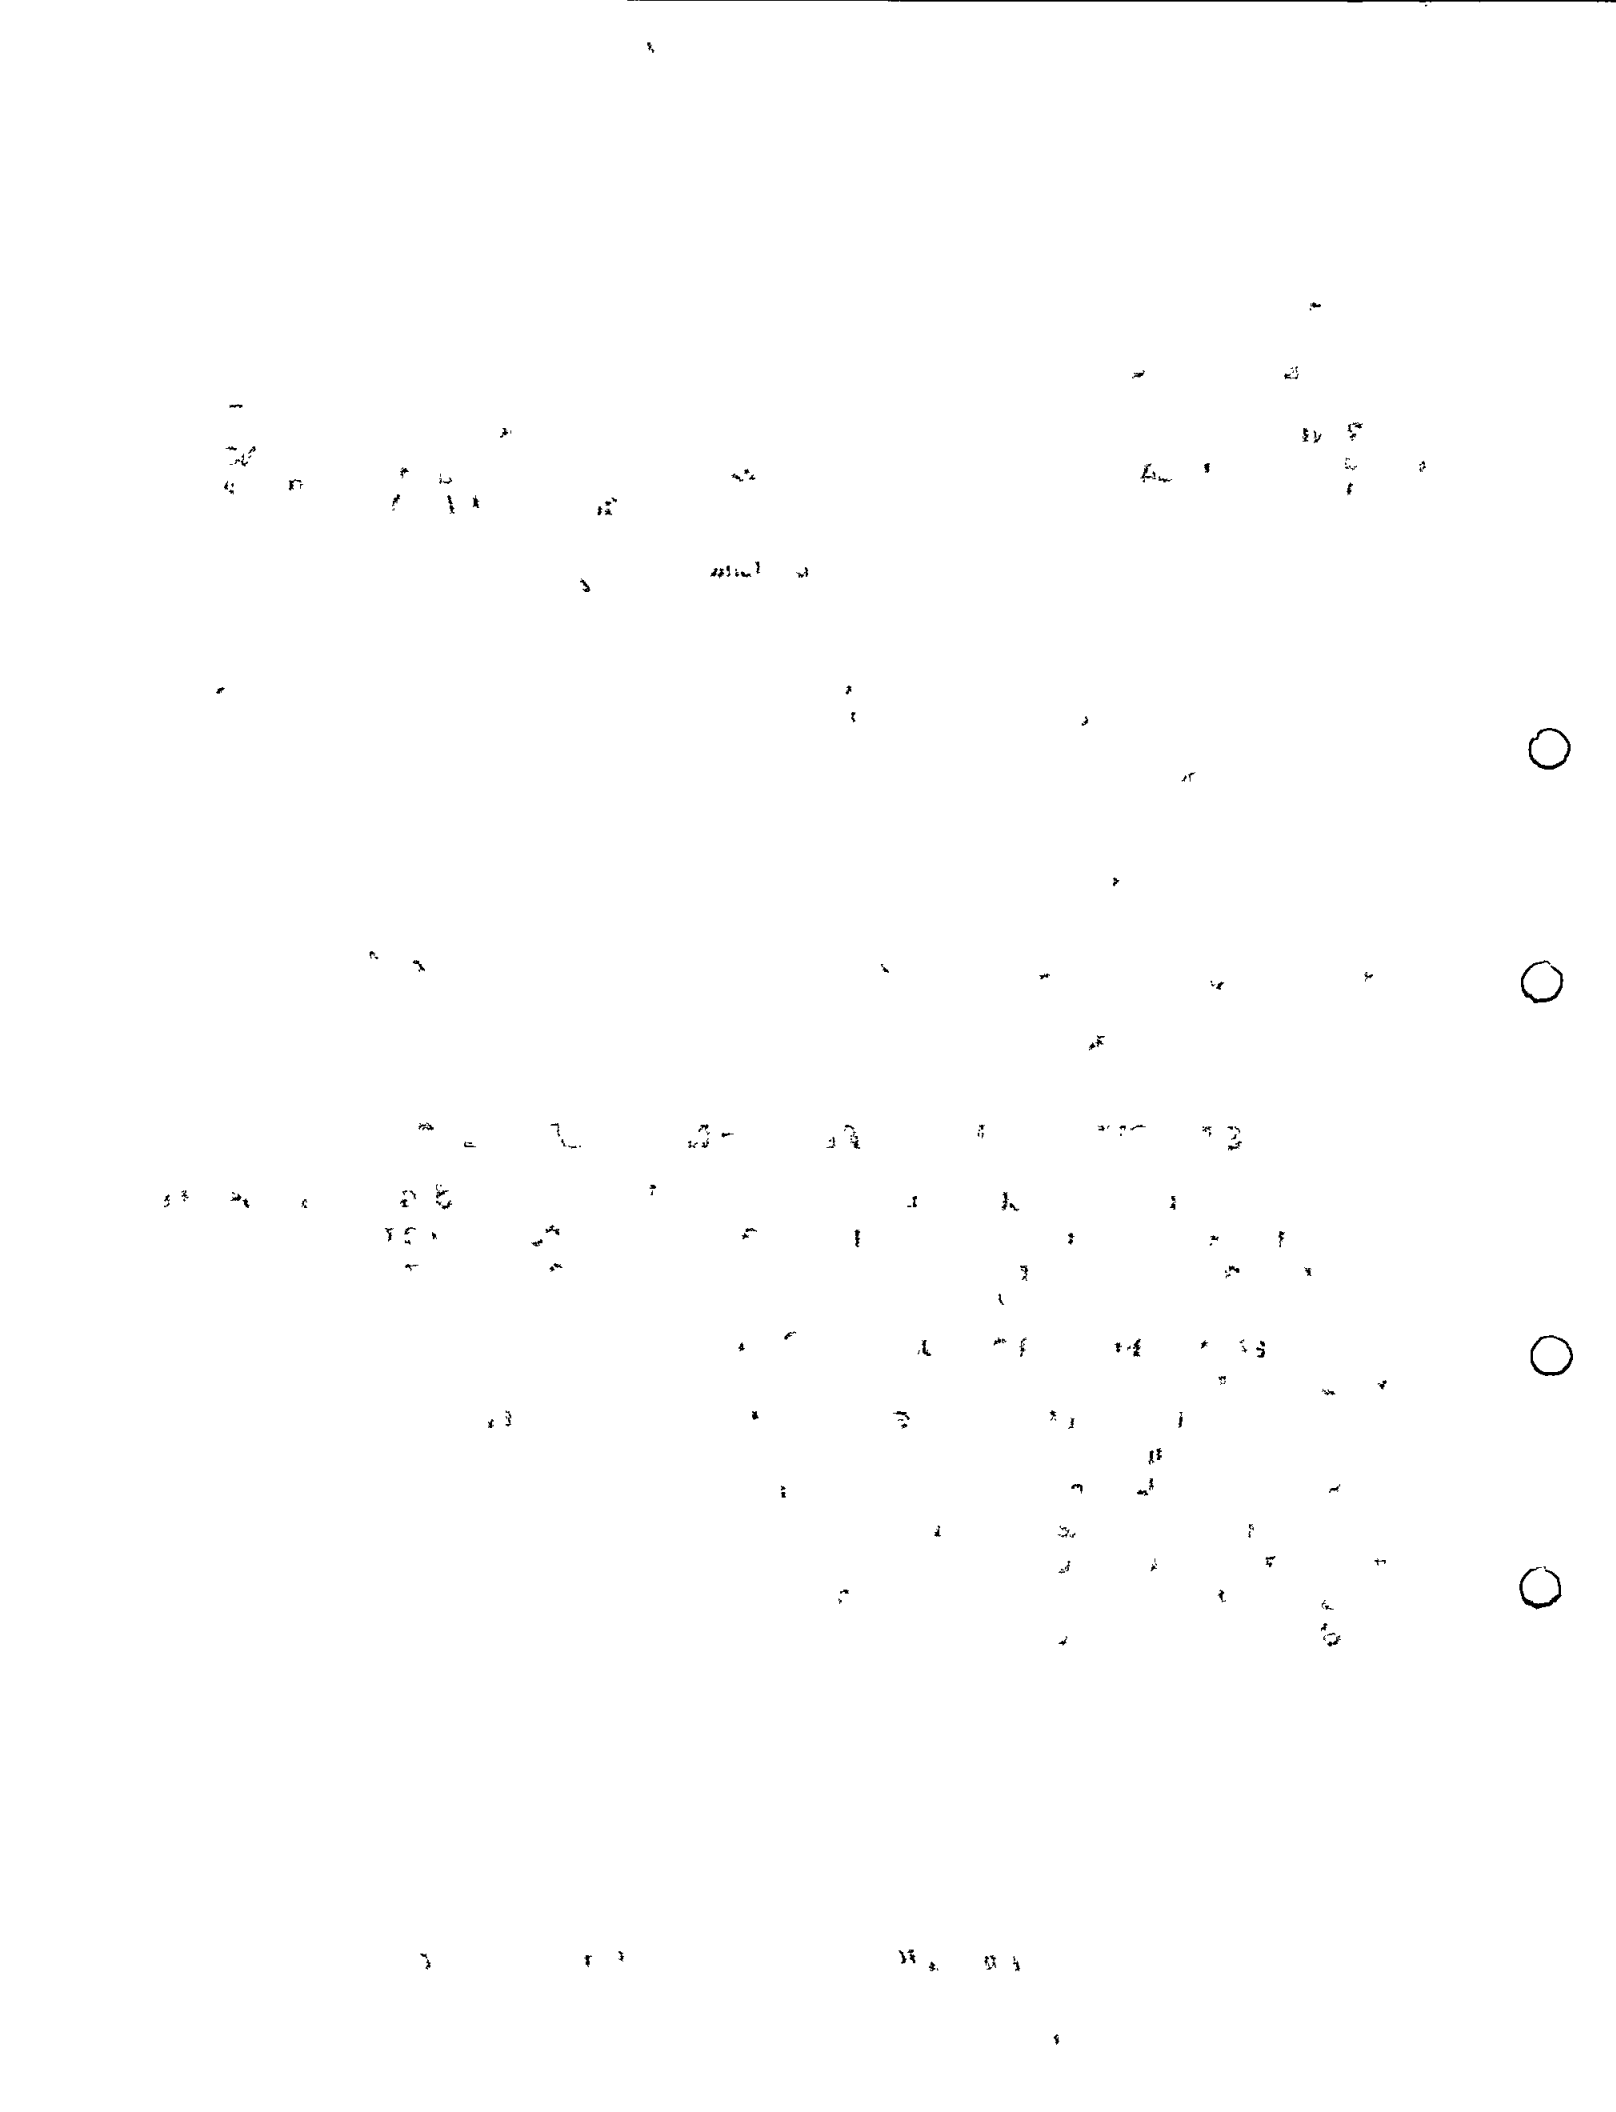

CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC
NIT 901526894-4

Levantamiento topográfico (Comisión topográfica).

Manejo de aguas lluvias.

Toma densidad de material de granular base.

Dirección: Manzana H14- Barrio Huasipanga, Mocoa, Putumayo
Cel: 320 4736672
Correo Electrónico: construpacicolsaszomac.info@gmail.com

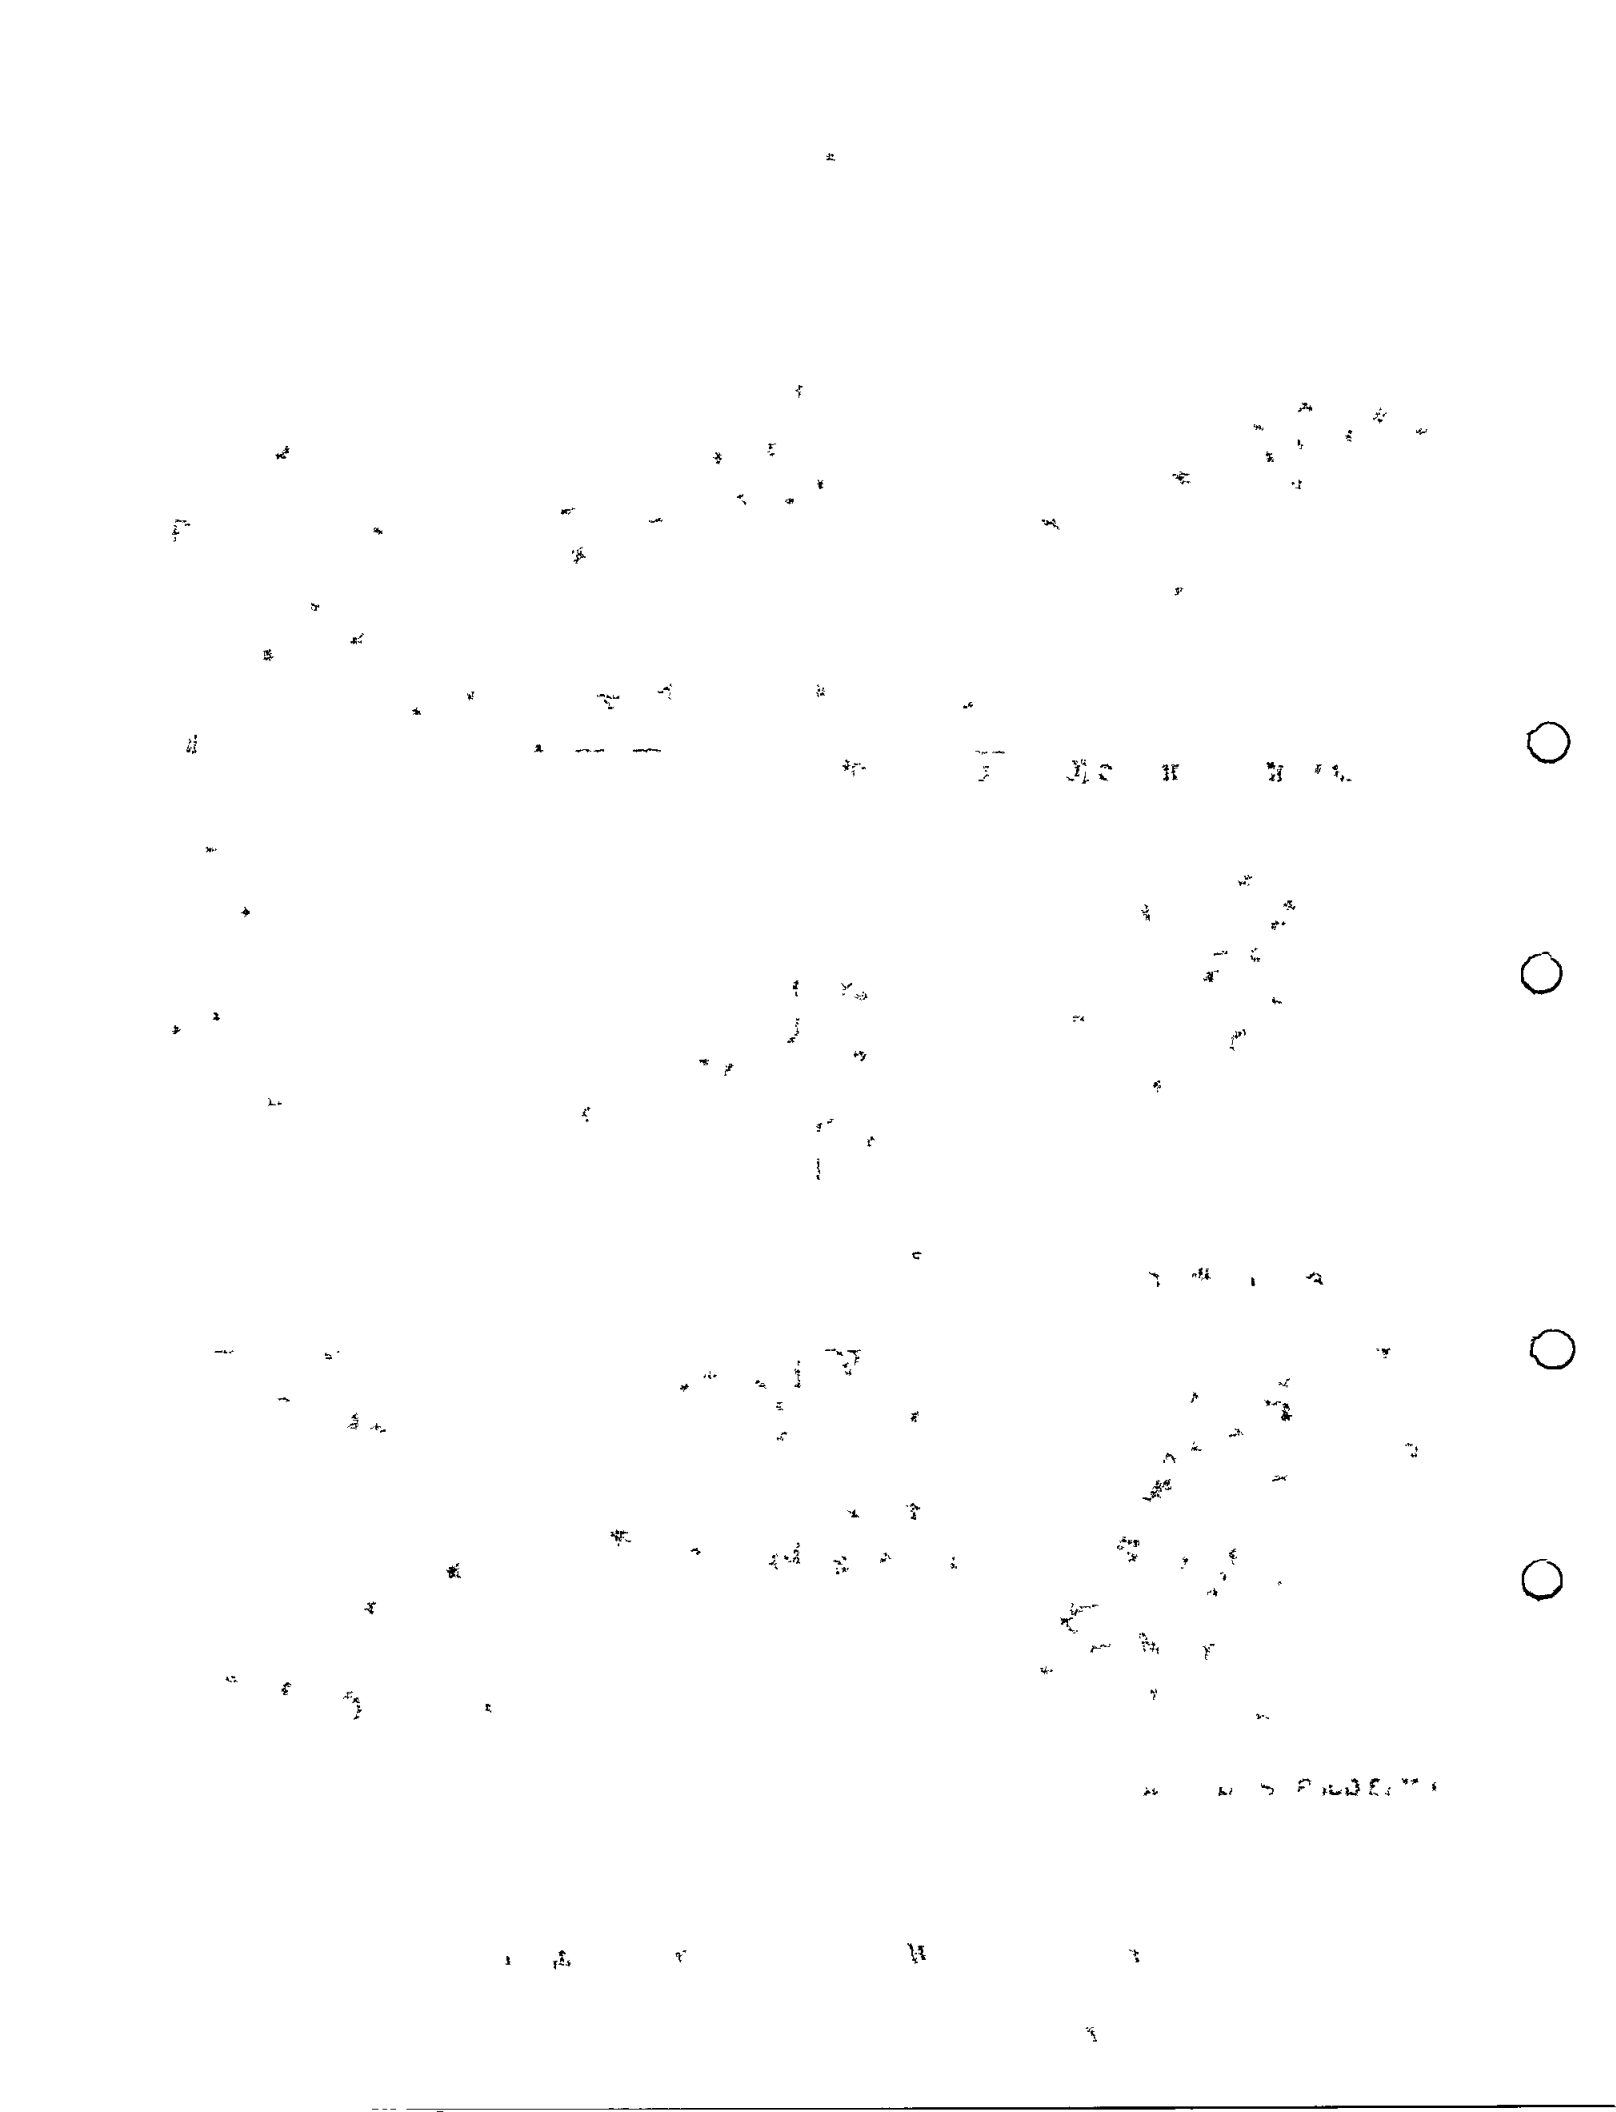

CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC
NIT 901526894-4

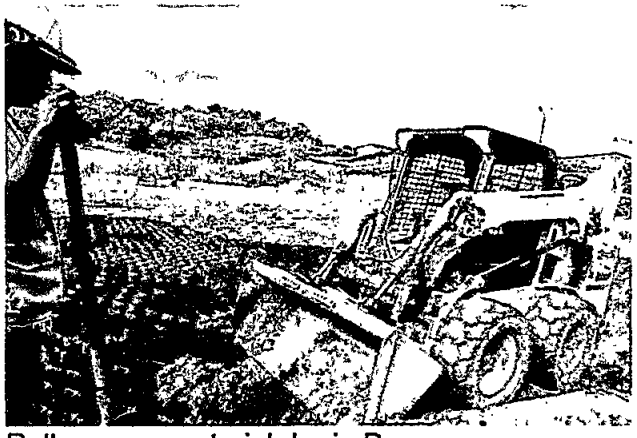

Relleno can material de rio Base.

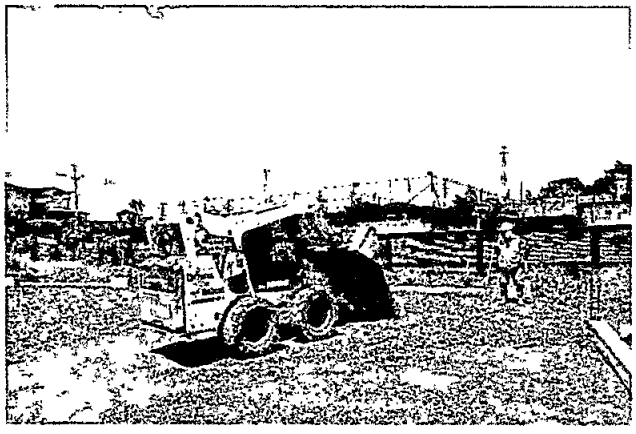

Relleno can material de rio Sub-base.

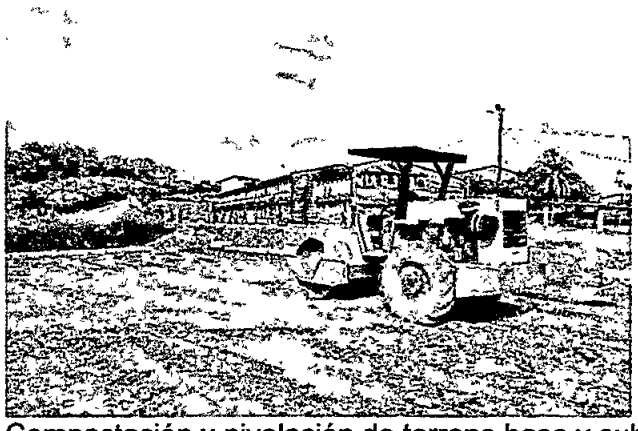
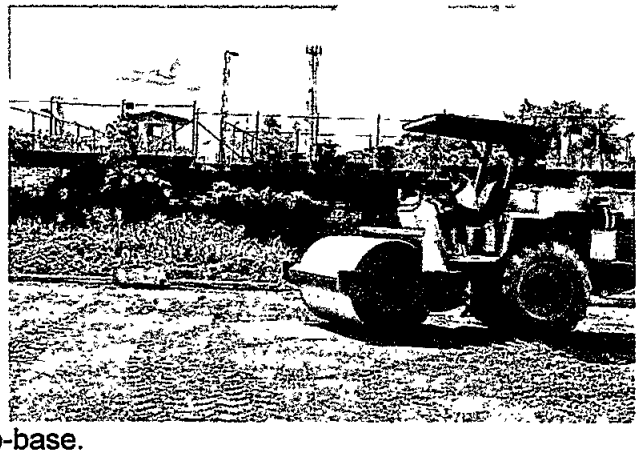

Compactación y nivelación de terreno base y sub-base.

Dirección: Manzana H14- Barrio Huasipanga, Mocoa, Putumayo
Cel: 320 4736672
Correo Electrónico: construpacicolsaszomac.info@gmail.com

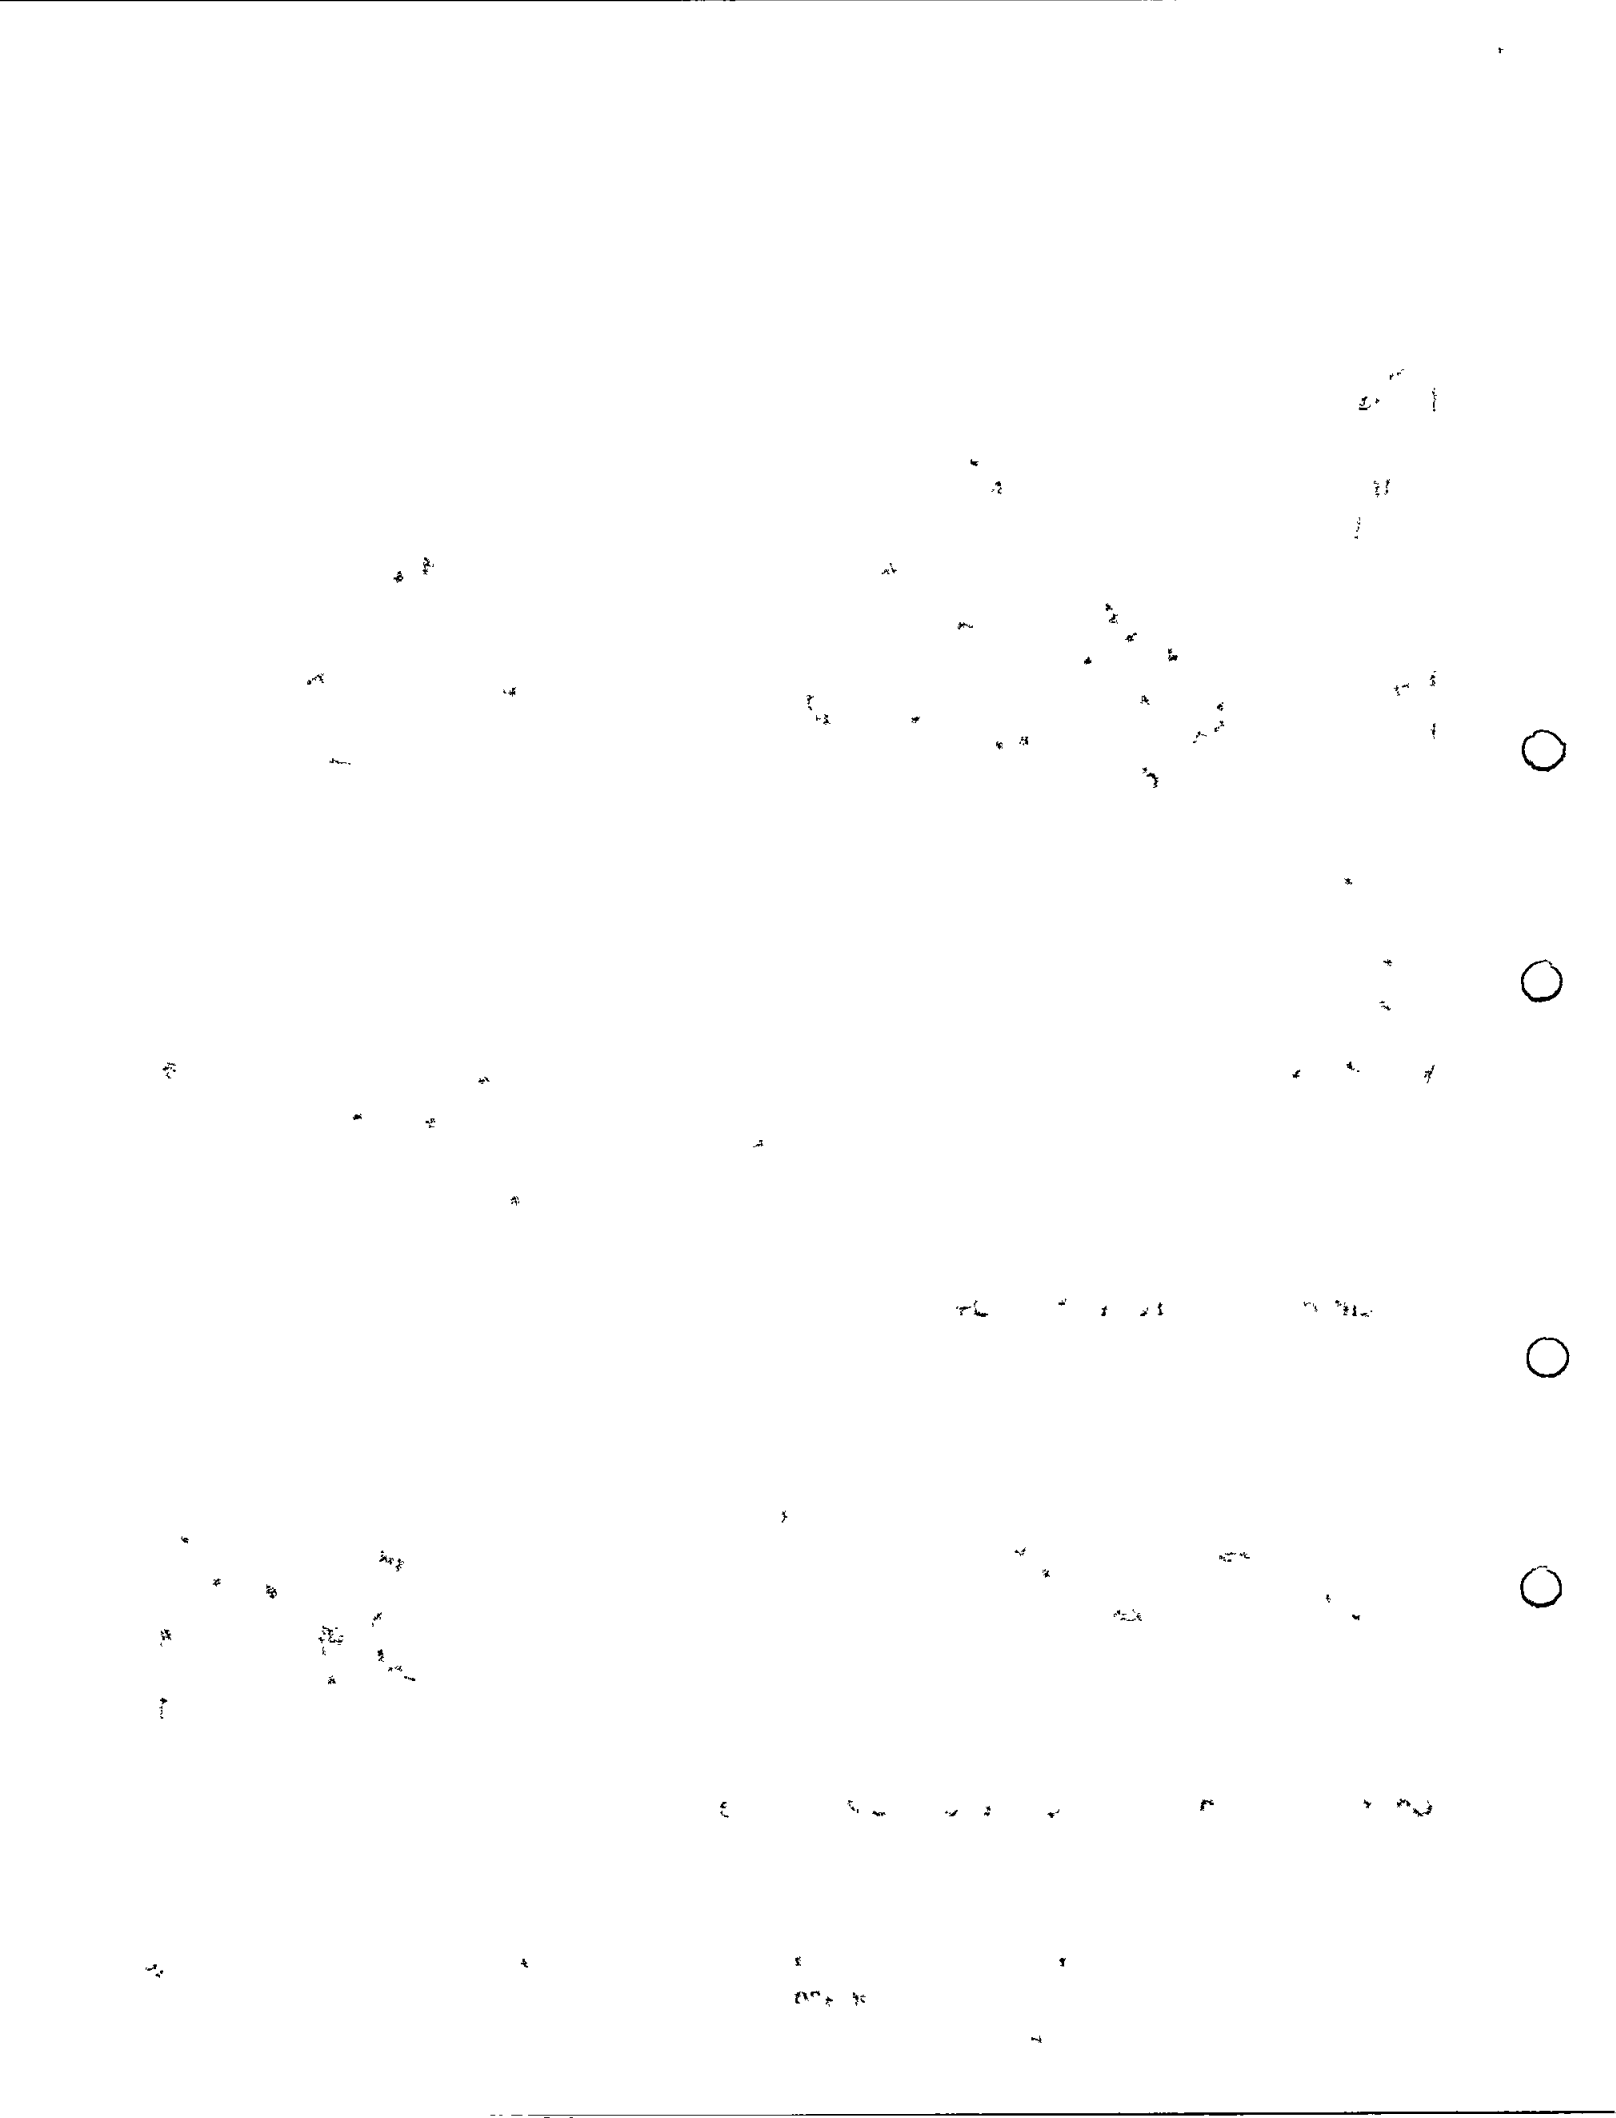

CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC
NIT 901526894-4

Excavación y construcción de formaleta para gaviones

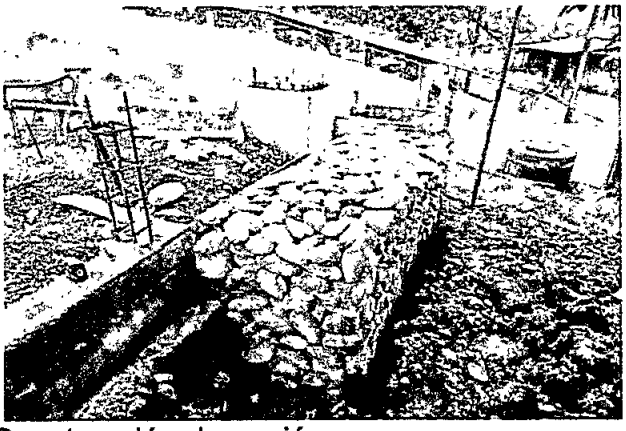
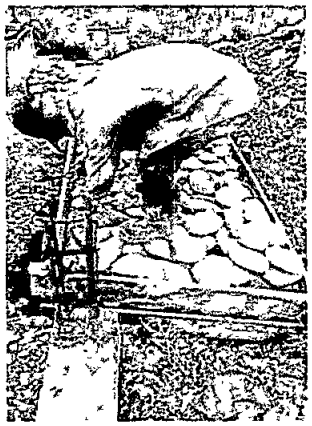

Construcción de gavión.

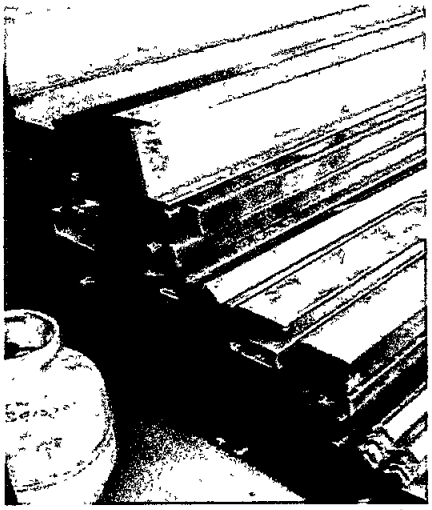
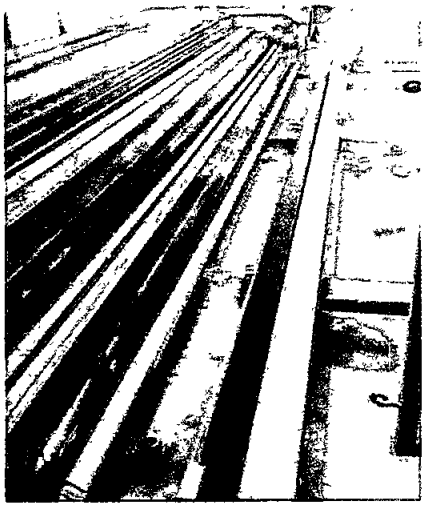
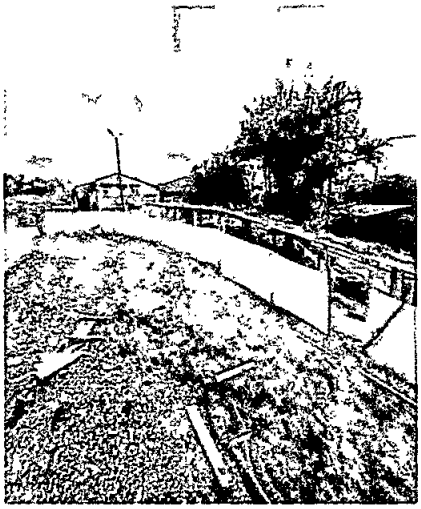

Material para La construcción de estructura metálica y cerramiento de la obra.

Dirección: Manzana H14- Barrio Huasipanga, Mocoa, Putumayo
Cel: 320 4736672
Correo Electrónico: construpacicolsaszomac.info@gmail.com

RECURSOS HUMANOS

Para la gestión y ejecución de las actividades de obra durante este periodo se contó con el apoyo del siguiente personal:

- Ing. Guillermo Villegas
- Arq. Beymar Panameño Angulo
- Profesional en SST Álvaro Tenorio
- Almacenista
- 1 Maestro de obra
- 1 Oficiales
- 2 Ayudantes

Revisión y Verificación de Pago de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscal (EPS, ARL y AFP)

Para el periodo informado contamos (CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC NIT) con las afiliaciones de todo el personal al Sistema General de Riesgos Laborales y los respectivos pagos de las planillas de aportes al sistema Integral de seguridad social, según los dos últimos dígitos del NIT, como lo establece el Art.3.2.2.1 del Decreto 923 de 2017 expedido por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud y Protección Social

REVISION DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Se realizaron tomas de muestras de concreto en obra, las cuales se deben llevar a laboratorio para sus respectivos fallos.

AVANCE DE OBRA

Ejecución del contrato

Porcentaje de Obra Proyectado Grupo 2: 51,46%

Porcentaje de obra Ejecutado: 51,40%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista presenta atrasos en la obra, por causas no imputables a Él como son las condiciones climáticas y problemas de orden público.
- Durante el presente periodo se ha contratado personal del sector donde se ejecuta la obra.
- El contrato de obra presenta un avance del 51.40 %.
- El Contratista presentara para la tercera semana de noviembre de 2024, una tercera acta de cobro de la obra.

Hasta el corte del presente informe, nos disponemos a iniciar las actividades de suministro e instalación de sikagrout para anclajes, instalación de estructura metálica para cubierta de la cancha con su respectivas laminas, realizar las actividades de drenajes de aguas lluvias (cunetas), construcción de muros gaviones, las excavaciones para estas actividades y por último realizar la fundición de la losa de la cancha con sus respectivas obras complementarias.

Atentamente,

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

CONSTRUPACICOL ZOMAC
NIT 901.526.894

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION..... 3
2. OBJETIVOS..... 4
2.1. Objetivos General.....4
2.2. Objetivos Especifico.....4
3. INDUCCIÓN.....5
4. CHARLAS DE SST.....6
4.1. Higiene y seguridad industrial.....6
4.2.Dotación y EPP.....7
5. REGISTRO INSPECCIONES DE A.T – I.T.....8

1, INTRODUCCIÓN

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es una disciplina que se encarga de la prevención de accidentes y enfermedades laborales, así como de la promoción y protección de la salud de los trabajadores mediante un conjunto de actividades, medidas, para preservar la salud y la integridad física y mental de los trabajadores, en todos los aspectos relacionados con su trabajo, mejorando el bienestar laboral y la productividad en las empresas, promoviendo una cultura en seguridad y calidad basado en la mejora continua.

La Seguridad y Salud en el Trabajo es una responsabilidad compartida por los empleadores y los trabajadores. Los empleadores tienen la obligación de garantizar la Seguridad y Salud de sus Trabajadores, adoptando las medidas necesarias para prevenir los accidentes y enfermedades laborales. Los trabajadores, por su parte, tienen la obligación de cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo y de utilizar los equipos de protección personal de manera adecuada.

La Construpacicol Zomac través de su SG-SST, busca disponer de herramientas que asegure un ambiente laboral con factores de riesgo controlados y con ello la disminución de los incidentes y accidentes de trabajo y las enfermedades laborales.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Cumplir con lo propuesto en el plan de trabajo en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo; que garanticen el bienestar de los colaboradores con el fin de contrarrestar los impactos, riesgos y peligros inherentes a las actividades del Contrato de Obra IND-23-5027 **"MEJORAMIENTOA ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOSDE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURAY EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI"**

2.2. Objetivos Específicos

- Ejecutar las actividades planteadas en el plan de trabajo anual del SG-SST, cumpliendo con la normatividad legal vigente.
- Realizar charlas de seguridad de prevención de los peligros y riesgos que se encuentran en las actividades que se desarrollan en obra.
- Entregar elementos de protección personal a los colaboradores y llevar el control de estos.
- Fomentar cultura de autocuidado y mutuo-cuidado en el desarrollo de las actividades promoviendo la prevención de incidentes o accidentes, de trabajo, así como la prevención de los actos o condiciones inseguras

3. INDUCCION DE SST

La vinculación del personal al proyecto, inicio con la inducción y reinducción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se expuso las políticas, reglamentos, obligaciones del empleador y del trabajador, los riesgos a los que pueden estar expuestos y todas las medidas preventivas para evitar incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral. En este espacio se deja claro que la Construpacicol Zomac tiene un gran compromiso con la protección integral del recurso humano.

Los temas tratados en la inducción se mencionan a continuación:

- SGSST: Política SST: (Contextualización de la estructura del SGSST, divulgación y sensibilización de la política y los objetivos de SST.)
- Medicina Preventiva: (Programa EMO, Perfil Sociodemográfico, Morbilidad Sentida, entre otros instrumentos)
- Política de Prevención Antitabaco, Alcohol y Sustancias Psicoactivas: (Divulgación y sensibilización de la política PAASPA)
- Uso clasificación y mantenimiento de elementos de protección personal: (Sensibilización uso adecuado, clasificación, mantenimiento-reposición y medidas disciplinarias de EPP)
- Política Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias: (Divulgación y sensibilización de la política PPRAE)
- Programa de orden y aseo: (Sensibilización y aplicación del programa en los ambientes de trabajo)
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial: (Divulgación y contextualización del reglamento y cumplimiento de este)
- Reporte incidentes-accidentes de trabajo y enfermedad laboral: (Socialización conceptos-reporte de incidentes/accidentes de trabajo y enfermedad laboral)

4. CHARLAS DE SEGURIDAD Y CAPACITACIONES

Las Charlas de Seguridad se realizan al iniciar y en el trascurso de la jornada laboral, donde la finalidad es comunicar y sensibilizar a los colaboradores sobre las normas de seguridad que se encuentran relacionadas en las diferentes políticas y reglamentos de la empresa y de las diferentes acciones que deben tener en cuenta frente al cuidado de su salud. Los temas relacionados en las charlas de seguridad dan a conocer, procedimientos de trabajo seguro, como también situaciones de emergencias que se pueden presentar en las áreas de trabajo y así el personal conozca del paso a paso que se debe seguir ante la ocurrencia de algún evento. A continuación, se relacionan algunos temas de las diferentes charlas de seguridad realizadas diariamente, se adjunta los respectivos soportes.

La importancia de realizar las charlas de seguridad y capacitaciones permite afianzar el compromiso con el Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte de los trabajadores, así como de la empresa; de igual manera el objetivo de las capacitaciones es brindar nuevos conocimientos, los cuales deben ser aplicados por trabajadores en el día a día.

Registro fotográfico

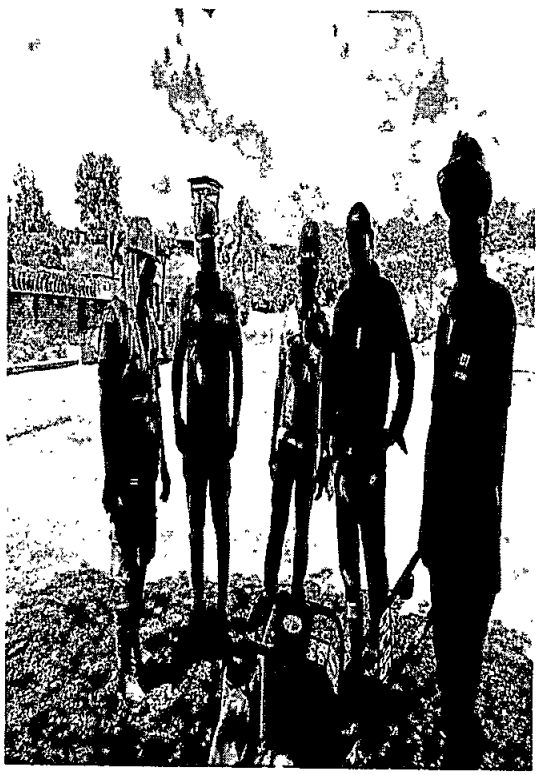

4.1 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Los factores de riesgo son aquellos elementos, situaciones o condiciones que pueden provocar un accidente o una enfermedad laboral. Pueden ser físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o psicosociales.

Para prevenir los accidentes y enfermedades laborales, es necesario identificar los factores de riesgo presentes en el lugar de trabajo y adoptar medidas de control adecuadas. Estas medidas pueden ser:

- Medidas de prevención: dirigidas a eliminar o reducir los factores de riesgo.
- Medidas de protección: dirigidas a proteger a los trabajadores de los factores de riesgo que no se pueden eliminar.

Y para ello se realizan diferentes actividades en busca del bienestar de los trabajadores mientras se encuentren vinculados a la Construpacicol Zomac.

4.2 DOTACION Y ELEMENTO DE PROTECION PERSONA

Durante la ejecución del proyecto se realiza la entrega de elementos de protección personal, de igual manera se evalúa la vida útil de los EPP, puesto que de acuerdo con ello se remplaza por deterioro o daño.

CONSTRUPACICOL ZOMAC
NIT 901.526.894

5.1 REGISTRO DE INSPECCIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y INCIDENTE DE TRABAJO

Se reportan e investigan los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales		CUMPLE			OBSERVACION / EVIDENCIA											
		SI	NO	N/A												
		X														
NOMBRE INDICADOR	DESCRIPCIÓN	MES														
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Frecuencia de accidentalidad	No. de accidentes de trabajo presentados en el periodo / No. De trabajadores en el periodo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%			
Severidad de accidentalidad	No. de días de incapacidad por AT en el mes + No. De días cargados / Número de trabajadores en el mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%			
Prevalencia de la Enfermedad Laboral	No. de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral presentados en el periodo / No. De trabajadores en el periodo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%			
Ausentismo por causa medica	No. de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el periodo / No. De días programados en el periodo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%			

PARA CONSTANCIA SE FIRMA

30/11/2024

ALVARO TENORIO RINCON

SISO ENCARGADO

ENSAYOS DE LABORATORIO

INSPECCIÓN POR ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS A ESTRUCTURA METALICA DEL PROYECTO COLISEO SIMON BOLIVAR BUENAVENTURA

ELABORADO POR: ING. RICHARD GONZALEZ

EMPRESA EJECUTORA:

INSPEST S.A.S

INTEGRIDAD ESTRUCTURAL

CLIENTE: VULCANUS IM SAS

SOLICITADO POR: VULCANUS IM SAS

FECHA: MAYO 21 2024

1. ALCANCE.

Este documento define las actividades técnicas que se están utilizando para el control de calidad de las juntas soldadas de la estructura metálica del proyecto **COLISEO SIMON BOLIVAR BUENAVENTURA**. Para un aseguramiento parcial de las conexiones soldadas **INSPEST S.A.S** realizo ensayos no destructivos a las soldaduras como inspección visual, líquidos penetrantes de acuerdo al código de referencia.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

- AWS D1.1 2020. STRUCTURAL WELDING CODE
- REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 TITULO F
- PLANOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE
- PROCEDIMIENTO DE INSPECCION INSPEST

3. LIQUIDOS PENETRANTES

La inspección por líquidos penetrantes realizados a las soldaduras de la estructura metálica me permite detectar fisuras, poros, falta de fusión y otras imperfecciones que sean abiertas a la superficie que puedan comprometer la resistencia de la estructura. Se utilizó penetrante visible rojo, soluble en agua tipo SKL WP Y revelador SKD – S2 marca MAGNAFLUX.
Los criterios de aceptación y rechazo son basados en el código **AWS D1.1 2020 STRUCTURAL WELDING CODE.**

3.1 PROCEDIMIENTO.

Para realizar la inspección por líquidos penetrantes previamente se realizó una limpieza manual mecánica con grata trenzada sobre las juntas soldadas, con el fin de tener una superficie libre de escoria, pintura, salpicaduras de soldadura entre otros. Posteriormente se limpió la zona de inspección con un trapo húmedo para retirar el exceso de partículas, y enseguida se aplicó el líquido penetrante sobre las juntas soldadas, se dejó actuar durante 10 minutos se removió el exceso de penetrante con un wypall humedecido con agua para poder aplicar el líquido revelador con el fin de inspeccionar el estado de las juntas soldadas.

Se realizo inspección visual y por líquidos penetrantes a las juntas a filete de 4 CERCHAS y 4 VIGAS DE AMARRE, fabricados a partir de tubería estructural, inspeccionando las uniones soldadas de parales y diagonales a cintas inferior y superiores, placas bridas. Durante la inspección no se encontraron indicaciones relevantes que comprometan la integridad estructural.

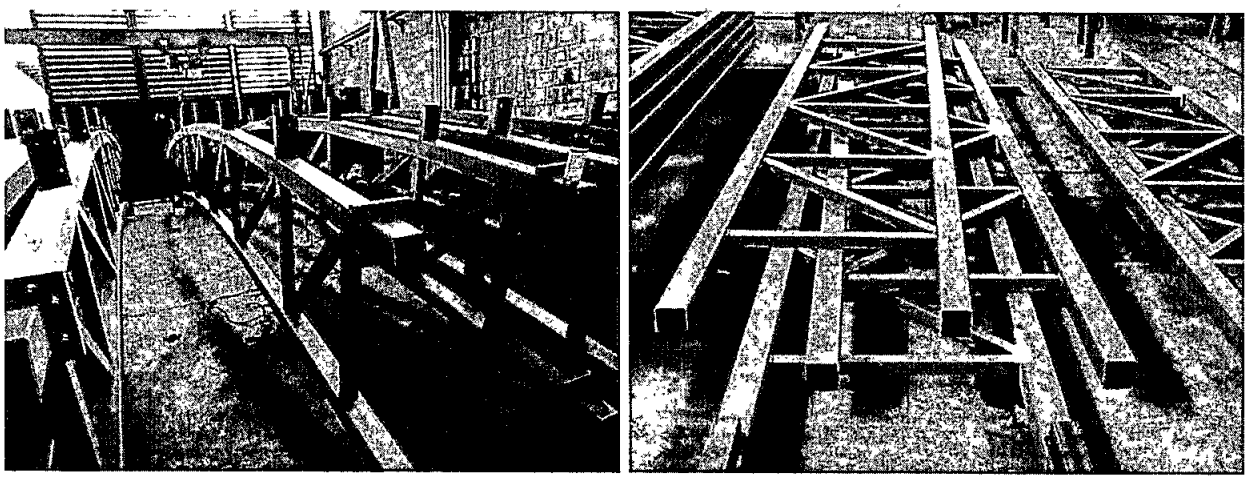

Fotografía 1-2. Fotografía general de elementos inspeccionados

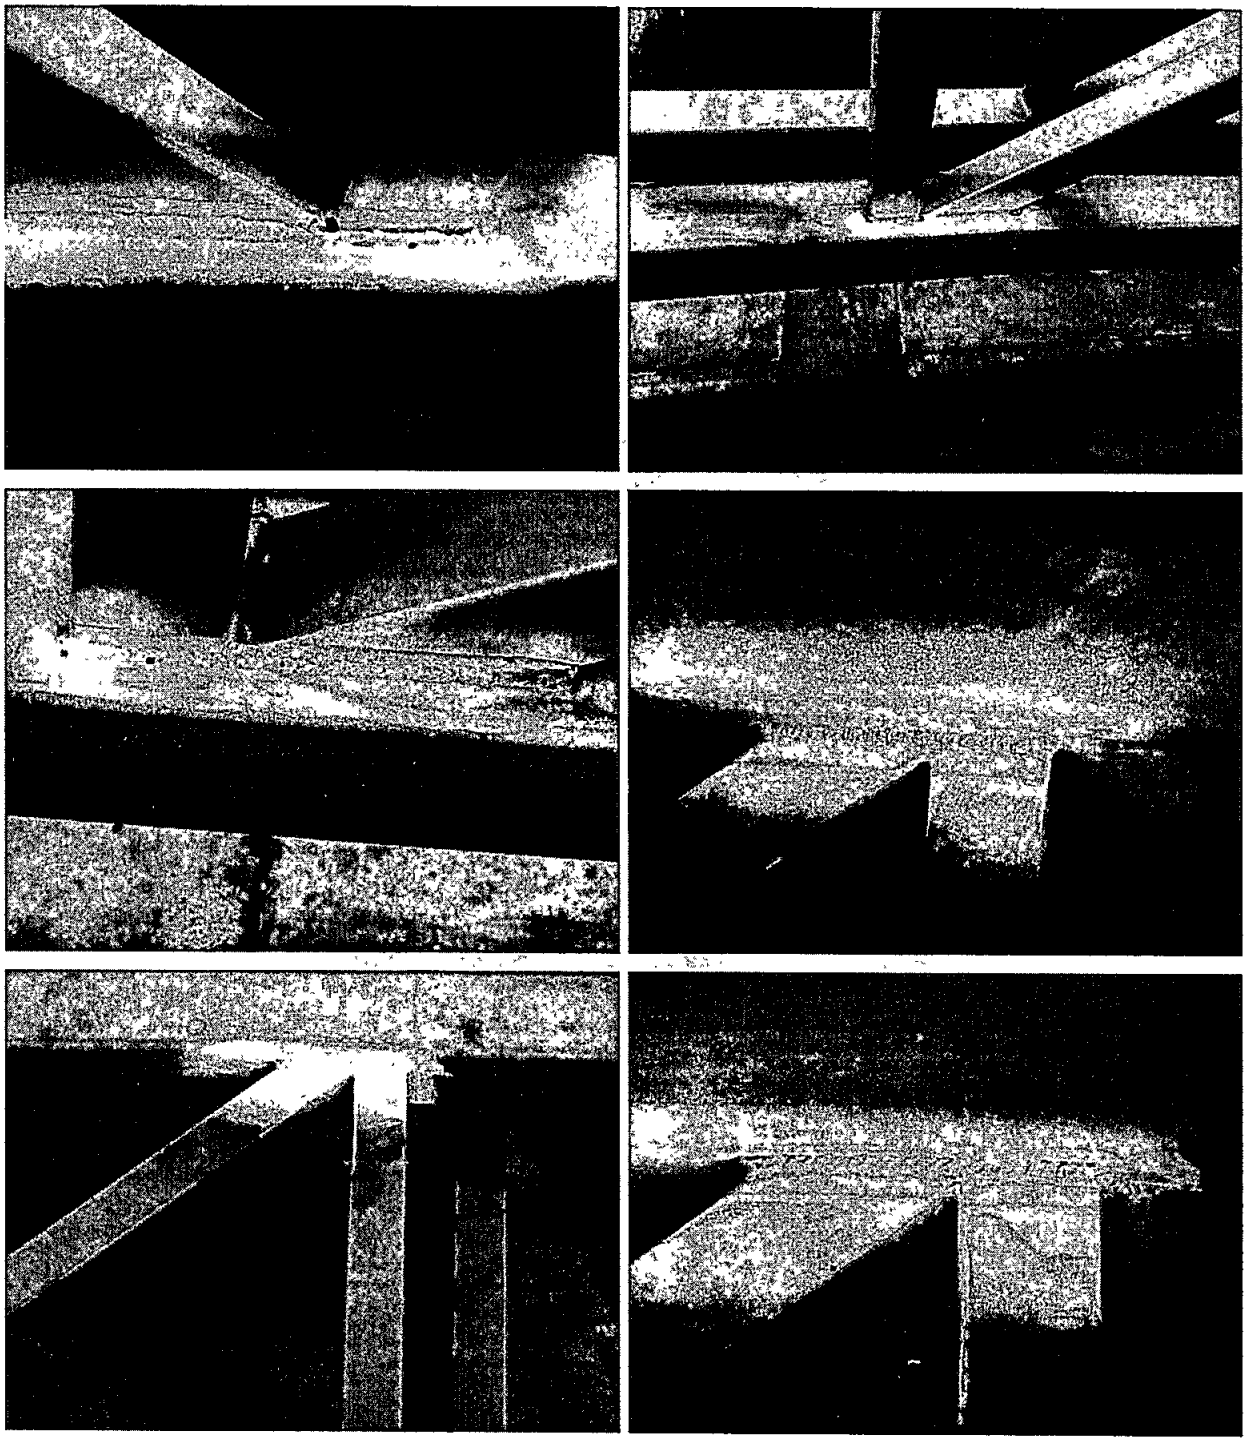

Fotografía 3-8. Inspección por líquidos penetrantes

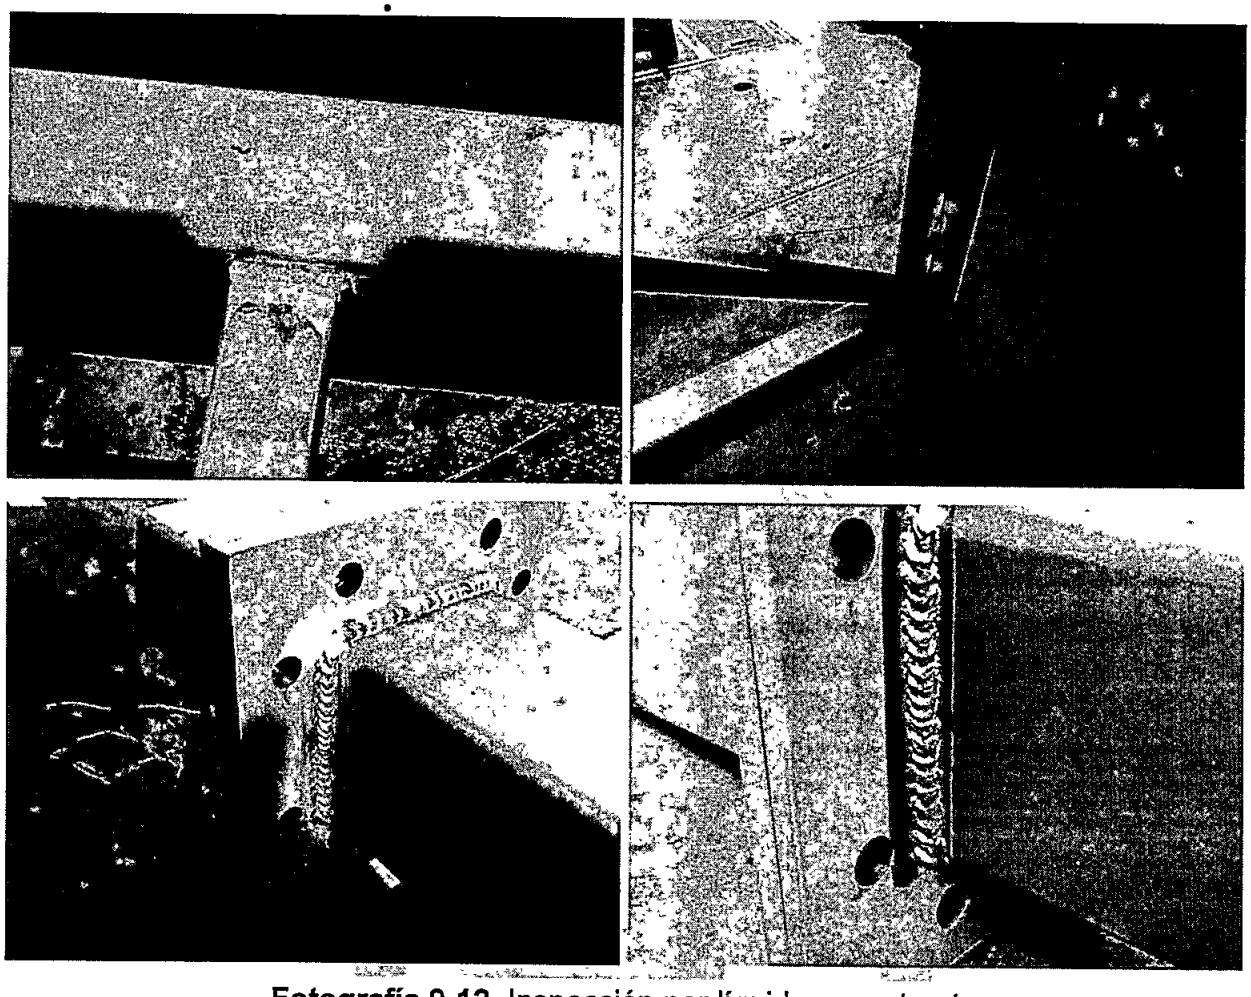

Fotografía 9-12. Inspección por líquidos penetrantes

5 CONCLUSIONES.

Durante la inspección por líquidos penetrantes realizado a los elementos de la estructura metalica no presentan indicaciones relevantes que comprometan su integridad estructural.

.

Cordial saludo,

Richard Gonzalez

RICHARD GONZALEZ RODRIGUEZ
INGENIERO DE MATERIALES
GERENTE TECNICO.
CERTIFICADO PT-II- CN2-030
CERTIFICADO UT-II- CN2-020
MATRICULA PROFESIONAL N° 76820-312332 VLL.

ANEXOS.

- ANEXO A – FT-PT-01

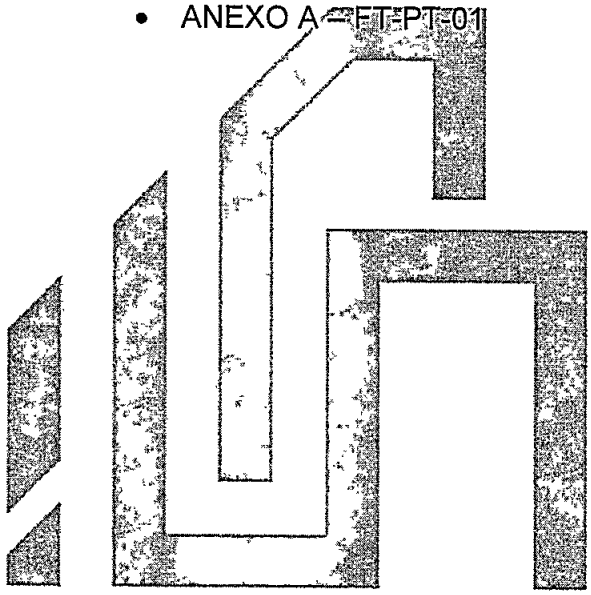

Santiago de Cali, MAYO 21 2024

INSPEST S.A.S — INTEGRIDAD ESTRUCTURAL	**FORMATO DE INSPECION VISUAL Y POR LIQUIDOS PENETRANTES**	FT-PT-01
		VERSION 01
		PAG. 1 DE 1

PROYECTO: COLISEO SIMON BOLIVAR BUENAVENTURA			**CODIGO PROYECTO:**
INFORME N°: INF-24049-INSP	**CIUDAD:** CALI		**FECHA** MAYO 21 2024
CLIENTE: VULCANUS IM SAS	**TIPO DE LIMPIEZA:** GRATA		
TIPO DE PENETRANTE Y REVELADOR: PENETRANTE SKL-WP / REVELADOR SKD-D2. MAGNAFLUX		**TIEMPO DE PENETRANTE Y REVELADO:** 10 min	
ELEMENTO INSPECCIONADO: CERCHAS Y VIGAS			
EQUIPOS Y ACCESORIOS: CAMARA FOTOGRAFICA			
INSPECTOR(S): ING. RICHARD GONZALEZ	**Nº PIEZAS INSPECIONADAS**	**END APLICADOS** 2	**LUGAR DE INSPECCIÓN:** PLANTA
ESPECIFICACIÓN (NORMA O CODIGO): STRUCTURAL WELDIN CODE AWS D1.1 2020			

ITEM	ELEMENTOS INSPECCIONADO	TIPO DE INDICACION/CLASE DE INDICACION	LONGITUD/DIAMETRO	PROFUNDIDAD	INTERPRETACION Y OBSERVACIONES	ESTADO
1	CERCHA 1 NODO 1	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
2	CERCHA 1 NODO 2	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
3	CERCHA 1 NODO 3	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
4	CERCHA 2 NODO 1	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
5	CERCHA 2 NODO 2	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
6	CERCHA 2 NODO 3	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
7	CERCHA 3 NODO 1	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
8	CERCHA 3 NODO 2	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
9	CERCHA 3 NODO 3	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
10	CERCHA 4 NODO 1	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
11	CERCHA 4 NODO 2	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
12	CERCHA 4 NODO 3	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
13	VIGA DE AMARRE 1 NODO 1	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
14	VIGA DE AMARRE 1 NODO 2	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
15	VIGA DE AMARRE 2 NODO 1	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
16	VIGA DE AMARRE 2 NODO 2	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
17	VIGA DE AMARRE 3 NODO 1	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
18	VIGA DE AMARRE 3 NODO 2	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
19	VIGA DE AMARRE 1 NODO 1	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME

CONVENCIONES:

LF : LADO FRENTE
L.SUP: LADO SUPERIOR
L.OP : LADO OPUESTO
CXN: CONEXIÓN
P: PERIMETRAL
INT: INTERIOR
EXT: EXTERIOR

PB: PLACA BASE
PS: PATIN SUPERIOR
PI: PATIN INFERIOR
LF: LADO FRENTE
LD: LADO DERECHO
LI.: LADO IZQUIERDO
J: JUNTA

JF:JUNTA A FILETE
JT:JUNTA A TOPE
JRT: JUNTA RANURA EN T

REP : REPARACION
CONFORME
RECHAZADO
INDICACIÓN NO RELEVANTE

INSPECTOR:	REVISO Y APROBO:	RECIBIO:
Richard Gonzalez NOMBRE: ING. RICHARD GONZALEZ CARGO:INGENIERO		NOMBRE: CARGO:

CONSTRUCTORA LITORAL PACIFICO LTDA

NIT-900517187-3

DENSIDADES CON CONO DE ARENA INV-E
161-2013

SG-032-119
21-07-2015
Versión 0

Obra : CANCHA POLIDEPORTIVO COLEGIO ITI 25-Nov-24

Material: SUB-BASE GRANULAR

CLIENTE: CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC

Ensayo No.		1	2	3	4	5
Localización (abscisa)						
Capa		1	1	1		
Peso frasco más arena Inicial (g)	A	6.582,0	6.556,0	6.492,0		
Peso frasco y arena restante (g)	B	3.846,0	3.612,0	3.540,0		
Peso arena total usada (g)	C = A - B	2.736,0	2.944,0	2.952,0		
Constante cono	D	1.750,0	1.750,0	1.750,0		
Peso arena en hueco (g)	E = C - D	986,0	1.194,0	1.202,0		
Densidad arena (g/cm³)	F	1,436	1,436	1,436		
Volumen del hueco (cm³)	G = E / F	686,6	831,5	837,0		
Peso material extraído húmedo (g)	H	1.720,0	2.026,0	2.004,0		
% Humedad	I	6,1	5,4	5,2		
Peso material extraído seco (g)	J = H / (1+I)	1.621,1	1.922,2	1.904,9		
Densidad material (g/cm³), Di	ρ = J/G	2,361	2,312	2,276		
Densidad máx. laboratorio, De (g/cm³)	$\rho_{Máx}$	2,395	2,395	2,395		
% Humedad óptima Laboratorio		7,60	7,60	7,60		
COMPACTACIÓN TERRENO (%)	N = $\rho/\rho_{Máx}$*100	98,6	96,5	95,0		
COMPACTACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN, M (%		95				
(Di-Dm)²		0,00201	0,00002	0,00163		
Desviación estándar, s	$s = \sqrt{\frac{\sum (D_i - D_m)^2}{n-1}}$	0,043				
Densidad promedio del lote (Dm)		2,316 g/cm³				
Dm - (k * s)		2,287 g/cm³				
Cumplimiento de Dm con respecto a De (Cumple (Dm - (k * s) >= 0,95 De) / No cumple (Dm - (k * s) < 0,95 De)		Cumple				

OBSERVACIÓN: -

Ejecutó	*Revisó*
CARI 1130652198	EDWIN MOSQUERA JEFE DE LABORATORIO

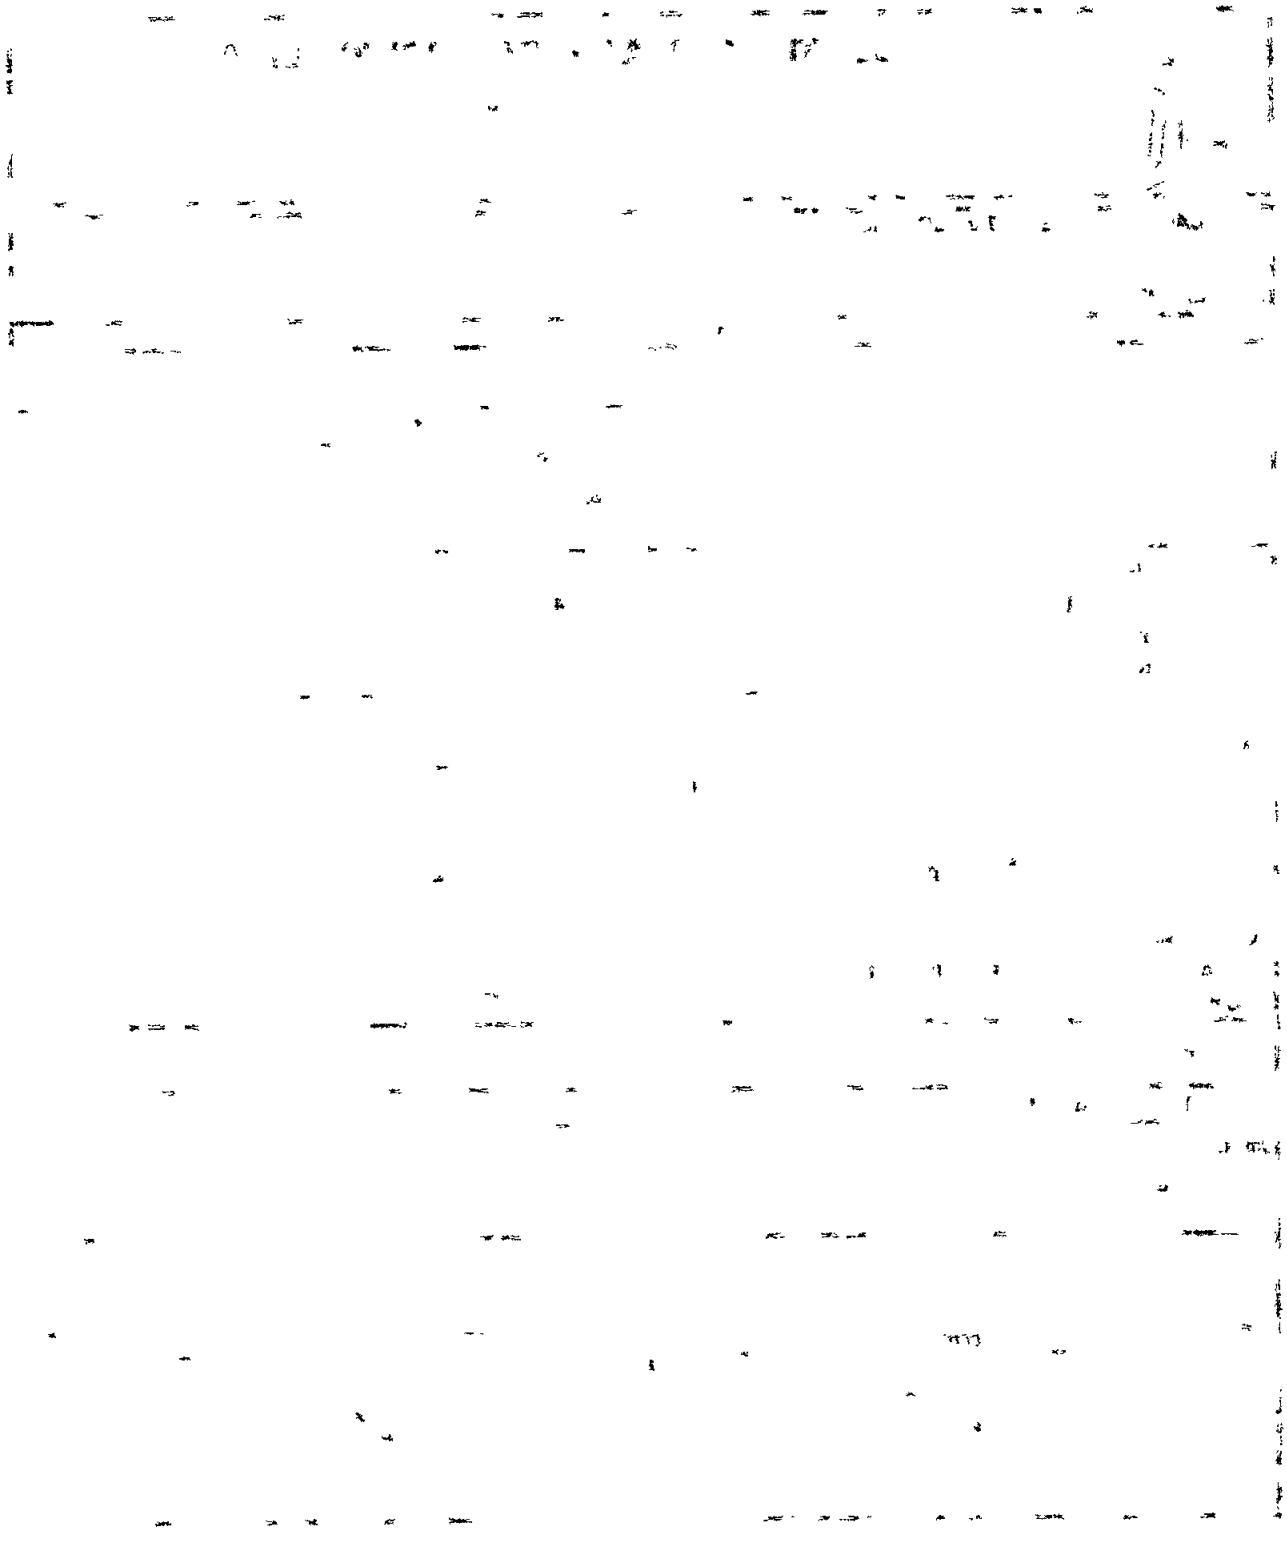

COSTRUCTORA LITORAL PACICO LTDA

NIT-900517187-3

RELACIONES HUMEDAD – PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS

(Ensayos de compactación normal y modificado)

INV E141 Y E142 - 2013

SG-032-119
21-07-2015
Versión 0

Obra	*POLIDEPORTIVO ITI*	*Fecha de muestreo:*	*15-Nov-24*	*Muestra No.:*	*1*
Material	*SUB-BASE GRANULAR*	*Fecha del ensayo:*	*25-Nov-24*	*Código:*	
Fuente:	*RIO DAGUA*			*Método de ensayo:*	*C*
Descripción	*Material granular, no plástica, color habano*				

Clase de ensayo: *Estándar:* *Modificado:* *X* *Tipo de ensayo: con reemplazo (CR) sin reemplazo (SR)* *SR*

PRUEBAS		1	2	3	4
Peso de Muestra Húmeda + Molde (g)	[1]	7995,0	8289,0	8340,0	8236,0
Peso del Molde (g)	[2]	2942,0	2942,0	2942,0	2942,0
Peso de la muestra húmeda (g)	[3] = [1] - [2]	5053,0	5347,0	5398,0	5294,0
Volumen del Molde (cm³)	[V]	2086,7	2086,7	2086,7	2086,7
Peso unitario Húmedo (g/cm³)	P = [3] / V	2,422	2,562	2,587	2,537
Peso de la muestra húmeda + Recipiente (g)	[P1]	220,0	287,0	351,5	455,3
Peso muestra seca + recipiente (g)	[P2]	211,3	272,0	328,6	421,3
Peso del recipiente (g)	[P3]	63,9	63,9	63,2	64,3
Contenido de humedad (%)	W = [(P1-P2) / (P2-P3)]*100	**5,9**	**7,2**	**8,6**	**9,5**
Densidad de Muestra seca, ρ (g/cm³)	P / [1+(W/100)]	**2,287**	**2,390**	**2,381**	**2,316**
Peso unitario Muestra seca, $\gamma_{d\,máx}$ (kN/m³)	$\gamma_{d\,máx}$ = 9,80665 ρ	**22,42**	**23,44**	**23,35**	**22,72**

Densidad máxima seca, $\rho_{d\,máx}$ = **2,395 g/cm³**

Humedad óptima, w_{opt} = **7,6 %**

Peso unitario máximo seco, $\gamma_{d\,máx}$ = **23,49 kN/m³**

% Masa retenida en el tamiz ¾" gradación original P_{FG} = **29,6%**

% Masa que pasa el tamiz ¾" gradación original P_{FE} = **70,4%**

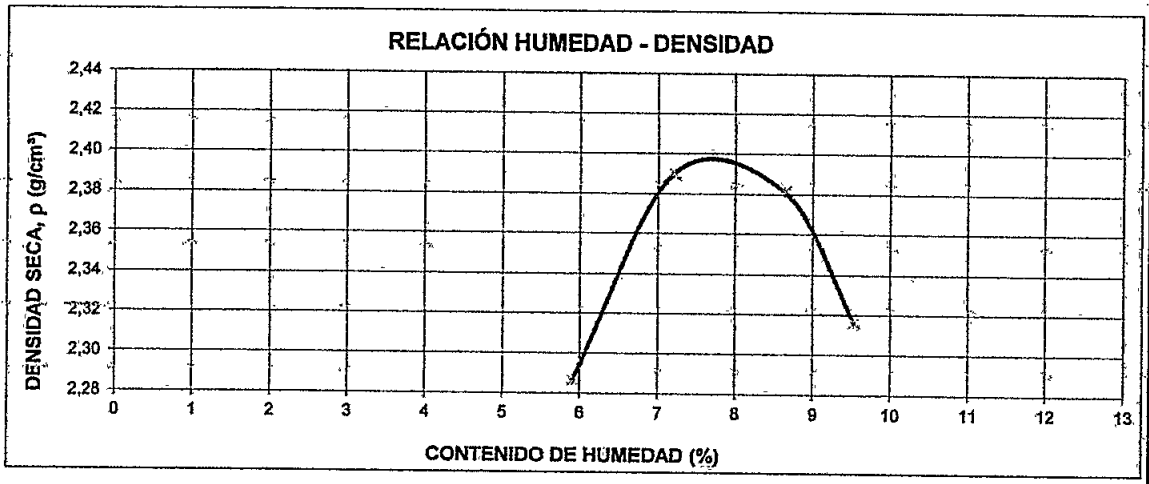

OBSERVACIONES

Ejecutó	*Aprobó*	*Notas*
LABORATORISTA	DIRECTOR DE PLANTAS	*EL RESULTADO OBTENIDO ES DE REFERENCIA PARA, POR EJEMPLO, CÁLCULOS DE PORCENTAJE DE COMPACTACIÓN EN ENSAYOS DE DENSIDAD*

BITACORA DE OBRA

CONTRATO Nº: IND-23-6027

OBJETO DEL CONTRATO: Mejoramiento a escenarios deportivos y recreativos para los municipios de Cartago, El Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el Departamento del Valle del Cauca

CONTRATISTA: CONSTRUPACIFICO SAS ZOMAC

Representante Legal:

Residente de Obra: Arq. Beymar Panamito Angulo

FECHA DE INICIO: 28 de diciembre de 2023

FECHA FINAL: 30 de Junio de 2024

INTERVENTORIA: CONSORCIO GRUPO 3

Representante Legal:

Residente Interventoria

Scanned with CamScanner

Fecha: Martes, 30/01/2024

Detalles de la obra: Se da inicio a la ejecución de las obras con instalación de lona verde (Campamento provisional), realizando a a su vez inspección del lugar de acuerdo, al diagnostico previamente realizado, focalizando el area a intervenir, el proceso de ejecución de las actividades y sobre todo la ruta programada para llevar a cabo la ejecución del proyecto. Todo esto una vez se haga efectiva reunión programada para el día miercoles 31 de enero 2024, e iniciar en forma la ejecución de la obra

Estado del tiempo: Día totalmente soleado

Personal en obra:

Director de obra

Sub-contratista de obra

Residente de obra

Maestro de obra

3 Ayudantes

Almacenista

Residente

Arq: Residente de obra

Residente Interventoría

Fecha: Miercoles, 31/01/2024

Se realizó cerramiento con tela verde en campamento y limpieza del mismo. De igual manera se empezó con el corte, figurado y armado de acero de refuerzo de 3/8" para vigas de cimentación con una longitud de 1,60mts. También se realizó reunión con la comunidad educativa del I.T.S.G.V con el objetivo de socializar el proyecto y conformar el Comité de Veedurías Ciudadanas, pero se aplazó para el día 06 de febrero ya que el personal de interventoría y Indervalle no pudieron asistir por problemas en la vía Cali-Buga (Cierres parciales). Por consiguiente se hizo toma del acta de reunión y se dio formalmente apertura a la obra.

Estado del tiempo: Día totalmente soleado

Personal en obra:
Sub- contratista de obra
Director de obra
Residente de obra
Siso
Maestro
1 Oficial
2 Ayudantes
Almacenista

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

Fecha: Jueves, 01/02/2024
Se continua con el corte, figurado y armado de acero de refuerzo de 3/8" (estribos) para vigas de cimentación con una longitud de 1,60 mts.

Estado del tiempo: Día totalmente soleado.

Personal en obra:
Sub-contratista de obra
Residente de obra
Siso
Maestro
1. Oficial
2. Ayudantes
Almacenista

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

Fecha: Viernes, 02/02/2024
Se continua con el corte, figurado y armado de acero de refuerzo de 3/8" y 5/8 para vigas de cimentación y dados en concreto respectivamente con longitudes de 1,60 mts y 1,25 mts.

Scanned with CamScanner

Estado del tiempo: Día totalmente soleado

Personal en obra:
Sub-contratista de obra
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro
1. Oficial
2. Ayudantes

Arq. Residente de obra ... Residente Interventoría

Fecha: Sabado, 03/02/2024

Se continúa con el corte, figurado y armado de acero de refuerzo de 3/8" y 5/8" para vigas de cimentación y dados en concreto respectivamente con longitudes de 1,60 mts y 1,80 mts. Se realizaron armado de acero de estructura para dados en concreto en total 4 unidades.

Estado del tiempo: Día totalmente soleado

Personal en obra:
Sub-contratista de obra
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
2 Ayudantes

Arq. Residente de obra ... Residente Interventoría

Fecha: Lunes, 05/02/2024

Se continua con el corte, figurado y armado de acero refuerzo de 5/8"

Norma

Scanned with CamScanner

para dados en concretos, se hizo un recorrido con el personal sub-contratista de la parte eléctrica tanto interna como externa de la Institución educativa con el objetivo de definir la red de conexión eléctrica del proyecto. También se realizó las charlas de seguridad y salud en el trabajo.

Estado del tiempo: Día totalmente soleado

Personal en obra:
Sub-contratista de obra
Residente de obra
Sisso
Almacenista
Maestro
1. Oficial
2. Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

Fecha: Martes, 06/02/2024

Se realizó corte, figurado, y amado de acero reforzo para estructuras en concreto con varillas de 3/8" y 3/8". Se realizó Socialización con la comunidad Educativa del Instituto técnico Industrial F.S.V.C., el contratista, sub-contratista de obra, interventoría e inderalle para la conformación de Comité de Veedurías Ciudadanas.

Estado del tiempo: Día totalmente soleado

Personal en obra:
Residente de obra — Maestro
Sisso — 1. Oficial
Almacenista — 2. Ayudantes
Director de obra — Sub-contratista

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

Fecha: Miercoles, 07/02/2024
Se realizó corte y figurado de acero refuerzo para estructuras de concretos, varillas de 5/8" para dados en concreto con una longitud de 1,35 mts. Se realizó localización de puntos para pilotes en concreto y malla contra impacto.

Estado del tiempo: Día totalmente soleado

Personal en obra:
Sub-Contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
2 Ayudantes

Comisión Topografico

Arq. Residente de obra

Residente Interventoria

Fecha: Jueves, 08/02/2024
Se tenía previsto realizar replanteo de puntos para pilotes y malla contra impacto y replanteo de cancha, al igual que localización de puntos para alcantarillado, todo esto en el área de trabajo pero no se pudo realizar por lluvias intensas durante toda la mañana y parte de la tarde, sin embargo, se realizo bajo techo el armado de acero refuerzo para estructuras de dado o zapata en concreto de 4 unidades. Además aún no se ha avalado el giro y desplazamiento de la implantación de la posición nueva de la cancha
Estado del tiempo: Día parcialmente lluvioso

Personal en obra:
Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista

Scanned with CamScanner

Maestro
1 Oficial
2 Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

Fecha: Viernes, 09/02/2024
Se realizó corte, figurado y armado de acero refuerzo para estructura de dado o zapata en concreto (4 unid.) de igual manera se realizó reeplanteo de puntos para pilotes en concreto, malla contra impacto y localización y reeplanteo de cancha múltiple. Se realizó localización de puntos sanitarios (alcantarillado) Por último se realizo demoliciones varias.

Estado del tiempo: Mañana soleada, tarde lluvias intensas
Personal en obra:
Sub-Contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
2 Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

Fecha: Sábado, 10/02/2024
Se realizó corte y figurado de acero refuerzo para estructuras en concreto en varilla de 3/8" (estribos) con longitud de 1,60 mts. Tambien se hizo excavación manual para instalación de tubería para drenajes. Por otro lado se realizó localización de puntos para alcantarillado. Aun no se difine por las partes, Interventoría avalar giro y desplazamiento de la cancha.

Norma

Scanned with CamScanner

Estado del tiempo: Mañana soleada

Personal en obra:
Sub-contratista
Residente de obra
Sisso
Almacenista
Maestro
1. Oficial
2 Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

Fecha: Lunes, 12/02/2024
Se realizó replanteo de puntos para pilotes y malla contra impacto, replanteo de cancha multiple, ademés, de localización de cajas de inspección para drenajes de aguas lluvias. Se realizo excavación manual para cajas de inspección.

Estado del tiempo: Día totalmente soleado.

Personal en obra
Sub-contratista
Residente de obra
Sisso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
3 Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

Fecha: Martes, 13/02/2024
A la fecha se presentan atrazos en la excavación para pilotes, debido

Scanned with CamScanner

a que no hay respuestas por el giro y desplazamiento generado en la cancha
Se realizó replanteo y localización de cajas de inspección para drenajes de aguas lluvias, excavación manual para cajas de inspección y recamara principal. Se hizo corte y figurado de acero refuerzo para estructuras de cimentación en concreto en varillas de 3/8" (estribos) longitud de 1.60 mts

Estado del tiempo Día totalmente soleado.

Personal en obra.
Sub-contratista
Residente de obra.
Siso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
3 Ayudantes

Observaciones

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

Fecha Miercoles, 14/02/2024
Se realizó excavación manual para recama, en la cual se dedico hacer excavacion fuera del area de localizacion de la recama para hallar la tubería existente. También se realizo demolicion de la placa de concreto de la cancha existe y desmonte de tablero de juegos para basquetbol con sus respectivos postes.

Estado del tiempo Día totalmente soleado.

Personal en obra
Sub-contratista
Residente de obra
Siso

Norma

Almacenista
Maestro
1. Oficial
1 Ayudante
2 Operadoras de maquina

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 15/02/2024
Se reinicia la excavación manual para fundición de cajas de inspección. Se espera a que en comité se defina para continuar con la demolición y retiro del material sobrante de la demolición. fundición de solado de cámara.
ESTADO DEL TIEMPO: Día totalmente soleado.

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almaceniata
Maestro
1. Oficial
2. Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

FECHA: Viernes, 16/02/2024
Se reinicia con la demolición de placa de concreto existente y excavación manual para fundición de cajas de inspección y fundición de solado en concreto para cajas de inspección (1).
ESTADO DEL TIEMPO: Día totalmente soleado.
PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra

SISO
Almacenista
Maestro
1. Oficial
3. Ayudantes
2 Operadores de maquina

Arq. Residente de obra

Residente Interventoria

FECHA: Sabado, 17/02/2024
Se inician las labores despues de las 10:00 AM por las intensas lluvias en horas de la mañana, se realizó retiro de material sobrante de la demolicion de placa concreto existente, se continua con la excavacion manual para caja de inspeccion y retiro de material caido en excavacion y fundicion de solado(2).
ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias intensas en la mañana
PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1. Oficial
3 Ayudantes
2 Operarios de maquina

Arq. Residente de obra

Residente Interventoria

FECHA: Lunes, 19/02/2024
A partir de las 10:00 AM se inician las labores en campo por las fuertes, se inicia con excavacion manual para instalacion de tuberia novafer de 10" y 12" para los drenajes, se realizó corte, figurado y armado de estructura de acero refuerzo para pilotes en concreto de 21.5 mts.

Norma

Scanned with CamScanner

16.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias intensas en la mañana, tarde soleada.

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Suso
Almacenista
Maestro
1. Oficial
5. Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

FECHA: Martes, 20/02/2024

Se reinicia con la excavación manual para instalación de tuberías para drenajes, se hizo corte, figurado y armado de estructura de acero refuerzo para pilotes en concreto de 2,5 mts. También se realizó prehuecos y excavación con maquina manual para fundición de pilotes, se realizó fundición de pilotes en concreto (2).

ESTADO DEL TIEMPO: Día totalmente soleado

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Suso
Almacenista
Maestro
1. Oficial
6. Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

FECHA: Miercoles, 21/02/2024

Norma

Scanned with CamScanner

Se continua con la excavacion manual para instalacion de tuberia para drenajes, se realizó corte, figurado y armado de estructura de acero refuerzo para pilotes de malla contra impacto con una longitud de 3 mts con su respectivo gancho, se realizo formaleteria en madera para fundicion de caja de inspeccion de 0,80 x 0,80 mts con su respectiva fundicion

ESTADO DEL TIEMPO: Dia totalmente soleado

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Sig80
Almacenista
Maestro
1. Oficial
6. Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente Interventoria

FECHA: Jueves, 22/02/2024

Se realizo excavacion manual para instalacion de tuberia para drenaje se hizo corte, figurado y armado de estructura de refuerzo para pilotes de la malla contra impacto. Se realizó carpinteria en madera para construccion de formaleta para caja de inspeccion de 1,20 x 1,20 y fundicion de caja de inspeccion de 1,20 x 1,20

ESTADO DEL TIEMPO: Dia parcialmente soleado

PERSONAL EN OBRA:
Sub-Contratista Sig80 Maestro 6. Ayudantes
Residente de obra Almacenista 1. Oficial

Arq. Residente de obra — Residente Interventoria

Norma

Scanned with CamScanner

FECHA: Viernes, 23/02/2024

Se realizo excavación manual para instalación de tubería del drenaje para aguas lluvias, se hizo corte, figurado y armado para la estructura de acero de fuerzo de pilotes para la malla contra impacto; también, se realizo formaleteria (carpintería en madera), para fundición de caja de inspección de 1,00 x 1,00 con una altura de 2,20 mts.

ESTADO DEL TIEMPO: Día soleado

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1. Oficial
6. Ayudantes

Arq. Residente de obra

Residente Interventoría

FECHA: Sábado, 24/02/2024

Se realizó fundición de caja de inspección de 1,00 x 1,00, se hizo replanteo según giro de la implantación para puntos de pilotes de muro y malla contra impacto con su respectiva localización. Se realizó corte, figurado y armado acero refuerzo para estructura de pilotes en concreto de malla contra impacto de 2,5 mts

ESTADO DEL TIEMPO: Día soleado

PERSONAL EN OBRA

Sub-contratista
Residente de obra
SISO

Norma

Scanned with CamScanner

Almacenista
Maestro
1. Oficial
6. Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente interventoría

FECHA: Lunes, 26/02/2024
Se realizo desencofrado de cajas de inspección, excavación a maquina para instalación de tubería novafort de 10" para drenajes de aguas lluvias, relleno con material de rio (gravilla) Instalación de tubería 10,80mts, relleno con arena media y material de sitio. Se realizo retiro de material sobrante.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias intensas en la mañana, tarde soleada.

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista — 1. Operador de maquina
Residente de obra
Sso.
Almacenista
Maestro
1. Oficial
6. Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

FECHA: Martes, 27/02/2024
Se continúa con la excavación a maquina para instalación de drenajes con tuberías de 10", además de la excavación a maquina para nivelación de terreno donde se implantara la cancha, retiro de material sobrante, se realiza el retiro de pilote en concreto de acuerdo a las observaciones realizadas por la interventoría. Se realiza encofrado de formaleta metálica y fundición de camara de inspec.

Norma

Scanned with CamScanner

con un diametro de 1,80 x 1,00 de altura, tambien, se realizó la instalacion de tuberia novafort de 8,40 mL (10") relleno con gravilla y arena media y relleno con material de sitio.

ESTADO DEL TIEMPO: Día soleado

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista — 1. Operador de maquina
Residente de obra
Sobs.
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

FECHA: Miercoles, 28/02/2024

Se realizó excavacion a maquina para instalacion de drenajes con tuberia de 12", además de nivelacion de terreno para implantacion de cancha, desencofrado y encofrado de formaleta metálica para reamara de inspeccion; fundicion de la misma con un diámetro de 1,80 mts x 1,00 altura. Se hizo instalacion de 6,00 mL de tuberia novafort de 12", cantela para cajas de inspeccion, retiro de pilote en concreto, relleno con material de rio y de sitio, asi como retiro de material sobrante en volqueta. Se realizó prehocos para pilotes en concreto de 2,5 mts y excavacion manual para el mismo (4)

ESTADO DEL TIEMPO: Día soleado mañana y tarde

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista — 1. Operador de maquina
Residente de obra
Sobs.
Norma

Scanned with CamScanner

Almacenista
Maestro
1. Oficial
6. Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 29/02/2024
Desencofrado de formaleta metálica y en madera. Encofrado de formaleta metálica para fundición de cámara de inspección, para una altura de 2,50 mts. Se realizó relleno con material de sitio. Fundición de un (1) pilote en concreto de acuerdo a los detalles constructivos para la malla contra impacto, fundición del último cuerpo de la cámara de inspección, se realizo la construcción de canceta para caja de inspección. Toma muestra de concreto

ESTADO DEL TIEMPO: Día soleado mañana y tarde

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Sisa
Almacenista
Maestro
1. Oficial
7. Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

FECHA: Viernes, 01/03/2024
Se realiza la excavación manual para pilotes de la malla contra impacto con una altura promedio de 3,30 mts y fundición de tres (3) pilotes en concreto con su respectivo acero de refuerzo. También se realizo desencofrado de formaleta metálica

Norma

Scanned with CamScanner

de la camara, relleno con material de sitio, demas, corte, figurado y armado acero refuerzo para tapa de camara de inspección.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana con lluvias moderadas, tarde soleado

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro de obra
1. Oficial
7. Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

FECHA: Sábado, 02/03/2024

Se realizo carpintería en madera para formaleta y encofrado de caja de inspección y su respectiva fundición, se realizó corte, figurado y armado de acero refuerzo para tapa de camara de inspección, excavación manual de terreno para pilotes de la malla contra impacto, por último se hizo relleno con material de sitio.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista — Maestro
Residente de obra — 1. Oficial
SISO — 7. Ayudantes
Almacenista

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

FECHA: Lunes, 04/03/2024

Se realizó excavación manual para fundición de zapatas y viga de cimiento para malla contra impacto, también se realizó excavación manual para pilotes en concreto de la malla contra impacto. Se hizo corte, figurado y armado de estructura de acero refuerzo para tapa de camara inspección, por consiguiente se realizo encofrado con formaleta metálica y fundición de la tapa. Se realizo fundición de pilotes en concreto (2) y toma de la muestra de concreto en cilindro para su respectivos fallos.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6. Ayudantes

Arq. Residente obra — Residente Interventoría

FECHA: Martes, 05/03/2024.

Se realizo corte, figurado y armado de estructuras de acero de refuerzo para pilotes en concreto de 2,5 mts correspondientes a los dos retirados; para zapatas y columnetas en concretos de la malla contra impacto y pilotes en concreto de 7 mts. Se realizó fundición de los dos (2) ultimos pilotes en concreto de 2,5 mts. Se continuo con la excavación manual para zapatas y viga de la malla contra impacto, solado de zapatas por ultimo desencofrado de formaleta de la tapa para la camara de inspección.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada.

Norma

Scanned with CamScanner

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Arq Residente de obra — Residente Interventoría

FECHA: Miercoles, 06/03/2024
Se continua con armado de estructura de acero refuerzo para columnetas de la malla contra impacto, formaleteria para encofrado de zapatas y fundición de las mismas; cabe recordar que en horas de la tarde a partir de las 2pm se produjeron lluvias intensas hasta las 4pm impidiendo la realización de actividades en campo

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada, tarde lluviosa

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro
1. Oficial
7. Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 07/03/2024
Se realizó corte y figurado de acero refuerzo para viga de

Scanned with CamScanner

cimiento de la malla contra impacto, se realizo relleno con materia de rio y solado para zapa de la malla contra impacto del lado 2 además, de relleno con material de sitio y rio para fundición de la viga de cimiento del lado 1, también se hizo vaciado de solado sobre este ultimo lado. Se realizó formaleteria y encofrado de zapatas del lado 2 para luego realizar fundición de la misma Se realizó relleno con material de sitio, ya por último se hizo corte, Alejado y armado de estructura de refuerzo para pilotes en concreto de 7mts Hay también se generaron lluvias intensas en la tarde a partir de las 2:pm hasta las 4pm impidiendo asi, continuar con labores en campo.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada, tarde lluviosa

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Sisso
Almacenista
Maestro
1. Oficial
7. Ayudantes

Arq. Residente de obra

Residente Interventoria

FECHA: Viernes, 08/03/2024
Se realizó visita por parte del contratista de la parte metálica correspondiente a la cubierta de la cancha, en la cual se deja constancia que el señor Angelo Marín toro de la empresa Volcanus se compromete el viernes 15 del mes en curso traer las platinas de guias y bastones, asi mismo el interventor de Volcanus Wilmar Alberto Marin Toro

C.C 1.253.583

Norma

Scanned with CamScanner

Se realizó armado de estructura acero refuerzo de viga cimentacion y colocación de la misma para la malla contra impacto, formaleteria y fundición de la misma. Se continuó con el corte, figurado y armada estructura acero refuerzo para pilotes en concreto de 7 mts.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada, tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-Contratista

Residente de obra

Siso

Almacenista

Maestro

1. Oficial

7. Ayudantes

Arq. Residente obra — Residente de Interventoria

FECHA: Sábado, 09/03/2024

Se continua con el corte, figurado para estructura de acero refuerzo de pilotes en concreto de 7 mts. Se realiza desencofrado de la viga de cimentacion. Se realizó replanteo de los puntos para fundicion de pilotes de 7 mts por parte de la comision topográfica.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-Contratista — Almacenista — 7. Ayudantes

Residente de obra — Maestro

Siso — 1 Oficial

Arq. Residente Obra — Residente Interventoria

Norma

Scanned with CamScanner

FECHA: Lunes, 11/03/2024

Se continua con el corte, figurado y armado de estructuras de acero refuerzo para pilotes en concreto de 7mts, además, se realizó corte y figurado de acero refuerzo para viga cimentación 2 de la malla contra impacto.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista
Residente de obra
Jiso
Almacenista
Maestro
1. Oficial
7 Ayudantes

Arq. Residente obra — Residente Interventoría

FECHA: Martes, 12/03/2024

Se inicio la jornada con armado y colocación de estructura de acero refuerzo para viga de cimentación 2 de la malla contra impacto formaleteria, encofrado, posteriormente fundición de la misma. La interventoría realizo visita de campo en la obra. Se continúe con el corte, figurado y armado de estructura acero refuerzo de pilotes en concreto de 7mts.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-Contratista — Jiso — Maestro — Ayudantes
Residente de obra — Almacenista — 1. Oficial

Arq. Residente obra — Residente Interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

FECHA: Miercoles, 13/03/2024
Se realiza desencofrado de formaleta de viga cimentacion de la malla contra impacto, se inicia la excavacion a mano para instalacion de tuberia sanitaria de filtro, de igual manera se realizó corte y figurado acero refuerzo para estructura de pilotes en concreto de 7mts.

ESTADO DEL TIEMPO: Tarde y mañana soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1. Oficial
7. Ayudantes

Arq. Residente Obra | Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 14/03/2024
Se continua con la excavacion manual para filtro, se continúa con el corte, figurado y armado de estructura de acero refuerzo para pilotes en concreto de 7mts. También se realizo por medio de la comisión topografica, ubicacion de los ejes para fundicion de pilotes en concreto de 7mts. y de los otros elementos estructurales de la cimentacion; como vigas y zapatas, ademas, de los pedestales. Se realizó corte y figurado acero refuerzo para pedestal como lo son los estribos

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de Obra

Norma

Scanned with CamScanner

3180
Almacenista
Maestro
1 Oficial
7 Ayudantes

Arq. Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Viernes, 15/03/2024

Se realizó excavación manual para instalación de tubería sanitaria 12" para drenajes, de igual manera se inicia con la excavación manual para construcción de caja de inspección de 0,60 x 0,60 y se continúa con la excavación manual para filtro. La empresa Volcanos trae a la obra las guías por ende el personal en obra procede en la descarga y almacenaje de las platinas de guías.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleado

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
3180
Almacenista
Maestro
1. Oficial
7. Ayudantes

Arq. Residente obra

Residente Interventoría

FECHA: Sábado, 16/03/2024

Se continúa con la excavación manual para caja de inspección de 0,60 x 0,60 y construcción de filtro. Se continua con el corte y figurado de acero refuerza para estructura de pilote en concreto 7mts

Norma

Scanned with CamScanner

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1. Oficial
7. Ayudantes

Arq. Residente Obra | Residente Interventoría

FECHA: Lunes, 18/03/2024
Se continúa con la excavación manual para instalación de tubería pvc 12" en la parte exterior que conecta con la cuneta se hace perforación de cámara de inspección para conexión de tubería a cuneta, también se hace demolición de cuneta, se realizó relleno con material de rio en excavación, instalación de 6,80 ml tubería pvc 12", relleno con material de sitio y sellado de cámara en la perforación. Por último se culminó con la excavación manual para caja de inspección y filtro.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
8 Ayudantes

Arq. Residente Obra | Residente Interventoría

Scanned with CamScanner

FECHA: Martes, 19/03/2024

Llega a la obra la máquina para perforación de suelos. Se inician las actividades en campo después de las 10:00 AM por las lluvias intensas. Se realizó relleno con material de sitio sobre el area de la camara y tuberia. Se continua con el flegue y corte de los estribos para pedestales en concreto, se termin la construcción de batea de la camara, Se realizó relleno con material de río en tubería que conecta de caja a camara de inspección y se continúa con corte, figurado y armado d estructura acero refuerzo para pilotes en concreto de 7mts.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana lloviosa, tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista

Residente de obra

Siso

Almacenista

Maestro

1 Oficial

8 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Miercoles, 20/03/2024

Se continua con el corte figurado y armado de estructura acero refuerzo para pilotes en concreto de 7mts, se realizó encofrado para fundición del area de la cuneta demolida, fundición del area y parte de la losa sobre la zona. También se realizó instalación de tela para filtro, tubería y relleno con material de rio (triturado). Se hizo pruebe

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada.

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista

Norma

Scanned with CamScanner

Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
8 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 21/03/2024
Se inicia la jornada con limpieza de cuneta, de igual manera se empieza con la excavación a máquina, se realiza la fundición de solado para caja de inspección de 0,60 x 0,60 posteriormente se realiza fundición de la caja. Continúa con la armada de estructura de acero refuerzo para pilotes de 7m en concreto

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista — Operador de máquinas
Residente de obra — 1 Ayudante de operador
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
12 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Viernes, 22/03/2024
Se realizó desencofrado de caja de inspección, se continua con la excavación a máquina para fundición de pilote en concreto el cual, se logró excavar 7,10 mts desde el nivel ± 0,0

Norma

Scanned with CamScanner

Posteriormente se realizó fundición de pilote en concreto, A-1 con su respectiva colocación del acero refuerzo con una longitud de 6mts el cuerpo y 1,65 mts entre traslapo y el cuerpo que sobresale en la zapata con su respectivo gancho. Se hizo toma de la muestra concreto

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista — Operador de máquina
Residente de obra — 1 Ayudante de operador
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
12 Ayudantes

Arq/Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Sábado, 23/08/2024

Se continua con la excavación a máquina para fundición de pilote de 7mts, se realizó excavación manual para zapatas y vigas de cimentación, se hizo solado para zapata. Se realizó corte figurado y armado de estructura de acero refuerzo de pedestal, asi mismo colocación y armado de parilla para zapata. Posteriormente se realizó fundición de zapatas del eje A-1. Se continua con corte y figurado de acero refuerzo para pilote de 7mts

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista — SISO — Maestro — 12 Ayudantes
Residente Obra — Almacenista — 1 Oficial — Operador + 2 Ay

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

FECHA: Lunes, 25/03/2024

Se continua con la excavación a máquina de los ejes E-1 el cual se logra excavar 7,30 mts desde el nivel ±0,00 del proyecto, luego se procede con la colocación de la estructura de acero refuerzo y posteriormente fundición del pilote. Para este pilote la estructura acero refuerzo tiene una longitud en su cuerpo de 6mts y 1,05 mts entre traslapo y cuerpo que se embebe en la zapata con su respectivo gancho. Se continua con la excavación a máquina en los ejes D-1. Posteriormente se realiza fundición del mismo con una profundidad de 7,20 mts.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista	Operador de máquina
Residente de obra	2 Ayudantes operador
Jefe	
Almacenista	
Maestro	
1 Oficial	
10 Ayudantes	

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Martes, 26/03/2024

Se continua con la excavación manual en zapata y vigas de cimentación, se realiza relleno con material de rio y fundición de solado en zapa de los ejes E-1. Se continua con la excavación a máquina de los pilote con ejes C-1, el cual se logró bajar en la excavación 7,30 mts desde el nivel ±000 del proyecto, luego se procede con la colocación de la estructura de acero refuerzo y posteriormente fundición del mismo. Por último se realizó relleno con material de rio en vigas y fundición de solado de cimentación. en el mismo.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

Norma

Scanned with CamScanner

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista — Operador de máquinas
Residente de obra — 2 Ayudantes de operador
Siso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
10 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Miercoles, 27/03/2024

Se continúa con la excavación a máquina para fundición de pilote entre los ejes B-1 y excavación manual para zapatas y vigas de cimentación para posteriormente fundición del solado de este último, por ultimo se continua con el corte, figurado y armado de estructura de acero refuerzo de pilote en concreto y fundición del pilote con una profundidad de 7,40 mts del nivel ±0

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada, tarde con lluvias moderadas

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista — Operador de máquina
Residente de obra — 2 Ayudantes de operador
Siso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
10 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 28/03/2024

Actividades religiosas de Semana Santa.

Norma

Scanned with CamScanner

FECHA: Viernes, 29/08/2024
Actividades religiosas de Semana Santa.

FECHA: Sábado, 30/03/2024
Actividades religiosas de Semana Santa.

FECHA: Lunes, 01/04/2024
Se continúa con el corte, figurado y armado en sitio del acero refuerzo del pedestal, de igual manera colocación del acero de zapatas, además, se realizó excavación manual para zapata. Se inicia excavación en para pilotes en los ejes F-2

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada.

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista — Operador de máquina
Residente de obra — 2 Ayudantes operador
Siso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
10 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Martes, 02/04/2024
Se continua con el armado en sitio del acero refuerzo para zapatas y pedestal en concreto en los ejes B-1 y C-1. De igual manera se continua con la excavación a maquina del pilote entre los ejes F-2, el cual bajo 7,00 mts desde el nivel ±0,00 del proyecto, se procede a colocar su respectivo acero de refuerzo para posteriormente realizar fundición del mismo. Se inicia excavación a máquina para pilotes en ejes E-2

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada.

Norma

Scanned with CamScanner

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista — Operador de máquinas
Residente de obra — 2 Ayudantes operador
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
10 Ayudantes.

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Miercoles, 03/04/2024

Se realiza corte, figurado y armado de estructura acero refuerzo para pilote en concreto de 7mts. Se continúa con la excavación a máquina en los ejes E-2 el cual llega a una profundidad de 7,00 mts desde el nivel ±0,00 del proyecto, se hace la respectiva colocación del acero reforzado y posteriormente fundición del mismo. Se inicia excavación a máquina de pilote entre los ejes A-2.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde Soleado

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista — Operador de maquinas
Residente de Obra — 2 Ayudantes operador
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
10 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 04/04/2024

Norma

Scanned with CamScanner

Se continúa con la excavación a máquina del pilote entre los ejes A-2 el cual bajó 7,20 mts con respeto al nivel ±0,0 del proyecto; por consiguiente, se procede a la colocación de la estructura acero refuerzo posteriormente fundición del pilote en concreto. Se realizo corte y figurado acero de refuerzo para pedestal en concreto, de igual manera para pilote en concreto de 7mts (estribos). Se inicia excavación a máquina para pilote entre los ejes B-2.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista
Residente de obra
Sisso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
10 Ayudantes
Operador de máquina
2 Ayudantes operador

Ing/Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Viernes, 05/04/2024

Se continua con la excavación a máquina para el pilote entre los ejes B-2 el cual bajó a una profundidad de 7,30 mts desde el nivel ±0,00 del proyecto, posteriormente se procede a la colocación del acero de refuerzo del pilote y por último fundición del mismo. De igual manera se realizó la excavación para el pilote entre los ejes C-2 con una profundidad de 7,10 mts desde la cota de nivel ±0,00 del proyecto también se procede con la colocación de la estructura acero refuerzo y fundición de este. Se realizó corte, figurado y armado estructura acero refuerzo para el pilote anterior. Por ultimo se realiza fundición de las zapatas entre los ejes B-1 y C-1

Norma

Scanned with CamScanner

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
10 Ayudantes
Operador de máquina
2 Ayudantes operador

Arq. Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Sábado, 06/04/2024

Se inicia excavación a máquina para pilote entre los ejes D-2, el cual tiene una profundidad de 7,10 mts desde el nivel ± 0,00 del proyecto, una vez llegado a este nivel se procede con la colocación de la estructura de acero reforzado en la excavación para luego realizar fundición del pilote en concreto.
También se realizó excavación a mano para zapas en concreto entre los ejes A-2 y B-2 de acuerdo a los planos, por último se hizo corte, figurado y armado de acero refuerzo para estructura de acero del pilote fundido y el restante.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de Obra
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
10 Ayudantes
Operador de máquina
2 Ayudantes operador

Arq. Residente Obra

Residente Interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

FECHA: Domingo, 07/04/2024

Se realiza corte y figurado del acero restante de la última estructura y por último armado de la parte pendiente de esta. Se realizó excavación a máquina del pilote restante entre los ejes E-1, el cual tiene una profundidad de 7mts a partir del nivel ±0,00 del proyecto, se procede a la colocación de la estructura acero refuerzo en la excavación para luego realizar fundición del pilote.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana, soleada, tarde con lluvias moderadas

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista	Operador de máquinas
Residente de obra	2 Ayudantes operador
Sisa	
Almacenista	
Maestro	
1 Oficial	
7 Ayudantes	

Ing. Residente Obra / Residente Interventoría

FECHA: Lunes, 08/04/2024

Se realizo relleno con material de sitio y se realizó corte y figurado de acero para pedestales en concreto. Hoy se trabajo media jornada debido a que el personal presento molestias por el desgaste de los trabajos en la semana.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista	
Residente de obra	
Sisa	

Norma

Scanned with CamScanner

Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Martes, 09/04/2024
Se realizó evacuación de aguas lluvias en las (zapatas) excavación y posteriormente iniciar con la colocación del acero de zapata, de la misma manera con el acero refuerzo de los pedestales entre los ejes D-1 y E-1 en sitio. Por otro lado se hizo la excavación a mano para las zapatas entre los ejes C-2, D-2 y E-2.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Sábado, 11/05/2024
Se reinician las labores en obra con desagüe en excavaciones para fundición de zapatas, se realizo armado y colocación de doble parilla en zapatas de los ejes 1-D y 1-E respectivamente. También se realizo corte de acero refuerzo para doble parilla.

Norma

Scanned with CamScanner

ESTADO DEL TIEMPO: Día totalmente soleado

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Sisa
Almacenista
Maestro
1 Oficial
3 Ayudantes

Arq. Residente obra — Residente Interventoría

FECHA: Martes, 14/05/2024

Se continúa con las actividades de corte, colocación y armado de doble parilla en los ejes V-D y 1-E respectivamente, se realizó fundición de zapata entre los ejes 1-D. Se presentaron precipitaciones durante todo el día impidiendo realizar con normalidad las actividades, razón por la cual, tocó evacuar el agua de la excavación varias veces.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde con lluvias parciales

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de Obra
Sisa
Almacenista
Maestro
1 Oficial
4 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

FECHA: Miercoles, 15/05/2024

Debido a las precipitaciones durante la noche, tocó nuevamente evacuar el agua almacenada en la excavación para fundición de las zapatas del eje 1-E. Se realizó fundición de solado para la zapata entre los ejes 1-F, ademas, se hizo la fundición de zapata entre los ejes 1-E. También se hizo corte, figurado y armado acero refuerzo para pedestal en concreto.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada - Tarde Soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro.
1 Oficial
4 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 16/05/2024

Se realizó corte, figurado de acero refuerzo para pedestales en concreto, también se realizó excavación manual para fundición de Viga cimentación. Se presentaron lluvias intensas a partir de 2:30 p.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada - Tarde lluviosas

PERSONAL EN OBRA:
Sub-Contratista — Almacenista — 4 Ayudantes
Residente de obra — Maestro
SISO — 1 Oficial

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

FECHA: Viernes, 17/05/2024

Se continua con la excavacion manual para fundicion de Vigas de amentacion, se realizó corte, figurado y armado estructura de acero refuerzo para pedestal en concreto, ademas, de figurado de estribos.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
5 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Sabado, 18/05/2024

Se realizó excavación manual para fundicion de Viga cimentacion, se continúa con el corte, figura. acero refuerzo (estribos para pedestales en concreto. Se realizó evacuacion de agua en las excavaciones debido a las fuertes precipitaciones de lluvias la noche anterior.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista — Almacenista — 5 Ayudantes
Residente de Obra — Maestro
Siso — 1 Oficial

Arq. Residente Obra — Residente Interventoria

Norma

Scanned with CamScanner

FECHA: Lunes, 20/05/2024

Se realizó evacuación de aguas lluvias de las excavaciones, se hizo fundición de solado cimentación para zapatas y viga cimentación, se realizó colocación y ubicación de estructura acero. refuerco para pedestales en concreto. Se hizo excavación manual para fundición de viga cimentación.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada — Tarde lluviosa

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
5 Ayudantes

Arq. Residente Obra

Residente Interventoria

FECHA: Martes, 21/05/2024

Se hizo evacuación de aguas lluvias de las excavaciones, se continua con armado de estructura para pedestal en concreto en sitio, se continua con excavación manual para fundicion de viga cimentación, se realizó formaleteria en madera para fundicion de zapata y encofrado. Se realizó fundición de zapata en concreto entre los ejes 2-A. y fundición de solado para zapata

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de Obra
SISO
Almacenista

Norma

Scanned with CamScanner

Maestro
1 Oficial
6. Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Miercoles, 22/05/2024.
Se continúa con la excavación manual para viga cimentación, colocación y ubicación de estructuras acero refuerzo para pedestales. También se realizó corte, figurado de acero refuerzo para pedestales en concreto. fundicion solado para viga cimentacion

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada - tarde lluviosa

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6. Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 23/05/2024
Se iniciaron las labores en campo a partir de las 10:00 AM debido a las fuertes precipitaciones de lluvias con evacuacion de estas en excavaciones. Se realizó corte y figurado de acero refuerzo para pedestales en concreto, se realizó armado de estructura de acero para pedestales en campamento y colocación de la doble parrilla ~~para~~ fundicion de pedestales entre los ejes 1-F y 2-F.

Norma

Scanned with CamScanner

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana lluviosa - tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Sisso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Arq. Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Viernes, 24/05/2024

Se inician las labores con colocación de parillas, pero antes se realizó evacuación de las aguas lluvias en excavaciones y limpieza de las mismas, para posteriormente realizar colocación y ubicación de estructura acero refuerzo para pedestales en concreto con sus respectivos ganchos, una vez realizado esto se realiza el vaciado de concreto en las zapatas entre los ejes 2-B, 2-C, 2-D y 2-E, por último se realiza fundación de soladas para viga.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-Contratista
Residente de obra
Sisso
Almacenista
Maestro
1. Oficial
6 Ayudantes

Arq Residente Obra

Residente Interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

FECHA: Sábado, 25/05/2024
Se inician las labores con evacuación de las aguas lluvias, limpieza de solado de las vigas de cimentación; se realizo recebo con material de sitio, fundición de solado cimentación excavación manual para viga cimentación por ultimo se hizo desencofrado de zapatas fundidas.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes.

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Lunes, 27/05/2024
Se inician las labores con evacuación de las aguas lluvias limpieza de las areas a trabajar y se procede con el armado de acero refuerzo de la viga, colocación y ubicación de la misma para fundición de la viga cimentación, se realizo fundición de solado cimentación para viga

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro

Norma

Scanned with CamScanner

1 Oficial
6 Ayudantes

Arq/Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Martes, 28/05/2024

Se continua con armado en sitio de la estructura de acero refuerzo para la viga cimentación, se continua con el corte y figurado de acero para viga cimentación. Iniciamos con colocación y ubicación a eje y nivelación de estructura acero (Platina) de la guía para montaje de la estructura de cubierta.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Arq/Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Miercoles, 29/05/2024

Se iniciaron las labores en campo a partir de las 10:00 AM debido a las fuertes lluvias, se realizó corte y figurado de acero refuerzo para viga cimentacion se realizó drenaje de las aguas lluvias se continua con la instalación de la guía de la platina con su respectiva nivelacion y a eje.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana lluviosa y tarde soleada

Norma

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 30/05/2024
Se realizó fundición de solado cimentación para viga, se continua con la ubicación y colocación de la guía de la platina tanto a eje como nivel. Se realizó visita de la entidad contratante, de la interventoría y el contratista en la obra y del personal sub-contratista de la estructura de la cubierta, además, se reunieron con la comunidad del instituto técnico. Con respecto de la obra se definió que la empresa volcano encargada de la estructura de cubierta metálica debe corregir la guía de la platina para que calce correctamente en la estructura de acero del pedestal. Se continua con amarre de la viga cimentación

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

Scanned with CamScanner

FECHA: Viernes, 31/05/2024

Se continúa con el armado de la estructura de acero refuerzo de la viga cimentación para su respectiva fundición. Se realizó figurado de acero refuerzo para estructura de la viga.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista

Residente de obra

Sisso

Almacenista

Maestro

1 Oficial

6 Ayudantes

Arq. Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Sábado, 01/06/2024

Se continúa con el armado de la estructura acero refuerzo para la viga cimentación.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada

PERSONAL EN OBRA

Sub-contratista

Residente de obra

Sisso.

Almacenista

Maestro

1 Oficial

6 Ayudantes

Arq. Residente Obra

Residente Interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

FECHA: Lunes, 03/06/2024
No se realizaron trabajos en la obra debido a que el día es festivo.

Ing/Residente Obra | Residente Interventoría

FECHA: Martes, 04/06/2024
Debido a las fuertes precipitaciones durante todo el día no se pudo realizar actividades en la obra.

Ing/Residente Obra | Residente Interventoría

FECHA: Miercoles, 05/06/2024
Se reinician las labores con drenaje de aguas lluvias debido a las precipitaciones de la noche anterior, luego se procede con el armado de la estructura de acero refuerzo para fundición de la viga cimentación dandole finalidad a esta actividad

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada - tarde nublada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
1 Sisa
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Ing/Residente Obra | Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 06/06/2024
Se inician las labores de carpintería en madera para posterior

Norma

Scanned with CamScanner

mente empezar con encofrado de viga cimentacion.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada.

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de Obra
Sso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Arq/ Residente Obra

Residente/ Interventoría

FECHA: Viernes, 07/06/2024

Se inician las labores en campo con drenaje o evacuacion de l aguas lluvias por las precipitaciones de la noche anterior y limpie. de lodo en excavaciones, para posteriormente continuar con encofra de la viga cimentacion con formaleta metálica y en madera, adem se realizo formaleta en madera.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Sso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Arq/ Residente Obra

Residente Interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

FECHA: Sábado, 08/06/2024

Se inician las labores con drenaje de aguas lluvias de las precipitaciones caídas la noche anterior, posteriormente se continua con la carpintería en madera, se realizó ensanchamiento de la excavación para la viga cimenta y procedor con encofrado de la misma en la viga 1.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana nublado

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista
Residente de obra
Jefe
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

FECHA: Lunes, 10/06/2024

No se realizaron trabajos en la obra debido a que el día es festivo.

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Martes, 11/06/2024

Se continuan las labores de carpintería en madera, encofrado en formaleta metálica y en madera para fundición de viga cimentación y pedestales en concreto.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Norma

Scanned with CamScanner

Sub- Contratista
Residente Obra
Siso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Arq. Residente Obra

Residente Interventoria

FECHA: Miercoles, 12/06/2024
Se realizo toma de muestra del terreno para estudio de suelos por parte de la interventoria, se inicio con ubicacion y nivelacion de la guia de la plastina

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleda

PERSONAL EN OBRA:
Sub-Contratista
Residente Obra
Siso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudante

Arq. Residente Obra

Residente Interventoria

FECHA Jueves, 13/06/2024
Se continúa con colocacion, ubicacion y nivelacion de la guia de la plastina

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada.

Norma

Scanned with CamScanner

PERSONAL EN OBRA
Sub-contratista
Residente de Obra
Sisa
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Ing Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Viernes, 14/06/2024
Se realizó fundicion de vigas y pedestales de los ejes 1 y 2. Se realizó toma la muestra de concreto. Se suspende parcialmente la obra

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA
Sub-contratista
Residente de obra
Sisa
Almacenista
Maestro
1 Oficial
8 Ayudantes

Ing Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA Viernes, 28/06/2024
Se reinicio la obra con desencofrado de vigas y pedestales en concreto, se realizó relleno con material de sitio

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

Norma

Scanned with CamScanner

PERSONAL EN OBRA
Sub-contratista
Residente de obra
Sisso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Arq Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Sábado, 24/08/2024
Se realizó levantamiento topografico para niveles de corte de terreno (excavaciones, para base y sub-base).

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde nublada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Sisso
Almacenista
Maestro
1 Ayudante
Comisión topografica (Topografo + Cadenero)

Arq Residente

Residente Interventoría

Se suspende parcialmente la obra.

FECHA Martes, 15/10/2024
Reiniciamos nuevamente la obra con la comisión topografica para excavación de terreno y posteriormente relleno de la base y sub-base
Se inicia la excavación de terreno a maquina y retiro de material

Norma

Scanned with CamScanner

sobrante a máquina (Volqueta)

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada, tarde lluviosa

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista	Operador de Retroexcavadora
Residente de obra	Operadores de Volquetas
SISO	
Almacenista	
1 Oficial	
1 Ayudante	
Topógrafo + Cadenero	

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Miércoles, 16/10/2024

Continuamos con excavación a máquina, demolición restante de cancha existente y retiro de material sobrante. Comisión topográfica.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada y tarde lluviosa

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista	Operador de Retroexcavado
Residente de obra	Operadores de Volquetas
SISO	
Almacenista	
1 Oficial	
1 Ayudante	
Topógrafo + Cadenero	

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

FECHA: Jueves, 17/10/2024

Se continua con la excavación a maquina y retiro de material sobrante en volqueta. Comisión topografica

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana nublada, tarde lluviosa

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista	Operador de Retro
Residente de Obra	Operadores de Volquetas
SISO	
Almacenista	
1 Oficial	
1 Ayudante	
Topógrafo + Cadenero	

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Viernes, 18/10/2024

Continuamos con excavación a maquina y retiro de materia sobrante en volquetas. Comisión topografica

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde con lluvias moderadas

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista	Operador de Retro
Residente de Obra	Operadores de Volquetas
SISO	
Almacenista	
1 Oficial	
1 Ayudante	
Topógrafo + cadenero	

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

FECHA: Sábado, 19/10/2024

Continuamos con la excavación de terreno a máquina y retiro de material sobrante. Culminamos con estas actividades y se iniciará el día de mañana con la instalación de geo-celdas

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista	Operador de Retro
Residente de obra	Operadores de Volquetas
Sisso	
Almacenista	
Maestro	
1 Oficial	
1 Ayudante	
Topografo + Cadenero	

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Lunes, 21/10/2024

Iniciamos con la instalación de geoceldas para estabilidad del terreno y relleno con material de rio (base) para conformación de terreno

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista	Operador de mini cargador (bobcat)
Residente de obra	
Sisso	
Almacenista	
Maestro	
1 Oficial	
1 Ayudante	
Norma	

Scanned with CamScanner

Arq/Residente Obra Residente Interventoría

FECHA: Martes, 22/10/2024.

Continuamos con la instalación de geoceldas y relleno con material de rio para base.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada.

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
1 Ayudante
Operador de minicargador (Cbocat)

Arq. Residente Obra Residente Interventoría

Scanned with CamScanner

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACION SISTEMA DE GESTIÓN ACTA DE REUNION No.	CODIGO	FO-220-011
		VERSIÓN	2
		APROBADO	18/12/2018

OBJETIVO REUNION

Comité de seguimiento al contrato de interventoría IND-23-4484 y su contrato de obra derivado IND-23-5027.

Fecha: 17-01-2025

Lugar: Inderualle.

Hora inicio: 10:00 am Hora final: 12:00 pm.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	EMAIL	FIRMA
Oscar Cardenas	Director Interventoria	oscarycholanda.com	
Guillermo Villegas	Construpacific	guivigo3@Hotmail.com	
Juan Carlos Rueda	Supervisor Contrato 4484	argangell@hotmail.com	

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN **ACTA DE REUNION No.**	CODIGO	FO-220-011
		VERSIÓN	2
		APROBADO	18/12/2018

ORDEN DEL DIA
1. Revisión de reprogramación
2. Revisión de seguridad social.
3. Ensayos de concreto.

La reunión es presidida por: Juan Carlos Rueda.

DESARROLLO

1.- Durante el desarrollo del comité, se solicita al contratista de obra presentar la reprogramación del contrato, teniendo en cuenta que se han presentado tiempos muertos por los festividades Decembrinas. Se espera con esta reprogramación ajustar los tiempos reales para el control y seguimiento.

2. El interventor solicita la entrega de las planillas de seguridad social para la respectiva revisión. El contratista de obra se compromete a entregar las planillas el día lunes 20 de enero de 2025.

3. El interventor informa en comité que el contratista terminó la construcción de la loza de concreto, y solicita en comité al contratista la entrega de los ensayos de concreto. El contratista se compromete a realizar la entrega el día 21 de Enero de 2025.

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN **ACTA DE REUNION No.**	CODIGO	FO-220-011
		VERSIÓN	2
		APROBADO	18/12/2018

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN ACTA DE REUNION No.	CODIGO	FO-220-011
		VERSIÓN	2
		APROBADO	18/12/2018

OBJETIVO REUNION

Comité de seguimiento al contrato de interventoría IND-23-4989 y su contrato de obra derivado Ind-23-5027.

Fecha: 04-02-2025.

Lugar: Indervalle.

Hora inicio: 10:30 am Hora final: 12:00 pm

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	EMAIL	FIRMA
Alvaro José Bozuto	Apoyo a la supervisión	Alvarobozuto0289.	
Isabela Gutierrez	Apoyo a la supervisión	-	
Oscar Cardenas	Interventoria	foscar@hotmail.a	
Guillermo Villegas	contratista	guv.603@hotmail.c	

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN ACTA DE REUNION No.	CODIGO	FO-220-011
		VERSIÓN	2
		APROBADO	18/12/2018

ORDEN DEL DIA
1. Revisión del cronograma de avance - reprogramación
2. Verificación de ensayos de concreto.
3.
La reunión es presidida por: _____

DESARROLLO
1.- El contratista de obra realizó la entrega del cronograma con la respectiva reprogramación, donde se evidencia una reducción del atraso de obra. Sin embargo, no se ha dado inicio a la actividad de izaje e instalación de la estructura metálica.
La interventoria se compromete a revisar el cronograma entregado y realizar las observaciones del caso.

2. El interventor socializa el resultados de los ensayos realizados al concreto que corresponde a la placa polideportiva fundida desde Diciembre. El interventor socializa que se debe de demoler algunos tramos de la placa, los cuales no cumplen con la resistencia requerida. Para lo cual el contratista manifiesta que va a realizar el arreglo por calidad, sin embargo, contemple realizar una contrapropuesta para mayor claridad.

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN ACTA DE REUNION No.	CODIGO	FO-220-011
		VERSIÓN	2
		APROBADO	18/12/2018

3. La supervisión del contrato de interventoria exhorta al interventor y al contratista para aunar esfuerzos que permitan generar un plan de acción que mitigue el atraso en las actividades de obra. y permitan culminar la obra en el plazo contractual.
Se recuerda al contratista que el atraso en el cronograma de obra. es causal de la apertura de procesos sancionatorios y de la imposición de multas.

Finalmente se plantea realizar una nueva reunión de seguimiento dentro de los proximos ocho días calendario.

Consecutivo de Autorización No. 1014 del 19/02/2025

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE JURÍDICA DEL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA "INDERVALLE" EMITE CONCEPTO DE LEGALIDAD PARA LA SUSCRIPCION DE OTROSI No. 3 AL CONTRATO DE OBRA No. IND-23-5027.

La Subgerencia de Infraestructura Deportiva remitió para la revisión de la Oficina Asesora de Jurídica de INDERVALLE, los documentos requeridos para la celebración de OTROSÍ No. 3 al Contrato de Obra Nro. IND-23-5027, celebrado entre EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA – INDERVALLE y CONSTRUPACICOL S.A.S ZOMAC, identificado con Nit. No. 901.526.894-4 representado legalmente por la señora BRENDA LIZETH MURILLO BARCO identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1.006.166.501.

En virtud de lo anterior, mediante la presente comunicación procedemos a informar el resultado de la revisión jurídica realizada al proceso mencionado, la cual, se realizó conforme a las disposiciones vigentes en materia de contratación estatal y especialmente lo preceptuado por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas modificatorias, la cual, se concreta en los siguientes términos:

DOCUMENTO REQUERIDO	OBSERVACIONES/DESCRIPCIÓN
Autorización para la celebración del OTROSÍ suscrita por Gerencia de INDERVALLE.	Concepto Favorable No. 006 expedido 11 días del mes de febrero de 2025.
Solicitud y justificación técnica de la modificación suscrita por el supervisor.	No reposa el documento.
Objeto.	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Plazo del contrato	09 de mayo de 2025.
Valor del contrato	Mil ochocientos sesenta y siete millones ochocientos noventa y nueve mil setecientos noventa y cinco pesos m/cte ($1.867.899.795)
Supervisión o interventoría.	La supervisión del presente contrato está a cargo de Juan Carlos Rueda Ángel.
Minuta de modificación.	Cumple.
Fundamento Jurídico.	Los numerales 1 y 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 1.993 titulado "De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual", señala que, para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato podrán Interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas e introducir modificaciones a lo contratado. Que en concepto 1439 de 18 de Julio de 2002 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se menciona: "...Roberto Dromi. Derecho Administrativo. Edición 5a, pág. 348. "El principio de mutabilidad de los contratos administrativos es una consecuencia impuesta por finalidades del interés público, dado que con ellos se tiende a lograr una más eficiente realización de La "justicia distributiva (...) las modificaciones en el contrato pueden traducirse tanto en aumento (MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA) como en una disminución (reducciones) de las prestaciones". "...De lo anterior resulta claro que es un deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los

	trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación; es un imperativo de su gestión, al cual no puede sustraerse so pena de incurrir en responsabilidad por omisión, pues iría en contra de lo previsto en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993..."
OBSERVACIONES	CUMPLE

En cumplimiento de las facultades otorgadas por la Gerencia General a las subgerencias mediante la Resolución IND-SG-734 del 23 de agosto de 2024, la cual derogó la Resolución IND-SG-1006 del 06 de septiembre de 2021 y modificó la Resolución IND-SG-0082 del 01 de febrero de 2024 que aclara la Resolución IND-SG-0071 del 31 de enero de 2024, es de exclusiva responsabilidad del (a) subgerente adelantar el proceso precontractual y poscontractual de conformidad con las normas que regulan la contratación estatal, los principios de transparencia, economía, responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 21 de la ley 1150 de 2007.

No obstante, lo anterior es responsabilidad de la Subgerencia, que la justificación de modificación cuente con los soportes de índole técnico y financiero requeridos, comprometiendo la responsabilidad del supervisor del contrato y subgerente del área quienes intervienen en el proceso.

El presente concepto se circunscribe al análisis jurídico de los documentos presentados. Los aspectos técnicos, así como los términos de ejecución contractual y cumplimiento de las normas presupuestales de disciplina fiscal contenidas en el Decreto 111 de 1996, la Ley 617 de 2000; son responsabilidad exclusiva del área delegada, como también, el análisis del término del plazo para la correcta ejecución y cumplimiento del contrato, la supervisión de la ejecución contractual.

En consecuencia, y de la revisión jurídica realizada se encuentra que los documentos SE ajustan a los requisitos exigidos para la suscripción del OTROSÍ, por lo tanto, se procede a IMPARTIR CONCEPTO DE LEGALIDAD FAVORABLE para la presente contratación.

Atentamente,

Camila Orozco González.
Jefe Oficina Asesora de Jurídica.
INDERVALLE.

Proyecto: Jeniffer Londoño. Profesional Universitario.
Revisó: Gabriela Gómez Montenegro. Contratista.
Revisó: Luz Stella Díaz Vélez – Profesional Universitario.
Aprobó: Sandra Patricia Ospina Valencia– Secretaria General.

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **OTROSÍ No. 3 DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. IND-23-5027 SUSCRITO ENTRE INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA (INDERVALLE) Y CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC**	CÓDIGO VERSIÓN APROBADO	PA-FO-240-001 4 14/AGO/2023

Otrosí No. 3 del contrato de Obra No. IND-23-5027

ANA MILENA OROZCO CAÑAS, mayor de edad, domiciliada en Santiago de Cali, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.974.731, quien obra en nombre y representación del INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE, a través del Decreto No. 1-17-0002 del 01 de Enero de 2024 y Acta de posesión No. 0022 de fecha 01 de Enero de 2024, con facultad para la ordenación del gasto, de conformidad con lo establecido en la Resolución IND SG No. 071 del 31 de enero de 2024, aclarada mediante la Resolución IND SG- 82 del 01 de febrero de 2024, la cual fue modificada por medio de la Resolución IND-SG 734 del 23 de agosto de 2024. Establecimiento Público del Orden Departamental creado mediante Ordenanza 022 del 26 de noviembre de 1997, con NIT. 805.012.896-4, en su calidad de Gerente, cumpliendo con el literal d) del artículo 16 de la Ordenanza 022 del 26 de noviembre de 1997 y el literal j) del artículo 18 de los Estatutos Internos de INDERVALLE, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y el Acuerdo 007 de diciembre 4 del 2024, expedido por la Junta Directiva del Instituto, quien en adelante y para los efectos del mismo, se denominará EL CONTRATANTE, y por la otra, BRENDA LIZETH MURILLO BARCO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.006.166.501 expedida en Cali, representante legal de CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC, identificado con el Nit No. 901.526.894-4, quien se denominará El CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el presente OTROSÍ No. 03 DE MODIFICACIÓN al contrato de obra No. IND-23-5027, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

1. Que, con ocasión de la viabilización, priorización y aprobación del proyecto de inversión identificado con BPIN 2022003760006, denominado "MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión Región Pacífico (OCAD), en sesión del 21 de abril de 2023, soportada en acta No. 19 de la misma fecha, se designó como ejecutor al INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA (en adelante, INDERVALLE).

2. Que, INDERVALLE elaboró los estudios previos, análisis del sector, matriz de riesgos, proyecto de pliego de condiciones, y demás documentación precontractual, surtiendo las etapas de publicación, con el objeto de adelantar el proceso de contratación, mediante la modalidad de selección de licitación pública No. IND-23-ID-07-4469.

3. Que, mediante la Resolución IND-SG-1339 del 28 de septiembre de 2023, la entidad aperturó el proceso de contratación, mediante la modalidad de selección de licitación pública No. IND-23-ID-07-4469, cuyo objeto corresponde a: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES". GRUPO 1: FRENTE 1. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACIÓN LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE: 2. ADECUACIÓN CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1. FRENTE 3. ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

4. Que mediante Resolución 1518 del 10 de noviembre de 2023, la entidad adjudicó el contrato de obra cuyo objeto fue: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2, FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA."

5. Que, el día veintidós (22) de diciembre de 2023, INDERVALLE después de adelantar el Proceso de Contratación No. IND-23-ID-07-4469, suscribió el contrato de Obra No. IND-23-5027, con CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC, cuyo Objeto es: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL

VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2, FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA."

6. Que, se firmó acta de inicio del contrato de Obra No. IND-23-5027, el 28 de diciembre del año 2023, con un plazo inicial de 6 meses, es decir hasta el 30 de junio de 2024.

7. Que, a continuación, se relacionan las suspensiones y reinicios contractuales acaecidos en el mismo:

NÚMERO Y FECHA	PERIODO	FECHA DE REANUDACIÓN	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
Acta de suspensión No. 1 del 14 de junio de 2024	Desde 14/06/2024 Hasta 21/07/2024	22/07/2024	08/08/2024
Acta de ampliación No. 1 de la suspensión No. 1 del 22 de julio de 2024	Desde 22/07/2024 Hasta 22/08/2024	23/08/2024	08/09/2024
Acta de reanudación No. 1 del 23 de agosto de 2024	No aplica	No aplica	08/09/2024
Acta de suspensión No. 2 del 26 de agosto de 2024	Desde 26/08/2024 Hasta 26/09/2024	27/09/2024	10/10/2024
Acta de ampliación No. 1 de la suspensión No. 2 del 27 de septiembre de 2024	Desde 27/09/2024 Hasta 14/10/2024	15/10/2024	28/10/2024
Acta de reanudación No. 2 del 15 de octubre de 2024	No aplica	No aplica	28/10/2024
Acta de Suspensión N° 3 del 23 de octubre de 2024	Desde 23/10/2024 Hasta 4/11/2024	5/11/2024	10/11/2024

8. Que, en virtud de la solicitud efectuada el 26 de diciembre de 2023, por el contratista de obra, que fue avalada el 28 de diciembre de 2023, por el arquitecto Nicolas Triana Castillo, en su calidad de supervisor del contrato de interventoría No. IND-23-4484, se procedió a la elaboración del otrosí número uno (1) al contrato de obra No. IND-23-5027, a través del cual se modificó la cláusula octava del contrato que hace referencia a la FORMA DE PAGO, el cual fue aprobado en la plataforma el 25 de enero de 2024.

9. Que, más adelante, para garantizar la correcta ejecución del contrato de obra, se suscribió otrosí número dos (2) a través del cual se adicionó la suma de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($441.098.753),** y amplió el término de ejecución por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, es decir hasta el 9 de mayo de 2025.

10. Que, en consecuencia, la cláusula séptima del contrato de obra quedó estipulada de la siguiente manera:

"CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL "Certificados de disponibilidad presupuestal del Sistema General de Regalías No. 1023 del 25 de julio de 2023, por valor de CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($4.053.381.399), de los cuales para el presente contrato se comprometen MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.426.801.042), certificados de disponibilidad del Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca No. 6246 del 31 de octubre de 2024, por valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE M/CTE ($396.739.850)" y certificado de disponibilidad No. 924 del 31 de octubre de 2024 por valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($44.358.903), expedido por el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías".

11. Que, por otra parte, surgió la necesidad de efectuar una actualización de documentos presupuestales por concepto de cierre de bienio fiscal 2023-2024 y apertura de bienio fiscal 2025-2026, por lo cual el Manual de Usuario Cierre de Vigencia Presupuestal Ejecutores de Proyectos, creado el 28 de diciembre de 2018 por el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias, que tiene como fin explicar la funcionalidad del cierre de vigencia presupuestal para ejecutores de proyectos de inversión, y con ello permitir la continuidad de la ejecución de proyectos de inversión, señala que:

"(...) Para aquellos recursos que han sido gestionados en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias SGR con pago a destinatario final, el Sistema es calculado por valor de disponibilidad inicial a partir de los saldos

de la gestión; para aquellos casos en que se hayan gestionado con giro a cuenta maestra, el Sistema calcula los saldos por girar con cargo a dicho proyecto dado que la educación real está en el ámbito de la entidad respectiva.

3. PRE CIERRE DE VIGENCIA PRESUPUESTAL

Proceso realizado por la Administración del SPGR de Oficio o por solicitud de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Se consolida la información del Presupuesto, Recaudo y Giro de la Vigencia que se cierra para los Recursos de Administración del SGR (Fiscalización, Monitoreo y Funcionamiento).

Adicionalmente, para los recursos de fondos, se calcula el valor pendiente por ejecutar, para los proyectos en ejecución.

4. CIERRE DE VIGENCIA PRESUPUESTAL

Proceso realizado por cada uno de los Ejecutores de Proyectos, en el que deberán adjuntar el acto administrativo de incorporación al presupuesto de los valores por ejecutar de los proyectos de inversión que se continúan ejecutando para la nueva vigencia (...)".

12. Que, de conformidad con lo anterior, INDERVALLE emitió la Resolución IND-SG 1143 del 31 de diciembre de 2024, por medio de la cual *"SE DECRETA EL CIERRE FISCAL DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS POR EL BIENIO 2023-2024, EJECUTADOS POR EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE"*, y a su vez, se informa el estado y ejecución de los proyectos aprobados por el Departamento del Valle del Cauca, y para los cuales se ha sido designado como entidad ejecutora al Instituto.

13. Que, posteriormente, INDERVALLE emitió la Resolución IND-SG-0039 del 29 de enero de 2025, mediante la cual *"SE INCORPORAN LOS SALDOS INICIALES DE LOS PROYECTOS DESIGNADOS COMO EJECUTOR PARA EL BIENIO 2025-2026 AL PRESUPUESTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS DEL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA "INDERVALLE"*, y además, se ordena efectuar la incorporación en el presupuesto de ingresos y gastos, las cuentas correspondientes al presupuesto general de regalias para el bienio fiscal 2025-2026, por la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($5.814.423.252), de acuerdo a la fuente de financiación y la asignación de cada proyecto.

14. Que, de acuerdo con la resolución citada en el numeral anterior, el saldo a incorporar al proyecto "MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", identificado con BPIN 2022003760006, es por valor de MIL SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($1.007.961.735).

15. Que, de acuerdo con la resolución citada en el numeral anterior, es necesario actualizar los certificados de disponibilidad presupuestal emitido por el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR) para el presente proyecto el cuál corresponde al BPIN 2022003760006.

16. Que, en ese marco, el SPGR expidió los certificados de disponibilidad presupuestal Nos. 225 del 30 de enero de 2025, por valor de SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($771.521.282,00), Y 525 del 30 de enero de 2025, por valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($44.358.903).

17. Que la Interventoría, CONSORCIO GRUPO 3 mediante Oficio CG3-002-2025 del 07 de febrero de 2025, recomendó la suscripción de Otrosí número tres (3) a través del cuál se efectúe la actualización de CDP por cambio de vigencia.

18. Que el Supervisor del contrato de Interventoría, arquitecto Juan Carlos Rueda Ángel, mediante Oficio OFICIO 500.13.1.231.2025 recomendó la suscripción de Otrosí número tres (3) al contrato de Obra IND-23-5027, a través del cuál se efectúe la actualización de CDP por cambio de vigencia.

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	CÓDIGO	PA-FO-240-001
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	4
	OTROSÍ No. 3 DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. IND-23-5027 SUSCRITO ENTRE INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA (INDERVALLE) Y CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC	APROBADO	14/AGO/2023

19. Que, finalmente, la modificación solicitada se hace necesaria para seguir garantizando el eficaz desarrollo y el cumplimiento del contrato, fines, metas y objetivos trazados desde el plan estratégico del Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca, y el Departamento del Valle del Cauca, a través de los principios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia de la función administrativa.

20. Que, mediante oficio con consecutivo No. 500-13-5-234/2025 del 10 de febrero de 2025, el señor Nicolas Triana Castillo, en su calidad de Subgerente de Infraestructura Deportiva, solicitó aval de legalidad a la Secretaría General y autorización de modificación de contrato a la Gerencia, para la suscripción del otrosí No. 3 de modificación al contrato de obra No. IND-23-5027.

21. Que, en atención a la solicitud efectuada por el Subgerente de Infraestructura Deportiva, y con el fin de obrar dentro del trámite de la referencia, la Secretaria General profirió aval de legalidad del 10 de febrero de 2025.

22. Que, debido a lo anterior, la Gerencia emitió autorización de modificación de contrato, a través de oficio con consecutivo de autorización No. 6 del del 11 de febrero de 2025.

23. Que, finalmente, la modificación solicitada se hace necesaria para seguir garantizando el eficaz desarrollo y el cumplimiento del contrato, fines, metas y objetivos trazados desde el plan estratégico del Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca, y el Departamento del Valle del Cauca, a través de los principios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia de la función administrativa.

24. Que, en virtud de lo anterior, se reconoce la importancia de atender esta solicitud, por lo cual se motiva la suscripción del otrosí No. 3, modificándose la siguiente cláusula: **CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, y en armonía con lo estipulado en la siguiente normatividad y jurisprudencia:

- *Que la contratación estatal busca satisfacer los fines estatales, de acuerdo con lo consignado en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, el cual refiere que "los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines".*

- *Que los numerales 1 y 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, señalan que "para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato (...) podrán (...) interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas e introducir modificaciones a lo contratado".*

- *Que la Ley 80 de 1993, en su artículo 40, establece que "las partes podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran para el cumplimiento de los fines estatales".*

- *Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado menciona:*

  "(...) Roberto Dromi. Derecho Administrativo. Edición 5a, pág. 348. "El principio de mutabilidad de los contratos administrativos es una consecuencia impuesta por finalidades del interés público, dado que con ellos se tiende a lograr una más eficiente realización de la justicia distributiva (...) las modificaciones en el contrato pueden traducirse tanto en aumento (adicionales) como en una disminución (reducciones) de las prestaciones".
  (...) De lo anterior resulta claro que es un deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación; es un imperativo de su gestión, al cual no puede sustraerse so pena de incurrir en responsabilidad por omisión, pues iría en contra de lo previsto en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993"[1].

- *La Corte Constitucional manifestó que "por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la Ley 80, los facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la*

[1] Consejo de Estado. (2002). Concepto 1439 del 18 de julio de 2002. Bogotá D.C.

paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos -como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 13 de agosto de 2009: "La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado"[2].

- *Que al respecto de los fines de la contratación estatal y las modificaciones a los contratos estatales el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han establecido lo siguiente: "(...) El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos "instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas. El interés general, además de guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a regular el régimen de contratación administrativa, determina las actuaciones de la Administración, de los servidores que la representan y de los contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de las obligaciones generales de todo contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los fines del Estado (...)"[3]. A su vez, el Consejo de Estado se ha pronunciado en el siguiente sentido: "(...) Los cambios o ajustes a los contratos estatales que reúnan las siguientes condiciones pueden ser realizados válidamente, en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad y dando primacía al fin del contrato: (i) que resulten necesarios para la adecuada ejecución del contrato y el logro de la finalidad perseguida con el mismo, debido a hechos sobrevinientes y no prèvistos al momento de su celebración; (ii) que mejoren o amplíen la protección de los derechos, activos e intereses del Estado, sin generar un desequilibrio económico en contra del contratista; (ii) que no resulten contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres; (iv) que no modifiquen sustancialmente las condiciones esenciales del proceso de contratación y del contrato a celebrar, tales como el objeto principal del contrato (o "núcleo del objeto"), los factores de evaluación y selección, la clase o modalidad del contrato, etc., y (iv) que no supongan para el contratista una situación más ventajosa de la que tenía frente a los otros interesados (por ejemplo, los precalificados) y oferentes durante el proceso de contratación. Esta última situación podría darse si pudiera inferirse razonablemente que la modificación contractual que se pretenda efectuar, de haberse hecho durante el proceso de selección, hubiera implicado la participación de oferentes adicionales, o una variación en las condiciones de participación de los proponentes y/o en el orden de elegibilidad de sus ofertas, en relación con la que se tuvo en cuenta para la adjudicación (...)"[4]. Por lo tanto, es deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los contratos y el logro del fin perseguido con los trabajos, en este caso del contrato en comento.*

25. Por lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan celebrar el presente **OTROSÍ NO. 3 DE MODIFICACIÓN,** el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: MODIFICAR la cláusula séptima del contrato de obra No. IND-23-5027 en el sentido de actualizar los certificados de disponibilidad presupuestal Nos. 1023 del 25 de julio de 2023, por valor de CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($4.053.381.399), de los cuales para el contrato se comprometían MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.426.801.042), y 924 del 31 de octubre de 2024, por valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($44.358.903), correspondientes a los recursos del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR), con ocasión a la apertura del bienio 2025-2026, la cual quedará así: "CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL Certificados de disponibilidad presupuestal del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías Nos. 1023 del 25 de julio de 2023, por valor de CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y

[2] Corte Constitucional. (2012) Sentencia C-300 de 2012. Bogotá D.C.

[3] Corte Constitucional. (2009). Sentencia C-713 de 2009. Bogotá D.C.

[4] Consejo de Estado. (2017). Radicación 11001-03-06-000-2017-00098-00 - 2346 del 15 de agosto de 2017. Bogotá D.C.

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **OTROSÍ No. 3 DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. IND-23-5027 SUSCRITO ENTRE INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA (INDERVALLE) Y CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC**	CÓDIGO	PA-FO-240-001
		VERSIÓN	4
		APROBADO	14/AGO/2023

NUEVE PESOS M/CTE ($4.053.381.399), de los cuales para el contrato se comprometían MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.426.801.042), 924 del 31 de octubre de 2024, por valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($44.358.903), 225 del 30 de enero de 2025 por valor de SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($771.521.282.00), y 525 del 30 de enero de 2025 por valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($44.358.903.00), y del Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca No. 6246 del 31 de octubre de 2024, por valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($396.739.850)".

SEGUNDA: Las partes acuerdan que con el presente otrosí No. 3, no se causa desequilibrio económico en el contrato de obra No. IND-23-5027, ni reajuste de honorarios, ni erogación adicional a INDERVALLE, y se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.

TERCERA: Las demás cláusulas y estipulaciones pactadas en el contrato que no han sido modificadas, se conservan tal como fueron convenidas.

CUARTA: El presente otrosí, se entiende perfeccionado con la aceptación de las partes en la plataforma SECOP II.

Proyectó: Diana Marcela Santos Espinosa.	Abogado Contratista:	Firma:
Revisó: Paola Andrea Rojas Escobar.	Abogada Contratista:	Firma:
Revisó: Ana Yibi Erazo	Profesional Contratista	Firma:
Revisó: Alvaro Jose Bazurto	Profesional Contratista	Firma:
Revisión: Juan Carlos Rueda Ángel	Supervisor del Contrato	Firma:
Revisó: Camila Orozco Gonzalez	Jefe Oficina Jurídica	Firma:
Revisó: Sandra Patricia Ospina Valencia	Secretaria General	Firma:
Aprobó: Nicolas Triana Castillo	Subgerente de Infraestructura Deportiva	Firma:
Suscribe: Ana Milena Orozco Cañas	Gerente	Firma:

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **AVAL DE LEGALIDAD**	CÓDIGO	PE-FO-220-135
		VERSIÓN	2
		APROBADO	07/03/2024

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA – INDERVALLE, SE PERMITE EMITIR EL PRESENTE AVAL DE LEGALIDAD DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN LA IND-SG-071 DEL 31 DE ENERO DE 2024 ACLARADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. IND-SG-82 DEL 01 DE FEBRERO DE 2024, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN No. IND-SG-734 DEL 23 DE AGOSTO DE 2024:

Mediante oficio No. 500.13.5.234-2025 del 10 de febrero de 2025, la Subgerencia de Infraestructura Deportiva, remitió para la revisión de la Secretaría General de INDERVALLE, los documentos contractuales tendientes a solicitar aval de legalidad para realizar OTROSÍ No. 3 DE MODIFICACIÓN al CONTRATO DE OBRA No. IND-23-5027, suscrito entre EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA – INDERVALLE y el contratista CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC, con Nit. 901.526.894-4, representada legalmente por la señora BRENDA LIZETH MURILLO BARCO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.006.166.501 de Cali.

En virtud de lo anterior, mediante la presente comunicación procedo a informar el resultado de la revisión jurídica realizada al proceso mencionado, la cual se realizó conforme a las disposiciones vigentes en materia de contratación estatal, y especialmente, a lo preceptuado por la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 y la Resolución IND-SG-071 del 31 de enero de 2024, aclarada mediante Resolución IND-SG-82 del 01 de febrero de 2024, a su vez modificada por la Resolución IND-24-734 del 23 de agosto de 2024, se concreta en los siguientes términos:

<table>
<tr><th>DOCUMENTO REQUERIDO</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>1. Objeto.</td><td>CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FLOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.</td></tr>
<tr><td>2. Certificado de disponibilidad presupuestal.</td><td>Expedidos por el Sistema General de Regalías – SGR: 1) No. 1023 del 25 de julio de 2023 y 2) No. 924 del 31 de octubre de 2024.
Expedido por INDERVALLE: No. 6246 del 31 de octubre de 2024</td></tr>
<tr><td>3. Valor del contrato.</td><td>MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.867.899.795)</td></tr>
<tr><td>4. Valor adicionar</td><td>No aplica.</td></tr>
<tr><td>5. Modificación.</td><td>CLÁUSULA SÉPTIMA – APROPIACIÓN PRESUPUESTAL</td></tr>
<tr><td>6. Plazo.</td><td>09 de mayo de 2025.</td></tr>
<tr><td>7. Plazo a Prorrogar.</td><td>No Aplica.</td></tr>
<tr><td>8. Garantías.</td><td>
<table>
<tr><th>ASEGURADORA Y POLIZA</th><th>AMPARO</th><th>SUMA ASEGURADA</th><th>VIGENCIA DESDE</th><th>VIGENCIA HASTA</th></tr>
<tr><td rowspan="3">420-47-994000042515 Anexo 6 (13/11/2024) ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA</td><td>CUMPLIMIENTO</td><td>$375.447.858,80</td><td>22/12/2023</td><td>9/11/2025</td></tr>
<tr><td>PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</td><td>$151.299.883,40</td><td>22/12/2023</td><td>9/05/2028</td></tr>
<tr><td>CALIDAD DEL SERVICIO</td><td>$375.447.858,80</td><td colspan="2">5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DE ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE OBRA</td></tr>
<tr><td>420-47-994000010243 Anexo 7 (26/11/2024) ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA</td><td>RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL</td><td>$260.000.000</td><td>22/12/2023</td><td>9/05/2025</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **AVAL DE LEGALIDAD**	CÓDIGO	PE-FO-220-135
		VERSIÓN	2
		APROBADO	07/03/2024

9. Supervisión.	La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA a favor de INDERVALLE, están a cargo del contratista CONSORCIO GRUPO 3, con Nit. 901.769.200-6, en su calidad de Interventor de Obra.
10. Persona natural – contratista.	No Aplica.
11. Justificación suscrita por el supervisor y que avala la suscripción del otrosí.	Se anexó justificación suscrita por el doctor NICOLÁS TRIANA CASTILLO, en su calidad de Subgerente de Infraestructura Deportiva, quien avala el trámite para adelantar la suscripción del otrosí.

Se recuerda que en virtud de la delegación efectuada mediante la Resolución Resolución No. IND-SG-071 DEL 31 de enero de 2024 aclarada mediante resolución No. IND-SG-82 DEL 01 de febrero de 2024, modificada por la resolución No. IND-SG-734 del 23 de agosto de 2024, es de exclusiva responsabilidad del delegatario adelantar el proceso de conformidad con las normas que regulan la contratación estatal, los principios de transparencia, economía, responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007.

En consecuencia, y de la revisión jurídica realizada, se encuentra que los documentos se ajustan a los requisitos propios del tipo de contrato, y por lo tanto, se procede a **IMPARTIR AVAL DE LEGALIDAD FAVORABLE** para la presente actuación: OTROSÍ No. 3 DE MODIFICACIÓN al CONTRATO DE OBRA No. IND-23-5027.

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, a los diez (10) días del mes de febrero de 2025.

Atentamente,

SANDRA PATRICIA OSPINA VALENCIA
Secretaria General
INDERVALLE

Proyectó: Andrea Leyva Villegas	Cargo: Abogada Contratista	Firma:
Revisó: Luz Stella Díaz Vélez	Cargo: Profesional Universitario	Firma:

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **AUTORIZACIÓN MODIFICACIÓN A CONTRATOS**	CÓDIGO	PE-FO-220-134
		VERSIÓN	1
		APROBADO	06/MAR/2023

LA GERENCIA DEL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, requiere realizar **OTROSÍ NO. 3 DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE OBRA N°. IND-23-5027** en la Subgerencia de Infraestructura Deportiva, para ejecutar actividades conforme a la siguiente información.

Que, en consecuencia, ya se expidió aval de legalidad por parte de la Secretaría General y se aprueba:

DOCUMENTO REQUERIDO	OBSERVACIONES
1. No. De Contrato 1.1 No De Proceso	IND-23-5027 IND-23-ID-07-4469
2. Certificados de Disponibilidad Presupuestal del Sistema General de Regalías y/o Indervalle:	**SGR:** 1023 del 25 de julio de 2023, 924 del 31 de octubre de 2024 **INDERVALLE:** 6246 del 31 de octubre de 2024
3. Valor del contrato.	MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO M/CTE ($1.867.899.795)
4. Valor que se pretende adicionar	*NA*
5. Modificación	Se modificará: **CLÁUSULA SÉPTIMA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.**
6. Plazo del contrato	Plazo inicial: 30 de junio de 2024. Plazo final después de suspensiones y reactivaciones: 9 de mayo de 2025.
7. Garantías.	• **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** Póliza de cumplimiento: 420-47-994000042515 Número de anexo: 6 **EXPEDICIÓN:** 13 de noviembre de 2024. **CUMPLIMIENTO:** Desde el 22 de diciembre de 2023 hasta el 9 de noviembre de 2025. **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND:** Desde el 22 de diciembre de 2023 hasta el 9 de mayo de 2028. **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:** 5 años contados a partir de la suscripción de acta de recibo y entrega final de la obra. **ASEGURADO/BENEFICIARIO:** INDERVALLE **TOMADOR/GARANTIZADO:** CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC. • **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** Póliza de responsabilidad civil extracontractual: 420-74-994000010243 Número de anexo: 7 **IMPRESIÓN:** 26 de noviembre 2024 **EXPEDICIÓN:** 26 de noviembre 2024 **VIGENCIA:** Desde el 22 de diciembre de 2023 hasta el 9 de mayo de 2025. **VALOR:** $260.000.000

Se precisa que hasta aquí no se ejerce un control de legalidad, solo se tiene un aval de legalidad por parte de Secretaría General, y sobre el proceso pues será labor del área jurídica de cada dependencia velar por la coherencia con el ordenamiento jurídico vigente y garantizar que se ajuste a las disposiciones administrativas para su celebración y ejecución, y de parte del supervisor garantizar el cumplimiento del contrato.

Se indica igualmente, que conforme a lo expresado por el manual de contratación del Instituto, los objetos contractuales de los procesos de prestación de servicios deberán coincidir con actividades especializadas, profesionales, técnicas o de apoyo a la gestión

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **AUTORIZACIÓN MODIFICACIÓN A CONTRATOS**	CÓDIGO	PE-FO-220-134
		VERSIÓN	1
		APROBADO	06/MAR/2023

que no puedan ser llevadas a cabo por el personal o es insuficiente en la entidad, siendo labor de cada Subgerencia verificar la coherencia con la normatividad de contratación estatal vigente y la normatividad administrativa, además de verificar que se observen los valores de contraprestación asignados conforme a las circulares internas existentes y garantizar que se trate de personas idóneas para el cumplimiento del objeto a contratar.

Si esta autorización no es utilizada antes de UN MES contados desde la fecha de expedición se considera revocada y como tal el proceso contractual no se considera autorizado.

En caso de utilizarse por fuera de los parámetros aquí establecidos, se dará traslado a la oficina encargada de ejercer las acciones disciplinarias que correspondan.

De acuerdo con la delegación recibida por cada Subgerente, éste será responsable de la contratación conforme a la ley.

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los once (11) días del mes de febrero de 2025.

ANA MILENA OROZCO CAÑAS
Gerente
INDERVALLE

Consecutivo de Autorización No. 006

Proyectó: Diana Marcela Santos Espinosa - Abogado Contratista	Firma:
Aprobado: Maira Alejandra Cabrera Valencia - Asesor Gerencia	Firma:

PE-FO-220-016

500-13-5-234/2025
Cali, 10 de febrero de 2025

Doctora
ANA MILENA OROZCO CAÑAS
Gerente
INDERVALLE

Doctora
SANDRA PATRICIA OSPINA VALENCIA
Secretaria General
INDERVALLE

Asunto: **SOLICITUD DE AVAL DE LEGALIDAD Y AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO PARA SUSCRIPCIÓN DE OTROSÍ NO. 3 DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE OBRA NO. IND-23-5027.**

En mi calidad de Subgerente de Infraestructura Deportiva, respetuosamente solicito emitir aval de legalidad y autorización de modificación de contrato, de conformidad con lo establecido en la Resolución IND SG No. 071 del 31 de enero de 2024, aclarada mediante la Resolución IND SG- 82 del 01 de febrero de 2024, la cual fue modificada por medio de la Resolución IND-SG 734 del 23 de agosto de 2024, para la suscripción del otrosí No. 3 de modificación al contrato de obra No. IND-23-5027, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que, con ocasión de la viabilización, priorización y aprobación del proyecto de inversión identificado con BPIN 2022003760006, denominado "MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión Región Pacífico (OCAD), en sesión del 21 de abril de 2023, soportada en acta No. 19 de la misma fecha, se designó como ejecutor al INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA (en adelante, INDERVALLE).

2. Que, INDERVALLE elaboró los estudios previos, análisis del sector, matriz de riesgos, proyecto de pliego de condiciones, y demás documentación precontractual, surtiendo las etapas de publicación, con el objeto de adelantar el proceso de contratación, mediante la modalidad de selección de licitación pública No. IND-23-ID-07-4469.

3. Que, mediante la Resolución IND-SG-1339 del 28 de septiembre de 2023, la entidad aperturó el proceso de contratación, mediante la modalidad de selección de licitación pública No. IND-23-ID-07-4469, cuyo objeto corresponde a: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES". GRUPO 1: FRENTE 1. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACIÓN LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE: 2. ADECUACIÓN CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1. FRENTE 3. ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

4. Que, mediante Resolución 1518 del 10 de noviembre de 2023, se adjudicó el siguiente grupo del proceso de contratación, mediante la modalidad de selección de licitación pública No. IND-23-ID-07-4469: "GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

5. Que, el día veintidós (22) de diciembre de 2023, INDERVALLE suscribió el contrato de obra No. IND-23-5027, con CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC, cuyo objeto es: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

6. Que, se firmó acta de inicio del contrato de obra No. IND-23-5027, el 28 de diciembre del año 2023, con un plazo inicial de 6 meses, es decir hasta el 30 de junio de 2024.

7. Que, a continuación, se relacionan las suspensiones y reinicios contractuales acaecidos en el mismo:

NÚMERO Y FECHA	PERIODO	FECHA DE REANUDACIÓN	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
Acta de suspensión No. 1 del 14 de junio de 2024	Desde 14/06/2024 Hasta 21/07/2024	22/07/2024	08/08/2024
Acta de ampliación No. 1 de la suspensión No. 1 del 22 de julio de 2024	Desde 22/07/2024 Hasta 22/08/2024	23/08/2024	08/09/2024
Acta de reanudación No. 1 del 23 de agosto de 2024	No aplica	No aplica	08/09/2024
Acta de suspensión No. 2 del 26 de agosto de 2024	Desde 26/08/2024 Hasta 26/09/2024	27/09/2024	10/10/2024
Acta de ampliación No. 1 de la suspensión No. 2 del 27 de septiembre de 2024	Desde 27/09/2024 Hasta 14/10/2024	15/10/2024	28/10/2024
Acta de reanudación No. 2 del 15 de octubre de 2024	No aplica	No aplica	28/10/2024
Acta de Suspensión N° 3 del 23 de octubre de 2024	Desde 23/10/2024 Hasta 4/11/2024	5/11/2024	10/11/2024
Acta de reanudación No. 3 del 5 de noviembre de 2024	No aplica	No aplica	10/11/2024

8. Que, en virtud de la solicitud efectuada el 26 de diciembre de 2023, por el contratista de obra, que fue avalada el 28 de diciembre de 2023, por el arquitecto Nicolas Triana Castillo, en su calidad de supervisor del contrato de interventoría No. IND-23-4484, se procedió a la elaboración del otrosí número uno (1) al contrato de obra No. IND-23-5027, a través del cual se modificó la cláusula octava del contrato que hace referencia a la FORMA DE PAGO, el cual fue aprobado en la plataforma el 25 de enero de 2024.

9. Que, más adelante, para garantizar la correcta ejecución del contrato de obra, se suscribió otrosí número dos (2) a través del cual se adicionó la suma de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($441.098.753),** y amplió el término de ejecución por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, es decir hasta el 9 de mayo de 2025.

10. Que, en consecuencia, la cláusula séptima del contrato de obra quedó estipulada de la siguiente manera:

"CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL "Certificados de disponibilidad presupuestal del Sistema General de Regalías No. 1023 del 25 de julio de 2023, por valor de CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($4.053.381.399), de los cuales para el presente contrato se comprometen MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.426.801.042), certificados de disponibilidad del Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca No. 6246 del 31 de octubre de 2024, por valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE M/CTE ($396.739.850)" y certificado de disponibilidad No. 924 del 31 de octubre de 2024 por valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($44.358.903), expedido por el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías".

11. Que, por otra parte, surgió la necesidad de efectuar una actualización de documentos presupuestales por concepto de cierre de bienio fiscal 2023-2024 y apertura de bienio fiscal 2025-2026, por lo cual el Manual de Usuario Cierre de Vigencia Presupuestal Ejecutores de Proyectos, creado el 28 de diciembre de 2018 por el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías, que tiene como fin explicar la funcionalidad del cierre de vigencia presupuestal para ejecutores de proyectos de inversión, y con ello permitir la continuidad de la ejecución de proyectos de inversión, señala que:

"(...) Para aquellos recursos que han sido gestionados en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias SGR con pago a destinatario final, el Sistema es calculado por valor de disponibilidad inicial a partir de los saldos de la gestión; para aquellos casos en que se hayan gestionado con giro a cuenta maestra, el Sistema calcula los saldos por girar con cargo a dicho proyecto dado que la educación real está en el ámbito de la entidad respectiva.

3. PRE-CIERRE DE VIGENCIA PRESUPUESTAL

Proceso realizado por la Administración del SPGR de Oficio o por solicitud de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Se consolida la información del Presupuesto, Recaudo y Giro de la Vigencia que se cierra para los Recursos de Administración del SGR (Fiscalización, Monitoreo y Funcionamiento).

Adicionalmente, para los recursos de fondos, se calcula el valor pendiente por ejecutar, para los proyectos en ejecución.

4. CIERRE DE VIGENCIA PRESUPUESTAL

Proceso realizado por cada uno de los Ejecutores de Proyectos, en el que deberán adjuntar el acto administrativo de incorporación al presupuesto de los valores por ejecutar de los proyectos de inversión que se continúan ejecutando para la nueva vigencia (...)".

12. Que, de conformidad con lo anterior, INDERVALLE emitió la Resolución IND-SG 1143 del 31 de diciembre de 2024, por medio de la cual *"SE DECRETA EL CIERRE FISCAL DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS POR EL BIENIO 2023-2024, EJECUTADOS POR EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE"*, y a su vez, se informa el estado y ejecución de los proyectos aprobados por el Departamento del Valle del Cauca, y para los cuales se ha sido designado como entidad ejecutora al Instituto.

13. Que, posteriormente, INDERVALLE emitió la Resolución IND-SG-0039 del 29 de enero de 2025, mediante la cual *"SE INCORPORAN LOS SALDOS INICIALES DE LOS PROYECTOS DESIGNADOS COMO EJECUTOR PARA EL BIENIO 2025-2026 AL PRESUPUESTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS DEL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA "INDERVALLE"*, y además, se ordena efectuar la incorporación en el presupuesto de ingresos y gastos, las cuentas correspondientes al presupuesto general de regalias para el bienio fiscal 2025-2026, por la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($5.814.423.252), de acuerdo a la fuente de financiación y la asignación de cada proyecto.

14. Que, de acuerdo con la resolución citada en el numeral anterior, el saldo a incorporar al proyecto "MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", identificado con BPIN 2022003760006, es por valor de MIL SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($1.007.961.735).

15. Que, es por esto que surgió la necesidad de actualizar el certificado de disponibilidad presupuestal emitido por el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR), e incorporarlo en el clausulado del presente contrato.

16. Que, en ese marco, el SPGR expidió los certificados de disponibilidad presupuestal Nos. 225 del 30 de enero de 2025, por valor de SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($771.521.282,00), Y 525 del 30 de enero de 2024, por valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($44.358.903).

17. Que la Interventoría, CONSORCIO GRUPO 3 mediante Oficio CG3-002-2025 del 07 de Febrero de 2025, recomendó la suscripción de Otrosí número tres (3) a través del cuál se efectúe la actualización de CDP por cambio de vigencia.

18. Que, finalmente, la modificación solicitada se hace necesaria para seguir garantizando el eficaz desarrollo y el cumplimiento del contrato, fines, metas y objetivos trazados desde el plan estratégico del Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca, y el Departamento del Valle del Cauca, a través de los principios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia de la función administrativa.

19. Que, en virtud de lo anterior, se reconoce la importancia de atender esta solicitud, por lo cual se motiva la suscripción del otrosí No. 3, modificándose la siguiente cláusula: **CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, y en armonía con lo estipulado en la siguiente normatividad y jurisprudencia:

• *Que la contratación estatal busca satisfacer los fines estatales, de acuerdo con lo consignado en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, el cual refiere que "los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la*

continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines".

• *Que los numerales 1 y 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, señalan que "para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato (...) podrán (...) interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas e introducir modificaciones a lo contratado".*

• *Que la Ley 80 de 1993, en su artículo 40, establece que "las partes podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran para el cumplimiento de los fines estatales".*

• *Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado menciona:*

"(...) Roberto Dromi. Derecho Administrativo. Edición 5a, pág. 348. "El principio de mutabilidad de los contratos administrativos es una consecuencia impuesta por finalidades del interés público, dado que con ellos se tiende a lograr una más eficiente realización de la justicia distributiva (...) las modificaciones en el contrato pueden traducirse tanto en aumento (adicionales) como en una disminución (reducciones) de las prestaciones".

(...) De lo anterior resulta claro que es un deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación; es un imperativo de su gestión, al cual no puede sustraerse so pena de incurrir en responsabilidad por omisión, pues iría en contra de lo previsto en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993"[1].

• *La Corte Constitucional manifestó que "por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la Ley 80, los facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos -como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 13 de agosto de 2009: "La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado"[2].*

• *Que al respecto de los fines de la contratación estatal y las modificaciones a los contratos estatales el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han establecido lo siguiente: "(...) El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos "instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas. El interés general, además de guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a regular el régimen de contratación administrativa, determina las actuaciones de la Administración, de los servidores que la representan y de los contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de las obligaciones generales de todo contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los fines del Estado (...)"[3]. A su vez, el Consejo de Estado se ha pronunciado en el siguiente sentido: "(...) Los cambios o ajustes a los contratos estatales que reúnan las siguientes condiciones pueden ser realizados válidamente, en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad y dando primacía al fin del contrato: (i) que resulten necesarios para la adecuada ejecución del contrato y el logro de la finalidad perseguida con el mismo, debido a hechos sobrevinientes y no previstos al momento de su celebración; (ii) que mejoren o amplíen la protección de los derechos, activos e intereses del Estado, sin generar un desequilibrio económico en contra del contratista; (ii) que no resulten contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres; (iv) que no modifiquen sustancialmente las condiciones esenciales del proceso de contratación y del contrato a celebrar, tales como el objeto principal del contrato (o "núcleo del objeto"), los factores de evaluación y selección, la clase o modalidad del contrato,*

[1] Consejo de Estado. (2002). Concepto 1439 del 18 de julio de 2002. Bogotá D.C.

[2] Corte Constitucional. (2012) Sentencia C-300 de 2012. Bogotá D.C.

[3] Corte Constitucional. (2009). Sentencia C-713 de 2009. Bogotá D.C.

etc., y (iv) que no supongan para el contratista una situación más ventajosa de la que tenía frente a los otros interesados (por ejemplo, los precalificados) y oferentes durante el proceso de contratación. Esta última situación podría darse si pudiera inferirse razonablemente que la modificación contractual que se pretenda efectuar, de haberse hecho durante el proceso de selección, hubiera implicado la participación de oferentes adicionales, o una variación en las condiciones de participación de los proponentes y/o en el orden de elegibilidad de sus ofertas, en relación con la que se tuvo en cuenta para la adjudicación (...)"[4]. Por lo tanto, es deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los contratos y el logro del fin perseguido con los trabajos, en este caso del contrato en comento.

Que, por lo anteriormente expuesto, se solicita emitir aval de legalidad y autorización, para dar inicio al respectivo proceso de otrosí No. 3 de modificación al presente contrato de obra No. IND-23-5027.

Atentamente,

NICOLAS TRIANA CASTILLO
Subgerente de Infraestructura Deportiva

Proyectó: Diana Marcela Santos	Profesional Contratista	Firma:
Revisó: Álvaro José Bazurto	Profesional Contratista	Firma:
Revisó: Stephanie Peñate	Profesional Contratista	Firma:
Revisó: May Stiven Paramo Martinez	Profesional Contratista	Firma:
Revisó: Paola Andrea Rojas	Profesional Contratista	Firma:
Aprobó: Juan Carlos Rueda Ángel	Asesor de Despacho	Firma:

[4] Consejo de Estado. (2017). Radicación 11001-03-06-000-2017-00098-00 - 2346 del 15 de agosto de 2017. Bogotá D.C.

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN OFICIOS	CODIGO	FO-220-016
		VERSIÓN	2
		APROBADO	18/12/2018

Santiago de Cali, 7 de febrero de 2025
OFICIO 500.13.1.231.2025

Arquitecto
NICOLAS TRIANA CASTILLO
Subgerente de Infraestructura Deportiva
Indervalle
Ciudad

REFERENCIA: Oficio CG3-002-2025 del 7 de febrero de 2025 enviado por CONSORCIO GRUPO 3 en calidad de Interventor y encargado del contrato de Interventoría IND-23-4484.
ASUNTO: Recomendación Suscripción Otrosí número Tres (3) al I contrato de Obra IND-23-5027.

Cordial saludo:

En atención a las obligaciones que en mi calidad de Supervisor[1] del contrato de Interventoría IND-23-4484 me atañen y en virtud de la solicitud efectuada por CONSORCIO GRUPO 3 mediante el oficio citado en la referencia, me permito recomendar la suscripción de un Otrosí, para el caso concreto el Otrosí número tres (3) en el que se modifique la cláusula Séptima del contrato de Obra IND-23-5027 la cuál hace referencia a la apropiación presupuestal con el fin de llevar a cabo la actualización de los Certificados de Disponibilidad presupuestal por el cambio de vigencia.

Atentamente,

JUAN CARLOS RUEDA ÁNGEL
Asesor de Gerencia
INDERVALLE

Proyectó:	Diana Marcela Santos Espinosa - Profesional contratista	Firma:

[1] artículos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015

CG3

CONSORCIO GRUPO 3
INTERVENTORIA

Distrito Santiago de Cali, Febrero 07 de 2025 CG3-002-2025

Arquitecto
JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
Supervisor Contrato Interventoría No. IND – 23 - 4484
Instituto del Deporte, la Educación Física y La Recreación
INDERVALLE
La Ciudad

Referencia: Contrato de obra **IND-23-5027**, cuyo objeto es: " CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES GRUPO 2 FRENTE 1: ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "

Asunto: Actualización de CDP´s Contrato No. IND-23-5027 – CONSTRUPACICOL S.A. S ZOMAC

Cordial saludo,

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones del contrato de la referencia, recomendamos la suscripción de un acto administrativo (Otrosi) para el contrato de la referencia motivado por la actualización de CDP´s por cambio de vigencia con el fin de que el soporte financiero quede debidamente actualizado en el contrato.

CDP No. 1023 del 25 Julio 2023 y CDP No. 6246 del 31 de Octubre 2024

Atentamente,

Arq. Juan Carlos Naranjo Ramírez
Representante Legal Consorcio Grupo 3
Interventor

Copia: Arquitecta Isabela Gutiérrez Zamora – Apoyo a la Supervisión de Indervalle
Archivo

CALLE 18 N # 3N-70
OFICINA 401
EDIFICIO NOYRA
CALI-COLOMBIA

consorciogrupo3@gmail.com
cardenascivil99@gmail.com

301-2759200; 316-4918891, 602 668 55 24

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante.	MHfvalverd	FABIAN VALVERDE CORREA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	03-7600010	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-30 -4:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	225	Fecha Registro:	2025-01-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-7600010 INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto		
Valor Inicial:	771.521.282,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	771.521.282,00	Saldo x Comprometer:	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	225	Fecha Registro:	2025-01-30	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	CDP:	1023	Compromiso:	1123	Obligación:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
03-7600010 INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE	00AR-4301-1604-2022-00376-0006 MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO EL, DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Nación	AR76000	CSF	2025-01-30				
					Total:	771.521.282,00	0,00	771.521.282,00	0,00

Objeto:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES GRUPOS. GRUPO 1: FRENTE 1. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACIÓN LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE 2. ADECUACIÓN CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ- DE CALI- DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1. FRENTE 3. ADECUACIÓN ESCENARIOS DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DE CALI VALLE DEL CAUCA. GRUPO 2 FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Firma Responsable

INDERVALLE

REGISTRADO PRESUPUESTO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfvalverd	FABIAN VALVERDE CORREA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-7600010	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-30 -4:16 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	225	**Fecha Registro:**	2025-01-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-7600010 INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	771.521.282,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	771.521.282,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
03-7600010 INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE	00AR ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS				
		Total:	771.521.282,00	0,00	771.521.282,00

Objeto:	

INDERVALLE
REGISTRADO PRESUPUESTO

Firma Responsable

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfvalverd	FABIAN VALVERDE CORREA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	03-7600010	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-30 -4:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	525	Fecha Registro:	2025-01-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-7600010 INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto			
Valor Inicial:	44.358.903,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	44.358.903,00	Saldo x Comprometer:	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	525	Fecha Registro:	2025-01-30	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

VIGENCIA ANTERIOR							
Proviene Vigencia Anterior:	Si	CDP:	924	Compromiso:	424	Obligación:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA. OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
03-7600010 INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE	0DAR-4301-1604-2022-00376-0006 MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Nación	AR76000	CSF	2025-01-30				
					Total:	44.358.903,00	0,00	44.358.903,00	0,00

Objeto:	OTROSI No. 02 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA IND-23-5027 (AUT-G1116)

Firma Responsable

INDERVALLE

INDERVALLE
REGISTRADO
PRESUPUESTO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfvalverd	FABIAN VALVERDE CORREA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-7600010	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-30 -4:16 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	525	**Fecha Registro:**	2025-01-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-7600010 INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	44.358.903,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	44.358.903,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
03-7600010 INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE	00AR ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS				
		Total:	44.358.903,00	0,00	44.358.903,00

Objeto:	

INDERVALLE
REGISTRADO PRESUPUESTO

Firma Responsable

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN **ACTA DE REUNION No.**	CODIGO	FO-220-011
		VERSIÓN	2
		APROBADO	18/12/2018

OBJETIVO REUNION

Seguimiento a la ejecución del contrato de obra IND-23-5027

Fecha : 12/03/2025
Lugar : INDERVALLE - Gerencia.
Hora inicio: 10:00 am Hora final: 11:30 am

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	EMAIL	FIRMA
Eduardo Cardenas	Consorcio Grupo 3.	cardenasciviles@gmail.com	
Oscar Cardenas	Consorcio grupo 3	FOscary@hotmail.com	
Guillermo Villegas	Director obra	Guivi61@Hotmail.com	
Alvaro José Bozorto	Apoyo supervision - Inder	alvarobozorto0289@gmail.com	
José Rodrigo Morillo	Rep legal	morillo1906@hotmail.com	
David Garcia	Apoyo Supervisión-Infra	davidgarcia1233@gmail.com	
Dora Hacela Santos	Abogado Apoyo Supervisión	sanhisan2@gmail.com	

INVITADOS:

NOMBRE	CARGO/ AREA	EMAIL	FIRMA
Juan Carlos Rueda	Supervisor Gerencia	argangell@hotmail.com	
Isabella Cortiéns	Apoyo Supervisión	isabellaputumes@gmail.com	

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN **ACTA DE REUNION No.**	CODIGO	FO-220-011
		VERSIÓN	2
		APROBADO	18/12/2018

ORDEN DEL DIA
1. Presentación informe contratista de obra
2. Presentación informe interventoría.
3. Conclusiones.

La reunión es presidida por: _____

DESARROLLO

1.- Se da inicio a la reunión con la presentación de todos los asistentes y seguidamente se inicia con la presentación del informe que lleva el contratista de obra Construpacicol s.a.s. zomac. En el informe se expone información general del estado del contrato en cuanto a valores iniciales y adiciones. y tambien en cuanto actas de suspenciones reinicios y tiempo vigente actual con el que cuenta el contato para realizar las obras pendientes, el cual es de 60 dias calendario. A continuación el contratista de obra presenta fotografías del estado actual de la obra y de las actividades realizadas en la última semana, las cuales corresponden generalmente a actividades relacionadas a estructura y carpintería metálica. Durante la presentacion tanto interventoría como la Gerente de Indervalle realizan preguntas sobre el avance de tales actividades relacionadas a la estructura metálica, pues en las fotos del sitio de la obra no se evidencia el material mencionado. Frente a estas preguntas el contratista de obra expone que debido a las dificultades presentadas por las altas salinas en el lugar de la obra,

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN **ACTA DE REUNION No.**	CODIGO	FO-220-011
INDERVALLE		VERSIÓN	2
		APROBADO	18/12/2018

condiciones que son propias del sitio, los trabajos se estan realizando en un taller de fabricación en el Municipio de Yumbo y que una vez las piezas tengan aplicadas las primeras capas de impermeabilizante, estas serán transportadas al lugar de la obra.

Se continúa con la presentación de la interventoría, la cual es realizada mediante un informe que muestra el estado actual de la obra y hace especial enpasis en que a la presente fecha el contratista de obra no ha realizado algunas actividades de obra relacionadas a: Filtros, reposición de losas deficientes, pantallas de potencia, canal de aguas lluvias y terminado de cajas de inspección, y que el no realizar estas actividades podria potenciar un atraso presentado ya que no tiene ninguna razón valida para no haberlas ejecutando.

Acto seguido el supervisor del contrato de interventoría por parte de Inderalle, toma la palabra haciendo especial enfásis al contratista de que las actividades relacionadas a la sustitución de las placas deficientes deban ser abordadas lo antes posible, ya que al no tenerse a tiempo la realización de este trabajo en correcta forma, podria presentarse un retraso en actividades inmediatas como la pintura de la cancha, ya que previa aplicación de esta pintura la placa construida debe cumplir con sus tiempos de curado. Adicionalmente

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN **ACTA DE REUNION No.**	CODIGO	FO-220-011
		VERSIÓN	2
		APROBADO	18/12/2018

observa al contratista de obra la importancia de abordar a tiempo las actividades citadas por la interventoría teniendo en cuenta que el plazo contractual es hasta el 09 de mayo de 2025 y se debe cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.
Finalmente para el tema de la reunión se establece un próximo comité de obra en el lugar de la obra para el día 31 de marzo de 2025, y donde el contratista se compromete a: i) Estar al día con el cronograma de obra sin presentar atrasos. ii) Tener realizadas las actividades correspondientes a pilotos, reposición de losa, muros de pantallas + estructura metálica y cajas de inspección iii) Tener en optimas condiciones el cerramiento de la obra que presenta deterioro iv) Realizar limpieza y aseo general a la obra.

COMPROMISOS/ ACCIONES

Actividad	Responsable	Fecha
comité de obra en Buenaventura	contratista + interventoría + Indervalle	31/03/25

PROXIMA REUNION (si se programa una nueva reunión)

Fecha:	Hora:	Lugar:

ANEXOS (Si los hay)

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN ACTA DE REUNION No.	CODIGO	FO-220-011
		VERSIÓN	2
		APROBADO	16/12/2018

OBJETIVO REUNION

Comite de Seguimiento al contrato de interventoria. IND-23-4484. y su contrato de obra derivado IND-23-5027.

Fecha 04-03-2025.
Lugar Indervalle.
Hora inicio: 10:30 am. Hora final: 11:30 am

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	EMAIL	FIRMA
Alvaro José Borunda	Apoyo a la supervisión	alvarobornda0289@	
Cesar Cadena	Interventoria	FOXcesar@hotmail.com	
Juan Carlos Rueda	Supervisor Interventoria	argangell@hotmail.com	
Guillermo Ulloque	Contratista.	asiste virtual.	

INVITADOS:

NOMBRE	CARGO/ AREA	EMAIL	FIRMA

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN	CODIGO	FO-220-011
		VERSION	2
	ACTA DE REUNION No.	APROBADO	18/12/2018

ORDEN DEL DIA
1 Seguimiento cronograma de Obra.
2 Obligaciones pendientes
3.
La reunión es presidida por Arq Juan Carlos Rueda.

DESARROLLO
1.- Se da inicio al comité leyendo las tareas pendientes del comité anterior. El interventor manifiesta que se tiene el compromiso por parte del contratista de entregar los informes mensuales y semanales correspondientes a los meses de enero y Febrero de 2025, se tiene pendiente el aporte de las planillas de seguridad social del personal mínimo del mes de enero, así como, la entrega de los resultados de los ensayos pendientes a la fecha.

El contratista informa que aportó vía correo electrónico el día 17 de Febrero los informes mensuales y semanales pendientes y el día 26 de Febrero realizó la entrega de las planillas, los planos de taller y demas información técnica necesaria para el seguimiento técnico por parte de la interventoria.

El interventor se compromete a revisar la información suministrada por el contratista de obra y validar su contenido.

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN ACTA DE REUNION No.	CODIGO	FO-220-011
INDERVALLE		VERSIÓN	2
		APROBADO	18/12/2018

Paso seguido, el interventor manifiesta que realizando el seguimiento a la reprogramación aprobada, se esta presentando un atraso en la actividad de instalación de la estructura metalica, la cual tenía programado su inicio de izaje para la última semana de febrero de 2025.

El contratista manifiesta que tuvo un retraso por la oportunidad de la adquisición del material necesario para la construcción de las columnas, que actualmente esta culminando los trabajos en taller para proceder con el traslado a obra de las columnas, complementando las vigas y cerchas que ya se encuentran en sitio.
El compromiso del contratista es comenzar el izaje para la semana del 15 de marzo.
Actualmente frente a esta actividad aparte de las labores en taller, se avanza con la fijación de las placas base. Adicionalmente se trabaja en la construcción de anclajes y filtros pendientes

Finalmente, se socializa con el interventor que es necesario que complemente el informe radicado sobre la recomendación de aperturar un proceso al contratista por un presunto incumplimiento de sus obligaciones, dado que, se debe precisar que obligaciones contractuales

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN ACTA DE REUNION No.	CODIGO	FO-220-011
INDERVALLE		VERSIÓN	2
		APROBADO	18/12/2018

estan siendo presuntamente incumplidos y presentar toda la información que lo sustente.

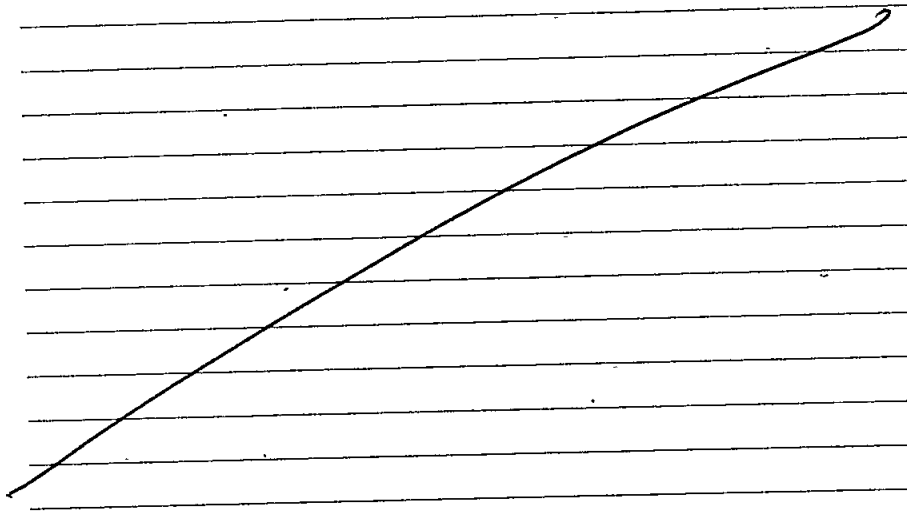

COMPROMISOS/ ACCIONES

Actividad	Responsable	Fecha
Complementar oficio posible incumplimiento	Interventor	10-03-25
Comentar viaje estructura metalica	Contratista	13-03-25

PROXIMA REUNION (si se programa una nueva reunión)

Fecha:	Hora:	Lugar:

ANEXOS (Si los hay)

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO	PM-FO-600-015
		VERSION	2
	VISITA DE OBRA SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA — PROCESO:	APROBADO	18/OCT/23

DATOS DEL CONTRATO

No.	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR	CONTRATISTA	INTERVENTOR
IND-23-5027	BUENAVENTURA	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES GRUPO 2 FRENTE 1 ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	$1.867.899.795	CONSTRUPACICOL S.A. S ZOMAC	CONSORCIO GRUPO 3

FECHA DE LA VISITA: 19/02/2025

OBJETO DE LA VISITA: VERIFICAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN SITIO, EL AVANCE DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA VIGENTE.

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCION PLACA EN CONCRETO FUNDIDA

DESCRIPCIÓN INICIO FUNDICIÓN TAPAS CAJAS DE INSPECCIÓN

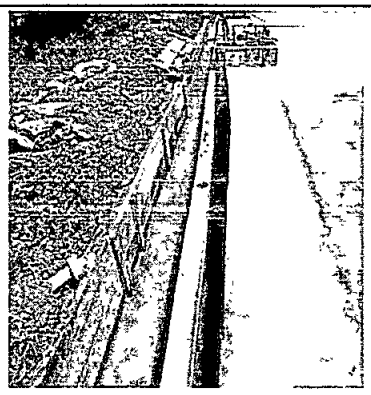

DESCRIPCION FUNDICIÓN CANALES DE DESAGUE

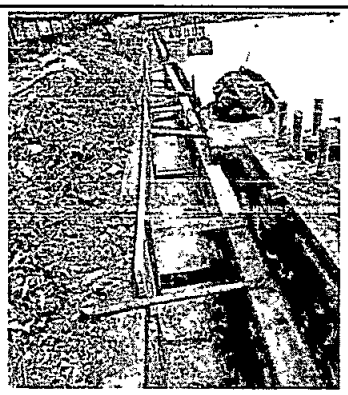

DESCRIPCION: INCIO INSTALACION TUBERIA ELÉCTRICA

ESTADO GENERAL DE LA OBRA

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA FUNDICIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DE LA CANCHA, LA FUNDICION DE CANALES LATERALES Y EL ALISTAMIENTO PARA LA FUNDICION DE LAS TAPAS DE LAS CAJAS DE INSPECCIÓN
SE INICIAN TAMBIÉN ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA ILUMINACIÓN CON LA INSTALACIÓN DE TUBERIA Y EL ALISTAMIENTO PARA LA FUNDICIÓN DE LAS CAJAS EN CONCRETO

OBSERVACIONES REALIZADAS

SE RECOMIENDA REVISAR EN DETALLE LA LOGÍSTICA PARA LA INSTALACIÓN E IZAJE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CUBIERTA TODA VEZ QUE EL INGRESO DE LOS EQUIPOS NECESARIOS CUENTEN CON SUFICIENTE ESPACIO DE MANIOBRA SIN GENERAR AFECTACIÓN A NINGÚN ELEMENTO YA CONSTRUIDO

CONCLUSIONES DE LA VISITA

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN Y PRESENTA UN % DE ATRASO SEGÚN LO PROGRAMA DEBIDO A QUE LA ESTRUCTURA METALICA NO SE ENCUENTRA IZADA. SIN EMBARGO ES PERTINENTE APUNTAR QUE LA MISMA SE ENCUENTRA EN E_ SITIO DE LA OBRA PRÓXIMA A SER INSTALADA EN SU TOTALIDAD

LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA POR PARTE DE INDERVALLE SOCIALIZA AL INTERVENTOR EL OFICIO EMITIDO POR PARTE DEL SUBGERENTE DE INDERVALLE NO.500 13 5 292 2025 DEL 18 DE FEBRERO DE 2025 EN ARAS DE PRECISAR LA IMPORTANCIA DE LA ENTREGA DE UN INFORME POR PARTE DE ELLOS EN EL CUAL SE DESCRIBA CLARAMENTE EL ATRASO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS POSIBLES INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS

ELABORADO POR	REVISADO POR	Vo Bo
Nombre Isabela Gutierrez Cargo Apoyo a la supervision de obras	Nombre Ana Yiby Erazo Cargo Coordinadora suepervision de obras	Nombre Juan Carlos Rueda Angel Supervisor

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfvalverd	FABIAN VALVERDE CORREA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	03-7600010	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-30 -4:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	225	**Fecha Registro:**	2025-01-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-7600010 INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso	**Tipo:**	Gasto		
Valor Inicial:	771.521.282,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual.:**	771.521.282,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	225	**Fecha Registro:**	2025-01-30	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	**CDP:**	1023			**Compromiso:**	1123	**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.
03-7600010 INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE	00AR-4301-1604-2022-00376-0006 MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Nación	AR76000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
2025-01-30				
Total:	771.521.282,00	0,00	771.521.282,00	0,00

Objeto:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES GRUPOS. GRUPO 1: FRENTE 1. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACIÓN LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE:2. ADECUACIÓN CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ- DE CALI- DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1. FRENTE 3. ADECUACIÓN ESCENARIOS DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DE CALI VALLE DEL CAUCA. GRUPO 2 FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Firma Responsable

INDERVALLE

INDERVALLE
REGISTRADO
PRESUPUESTO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHfvalverd	FABIAN VALVERDE CORREA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-7600010	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-30-9:40 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 225 de fecha 2025-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	225	Fecha Registro:	2025-01-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-7600010 INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	771.521.282,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	771.521.282,00	Saldo x Obligar:	771.521.282,00

TERCERO

Identificacion:	901526894	Razon Social:	CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0598027217	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	31321997	Nombre:	DORADO GOMEZ DAYRA FAISURY	Cargo:	GERENTE

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	IND-23-5027	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2023-12-22

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	CDP:	1023	Compromiso:	1123	Obligación:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
03-7600010 INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE	00AR-4301-1604-2022-00376-0006 MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Nación	AR76000	CSF	2025-01-30	771.521.282,00	0,00		
					Total:	771.521.282,00	0,00	771.521.282,00	771.521.282,00

Objeto:	CONTRATO No. IND-23-5027, CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. (CJ-5791) POLIZAS EN TRAMITE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-7600010	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-01-01	771.521.282,00	771.521.282,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INDERVALLE
REGISTRADO PRESUPUESTO

DISEGNATE
BREVETTO
COMUNICATO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfvalverd	FABIAN VALVERDE CORREA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-7600010	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-30 -4:16 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	225	**Fecha Registro:**	2025-01-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-7600010 INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	771.521.282,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	771.521.282,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO
03-7600010 INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE	00AR ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
Total:	771.521.282,00	0,00	771.521.282,00

Objeto:	

INDERVALLE
REGISTRADO PRESUPUESTO

Firma Responsable

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfvalverd	FABIAN VALVERDE CORREA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-7600010	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-30 -4:16 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	525	**Fecha Registro:**	2025-01-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-7600010 INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	44.358.903,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	44.358.903,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO
03-7600010 INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE	00AR ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
Total:	44.358.903,00	0,00	44.358.903,00

Objeto:	

INDERVALLE
REGISTRADO PRESUPUESTO

Firma Responsable

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfvalverd	FABIAN VALVERDE CORREA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	03-7600010	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-30 -4:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	525	**Fecha Registro:**	2025-01-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-7600010 INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto	
Valor Inicial:	44.358.903,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	44.358.903,00	**Saldo x Comprometer:** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	525	**Fecha Registro:**	2025-01-30	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	**CDP:**	924	**Compromiso:**	424	**Obligación:**

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.
03-7600010 INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE	00AR-4301-1604-2022-00376-0006 MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Nación	AR76000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
2025-01-30				
Total:	44.358.903,00	0,00	44.358.903,00	0,00

Objeto:	OTROSI No. 02 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA IND-23-5027 (AUT-G1116)

Firma Responsable

INDERVALLE

INDERVALLE
REGISTRADO
PRESUPUESTO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHfvalverd	FABIAN VALVERDE CORREA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-7600010	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-30-9:40 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 525 de fecha 2025-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	525	Fecha Registro:	2025-01-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-7600010 INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	44.358.903,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	44.358.903,00	Saldo x Obligar:	44.358.903,00

TERCERO

Identificacion:	901526894	Razon Social:	CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0598027217	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	31974731	Nombre:	ANA MILENA OROZCO CAÑAS	Cargo:	GERENTE GENERAL

CAJA MENOR / **DOCUMENTO SOPORTE**

Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	IND-23-5027	Tipo:	CONTRATO	Fecha: 2024-11-08

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	CDP:	924	Compromiso:	424	Obligación:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.
03-7600010 INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE	00AR-4301-1604-2022-00376-0006 MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Nación	AR76000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2025-01-30	44.358.903,00	0,00		
Total:	44.358.903,00	0,00	44.358.903,00	44.358.903,00

Objeto:	OTROSI No. 02 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA IND-23-5027. (CJ-7141)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-7600010	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA DEL VALLE - INDERVALLE	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-01-01	44.358.903,00	44.358.903,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INDERVALLE
INDERVALLE REGISTRADO PRESUPUESTO

UNITED STATES
DEPARTMENT OF
AGRICULTURE

GOBERNACIÓN Departamento del Valle del Cauca | paraíso de todos | INDERVALLE

PE-FO-220-016
500-41-5-308-2025

Cali, 01 de abril de 2025

Doctor:
FABIAN VALVERDE
Oficina de Presupuesto
INDERVALLE
VALLE DEL CAUCA

REFERENCIA: Certificados de disponibilidad contrato IND-23-5027 para la vigencia 2025.

Cordial saludo,

De manera atenta nos permitimos dar alcance al otro SI NO.3 – Contrato de obra No. IND-23-5027 CONSTRUPACICOL S.A.S ZOMAC, identificado con Nit No. 901.526.894-4 aclarando los Certificados de disponibilidad que se encuentran avalando dicho contrato que son:

CDP	FECHA	VALOR
1023	25-07-2023	1.426.801.042
924	31-10-2024	44.358.903
6246	31-10-2024	396.739.850

De esta manera se actualizan los siguientes certificados que corresponden únicamente a una actualización del sistema general de regalías vigencia 2025, Tal como lo estipula la cláusula segunda del otro Si en mención: Las partes acuerdan que con el presente otro si No.3 no se cusa desequilibrio económico en el contrato de obra No. IND-23-5027, ni reajuste de honorarios, ni erogación adicional a INDERVALLE, y se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 de Decreto 1082 de 2015.

CDP	FECHA	CDP ACTUALIZADO 2025	FECHA	VALOR
1023	25-07-2023	225	30-01-2025	$ 771.521.282
924	31-10-2024	525	30-01-2025	$ 44.358.903

Agradecemos de antemano la oportuna gestión al asunto.

Cordialmente,

INDERVALLE PRESUPUESTO

02 ABR 2025

RECIBIDO
Hora: 3:20 pm
Firma:

NICOLAS TRIANA CASTILLO
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
INDERVALLE

Elaboró: Angela Maria Gil	Cargo: Contratista	Firma: ANGELA MARIA GIL
Revisó: May Stiven Paramo Martínez	Cargo: Contratista	Firma:

ACTA



	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
	Vigencia a partir de	01

SOPORTE DEL ACTA No.	5	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 1 DE FEBRERO 2024 AL 1 DE ABRIL DE 2025
OBJETO	MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
CONTRATO No.	IND-23-5027	SUPERVISOR PROYECTO	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
CONTRATISTA	CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	INDERVALLE
INTERVENTOR	CONSORCIO GRUPO G3		
ITEM	1.3.1 ACERO ESTRUCTURAL	UNIDAD	KLS

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Kg/ml - Kg/m2	Long (ML)	peso/und	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	Conexion Int. Cercha	99,70	0,23*0,23	5,27	12,0		0,00	
	Conexion Int. Cercha	99,70	0,17*0,17	2,88	6,0		0,00	
	Conexion Cercha, Columna	118,00	0,265*0,265	8,29	4,0		0,00	
	Conexion Int. Cercha	99,70	0,17*0,17	2,88	4,0		0,00	
	Conexion Int. Viga	99,70	0,21*0,21	4,40	8,0		0,00	
	Conexion Int. Viga	74,58	0,13*0,075	0,73	4,0		0,00	
	Platina Viga Inf. Y Sup.	74,58	0,10*6,00	44,75	2,0		0,00	
	Platina Anclaje	299 10	0,70*0,70	146,56	2,0		0,00	
	Perfil Correa	9,56	31,00	296,36	1,0	8	0,00	
	Columna HEA 300	88 30	8,50	750,55	2,0	3,148	4.720,32	
	Atiesador Columna	99,70	0,15x0,28	4,19	8,0	12	301,49	
	RIOSTRA HEA 200	42,30	8,40	355,32	2,0	2	1.421,28	
	Platina Riostra	99 70	0,48x0,64	30,628	8,0	2	490,05	
	Platina Riostra	48 00	0,1x0,22	1,06	8,0	2	16,90	
	Conexion Riostra	99,70	0,42x0,20	8,37	8,0	2	134,00	
	Abensadores	74 58	0,2x0,2	2,98	2,0	2	11,93	
	Tirante para Cubierta	1,88	1,70	3,19	14,0	10,00		
	Tirante para Cubierta	1,88	0,60	1,13	2,0	5,00		
	Tensor para Cubierta	1,22	2,65	3,24	4,0	5,00		
	Tensores Contravientos	1,56	7,35	11,47	2,0	10,00		
	Oreja Contravientos	7,5	0,10	0,75	4,0	10,00		
	TORNILLERIA Y CONECTORES CUBIERTA					3%	212,88	
							7.407,15	

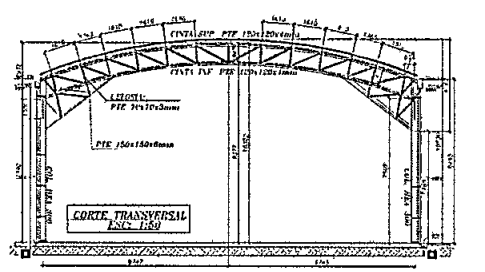

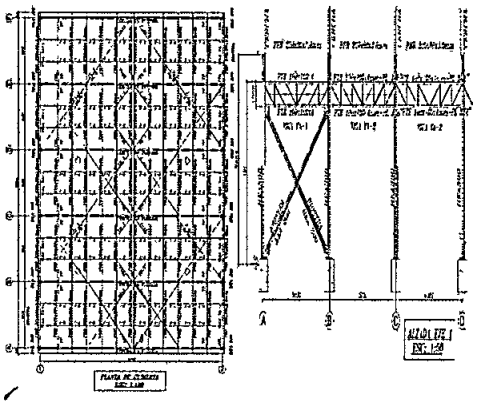

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ
REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nota: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre completo del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en constatar a nuevo examen los otros objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirla, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, el interventor la corregirá aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de las diversas en la obra, según lo exige en que la misma se encuentra.

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Este aval/ó consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir autorizar su alcance con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
	Vigencia a partir de	01

SOPORTE DEL ACTA No.	5	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 1 DE FEBRERO 2024 AL 1 DE ABRIL DE 2025
OBJETO	MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
CONTRATO No.	IND-23-5027	SUPERVISOR PROYECTO	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
CONTRATISTA	CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	INDERVALLE
INTERVENTOR	CONSORCIO GRUPO G3		
ITEM	SUB-BASE COMP.MAT.SELECC.	UNIDAD	M3

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo (ML)	Ancho (ML)	Alto (M.)	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	SUB-BASE	30	21,2	0,15	1	M3	95,40
	MENOS ACTA #4						-47,7
							47,70

ESQUEMA

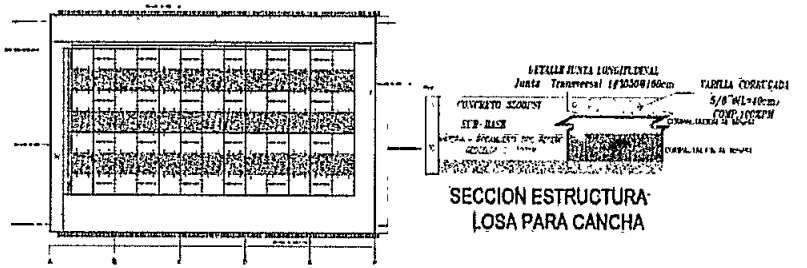

SECCION ESTRUCTURA LOSA PARA CANCHA

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma: Brenda Murillo B.

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

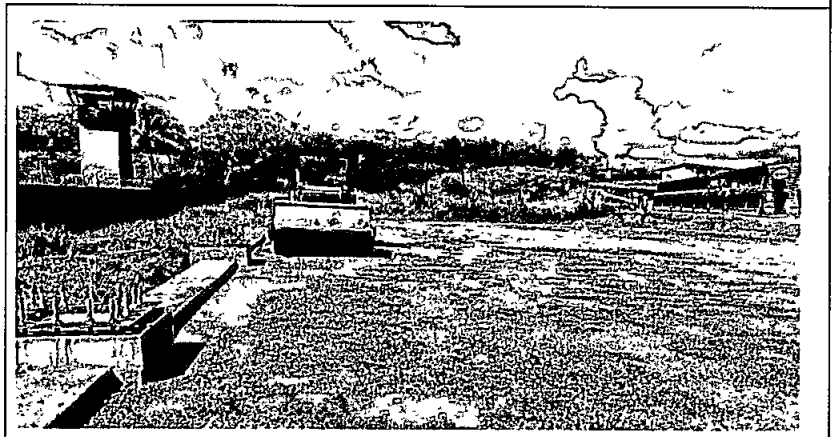

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
	Vigencia a partir de	01

SOPORTE DEL ACTA No.	5	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 1 DE FEBRERO 2024 AL 1 DE ABRIL DE 2025
OBJETO	MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
CONTRATO No.	IND-23-5027	SUPERVISOR PROYECTO	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
CONTRATISTA	CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	INDERVALLE
INTERVENTOR	CONSORCIO GRUPO G3		
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOCELDA PARA MEJORAMINETO DEL TERRENO DEL AREA DE LA CANCHA.	UNIDAD	M2

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo (ML)	Ancho (ML)	Alto (M.)			
	GEOCELDA	30	21,2	1	1	M2	636,00
	MENOS ACTA #4						-318
							318,00

ESQUEMA

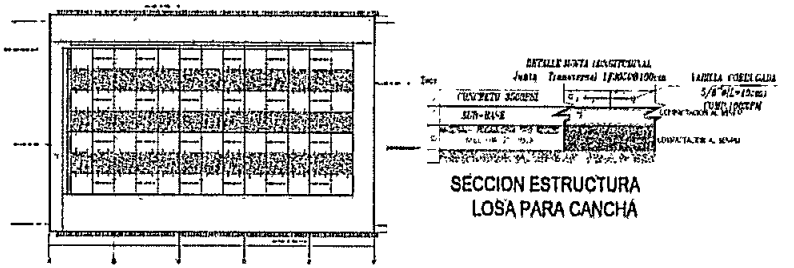

SECCION ESTRUCTURA
LOSA PARA CANCHA

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Brenda Murillo B.

Firma:

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

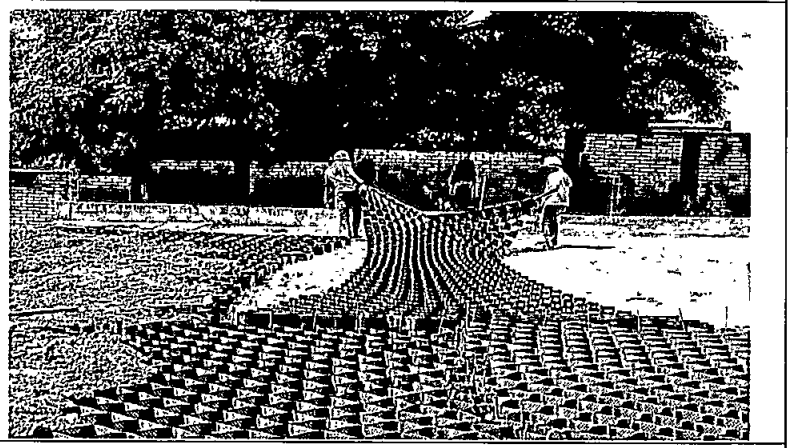

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
	Vigencia a partir de	01

SOPORTE DEL ACTA No.	5	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 1 DE FEBRERO 2024 AL 1 DE ABRIL DE 2025
OBJETO	MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
CONTRATO No.	IND-23-5027	SUPERVISOR PROYECTO	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
CONTRATISTA	CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	INDERVALLE
INTERVENTOR	CONSORCIO GRUPO G3		
ITEM	3.3.6 PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	UNIDAD	M3

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo (ML)	Ancho (ML)	Alto (M.)			
	Columnas muros Pantalla	0,20	0,20	0,80	8	M3	0,26
							0,26

ESQUEMA

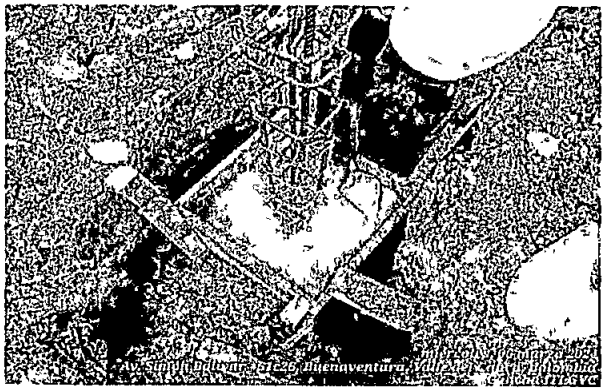

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Brenda Murillo B.

Firma:

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registra la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registra la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
	Vigencia a partir de	01

SOPORTE DEL ACTA No.	5	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 1 DE FEBRERO 2024 AL 1 DE ABRIL DE 2025
OBJETO	MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
CONTRATO No.	IND-23-5027	SUPERVISOR PROYECTO	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
CONTRATISTA	CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	INDERVALLE
INTERVENTOR	CONSORCIO GRUPO G3		
ITEM	3.4.1 MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C	UNIDAD	M2

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo (ML)	Ancho (ML)	Alto (M.)			
	Muros ladrillos	2,00		0,4	12	M2	9,60
							9,60

ESQUEMA

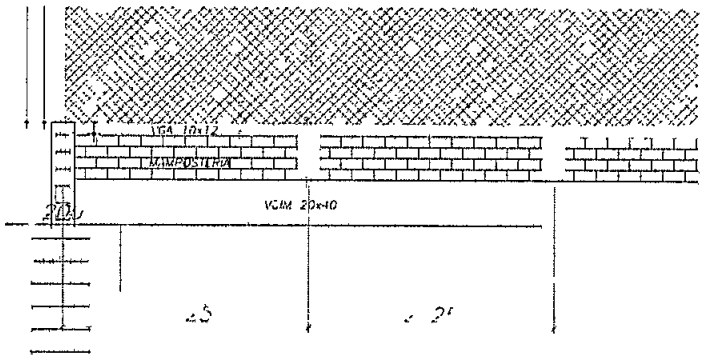

Elaboró
EL CONTRATISTA: Brenda Murillo B.

Firma:

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
	Vigencia a partir de	01

SOPORTE DEL ACTA No.	5	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 1 DE FEBRERO 2024 AL 1 DE ABRIL DE 2025
OBJETO	MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
CONTRATO No.	IND-23-5027	SUPERVISOR PROYECTO	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
CONTRATISTA	CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	INDERVALLE
INTERVENTOR	CONSORCIO GRUPO G3		
ITEM	3.4.2 CINTA CONFINAMIENTO MURO	UNIDAD	ML

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo (ML)	Ancho (ML)	Alto (M.)	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Cinta remate muro	12,75			2	ML	25,50
							25,5

ESQUEMA

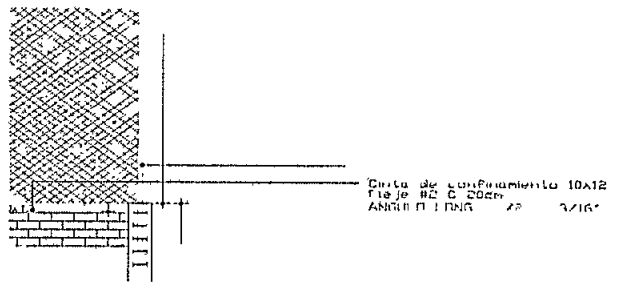

Elaboró
EL CONTRATISTA: Brenda Murillo B.

Firma:

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

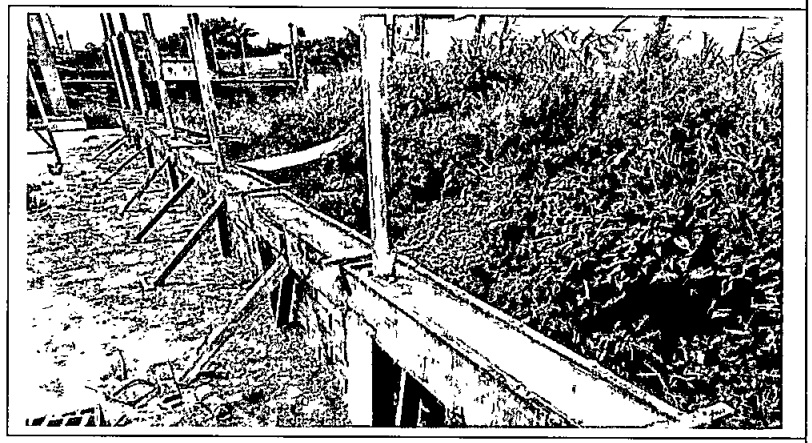

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
	Vigencia a partir de	01

SOPORTE DEL ACTA No.	5	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 1 DE FEBRERO 2024 AL 1 DE ABRIL DE 2025
OBJETO	MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
CONTRATO No.	IND-23-5027	SUPERVISOR PROYECTO	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
CONTRATISTA	CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	INDERVALLE
INTERVENTOR	CONSORCIO GRUPO G3		
ITEM	3.4.3 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	UNIDAD	KLS

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo (ML)	Ancho (ML)	Alto (M.)			
	Long cinta conf.	12,75	0,57		2,00	2,00	29,07
	Estribos Cinta Conf	0,20	0,57		51,00	2,00	11,63
							40,70

ESQUEMA

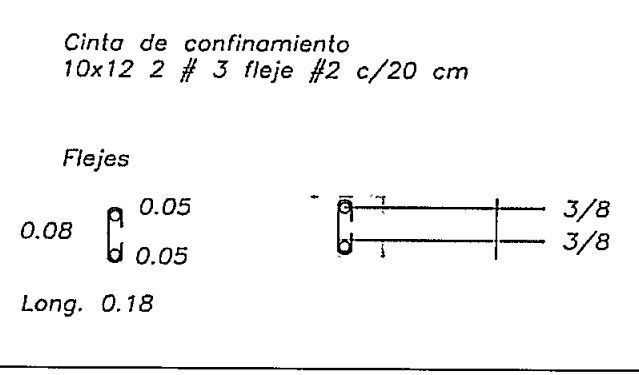

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Brenda Murillo B.

Firma:

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

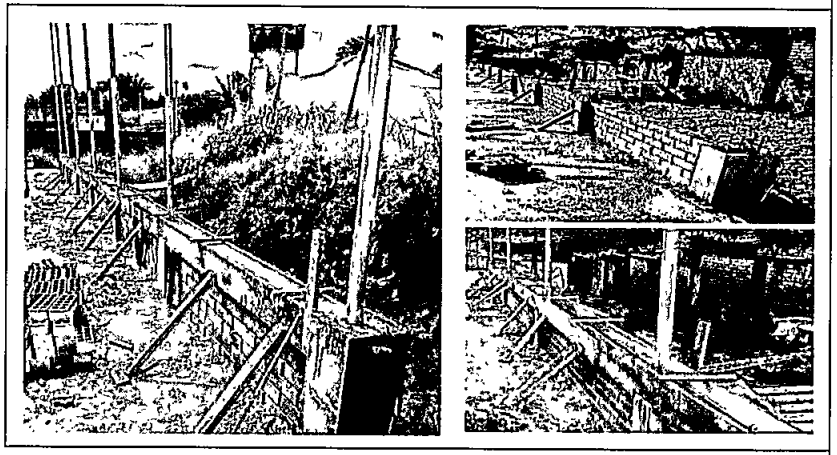

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
	Vigencia a partir de	01

SOPORTE DEL ACTA No.	5	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 1 DE FEBRERO 2024 AL 1 DE ABRIL DE 2025
OBJETO	MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
CONTRATO No.	IND-23-5027	SUPERVISOR PROYECTO	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
CONTRATISTA	CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	INDERVALLE
INTERVENTOR	CONSORCIO GRUPO G3		
ITEM	3.5.2 POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13	UNIDAD	ML

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo (ML)	Ancho (ML)	Alto (M.)			
	Poste vertical			4,80	14	ML	67,20
	Poste Horizontal	12,75			6	ML	
							67,20

ESQUEMA

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma: Brenda Murillo B.

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la Interventoría. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
	Vigencia a partir de	01

SOPORTE DEL ACTA No.	5	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 1 DE FEBRERO 2024 AL 1 DE ABRIL DE 2025
OBJETO	MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
CONTRATO No.	IND-23-5027	SUPERVISOR PROYECTO	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
CONTRATISTA	CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	INDERVALLE
INTERVENTOR	CONSORCIO GRUPO G3		
ITEM	5.4.8 CANAL CONCRETO PISO 50x25x08 CM DOBLE	UNIDAD	ML

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo (ML)	Ancho (ML)	Alto (M.)			
		30,65			1	ML	30,65
							30,65

ESQUEMA

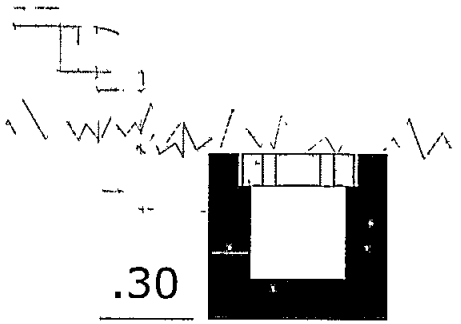

Elaboró
EL CONTRATISTA: Brenda Murillo B.

Firma:

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
	Vigencia a partir de	01

SOPORTE DEL ACTA No.	5	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 1 DE FEBRERO 2024 AL 1 DE ABRIL DE 2025
OBJETO	MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
CONTRATO No.	IND-23-5027	SUPERVISOR PROYECTO	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
CONTRATISTA	CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	INDERVALLE
INTERVENTOR	CONSORCIO GRUPO G3		
ITEM	5.4.10 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	UNIDAD	KLS

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo (ML)	Ancho (ML)	Alto (M.)	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Acero Canal						
	Long	30,50	0,99	7,00	1,00		211,37
	Gancho U	0,80	0,56	77,00	1,00		34,50
	Tapa Camara						
	Radiales	0,50	0,56	20,00	1,00		5,60
	Penmetrales	1,72	0,56	1	2		1,93
		2,29	0,56	1	2		2,56
		2,86	0,56	1	2		3,20
		3,42	0,56	1	2		3,83
		3,98	0,56	1	2		4,46
		4,55	0,56	1	2		5,10
							272,54

ESQUEMA

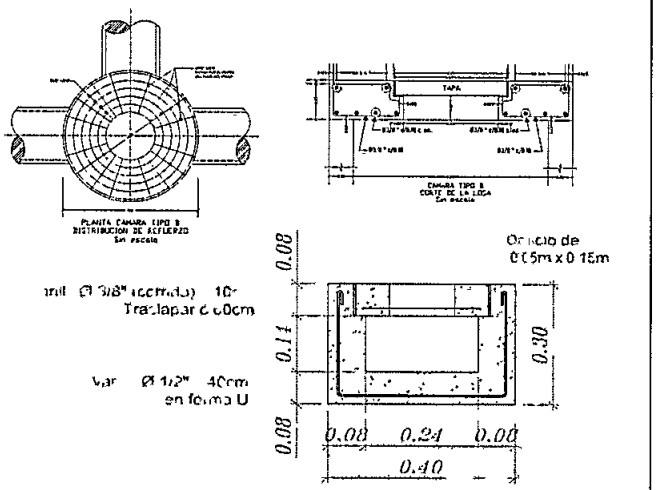

CORTE TRANSVERSAL CANAL CARCAMO EN CONCRETO

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma: Brenda Murillo B.

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

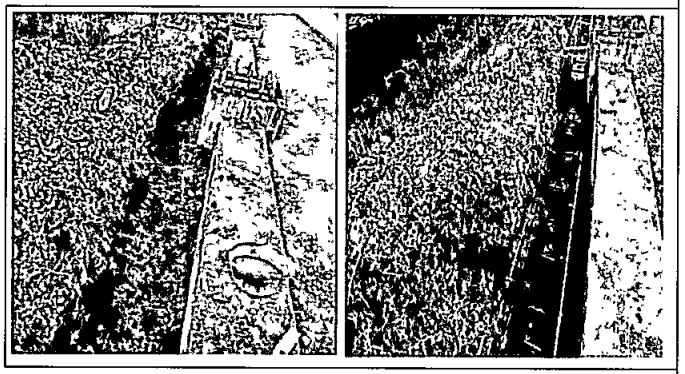

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentra.

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
	Vigencia a partir de	01

SOPORTE DEL ACTA No.	5	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 1 DE FEBRERO 2024 AL 1 DE ABRIL DE 2025
OBJETO	MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
CONTRATO No.	IND-23-5027	SUPERVISOR PROYECTO	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
CONTRATISTA	CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	INDERVALLE
INTERVENTOR	CONSORCIO GRUPO G3		
ITEM	6.1 EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA H=1.8M(SR)	UNIDAD	M3

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo (ML)	Ancho (ML)	Alto (M.)			
		60	0,3	0,4		M3	0,00
	cajas	0,5	0,5	0,5	6		0,75
							0,75

ESQUEMA

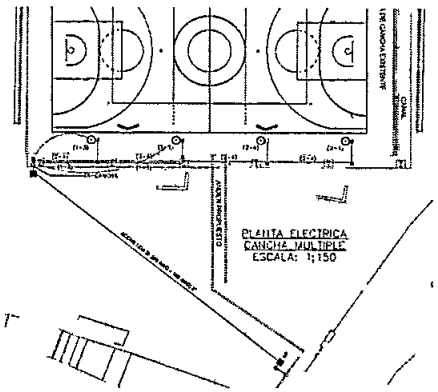

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Brenda Murillo B.

Firma:

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
	Vigencia a partir de	01

SOPORTE DEL ACTA No.	5	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 1 DE FEBRERO 2024 AL 1 DE ABRIL DE 2025
OBJETO	MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
CONTRATO No.	IND-23-5027	SUPERVISOR PROYECTO	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
CONTRATISTA	CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	INDERVALLE
INTERVENTOR	CONSORCIO GRUPO G3		
ITEM	6.25 CAJA ELECTRICA 0,3 X 0,3 X 0,5 MT + TAPA	UNIDAD	UND

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo (ML)	Ancho (ML)	Alto (M.)			
					6	UNIDAD	6,00
							6,00

ESQUEMA

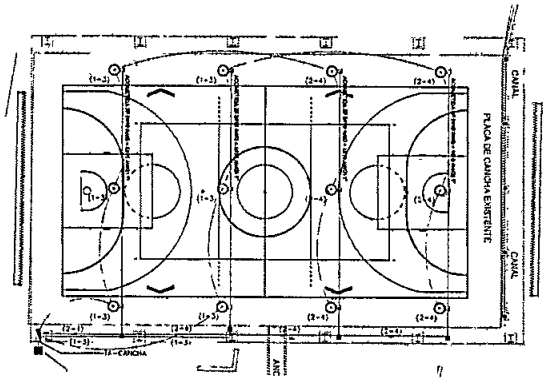

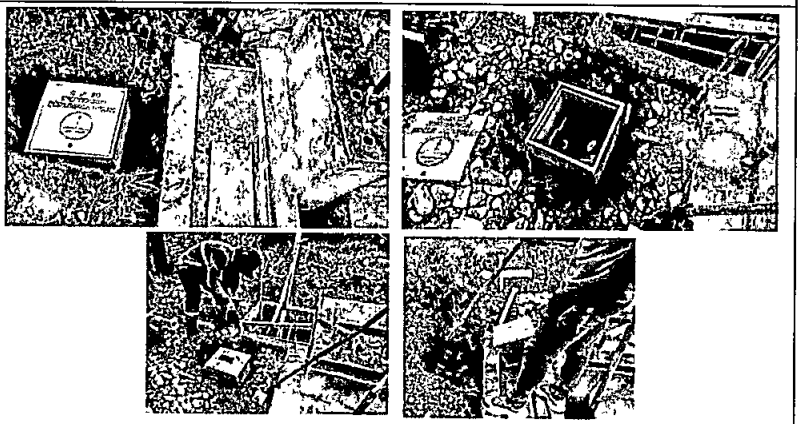

Elaboró
EL CONTRATISTA: Brenda Murillo B.

Firma:

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° IND - 23 - 5027

CONTRATANTE: INDERVALLE **NIT. 805.012.896-4** ORDENADOR DEL GASTO: JUAN **CARLOS RUEDA ANGEL C.C. 94.501.292**

CONTRATISTA: CONSTRUPACICOL S A S ZOMAC **NIT. 901.526.894-4**
REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO **C.C. 1.006.166.501**

INTERVENTOR: CONSORCIO GRUPO 3 **NIT. 901.769.200-6** REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ. **C.C. 16.700.426**

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR TOTAL $	$1.426.801.042 M/CTE – INCLUIDO AIU					
PLAZO	6 MESES	185 DÍAS				
FECHA DE INICIO	28-dic-23					
	4-nov-24	186 DÍAS		HASTA: 9-mayo-25	9/05/2025	186
SUSPENSION 1		DEL: 14 junio 2024	14/06/2024	HASTA: 22-agosto-24	22/08/2024	70
REINICIO N° 1		DEL: 23-agosto-24	23/08/2024	HASTA: 25-agosto-24	25/08/2024	3
SUSPENSION 2		DEL: 26-agosto-24	26/08/2024	HASTA: 14-octubre-24	14/10/2024	50
REINICIO N° 2		DEL: 15-octubre-24	15/10/2024	HASTA: 22-octubre-24	22/10/2024	8
SUSPENSION 3		DEL: 22-octubre-24	22/10/2024	HASTA:4-noviembre-24	4/11/2024	13
REINICIO N° 3		DEL: 4-nobviembre-24	4/11/2024	HASTA: 9-mayo-25	9/05/2025	186

2. INFORMACION BASICA DEL FRENTE DE OBRA

FRENTE No. 01: CUBIERTA CANCHA MULTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO

VALOR COSTOS TOTALES:	$1 867 899 794				
Informe N°:	37	Fecha de informe:	30/12/2024	A	5/01/2025

INFORMACION GENERAL

CONTRATISTA DE OBRA

Valor frente de obra.	$1.426.801.042
Adiciones o mayor valor:	$441.098.752
Valor total:	$1.867.899.794
Fecha de Inicio	28/12/2023
Tiempo de prorrogas	186 dias
Tiempo de suspensiones	133 dias
Plazo estipulado:	371 dias
Fecha de terminacion:	9/05/2025
Tiempo transcurrido contrato:	241 dias

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Fecha de Inicio:	28/12/2023
Tiempo de prorrogas:	186 dias
Tiempo de suspensiones.	133 dias
Plazo actualizado	371 dias
Fecha de terminacion:	9/05/2025
Tiempo transcurrido interventoria:	241 dias

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FISICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso
% Programado	53,00%	2,24%	55,24%	3
% Ejecutado	59,60%	1,00%	60,60%	0
Diferencia	-6,60%	-1,24%	5,36%	

AVANCE FINANCIERO

				En %
Programado(%)	$989.986.891	$41.840.958	$1.031.827.849	55,24%
Ejecutado (%)	$1.113.268.277	$18.678.998	$1.131.947.275	60,60%
Diferencia	$123.281.386	-$23.161.960	$100.119.426	5,36%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoria:	Ingeniero Residente e inspector
Contratista:	Arquitecto Residente de obra y cuatro obreros

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Herramienta menor
soldadores
Cilindro compactador

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	S/N/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	Interventor	S
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	Interventor	S
Normas ambientales	Interventor	S

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1: Corte transversal del pavimento.

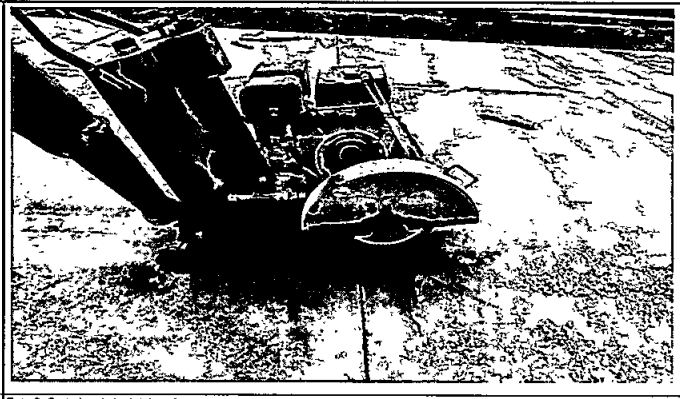

Foto 2: Corte longitudinal del pavimento

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 5 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

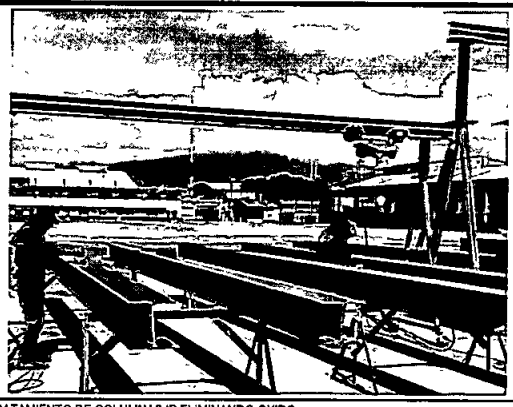

Foto 3:TRATAMIENTO DE COLUMNAS IP ELIMINANDO OXIDO

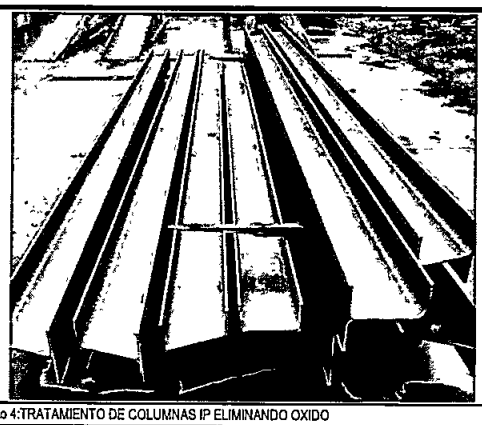

Foto 4:TRATAMIENTO DE COLUMNAS IP ELIMINANDO OXIDO

Foto 5: Colocacion antisol y fundicion de pavimento.

Foto 6: Compactación y nivelación de terreno

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
LUNES: - Se realizó grateada de columnas en perfil Ipe, corte y pintura anticorrosivo.	
MARTES: - Se realizó grateada de columnas en perfil Ipe, corte y pintura anticorrosivo.	
MIERCOLES: - FESTIVO	
JUEVES: - Se realizó grateada de columnas en perfil Ipe, corte y pintura anticorrosivo.	
VIERNES: - Se realizó grateada de columnas en perfil Ipe, corte y pintura anticorrosivo.	
SABADO: - Se realizó grateada de columnas en perfil Ipe, corte y pintura anticorrosivo.	
DOMINGO: No se realizan actividades en la obra el día de hoy.	

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:
La obra presenta una ejecución 241 dias con respecto al cronograma programado

2. Disponibilidad de Recursos:
Se cuenta con la maquinaria y equipos menores necesarios para las actividades preliminares

3. Ejecución Financiera:
Se realiza actividades correspondientes a lo programado, donde se efectua una inversion total de $1.184.248.469

4. Calidad de los trabajos:
Hasta el momento los trabajos ejecutados son aceptados por la interventoría

5. Manejo Ambiental:
La obra ya cuenta con los certificados de botadero de residuos y materiales sobrantes

6. Seguridad Industrial:
los trabajadores cuentan con sus elementos de seguridad industrial, tanto personal de la obra como los profesionales de campo

7. Programa salud ocupacional (si aplica):
Se cuenta con el profesional de seguridad y salud en el trabajo (SISO)

8. Aspectos sociales:

OBSERVACIONES:

* No se presentan observaciones de la obra para el periodo del presente informe

Aprobado por:

FIRMA EL CONTRATISTA
NOMBRE: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
CARGO: REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

VoBo (FIRMA)
NOMBRE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° IND - 23 - 5027

CONTRATANTE: INDERVALLE **NIT. 805.012.896-4** ORDENADOR DEL GASTO: JUAN **CARLOS RUEDA ANGEL C.C. 94.501.292**

CONTRATISTA: CONSTRUPACICOL S.A.S ZOMAC **NIT. 901.526.894-4**
REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO **C.C. 1.006.166.501**

INTERVENTOR: CONSORCIO GRUPO 3 **NIT. 901.769.200-6** REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ. **C.C. 16.700.426**

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR TOTAL $	$1.426.801.042 M/CTE – INCLUIDO AIU					
PLAZO	6 MESES	185 DÍAS				
FECHA DE INICIO	28-dic-23					
	4-nov-24	186 DÍAS		HASTA: 9-mayo-25	9/05/2025	186
SUSPENSION 1		DEL: 14 junio 2024	14/06/2024	HASTA: 22-agosto-24	22/08/2024	70
REINICIO N° 1		DEL: 23-agosto-24	23/08/2024	HASTA: 25-agosto-24	25/08/2024	3
SUSPENSION 2		DEL: 26-agosto-24	26/08/2024	HASTA: 14-octubre-24	14/10/2024	50
REINICIO N° 2		DEL: 15-octubre-24	15/10/2024	HASTA: 22-octubre-24	22/10/2024	8
SUSPENSION 3		DEL: 22-octubre-24	22/10/2024	HASTA:4-noviembre-24	4/11/2024	13
REINICIO N° 3		DEL: 4-nobviembre-24	4/11/2024	HASTA: 9-mayo-25	9/05/2025	186

2. INFORMACION BASICA DEL FRENTE DE OBRA

FRENTE No. 01: CUBIERTA CANCHA MULTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO

VALOR COSTOS TOTALES: $1 867 899 794

Informe N°: 38 Fecha de informe: 6/01/2025 A 12/01/2025

INFORMACION GENERAL

CONTRATISTA DE OBRA

Valor frente de obra:	$1.426.801.042
Adiciones o mayor valor:	$441.098.752
Valor total:	$1.867.899.794
Fecha de Inicio	28/12/2023
Tiempo de prorrogas	186 dias
Tiempo de suspensiones	133 dias
Plazo estipulado.	371 dias
Fecha de terminacion.	9/05/2025
Tiempo transcurrido contrato:	248 dias

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Fecha de Inicio:	28/12/2023
Tiempo de prorrogas:	186 dias
Tiempo de suspensiones:	133 dias
Plazo actualizado	371 dias
Fecha de terminacion:	9/05/2025
Tiempo transcurrido Interventoria:	248 dias

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FISICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso
% Programado	55,24%	2,24%	57,48%	3
% Ejecutado	60,60%	1,00%	61,60%	0
Diferencia	-5,36%	-1,24%	4,12%	

AVANCE FINANCIERO

				En %
Programado(%)	$1.031.827.846	$41.840.958	$1.073.668.805	57,48%
Ejecutado (%)	$1.131.947.275	$18.678.998	$1.150.626.273	61,60%
Diferencia	$100.119.429	-$23.161.960	$76.957.469	4,12%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoria:	Ingeniero Residente e inspector
Contratista:	Arquitecto Residente de obra y cuatro obreros

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Herramienta menor
Mini cargador (Bobcat)
Cilindro compactador

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	Interventor	S
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	Interventor	S
Normas ambientales	Interventor	S

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

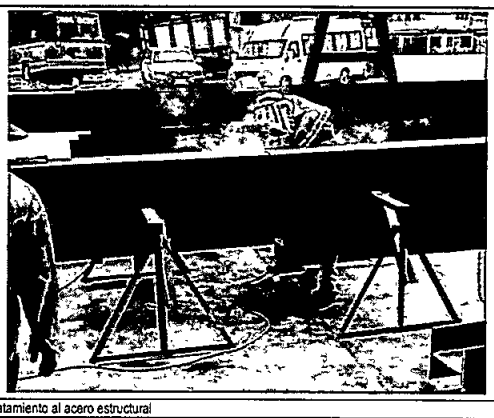

Foto 1: corte y tratamiento al acero estructural

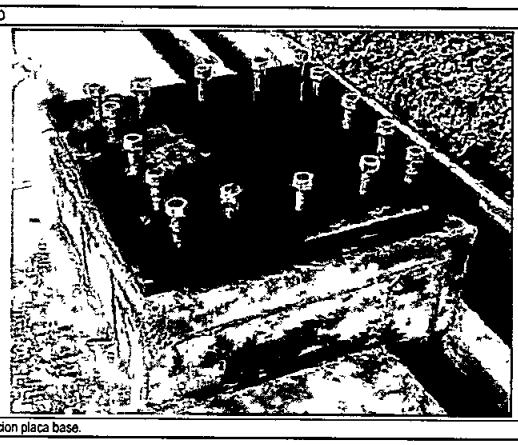

Foto 2: instalacion placa base.

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

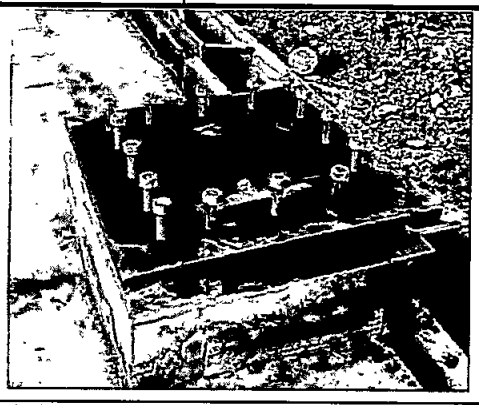

Foto 3: Instalacion placa base.

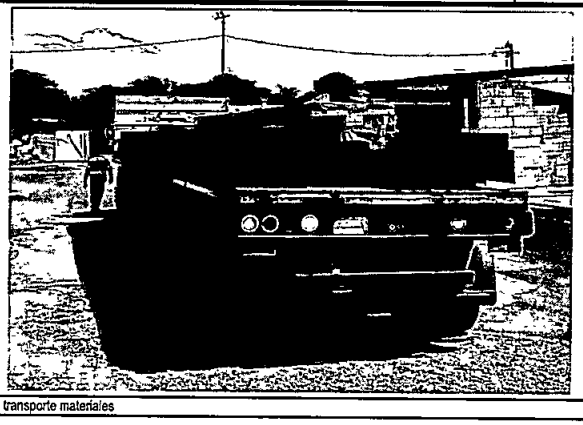

Foto 4: transporte materiales

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
LUNES: - FESTIVO	
MARTES: - actividades de instalacion d eplaca base y acero estructural .	
MIERCOLES: - actividades de instalacion d eplaca base y acero estructural .	
JUEVES: -Sactividades de instalacion d eplaca base y acero estructural .	
VIERNES: - actividades de instalacion d eplaca base y acero estructural .	
SABADO: - actividades de instalacion d eplaca base y acero estructural .	
DOMINGO: No se realizan actividades en la obra el día de hoy	

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:
La obra presenta una ejecución 248 dias con respecto al cronograma programado

2. Disponibilidad de Recursos:
Se cuenta con la maquinaria y equipos menores necesarios para las actividades preliminares

3. Ejecución Financiera:
Se realiza actividades correspondientes a lo programado, donde se efectua una inversion total de $1.202.927.467

4. Calidad de los trabajos:
Hasta el momento los trabajos ejecutados son aceptados por la interventoria.

5. Manejo Ambiental:
La obra ya cuenta con los certificados de botadero de residuos y materiales sobrantes.

6. Seguridad Industrial:
los trabajadores cuentan con sus elementos de seguridad industrial, tanto personal de la obra como los profesionales de campo

7. Programa salud ocupacional (si aplica):
Se cuenta con el profesional de seguridad y salud en el trabajo (SISO)

8. Aspectos sociales:

OBSERVACIONES:

* No se presentan observaciones de la obra para el periodo del presente informe

FIRMA EL CONTRATISTA
NOMBRE: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
CARGO: REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

Aprobado por:
VoBo (FIRMA)
NOMBRE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° IND - 23 - 5027

CONTRATANTE: INDERVALLE **NIT. 805.012.896-4** ORDENADOR DEL GASTO: JUAN **CARLOS RUEDA ANGEL C.C. 94.501.292**

CONTRATISTA: CONSTRUPACICOL S.A.S ZOMAC **NIT. 901.526.894-4**
REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO C.C. 1.006.166.501

INTERVENTOR: CONSORCIO GRUPO 3 **NIT. 901.769.200-6** REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ. **C.C. 16.700.426**

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS. MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR TOTAL $	$1.426.801.042 M/CTE – INCLUIDO AIU					
PLAZO	6 MESES	185 DÍAS				
FECHA DE INICIO	28-dic-23					
	4-nov-24	186 DÍAS		HASTA: 9-mayo-25	9/05/2025	186
SUSPENSION 1		DEL: 14 junio 2024	14/06/2024	HASTA: 22-agosto-24	22/08/2024	70
REINICIO N° 1		DEL: 23-agosto-24	23/08/2024	HASTA: 25-agosto-24	25/08/2024	3
SUSPENSION 2		DEL: 26-agosto-24	26/08/2024	HASTA: 14-octubre-24	14/10/2024	50
REINICIO N° 2		DEL: 15-octubre-24	15/10/2024	HASTA: 22-octubre-24	22/10/2024	8
SUSPENSION 3		DEL: 22-octubre-24	22/10/2024	HASTA:4-noviembre-24	4/11/2024	13
REINICIO N° 3		DEL: 4-nobviembre-24	4/11/2024	HASTA: 9-mayo-25	9/05/2025	186

2. INFORMACION BASICA DEL FRENTE DE OBRA

FRENTE No. 01: CUBIERTA CANCHA MULTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO

VALOR COSTOS TOTALES $1 867 899 794

Informe N°: 39 Fecha de informe: 13/01/2025 A 19/01/2025

INFORMACION GENERAL

CONTRATISTA DE OBRA

Valor frente de obra:	$1.426.801.042
Adiciones o mayor valor:	$441.098.752
Valor total:	$1.867 899.794
Fecha de Inicio	28/12/2023
Tiempo de prorrogas	186 dias
Tiempo de suspensiones	133 dias
Plazo estipulado:	371 dias
Fecha de terminacion:	9/05/2025
Tiempo transcurrido contrato:	255 dias

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Fecha de Inicio:	28/12/2023
Tiempo de prorrogas:	186 dias
Tiempo de suspensiones:	133 dias
Plazo actualizado	371 dias
Fecha de terminacion:	9/05/2025
Tiempo transcurrido Interventoria:	255 dias

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FISICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso
% Programado	57,48%	2,24%	59,72%	2
% Ejecutado	61,60%	1,00%	62,60%	0
Diferencia	-4,12%	-1,24%	2,88%	

AVANCE FINANCIERO

				En %
Programado(%)	$1.073.668.802	$41.840.958	$1.115.509.760	59,72%
Ejecutado (%)	$1.150.626.273	$18.678.998	$1.169.305.271	62,60%
Diferencia	$76.957.472	-$23.161.960	$53.795.511	2,88%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoria:	Ingeniero Residente e inspector
Contratista:	Arquitecto Residente de obra y cuatro obreros

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Herramienta menor
Mini cargador (Bobcat)
Cilindro compactador

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	S/N/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	Interventor	S
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	Interventor	S
Normas ambientales	Interventor	S

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

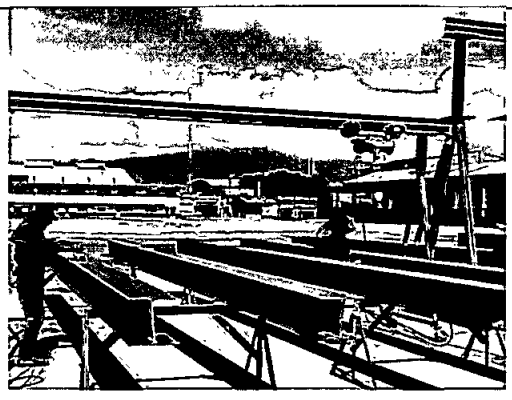

Foto 1: corte y tratamiento al acero estructural

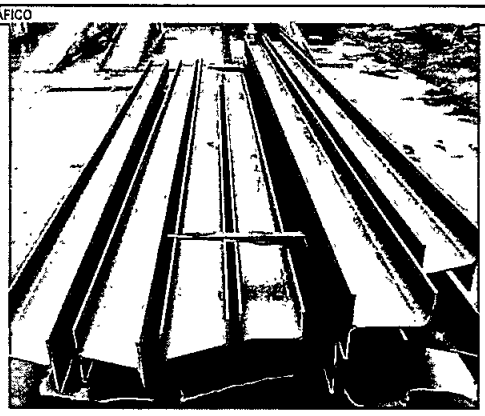

Foto 2: corte y tratamiento al acero estructural

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

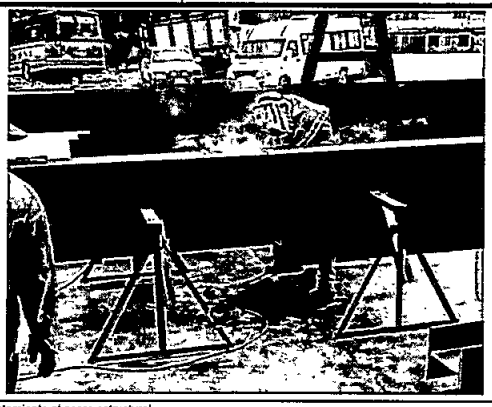

Foto 3: corte y tratamiento al acero estructural

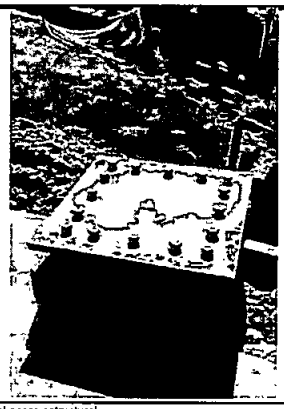

Foto 4: corte y tratamiento al acero estructural

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
LUNES: - **Se reinicia la obra con la excavación manual para cuneta**	
MARTES: - actividades de instalacion d eplaca base y acero estructural .	
MIERCOLES: - actividades de instalacion d eplaca base y acero estructural .	
JUEVES: - factividades de instalacion d eplaca base y acero estructural .	
VIERNES: --actividades de instalacion d eplaca base y acero estructural .	
SABADO: - -actividades de instalacion d eplaca base y acero estructural .	
DOMINGO: No se realizan actividades en la obra el día de hoy	

LOGROS Y/O DIFICULTADES
1. Cronograma:
La obra presenta una ejecución 255 dias con respecto al cronograma programado
2. Disponibilidad de Recursos:
Se cuenta con la maquinaria y equipos menores necesarios para las actividades preliminares
3. Ejecución Financiera:
Se realiza actividades correspondientes a lo programado, donde se efectua una inversion total de $1.221.606.465
4. Calidad de los trabajos:
Hasta el momento los trabajos ejecutados son aceptados por la interventoria
5. Manejo Ambiental:
La obra ya cuenta con los certificados de botadero de residuos y materiales sobrantes.
6. Seguridad Industrial:
los trabajadores cuentan con sus elementos de segundad industrial, tanto personal de la obra como los profesionales de campo
7. Programa salud ocupacional (si aplica):
Se cuenta con el profesional de seguridad y salud en el trabajo (SISO)
8. Aspectos sociales:

OBSERVACIONES:
* No se presentan observaciones de la obra para el periodo del presente informe.

FIRMA EL CONTRATISTA	Aprobado por:
NOMBRE: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO	VoBo (FIRMA)
CARGO: REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
	CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° IND - 23 - 5027

CONTRATANTE: INDERVALLE **NIT. 805.012.896-4** ORDENADOR DEL GASTO: JUAN **CARLOS RUEDA ANGEL C.C. 94.501.292**

CONTRATISTA: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC **NIT. 901.526.894-4**
REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO **C.C. 1.006.166.501**

INTERVENTOR: CONSORCIO GRUPO 3 **NIT. 901.769.200-6** REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ. **C.C. 16.700.426**

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR TOTAL $	$1.426.801.042 M/CTE – INCLUIDO AIU					
PLAZO	6 MESES	185 DÍAS				
FECHA DE INICIO	28-dic-23					
	4-nov-24	186 DÍAS		HASTA: 9-mayo-25	9/05/2025	186
SUSPENSION 1		DEL: 14 junio 2024	14/06/2024	HASTA: 22-agosto-24	22/08/2024	70
REINICIO N° 1		DEL: 23-agosto-24	23/08/2024	HASTA: 25-agosto-24	25/08/2024	3
SUSPENSION 2		DEL: 26-agosto-24	26/08/2024	HASTA: 14-octubre-24	14/10/2024	50
REINICIO N° 2		DEL: 15-octubre-24	15/10/2024	HASTA: 22-octubre-24	22/10/2024	8
SUSPENSION 3		DEL: 22-octubre-24	22/10/2024	HASTA:4-noviembre-24	4/11/2024	13
REINICIO N° 3		DEL: 4-nobviembre-24	4/11/2024	HASTA: 9-mayo-25	9/05/2025	186

2. INFORMACION BASICA DEL FRENTE DE OBRA

FRENTE No. 01: CUBIERTA CANCHA MULTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO

VALOR COSTOS TOTALES: $1 867 899.794

Informe N°: 40 Fecha de informe: 20/01/2025 A 26/01/2025

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA DE OBRA

Valor frente de obra:	$1.426.801.042
Adiciones o mayor valor:	$441.098.752
Valor total:	$1.867.899.794
Fecha de Inicio	28/12/2023
Tiempo de prorrogas	186 días
Tiempo de suspensiones	133 días
Plazo estipulado:	371 días
Fecha de terminacion	9/05/2025
Tiempo transcurrido contrato:	262 días

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Fecha de Inicio:	28/12/2023
Tiempo de prorrogas:	186 días
Tiempo de suspensiones	133 días
Plazo actualizado	371 días
Fecha de terminacion	9/05/2025
Tiempo transcurrido Interventoria:	262 días

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FISICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso
% Programado	59,72%	2,24%	61,96%	1
% Ejecutado	62,60%	1,00%	63,60%	0
Diferencia	-2,88%	-1,24%	1,64%	

AVANCE FINANCIERO

				En %
Programado(%)	$1.115.509.757	$41.840.958	$1.157.350.715	61,96%
Ejecutado (%)	$1.169.305.271	$18.678.998	$1.187.984.269	63,60%
Diferencia	$53.795.514	-$23.161.960	$30.633.554	1,64%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoria:	Ingeniero Residente e Inspector
Contratista:	Arquitecto Residente de obra y cuatro obreros

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Herramienta menor

Mini cargador (Bobcat)

Cilindro compactador

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	S/N/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	Interventor	S
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	Interventor	S
Normas ambientales	Interventor	S

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1: corte y tratamiento al acero estructural

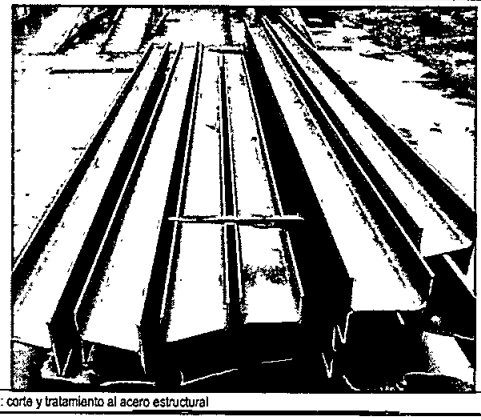

Foto 2: corte y tratamiento al acero estructural

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

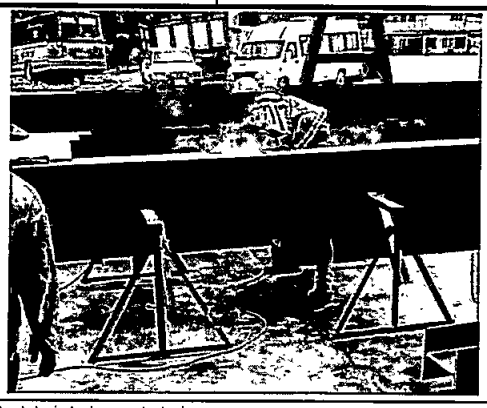

Foto 3: corte y tratamiento al acero estructural

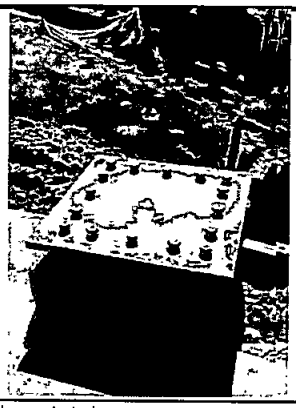

Foto 4: corte y tratamiento al acero estructural

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
LUNES: Se realizó corte y colocación de respectivo acero refuerzo, fundición de un tramo de losa de la cancha con su respectiva aplicación de antisol y toma de la muetra de concreto para su respectivo fallo	
MARTES: - Se realizó corte y colocación de respectivo acero refuerzo, fundición de un tramo de losa de la cancha con su respectiva aplicación de antisol y toma de la muetra de concreto para su respectivo fallo.	
MIERCOLES: - Se realizó desencofrado y encofrado de formaleta metálica, nivelación y conformación de terreno para fundicion de un tramo de losa de la cancha.	
JUEVES: - Se realizó nivelación y conformación de terreno para fundicion de un tramo de losa de la cancha.	
VIERNES: - Se realizó corte y colocación de respectivo acero refuerzo y fundicion de un tramo de losa de la cancha.	
SABADO: - Se realizó fundicion de un tramo de losa de la cancha y corte de paños con máquina para corte de concreto	
DOMINGO: No se realizan actividades en la obra el dia de hoy	

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:

La obra presenta una ejecución 262 días con respecto al cronograma programado

2. Disponibilidad de Recursos:

Se cuenta con la maquinaria y equipos menores necesarios para las actividades preliminares

3. Ejecución Financiera:

Se realiza actividades correspondientes a lo programado, donde se efectua una inversion total de $1.240.285.463

4. Calidad de los trabajos:

Hasta el momento los trabajos ejecutados son aceptados por la interventoria

5. Manejo Ambiental:

La obra ya cuenta con los certificados de botadero de residuos y materiales sobrantes.

6. Seguridad Industrial:

los trabajadores cuentan con sus elementos de seguridad industrial, tanto personal de la obra como los profesionales de campo

7. Programa salud ocupacional (si aplica):

Se cuenta con el profesional de seguridad y salud en el trabajo (SISO)

8. Aspectos sociales:

OBSERVACIONES:

* No se presentan observaciones de la obra para el periodo del presente informe.

Aprobado por:

FIRMA EL CONTRATISTA
NOMBRE: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
CARGO: REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

VoBo (FIRMA)
NOMBRE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° IND - 23 - 5027

CONTRATANTE: INDERVALLE **NIT. 805.012.896-4** ORDENADOR DEL GASTO: JUAN **CARLOS RUEDA ANGEL C.C. 94.501.292**

CONTRATISTA: CONSTRUPACICOL S.A.S ZOMAC **NIT. 901.526.894-4**
REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO **C.C.** 1 006.166.501

INTERVENTOR: CONSORCIO GRUPO 3 **NIT. 901.769.200-6** REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ. **C.C. 16.700.426**

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS· MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1 ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR TOTAL $	$1.426.801.042 M/CTE – INCLUIDO AIU					
PLAZO	6 MESES	185 DÍAS				
FECHA DE INICIO	28-dic-23					
	4-nov-24	186 DÍAS		HASTA: 9-mayo-25	9/05/2025	186
SUSPENSION 1		DEL: 14 junio 2024	14/06/2024	HASTA: 22-agosto-24	22/08/2024	70
REINICIO N° 1		DEL: 23-agosto-24	23/08/2024	HASTA: 25-agosto-24	25/08/2024	3
SUSPENSION 2		DEL: 26-agosto-24	26/08/2024	HASTA: 14-octubre-24	14/10/2024	50
REINICIO N° 2		DEL: 15-octubre-24	15/10/2024	HASTA: 22-octubre-24	22/10/2024	8
SUSPENSION 3		DEL: 22-octubre-24	22/10/2024	HASTA:4-noviembre-24	4/11/2024	13
REINICIO N° 3		DEL: 4-nobviembre-24	4/11/2024	HASTA: 9-mayo-25	9/05/2025	186

2. INFORMACION BASICA DEL FRENTE DE OBRA

FRENTE No. 01: CUBIERTA CANCHA MULTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO

VALOR COSTOS TOTALES· $1 867 899.794

Informe N° 41 Fecha de informe: 27/01/2025 A 2/02/2025

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA DE OBRA

Valor frente de obra.	$1.426 801 042
Adiciones o mayor valor:	$441 098.752
Valor total:	$1.867.899 794
Fecha de Inicio	28/12/2023
Tiempo de prorrogas	186 dias
Tiempo de suspensiones	133 dias
Plazo estipulado	371 dias
Fecha de terminacion.	9/05/2025
Tiempo transcurrido contrato·	269 dias

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Fecha de Inicio	28/12/2023
Tiempo de prorrogas	186 dias
Tiempo de suspensiones	133 dias
Plazo actualizado	371 dias
Fecha de terminacion	9/05/2025
Tiempo transcurrido Interventona:	269 dias

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FISICO (%)

Avance	Acum Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso
% Programado	61,96%	2,24%	64,20%	0
% Ejecutado	63,60%	1,00%	64,60%	0
Diferencia	-1,64%	-1,24%	0,40%	

AVANCE FINANCIERO

				En %
Programado(%)	$1.157.350.712	$41.840.958	$1.199.191.671	64,20%
Ejecutado (%)	$1.187.984.269	$18.678.998	$1.206.663.267	64,60%
Diferencia	$30.633.557	-$23.161.960	$7.471.596	0,40%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	Ingeniero Residente e inspector
Contratista:	Arquitecto Residente de obra y cuatro obreros

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Herramienta menor

Mini cargador (Bobcat)

Cilindro compactador

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	Interventor	S
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	Interventor	S
Normas ambientales	Interventor	S

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

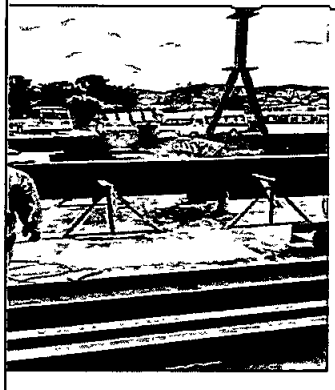

Foto 1· Corte y colocación acero refuerzo.

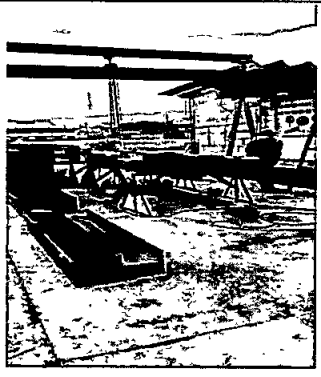

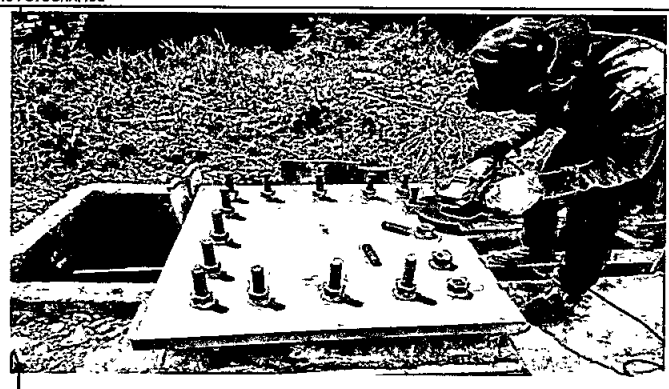

Foto 2· Corte y colocación acero refuerzo

INDERVALLE

CG3

CONSORCIO GRUPO 3
INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

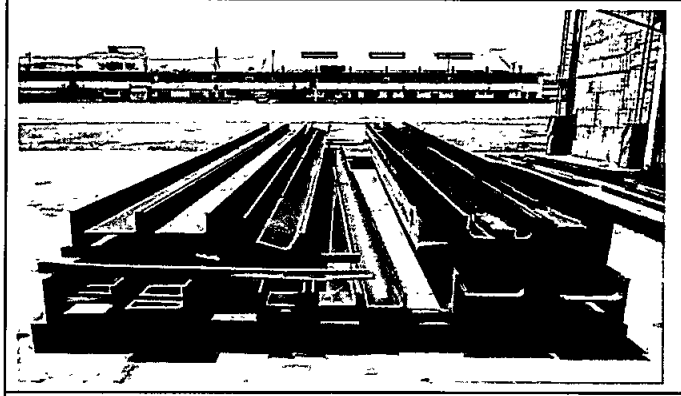

Foto 5: Estructura metalica para columnas.

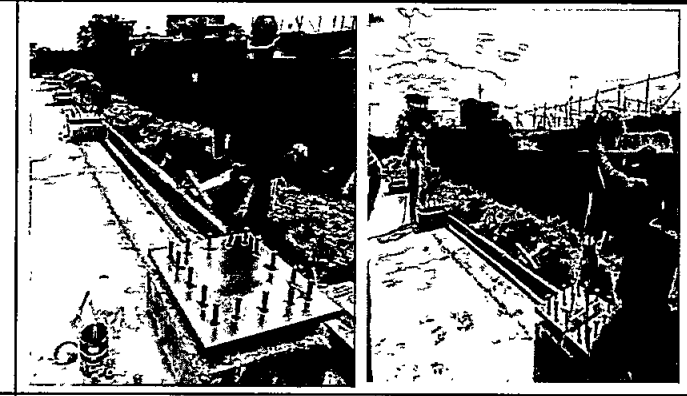

Foto 4: Fundicion de un tramo de losa de la cancha.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
LUNES: -Se realizó la limpieza de los tornillos para sopcete de columnas metalicas.	
MARTES: -Instalacion de base metalica para la colocacion de columnas metalica.	
MIERCOLES: -Se continua con el corte y la soldadura de columnas metalica en sitio de taller.	
JUEVES: -Se nivela las platinas y se aplieta las tuercas ya niveladas.	
VIERNES: -Se pinta todas las bases de la platina.	
SABADO: -Se realizan los cortes faltantes del pavimento.	
DOMINGO: No se realizan actividades en la obra el día de hoy.	

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:
La obra presenta una ejecución 269 días con respecto al cronograma programado

2. Disponibilidad de Recursos:
Se cuenta con la maquinaria y equipos menores necesarios para las actividades preliminares

3. Ejecución Financiera:
Se realiza actividades correspondientes a lo programado, donde se efectua una inversion total de $1.258.964.461

4. Calidad de los trabajos:
Hasta el momento los trabajos ejecutados son aceptados por la interventoría

5. Manejo Ambiental:
La obra ya cuenta con los certificados de botadero de residuos y materiales sobrantes.

6. Seguridad Industrial:
los trabajadores cuentan con sus elementos de seguridad industrial, tanto personal de la obra como los profesionales de campo

7. Programa salud ocupacional (si aplica):
Se cuenta con el profesional de seguridad y salud en el trabajo (SISO)

8. Aspectos sociales:

OBSERVACIONES:

* No se presentan observaciones de la obra para el periodo del presente informe.

FIRMA EL CONTRATISTA
NOMBRE: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
CARGO: REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

Aprobado por:
VoBo (FIRMA)
NOMBRE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° IND - 23 - 5027

CONTRATANTE: INDERVALLE **NIT. 805.012.896-4** ORDENADOR DEL GASTO: JUAN **CARLOS RUEDA ANGEL C.C. 94.501.292**

CONTRATISTA: CONSTRUPACICOL S.A.S ZOMAC **NIT. 901.526.894-4**
REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO **C.C. 1.006.166.501**

INTERVENTOR: CONSORCIO GRUPO 3 **NIT. 901.769.200-6** REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ. **C.C. 16.700.426**

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR TOTAL $	$1.426.801.042 M/CTE – INCLUIDO AIU					
PLAZO	6 MESES	185 DÍAS				
FECHA DE INICIO	28-dic-23					
	4-nov-24	186 DÍAS		HASTA: 9-mayo-25	9/05/2025	186
SUSPENSION 1		DEL: 14 junio 2024	14/06/2024	HASTA: 22-agosto-24	22/08/2024	70
REINICIO N° 1		DEL: 23-agosto-24	23/08/2024	HASTA: 25-agosto-24	25/08/2024	3
SUSPENSION 2		DEL: 26-agosto-24	26/08/2024	HASTA: 14-octubre-24	14/10/2024	50
REINICIO N° 2		DEL: 15-octubre-24	15/10/2024	HASTA: 22-octubre-24	22/10/2024	8
SUSPENSION 3		DEL: 22-octubre-24	22/10/2024	HASTA:4-noviembre-24	4/11/2024	13
REINICIO N° 3		DEL: 4-nobviembre-24	4/11/2024	HASTA: 9-mayo-25	9/05/2025	186

2. INFORMACION BASICA DEL FRENTE DE OBRA

FRENTE No. 01: CUBIERTA CANCHA MULTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO

VALOR COSTOS TOTALES $1 867 899.794

Informe N° 42 Fecha de informe: 3/02/2025 A 9/02/2025

INFORMACION GENERAL

CONTRATISTA DE OBRA

Valor frente de obra:	$1.426.801.042
Adiciones o mayor valor:	$441.098.752
Valor total:	$1.867.899.794
Fecha de inicio	28/12/2023
Tiempo de prorrogas	186 dias
Tiempo de suspensiones	133 dias
Plazo estipulado:	371 dias
Fecha de terminacion.	9/05/2025
Tiempo transcurrido contrato:	276 dias

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Fecha de Inicio	28/12/2023
Tiempo de prorrogas:	186 dias
Tiempo de suspensiones:	133 dias
Plazo actualizado:	371 dias
Fecha de terminacion:	9/05/2025
Tiempo transcurrido Interventona:	276 dias

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FISICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso
% Programado	64,20%	2,75%	66,95%	-1
% Ejecutado	64,60%	1,00%	65,60%	0
Diferencia	-0,40%	-1,75%	-1,35%	

AVANCE FINANCIERO

				En %
Programado(%)	$1.199.191.668	$51.367.247	$1.250.558.915	66,95%
Ejecutado (%)	$1.206.663.267	$18.678.998	$1.225.342.265	65,60%
Diferencia	$7.471.599	-$32.688.249	-$25.216.650	-1,35%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoria:	Ingeniero Residente e inspector
Contratista:	Arquitecto Residente de obra y cuatro obreros

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Herramienta menor
Mini cargador (Bobcat)
Cilindro compactador

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	S/N/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	Interventor	S
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	Interventor	S
Normas ambientales	Interventor	S

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

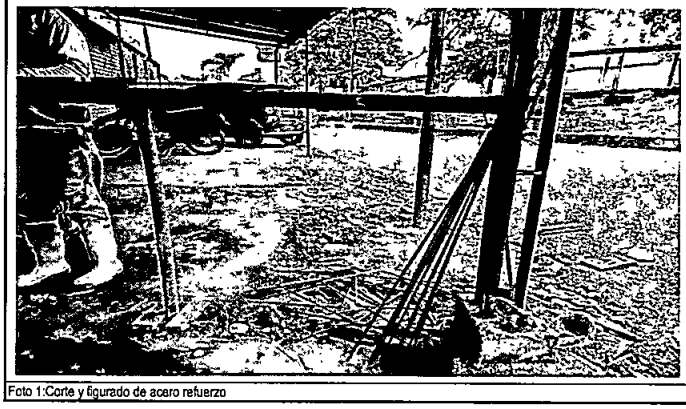

Foto 1:Corte y figurado de acero refuerzo

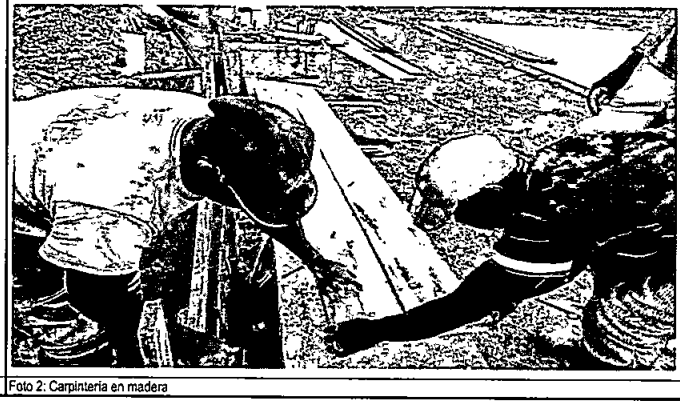

Foto 2: Carpinteria en madera

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Foto 3: Fundición de losa cuneta

Foto 4: Fundición muro cuneta

Foto 5: Reconstrucción caja de inspección

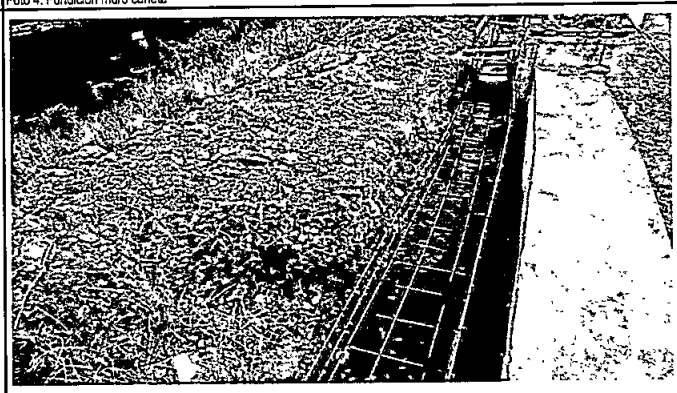

Foto 6: Armado estructura acero refuero para cuneta

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
LUNES: -Se realizó corte y figurado de acero refuerzo, carpintería en madera para formaleta, armado de acero refuerzo para fundición de losa cuneta	
MARTES: -Encofrado con formaleta en madera y fundición de piso cuneta para desague de aguas lluvias y reconstrucción de caja de inspección	
MIERCOLES: -Carpintería en madera, encofrado de muro cuneta y fundición del mismo	
JUEVES: -Corte, figurado y armado de estructura acero refuerzo, encofrado y fundicion de piso cuneta.	
VIERNES: -Se realizó carpintería en madera, encofrado muro cuneta y fundición de la misma Se realizó corte, figurado acero refuerzo y armado del mismo para fundición de piso y muro	
SABADO: -Fundición de muro concreto para la cuneta	
DOMINGO: No se realizan actividades en la obra el día de hoy	

LOGROS Y/O DIFICULTADES
1. Cronograma:
La obra presenta una ejecución 276 días con respecto al cronograma programado
2. Disponibilidad de Recursos:
Se cuenta con la maquinaria y equipos menores necesarios para las actividades preliminares
3. Ejecución Financiera:
Se realiza actividades correspondientes a lo programado, donde se efectua una inversion total de $1.277 643.459
4. Calidad de los trabajos:
Hasta el momento los trabajos ejecutados son aceptados por la interventoria
5. Manejo Ambiental:
La obra ya cuenta con los certificados de botadero de residuos y matenales sobrantes
6. Seguridad Industrial:
los trabajadores cuentan con sus elementos de segundad industrial, tanto personal de la obra como los profesionales de campo
7. Programa salud ocupacional (si aplica):
Se cuenta con el profesional de seguridad y salud en el trabajo (SISO)
8. Aspectos sociales:
OBSERVACIONES:
* No se presentan observaciones de la obra para el periodo del presente informe

FIRMA EL CONTRATISTA

NOMBRE: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

CARGO: REP LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

Aprobado por

VoBo (FIRMA)

NOMBRE. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ

CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° IND - 23 - 5027

CONTRATANTE: INDERVALLE **NIT. 805.012.896-4** ORDENADOR DEL GASTO. JUAN **CARLOS RUEDA ANGEL C.C. 94.501.292**

CONTRATISTA: CONSTRUPACICOL S A S. ZOMAC **NIT. 901.526.894-4**
REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO **C.C.** 1.006.166.501

INTERVENTOR: CONSORCIO GRUPO 3 **NIT. 901.769.200-6** REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ. **C.C. 16.700.426**

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2 FRENTE 1 ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR TOTAL $	$1.426.801.042 M/CTE – INCLUIDO AIU					
PLAZO	6 MESES	185 DÍAS				
FECHA DE INICIO	28-dic-23					
	4-nov-24	186 DÍAS		HASTA: 9-mayo-25	9/05/2025	186
SUSPENSION 1		DEL: 14 junio 2024	14/06/2024	HASTA: 22-agosto-24	22/08/2024	70
REINICIO N° 1		DEL: 23-agosto-24	23/08/2024	HASTA: 25-agosto-24	25/08/2024	3
SUSPENSION 2		DEL: 26-agosto-24	26/08/2024	HASTA: 14-octubre-24	14/10/2024	50
REINICIO N° 2		DEL: 15-octubre-24	15/10/2024	HASTA: 22-octubre-24	22/10/2024	8
SUSPENSION 3		DEL: 22-octubre-24	22/10/2024	HASTA:4-noviembre-24	4/11/2024	13
REINICIO N° 3		DEL: 4-nobviembre-24	4/11/2024	HASTA: 9-mayo-25	9/05/2025	186

2. INFORMACIÓN BASICA DEL FRENTE DE OBRA

FRENTE No 01: CUBIERTA CANCHA MULTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO

VALOR COSTOS TOTALES:	$1 867 899 794				
Informe N°	43	Fecha de informe.	10/02/2025	A	16/02/2025

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA DE OBRA

Valor frente de obra:	$1.426 801.042
Adiciones o mayor valor:	$441.098.752
Valor total:	$1.867.899.794
Fecha de Inicio	28/12/2023
Tiempo de prorrogas	186 dias
Tiempo de suspensiones	133 dias
Plazo estipulado	371 dias
Fecha de terminacon:	9/05/2025
Tiempo transcurrido contrato:	283 dias

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Fecha de Inicio	28/12/2023
Tiempo de prorrogas	186 dias
Tiempo de suspensiones	133 dias
Plazo actualizado:	371 dias
Fecha de terminacon.	9/05/2025
Tiempo transcurrido Interventoria:	283 dias

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FISICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso
% Programado	66,95%	3,00%	69,95%	-3
% Ejecutado	65,60%	1,00%	66,60%	0
Diferencia	1,35%	-2,00%	-3,35%	

AVANCE FINANCIERO.

				En %
Programado(%)	$1.250.558.912	$56.036.997	$1.306.595.909	69,95%
Ejecutado (%)	$1.225.342.265	$18.678 998	$1.244.021.263	66,60%
Diferencia	-$25.216.647	-$37.357.999	-$62.574.646	-3,35%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	Ingeniero Residente e inspector
Contratista:	Arquitecto Residente de obra y cuatro obreros

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Herramienta menor
Mini cargador (Bobcat)
Cilindro compactador

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	S/N/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	Interventor	S
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	Interventor	S
Normas ambientales	Interventor	S

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

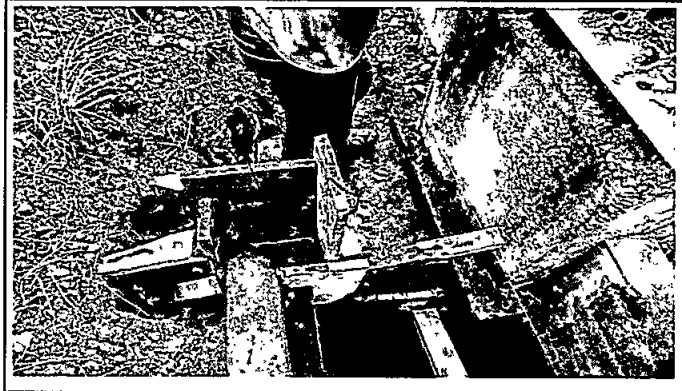

Foto 1: Encofrado para fundición muros para cunetas

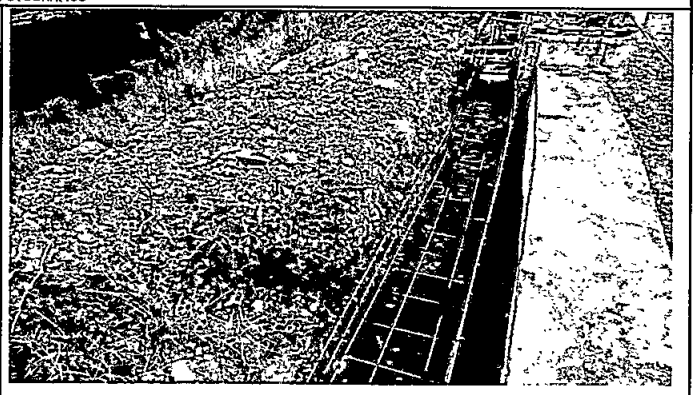

Foto 2: Encofrado para fundición muros para cunetas

INDERVALLE

CG3

CONSORCIO GRUPO 3
INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

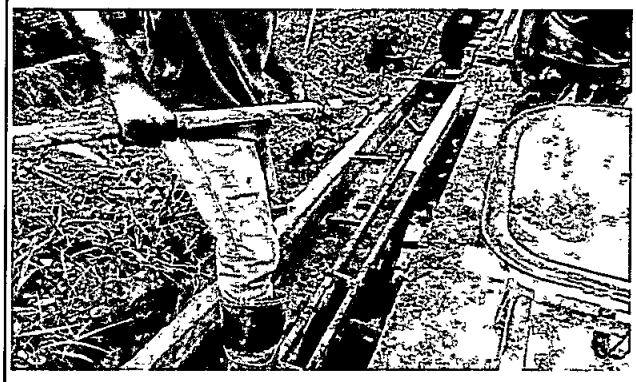

Foto 3: Fundicion de un tramo de muros para cunetas.

Foto 4: Fundicion de un tramo de losa de la cancha.

Foto 5: Platina para base de estructura.

Foto 6: Platina para base de estructura

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
LUNES: -Encofrado para fundición muros para cunetas	
MARTES: -No se laboró el día de hoy por las fuertes lluvias generadas	
MIERCOLES: -Encofrado para fundición muros para cunetas	
JUEVES: -fundición muros para cunetas .	
VIERNES: -fundición muros para cunetas .	
SABADO: -llegada de las platinas para la base de la estructura	
DOMINGO: No se realizan actividades en la obra el día de hoy	

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:
La obra presenta una ejecución 283 dias con respecto al cronograma programado

2. Disponibilidad de Recursos:
Se cuenta con la maquinaria y equipos menores necesarios para las actividades preliminares

3. Ejecución Financiera:
Se realiza actividades correspondientes a lo programado, donde se efectua una inversion total de $1.315.001.455

4. Calidad de los trabajos:
Hasta el momento los trabajos ejecutados son aceptados por la interventoria

5. Manejo Ambiental:
La obra ya cuenta con los certificados de botadero de residuos y materiales sobrantes.

6. Seguridad Industrial:
los trabajadores cuentan con sus elementos de seguridad industrial, tanto personal de la obra como los profesionales de campo

7. Programa salud ocupacional (si aplica):
Se cuenta con el profesional de seguridad y salud en el trabajo (SISO)

8. Aspectos sociales:

OBSERVACIONES:

* No se presentan observaciones de la obra para el periodo del presente informe

FIRMA EL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA
NOMBRE: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
CARGO: REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

Aprobado por:
VoBo (FIRMA)
NOMBRE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INDERVALLE

CG3 — CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° IND - 23 - 5027

CONTRATANTE: INDERVALLE **NIT. 805.012.896-4** ORDENADOR DEL GASTO: JUAN **CARLOS RUEDA ANGEL C.C. 94.501.292**

CONTRATISTA: CONSTRUPACICOL S A S ZOMAC **NIT. 901.526.894-4**
REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO **C.C.** 1 006 166.501

INTERVENTOR: CONSORCIO GRUPO 3 **NIT. 901.769.200-6** REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ. **C.C. 16.700.426**

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS. MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2 FRENTE 1 ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR TOTAL $	$1.426.801.042 M/CTE – INCLUIDO AIU					
PLAZO	6 MESES	185 DÍAS				
FECHA DE INICIO	28-dic-23					
	4-nov-24	186 DÍAS		HASTA: 9-mayo-25	9/05/2025	186
SUSPENSION 1		DEL: 14 junio 2024	14/06/2024	HASTA: 22-agosto-24	22/08/2024	70
REINICIO N° 1		DEL: 23-agosto-24	23/08/2024	HASTA: 25-agosto-24	25/08/2024	3
SUSPENSION 2		DEL: 26-agosto-24	26/08/2024	HASTA: 14-octubre-24	14/10/2024	50
REINICIO N° 2		DEL: 15-octubre-24	15/10/2024	HASTA: 22-octubre-24	22/10/2024	8
SUSPENSION 3		DEL: 22-octubre-24	22/10/2024	HASTA:4-noviembre-24	4/11/2024	13
REINICIO N° 3		DEL: 4-nobviembre-24	4/11/2024	HASTA: 9-mayo-25	9/05/2025	186

2. INFORMACION BASICA DEL FRENTE DE OBRA

FRENTE No. 01: CUBIERTA CANCHA MULTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO

VALOR COSTOS TOTALES $1 867 899 794

Informe N° 44 — Fecha de informe: 17/02/2025 A 23/02/2025

INFORMACION GENERAL

CONTRATISTA DE OBRA

Valor frente de obra	$1.426.801.042
Adiciones o mayor valor:	$441 098.752
Valor total:	$1.867.899.794
Fecha de Inicio	28/12/2023
Tiempo de prorrogas	186 dias
Tiempo de suspensiones	133 dias
Plazo estipulado	371 dias
Fecha de terminacion:	9/05/2025
Tiempo transcurrido contrato:	290 dias

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Fecha de Inicio	28/12/2023
Tiempo de prorrogas	186 dias
Tiempo de suspensiones:	133 dias
Plazo actualizado.	371 dias
Fecha de terminacion:	9/05/2025
Tiempo transcurrido Interventona.	290 dias

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FISICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso
% Programado	69,95%	3,00%	72,95%	-6
% Ejecutado	66,60%	1,00%	67,60%	0
Diferencia	3,35%	-2,00%	-5,35%	

AVANCE FINANCIERO

				En %
Programado(%)	$1.306.595.906	$56.036.997	$1.362.632.903	72,95%
Ejecutado (%)	$1.244.021.263	$18.678.998	$1.262.700.261	67,60%
Diferencia	-$62.574.643	-$37.357.999	-$99.932.642	-5,35%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoria:	Ingeniero Residente e inspector
Contratista:	Arquitecto Residente de obra y cuatro obreros

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Herramienta menor
Mini cargador (Bobcat)
Cilinidro compactador

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	S/N/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	Interventor	S
Normas segundad, higiene y salud ocupacional	Interventor	S
Normas ambientales	Interventor	S

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

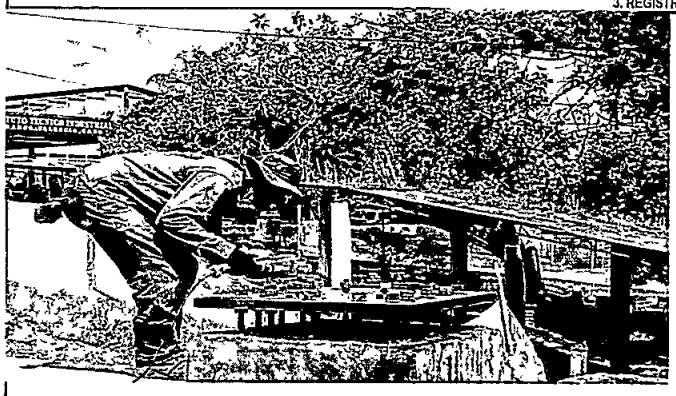

Foto 1 Relleno, compatación y nivelación de terreno.

Foto 2: Instalación de cajas electricas para polos a tierra

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Foto 3: Fundición de tramo losa del perimetro de la cancha

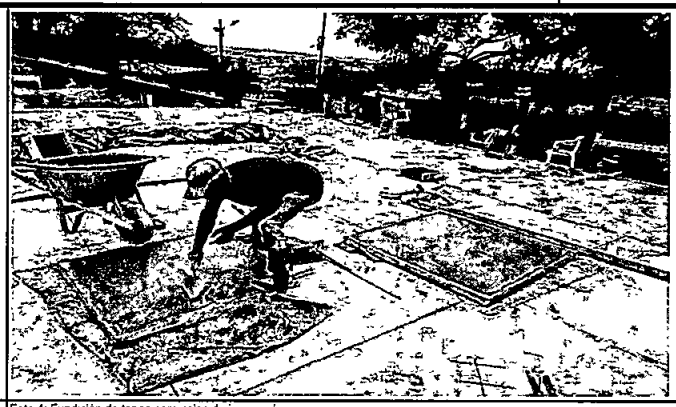

Foto 4: Fundición de tapas para cajas de inspección

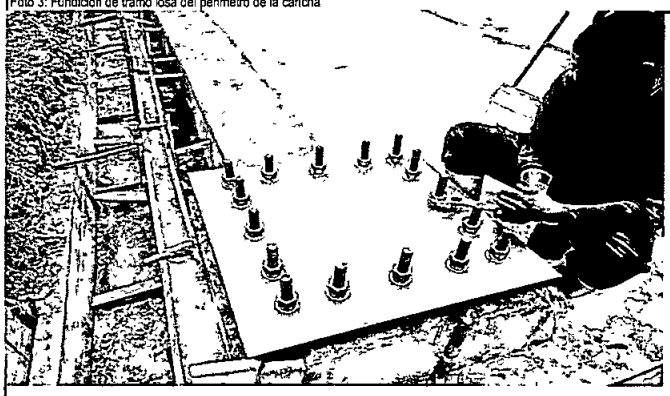

Foto 5: Corte de pernos y pintura de la base metalica.

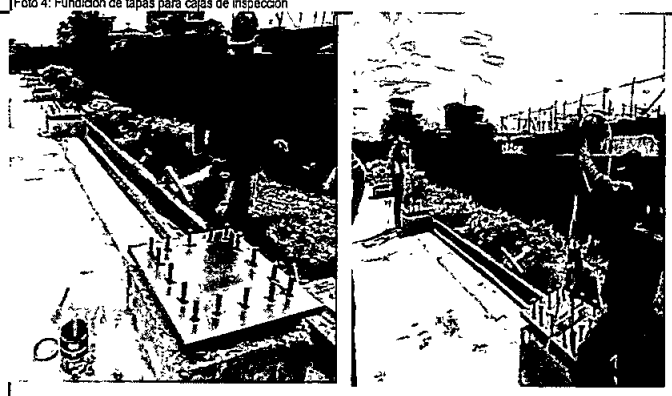

Foto 6: Corte de pernos y pintura de la base metalica

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
LUNES: -Se realizó encofrado en madera para fundición de muro cuneta.	
MARTES: -Se realizó encofrado en madera, instlación acero refuerzo y fundición de tramo losa del perimetro de la cancha y aplicación de antisol	
MIERCOLES: -Se realizó visita por parte de funcionario de indervalle, citando a las partes de interventoría y contratista Se realizó fundicón de tramo losa del perimetro de la cancha con su respetivo acero refuerzo y aplicación de antisol.	
JUEVES: -Se realizó relleno con material de rio para compactación y nivelación de terreno para fundición Fundición de tramo del perimetro de la cancha con su respectivo acero refuerzo y aplicación de antisol.	
VIERNES: -Se continua con la fundición del ultimo tramo del perimetro de la cancha con su respectivo acero refuerzo y aplicación de antisol y toma de la muestra concreto. Llegada a la obra de platina para su respectiva instalación.	
SABADO: -Carpintería y encofrado en madera, fundición de muro cuneta e instalación de caja eléctrica para polo a tierra y fundición de tapas de cajas de inspección.	
DOMINGO: No se realizan actividades en la obra el día de hoy	

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:

La obra presenta una ejecución 290 dias con respecto al cronograma programado

2. Disponibilidad de Recursos:

Se cuenta con la maquinaria y equipos menores necesarios para las actividades preliminares

3. Ejecución Financiera:

Se realiza actividades correspondientes a lo programado, donde se efectua una inversion total de $1.352.359.451

4. Calidad de los trabajos:

Hasta el momento los trabajos ejecutados son aceptados por la interventoría

5. Manejo Ambiental:

La obra ya cuenta con los certificados de botadero de residuos y materiales sobrantes

6. Seguridad Industrial:

los trabajadores cuentan con sus elementos de segundad industrial, tanto personal de la obra como los profesionales de campo

7. Programa salud ocupacional (si aplica):

Se cuenta con el profesional de seguridad y salud en el trabajo (SISO)

8. Aspectos sociales:

OBSERVACIONES:

* No se presentan observaciones de la obra para el periodo del presente informe.

Aprobado por:

FIRMA EL CONTRATISTA

NOMBRE BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

CARGO: REP LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

VoBo (FIRMA)

NOMBRE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ

CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° IND - 23 - 5027

CONTRATANTE: INDERVALLE **NIT. 805.012.896-4** ORDENADOR DEL GASTO: JUAN **CARLOS RUEDA ANGEL C.C. 94.501.292**

CONTRATISTA: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC **NIT. 901.526.894-4**
REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO **C.C.** 1.006.166.501

INTERVENTOR: CONSORCIO GRUPO 3 **NIT. 901.769.200-6** REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ. **C.C. 16.700.426**

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1 ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR TOTAL $	$1.426.801.042 M/CTE – INCLUIDO AIU					
PLAZO	6 MESES	185 DÍAS				
FECHA DE INICIO	28-dic-23					
	4-nov-24	186 DÍAS		HASTA: 9-mayo-25	9/05/2025	186
SUSPENSION 1		DEL: 14 junio 2024	14/06/2024	HASTA: 22-agosto-24	22/08/2024	70
REINICIO N° 1		DEL: 23-agosto-24	23/08/2024	HASTA: 25-agosto-24	25/08/2024	3
SUSPENSION 2		DEL: 26-agosto-24	26/08/2024	HASTA: 14-octubre-24	14/10/2024	50
REINICIO N° 2		DEL: 15-octubre-24	15/10/2024	HASTA: 22-octubre-24	22/10/2024	8
SUSPENSION 3		DEL: 22-octubre-24	22/10/2024	HASTA:4-noviembre-24	4/11/2024	13
REINICIO N° 3		DEL: 4-nobviembre-24	4/11/2024	HASTA: 9-mayo-25	9/05/2025	186

2. INFORMACION BASICA DEL FRENTE DE OBRA

FRENTE No. 01: CUBIERTA CANCHA MULTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO

VALOR COSTOS TOTALES: $1 867 899 794

Informe N°: 45 Fecha de informe: 24/02/2025 A 2/03/2025

INFORMACION GENERAL

CONTRATISTA DE OBRA

Valor frente de obra:	$1.426.801.042
Adiciones o mayor valor:	$441.098.752
Valor total:	$1.867 899.794
Fecha de Inicio	28/12/2023
Tiempo de prorrogas	186 dias
Tiempo de suspensiones	133 dias
Plazo estipulado:	371 dias
Fecha de terminacion:	9/05/2025
Tiempo transcurrido contrato:	297 dias

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Fecha de Inicio:	28/12/2023
Tiempo de prorrogas:	185 dias
Tiempo de suspensiones:	133 dias
Plazo actualizado.	371 dias
Fecha de terminacion	9/05/2025
Tiempo transcurrido Interventona:	297 dias

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FISICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso
% Programado	72,95%	5,00%	77,95%	-9
% Ejecutado	67,60%	2,00%	69,60%	0
Diferencia	5,35%	-3,00%	-8,35%	

AVANCE FINANCIERO

				En %
Programado(%)	$1.362.632.900	$93.394.993	$1.456.027.892	77,95%
Ejecutado (%)	$1.262.700.261	$37.357.996	$1.300.058.257	69,60%
Diferencia	-$99.932.639	-$56.036.997	-$155.969.636	-8,35%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	Ingeniero Residente e inspector
Contratista:	Arquitecto Residente de obra y cuatro obreros

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Herramienta menor
Mini cargador (Bobcat)
Cilindro compactador

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	Interventor	S
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	Interventor	S
Normas ambientales	Interventor	S

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

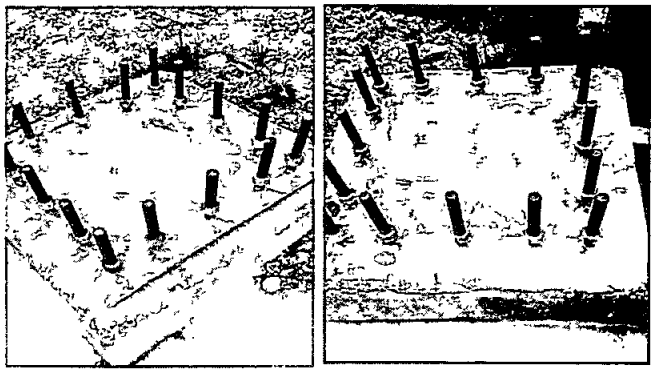

Foto 1: Relleno, compatación y nivelación de terreno.

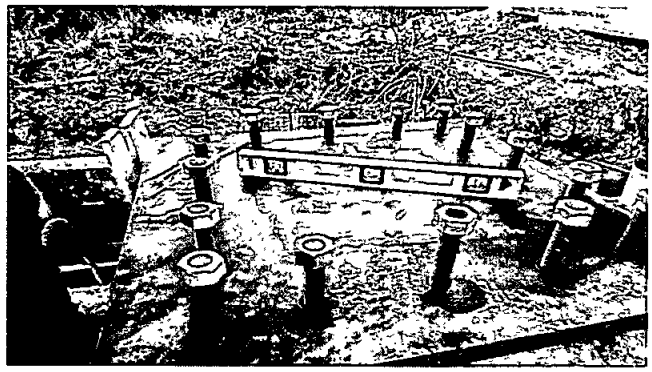

Foto 2: Instalación de plata (platina) metalica para estructura.

INDERVALLE

CG3 — CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

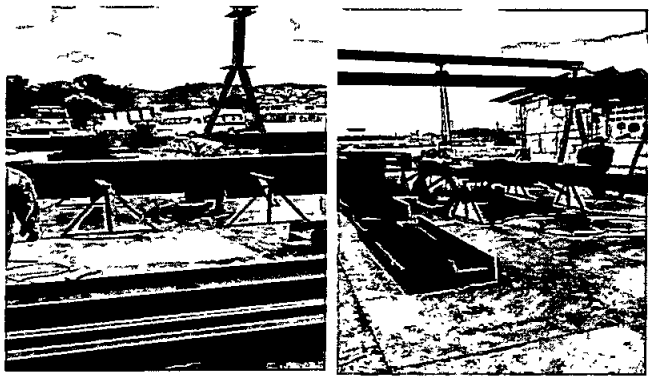

Foto 3: Corte y soldadura de columnas metalicas.

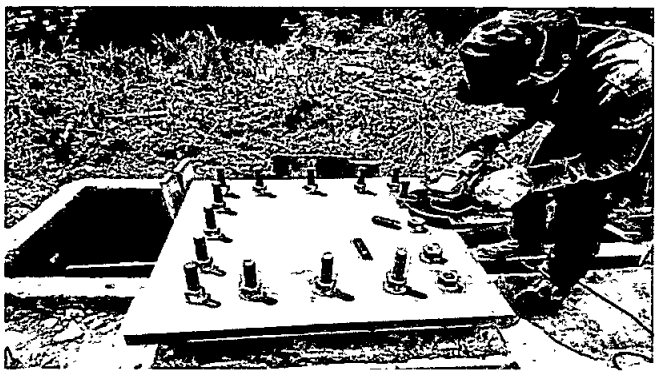

Foto 4: Corte de pernos y pintura de la base metalica.

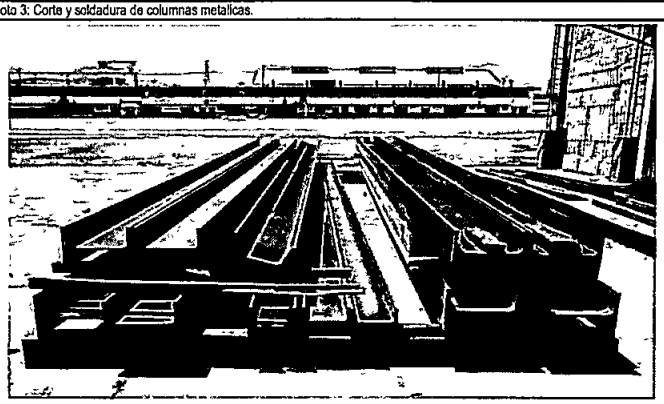

Foto 5: Estructura metalica para columnas.

Foto 6: Instalacion y nivelacion de base soporte columna metalica.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
LUNES: -Se realizó la limpieza de los tornillos para sopoete de columnas metalicas.	
MARTES: -instalacion de base metalica para la colocacion de columnas metalica.	
MIERCOLES: -Se continua con el corte y la soldadura de columnas metalica en sitio de taller.	
JUEVES: -Se nivela las platinas y se aplieta las tuercas ya niveladas.	
VIERNES: -Se pinta todas las bases de la platina	
SABADO: -Se realizan los cortes faltantes del pavimento	
DOMINGO: No se realizan actividades en la obra el día de hoy	

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:
La obra presenta una ejecución 297 dias con respecto al cronograma programado.

2. Disponibilidad de Recursos:
Se cuenta con la maquinaria y equipos menores necesarios para las actividades preliminares

3. Ejecución Financiera:
Se realiza actividades correspondientes a lo programado, donde se efectua una inversion total de $1.389.717.447

4. Calidad de los trabajos:
Hasta el momento los trabajos ejecutados son aceptados por la interventoria

5. Manejo Ambiental:
La obra ya cuenta con los certificados de botadero de residuos y materiales sobrantes.

6. Seguridad Industrial:
los trabajadores cuentan con sus elementos de seguridad industrial, tanto personal de la obra como los profesionales de campo

7. Programa salud ocupacional (si aplica):
Se cuenta con el profesional de segundad y salud en el trabajo (SISO)

8. Aspectos sociales:

OBSERVACIONES:

* No se presentan observaciones de la obra para el periodo del presente informe.

FIRMA EL CONTRATISTA
NOMBRE: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
CARGO: REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

Aprobado por:

VoBo (FIRMA)
NOMBRE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° IND - 23 - 5027

CONTRATANTE: INDERVALLE **NIT. 805.012.896-4** ORDENADOR DEL GASTO: JUAN **CARLOS RUEDA ANGEL C.C. 94.501.292**

CONTRATISTA: CONSTRUPACICOL S A S. ZOMAC **NIT. 901.526.894-4**
REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO C.C. 1.006.166.501

INTERVENTOR: CONSORCIO GRUPO 3 **NIT. 901.769.200-6** REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ. **C.C. 16.700.426**

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2 FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR TOTAL $	$1.426.801.042 M/CTE – INCLUIDO AIU					
PLAZO	6 MESES	185 DÍAS				
FECHA DE INICIO	28-dic-23					
	4-nov-24	186 DÍAS		HASTA: 9-mayo-25	9/05/2025	186
SUSPENSION 1		DEL: 14 junio 2024	14/06/2024	HASTA: 22-agosto-24	22/08/2024	70
REINICIO N° 1		DEL: 23-agosto-24	23/08/2024	HASTA: 25-agosto-24	25/08/2024	3
SUSPENSION 2		DEL: 26-agosto-24	26/08/2024	HASTA: 14-octubre-24	14/10/2024	50
REINICIO N° 2		DEL: 15-octubre-24	15/10/2024	HASTA: 22-octubre-24	22/10/2024	8
SUSPENSION 3		DEL: 22-octubre-24	22/10/2024	HASTA:4-noviembre-24	4/11/2024	13
REINICIO N° 3		DEL: 4-nobviembre-24	4/11/2024	HASTA: 9-mayo-25	9/05/2025	186

2. INFORMACION BASICA DEL FRENTE DE OBRA

FRENTE No. 01: CUBIERTA CANCHA MULTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO

VALOR COSTOS TOTALES	$1 867 899 794				
Informe N°	46	Fecha de informe.	3/03/2025	A	9/03/2025

INFORMACION GENERAL

CONTRATISTA DE OBRA

Valor frente de obra:	$1.426.801.042
Adiciones o mayor valor:	$441.098.752
Valor total:	$1.867.899.794
Fecha de Inicio	28/12/2023
Tiempo de prorrogas	186 dias
Tiempo de suspensiones	133 dias
Plazo estipulado:	371 dias
Fecha de terminacion:	9/05/2025
Tiempo transcurrido contrato:	304 dias

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Fecha de Inicio	28/12/2023
Tiempo de prorrogas	186 dias
Tiempo de suspensiones	133 dias
Plazo actualizado:	371 dias
Fecha de terminacion:	9/05/2025
Tiempo transcurrido Interventoria:	304 dias

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FISICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso
% Programado	77,95%	2,00%	79,95%	-11
% Ejecutado	69,60%	1,00%	70,60%	0
Diferencia	8,35%	-1,00%	-9,35%	

AVANCE FINANCIERO

				En %
Programado(%)	$1.456.027.889	$37.357.999	$1.493.385.888	79,95%
Ejecutado (%)	$1.300.058.257	$18.678.998	$1.318.737.255	70,60%
Diferencia	-$155.969.633	-$18.679.001	-$174.648.634	-9,35%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	Ingeniero Residente e inspector
Contratista:	Arquitecto Residente de obra y cuatro obreros

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Herramienta menor
Mini cargador (Bobcat)
Cilindro compactador

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	S/N/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	Interventor	S
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	Interventor	S
Normas ambientales	Interventor	S

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1: Nivelaci0on de platinas para instalacion de estructura metalica

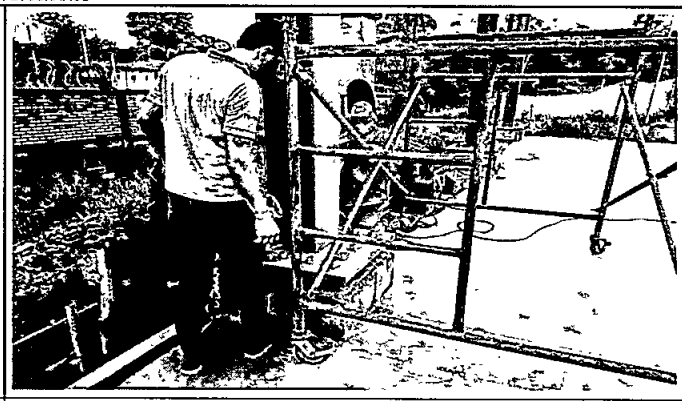

Foto 2: Instalación de columnas en su respectiva base

INDERVALLE

CG3

CONSORCIO GRUPO 3
INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

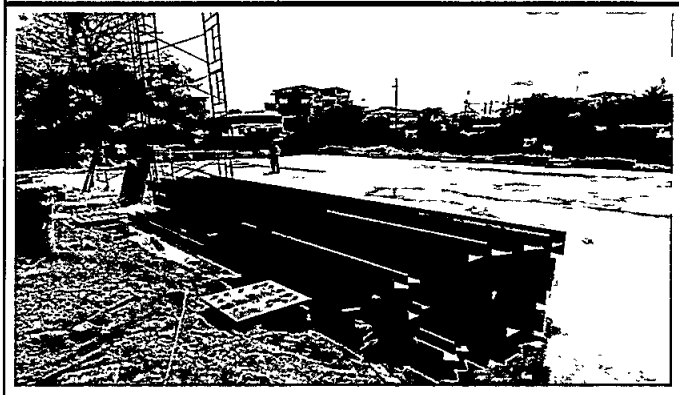

Foto 3: Transporte de material de la estructura.

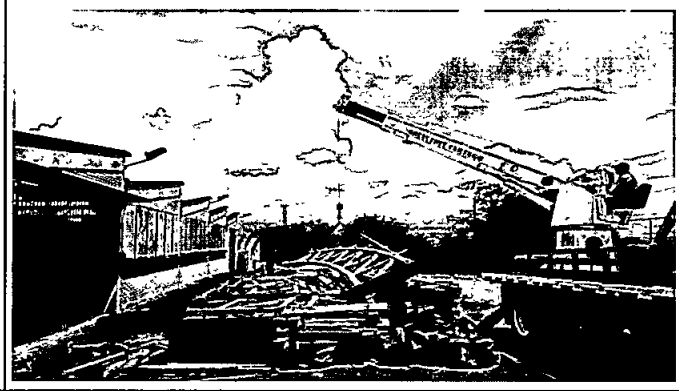

Foto 4: Descargue de material de la estructura.

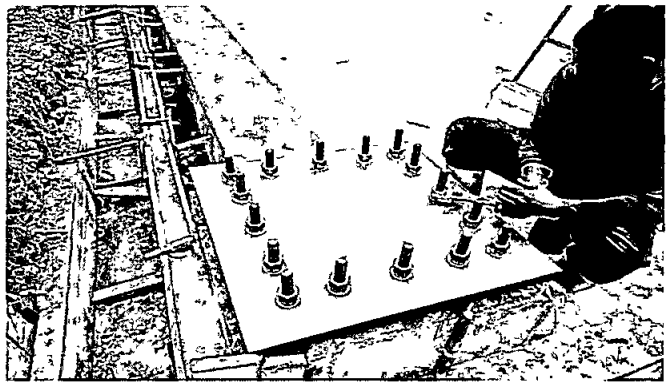

Foto 5: Ajuste de tornillos

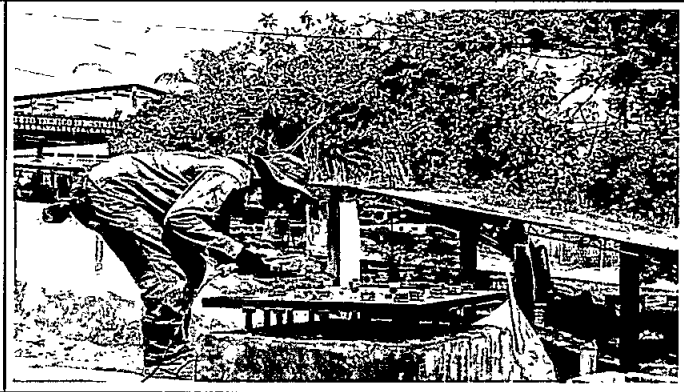

Foto 6: Corte de tornillos sobrantes

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
LUNES: -Se realizó el desencofrado de madera en la fundición de muro cuneta.	
MARTES: -Se realizó limpieza de las columnas para la instalacion de la placa base	
MIERCOLES: -Se realizó instalacion de la placa base y su nivelacion	
JUEVES: -Se realizó transporte de material de la estructura	
VIERNES: -Se continua con el transporte de material de la estructura	
SABADO: - Descarque de la estructura	
DOMINGO: No se realizan actividades en la obra el día de hoy	

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:
La obra presenta una ejecución 304 dias con respecto al cronograma programado

2. Disponibilidad de Recursos:
Se cuenta con la maquinaria y equipos menores necesarios para las actividades preliminares

3. Ejecución Financiera:
Se realiza actividades correspondientes a lo programado, donde se efectua una inversion total de $1 427 075.443

4. Calidad de los trabajos:
Hasta el momento los trabajos ejecutados son aceptados por la interventoría

5. Manejo Ambiental:
La obra ya cuenta con los certificados de botadero de residuos y materiales sobrantes

6. Seguridad Industrial:
los trabajadores cuentan con sus elementos de seguridad industrial, tanto personal de la obra como los profesionales de campo

7. Programa salud ocupacional (si aplica):
Se cuenta con el profesional de segundad y salud en el trabajo (SISO)

8. Aspectos sociales:

OBSERVACIONES:

* No se presentan observaciones de la obra para el periodo del presente informe

FIRMA EL CONTRATISTA
NOMBRE: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
CARGO: REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

Aprobado por:

VoBo (FIRMA)
NOMBRE. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° IND - 23 - 5027

CONTRATANTE: INDERVALLE **NIT. 805.012.896-4** ORDENADOR DEL GASTO: JUAN **CARLOS RUEDA ANGEL C.C. 94.501.292**

CONTRATISTA: CONSTRUPACICOL S.A.S ZOMAC **NIT. 901.526.894-4**
REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO **C.C. 1.006.166.501**

INTERVENTOR: CONSORCIO GRUPO 3 **NIT. 901.769.200-6** REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ. **C.C. 16.700.426**

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2 FRENTE 1 ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR TOTAL $	$1.426.801.042 M/CTE – INCLUIDO AIU						
PLAZO	6 MESES	185 DÍAS					
FECHA DE INICIO	28-dic-23						
	4-nov-24	186 DÍAS		HASTA:	9-mayo-25	9/05/2025	186
SUSPENSION 1		DEL:	14 junio 2024	14/06/2024	HASTA:	22-agosto-24	22/08/2024	70
REINICIO N° 1		DEL:	23-agosto-24	23/08/2024	HASTA:	25-agosto-24	25/08/2024	3
SUSPENSION 2		DEL:	26-agosto-24	26/08/2024	HASTA:	14-octubre-24	14/10/2024	50
REINICIO N° 2		DEL:	15-octubre-24	15/10/2024	HASTA:	22-octubre-24	22/10/2024	8
SUSPENSION 3		DEL:	22-octubre-24	22/10/2024	HASTA:	4-noviembre-24	4/11/2024	13
REINICIO N° 3		DEL:	4-nobviembre-24	4/11/2024	HASTA:	9-mayo-25	9/05/2025	186

2. INFORMACION BASICA DEL FRENTE DE OBRA

FRENTE No. 01: CUBIERTA CANCHA MULTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO

VALOR COSTOS TOTALES: $1.867.899.794

Informe N°: 47 Fecha de informe: 10/03/2025 A 16/03/2025

INFORMACION GENERAL

CONTRATISTA DE OBRA

Valor frente de obra	$1.426.801.042
Adiciones o mayor valor:	$441.098.752
Valor total:	$1.867.899.794
Fecha de inicio	28/12/2023
Tiempo de prorrogas	186 dias
Tiempo de suspensiones	133 dias
Plazo estipulado:	371 dias
Fecha de terminacion:	9/05/2025
Tiempo transcurrido contrato:	311 dias

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Fecha de Inicio:	28/12/2023
Tiempo de prorrogas:	186 dias
Tiempo de suspensiones:	133 dias
Plazo actualizado:	371 dias
Fecha de terminacion	9/05/2025
Tiempo transcurrido Interventoria:	311 dias

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FISICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso
% Programado	79,95%	2,00%	81,95%	-12
% Ejecutado	70,60%	2,00%	72,60%	0
Diferencia	9,35%	0,00%	-9,35%	

AVANCE FINANCIERO

				En %
Programado(%)	$1.493.385.885	$37.357.999	$1.530.743.884	81,95%
Ejecutado (%)	$1.318.737.255	$37.357.996	$1.356.095.250	72,60%
Diferencia	-$174.648.631	-$3	-$174.648.634	-9,35%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoria:	Ingeniero Residente e inspector
Contratista:	Arquitecto Residente de obra y cuatro obreros

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Herramienta menor
Mini cargador (Bobcat)
Cilindro compactador

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	Interventor	S
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	Interventor	S
Normas ambientales	Interventor	S

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1: Instalacion de columnas metalicas

Foto 2: Soldadura para las columnas metalicas

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Foto 3: Mamposteria para muros lateral.

Foto 4: Trazado de ejes para instalacion de columnas.

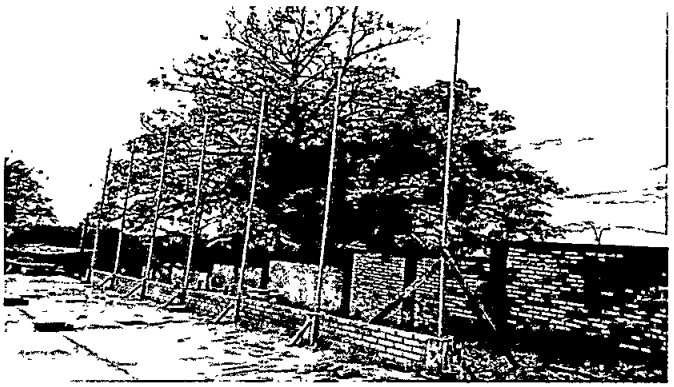

Foto 5: instalacion de poste muro lateral

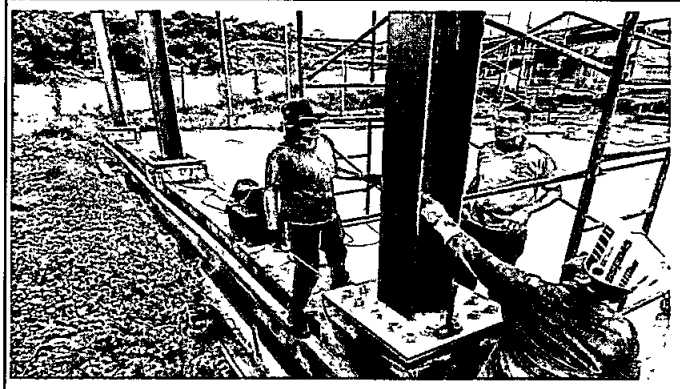

Foto 6: Instalacion de columna y soldadura

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
LUNES: -Se realizó la instalacion de las columnas	
MARTES: -Se realizó la soldadrura de las columnas	
MIERCOLES: -Se realizó mampostena para el muro lateral.	
JUEVES: -Se realizó la instalacion de los postes metalicos para el muro y su fundion	
VIERNES: -Se continua con la mamposteria del muro lateral	
SABADO: -Instalacion de postes y fundicon de columnas del otro lado del muro	
DOMINGO: No se realizan actividades en la obra el día de hoy	

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:
La obra presenta una ejecución 311 dias con respecto al cronograma programado

2. Disponibilidad de Recursos:
Se cuenta con la maquinaria y equipos menores necesarios para las actividades preliminares

3. Ejecución Financiera:
Se realiza actividades correspondientes a lo programado, donde se efectua una inversion total de $1 464.433 438

4. Calidad de los trabajos:
Hasta el momento los trabajos ejecutados son aceptados por la interventoria

5. Manejo Ambiental:
La obra ya cuenta con los certificados de botadero de residuos y materiales sobrantes

6. Seguridad Industrial:
los trabajadores cuentan con sus elementos de segundad industrial, tanto personal de la obra como los profesionales de campo

7. Programa salud ocupacional (si aplica):
Se cuenta con el profesional de segundad y salud en el trabajo (SISO)

8. Aspectos sociales:

OBSERVACIONES:

* No se presentan observaciones de la obra para el penodo del presente informe

FIRMA EL CONTRATISTA
NOMBRE. BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
CARGO: REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

Aprobado por:

VoBo (FIRMA)
NOMBRE EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° IND - 23 - 5027

CONTRATANTE: INDERVALLE **NIT. 805.012.896-4** ORDENADOR DEL GASTO: JUAN **CARLOS RUEDA ANGEL C.C. 94.501.292**

CONTRATISTA: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC **NIT. 901.526.894-4**
REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO **C.C.** 1.006.166.501

INTERVENTOR: CONSORCIO GRUPO 3 **NIT. 901.769.200-6** REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ. **C.C. 16.700.426**

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR TOTAL $	$1.426.801.042 M/CTE – INCLUIDO AIU					
PLAZO	6 MESES	185 DÍAS				
FECHA DE INICIO	28-dic-23					
	4-nov-24	186 DÍAS		HASTA: 9-mayo-25	9/05/2025	186
SUSPENSION 1		DEL: 14 junio 2024	14/06/2024	HASTA: 22-agosto-24	22/08/2024	70
REINICIO N° 1		DEL: 23-agosto-24	23/08/2024	HASTA: 25-agosto-24	25/08/2024	3
SUSPENSION 2		DEL: 26-agosto-24	26/08/2024	HASTA: 14-octubre-24	14/10/2024	50
REINICIO N° 2		DEL: 15-octubre-24	15/10/2024	HASTA: 22-octubre-24	22/10/2024	8
SUSPENSION 3		DEL: 22-octubre-24	22/10/2024	HASTA:4-noviembre-24	4/11/2024	13
REINICIO N° 3		DEL: 4-nobviembre-24	4/11/2024	HASTA: 9-mayo-25	9/05/2025	186

2. INFORMACION BASICA DEL FRENTE DE OBRA

FRENTE No. 01: CUBIERTA CANCHA MULTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO

VALOR COSTOS TOTALES: $1 867 899 794

Informe N°: 48 Fecha de informe: 17/03/2025 A 23/03/2025

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA DE OBRA

Valor frente de obra.	$1.426 801.042
Adiciones o mayor valor:	$441.098.752
Valor total:	$1.867.899.794
Fecha de Inicio	28/12/2023
Tiempo de prorrogas	186 dias
Tiempo de suspensiones	133 dias
Plazo estipulado	371 dias
Fecha de terminacion:	9/05/2025
Tiempo transcurrido contrato:	318 dias

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Fecha de Inicio:	28/12/2023
Tiempo de prorrogas:	186 dias
Tiempo de suspensiones:	133 dias
Plazo actualizado:	371 dias
Fecha de terminacion	9/05/2025
Tiempo transcurrido Interventoria:	318 dias

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FISICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso
% Programado	81,95%	3,00%	84,95%	-13
% Ejecutado	72,60%	2,50%	75,10%	0
Diferencia	9,35%	-0,50%	-9,85%	

AVANCE FINANCIERO

				En %
Programado(%)	$1.530.743.881	$56.036.997	$1.586.780.878	84,95%
Ejecutado (%)	$1.356.095.250	$46.697.495	$1.402.792.745	75,10%
Diferencia	-$174.648.631	-$9.339.502	-$183.988.133	-9,85%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoria:	Ingeniero Residente e inspector
Contratista:	Arquitecto Residente de obra y cuatro obreros

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Herramienta menor
Mini cargador (Bobcat)
Cilindro compactador

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	S/N/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	Interventor	S
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	Interventor	S
Normas ambientales	Interventor	S

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

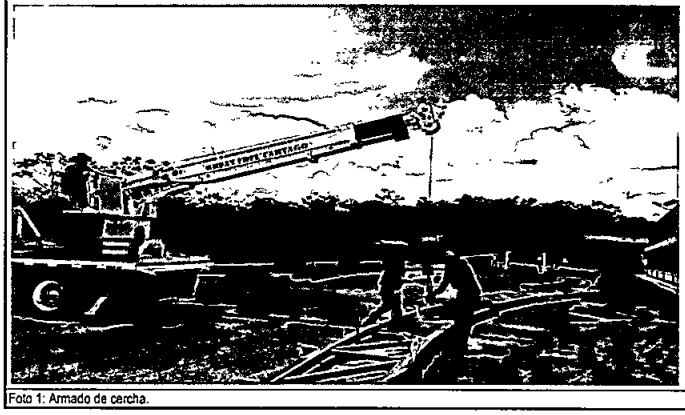

Foto 1: Armado de cercha.

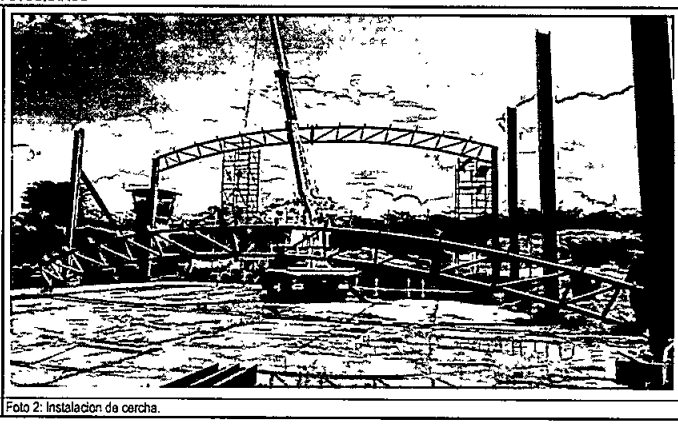

Foto 2: Instalacion de cercha.

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Foto 3: Instalacion de cercha.

Foto 4: Instalacion de cercha..

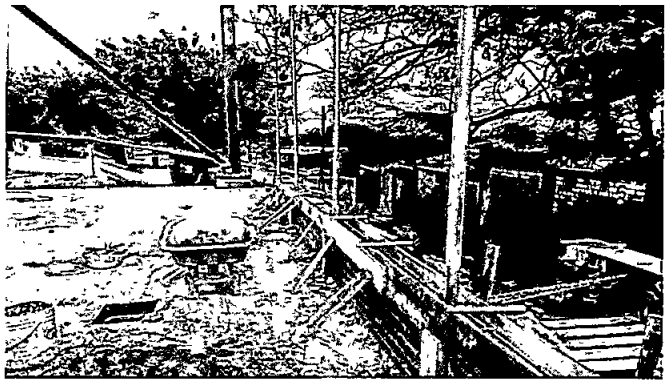

Foto 5: Encofrado de viga para muro lateral.

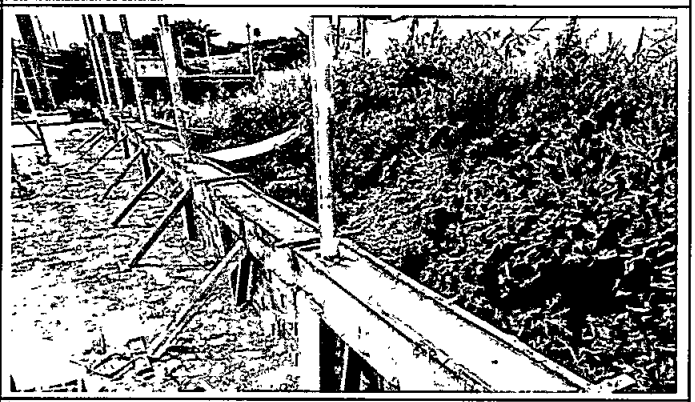

Foto 6: Fundicion de concreto para viga lateral

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
LUNES: -Se realizó el armado de las cerchas para su instalacion	
MARTES: -Se realizó la instalacion de las cerchas	
MIERCOLES: -Se continua con la i9nstalacion de las cerchas	
JUEVES: -Se realizó el encofrado de las vigas de los muros laterales y la instalacion del hierro	
VIERNES: -Se realiza la fundicion de la viga de los muros	
SABADO: -Se realizó la instalacion de las cerchas	
DOMINGO: No se realizan actividades en la obra el día de hoy	

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:
La obra presenta una ejecución 318 dias con respecto al cronograma programado

2. Disponibilidad de Recursos:
Se cuenta con la maquinaria y equipos menores necesarios para las actividades preliminares

3. Ejecución Financiera:
Se realiza actividades correspondientes a lo programado, donde se efectua una inversion total de $1 511.130.933

4. Calidad de los trabajos:
Hasta el momento los trabajos ejecutados son aceptados por la interventoría

5. Manejo Ambiental:
La obra ya cuenta con los certificados de botadero de residuos y materiales sobrantes

6. Seguridad Industrial:
los trabajadores cuentan con sus elementos de seguridad industrial, tanto personal de la obra como los profesionales de campo

7. Programa salud ocupacional (si aplica):
Se cuenta con el profesional de segundad y salud en el trabajo (SISO)

8. Aspectos sociales:

OBSERVACIONES:

* No se presentan observaciones de la obra para el periodo del presente informe

FIRMA EL CONTRATISTA
NOMBRE BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
CARGO: REP LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

Aprobado por:

VoBo (FIRMA)
NOMBRE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
CARGO. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° IND - 23 - 5027

CONTRATANTE: INDERVALLE **NIT. 805.012.896-4** ORDENADOR DEL GASTO: JUAN **CARLOS RUEDA ANGEL C.C. 94.501.292**

CONTRATISTA: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC **NIT. 901.526.894-4**
REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO **C.C. 1.006.166.501**

INTERVENTOR: CONSORCIO GRUPO 3 **NIT. 901.769.200-6** REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ. **C.C. 16.700.426**

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO OEL VALLE DEL CAUCA

VALOR TOTAL $	$1.426.801.042 M/CTE – INCLUIDO AIU					
PLAZO	6 MESES	185 DÍAS				
FECHA DE INICIO	28-dic-23					
	4-nov-24	186 DÍAS		HASTA: 9-mayo-25	9/05/2025	186
SUSPENSION 1		DEL: 14 junio 2024	14/06/2024	HASTA: 22-agosto-24	22/08/2024	70
REINICIO N° 1		DEL: 23-agosto-24	23/08/2024	HASTA: 25-agosto-24	25/08/2024	3
SUSPENSION 2		DEL: 26-agosto-24	26/08/2024	HASTA: 14-octubre-24	14/10/2024	50
REINICIO N° 2		DEL: 15-octubre-24	15/10/2024	HASTA: 22-octubre-24	22/10/2024	8
SUSPENSION 3		DEL: 22-octubre-24	22/10/2024	HASTA:4-noviembre-24	4/11/2024	13
REINICIO N° 3		DEL: 4-nobviembre-24	4/11/2024	HASTA: 9-mayo-25	9/05/2025	186

2. INFORMACION BASICA DEL FRENTE DE OBRA

FRENTE No. 01: CUBIERTA CANCHA MULTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO

VALOR COSTOS TOTALES $1 867 899 794

Informe N°: 49 Fecha de informe: 24/03/2025 A 30/03/2025

INFORMACION GENERAL

CONTRATISTA DE OBRA

Valor frente de obra:	$1.426.801.042
Adiciones o mayor valor:	$441.098.752
Valor total:	$1.867.899.794
Fecha de inicio	28/12/2023
Tiempo de prorrogas	186 dias
Tiempo de suspensiones	133 dias
Plazo estipulado:	371 dias
Fecha de terminacion:	9/05/2025
Tiempo transcurrido contrato:	325 dias

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Fecha de inicio:	28/12/2023
Tiempo de prorrogas:	186 dias
Tiempo de suspensiones:	133 dias
Plazo actualizado:	371 dias
Fecha de terminacion.	9/05/2025
Tiempo transcurrido Interventoria:	325 dias

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FISICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso
% Programado	84,95%	3,00%	87,95%	-13
% Ejecutado	75,10%	3,50%	78,60%	0
Diferencia	9,85%	0,50%	-9,35%	

AVANCE FINANCIERO

				En %
Programado(%)	$1.586.780.875	$56.036.997	$1.642.817.872	87,95%
Ejecutado (%)	$1.402.792.745	$65.376.493	$1.468.169.238	78,60%
Diferencia	-$183.988.130	$9.339.496	-$174.648.634	-9,35%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoria:	Ingeniero Residente e Inspector
Contratista:	Arquitecto Residente de obra y cuatro obreros

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Herramienta menor
Mini cargador (Bobcat)
Cilindro compactador

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	S/N/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	Interventor	S
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	Interventor	S
Normas ambientales	Interventor	S

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1: Instalacion de viga metalica.

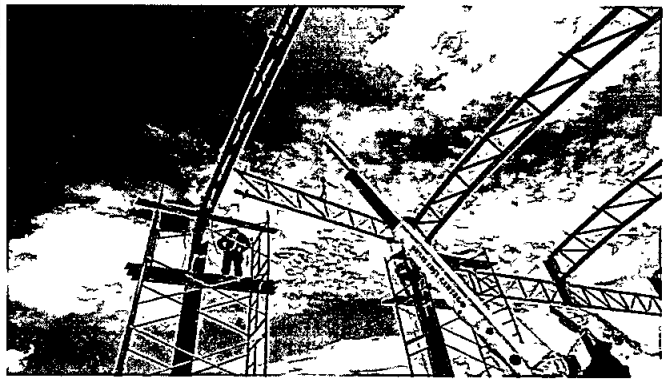

Foto 2: Instalacion de viga metalica

INDERVALLE

CG3 CONSORCIO GRUPO 3 INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Foto 3: Instalacion de viga metalica .

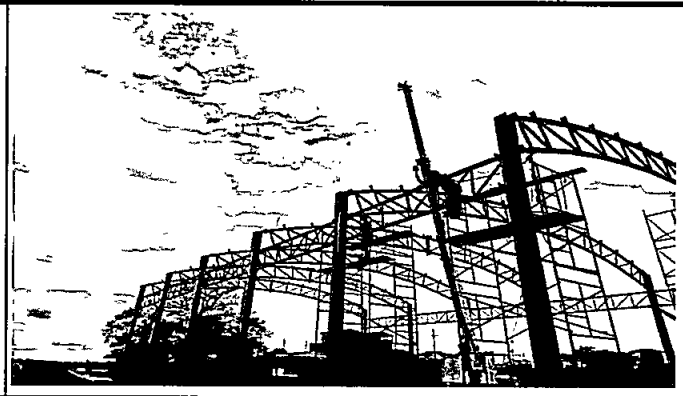

Foto 4: Instalacion de viga metalica .

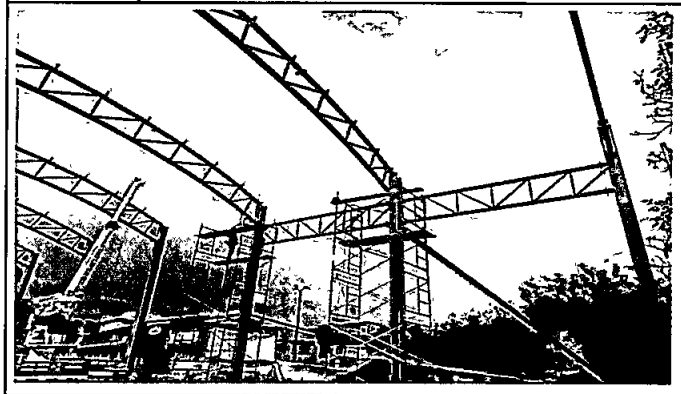

Foto 5: Instalacion de estructura metalica diagonal.

Foto 6: Estructura metalica.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
LUNES: -Se realizó encofrado en madera para fundición de muro cuneta.	
MARTES: -Se realizó encofrado en madera, instlación acero refuerzo y fundición de tramo losa del perimetro de la cancha y aplicación de antisol	
MIERCOLES: -Se realizó visita por parte de funcionario de indervalle, citando a las partes de interventoría y contratista Se realizó fundición de tramo losa del perimetro de la cancha con su respetivo acero refuerzo y aplicación de antisol.	
JUEVES: -Se realizó relleno con material de río para compactación y nivelación de terreno para fundición. Fundición de tramo del perimetro de la cancha con su respectivo acero refuerzo y aplicación de antisol.	
VIERNES: -Se continua con la fundición del ultimo tramo del perimetro de la cancha con su respectivo acero refuerzo y aplicación de antisol y toma de la muestra concreto. Llegada a la obra de platina para su respectva instalación.	
SABADO: -Carpintería y encofrado en madera, fundición de muro cuneta e instalación de caja eléctrica para polo a tierra y fundición de tapas de cajas de inspección.	
DOMINGO: No se realizan actividades en la obra el día de hoy	

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:

La obra presenta una ejecución 325 dias con respecto al cronograma programado

2. Disponibilidad de Recursos:

Se cuenta con la maquinaria y equipos menores necesarios para las actividades preliminares

3. Ejecución Financiera:

Se realiza actividades correspondientes a lo programado, donde se efectua una inversion total de $1.576.507.426

4. Calidad de los trabajos:

Hasta el momento los trabajos ejecutados son aceptados por la interventoria

5. Manejo Ambiental:

La obra ya cuenta con los certificados de botadero de residuos y materiales sobrantes.

6. Seguridad Industrial:

los trabajadores cuentan con sus elementos de seguridad industrial, tanto personal de la obra como los profesionales de campo

7. Programa salud ocupacional (si aplica):

Se cuenta con el profesional de seguridad y salud en el trabajo (SISO)

8. Aspectos sociales:

OBSERVACIONES:

* No se presentan observaciones de la obra para el penodo del presente informe

FIRMA EL CONTRATISTA

NOMBRE: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

CARGO. REP LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

Aprobado por:

VoBo (FIRMA)

NOMBRE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ

CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC
NIT 901526894-4

INFORME MENSUAL No. 11

CONTRATO DE OBRA No. IND - 23 - 5027

01 AL 31 ENERO DEL 2025

GENERALIDADES

INTRODUCCION

El presente documento es elaborado por el contratista, CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC NIT. 901.526.894-4 mediante el contrato de obra No. IND – 23 – 5027, cuyo objeto es: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

En este informe mensual se resume el seguimiento técnico, administrativo, ambiental, financiero, jurídica de los aspectos más relevantes ocurridos durante la ejecución de la obra en el periodo comprendido entre el 1 de ENERO al 31 de ENERO del 2025.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

DATOS BASICOS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CODIGO BPIN: 2022003760006

La Gobernación del Valle del Cauca realizó procesos de concertación y socialización del Plan Departamental de Desarrollo Departamental denominado: **VALLE INVENCIBLE 2020 – 2023,** dentro del cual se encuentra incluido el proyecto en asunto, con las poblaciones de los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el Departamento del Valle del Cauca.
Así mismo se realizaron mesas de trabajo con la comunidad beneficiaria del proyecto en relación con su alcance.

El proyecto general de: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES GRUPO 1 FRENTE 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES URBANIZACION LA CABAÑA MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1: FRENTE 2: ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1 : FRENTE 3 : ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, la Gobernación del Valle del Cauca y la Entidad promotora del Deporte, Educación Física y la Recreación - Indervalle, se ha basado en estudios donde se comprueba que la recreación, el deporte y la actividad física es un medio transversal que potencializa la calidad de vida de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores, convirtiéndose así en una ruta de primer nivel para la ocupación del tiempo libre, fomento de hábitos saludables y resolución de conflictos. En consecuencia, se quiere lograr que dentro de las políticas públicas locales y territoriales deportivas exista el compromiso de apoyar activamente estas iniciativas y generar espacios de encuentros diferentes que permitan explorar nuevas capacidades, transformar imaginarios, hacer uso adecuado del tiempo libre y fortalecer redes de apoyo.

Con la ejecución del proyecto, se propone articular la experiencia profesional con los conocimientos técnicos y profesionales que INDERVALLE ofrece, los cuales contribuyen al beneficio de la Comunidad y la recreación en los Distritos de: Cali y Buenaventura y Municipio de Cartago, Departamento del Valle del Cauca, a través de adecuación, construcción o dotación, e igualmente se canalizan las habilidades aprendidas en intervenciones anteriores.

Es importante resaltar que el proyecto consolida los procesos deportivos, recreativos y culturales en el Departamento del Valle del Cauca, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y construcción de tejido social en los sitios donde se desarrollan.

En resumen, tenemos:

CONTRATO DE OBRA No. IND - 23 – 5027 GRUPO 2

INFORMACION DEL CONTRATO

1. TIPO DE CONTRATO	
OBRA [X]	INTERVENTORIA [ ]
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Informe Número: 11	Periodo desde el (01/01/2025) hasta el (31/01/2025)
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato / Aceptación de Oferta No. IND – 23 – 5027 GRUPO 2	
Nombre Completo del Contratista: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	
Cédula y/o Nit: 901.526.894-4	Correo Electrónico: construpacicolsaszomac.info@gmail.com
Dirección: manzana H 14ABarrio Huasipanga Mocoa - Putumayo	Teléfonos: 320 473 66 72
Nombre de interventoría: CONSORCIO GRUPO 3	
Dependencia: Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca - INDERVALLE	No. Teléfono y Extensión: (602) 25569242
Obra Física Ejecutada del Periodo: **3.3%**	Obra Física Ejecutada Acumulada: **59.6%**
Objeto Contrato Obra: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	

3. INFORME JURÍDICO		
Fecha de Inicio	Plazo de Ejecución	Fecha terminación
28 DE DICIEMBRE DE 2023	371 DIAS	09 DE MAYO DE 2025

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO
Valor del Contrato: Es hasta por la suma de: MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS. **$1.867.899.794**
Adición No. 1: $ 441.098.752
Prórroga No.: 1 | 186 días
Prórroga No.: 2 | N/A
Prórroga No.: 3 | N/A
Prórroga No.: 4 | N/A
Suspensión No.: 1 | 14/06/2024 al 21/07/2024
Ampliación Suspensión No.: 1 | 22/07/2024 al 22/08/2024
Reinicio No.: 1 | 23/08/2024
Suspensión No.: 2 | 28/08/2024 al 26/09/2024
Ampliación Suspensión No.: 2 | 27/09/2024 al 14/10/2024
Reinicio No.: 2 | 15/10/2024
Suspensión No.: 3 | 23/10/2024 al 04/11/2024
Reinicio No.: 3 | 05/11/2024
Cesión: N.A.
Terminación Anticipada: N/A
Acta de recibo final de obra: N/A
Acta de liquidación: N/A
Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Adición 1	Valor Acumulado Contrato	Valor Anticipo
$ 1.426.801.042	$ 441:098.752	**$ 1.867.899.794**	$ 0.00

ACTA				RECIBO PARCIAL		VALOR NETO A PAGAR	
No.	Meses Ejecución			Ejecutado (Valor Bruto)	Acumulado	Amortización Anticipo	A pagar
1	12/23-3/24			172.520.032	172.520.032	-0,00-	172.520.032
2	4/24-5/24			300.060.417	472.580.449	-0,00-	300.060.417
3	6/24-11/24			182.787.366	655.367.815	-0,00-	182.787.366
4	12/24-12/24			396.739.850	1.052.019.610	-0,00-	396.739.850

POLIZAS

SEGÚN FECHA DE CONTRATO

GARANTE (Aseguradora, Banco o Fiduciaria)	No. GARANTÍA	FECHA DE EXPEDICION	AMPAROS	VIGENCIA		SUFICIENCIA (monto garantizado)
				Desde (d/m/a)	Hasta (d/m/a)	
Seguros del Estado	420-47-994000042515 Póliza de Garantía Única de Cumplimiento Estatal	26/11/2024	Cumplimiento del Contrato	22/12/2023	09/11/2025	$ 375.447.858,80
			Pago de salarios, prestaciones sociales	22/12/2023	09/05/2028	$ 151.299.883,40
			Calidad de la Obra	30/06/2024	09/05/2030	$ 375.447.858.80
Seguros del Estado	420-47-994000010243 Póliza Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual	26/11/2024	Predios labores y operaciones	22/12/2023	09/05/2025	$ 260.000.000.00

ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025

Según la proyección de ejecución de obra, las actividades realizadas en este periodo corresponden a las actividades preliminares de la cancha múltiple; como son relleno y nivelación de material de rio para base, sub-base y compactación de terreno.

- ✓ Se realizó levantamiento topográfico (Comisión topográfica) para estructura.
- ✓ Se realizó la llegada de estructura metálica para su instalación...
- ✓ Se realizó la instalación de las platinas de nivelacion.
- ✓ Se realizo tratamiento de juntas.

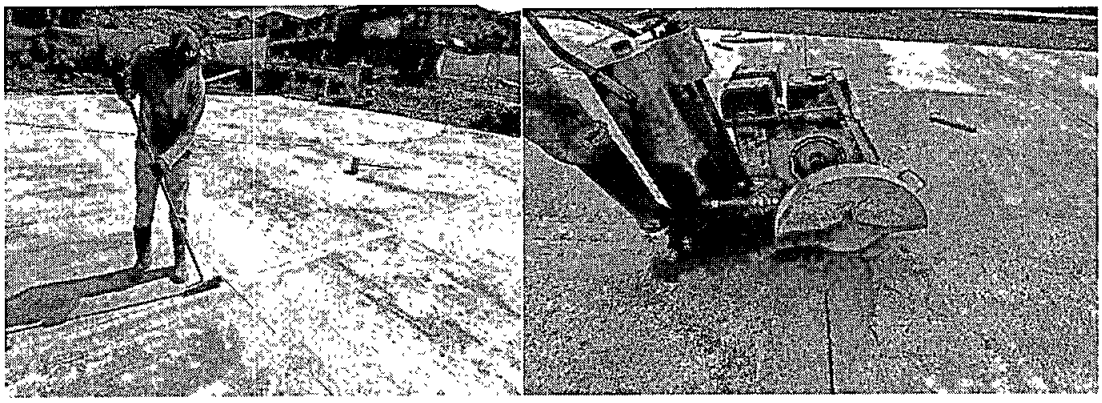

Corte de pavimento para juntas.

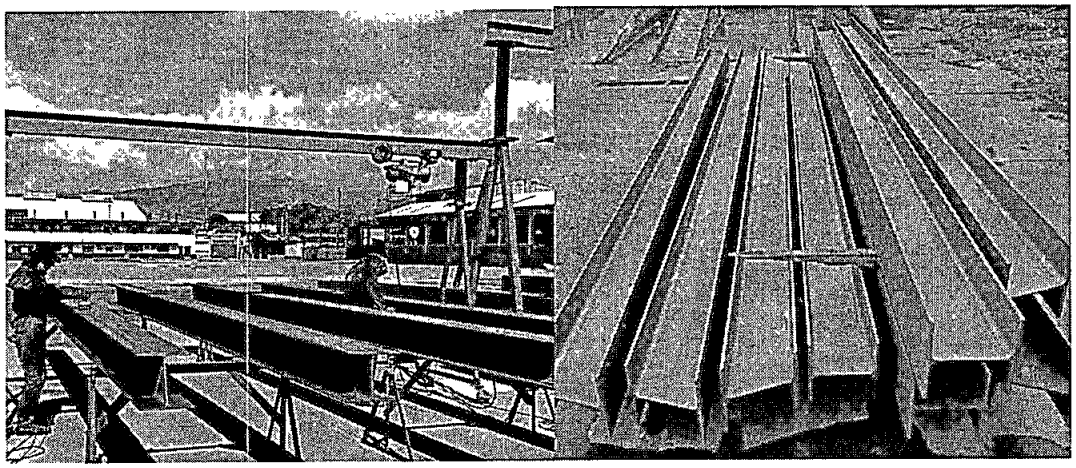

Adecuación y pintura columnas.

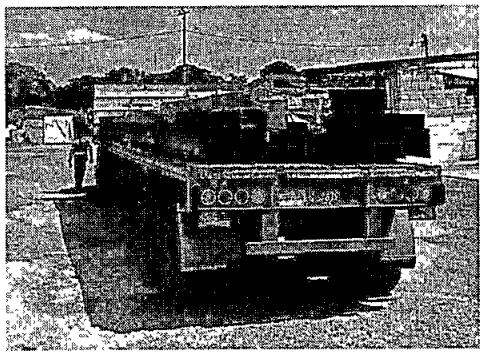

Dirección: Manzana H14- Barrio Huasipanga, Mocoa, Putumayo
Cel: 320 4736672
Correo Electrónico: construpacicolsaszomac.info@gmail.com

Transporte de estructura.

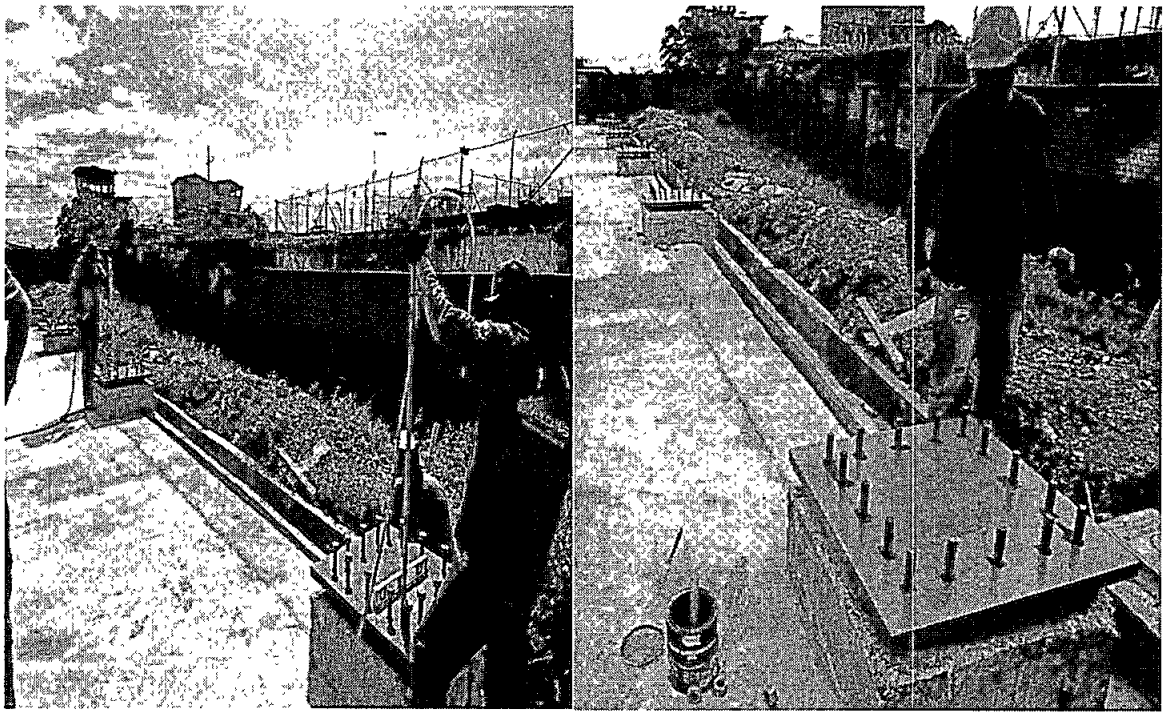

Instalación y nivelación de las platinas.

RECURSOS HUMANOS

Para la gestión y ejecución de las actividades de obra durante este periodo se contó con el apoyo del siguiente personal:

- Ing. Guillermo Villegas
- Arq. Beymar Panameño Angulo
- Profesional en SST Álvaro Tenorio
- Almacenista
- 1 Maestro de obra
- 1 Oficiales
- 2 Ayudantes
- 5 soldadores.

Revisión y Verificación de Pago de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscal

(EPS, ARL y AFP)

Para el periodo informado contamos (CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC NIT) con las afiliaciones de todo el personal al Sistema General de Riesgos Laborales y los respectivos pagos de las planillas de aportes al sistema Integral de seguridad social, según los dos últimos dígitos del NIT, como lo establece el Art.3.2.2.1 del Decreto 923 de 2017 expedido por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud y Protección Social

REVISION DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Se realizaron tomas de muestras de concreto en obra, las cuales se deben llevar a laboratorio para sus respectivos fallos.

AVANCE DE OBRA

Ejecución del contrato

Porcentaje de Obra Proyectado Grupo 2: 60%

Porcentaje de obra Ejecutado: 69,60%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista no presenta atrasos en la obra, pero por causas no imputables a Él como son las condiciones climáticas y problemas de orden público no se ha podido avanzar más.
- Durante el presente periodo se ha contratado personal del sector donde se ejecuta la obra.
- El contrato de obra presenta un avance del **59.60 %.**

Hasta el corte del presente informe, nos disponemos a iniciar las actividades de suministro e instalación de sikagrout para anclajes, instalación de estructura metálica para cubierta de

la cancha con su respectivas laminas, realizar las actividades de drenajes de aguas lluvias (cunetas),

Atentamente,

Brenda Murillo B.

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Dirección: Manzana H14- Barrio Huasipanga, Mocoa, Putumayo
Cel: 320 4736672
Correo Electrónico: construpacicolsaszomac.info@gmail.com

CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC
NIT 901526894-4

INFORME MENSUAL No. 12

CONTRATO DE OBRA No. IND - 23 - 5027

01 AL 28 FEBRERO DEL 2025

GENERALIDADES

INTRODUCCION

El presente documento es elaborado por el contratista, CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC NIT. 901.526.894-4 mediante el contrato de obra No. IND – 23 – 5027, cuyo objeto es: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

En este informe mensual se resume el seguimiento técnico, administrativo, ambiental, financiero, jurídica de los aspectos más relevantes ocurridos durante la ejecución de la obra en el periodo comprendido entre el 1 de FEBRERO al 28 de FEBRERO del 2025.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

DATOS BASICOS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CODIGO BPIN: 2022003760006

La Gobernación del Valle del Cauca realizó procesos de concertación y socialización del Plan Departamental de Desarrollo Departamental denominado: **VALLE INVENCIBLE 2020 – 2023,** dentro del cual se encuentra incluido el proyecto en asunto, con las poblaciones de los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el Departamento del Valle del Cauca.
Así mismo se realizaron mesas de trabajo con la comunidad beneficiaria del proyecto en relación con su alcance.

El proyecto general de: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES GRUPO 1 FRENTE 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES URBANIZACION LA CABAÑA MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1: FRENTE 2: ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1 : FRENTE 3 : ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, la Gobernación del Valle del Cauca y la Entidad promotora del Deporte, Educación Física y la Recreación - Indervalle, se ha basado en estudios donde se comprueba que la recreación, el deporte y la actividad física es un medio transversal que potencializa la calidad de vida de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores, convirtiéndose así en una ruta de primer nivel para la ocupación del tiempo libre, fomento de hábitos saludables y resolución de conflictos. En consecuencia, se quiere lograr que dentro de las políticas públicas locales y territoriales deportivas exista el compromiso de apoyar activamente estas iniciativas y generar espacios de encuentros diferentes que permitan explorar nuevas capacidades, transformar imaginarios, hacer uso adecuado del tiempo libre y fortalecer redes de apoyo.

Con la ejecución del proyecto, se propone articular la experiencia profesional con los conocimientos técnicos y profesionales que INDERVALLE ofrece, los cuales contribuyen al beneficio de la Comunidad y la recreación en los Distritos de: Cali y Buenaventura y Municipio de Cartago, Departamento del Valle del Cauca, a través de adecuación, construcción o dotación, e igualmente se canalizan las habilidades aprendidas en intervenciones anteriores.

Es importante resaltar que el proyecto consolida los procesos deportivos, recreativos y culturales en el Departamento del Valle del Cauca, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y construcción de tejido social en los sitios donde se desarrollan.

En resumen, tenemos:

CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC
NIT 901526894-4

CONTRATO DE OBRA No. IND - 23 – 5027 GRUPO 2

INFORMACION DEL CONTRATO

1. TIPO DE CONTRATO	
OBRA [X]	INTERVENTORIA [ ]
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Informe Número: 12	Periodo desde el (01/02/2025) hasta el (28/02/2025)
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato / Aceptación de Oferta No. IND – 23 – 5027 GRUPO 2	
Nombre Completo del Contratista: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	
Cédula y/o Nit: 901.526.894-4	Correo Electrónico: construpacicolsaszomac.info@gmail.com
Dirección: manzana H 14ABarrio Huasipanga Mocoa - Putumayo	Teléfonos: 320 473 66 72
Nombre de interventoría: CONSORCIO GRUPO 3	
Dependencia: Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca - INDERVALLE	No. Teléfono y Extensión: (602) 25569242
Obra Física Ejecutada del Periodo: **3.4%**	Obra Física Ejecutada Acumulada: **62.0%**
Objeto Contrato Obra: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	

3. INFORME JURÍDICO		
Fecha de Inicio	Plazo de Ejecución	Fecha terminación
28 DE DICIEMBRE DE 2023	371 DIAS	09 DE MAYO DE 2025

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO
Valor del Contrato: Es hasta por la suma de: MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS. **$1.867.899.794**
Adición No. 1: $ 441.098.752
Prórroga No.: 1 186 días
Prórroga No.: 2 | N/A
Prórroga No.: 3 | N/A
Prórroga No.: 4 | N/A
Suspensión No.: 1 | 14/06/2024 al 21/07/2024
Ampliación Suspensión No.: 1 | 22/07/2024 al 22/08/2024
Reinicio No.: 1 | 23/08/2024
Suspensión No.: 2 | 28/08/2024 al 26/09/2024
Ampliación Suspensión No.: 2 | 27/09/2024 al 14/10/2024
Reinicio No.: 2 | 15/10/2024
Suspensión No.: 3 | 23/10/2024 al 04/11/2024
Reinicio No.: 3 | 05/11/2024
Cesión: N.A.
Terminación Anticipada: N/A
Acta de recibo final de obra: N/A
Acta de liquidación: N/A
Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Adición 1	Valor Acumulado Contrato	Valor Anticipo
$ 1.426.801.042	$ 441.098.752	**$ 1.867.899.794**	$ 0.00

ACTA				RECIBO PARCIAL		VALOR NETO A PAGAR	
No	Meses Ejecución			Ejecutado (Valor Bruto)	Acumulado	Amortización Anticipo	A pagar
1	12/23-3/24			172.520.032	172.520.032	-0,00-	172.520.032
2	4/24-5/24			300.060.417	472.580.449	-0,00-	300.060.417
3	6/24-11/24			182.787.366	655.367.815	-0,00-	182.787.366
4	12/24-12/24			396.739.850	1.052.019.610	-0,00-	396.739.850
5						-0,00-	

POLIZAS

SEGÚN FECHA DE CONTRATO

GARANTE (Aseguradora, Banco o Fiduciaria)	No. GARANTÍA	FECHA DE EXPEDICIO N	AMPAROS	VIGENCIA		SUFICIENCIA (monto garantizado)
				Desde (d/m/a)	Hasta (d/m/a)	
Seguros del Estado	420-47-994000042515 Póliza de Garantía Única de Cumplimiento Estatal	26/11/2024	Cumplimiento del Contrato	22/12/2023	09/11/2025	$ 375.447.858,80
			Pago de salarios, prestaciones sociales	22/12/2023	09/05/2028	$ 151.299.883,40
			Calidad de la Obra	30/06/2024	09/05/2030	$ 375.447.858.80
Seguros del Estado	420-47-994000010243 Póliza Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual	26/11/2024	Predios labores y operaciones	22/12/2023	09/05/2025	$ 260.000.000.00

ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

Según la proyección de ejecución de obra, las actividades realizadas en este periodo corresponden a las actividades preliminares de la cancha múltiple; como son relleno y nivelación de material de rio para base, sub-base y compactación de terreno.

- ✓ Se realizó levantamiento topográfico (Comisión topográfica).
- ✓ Se realizó compactación y nivelación de terreno.
- ✓ Se realizó instalación de formaletas para fundición de concreto.
- ✓ Se realizó la llegada de estructura metálica para su instalación...
- ✓ Se realizó fundición del ´piso de la canal.

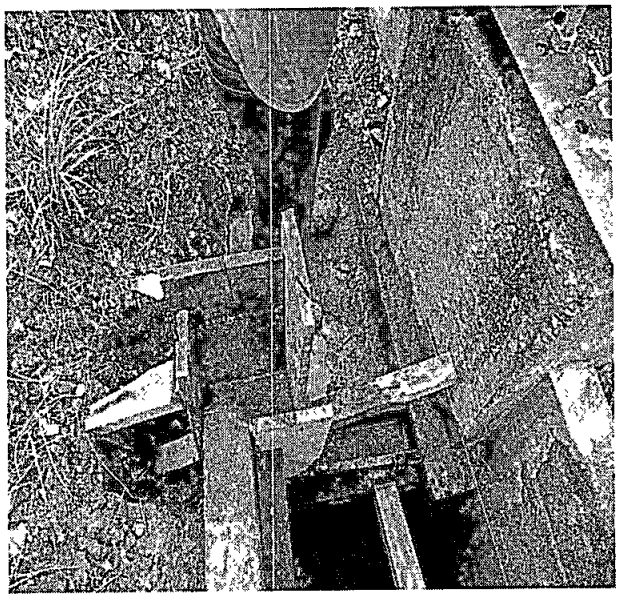

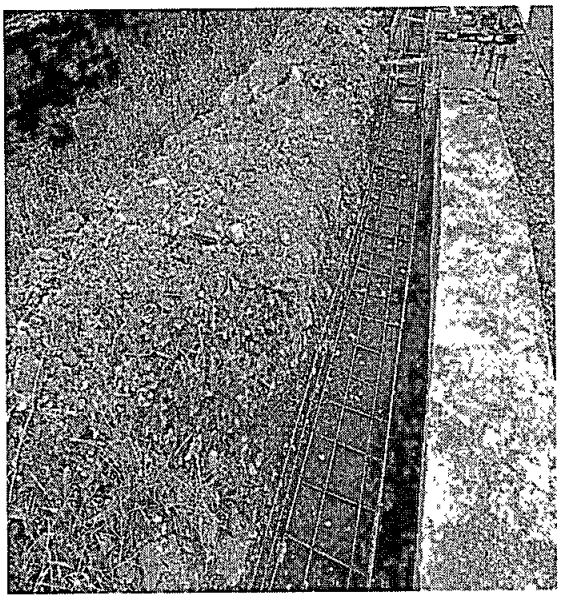

Reparación caja y construcción de canal para aguas lluvias.

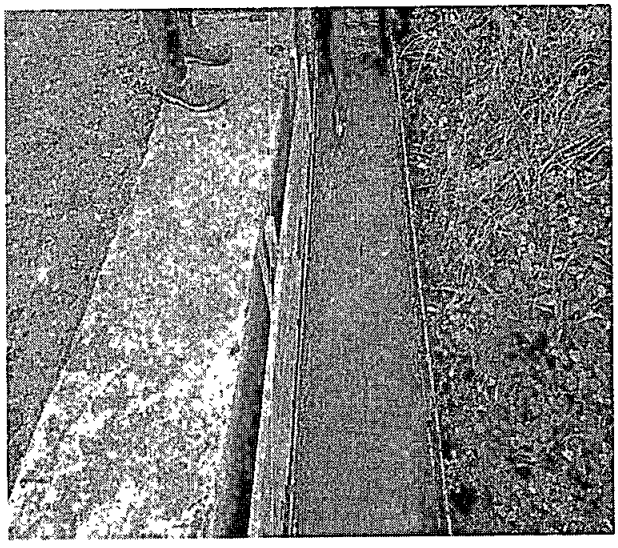

Instalación de hierro de refuerzo.

Dirección: Manzana H14- Barrio Huasipanga, Mocoa, Putumayo
Cel: 320 4736672
Correo Electrónico: construpacicolsaszomac.info@gmail.com

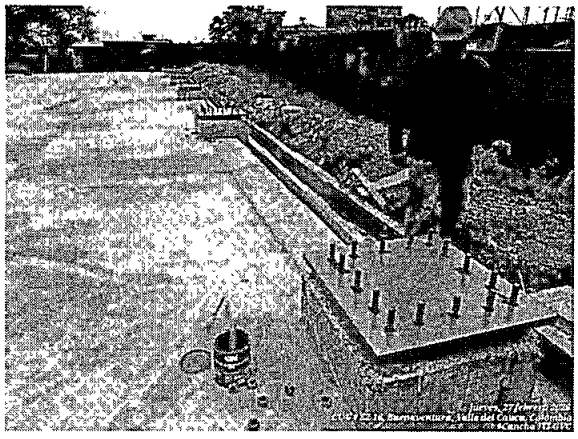

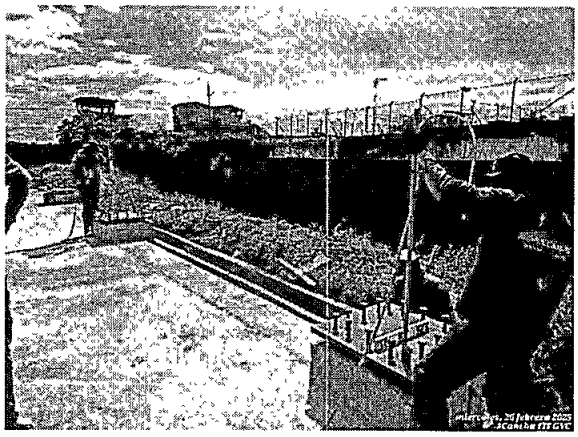

Se continua con Instalación de platinas

RECURSOS HUMANOS

Para la gestión y ejecución de las actividades de obra durante este periodo se contó con el apoyo del siguiente personal:

- Ing. Guillermo Villegas
- Arq. Beymar Panameño Angulo
- Profesional en SST Álvaro Tenorio
- Almacenista
- 5 soldadores.

Revisión y Verificación de Pago de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscal (EPS, ARL y AFP)

Para el periodo informado contamos (CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC NIT) con las afiliaciones de todo el personal al Sistema General de Riesgos Laborales y los respectivos pagos de las planillas de aportes al sistema Integral de seguridad social, según los dos últimos dígitos del NIT, como lo establece el Art.3.2.2.1 del Decreto 923 de 2017 expedido por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud y Protección Social

CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC
NIT 901526824-4

REVISION DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Se realizaron tomas de muestras de concreto en obra, las cuales se deben llevar a laboratorio para sus respectivos fallos.

AVANCE DE OBRA

Ejecución del contrato

Porcentaje de Obra Proyectado Grupo 2: 69%

Porcentaje de obra Ejecutado: 62%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el presente periodo se ha contratado personal del sector donde se ejecuta la obra.
- El contrato de obra presenta un avance del 69.00 %. Presentando un atraso con la programación del 7 %.

Hasta el corte del presente informe, nos disponemos a iniciar las actividades de suministro e instalación de sikagrout para anclajes, instalación de estructura metálica para cubierta de la cancha con su respectivas laminas, realizar las actividades de drenajes de aguas lluvias (cunetas).

Atentamente,

Brenda Murillo B.

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Dirección: Manzana H14- Barrio Huasipanga, Mocoa, Putumayo
Cel: 320 4736672
Correo Electrónico: construpacicolsaszomac.info@gmail.com

CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC
NIT 901526894-4

INFORME MENSUAL No. 13

CONTRATO DE OBRA No. IND - 23 - 5027

01 AL 31 MARZO DEL 2025

GENERALIDADES

INTRODUCCION

El presente documento es elaborado por el contratista, CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC NIT. 901.526.894-4 mediante el contrato de obra No. IND – 23 – 5027, cuyo objeto es: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

En este informe mensual se resume el seguimiento técnico, administrativo, ambiental, financiero, jurídica de los aspectos más relevantes ocurridos durante la ejecución de la obra en el periodo comprendido entre el 1 de MARZO al 31de MARZO del 2025.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

DATOS BASICOS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CODIGO BPIN: 2022003760006

La Gobernación del Valle del Cauca realizó procesos de concertación y socialización del Plan Departamental de Desarrollo Departamental denominado: **VALLE INVENCIBLE 2020 – 2023,** dentro del cual se encuentra incluido el proyecto en asunto, con las poblaciones de los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el Departamento del Valle del Cauca.
Así mismo se realizaron mesas de trabajo con la comunidad beneficiaria del proyecto en relación con su alcance.

El proyecto general de: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES GRUPO 1 FRENTE 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES URBANIZACION LA CABAÑA MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1: FRENTE 2: ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1 : FRENTE 3 : ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, la Gobernación del Valle del Cauca y la Entidad promotora del Deporte, Educación Física y la Recreación - Indervalle, se ha basado en estudios donde se comprueba que la recreación, el deporte y la actividad física es un medio transversal que potencializa la calidad de vida de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores, convirtiéndose así en una ruta de primer nivel para la ocupación del tiempo libre, fomento de hábitos saludables y resolución de conflictos. En consecuencia, se quiere lograr que dentro de las políticas públicas locales y territoriales deportivas exista el compromiso de apoyar activamente estas iniciativas y generar espacios de encuentros diferentes que permitan explorar nuevas capacidades, transformar imaginarios, hacer uso adecuado del tiempo libre y fortalecer redes de apoyo.

Con la ejecución del proyecto, se propone articular la experiencia profesional con los conocimientos técnicos y profesionales que INDERVALLE ofrece, los cuales contribuyen al beneficio de la Comunidad y la recreación en los Distritos de: Cali y Buenaventura y Municipio de Cartago, Departamento del Valle del Cauca, a través de adecuación, construcción o dotación, e igualmente se canalizan las habilidades aprendidas en intervenciones anteriores.

Es importante resaltar que el proyecto consolida los procesos deportivos, recreativos y culturales en el Departamento del Valle del Cauca, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y construcción de tejido social en los sitios donde se desarrollan.

En resumen, tenemos:

CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC
NIT 901526894-4

CONTRATO DE OBRA No. IND - 23 – 5027 GRUPO 2

INFORMACION DEL CONTRATO

1. TIPO DE CONTRATO		
OBRA [X]		INTERVENTORIA [ ]
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL	[ ]
Informe Número: 13	Periodo desde el (01/03/2025) hasta el (31/03/2025)	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN		
Contrato / Aceptación de Oferta No. IND – 23 – 5027 GRUPO 2		
Nombre Completo del Contratista: CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC		
Cédula y/o Nit: 901.526.894-4	Correo Electrónico: construpacicolsaszomac.info@gmail.com	
Dirección: manzana H 14ABarrio Huasipanga Mocoa - Putumayo	Teléfonos: 320 473 66 72	
Nombre de interventoría: CONSORCIO GRUPO 3		
Dependencia: Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca - INDERVALLE	No. Teléfono y Extensión: (602) 25569242	
Obra Física Ejecutada del Periodo: **11.0%**	Obra Física Ejecutada Acumulada: **72.8%**	
Objeto Contrato Obra: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
3. INFORME JURÍDICO		
Fecha de Inicio	Plazo de Ejecución	Fecha terminación
28 DE DICIEMBRE DE 2023	371 DIAS	09 DE MAYO DE 2025

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO
Valor del Contrato: Es hasta por la suma de: MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS. **$1.867.899.794**
Adición No. 1: $ 441.098.752
Prórroga No.: 1 186 días
Prórroga No.: 2 | N/A
Prórroga No.: 3 | N/A
Prórroga No.: 4 | N/A
Suspensión No.: 1 | 14/06/2024 al 21/07/2024
Ampliación Suspensión No.: 1 | 22/07/2024 al 22/08/2024
Reinicio No.: 1 | 23/08/2024
Suspensión No.: 2 | 28/08/2024 al 26/09/2024
Ampliación Suspensión No.: 2 | 27/09/2024 al 14/10/2024
Reinicio No.: 2 | 15/10/2024
Suspensión No.: 3 | 23/10/2024 al 04/11/2024
Reinicio No.: 3 | 05/11/2024
Cesión: N.A.
Terminación Anticipada: N/A
Acta de recibo final de obra: N/A
Acta de liquidación: N/A
Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Adición 1	Valor Acumulado Contrato	Valor Anticipo
$ 1.426.801.042	$ 441.098.752	**$ 1.867.899.794**	$ 0.00

ACTA				RECIBO PARCIAL		VALOR NETO A PAGAR	
No	Meses Ejecución			Ejecutado (Valor Bruto)	Acumulado	Amortización Anticipo	A pagar
1	12/23-3/24			172.520.032	172.520.032	-0,00-	172.520.032
2	4/24-5/24			300.060.417	472.580.449	-0,00-	300.060.417
3	6/24-11/24			182.787.366	655.367.815	-0,00-	182.787.366
4	12/24-12/24			396.739.850	1.052.019.610	-0,00-	396.739.850
5							
6						-0,00-	

POLIZAS

SEGÚN FECHA DE CONTRATO

GARANTE (Aseguradora, Banco o Fiduciaria)	No. GARANTÍA	FECHA DE EXPEDICION	AMPAROS	VIGENCIA		SUFICIENCIA (monto garantizado)
				Desde (d/m/a)	Hasta (d/m/a)	
Seguros del Estado	420-47-994000042515 Póliza de Garantía Única de Cumplimiento Estatal	26/11/2024	Cumplimiento del Contrato	22/12/2023	09/11/2025	$ 375.447.858,80
			Pago de salarios, prestaciones sociales	22/12/2023	09/05/2028	$ 151.299.883,40
			Calidad de la Obra	30/06/2024	09/05/2030	$ 375.447.858.80
Seguros del Estado	420-47-994000010243 Póliza Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual	26/11/2024	Predios labores y operaciones	22/12/2023	09/05/2025	$ 260.000.000.00

ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025

Según la proyección de ejecución de obra, las actividades realizadas en este periodo corresponden a las actividades preliminares de la cancha múltiple; como son relleno y nivelación de material de rio para base, sub-base y compactación de terreno.

- ✓ Se continuo con la construcción de estructura metálica en taller.
- ✓ Se realizó transporte de la estructura metálica.
- ✓ Se realizó instalación de formaletas para fundición columna en de concreto.
- ✓ Se realizó fundición de viga en concreto reforzado para muro.
- ✓ Se realizó la llegada de estructura metálica faltante para su instalación.
- ✓ Se inicio la instalación de estructura metálica.

CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC
NIT 901526894-4

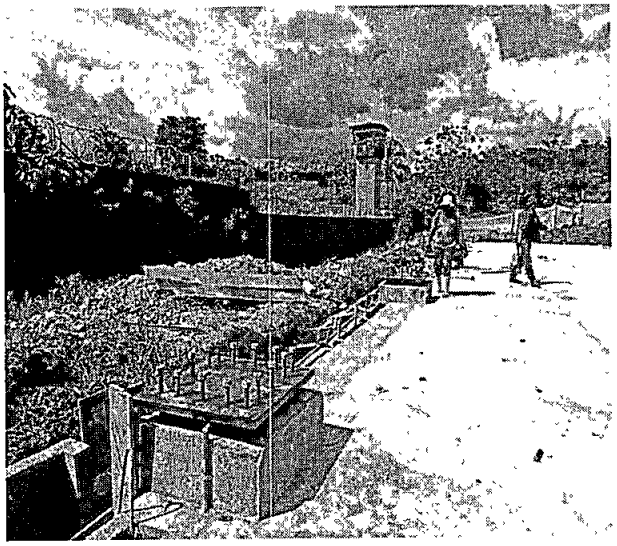

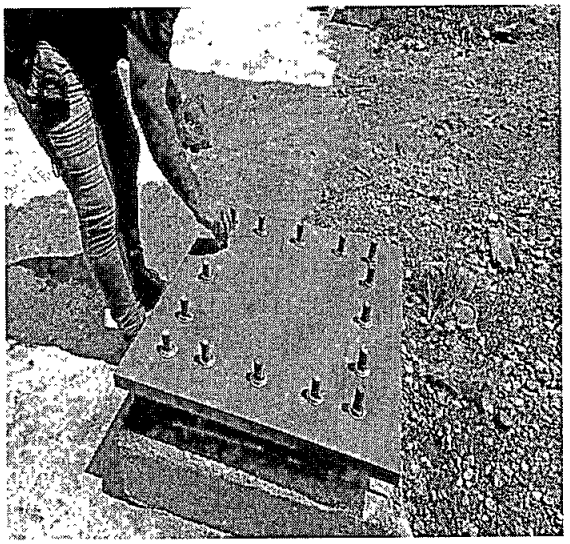

Terminación de Instalación de platina para bases de la estructura.

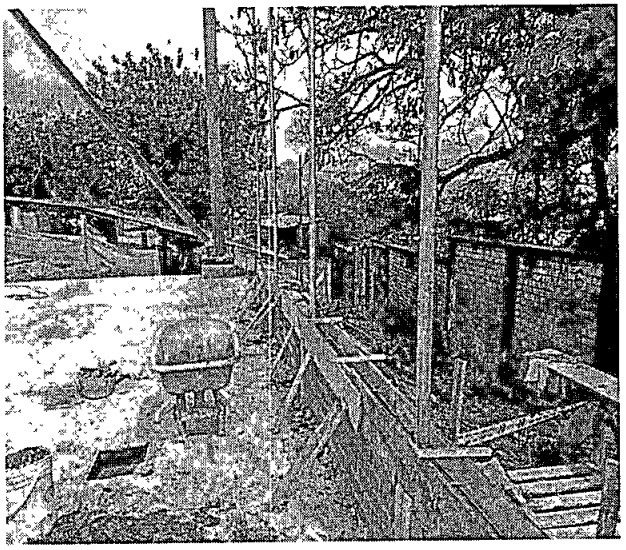

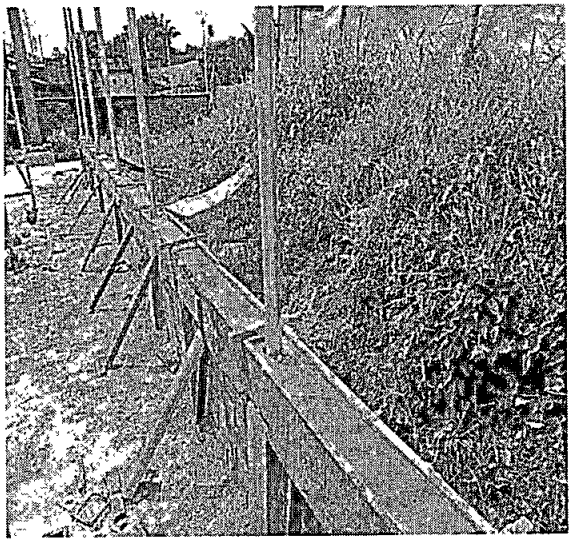

Instalación de hierro de refuerzo y fundicion de viga.

.

Dirección: Manzana H14- Barrio Huasipanga, Mocoa, Putumayo
Cel: 320 4736672
Correo Electrónico: construpacicolsaszomac.info@gmail.com

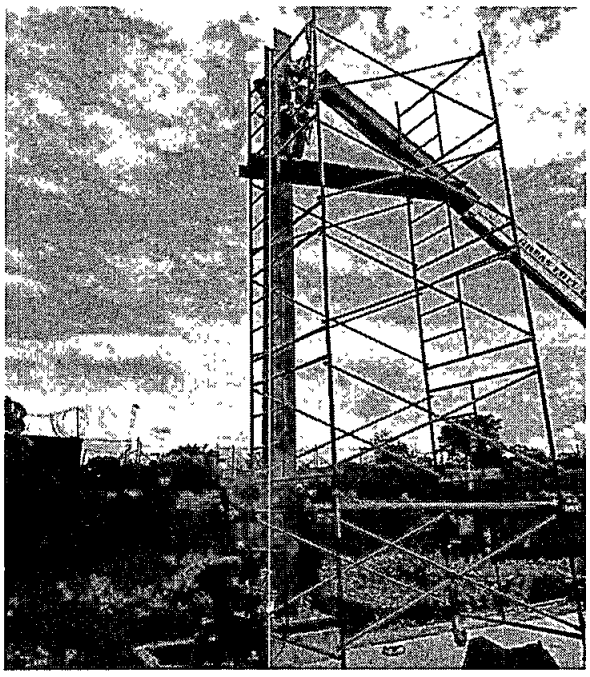

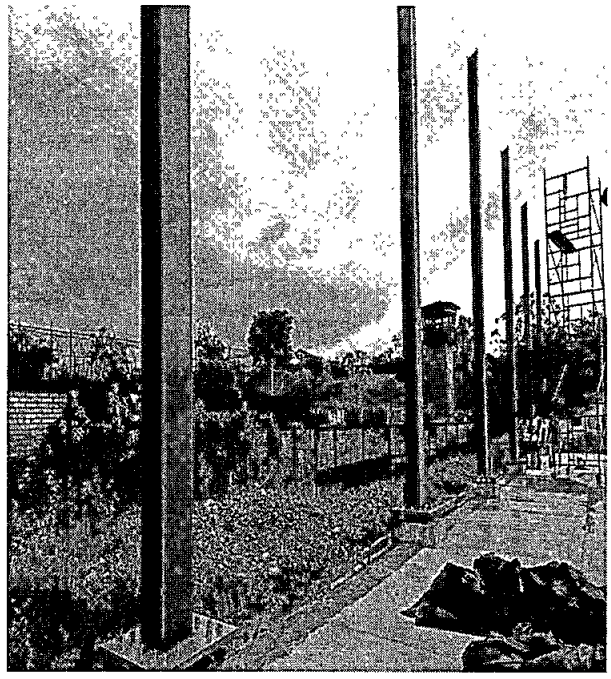

Instalación de columnas metálicas.

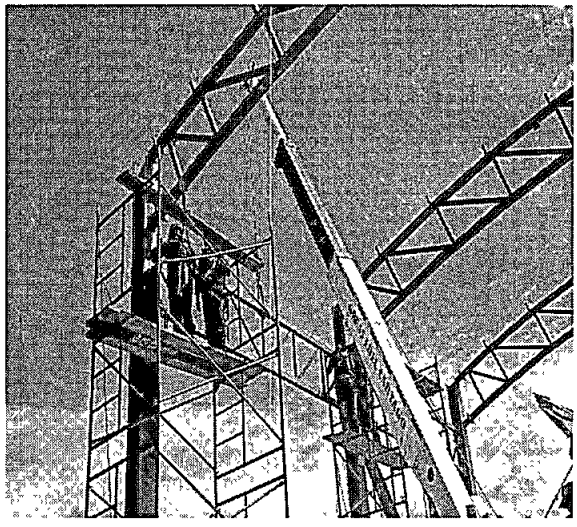

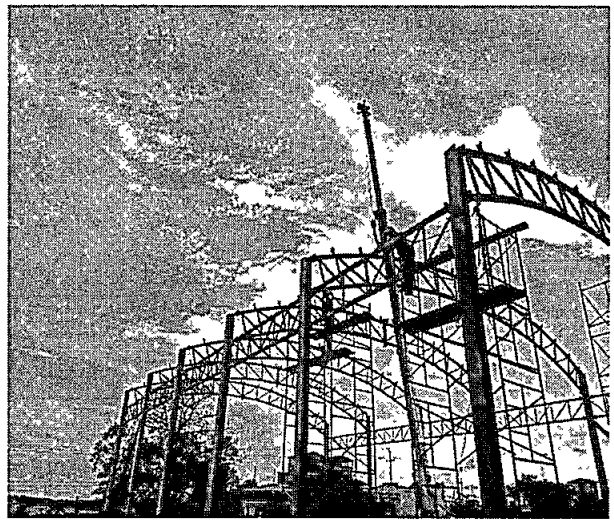

Instalación de columnas metálicas.

Dirección: Manzana H14- Barrio Huasipanga, Mocoa, Putumayo
Cel: 320 4736672
Correo Electrónico: construpacicolsaszomac.info@gmail.com

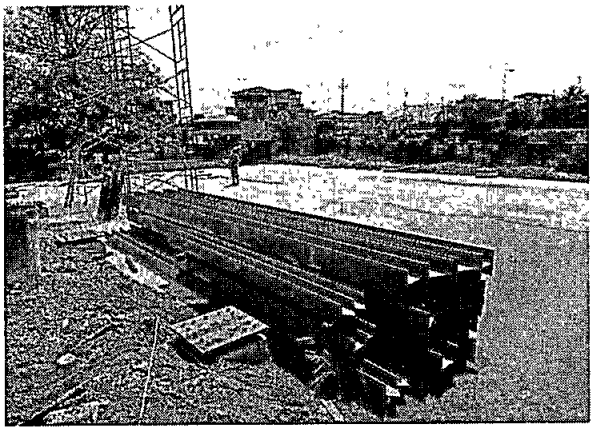
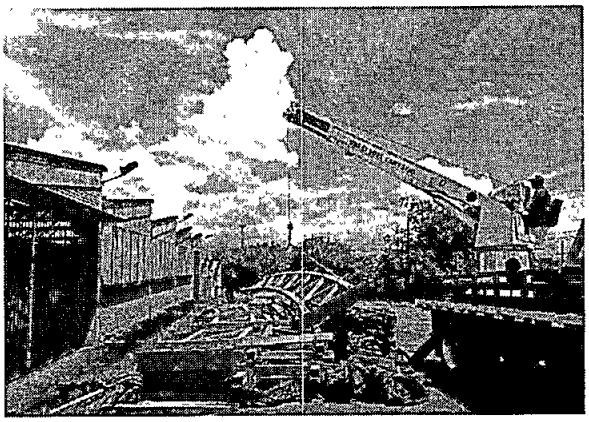

Llegada de estructura metálica.

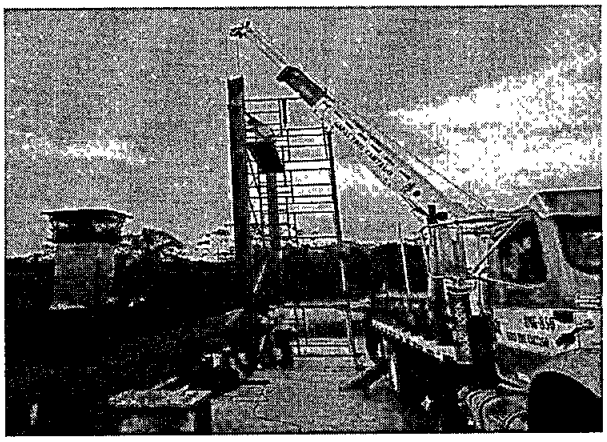
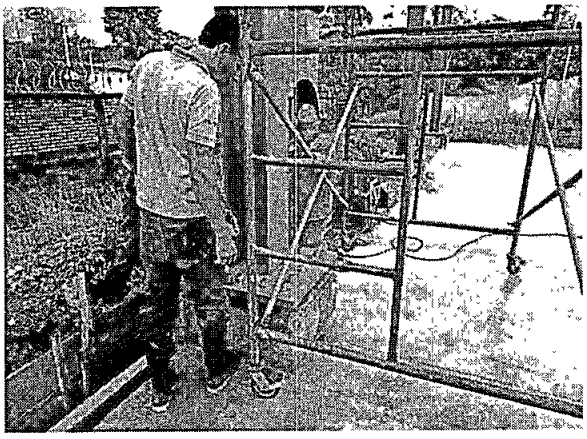

Instalación de columnas metálicas.

Dirección: Manzana H14- Barrio Huasipanga, Mocoa, Putumayo
Cel: 320 4736672
Correo Electrónico: construpacicolsaszomac.info@gmail.com

RECURSOS HUMANOS

Para la gestión y ejecución de las actividades de obra durante este periodo se contó con el apoyo del siguiente personal:

- Ing. Guillermo Villegas
- Arq. Beymar Panameño Angulo
- Profesional en SST Álvaro Tenorio
- Almacenista
- 1 Maestro de obra
- 1 Oficiales
- 2 Ayudantes
- 5 Soldadores

Revisión y Verificación de Pago de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscal (EPS, ARL y AFP)

Para el periodo informado contamos (CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC NIT) con las afiliaciones de todo el personal al Sistema General de Riesgos Laborales y los respectivos pagos de las planillas de aportes al sistema Integral de seguridad social, según los dos últimos dígitos del NIT, como lo establece el Art.3.2.2.1 del Decreto 923 de 2017 expedido por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud y Protección Social

REVISION DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Se realizaron tomas de muestras de concreto en obra, las cuales se deben llevar a laboratorio para sus respectivos fallos.

AVANCE DE OBRA

Ejecución del contrato

Porcentaje de Obra Proyectado Grupo 2: 72.8 %

Porcentaje de obra Ejecutado: 82 %

CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC
NIT 901526894-4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista presenta atrasos en la obra, por causas no imputables a Él como son las condiciones climáticas y problemas de orden público.
- Durante el presente periodo se ha contratado personal del sector donde se ejecuta la obra.
- El contrato de obra presenta un avance del **72.8%.**

Hasta el corte del presente informe, nos disponemos a continuar con la instalación de estructura metálica para cubierta de la cancha con su respectivas laminas, realizar las actividades de drenajes de aguas lluvias (cunetas),

Atentamente,

Brenda Murillo B.

Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Dirección: Manzana H14- Barrio Huasipanga, Mocoa, Putumayo
Cel: 320 4736672
Correo Electrónico: construpacicolsaszomac.info@gmail.com

SEGURIDAD SOCIAL

SCAN
RECEIVED

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901526894	4	CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MZ H 14A BRR HUASIPANGA	MOCOA-PUTUMAYO	4604877	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1273587158	9481737806	E	2025/01/24	2025/02/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	24	$1,295,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1020736191	MARTINEZ ROBERTO																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
2	CC	1072642624	MORERA LINA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
3	CC	1006166501	MURILLO BRENDA	X																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
4	CC	437428	VILLEGAS GUILLERMO	X																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
Total			Afiliados(4)																				$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$27,200		$0	$0		$1,275,200

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901526894	4	CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MZ H 14A BRR HUASIPANGA	MOCOA-PUTUMAYO	4604877	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2024-12	2025-01	1273587158	9481737806	E	2025/01/24	2025/02/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	24	$1,295,700	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$832,000	$13,200	$0	$845,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$3,300	$0	$211,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$3,300	$0	$211,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$3,300	$0	$211,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$3,300	$0	$211,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$27,200	$500	$0	$27,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$27,200	$500	$0	$27,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$208,000	$3,300	$0	$211,300
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	4	$208,000	$3,300	$0	$211,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$208,000	$3,500	$0	$211,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$52,000	$900	$0	$52,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$900	$0	$52,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$104,000	$1,700	$0	$105,700
TOTAL				4	$1,275,200	$20,500	$0	$1,295,700

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901526894	4	CONSTRUPACIFICOL SAS ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MZ H 14A BRR HUASIPANGA	MOCOA-PUTUMAYO	4604877	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1273601605	9481737832	E	2025/02/24	2025/02/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,387,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1020736191	MARTINEZ ROBERTO							X											231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
2	CC	1072642624	MORERA LINA							X											230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
3	CC	1006166501	MURILLO BRENDA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$344,300
4	CC	4377428	VILLEGAS GUILLERMO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$344,300
Total	Afiliados(4)																						$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,447,000	$218,000			$5,694,000	$30,000		$0	$0		$1,387,200

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901526894	4	CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MZ H 14A BRR HUASIPANGA	MOCOA-PUTUMAYO	4604877	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-01	2025-02	1273601605	94817378321	E	2025/02/24	2025/02/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,387,200	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$911,200	$0	$0	$911,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$30,000	$0	$0	$30,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$30,000	$0	$0	$30,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$218,000	$0	$0	$218,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	4	$218,000	$0	$0	$218,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$228,000	$0	$0	$228,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$0	$0	$114,000
TOTAL				4	$1,387,200	$0	$0	$1,387,200

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

TOTAL APORTES A SALUD

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		
	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZAC
1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	
3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 171.000	$ 0	
1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	
1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		
	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	
6		$ 0	$ 0		$ 0	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA	NOMBRE

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL																
					PENSIÓN											SALUD					
					ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	T A
					230301-PORVENIR	16	$ 759.200	$ 121.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.500	EPS012-COMFENALCO VALLE	16	$ 759.200	$ 30.400	$ 0	
	01-14				230301-PORVENIR	14	$ 664.300	$ 106.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 106.300	EPS012-COMFENALCO VALLE	14	$ 664.300	$ 26.600	$ 0	
	01-14				230301-PORVENIR	14	$ 664.300	$ 106.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 106.300	EPS002-SALUD TOTAL	14	$ 664.300	$ 26.600	$ 0	
					230301-PORVENIR	16	$ 759.200	$ 121.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.500	EPS002-SALUD	16	$ 759.200	$ 30.400	$ 0	

	01-14				230201-PROTECCION	14	$ 664.300	$ 106.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 106.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	14	$ 664.300	$ 26.600	$ 0
	01-14				25-14 COLPENSIONES	14	$ 664.300	$ 106.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 106.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	14	$ 664.300	$ 26.600	$ 0
					25-14 COLPENSIONES	16	$ 759.200	$ 121.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	16	$ 759.200	$ 30.400	$ 0

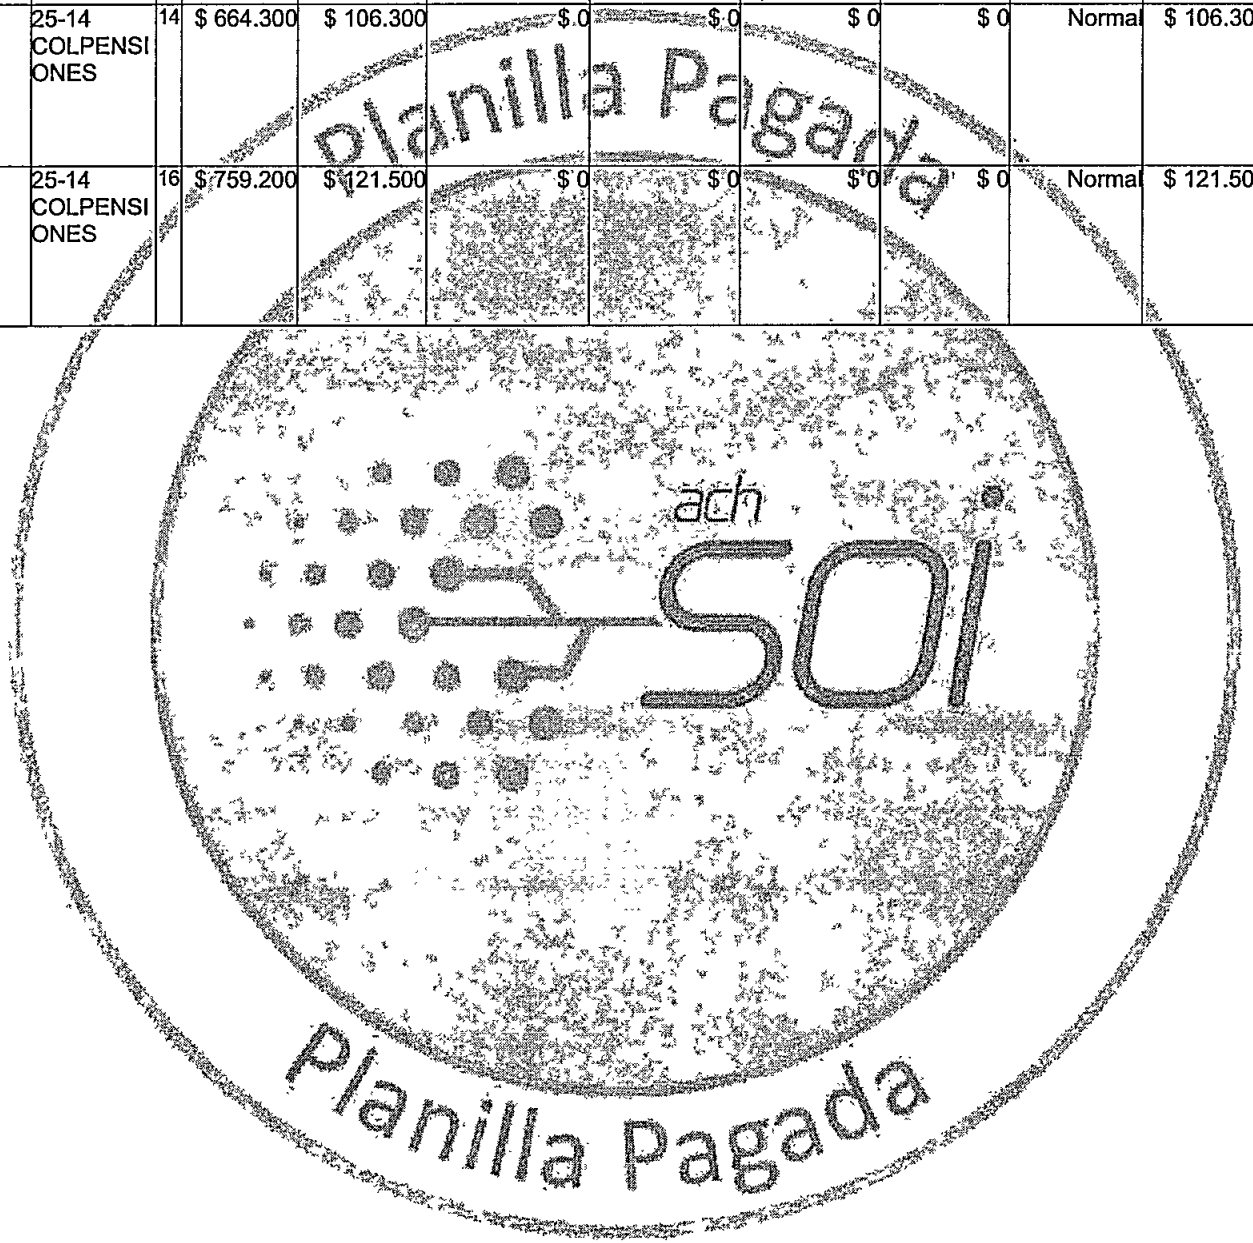

TOTAL APORTES A SALUD

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		
	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZAC
1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	
1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	
3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 171.000	$ 0	
1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		
	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	
6		$ 0	$ 0		$ 0	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA	
NOMBRE	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL																
					PENSIÓN											SALUD					
					ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	T A
					230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS012-COMFENALCO VALLE	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	
					230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	
					230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	

SISO

CONSTRUPACICOL ZOMAC
NIT 901.526.894

"MEJORAMIENTOA ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOSDE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURAY EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI"

CONTRATO DE OBRA No.: IND-23-5027

INFORME MENSUAL No. 6
AVANCE DE OBRA SST
01 DE ENERO A 31 DE ENERO

CONSTRUPACICOL ZOMAC

CONSTRUPACICOL ZOMAC
NIT 901.526.894

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION..... 3
2. OBJETIVOS..... 4
2.1. Objetivos General.....4
2.2. Objetivos Especifico.....4
3. INDUCCIÓN.....5
4. CHARLAS DE SST.....6
4.1. Higiene y seguridad industrial.....6
4.2.Dotación y EPP.....7
5. REGISTRO INSPECCIONES DE A.T – I.T.....8

1, INTRODUCCIÓN

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es una disciplina que se encarga de la prevención de accidentes y enfermedades laborales, así como de la promoción y protección de la salud de los trabajadores mediante un conjunto de actividades, medidas, para preservar la salud y la integridad física y mental de los trabajadores, en todos los aspectos relacionados con su trabajo, mejorando el bienestar laboral y la productividad en las empresas, promoviendo una cultura en seguridad y calidad basado en la mejora continua.

La Seguridad y Salud en el Trabajo es una responsabilidad compartida por los empleadores y los trabajadores. Los empleadores tienen la obligación de garantizar la Seguridad y Salud de sus Trabajadores, adoptando las medidas necesarias para prevenir los accidentes y enfermedades laborales. Los trabajadores, por su parte, tienen la obligación de cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo y de utilizar los equipos de protección personal de manera adecuada.

La Construpacicol Zomac través de su SG-SST, busca disponer de herramientas que asegure un ambiente laboral con factores de riesgo controlados y con ello la disminución de los incidentes y accidentes de trabajo y las enfermedades laborales.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Cumplir con lo propuesto en el plan de trabajo en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo; que garanticen el bienestar de los colaboradores con el fin de contrarrestar los impactos, riesgos y peligros inherentes a las actividades del Contrato de Obra IND-23-5027 **"MEJORAMIENTOA ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOSDE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURAY EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI"**

2.2. Objetivos Específicos

- Ejecutar las actividades planteadas en el plan de trabajo anual del SG-SST, cumpliendo con la normatividad legal vigente.
- Realizar charlas de seguridad de prevención de los peligros y riesgos que se encuentran en las actividades que se desarrollan en obra.
- Entregar elementos de protección personal a los colaboradores y llevar el control de estos.
- Fomentar cultura de autocuidado y mutuo-cuidado en el desarrollo de las actividades promoviendo la prevención de incidentes o accidentes, de trabajo, así como la prevención de los actos o condiciones inseguras

3. INDUCCION DE SST

La vinculación del personal al proyecto, inicio con la inducción y reinducción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se expuso las políticas, reglamentos, obligaciones del empleador y del trabajador, los riesgos a los que pueden estar expuestos y todas las medidas preventivas para evitar incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral. En este espacio se deja claro que la Construpacicol Zomac tiene un gran compromiso con la protección integral del recurso humano.

Los temas tratados en la inducción se mencionan a continuación:

- SGSST: Política SST: (Contextualización de la estructura del SGSST, divulgación y sensibilización de la política y los objetivos de SST.)
- Medicina Preventiva: (Programa EMO, Perfil Sociodemográfico, Morbilidad Sentida, entre otros instrumentos)
- Política de Prevención Antitabaco, Alcohol y Sustancias Psicoactivas: (Divulgación y sensibilización de la política PAASPA)
- Uso clasificación y mantenimiento de elementos de protección personal: (Sensibilización uso adecuado, clasificación, mantenimiento-reposición y medidas disciplinarias de EPP)
- Política Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias: (Divulgación y sensibilización de la política PPRAE)
- Programa de orden y aseo: (Sensibilización y aplicación del programa en los ambientes de trabajo)
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial: (Divulgación y contextualización del reglamento y cumplimiento de este)
- Reporte incidentes-accidentes de trabajo y enfermedad laboral: (Socialización conceptos-reporte de incidentes/accidentes de trabajo y enfermedad laboral)

4. CHARLAS DE SEGURIDAD Y CAPACITACIONES

Las Charlas de Seguridad se realizan al iniciar y en el trascurso de la jornada laboral, donde la finalidad es comunicar y sensibilizar a los colaboradores sobre las normas de seguridad que se encuentran relacionadas en las diferentes políticas y reglamentos de la empresa y de las diferentes acciones que deben tener en cuenta frente al cuidado de su salud. Los temas relacionados en las charlas de seguridad dan a conocer, procedimientos de trabajo seguro, como también situaciones de emergencias que se pueden presentar en las áreas de trabajo y así el personal conozca del paso a paso que se debe seguir ante la ocurrencia de algún evento. A continuación, se relacionan algunos temas de las diferentes charlas de seguridad realizadas diariamente, se adjunta los respectivos soportes.

La importancia de realizar las charlas de seguridad y capacitaciones permite afianzar el compromiso con el Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte de los trabajadores, así como de la empresa; de igual manera el objetivo de las capacitaciones es brindar nuevos conocimientos, los cuales deben ser aplicados por trabajadores en el día a día.

Registro fotográfico

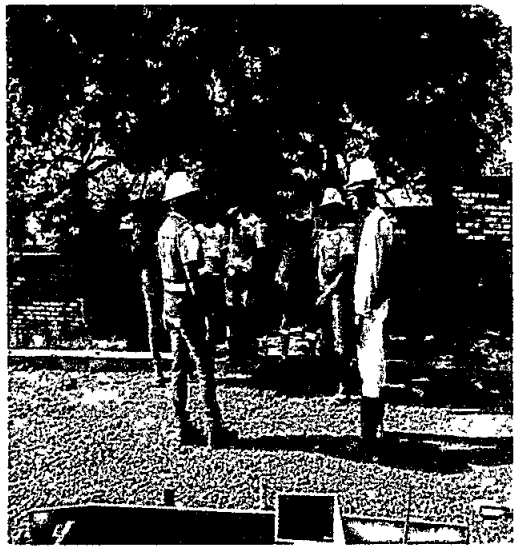

4.1 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Los factores de riesgo son aquellos elementos, situaciones o condiciones que pueden provocar un accidente o una enfermedad laboral. Pueden ser físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o psicosociales.

Para prevenir los accidentes y enfermedades laborales, es necesario identificar los factores de riesgo presentes en el lugar de trabajo y adoptar medidas de control adecuadas. Estas medidas pueden ser:

- Medidas de prevención: dirigidas a eliminar o reducir los factores de riesgo.
- Medidas de protección: dirigidas a proteger a los trabajadores de los factores de riesgo que no se pueden eliminar.

Y para ello se realizan diferentes actividades en busca del bienestar de los trabajadores mientras se encuentren vinculados a la empresa Construpacicol Zomac.

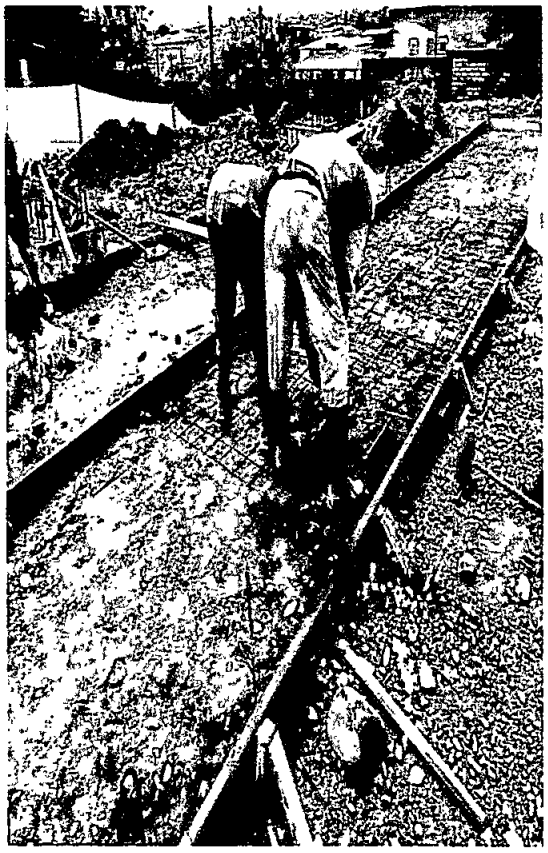

4.2 DOTACION Y ELEMENTO DE PROTECION PERSONA

Durante la ejecución del proyecto se realiza la entrega de elementos de protección personal, de igual manera se evalúa la vida útil de los EPP, puesto que de acuerdo con ello se remplaza por deterioro o daño.

CONSTRUPACICOL ZOMAC
NIT 901.526.894

5.1 REGISTRO DE INSPECCIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y INCIDENTE DE TRABAJO

Se reportan e investigan los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales		CUMPLE			OBSERVACION / EVIDENCIA											
		SI	NO	N/A												
		X														
NOMBRE INDICADOR	DESCRIPCIÓN	MES														
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Frecuencia de accidentalidad	No. de accidentes de trabajo presentados en el periodo / No. De trabajadores en el periodo	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0%			
Severidad de accidentalidad	No. de días de incapacidad por AT en el mes + No. De días cargados / Número de trabajadores en el mes	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0%			
Prevalencia de la Enfermedad Laboral	No. de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral presentados en el periodo / No. De trabajadores en el periodo	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0%			
Ausentismo por causa medica	No. de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el periodo / No. De días programados en el periodo	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0%			

PARA CONSTANCIA

31/01/2025

ALVARO TENORIO RINCON

SISO

CONSTRUPACICOL ZOMAC
NIT 901.526.894

"MEJORAMIENTOA ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOSDE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURAY EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI"

CONTRATO DE OBRA No.: IND-23-5027

INFORME MENSUAL No. 7
AVANCE DE OBRA SST
01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO

CONSTRUPACICOL ZOMAC

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 3
2. OBJETIVOS 4
2.1. OBJETIVOS GENERAL 4
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICO... 4
3. INDUCCIÓN 5
4. CHARLAS DE SST 6
4.1. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 6
4.2. DOTACIÓN Y EPP PARA TRABAJO EN TSA 7
5. REGISTRO INSPECCIONES DE A.T – I.T 8
6. CERTIFICADOS DE TSA 9

1, INTRODUCCIÓN

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es una disciplina que se encarga de la prevención de accidentes y enfermedades laborales, así como de la promoción y protección de la salud de los trabajadores mediante un conjunto de actividades, medidas, para preservar la salud y la integridad física y mental de los trabajadores, en todos los aspectos relacionados con su trabajo, mejorando el bienestar laboral y la productividad en las empresas, promoviendo una cultura en seguridad y calidad basado en la mejora continua.

La Seguridad y Salud en el Trabajo es una responsabilidad compartida por los empleadores y los trabajadores. Los empleadores tienen la obligación de garantizar la Seguridad y Salud de sus Trabajadores, adoptando las medidas necesarias para prevenir los accidentes y enfermedades laborales. Los trabajadores, por su parte, tienen la obligación de cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo y de utilizar los equipos de protección personal de manera adecuada.

La Construpacicol Zomac través de su SG-SST, busca disponer de herramientas que asegure un ambiente laboral con factores de riesgo controlados y con ello la disminución de los incidentes y accidentes de trabajo y las enfermedades laborales.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Cumplir con lo propuesto en el plan de trabajo en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo; que garanticen el bienestar de los colaboradores con el fin de contrarrestar los impactos, riesgos y peligros inherentes a las actividades del Contrato de Obra IND-23-5027 **"MEJORAMIENTOA ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOSDE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURAY EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI"**

2.2. Objetivos Específicos

- Ejecutar las actividades planteadas en el plan de trabajo anual del SG-SST, cumpliendo con la normatividad legal vigente.
- Realizar charlas de seguridad de prevención de los peligros y riesgos que se encuentran en las actividades que se desarrollan en obra.
- Entregar elementos de protección personal a los colaboradores y llevar el control de estos.
- Fomentar cultura de autocuidado y mutuo-cuidado en el desarrollo de las actividades promoviendo la prevención de incidentes o accidentes, de trabajo, así como la prevención de los actos o condiciones inseguras

3. INDUCCION DE SST

La vinculación del personal al proyecto, inicio con la inducción y reinducción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se expuso las políticas, reglamentos, obligaciones del empleador y del trabajador, los riesgos a los que pueden estar expuestos y todas las medidas preventivas para evitar incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral. En este espacio se deja claro que la Construpacicol Zomac tiene un gran compromiso con la protección integral del recurso humano.

Los temas tratados en la inducción se mencionan a continuación:

- SGSST: Política SST: (Contextualización de la estructura del SGSST, divulgación y sensibilización de la política y los objetivos de SST.)
- Medicina Preventiva: (Programa EMO, Perfil Sociodemográfico, Morbilidad Sentida, entre otros instrumentos)
- Política de Prevención Antitabaco, Alcohol y Sustancias Psicoactivas: (Divulgación y sensibilización de la política PAASPA)
- Uso clasificación y mantenimiento de elementos de protección personal: (Sensibilización uso adecuado, clasificación, mantenimiento-reposición y medidas disciplinarias de EPP)
- Política Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias: (Divulgación y sensibilización de la política PPRAE)
- Programa de orden y aseo: (Sensibilización y aplicación del programa en los ambientes de trabajo)
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial: (Divulgación y contextualización del reglamento y cumplimiento de este)
- Reporte incidentes-accidentes de trabajo y enfermedad laboral: (Socialización conceptos-reporte de incidentes/accidentes de trabajo y enfermedad laboral)

4. CHARLAS DE SEGURIDAD Y CAPACITACIONES

Las Charlas de Seguridad se realizan al iniciar y en el trascurso de la jornada laboral, donde la finalidad es comunicar y sensibilizar a los colaboradores sobre las normas de seguridad que se encuentran relacionadas en las diferentes políticas y reglamentos de la empresa y de las diferentes acciones que deben tener en cuenta frente al cuidado de su salud. Los temas relacionados en las charlas de seguridad dan a conocer, procedimientos de trabajo seguro, como también situaciones de emergencias que se pueden presentar en las áreas de trabajo y así el personal conozca del paso a paso que se debe seguir ante la ocurrencia de algún evento. A continuación, se relacionan algunos temas de las diferentes charlas de seguridad realizadas diariamente, se adjunta los respectivos soportes.

La importancia de realizar las charlas de seguridad y capacitaciones permite afianzar el compromiso con el Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte de los trabajadores, así como de la empresa; de igual manera el objetivo de las capacitaciones es brindar nuevos conocimientos, los cuales deben ser aplicados por trabajadores en el día a día.

Registro fotográfico

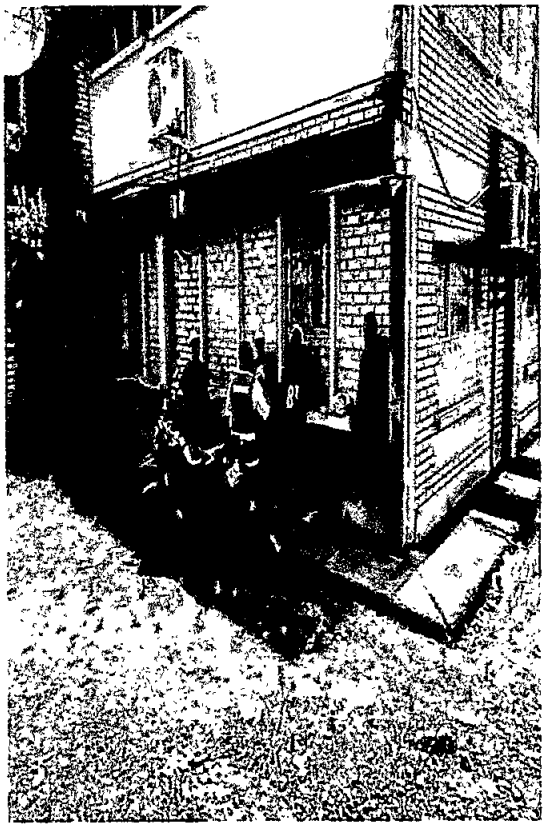

4.1 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Los factores de riesgo son aquellos elementos, situaciones o condiciones que pueden provocar un accidente o una enfermedad laboral. Pueden ser físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o psicosociales.

Para prevenir los accidentes y enfermedades laborales, es necesario identificar los factores de riesgo presentes en el lugar de trabajo y adoptar medidas de control adecuadas. Estas medidas pueden ser:

- Medidas de prevención: dirigidas a eliminar o reducir los factores de riesgo.
- Medidas de protección: dirigidas a proteger a los trabajadores de los factores de riesgo que no se pueden eliminar.

Y para ello se realizan diferentes actividades en busca del bienestar de los trabajadores mientras se encuentren vinculados a la empresa Construpacicol Zomac.

4.2 DOTACION Y ELEMENTO DE PROTECION PERSONAL SEGÚN LA RESOLUCIÓN 4272 DEL 2021

Durante la ejecución del proyecto se realiza la entrega de elementos de protección personal, de igual manera se evalúa la vida útil de los EPP, puesto que de acuerdo con ello se remplaza por deterioro o daño.

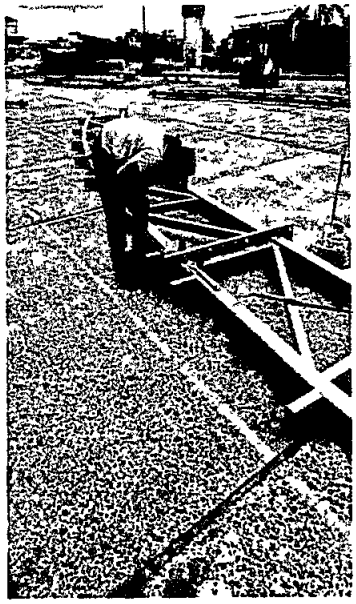

CONSTRUPACICOL ZOMAC
NIT 901.526.894

5.1 REGISTRO DE INSPECCIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y INCIDENTE DE TRABAJO

Se reportan e investigan los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales		CUMPLE			OBSERVACION / EVIDENCIA 2025											
		SI	NO	N/A												
		X														
NOMBRE INDICADOR	DESCRIPCIÓN	MES														
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic.			
Frecuencia de accidentalidad	No. de accidentes de trabajo presentados en el periodo / No. De trabajadores en el periodo	0	0	0									0%			
Severidad de accidentalidad	No. de días de incapacidad por AT en el mes + No. De días cargados / Número de trabajadores en el mes	0	0	0									0%			
Prevalencia de la Enfermedad Laboral	No. de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral presentados en el periodo / No. De trabajadores en el periodo	0	0	0									0%			
Ausentismo por causa medica	No. de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el periodo / No. De días programados en el periodo	0	0	0									0%			

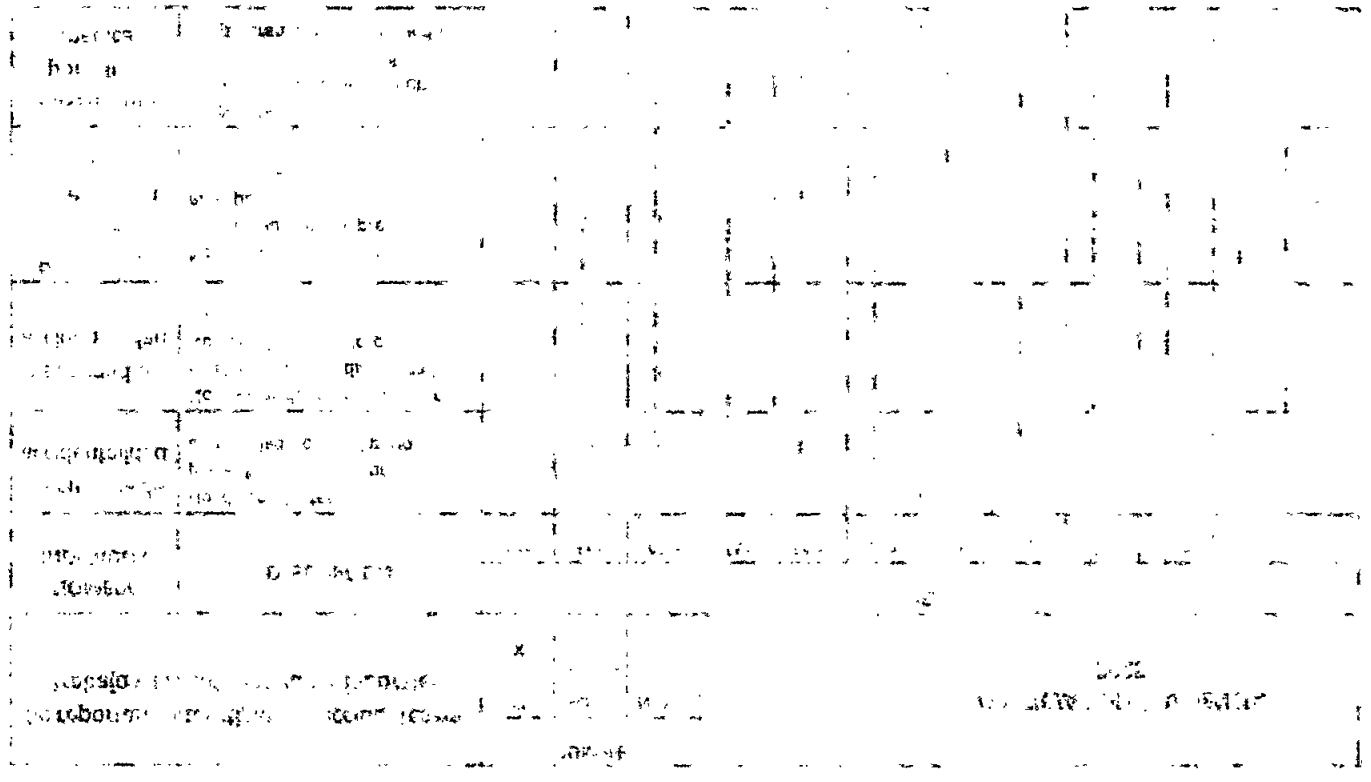

CONSTRUPACICOL ZOMAC
NIT 901.526.894

CERTIFICADOS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURA (TSA)

SEGURIDAD PARA ALTURAS C& O SAS

NIT 901534000 - 0
LICENCIA SST N° 3598 DEL 31 diciembre de 2021
APROBACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO
08SE2023220000000001679
CERTIFICACIÓN NTC 6072:2014. N° 30.455-1
CELAC 18-CPR-002
CARRERA 10 14 58 BRR LOS LIBERTADORES
www.cursosdealturacali.com.co
CEL: 317 744 98 69
JAMUNDÍ, VALLE

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

En cumplimiento de la Resolución 4272 del Ministerio de Trabajo

Otorgado a:

ANGELO MARIN TORO

Identificado con documento de identidad número:

6253583

Afiliado a la ARL: SURA
Razón social: VULCANUS IM SAS
NIT: 901225245 - 2
Representante Legal: ANDERSON MARIN CC 94074305

QUIEN CURSÓ Y APROBÓ SATISFACTORIAMENTE EL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

REALIZADO DESDE EL 14 DE Agosto HASTA EL 14 DE Agosto
EN JAMUNDÍ, VALLE
CON UNA INTENSIDAD DE 8 HORAS
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE EL (14) DE (08) DEL (2024)
EN JAMUNDÍ, VALLE

CELAC Trabajo en Alturas NTC 6072 No 30.455-1

Beltrán Oscar
REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO MONTENEGRO
ENTRENADOR T.A
LICENCIA S.O. Resolución 2252 -2017 de 26/12/2017

CONSTRUPACICOL ZOMAC
NIT 901.526.894

SEGURIDAD PARA ALTURAS C& O SAS

NIT 901534000 - 0
LICENCIA SST N° 3598 DEL 31 diciembre de 2021
APROBACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO
08SE2023220000000001679
CERTIFICACIÓN NTC 6072:2014. N° 30.455-1
CELAC 18-CPR-002
CARRERA 10 14 56 BRR LOS LIBERTADORES
www.cursosdealturacali.com.co
CEL.: 317 744 98 69
JAMUNDÍ, VALLE

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

En cumplimiento de la Resolución 4272 del Ministerio de Trabajo

Otorgado a:

WILMAR ALBERTO MARIN TORO

Identificado con documento de identidad número:

16763481

Afiliado a la ARL: SURA
Razón social: VULCANUS IM SAS
NIT: 901225245 - 2
Representante Legal: ANDERSON MARIN CC 94074305

QUIEN CURSÓ Y APROBÓ SATISFACTORIAMENTE EL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

REALIZADO DESDE EL 14 DE Agosto HASTA EL 14 DE Agosto
EN JAMUNDÍ, VALLE
CON UNA INTENSIDAD DE 8 HORAS
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE EL (14) DE (08) DEL (2024)
EN JAMUNDÍ, VALLE

CELAC Trabajo en Alturas NTC 6072 No 30.455-1

Beltrán Oscar
REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO MONTENEGRO
ENTRENADOR T.A
LICENCIA S.O. Resolución 2252 -2017 de 26/12/2017

CONSTRUPACICOL ZOMAC
NIT 901.526.894

SEGURIDAD PARA ALTURAS C& O SAS

NIT 901534000 - 0
LICENCIA SST N° 3598 DEL 31 diciembre de 2021
APROBACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO
08SE2023220000000001679
CERTIFICACIÓN NTC 6072:2014. N° 30.455-1
CELAC 18-CPR-002
CARRERA 10 14 56 BRR LOS LIBERTADORES
www.cursosdealturacali.com.co
CEL.: 317 744 98 69
JAMUNDÍ, VALLE

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

En cumplimiento de la Resolución 4272 del Ministerio de Trabajo

Otorgado a:

HENRY JAVIER RIVERA ALVAREZ

Identificado con documento de identidad número:

78114730

Afiliado a la ARL: SURA
Razón social: VULCANUS IM SAS
NIT: 901225245 - 2
Representante Legal: ANDERSON MARIN CC 94074305

QUIEN CURSÓ Y APROBÓ SATISFACTORIAMENTE EL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

REALIZADO DESDE EL 14 DE Agosto HASTA EL 14 DE Agosto
EN JAMUNDÍ, VALLE
CON UNA INTENSIDAD DE 8 HORAS
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE EL (14) DE (08) DEL (2024)
EN JAMUNDÍ, VALLE

CELAC Trabajo en Alturas NTC 6072 No 30.455-1

Beltrán Oscar
REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO MONTENEGRO
ENTRENADOR T.A.
LICENCIA S.O. Resolución 2252 -2017 de 26/12/2017

CONSTRUPACICOL ZOMAC
NIT 901.526.894

SEGURIDAD PARA ALTURAS C& O SAS

NIT 901534000 - 0
LICENCIA SST N° 3598 DEL 31 diciembre de 2021
APROBACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO
08SE2023220000000001679
CERTIFICACIÓN NTC 6072:2014. N° 30.455-1
CELAC 18-CPR-002
CARRERA 10 14 56 BRR LOS LIBERTADORES
www.cursosdealturacali.com.co
CEL.: 317 744 98 69
JAMUNDÍ, VALLE

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

En cumplimiento de la Resolución 4272 del Ministerio de Trabajo

Otorgado a:

JORGE ALBERTO LUGO ZAPATA

Identificado con documento de identidad número:

1113514195

Afiliado a la ARL: SURA
Razón social: VULCANUS IM SAS
NIT: 901225245 - 2
Representante Legal: ANDERSON MARIN CC 94074305

QUIEN CURSÓ Y APROBÓ SATISFACTORIAMENTE EL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

REALIZADO DESDE EL 14 DE Agosto HASTA EL 14 DE Agosto
EN JAMUNDÍ, VALLE
CON UNA INTENSIDAD DE 8 HORAS
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE EL (14) DE (08) DEL (2024)
EN JAMUNDÍ, VALLE

CELAC Trabajo en Alturas NTC 6072 No 30 455-1

Beltrán Oscar
REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO MONTENEGRO
ENTRENADOR T.A
LICENCIA S.O. Resolución 2252 -2017 de 26/12/2017

CONSTRUPACICOL ZOMAC
NIT 901.526.894

SEGURIDAD PARA ALTURAS C& O SAS

NIT 901534000 - 0
LICENCIA SST N° 3598 DEL 31 diciembre de 2021
APROBACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO
08SE2023220000000001679
CERTIFICACIÓN NTC 6072:2014. N° 30.455-1
CELAC 18-CPR-002
CARRERA 10 14 56 BRR LOS LIBERTADORES
www.cursosdealturacali.com.co
CEL.: 317 744 98 69
JAMUNDÍ, VALLE

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

En cumplimiento de la Resolución 4272 del Ministerio de Trabajo

Otorgado a:

ANDERSON MARIN TORO

Identificado con documento de identidad número:

94074305

Afiliado a la ARL: SURA
Razón social: VULCANUS IM SAS
NIT: 901225245 - 2
Representante Legal: ANDERSON MARIN CC 94074305

QUIEN CURSÓ Y APROBÓ SATISFACTORIAMENTE EL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

REALIZADO DESDE EL 14 DE Agosto HASTA EL 14 DE Agosto
EN JAMUNDÍ, VALLE
CON UNA INTENSIDAD DE 8 HORAS
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE EL (14) DE (08) DEL (2024)
EN JAMUNDÍ, VALLE

CELAC Trabajo en Alturas NTC 6072 No. 30.455-1

Beltrán Oscar
REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO MONTENEGRO
ENTRENADOR T.A
LICENCIA S.O. Resolución 2252 -2017 de 26/12/2017

ENSAYOS

ENCLOSE

INSPECCIÓN POR ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS A ESTRUCTURA METALICA DEL PROYECTO COLISEO SIMON BOLIVAR BUENAVENTURA

ELABORADO POR: ING. RICHARD GONZALEZ

EMPRESA EJECUTORA:

INSPEST S.A.S

INTEGRIDAD ESTRUCTURAL

CLIENTE: VULCANUS IM SAS

SOLICITADO POR: VULCANUS IM SAS

FECHA: MAYO 21 2024

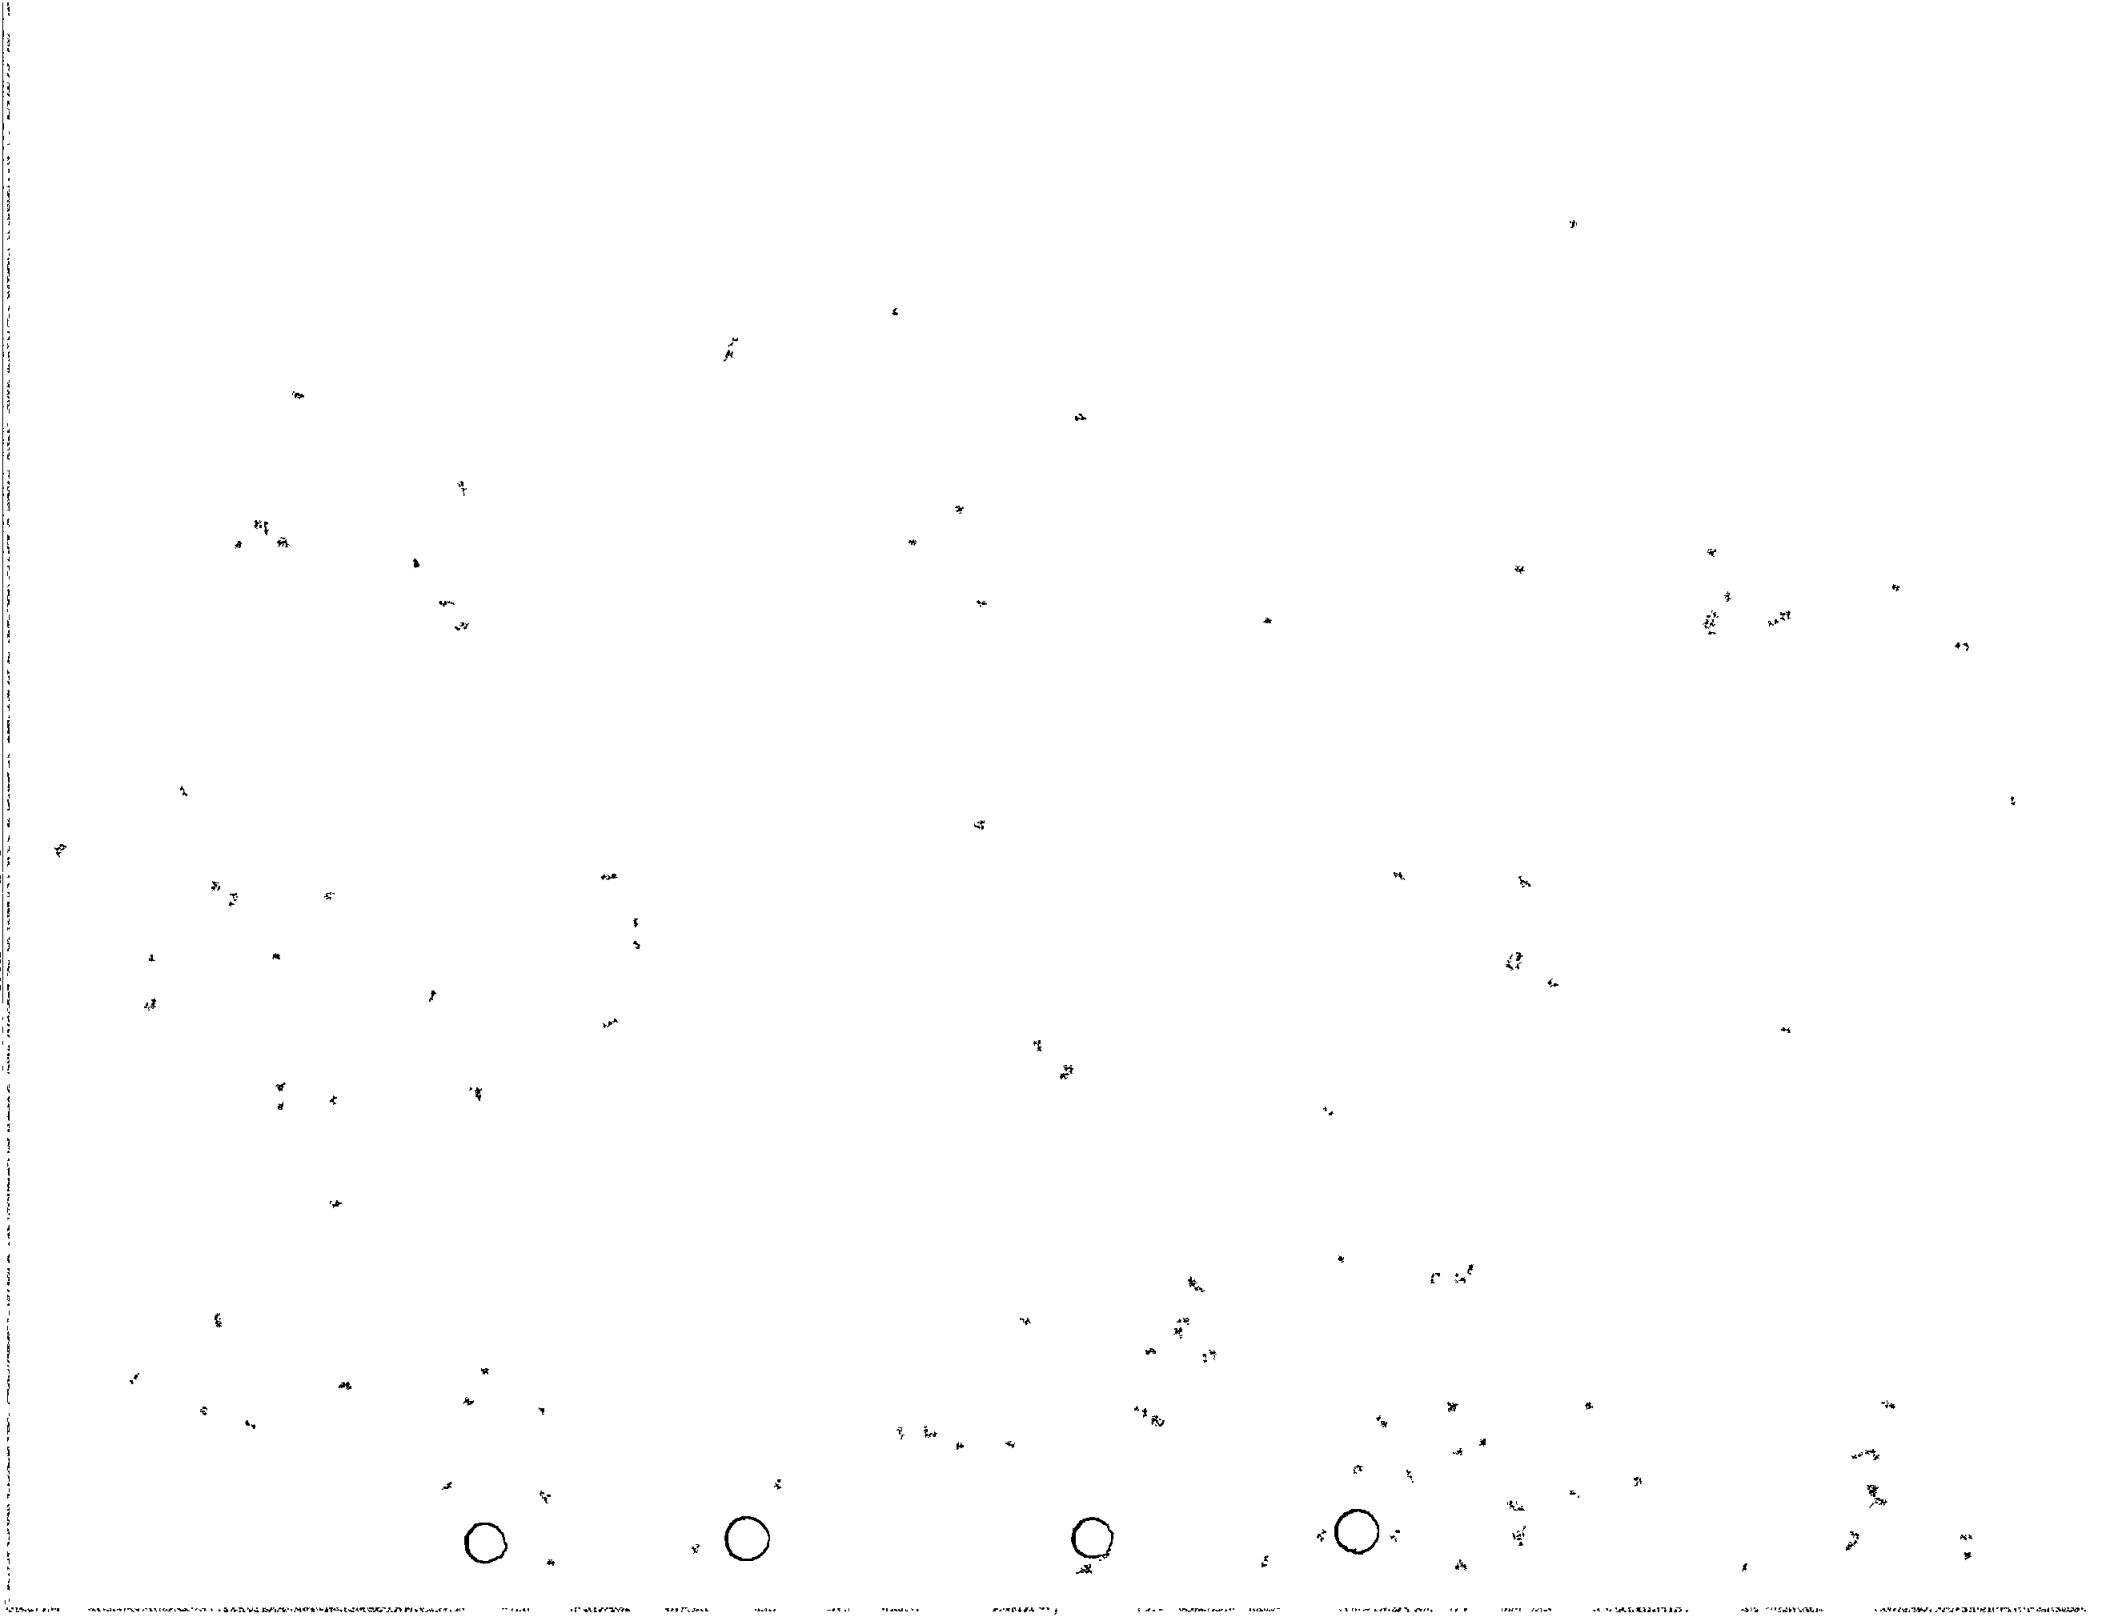

1. ALCANCE.

Este documento define las actividades técnicas que se están utilizando para el control de calidad de las juntas soldadas de la estructura metálica del proyecto **COLISEO SIMON BOLIVAR BUENAVENTURA**. Para un aseguramiento parcial de las conexiones soldadas **INSPEST S.A.S** realizo ensayos no destructivos a las soldaduras como inspección visual, líquidos penetrantes de acuerdo al código de referencia.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

- AWS D1.1 2020. STRUCTURAL WELDING CODE
- REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 TITULO F
- PLANOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE
- PROCEDIMIENTO DE INSPECCION INSPEST

3. LIQUIDOS PENETRANTES

La inspección por líquidos penetrantes realizados a las soldaduras de la estructura metálica me permite detectar fisuras, poros, falta de fusión y otras imperfecciones que sean abiertas a la superficie que puedan comprometer la resistencia de la estructura. Se utilizó penetrante visible rojo, soluble en agua tipo SKL WP Y revelador SKD – S2 marca MAGNAFLUX.
Los criterios de aceptación y rechazo son basados en el código **AWS D1.1 2020 STRUCTURAL WELDING CODE.**

INSPEST S.A.S

1. ALCANCE.

Este documento define los criterios técnicos que se aplicarán para el control de calidad de las unidades fabricadas en la estructura metálica de proyecto **CONSEJO SIMÓN BOLIVAR BUENAVENTURA**. Para un seguimiento personal de las inspecciones, solicitar a **INSPEST S.A.S** previa reserva de anticipación a las solicitudes de inspección. Vease tipologías panel, tipos de unión y codigo de referencia.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

- AWS D1.1 2020 STRUCTURAL WELDING CODE
- PLANOS APROBADOS PARA CONSTRUCCION SIRMC – ESTRUCTURA
- PLANOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE
- PROCEDIMIENTO DE INSPECCION INSPEST

3. EQUIPOS HERRAMIENTAS

La inspección por líquidos penetrantes realizada a las soldaduras de la estructura metálica permite detectar discontinuidades superficiales, como fisuras y poros que se encuentren en la superficie que puede comprometer la resistencia de la unión. Este método es visible solo, soluble en agua y aplicable a WPS – Welder SKD – soldadores AWS D1.1 2020 STRUCTURAL WELDING CODE

Los ensayos de aceptación o rechazo se basan en el Código AWS D1.1 2020

3.1 PROCEDIMIENTO.

Para realizar la inspección por líquidos penetrantes previamente se realizó una limpieza manual mecánica con grata trenzada sobre las juntas soldadas, con el fin de tener una superficie libre de escoria, pintura, salpicaduras de soldadura entre otros. Posteriormente se limpió la zona de inspección con un trapo húmedo para retirar el exceso de partículas, y enseguida se aplicó el líquido penetrante sobre las juntas soldadas, se dejó actuar durante 10 minutos se removió el exceso de penetrante con un wypall humedecido con agua para poder aplicar el líquido revelador con el fin de inspeccionar el estado de las juntas soldadas.

Se realizo inspección visual y por líquidos penetrantes a las juntas a filete de 4 CERCHAS y 4 VIGAS DE AMARRE, fabricados a partir de tubería estructural, inspeccionando las uniones soldadas de parales y diagonales a cintas inferior y superiores, placas bridas. Durante la inspección no se encontraron indicaciones relevantes que comprometan la integridad estructural.

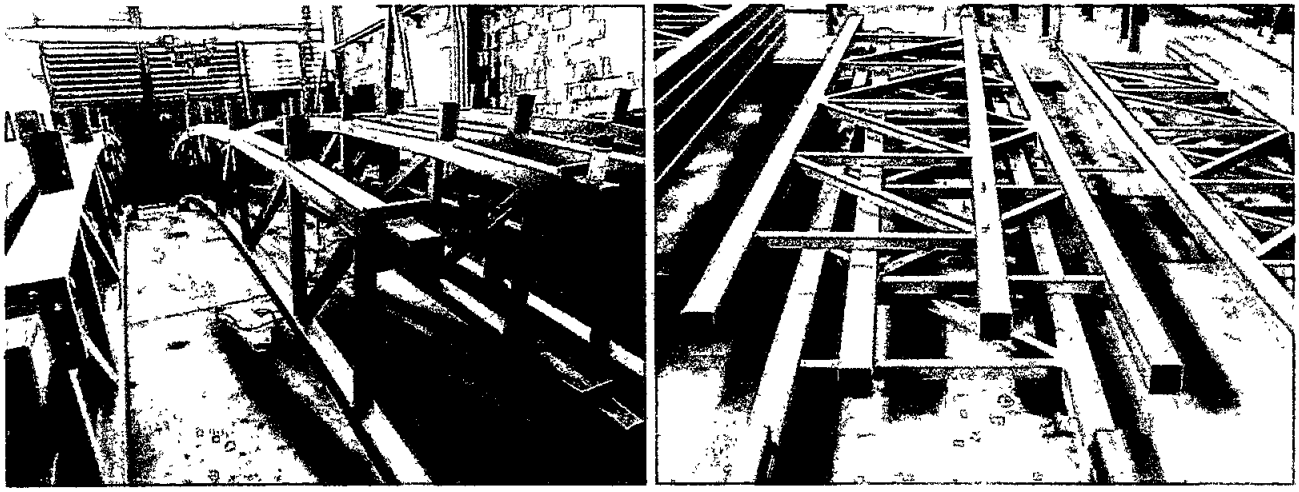

Fotografía 1-2. Fotografía general de elementos inspeccionados

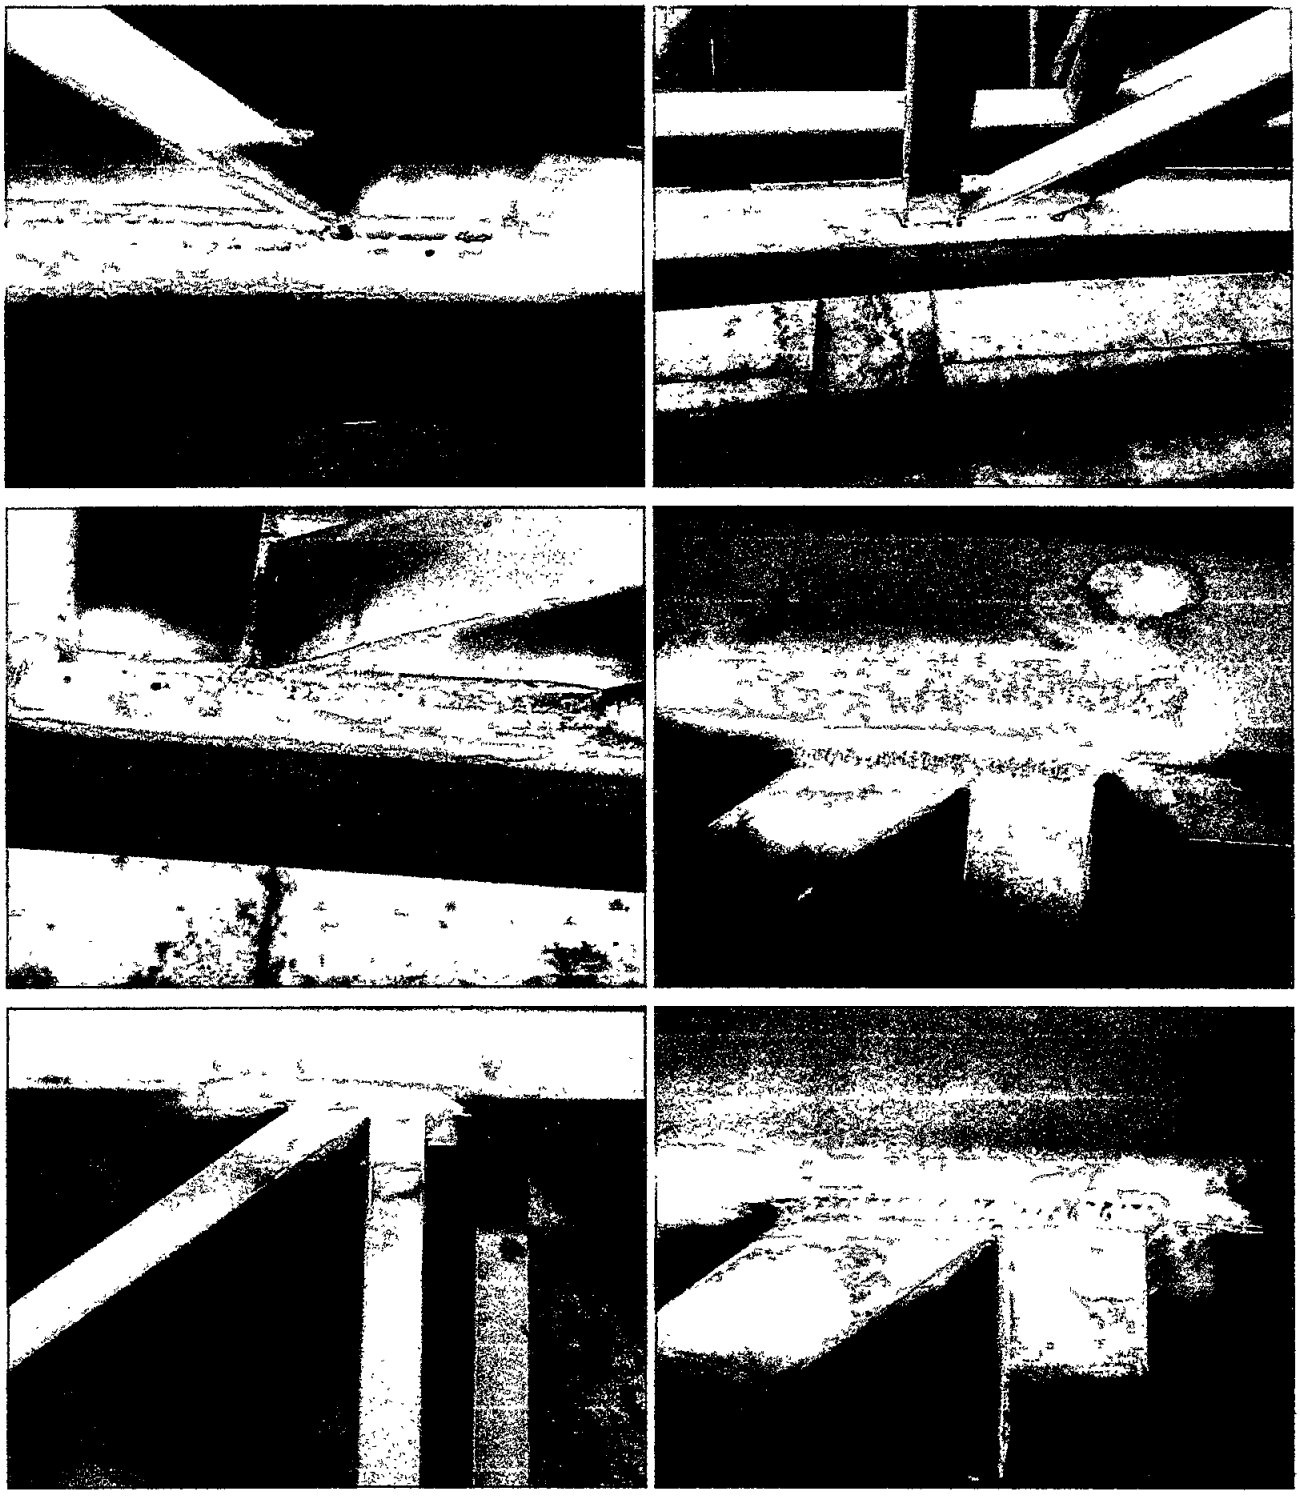

Fotografía 3-8. Inspección por líquidos penetrantes

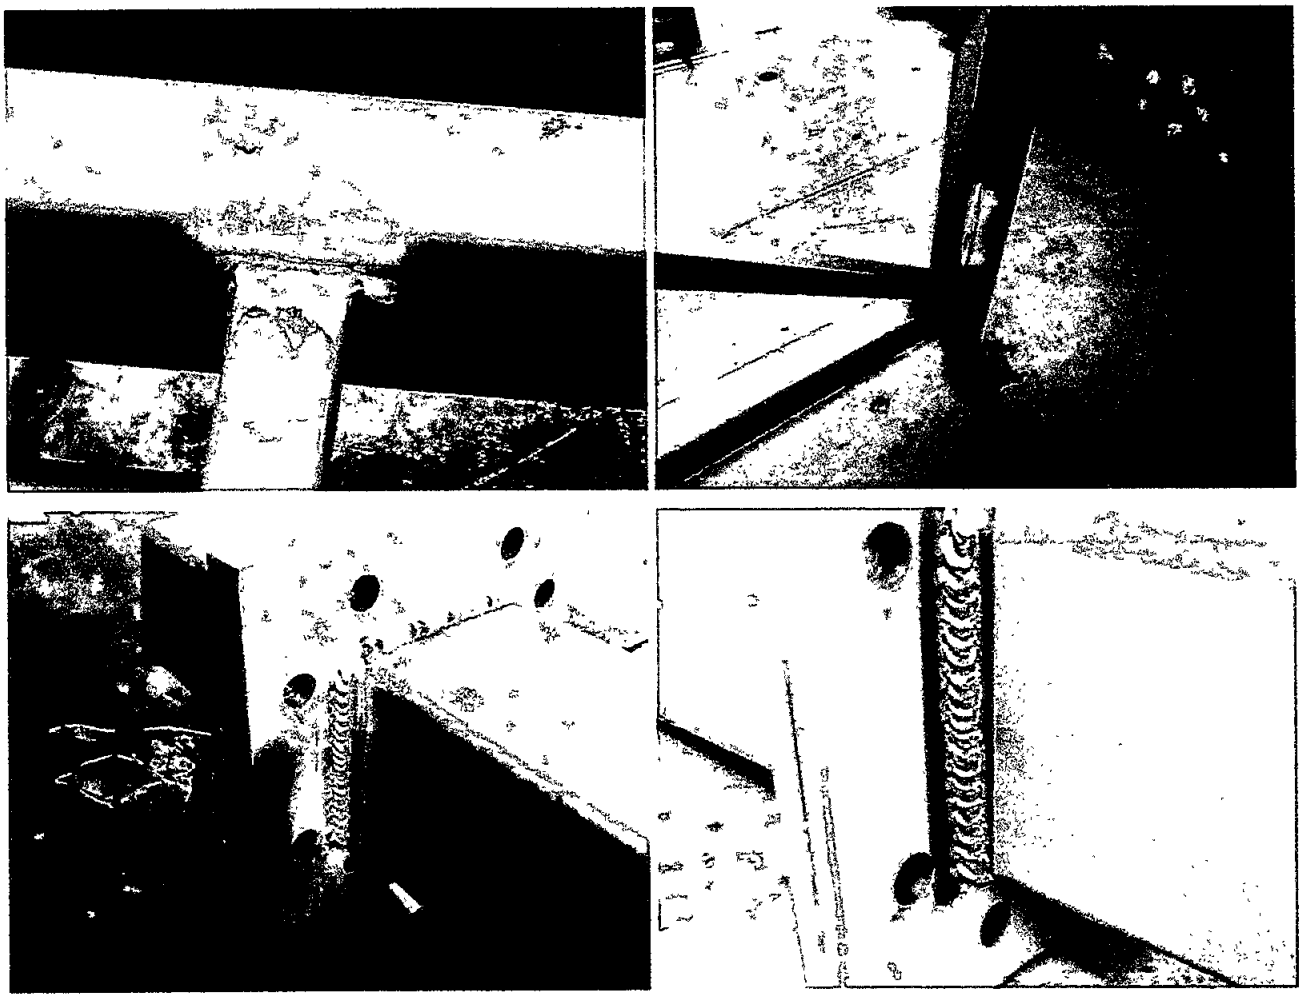

Fotografía 9-12. Inspección por líquidos penetrantes

5 CONCLUSIONES.

Durante la inspección por líquidos penetrantes realizado a los elementos de la estructura metalica no presentan indicaciones relevantes que comprometan su integridad estructural.

.

Cordial saludo,

Richard Gonzalez

RICHARD GONZALEZ RODRIGUEZ
INGENIERO DE MATERIALES
GERENTE TECNICO.
CERTIFICADO PT-II- CN2-030
CERTIFICADO UT-II- CN2-020
MATRICULA PROFESIONAL N° 76820-312332 VLL.

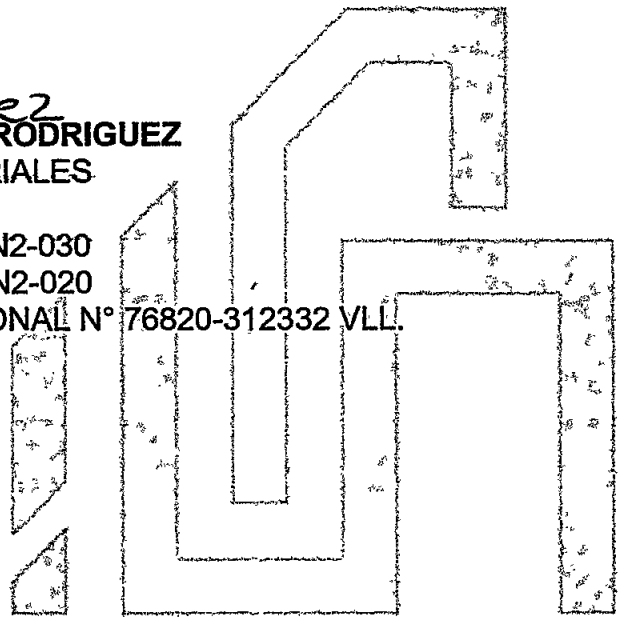

INSPECT S A.S

GC CIUDAD

Cc Autorizado

ANEXOS.

- ANEXO A – FT-PT-01

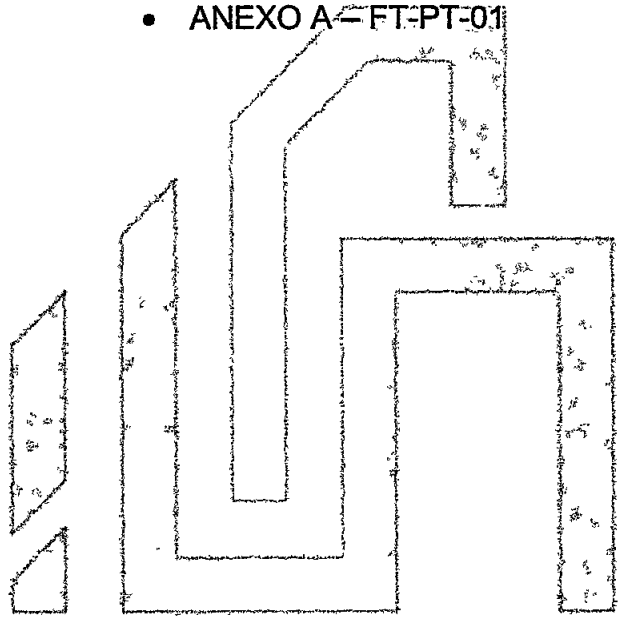

Santiago de Cali, MAYO 21 2024

U.S. PATENT

INSPEST S.A.S INTEGRIDAD ESTRUCTURAL	**FORMATO DE INSPECION VISUAL Y POR LIQUIDOS PENETRANTES**	FT-PT-01 VERSION 01 PAG. 1 DE 1

PROYECTO: COLISEO SIMON BOLIVAR BUENAVENTURA		**CODIGO PROYECTO:**	
INFORME N°: INF-24049-INSP	**CIUDAD:** CALI	**FECHA**	MAYO 21 2024
CLIENTE: VULCANUS IM SAS	**TIPO DE LIMPIEZA:** GRATA		
TIPO DE PENETRANTE Y REVELADOR: PENETRANTE SKL-WP / REVELADOR SKD-D2. MAGNAFLUX		**TIEMPO DE PENETRANTE Y REVELADO:** 10 min	
ELEMENTO INSPECCIONADO: CERCHAS Y VIGAS			
EQUIPOS Y ACCESORIOS: CAMARA FOTOGRAFICA			

INSPECTOR(S):	**N° PIEZAS INSPECIONADAS**	**END APLICADOS**	**LUGAR DE INSPECCIÓN:**
ING. RICHARD GONZALEZ		2	PLANTA

ESPECIFICACIÓN (NORMA O CODIGO): STRUCTURAL WELDIN CODE AWS D1.1 2020

ITEM	ELEMENTOS INSPECCIONADO	TIPO DE INDICACION/CLASE DE INDICACION	LONGITUD/DIAMETRO	PROFUNDIDAD	INTERPRETACION Y OBSERVACIONES	ESTADO
1	CERCHA 1 NODO 1	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
2	CERCHA 1 NODO 2	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
3	CERCHA 1 NODO 3	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
4	CERCHA 2 NODO 1	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
5	CERCHA 2 NODO 2	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
6	CERCHA 2 NODO 3	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
7	CERCHA 3 NODO 1	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
8	CERCHA 3 NODO 2	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
9	CERCHA 3 NODO 3	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
10	CERCHA 4 NODO 1	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
11	CERCHA 4 NODO 2	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
12	CERCHA 4 NODO 3	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
13	VIGA DE AMARRE 1 NODO 1	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
14	VIGA DE AMARRE 1 NODO 2	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
15	VIGA DE AMARRE 2 NODO 1	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
16	VIGA DE AMARRE 2 NODO 2	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
17	VIGA DE AMARRE 3 NODO 1	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
18	VIGA DE AMARRE 3 NODO 2	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME
19	VIGA DE AMARRE 1 NODO 1	--	--	--	INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES	CONFORME

CONVENCIONES:

LF : LADO FRENTE
L.SUP: LADO SUPERIOR
L.OP : LADO OPUESTO
CXN: CONEXIÓN
P: PERIMETRAL
INT: INTERIOR
EXT: EXTERIOR

PB: PLACA BASE
PS: PATIN SUPERIOR
PI: PATIN INFERIOR
LF: LADO FRENTE
LD: LADO DERECHO
LI.: LADO IZQUIERDO
J: JUNTA

JF:JUNTA A FILETE
JT:JUNTA A TOPE
JRT: JUNTA RANURA EN T

REP : REPARACION

	CONFORME
	RECHAZADO
	INDICACIÓN NO RELEVANTE

INSPECTOR:	**REVISO Y APROBO:**	**RECIBIO:**

BITÁCORA

RECEIVED

Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Ing. Residente Obra | Residente Interventoría

FECHA: Miercoles, 22/05/2024
Se continúa con la excavación manual para viga cimentación, colocación y ubicación de estructuras acero refuerzo para pedestales. También se realizó corte, figurado de acero refuerzo para pedestales en concreto. fundición solado para viga cimentación

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada- tarde lluviosa

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Ing Residente Obra | Residente Interventoría

FECHA Jueves, 23/05/2024
Se iniciaron las labores en campo a partir de las 10:00 AM debido a las fuertes precipitaciones de lluvias con evacuación de estas en excavaciones. Se realizó corte y figurado de acero refuerzo para pedestales en concreto, se realizó armado de estructura de acero para pedestales en campamento y colocación de la doble parrilla para fundición de pedestales entre los ejes 1-F y 2-F.

Norma

Scanned with

FECHA: Lunes, 20/05/2024
Se realizó evacuación de aguas lluvias de las excavaciones, se hizo fundición de solado cimentación para zapatas y viga cimentación, se realizó colocación y ubicación de estructura acero refuerco para pedestales en concreto. Se hizo excavación manual para fundición de viga cimentación.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada — Tarde lluviosa

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de Obra
Sigo
Almacenista
Maestro
1 Oficial
5 Ayudantes

Arq. Residente Obra

Residente Interventoria

FECHA: Martes, 21/05/2024
Se hizo evacuación de aguas lluvias de las excavaciones, se continua con armado de estructura para pedestal en concreto en sitio, se continua con excavación manual para fundición de viga cimentación, se realizó formaleteria en madera para fundición de zapata y encofrado. Se realizó fundición de zapata en concreto entre los ejes 2-A. y fundición de solado para zapata

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de Obra
Sigo
Almacenista

Norma

Scanned with

FECHA: Viernes, 17/05/2024

Se continua con la excavacion manual para fundicion de vigas de amentacion, se realizó corte, figurado y armado estructura de acero refuerzo para pedestal en concreto, ademas, de figurado de estribos.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
5 Ayudantes

Arq. Residente Obra | Residente Interventoría

FECHA Sábado, 18/05/2024

Se realizó excavación manual para fundición de Viga cimentación, se continúa con el corte, figura acero refuerzo (estribos para pedestales en concreto. Se realizó evacuación de agua en las excavaciones debido a las fuertes precipitaciones de lluvias la noche anterior.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista — Almacenista — 5 Ayudantes
Residente de Obra — Maestro
Siso — 1 Oficial

Arq. Residente Obra | Residente Interventoría

Norma

Scanned with

FECHA: Miercoles, 15/05/2024
Debido a las precipitaciones durante la noche, tocó nuevamente evacuar el agua almacenada en la excavación para fundición de las zapatas del eje 1-E. Se realizó fundición de solado para la zapata entre los ejes 1-F, ademas, se hizo la fundición de zapata entre los ejes 1-E. También se hizo corte, figurado y armado acero refuerzo para pedestal en concreto.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada - Tarde Soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
4 Ayudantes

Arq. Residente Obra | Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 16/05/2024
Se realizó corte, figurado de acero refuerzo para pedestales en concreto, también se realizó excavación manual para fundición d Viga cimentación. Se presentaron lluvias intensas a partir de 2:30p

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada - Tarde lluviosas

PERSONAL EN OBRA:
Sub-Contratista | Almacenista | 4 Ayudantes
Residente de obra | Maestro
SISO | 1 Oficial

Arq. Residente Obra | Residente Interventoría

Norma

Scanned with

ESTADO DEL TIEMPO: Día totalmente soleado

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista

Residente de obra

Sisa

Almacenista

Maestro

1 Oficial

3 Ayudantes

Ing. Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Martes, 14/05/2024

Se continúa con las actividades de corte, colocación y armado de doble parrilla en los ejes 1-B y 1-E respectivamente, se realizó fundición de zapata entre los ejes 1-D. Se presentaron precipitaciones durante todo el día impidiendo realizar con normalidad las actividades, razón por la cual, tocó evacuar el agua de la excavación varias veces.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde con lluvias parciales

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista

Residente de Obra

Sisa

Almacenista

Maestro

1 Oficial

4 Ayudantes

Ing. Residente Obra

Residente Interventoría

Norma

Scanned with

Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoria

FECHA: Martes, 09/04/2024
Se realizó evacuación de aguas lluvias en las (zapatas) excavación y posteriormente iniciar con la colocación del acero de zapata de la misma manera con el acero refuerzo de los pedestales entre los ejes D-1 y E-1 en sitio. Por otro lado se hizo la excavación a mano para las zapatas entre los ejes C-2, D-2 y E-2.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoria

FECHA: Sábado, 11/05/2024
Se reinician las labores en obra con desagüe en excavaciones para fundición de zapatas, se realizo armado y colocacción de doble parilla en zapatas de los ejes 1-D y 1-E respectivamente. También se realizo corte de acero refuerzo para doble parilla.

Norma

Scanned with

FECHA: Domingo, 07/04/2024

Se realiza corte y figurado del acero restante de la última estructura y por último armado de la parte pendiente de esta. Se realiza excavación a máquina del pilote restante entre los ejes F-1, el cual tiene una profundidad de 7mts a partir del nivel ±0,00 del proyecto, se procede a la colocación de la estructura acero refuerzo en la excavación para luego realizar fundición del pilote.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana, soleada, tarde con lluvias moderadas

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista	Operador de máquinas
Residente de obra	2 Ayudantes operador
Sisso	
Almacenista	
Maestro	
1 Oficial	
7 Ayudantes	

Arq. Residente Obra / Residente Interventoría

FECHA: Lunes, 08/04/2024

Se realizo relleno con material de sitio y se realizó corte y figurado de acero para pedestales en concreto. Hoy se trabajo media jornada debido a que el personal presento molestias por el desgaste de los trabajos en la semana.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista	
Residente de obra	
Sisso	

Norma

Scanned with

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA

Sub-contratista — Operador de máquina
Residente de obra — 2 Ayudantes operador
3:30
Almacenista
Maestro
1 Oficial
10 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Sábado, 06/04/2024

Se inicia excavación a máquina para pilote entre los ejes D-2, el cual tiene una profundidad de 7,10 mts desde el nivel ± 0,00 del proyecto, una vez llegado a este nivel se procede con la colocación de la estructura de acero reforzado en la excavación para luego realizar fundición del pilote en concreto. También se realizó excavación a mano para zapas en concreto entre los ejes A-2 y B-2 de acuerdo a los planos, por último se hizo corte, figurado y armado de acero refuerzo para estructura de acero del pilote fundado y el restante.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA

Sub-contratista — Maestro — Operador de máquina
Residente de Obra — 1 Oficial — 2 Ayudantes operador
3:30 — 10 Ayudantes
Almacenista

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

Norma

Scanned with

Se continúa con la excavación a máquina del pilote entre los ejes A-2 el cual bajó 7,20 mts con respecto al nivel ±0,00 del proyecto, por consiguiente, se procede a la colocación de la estructura acero refuerzo posteriormente fundición del pilote en concreto. Se realizo corte y figurado acero de refuerzo para pedestal en concreto, de igual manera para pilote en concreto de 7mts (estribos). Se inicia excavación a máquina para pilote entre los ejes B-2.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista
Residente de obra
Sisa
Almacenista
Maestro
1 Oficial
10 Ayudantes
Operador de máquina
2 Ayudantes operador

Ing. Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Viernes, 05/04/2024

Se continúa con la excavación a máquina para el pilote entre los ejes B-2, el cual baja a una profundidad de 7,20 mts desde el nivel ±0,00 del proyecto, posteriormente se procede a la colocación del acero de refuerzo del pilote y por último fundición del mismo. De igual manera se realizó la excavación para el pilote entre los ejes C-2 con una profundidad de 7,10 mts desde la cota de nivel ±0,00 del proyecto también se procede con la colocación de la estructura acero refuerzo y fundición de este. Se realizó corte, figurado y armado estructura acero refuerzo para el pilote anterior. Por ultimo se realiza fundición de las zapatas entre los ejes B-1 y C-1

Norma

Scanned with

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista — Operador de máquina
Residente de obra — 2 Ayudantes operador
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
10 Ayudantes.

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Miercoles, 03/04/2024

Se realiza corte, figurado y armado de estructura acero refuerzo para pilote en concreto de 7mts. Se continúa con la excavación a máquina en los ejes E-2 el cual llega a una profundidad de 7,00 mts desde el nivel ±0,00 del proyecto, se hace la respectiva colocación del acero reforzado y posteriormente fundición del mismo. Se inicia excavación a máquina del pilote entre los ejes A-2.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde Soleado

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista — Operador de máquina
Residente de Obra — 2 Ayudantes operador
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
10 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 04/04/2024

Norma

Scanned with

FECHA: Viernes, 29/08/2024
Actividades religiosas de Semana Santa.

FECHA: Sábado, 30/03/2024
Actividades religiosas de Semana Santa.

FECHA: Lunes, 01/04/2024
Se continúa con el corte, figurado y armado en sitio del acero refuerzo del pedestal, de igual manera colocación del acero de zapatas, además, se realizó excavación manual para zapata 3e inicia excavación en para pilotes en los ejes F-2

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
10 Ayudantes
1 Operador de maquina
2 Ayudantes operador

Arq. Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Martes, 02/04/2024
Se continua con el armado en sitio del acero refuerzo para zapatas y pedestal en concreto en los ejes B-1 y C-1. De igual manera se continua con la excavación a maquina del pilote entre los ejes F-2, el cual bajo 7,00 mts desde el nivel ±0,00 del proyecto, se procede a colocar su respectivo acero de refuerzo para posteriormente realizar fundición del mismo. Se inicia excavación a máquina para pilotes en ejes E-2

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada.

Norma

Scanned with

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista — Operador de máquinas
Residente de obra — 2 Ayudantes de operador
Siso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
10 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Miercoles, 27/03/2024

Se continúa con la excavación a máquina para fundición de pilote entre los ejes B-1 y excavación manual para zapatas y vigas de cimentación para posteriormente fundición del solado de este último, por último se continua con el corte, figurado y armado de estructura de acero refuerzo de pilote en concreto y fundición del pilote con una profundidad de 7,40 mts del nivel ±0

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada, tarde con lluvias moderad

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista — Operador de máquina
Residente de obra — 2 Ayudantes de operador
Siso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
10 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 28/03/2024

Actividades religiosas de Semana Santa

Norma

Scanned with

FECHA: Lunes, 25/03/2024

Se continua con la excavación a máquina de los ejes E-1 el cual se logra excavar 7,30 mts desde el nivel ±0,00 del proyecto, luego se procede con la colocación de la estructura de acero refuerzo y posteriormente fundición del pilote. Para este pilote la estructura acero refuerzo tiene una longitud en su cuerpo de 6mts y 1,05 mts entre traslapo y cuerpo que se embebe en la zapata con su respectivo gancho. Se continua con la excavación a máquina en los ejes D-1. Posteriormente se realiza fundición del mismo con una profundidad de 7,20 mts.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista	Operador de máquina
Residente de obra	2 Ayudantes operador
Sisso	
Almacenista	
Maestro	
1 Oficial	
10 Ayudantes	

Ing. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Martes, 26/03/2024

Se continua con la excavación manual en zapata y vigas de cimentación, se realiza relleno con material de rio y fundición de solado en zapa de los ejes E-1. Se continua con la excavación a máquina del pilote con ejes C-1, el cual se logró bajar en la excavación 7,30 mts desde el nivel ±0,00 del proyecto, luego se procede con la colocación de la estructura de acero refuerzo y posteriormente fundición del mismo. Por último se realizó relleno con material de rio en vigas y fundición de solado de cimentación en el mismo.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

Norma

Scanned with

A-1

Posteriormente se realizó fundición de pilote en concreto, con su respectiva colocación del acero refuerzo con una longitud de 6mts el cuerpo y 1,65 mts entre traslapo y el cuerpo que sobresale en la zapa con su respectivo gancho. Se hizo toma de la muestra concret

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista	Operador de máquinas
Residente de obra	1 Ayudante de operador.
SISO	
Almacenista	
Maestro	
1 Oficial	
12 Ayudantes	

Arq/Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Sábado, 23/08/2024

Se continua con la excavación a máquina para fundición de pilote de 7mts, se realizó excavación manual para zapatas y vigas de cimentación, se hizo solado para zapata. Se realizó corte, figurado, y armado de estructura de acero refuerzo de pedestal, así mismo colocación y armado de parilla para zapata. posteriormente se realizó fundición de zapata del eje A-1. Se continua con corte y figurado de acero refuerzo para pilote de 7mts

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista. SISO Maestro 12 Ayudantes
Residente Obra. Almacenista 1 Oficial Operador + 2 Ay

Arq/Residente Obra

Residente Interventoría

Norma

Scanned with

Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1. Oficial
8 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 21/03/2024
Se inicia la jornada con limpieza de cuneta, de igual manera se empieza con la excavación a máquina, se realiza la fundición de solado para caja de inspección de 0,60 x 0,60 posteriormente se realiza fundición de la caja. Continúa con la armada de estructura de acero refuerzo para pilotes de 1m en concreto

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista — Operador de máquina
Residente de obra — 1 Ayudante de operador
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
12 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Viernes, 22/03/2024
Se realizó desencofrado de caja de inspección, se continua con la excavación a máquina para fundición de pilote en concreto el cual, se logró excavar 7,10 mts desde el nivel ± 0,0

Norma

FECHA: Martes, 19/03/2024

Llega a la obra la máquina para perforación de suelos. Se inician las actividades en campo después de las 10:00 AM por las lluvias intensas. Se realizó relleno con material de sitio sobre el area de la camara y tuberia. Se continua con el figurado y corte de los estribos para pedestales en concreto, se termina la construcción de batea de la camara. Se realizó relleno con material de rio en tubería que conecta de caja a camara de inspección y se continúa con corte, figurado y armado de estructura acero refuerzo para pilotes en concreto de 7mts.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana lloviosa, tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
8 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Miercoles, 20/03/2024

Se continua con el corte figurado y armado de estructura acero refuerzo para pilotes en concreto de 7mts, se realizó encofrado para fundición del area de la cuneta demolida, fundición del area y parte de la losa sobre la zona. También se realizó instalación de tela para filtro, tubería y relleno con material de rio (triturado). Se hizo prueba

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista

Norma

Scanned with

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sob-contratista
Residente de obra
Sisa
Almacenista
Maestro
1. Oficial
7. Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Lunes, 18/03/2024

Se continúa con la excavación manual para instalación de tubería pvc 12" en la parte exterior que corresponde con la cuneta se hace perforación de cámara de inspección para conexión de tubería a cuneta, también se hace demolición de cuneta, se realizó relleno con material de rio en excavación, instalación de 6,80 ml tubería pvc 12", relleno con material de sitio y sellado de cámara en la perforación. Por último se culminó con la excavación manual para caja de inspección y filtro.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sob-contratista
Residente de obra
Sisa
Almacenista
Maestro
1 Oficial
8 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

Scanned with

Sisa
Almacenista
Maestro
1 Oficial
7 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Viernes, 15/03/2024
Se realizó excavación manual para instalación de tubería sanitaria 12" para drenajes, de igual manera se inicia con la excavación manual para construcción de caja de inspección de 0,60 x 0,60 y se continúa con la excavación manual para filtro. La empresa Volcanos trae a la obra las guías por ende el personal en obra procede en la descarga y almacenaje de las platinas de guías.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Sisa
Almacenista
Maestro
1. Oficial
7. Ayudantes

Arq. Residente obra — Residente Interventoría

FECHA: Sábado, 16/03/2024
Se continúa con la excavación manual para caja de inspección de 0,60 x 0,60 y construcción de filtro. Se continua con el corte y figurado de acero refuerzo para estructura de pilote en concreto 7mts

Norma

Scanned with

FECHA: Miercoles, 13/03/2024

Se realiza desencofrado de formaleta de viga cimentación de la malla contra impacto, se inicia la excavación a mano para instalación de tubería sanitaria de filtro, de igual manera se realizó corte y figurado acero refuerzo para estructura de pilotes en concreto de 7mts.

ESTADO DEL TIEMPO: Tarde y mañana soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1. Oficial
7. Ayudantes

Arq. Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 14/03/2024

Se continua con la excavación manual para filtro, se continúa con el corte, figurado y armado de estructura de acero refuerzo para pilotes en concreto de 7mts. También se realizo por medio de la comisión topografica ubicación de los ejes para fundición de pilotes en concreto de 7mts. y de los otros elementos estructurales de la cimentación; como vigas y zapatas, además, de los pedestales. Se realizó corte y figurado acero refuerzo para pedestal como lo son los estribos.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista.
Residente de Obra.

Norma

Scanned with

FECHA: Lunes, 11/03/2024

Se continua con el corte, figurado y armado de estructuras de acero refuerzo para pilotes en concreto de 7mts, ademas, se realizó corte y figurado de acero refuerzo para viga cimentacion 2 de la malla contra impacto.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista
Residente de obra
Viso
Almacenista
Maestro
1. Oficial
7. Ayudantes

Arq. Residente obra

Residente Interventoría

FECHA: Martes, 12/03/2024

Se inicio la jornada con armado y colocacion de estructura de acero refuerzo para viga de cimentacion 2 de la malla contra impacto firmalistería o encofrado posteriormente fundicion de la misma. La interventoría realizo visita de campo en la obra. Se continúe con el corte, figurado y armado de estructura acero refuerzo de pilotes en concreto de 7mts.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista — Viso — Maestro — 7. Ayudantes
Residente de obra — Almacenista — 1. Oficial

Arq. Residente obra

Residente Interventoría

Norma

Scanned with

Se realizó armado de estructura acero refuerzo de viga cimentacion y colocación de la misma para la malla contra impacto, formaleteria y fundición de la misma. Se continuó con el corte, figurada y armada estructura acero refuerzo para pilotes en concreto de 7mts.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada, tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-Contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro
1. Oficial
7. Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente de Interventoria

FECHA: Sábado, 09/03/2024

Se continua con el corte, figurado para estructura de acero refuerzo de pilotes en concreto de 7mts. Se realiza desencofrado de la viga de cimentacion. Se realizó replanteo de los puntos para fundicion de pilotes de 7mts por parte de la comision topográfica.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-Contratista — Almacenista — 7. Ayudantes
Residente de obra — Maestro
Siso — 1 Oficial

Arq. Residente Obra — Residente Interventoria

Norma

Scanned with

cimiento de la malla contra impacto, se realizo relleno con materia de rio y soladó para zapa de la malla contra impacto del lado 2, además, de relleno con material de sitio y rio para fundición de la viga de cimiento del lado 1, también se hizo vaciado de solado sobre este ultimo lado. Se realizó formaleteria y encofrado de zapatas del lado 2 para luego realizar fundición de la misma Se realizó relleno con material de sitio, ya por ultimo se hizo corte, flejado y armado de estructura de refuerzo para pilotes en concreto de 7mts. Hoy también se generaron lluvias intensas en la tarde a partir de las 2:pm hasta las 4pm impidiendo asi, continuar con labores en campo.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada, tarde lluviosa

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Sisa
Almacenista
Maestro
1. Oficial
7. Ayudantes

Arq. Residente de obra

Residente Interventoria

FECHA: Viernes, 08/03/2024
Se realizó visita por parte del contratista de la parte metálica correspondiente a la cubierta de la cancha, en la cual se deja constancia que el señor Angelo Marín toro de la empresa Volcanus se compromete el viernes 15 del mes en curso traer las platinas de guias y bastones, asi mismo el interventor de Volcanus Wilmar Alberto Marin Toro

6.253.583

Norma

Scanned with

PERSONAL EN OBRA.
Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

FECHA: Miercoles, 06/03/2024
Se continua con armado de estructura de acero refuerzo para columnetas de la malla contra impacto, formaleteria para encofrado de zapatas y fundicción de las mismas; cabe recordar que en horas de la tarde a partir de las 2pm se prodigeron lluvias intensas hasta las 4pm impidiendo la realización de actividades en campo

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada, tarde lluviosa

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1. Oficial
7 Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 07/03/2024.
Se realizó corte y figurado de acero refuerzo para viga de

Norma

FECHA: Lunes, 04/03/2024

Se realizó excavación manual para fundición de zapatas y viga de amiento para malla contra impacto, también se realizó excavación manual para pilotes en concreto de la malla contra impacto. Se hizo corte, figurado y armado de estructura de acero refuerzo para tapa de camara inspeccion, por consiguiente se realizo encofrado con formaleta metálica y fundición de la tapa. Se realizo fundición de pilotes en concreto (2) y toma de la muestra de concreto en cilindro para su respectivos fallos.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista

Residente de obra

Siso

Almacenista

Maestro

1 Oficial

6. Ayudantes

Arq. Residente obra

Residente Interventoría

FECHA: Martes, 05/03/2024

Se realizo corte, figurado y armado de estructuras de acero de refuerzo para pilotes en concreto de 2,5 mts correspondientes a los dos retirados; para zapatas y columnetas en concretos de la malla contra impacto y pilotes en concreto de 7mts. Se realizó fundición de los dos (2) ultimos pilotes en concreto de 2,5 mts. Se continuo con la excavación manual para zapatas y viga de la malla contra impacto, solado de zapatas por ultimo desencofrado de formaleta de la tapa para la camara de inspección.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

Norma

Scanned with

de la camara, relleno con material de sitio, demás, corte, figurado y armado acero refuerzo para tapa de camara de inspección.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana con lluvias moderadas, tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro de obra
1. Oficial
7. Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

FECHA: Sábado, 02/03/2024

Se realizo carpintería en madera para formaleta y encofrado de caja de inspección y su respectiva fundición, se realizó corte, figurado y armado de acero refuerzo para tapa de camara de inspección, excavacion manual de terreno para pilotes de la malla contra impacto, por último se hizo relleno con material de sitio.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista — Maestro
Residente de obra — 1. Oficial
SISO — 7. Ayudantes
Almacenista

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

Norma

Scanned with

Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 29/02/2024
Descofrado de formaleta metálica y en madera. Encofrado de formaleta metálica para fundición de cámara de inspección para una altura de 2,50 mts. Se realizó relleno con material de sitio. Fundición de un (1) pilote en concreto de acuerdo a los detalles constructivos para la malla contra impacto, fundición del último cuerpo de la cámara de inspección, se realizo la construcción de cañuela para cajas de inspección. Toma muestra de concreto

ESTADO DEL TIEMPO: Día soleado mañana y tarde

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Sisa
Almacenista
Maestro
1 Oficial
7 Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

FECHA: Viernes, 01/03/2024
Se realizó la excavación manual para pilotes de la malla contra impacto con una altura promedio de 3,80 mts y fundición de tres (3) pilotes en concreto con su respectivo acero de refuerzo. También se realizo desencofrado de formaleta metálica

Norma

con un diametro de 1,80 x 1,00 de altura, tambien, se realizó la instalacion de tuberia novafort de 8,40 mL (30") relleno con gravilla y arena media y relleno con material de sitio.

ESTADO DEL TIEMPO: Dia soleado

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista — 1. Operador de maquina
Residente de obra
Soso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6. Ayudantes

Ing. Residente de obra — Residente Interventoría

FECHA: Miercoles, 28/02/2024

Se realizó excavacion a maquina para instalacion de drenajes con tuberia de 12", además de nivelacion de terreno para implantacion de cancha, disencofrado y encofrado de formaleta metálica para reamara de inspeccion, fundicion de la misma con un diámetro de 1,80 mts x 4,00 altura. Se hizo instalacion de 6,00 mL de tuberia novafort de 12", canuela para cajas de inspeccion, retiro de pilote en concreto, relleno con material de rio y de sitio, asi como, retiro de material sobrante en volqueta. Se realizó mehocos para pilotes en concreto de 2,5 mts y excavacion manual para el mismo (4)

ESTADO DEL TIEMPO: Dia soleado mañana y tarde

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista — 1. Operador de maquina
Residente de obra
Soso
Norma

Almacenista
Maestro
1. Oficial
6. Ayudantes

Arq. Residente de obra

Residente Interventoría

FECHA: Lunes, 26/02/2024

Se realizo desencofrado de cajas de inspección, excavación a maquina para instalación de tubería novafort de 10" para drenajes de aguas lluvias, relleno con material de río (gravilla) Instalación de tubería 10,80 mts, relleno con arena media y material de sitio. Se realizo retiro de material sobrante.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias intensas en la mañana, tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista
1. Operador de maquina
Residente de obra
Sisa
Almacenista
Maestro
1. Oficial
6. Ayudantes

Arq. Residente de obra

Residente Interventoría

FECHA: Martes, 27/02/2024

Se continúa con la excavación a maquina para instalación de drenajes con tuberías de 10", además de la excavación a maquina para nivelación de terreno donde se implantara la cancha, retiro de material sobrante, se realico el retiro de pilote en concreto de acuerdo a las observaciones realizadas por la interventoría. Se realizo encofrado de formaleta metálica y fundición de camara de inspec.

Norma

Scanned with

Se realizo excavación manual para instalación de tubería del drenaje para aguas lluvias, se hizo corte, figurado y armado para la estructura de acero de fierro de pilotes para la malla contra impacto; también, se realizo formaletería (carpintería en madera) para fundición de caja de inspección de 1,00 x 1,00 con una altura de 2,20 mts.

ESTADO DEL TIEMPO: Día soleado

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Sisa
Almacenista
Maestro
1. Oficial
6. Ayudantes

Arq. Residente de obra

Residente Interventoría

FECHA: Sábado, 24/02/2024

Se realizó fundición de caja de inspección de 1,00 x 1,00, se hizo replanteo según giro de la implantación para puntos de pilotes de 7mts y malla contra impacto con su respectiva localización. Se realizó corte, figurado y armado acero refuerzo para estructura de pilotes en concreto de malla contra impacto de 2,5 mts

ESTADO DEL TIEMPO: Día soleado

PERSONAL EN OBRA
Sub-contratista
Residente de obra
Sisa
Norma

Scanned with

tubería para drenajes, se realizó corte, figurado y armado de estructura de acero refuerzo para pilotes de malla contra impacto con una longitud de 3 mts con su respectivo gancho, se realizo formaleteria en madera para fundicion de caja de inspeccion de 0,80 x 0,80 mts con su respectiva fundicion

ESTADO DEL TIEMPO: Dia totalmente soleado

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Sisa
Almacenista
Maestro
1. Oficial
6. Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente Interventoria

FECHA: Jueves, 22/02/2024
Se realizó excavacion manual para instalacion de tubería para drenaje se hizo corte, figurado y armado de estructura de refuerzo para pilotes de la malla contra impacto. Se realizó carpintería en madera para construccion de formaleta para caja de inspeccion de 1,20 x 1,20 y fundicion de caja de inspeccion de 1,20 x 1,20

ESTADO DEL TIEMPO: Dia parcialmente soleado

PERSONAL EN OBRA:
Sub-Contratista — Sisa — Maestro — 6. Ayudantes
Residente de obra — Almacenista — 1. Oficial

Arq. Residente de obra — Residente Interventoria

Norma

Scanned with

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias intensas en la mañana, tarde soleada.

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro
1. Oficial
5. Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

FECHA Martes, 20/02/2024

Se reinicio con la excavación manual para instalación de tuberías para drenajes, se hizo corte, figurado y armado de estructura de acero refuerzo para pilotes en concreto de 2,5 mts. También se realizó prehuecos y excavación con maquina manual para fundicion de pilotes, se realizó fundicion de pilotes en concreto (2)

ESTADO DEL TIEMPO: Día totalmente soleado

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro
1. Oficial
6. Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

FECHA: Miercoles, 21/02/2024

Norma

Scanned with

Almacenista
Maestro
1. Oficial
3. Ayudantes
2 Operadores de maquina

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

FECHA: Sabado, 17/02/2024
Se inician las labores despues de las - 10:00 AM por las intensas lluvias en horas de la mañana, se realizo retiro de material sobrante de la demolicion de placa concreto existente, se continua con la excavacion manual para caja de inspeccion y retiro de material caido en excavación, y fundicion de solado(2).
ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias intensas en la mañana
PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro
1. Oficial
3 Ayudantes
2 Operarios de maquina

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

FECHA: Lunes, 19/02/2024
A partir de las 10:00 AM se inician las labores en campo por las fuertes; se inicia con excavacion manual para instalacion de tubería novafer de 10" y 12" para los drenajes, se realizó corte, figurado y armado de estructura de acero refuerzo para pilotes en concreto de 2,5 mts.

Norma

Scanned with

Almacenista
Maestro
1 Oficial
1 Ayudante
2 Operadoras de maquina

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 15/02/2024
Se reinicia la excavación manual para fundición de cajas de inspección. Se espera a que el comité se defina para continuar con la demolición y retiro del material sobrante de la demolición.
fundición de solado de cámara.
ESTADO DEL TIEMPO: Día totalmente soleado

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Sisa
Almacenista
Maestro
1 Oficial
2 Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

FECHA Viernes, 16/02/2024
Se reinicia con la demolición de placa de concreto existente y excavación manual para fundición de cajas de inspección y fundición de solado en concreto para cajas de inspección (1)
ESTADO DEL TIEMPO: Día totalmente soleado
PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra

Scanned with

y que no hay respuestas por el giro y desplazamiento generado en la cancha
Se realizó replanteo y localización de cajas de inspección para drenajes de aguas lluvias, excavación manual para cajas de inspección y recamara principal. Se hizo corte y figurado de acero refuerzo para estructuras de cimentación en concreto en varillas de 3/8" (estribos) longitud de 1,60 mts

Estado del tiempo: Día totalmente soleado.

Personal en obra
Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
3 Ayudantes

Observaciones:

Ing. Residente Obra

Residente Interventoría

Fecha: Miercoles 14/02/2024

Se realizó excavación manual para recama, en la cual se debio hacer excavacion fuera del area de localizacion de la recama para hallar la tubería existente. También se realizo demolición de la placa de concreto de la cancha existe y desmonte de tablero de juegos para basgeto bol con sus respectivos postes.

Estado del tiempo: Día totalmente soleado

Personal en obra
Sub-contratista
Residente de obra
Siso

Norma

Estado del tiempo: Mañana soleada

Personal en obra:
Sub-contratista
Residente de obra
Sisa
Almacenista
Maestro
1. Oficial
2. Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

Fecha: Lunes, 12/02/2024

Se realizó replanteo de puntos para pilotes y malla contra impacto, replanteo de cancha multiple, ademas, de localización de cajas de inspección para drenajes de aguas lluvias. Se realizo excavación manual para cajas de inspección.

Estado del tiempo: Día totalmente soleado.

Personal en obra
Sub-contratista
Residente de obra
Sisa
Almacenista
Maestro
1 Oficial
3 Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente Interventoria

Fecha: Martes, 13/02/2024

A la fecha se presentan atrasos en la excavación para pilotes, debido

Norma

Scanned with

Maestro
1 Oficial
2 Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente de Interventoría

Fecha: Viernes, 09/02/2024
Se realizó corte, figurado y armado de acero refuerzo para estructura de dado o zapata en concreto (4 unid.) de igual manera se realizó reeplanteo de puntos para pilotes en concreto, malla contra impacto y localización y reeplanteo de cancha multiple. Se realizó localización de puntos sanitarios (alcantarillado) Por último se realizo demoliciones varias.

Estado del tiempo: Mañana oleada, tarde lluvias intensas

Personal en obra:
Sub-Contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
2 Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente/Interventoría

Fecha: Sábado, 10/02/2024
Se realizó corte y figurado de acero refuerzo para estructuras en concreto en varilla de 3/8" (estribos) con longitud de 1,60 mts. También se hizo excavación manual para instalación de tubería para drenajes. Por otro lado se realizó localización de puntos para alcantarillado. Aún no se difine por las partes) Interventoría cuadar giro y desplazamiento de la cancha.

Norma

Scanned with

Fecha: Miercoles, 07/02/2024
Se realizó corte y figurado de acero refuerzo para estructuras de concretos, varillas de 5/8" para dados en concreto con una longitud 1,35 mts. Se realizó localización de puntos para pilotes en concreto y malla contra impacto.

Estado del tiempo: Día totalmente soleado

Personal en obra:
Sub-Contratista Comisión Topografica
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
2 Ayudantes

Arq. Residente de obra

Residente Interventoría

Fecha: Viernes, 08/02/2024
Se tenía previsto realizar replanteo de puntos para pilotes y malla contra impacto y replanteo de cancha, al igual que localización de puntos para alcantarillado, todo esto en el area de trabajo pero no se pudo realizar por lluvias intensas durante toda la mañana y parte de la tarde, sin embargo, se realizo bajo techo el armado de acero refuerzo para estructuras de dado o zapata en concreto de 4 unidades. Ademas que no se ha avalado el giro y desplazamiento de la implantacion de la posicion nueva de la cancha

Estado del tiempo: Día parcialmente lluvioso

Personal en obra
Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista

para dados en concretos, se hizo un recorrido con el personal sub-contratista de la parte eléctrica tanto interna como externa de la Institución educativa con el objetivo de definir la red de conexión eléctrica del proyecto. También se realizó las charlas de seguridad y salud en el trabajo.

Estado del tiempo: Día totalmente soleado

Personal en obra:
Sub-contratista de obra
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
2. Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

Fecha: Martes, 06/02/2024
Se realizó corte, figurado, y armado de acero reforzado para estructuras en concreto con varillas de 3/8" y 3/8". Se realizó socialización con la comunidad Educativa del Instituto técnico Industrial G.V.C., el contratista, sub-contratista de obra, interventoría e indervalle para la conformación de Comité de Veedurías Ciudadanas.

Estado del tiempo: Día totalmente soleado

Personal en obra:
Residente de obra — Maestro
Siso — 1 Oficial
Almacenista — 2. Ayudantes
Director de obra — Sub-contratista

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

Norma

Scanned with

Estado del tiempo: Día totalmente soleado

Personal en obra:
Sub-contratista de obra
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro
1. Oficial
2. Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

Fecha: Sabado, 03/02/2024

Se continúa con el corte, figurado y armado de acero de refuerzo de 3/8" y 5/8" para vigas de cimentación y dados en concreto respectivamente con longitudes de 1,60 mts y 1,80 mts. Se realizaron armado de acero de estructura para dados en concreto en total 4 unidades.

Estado del tiempo: Día totalmente soleado

Personal en obra:
Sub-contratista de obra
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro
1. Oficial
2. Ayudantes

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

Fecha: Lunes, 05/02/2024

Se continua con el corte, figurado y armado de acero refuerzo de 5/8"

Norma

Scanned with

Personal en obra:
Sub- contratista de obra
Director de obra
Residente de obra
Siso
1 Maestro
1 Oficial
3 Ayudantes
Almacenista

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

Fecha: Jueves, 01/02/2024
Se continua con el corte, figurado y armado de acero de refuerzo de 3/8" (estribos) para vigas de cimentación con una longitud de 1,60 mts.

Estado del tiempo: Día totalmente soleado.

Personal en obra:
Sub-contratista de obra
Residente de obra
Siso
Maestro
1. Oficial
2. Ayudantes
Almacenista

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

Fecha: Viernes, 02/02/2024
Se continua con el corte, figurado y armado de acero de refuerzo de 3/8" y 5/8 para vigas de cimentación y dados en concreto respectivamente con longitudes de 1,60 mts y 1,35 mts.

Scanned with

Fecha: Martes, 30/01/2024

Detalles de la obra: Se da inicio a la ejecución de las obras con instalación de tela verde (Cerramiento provisional), realizando a a su vez inspección del lugar de acuerdo, al diagnostico previamente realizado, focalizando el area a intervenir, el proceso de ejecución de las actividades y sobre todo la ruta programada para llevar a cabo la ejecución del proyecto; Todo esto una vez se haga efectiva reunión programada para el día miercoles 31 de enero 2024, e iniciar en forma la ejecución de la obra

Estado del tiempo: Día totalmente soleado

Personal en obra

Director de obra

Sub-contratista de obra

Residente de obra

Maestro de obra

3 Ayudantes

Almacenista

Arq: Residente de obra — Residente Interventoría

Fecha: Miercoles, 31/01/2024

Se realizó cerramiento con tela verde en campamento y limpieza del mismo. De igual manera se empezó con el corte, figurado y armado de acero de refuerzo de 3/8" para vigas de cimentación con una longitud de 1,60 mts. También se realizo reunión con la comunidad educativa del ITLGVC con el objetivo de socializar el proyecto y conformar el Comité de Veedurías Ciudadanas, pero se aplazó para el día 06 de febrero ya que el personal de interventoría y inder valle no pudieron asistir por problemas en la vía Cali-Palmira (Cierres parciales). Por consiguiente se hizo toma del acta de reunión y se dio formalmente apertura a la obra.

Estado del tiempo: Día totalmente soleado

Scanned with

BITACORA DE OBRA

CONTRATO Nº: IND-23-5027

OBJETO DEL CONTRATO: Mejoramiento a escenarios deportivos y recreativos para los municipios de Cartago, El Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el Departamento del Valle del Cauca

CONTRATISTA: CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC
Representante Legal:
Residente de Obra: Arq. Beymar Panamito Angulo

FECHA DE INICIO: 28 de diciembre de 2023
FECHA FINAL: 30 de Junio de 2024

INTERVENTORIA: CONSORCIO GRUPO 3
Representante Legal:
Residente Interventoria:

Scanned with

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana nublada – tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Sisa
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Arq. Residente Obra.

Residente Interventoría

FECHA: Viernes, 24/05/2024

Se inician las labores con colocación de parillas, pero antes se realizó evacuación de las aguas lluvias en excavaciones y limpieza de los mismos, para posteriormente realizar colocación y ubicación de estructura acero refuerzo para pedestales en concreto con sus respectivos ganchos, una vez realizado esto se realiza el vaciado de concreto en las zapatas entre los ejes 2-B, 2-C, 2-D y 2-E, por último se realizo fundición de solados para viga.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-Contratista
Residente de obra
Sisa
Almacenista
Maestro
1. Oficial
6 Ayodantes

Arq Residente Obra

Residente Interventoría

Norma

Scanned with

FECHA: Sábado, 25/05/2024

Se inician las labores con evacuación de las aguas lluvias, limpieza de solado de las vigas de cimentación, se realizo recebo con material de rio, fundición de solado cimentación, excavación manual para viga cimentación por ultimo se hizo desencofrado de zapatas fundidas.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Arq. Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Lunes, 27/05/2024

Se inician las labores con evacuación de las aguas lluvias limpieza de las areas a trabajar y se procede con el izado de acero refuerzo de la viga, colocación y ubicación de la misma para fundicion de la viga cimentacion, se realizo fundicion de solado cimentacion para viga

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro

Norma

Scanned with

1 Oficial
6 Ayudantes

Arq/Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Martes, 28/05/2024

Se continua con armado en sitio de la estructura de acero reforzado para la viga cimentación, se continua con el corte y figurado de acero para viga cimentación. Iniciamos con colocación y ubicacción a eje y nivelación de estructura acero (Platina) de la guía para montaje de la estructura de cobierta.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA

Sub-contratista
Residente de obra
Sisa
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Arq/Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Miercoles, 29/05/2024

Se iniciaron las labores en campo a partir de las 10:00 AM debido a las fuertes lluvias, se realizó corte y figurado de acero refuerzo para viga cimentacion se realizó drenaje de las aguas lluvias se continua con la instalación de la guía de la platina con su respectiva nivelacion y a eje.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana lluviosa y tarde soleada

Norma

Scanned with

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 30/05/2024
Se realizó fundición de solado cimentación para viga, se continua con la ubicación y colocación de la guía de la platina tanto a eje como nivel. Se realizó visita de la entidad contratante, de la interventoría y el contratista en la obra y del personal sub-contratista de la estructura de la cubierta, además, se reunieron con la comunidad del instituto técnico. Con respecto de la obra se definió que la empresa volcano encargada de la estructura de cubierta metálica debe corregir la guía de la platina para que calce correctamente en la estructura de acero del pedestal. Se continua con amarre de la viga cimentación

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Residente Obra — Residente Interventoría

Scanned with

FECHA: Viernes, 31/05/2024
Se continúa con el armado de la estructura de acero refuerzo de la viga cimentación para su respectiva fundición. Se realizó figurado de acero refuerzo para estructura de la viga.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Sábado, 01/06/2024
Se continúa con el armado de la estructura acero refuerzo para la viga cimentación.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada

PERSONAL EN OBRA
Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

Norma

Scanned with

FECHA: Lunes, 03/06/2024
No se realizaron trabajos en la obra debido a que el día es festivo.

Arq/Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Martes, 04/06/2024
Debido a las fuertes precipitaciones durante todo el día no se pudo realizar actividades en la obra.

Arq/Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Miercoles, 05/06/2024
Se reinician las labores con drenaje de aguas lluvias debido a las precipitaciones de la noche anterior, luego se procede con el armado de la estructura de acero refuerzo para fundición de la viga cimentación dandole finalidad a esta actividad

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada — tarde nublada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Arq/Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Viernes, 06/06/2024
Se inician las labores de carpintería en madera para posterior

Norma

Scanned with

mente empezar con encofrado de viga cimentacion.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada.

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de Obra
Sisa
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Arq. Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Viernes, 07/06/2024

Se inician las labores en campo con drenaje o evacuacion de l
aguas lluvias por las precipitaciones de la noche anterior y limpie
de lodo en excavaciones, para posteriormente continuar con encofra
de la viga cimentacion con formaleta metálica y en madera, adem
se realizo formaleta en madera.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Sisa
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Arq. Residente Obra

Residente Interventoría

Norma

Scanned with

FECHA: Sábado, 08/06/2024

Se inician las labores con drenaje de aguas lluvias de las precipitaciones caídas la noche anterior, posteriormente se continua con la carpintería en madera, se realizó ensanchamiento de la excavación para la viga cimenta y procedor con encofrado de la misma en la viga 1.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana nublada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista
Residente de obra
Jefe
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Arq. Residente de obra

Residente Interventoría

FECHA: Lunes, 10/06/2024

No se realizaron trabajos en la obra debido a que el día es festivo.

Arq Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Martes, 11/06/2024

Se continuan las labores de carpintería en madera, encofrado en formaleta metálica y en madera para fundición de viga cimentación y pedestales en concreto.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Norma

Scanned with

Sub-Contratista
Residente Obra
Sisso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Arq. Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA Miércoles, 12/06/2024
Se realizo toma de muestra del terreno para estudio de suelos por parte de la interventoría, se inicia con ubicación y nivelación de la guía de la platina

ESTADO DEL TIEMPO Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA
Sub-Contratista
Residente Obra
Sisso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudante

Arq. Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA Jueves, 13/06/2024
Se continúa con colocación, ubicación y nivelación de la guía de la platina.

ESTADO DEL TIEMPO Mañana y tarde soleada

Norma

Scanned with

PERSONAL EN OBRA
Sub-contratista
Residente de Obra
Sisso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Arq Residente Obra

Residente interventoría

FECHA: Viernes, 14/06/2024
Se realizó fundición de vigas y pedestales de los ejes 1 y 2. Se realizo toma la muestra de concreto se suspende parcialmente la obra

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA
Sub-contratista
Residente de obra
Sisso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
8 Ayudantes

Arq Residente Obra

Residente interventoría

FECHA: Viernes, 28/06/2024
Se reinicio la obra con desencofrado de vigas y pedestales en concreto, se realizó relleno con material de sitio

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

Norma

Scanned with

PERSONAL EN OBRA
Sub-contratista
Residente de obra
Sisa
Almacenista
Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

Arq Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA Sábado, 24/08/2024
Se realizo levantamiento topografico para niveles de corte de terreno (excavaciones para base y subbase).

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA
Sub-contratista
Residente de obra
Sisa
Almacenista
Maestro
1 Ayudante
Comision topografica (Topografo + Cadinero)

Arq Residente

Residente Interventoría

Se suspende parcialmente la obra

FECHA Martes, 15/10/2024
Reiniciamos nuevamente la obra con la comision topografica para excavacion de terreno y posteriormente relleno de la base y sub-base
Se inicio la excavación de terreno a maquina y retiro de material

Norma

Scanned with

Solvente a máquina (Colqueta)

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada, tarde lluviosa

PERSONAL EN OBRA:

Sub contratista	Operador de Retroexcavadora
Residente de obra	Operadores de Colquetas
3:30	
Almacenista	
1 Oficial	
1 Ayudante	
Topografo + Cadenero	

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Miércoles, 16/10/2024

Continuamos con excavación a máquina, demolición restante de cancha existente y retiro de material sobrante. Comisión topografica

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada y tarde lluviosa

PERSONAL EN OBRA

Sub contratista	Operador de Retroexcavadora
Residente de obra	Operadores de Colquetas
3:30	
Almacenista	
1 Oficial	
1 Ayudante	
Topógrafo + Cadenero	

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

Norma

Scanned with

FECHA: Jueves, 17/10/2024

Se continua con la excavacion a maquina y retiro de material sobrante en volqueta. Comision topografica

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana nublada, tarde lluviosa

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista — Operador de Retro
Residente de Obra — Operadores de Volquetas
Sisso
Almacenista
1 Oficial
1 Ayudante
Topografo + Cadenero

Arq. Residente Obra — Residente Interventoria

FECHA: Viernes, 18/10/2024

Continuamos con excavación a maquina y retiro de materia sobrante en volquetas. Comisión topografica.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde con lluvias moderadas

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista — Operador de Retro
Residente de Obra — Operadores de Volquetas
Sisso
Almacenista
1 Oficial
1 Ayudante
Topografo + cadenero

Arq. Residente Obra — Residente Interventoria

Norma

FECHA: Sábado, 19/10/2024

Continuamos con la excavación de terreno a máquina y retiro de material sobrante. Culminamos con estas actividades y se iniciará el día de mañana con la instalación de geo-celdas.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA

Sub-contratista	Operador de Retro
Residente de obra	Operadores de Volquetas
Sisso	
Almacenista	
Maestro	
1 Oficial	
1 Ayudante	
Topografo + cadenero	

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Lunes, 21/10/2024

Iniciamos con la instalación de geoceldas para estabilidad del terreno y relleno con material de rio (base) para conformación de terreno.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA

Sub-contratista	Operador de minicargador (bobcat)
Residente de obra	
Sisso	
Almacenista	
Maestro	
1 Oficial	
1 Ayudante	

Norma

Scanned with

Arq. Residente Obra Residente Interventoría

FECHA: Martes, 22/10/2024

Continuamos con la instalacion de geoceldas y relleno con material de rio para base.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
1 Ayudante
Operador de minicargador (Bobcat)

Arq. Residente Obra Residente Interventoría

Scanned with

Arq/Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Martes, 22/10/2024

Continuamos con la instalación de geoceldas y relleno con material de río para base.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
1 Ayudante
Operador de minicargador (Bobcat)

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 14/11/2024

Se reinicio la obra con relleno de material de río para sub-base, por las lluvias se para la obra hasta mañana

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleado, tarde lluvioso

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
1 Ayudante

Norma

Scanned with

Operador de minicargador (bocat)

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Viernes, 15/11/2024

Lluvias intensas todo el día, por tal motivo no se pudo laborar hoy.

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Sábado, 16/11/2024

Continuan las lluvias, por esta razón no se labora el día de hoy.

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Lunes, 18/11/2024

Continuan las obras con relleno de material de rio para la sub-base

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada, tarde alspejuela.

PERSONAL EN OBRA

Sob-contratista

Residente de obra

Sisa

Almacenista

Maestro

1 Oficial

1 Ayudante

Operador de minicargador (bocat)

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

Norma

FECHA: Martes, 19/11/2024

Continuamos con relleno material de rio para la sub-base.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias moderadas durante el dia.

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista

Residente de obra

Siso

Almacenista

Maestro

1 Oficial

1 Ayudante

Operador de minicargador (bobcat)

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Miércoles, 20/11/2024

La comisión topografica verifica los niveles del relleno para tener claro hasta donde se debe llegar con el relleno.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana lluviosa, tarde con lluvias moderadas

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista

Residente de obra

Siso

Almacenista

Maestro

1 Oficial

1 Ayudante

Comision topografica

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

Norma

Scanned with

FECHA: Sábado, 23/11/2024
No se laboró, debido a que la maquina tubo fallas y toco parar para poder repar la falla.

Arq. Residente — Residente Interventoría

FECHA: Lunes, 25/11/2024
Continuamos con la compactación y nivelación de terreno, por las lluvias generadas al medio día se suspenden las obras hasta el día siguiente.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada, tarde lluviosa

PERSONAL EN OBRA:
Sob-contratista
Residente de Obra
Diso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
1 Ayudante
Operador de Vibrocompactador cilindro

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Martes, 26/11/2024
No se laboró por problemas de inseguridad presentados cerca de la obra el sob-contratista manifiesta que una vez se aclare la situación continuara con las labores de obra.

Arq. Residente de obra — Residente Interventoría

Norma

FECHA: Viernes, 29/11/2024

Se reinicia la obra una vez superado el impasse de inseguridad continuamos con manejo de aguas lluvias y compactación y nivelación de terreno de la sub-base.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de Obra
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
1 Ayudante
Operador de vibrocompactador cilindro

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA Sábado, 30/11/2024

Se realiza prueba densidad del terreno compactado.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de Obra
SISO
Almacenista
1 Oficial
1 Ayudante
1 Personal para muestra de densidad

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

Norma

FECHA: Lunes, 02/12/2024

Se realiza comision topografica para plantear los niveles de acabo de fundicion de losa, limpieza de filtro (canal)

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista
Residente de obra
Sisso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
Topografo + cadenero

Arq Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Martes, 03/12/2024

Se realiza excavación manual, carpintería en madera para formaleta de muro gavión y posteriormente se realiza concreción del mismo.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista
Residente de obra
Sisso
Almacenista
1 Oficial
2 Ayudantes

Arq Residente Obra

Residente Interventoría

Norma

Scanned with

FECHA: Miércoles, 04/12/2024

Se continua con la excavación manual, se realiza con la construcción de muro gavión en la parte superior de la cancha.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
1 Oficial
2 Ayudantes

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 05/12/2024

Se continua con la construcción de muro gavion, también se realizo limpieza y resane de caja de inspección.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde despejada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
1 Oficial
2 Ayudantes

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Viernes, 06/12/2024

Se realiza chequeo de niveles con comisión topografica para

Norma

Scanned with

nivelacion y compactacion de sub-rasante para fundición de tramo de losa de la cancha.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA.
Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
2 Ayudantes
Topografo + cadenero

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Sabado, 07/12/2024
Se realizó relleno con material de rio para compactacion y nivelación de la subrasante.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
2 Ayudantes
Topografo + cadenero

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

Norma

Scanned with

FECHA: Lunes, 09/12/2024

Se realizó carpintería metálica para construcción de formaletas metálicas. También se realizo localización y replanteo del perimetro de juego

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada.

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista
Residente de Obra
Dios
Almacenista
Maestro
1 Oficial
2 Ayudantes
Topografo + cadenero

Arq. Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Martes, 10/12/2024

Se continua con la carpintería metálica para formaletería y posteriormente realizar la respectiva fundición de tramo de losa para la cancha

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista
Residente de Obra
Dios
Almacenista
Maestro
1 Oficial
2 Ayudantes

Arq. Residente Obra

Residente Interventoría

Scanned with

FECHA: Miercoles, 11/12/2024

Se realiza encofrado metálico, corte acero refuerzo y relleno con material de rio de la sub-rasante y compactación de terreno.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA.

Sub-contratista

Residente de Obra

SISO

Almacenista

Maestro

1 Oficial

2 Ayudantes

Arq Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 12/12/2024

Se realizó fundición de tramo losa pavimento para el perimetro de juego de la cancha con colacion de sus respectivos aceros refuerzos

Se realizó toma de muestra de concreto y prueba de slum

1

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA

Sub-contratista

Residente de obra

SISO

Almacenista

Maestro

1 Oficial

7 Ayudantes

Arq Residente Obra

Residente Interventoría

Norma

FECHA: Viernes, 13/12/2024

Se realizó desencofrado y encofrado metálico, relleno con material de rio y compactación de la sub-rasante.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana lluviosa, tarde cielo despejado

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
2 Ayudantes

Arq Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA Sábado 14/12/2024

Se realiza fundición de un tramo de losa del perimetro de juego de la cancha con su respectiva colocación y ubicación del acero refuerzo.

ESTADO DEL TIEMPO Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
7 Ayudantes

Arq Residente Obra

Residente Interventoría

Norma

Scanned with

FECHA: Lunes, 16/12/2024

Se realiza desencofrado y encofrado metálico para fundición de losa concreto, relleno con material de rio para conformacion de la sub-rasante.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista
Residente de Obra
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
2 Ayudantes

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Martes, 17/12/2024

Se realizó relleno con material y conformacion de termino de la sub-rasante y corte de concreto según diseño para paños.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA

Sub-contratista — Operador maquina cortadora concreto
Residente de Obra — Ayudante
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
2 Ayudantes

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

Norma

Scanned with

Fecha: Miércoles, 18/12/2024

Se realizo relleno con material de rio y conformación de la sub-rasante para fundición de losa concreto de la cancha.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista

Residente Obra

Siso

Almacenista

Maestro

1 Oficial

2 Ayudantes

Arq Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 19/12/2024

Se inicia excavación manual para construcción de cunetas en concreto.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana lluvias moderadas, tarde lluvioso

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista

Residente de obra

Siso

Almacenista

Maestro

1 Oficial

2 Ayudantes

Arq Residente Obra

Residente Interventoría

Norma

Scanned with

FECHA. Viernes, 20/12/2024

Continuamos con la excavacion manual para construccion de cunetas en concreto.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde con lluvias moderadas.

PERSONAL EN OBRA.

Sub-contratista

Residente de Obra

Sisa

Almacenista

Maestro

1. Oficial

2 Ayudantes

Arq. Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA. Sabado, 21/12/2024

No se realizaron todos los fuertes lluvias

Arq. Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA. Lunes, 23/12/2024

Se continua con la excavacion manual para construccion de cunetas en concreto.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA.

Sub-contratista

Residente de Obra

Sisa

Almacenista

Maestro

Norma

Scanned with

1 Oficial
2 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Martes, 24/12/2024
No se laboró por ser el día de celebrar en familia la navidad

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Miércoles, 25/12/2024
No se laboró por ser día festivo

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 26/12/2024
Se continua con la excavación manual para construcción de cometa

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana lluviosa, tarde con lluvias moderad

PERSONAL EN OBRA
Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
2 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

Norma

Scanned with

FECHA: Viernes, 27/12/2024
Se presentaron lluvias intensas por tal motivo no se pudo laborar el día de hoy.

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Sábado, 28/12/2024
Continuan las fuertes lluvias tampoco se pudo trabajar este día.

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Lunes, 30/12/2024
Se continua con la excavación manual para construcción de cunetas en concreto

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA
Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
2 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 02/01/2025
Se continuan las labores con localización y verificación de los niveles de fundición de la cuneta los días, 31 de diciembre de 2024 y 1 enero de 2025 no se laboraron por ser unos fiestas de fin de año

Norma

el otro por ser dia festivo. llegada del año nuevo.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de Obra
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
2 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoria

FECHA Viernes, 08/01/2025
Se realiza relleno con material de rio, nivelacion y compactacion de la sub-rasante para fundicion de losa pavimento de la cancha

ESTADO DEL TIEMPO. Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
2 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoria

FECHA Sábado, 04/01/2025
El personal de obra no se presento a la obra por los proble-
Norma

Scanned with

mas de inseguridad que presenta la ciudad, debido a que viven en diferentes sectores y sienten temor de desplazarse al lugar de trabajo.

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA. Viernes, 16/01/2025

Una vez calmada un poco la situacion de orden publico en la ciudad se retoman las obras. Se realizo excavacion manual par construccion de cunetas en concreto y se realizó solado para la misn

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA

Sub-contratista
Residente de Obra
Piso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
2 Ayudantes

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA. Viernes, 17/01/2025

Se realizó fundicion de tramo o paño losa de la cancha, con su respectivo colocación y amarre de acero refuerzo, ademas, de aplicacion de antisol y toma de muestra concreto para fallos.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA

Sub-contratista
Residente de obra

Norma

Scanned with

SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
7 Ayudante

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA Sabado, 18/01/2025
Se realizó fundicion de losa para la cancha con su respectiva colocacion y amarre de acero refuerzo, aplicacion de antisol.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA
Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
7 Ayudantes

Arq. Residente de Obra — Residente Interventoría

FECHA Lunes 20/01/2025
Se realiza corte de acero refuerzo, colocacion del mismo, la malla electrosoldada y fundicion de losa de la cancha aplicacion de antisol y toma para la muestra de concreto.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Norma

Scanned with

Sub-contratista
Residente de Obra
Diso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
7 Ayudantes

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Martes, 21/01/2025
Continuamos con fundición de un tramo de losa para cancha, aplicación de antisol y colocación y amarre del respectivo acero de refuerzo.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA
Sub-contratista
Residente de obra
Diso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
7 Ayudantes

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Miércoles, 22/01/2025
Se realiza desencofrado y encofrado metálico para fundición de losa concreto de la cancha.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleado

Norma

Scanned with

PERSONAL EN OBRA.
Sub-contratista
Residente de obra
3 Iso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
2 Ayudantes

Arq Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA. Jueves, 23/01/2025
Corte acero refuerzo, relleno con material de río, compactación y nivelación de la sub-rasante, colocación de respectivo acero refuerzo y fundición de tramo losa concreto de la cancha y aplicación de antisol.

ESTADO DEL TIEMPO. Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA.
Sub-contratista
Residente de obra
3 Iso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
2 Ayudantes

Arq Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA. Viernes, 24/01/2025
Se realiza fundicion de tramo losa concreto de la cancha

ESTADO DEL TIEMPO. Mañana y tarde soleada

Norma

Scanned with

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
7 Ayudantes

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Sábado, 25/01/2025
Se continua con la fundicion del día de ayer terminando así el tramo. Corte concreto segun diseño para dilatacción de paños

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista — Operador maquina cortadora concreto
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
7 Ayudantes

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Lunes, 27/01/2025
Se realizó fundicion de tramo loza concreto de la cancha

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Norma

Scanned with

Sub-contratista
Residente de Obra
5100
Almacenista
Maestro
1 Oficial
7 Ayudantes

Arq/Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Martes, 28/01/2025
Se realizo retiro y reubicacion de material de rio sobrante para fundicion de losa de la cancha.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
5100
Almacenista
Maestro
1 Oficial
2 Ayudantes

Arq/Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Miércoles, 29/01/2025
Se continua con retiro y reubicacion de material sobrante de rio para fundicion de losa concreto de la cancha

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Norma

Scanned with

Sub-contratista
Residente de obra
Sisa
Almacenista
Maestro
1 Oficial
2 Ayudantes

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA Jueves, 30/01/2025
Se realizó demolición de placa concreto existente para continuar con la excavación manual para construcción de cuneta.

ESTADO DEL TIEMPO Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA
Sub-contratista
Residente de obra
Sisa
Almacenista
Maestro
1 Oficial
2 Ayudantes

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA Viernes, 31/01/2025
Se continua con la excavación manual para construcción de cuneta.

ESTADO DEL TIEMPO Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA
Sub-contratista

Norma

Scanned with

Residente de Obra
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
2 Ayudantes

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Sábado, 01/02/2025
Se realiza relleno con material de rio para fundicion de solado cimentacion de cometa

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada

PERSONAL EN OBRA
Sub-contratista
Residente de Obra
SISO
Almacenista
Maestro
1 Oficial
2 Ayudantes

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Lunes, 03/02/2025
Se realizo corte y figurado de acero refuerzo, formaleteria y armado de acero refuerzo para fundicion losa cometa

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA
Sub-contratista
Norma

Scanned with

Residente de Obra
SISO
Almacenista
1 Oficial
3 Ayudantes

Arq / Residente de Obra — Residente Interventoría

FECHA: Martes, 04/02/2025
Formaleteria y fundicion de piso concreto para desagüe de aguas lluvias y reconstruccion de caja de inspeccion

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA
Sub-contratista
Residente de obra
SISO
Almacenista
1 Oficial
3 Ayudantes

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Miércoles, 05/02/2025
Carpintería en madera para fundicion de muros de concreto, encofrado de muro y fundicion del mismo

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA
Sub-contratista
Residente de Obra
SISO

Norma

Scanned with

Almacenista
1 Oficial
3 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoria

FECHA: Jueves, 06/02/2025
Corte y figurado y armado estructura acero refuerzo, encofrado y fundicion de piso conecta.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista
1 Oficial
3 Ayudantes

Arq. Residente Obra — Residente Interventoria

FECHA: Viernes, 07/02/2025
Se realizó carpintería en madera, encofrado para muro conecta y fundicion de la misma. Tambien se realiza corte, figurado de acero refuerzo y armado del mismo para fundicion de piso y muro.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista
Norma

Scanned with

1 Oficial
3 Ayudantes

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA Sábado, 08/02/2025
Fundicion de muro concreto para la conecta

ESTADO DEL TIEMPO. Mañana soleada

PERSONAL EN OBRA
Sub-contratista
Residente de obra
Viso
Almacenista
1 Oficial
3 Ayudantes

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA Lunes, 10/02/2025
Encofrado de muros conecta para fundicion de los mismos.

ESTADO DEL TIEMPO. Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA
Sub-contratista
Residente de obra
Viso
Almacenista
1 Oficial
3 Ayudantes

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

Scanned with

FECHA Martes, 11/02/2025

No se laboró el día de hoy por las fuertes lluvias generadas

Arq Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Miércoles, 12/02/2025

No se laboró hoy porque no llegó todo el personal citado a trabajar

Arq Residente Obra

Residente Interventoría

Scanned with

FECHA: Martes, 11/02/2025
No se laboró el día de hoy por las fuertes lluvias generadas

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Miércoles, 12/02/2025
No se laboró hoy porque no llegó todo el personal citado a trabajar

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 13/02/2025
No se laboró porque el personal no vino por problemas de inseguridad en la ciudad y el sector donde se realiza la obra.

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Lunes, 17/02/2025
Se realizó encofrado con formaleta en madera para fundición de muro concreto

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Sisa
Almacenista
1 Oficial
3 Ayudantes

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

Norma

FECHA: Martes, 18/02/2025
Se realizó encofrado en madera, instalación acero refuerzo y fundición de losa concreto cancha del perímetro de la zona mixta de un tramo. Aplicación de antisol.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
7 Ayudantes

Arq Residente Obra
Residente Interventoría

FECHA: Miercoles, 19/02/2025
Se realizó visita a campo por el personal de Indervalle, cuando al contratista se instaló acero refuerzo, fundición de tramo del perímetro de la cancha con su respectiva aplicación de antisol.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista
1 Oficial
7 Ayudantes
Maestro

Arq Residente Obra
Residente Interventoría

Norma
Scanned with

FECHA: Jueves, 20/02/2025

Se realizó relleno con material de rio para compactacion y nivelación de terreno para fundación. Fundicion de tramo del perimetro de la cancha con su respectivo acero refuerzo y aplicación de antisol.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista
Residente de obra
Sisso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
7 Ayudantes

Arq Residente Obra

Residente Interventoria

FECHA: Viernes, 21/02/2025

Se continua con la fundición del último tramo del perimetro de la cancha con su respectivo acero refuerzo y aplicación de antisol y toma muestra concreto

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista
Residente de obra
Sisso
Almacenista
Maestro
1 Oficial
7 Ayudantes

Arq Residente Obra

Residente Interventoria

Scanned with

FECHA: Sábado, 22/02/2025
Llega a la obra las platina para proceso de instalación, carpintería, encofrado en madera, y fundición de muro cuneta e instalación de caja para polo a tierra y fundición de tapas de cajas inspección

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada

PERSONAL EN OBRA
Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista
1 Oficial
3 Ayudantes

Arq Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Lunes, 24/02/2025
Se realiza limpieza de tornillos y retirada de guia de la platinas para estructura de cubierta.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada.

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Residente de obra
Siso
Almacenista
1 Oficial carpintería metálica.
1 Ayudante carpintería metálica.

Arq Residente Obra

Residente Interventoría

Norma

Scanned with

FECHA: Martes, 25/02/2025
Se continua con la retirada de las guias de las platinas y limpieza de los tornillos.
ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada
PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista (Estructura Metálica)
Residente de Obra
Almacenista
3 Soo
Oficial Carpintería metálica
Ayudante Carpintería metálica

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Miércoles, 26/02/2025
Continúa con retirada de guias de la platina, limpieza de tornillos, instalacción de platinas con su respectivas nivelaciones.
ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada
PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista (Estructura Metálica)
Residente de Obra
3 Soo
Almacenista
Ofic. Carp. Metálica
Ayudante Carp. Metálica

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 27/02/2025
Continúa con retiro de guias de la platina, limpieza de tornillos,

Norma
Scanned with

se realiza instalación de platinas para base de la estructura de la cubierta, se realiza pulida y aplicación de base prime, con la respectiva nivelación de la platina.

PERSONAL EN OBRA:
Sub-Contratista (Est. Metálica)
Residente de Obra
Siso
Almacenista
Ofi. carp. metálica.
Ayu. carp. metálica.

Arq. Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Viernes, 28/02/2025
Continuamos con instalación, nivelación, pulida y pintura base prime de las platinas.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-Contratista (Est. Metálica)
Residente Obra
Siso
Almacenista
Ofi. carp. metálica
Ayu. carp. metálica

Arq. Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Sábado, 01/03/2025
Se terminan las labores de instalación, nivelación, pulida y pintura base prime de las platinas.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista (Est. Metálica)
Residente de Obra
3100
Almacenista
Ofi. carp. metálica
Ayo. carp. metálica

Arq. Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Lunes, 03/03/2025
Se realiza en bodega corte con plasma de columnas - Vigas HEA 300.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA (BODEGA)
Sub-contratista estructura metálica
Almacenista
Ofi. carp metálica
2 Ayo. carp. metálica

Arq. Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Martes, 04/03/2025
Se continua con los trabajos en bodega de corte con plasma de Vigas HEA 300 para columnas de la estructura de cobierta.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA - BODEGA
Sub-Contratista estructura metálica

Norma

Scanned with

Almacenista
Ofi. carp. metálica
C. Ayu. carp. metálica

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Miércoles, 05/03/2025
Se realiza corte con plasma x de Vigas HEA 200 para riostras o cruz de san andrés.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA - BODEGA
Sub-contratista estructura metálica
Almacenista
Ofi. carp. metálica
C. Ayu. carp. metálica

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 06/03/2025
Se procede a realizar grateada con poliderás en vigas HEA 300 y 200.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA - BODEGA
Sub-contratista estructura metálica
Almacenista
Ofi carp. metálica
C. Ayu. carp. metálica

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

Norma

Scanned with

FECHA: Viernes, 07/03/2025

Se continua con granteado de vigas HEA 200 y 300 con polidoras y se procede a uniones de elementos con soldadura 6011 x 5/32 y 7018 x 5/32

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA: BODEGA:
Sub-contratista estructura metálica
Almacenista
Ofi. carp. metálica
6 Ayu. carp. metálica

Arq. Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Sábado, 08/03/2025

Se continua con uniones de elementos estructurales metálicos con soldadura 6011 x 5/32 y 7018 x 5/32.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA: BODEGA
Sub-contratista estructura metálica
Almacenista
Ofi. carp. metálica
6 Ayu. carp. metálica

Arq. Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Lunes, 10/03/2025

Se continua con uniones de elementos estructurales metálicos con soldadura 6011 x 5/32 y 7018 x 5/32.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

Norma

Scanned with

PERSONAL EN OBRA — BODEGA:
Sub-contratista estructura metálica
Almacenista
Ofi. carp. metálica
6 Ayu. carp. metálica

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Martes, 11/03/2025
Se realiza nuevamente grateado con pulidora, se procede a iniciar descontaminación de material soldado, se quitan oxidación y lavado con desengrasante industrial.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA — BODEGA:
Sub-contratista estructura metálica
Almacenista
Oficial carp. metálica
6 Ayu. carp. metálica

Arq Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Miercoles, 12/03/2025
Continuamos con grateado con pulidora, descontaminación de material soldado, retiro de oxidación y lavado con desengrasante industrial.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA — BODEGA:
Sub-contratista estructura metálica
Almacenista
Ofi. carp. metálica

Norma

Scanned with

6 Ayu. carp. metálica

Arq/Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 13/03/2025

Se inicia proceso de pintura base en general tipo prime 513.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA - BODEGA:

Sub-contratista estructura metálica

Almacenista

Ofi. carp. metálica

6 Ayu. carp. metálica

Arq Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Viernes, 14/03/2026

Continua con proceso de pintura base en general tipo prime 513.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA - BODEGA:

Sub-contratista estructura metálica

Almacenista

Ofi. carp. metálica

6 Ayu. carp. metálica

Arq Residente Obra

Residente Interventoría

Scanned with

FECHA: Sábado, 15/03/2025

Se continúa con pintura de elementos estructurales metálicos en general tipo prime 518.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada

PERSONAL EN OBRA - BODEGA:

Sub-contratista estructura metálica

Almacenista

Ofi. carp. metálica

6 Ayu. carp. metálica

Ing. Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Lunes, 17/03/2025

Se continua con pintura general en elementos estructural metálicos con pintura prime 518.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleado

PERSONAL EN OBRA-BODEGA:

Sub-contratista estructura metálica

Almacenista

Ofi. carp. metálica

6 Ayu carp metálica

Ing. Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Martes, 18/03/2025

Se continua con pintura general de elementos estructurales metálicos con pintura tipo prime 518.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

Scanned with

PERSONAL EN OBRA=BODEGA

Sub-contratista estructura metálica

Almacenista

Ofi carp. metálica

6 Ayd. carp. metálica

Arq Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Miércoles, 19/03/2025

Se realiza corte de perlines 220 mm x 90mm x 3.0mm se realizo ademas, unión de perlines existentes con soldadura 6011 x 1/8.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA=BODEGA

Sub-contratista estructura metálica

Almacenista

Ofi. carp. metálica

6 Ayd. carp. metálica

Arq Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 20/03/2025

Se realiza nuevamente unión de perlines existeo y nuevos con soldadura 6011 x 1/8

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA — BODEGA

Sub-contratista estructura metálica — Almacenista

Oficial carpintería metálica — 6 Ayudantes carp. metalica

Arq Residente Obra

Residente interventoría

Scanned with

FECHA: Viernes, 21/03/2025

Se realizan perforaciones de perlines para riostras y punta correas.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA/BODEGA:

Sub-contratista estructura metálica

Almacenista

Ofi. carp. metálica

6 Ayu. carp. metálica

Arq Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Sábado, 22/03/2025

Se realiza corte y armadura de riostras en angulo y se inicia con grateado con poli dora de perlines y de riostras en angulo.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA/BODEGA:

sub-contratista estructura metálica

Almacenista

Ofi. carp. metálica

6 Ayu. carp. metálica

Arq Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Lunes, 24/03/2025

Se realizo grateado con polidora, descontaminación de elementos estructurales como perlines y riostra con su respectivo lavado para quitar exido con desengrasante industrial.

Scanned with

ESTADO DEL TIEMPO Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA/BODEGA

Sub-contratista estructura metálica

Almacenista

Ofi. carp. metálica

6 Ayu. carp. metálica

Arq Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA Martes, 25/03/2025

Se realiza pintura general tipo prime sis en elementos estructurales como perlines y riostras. Todo la parte de estructuras metálicas se trabajó en bodega. Por otra parte se inicio con perforaciones para anclajes de varillas en viga existente del muro para malla contra impacto, anclaje de las varillas y construcción de muro en ladrillo estructural limpio.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA/BODEGA

Sub-contratista

Sub-contratista estructura metalica

Residente de Obra

Sisa

Almacenista

1 Oficial Obra

1 Ayudante Obra

Oficial carp metálica

6 Ayudantes carp metálica

Arq. Residente Obra

Residente Interventoría

Scanned with

FECHA: Miércoles, 26/03/2025

Se termina con la construcción de muro para la malla contra impacto, se realiza carpintería en madera para formaleta, posteriormente se inicia encofrado para columnetas en concreto del muro. En horas de la mañana llegan todos los elementos estructurales realizados en bodega a obra, de igual manera se procede a descargar cada elemento, posteriormente en la tarde se inicia con armado de cerchas metálicas existentes en obra.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleado

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista
Sub-contratista estructura metálica
Residente de Obra
SISO
Almacenista
Oficial de Obra
1 Ayudante de Obra
Oficial carp metálica
4 Ayudantes carp metálica
Operador de grua

Arq Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Jueves, 27/03/2025

Se continua con encofrado de formaleta en madera para columnetas, se inician las labores de replanteo de ejes para la estructura metálica en las placas base y se continua con armado en sitio de las cerchas existentes, posteriormente se procede con montaje de vigas HEA 300 para columnas, nivelación y unión con soldadura a platinas. Por otro lado se procede con montaje tubulares, nivelación del mismo, soldadura y fundición de columnetas en muros

Scanned with

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias moderadas mañana y tarde

PERSONAL EN OBRA

Sub-contratista

Sub-contratista estructura metálica

Residente de Obra

SISO

Almacenista

Oficial de obra

1 Ayudante de Obra

Oficial carp. metálica

4 Ayudantes carp. metálica

Operador de grua

Arq Residente Obra

Residente Interventoría

FECHA: Viernes, 28/03/2025

Se realiza descapote de columnetas y encofrado de vigas para muro de la malla contra impacto a la par se continua con el montaje de vigas HEA 800 para las columnas de la estructura de la cubierta con su respectiva soldadura y nivelación.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana con cielo despejado, tarde: lluviosa

PERSONAL EN OBRA

Sub-contratista

Sub-contratista estructura metálica

Residente de Obra

SISO

Almacenista

Oficial de Obra

1 Ayudante de Obra

Oficial carp. metálica

4 Ayudantes carp metálica

Operador de grua

Arq Residente Obra

Residente Interventoría

Scanned with

FECHA: Sábado, 29/03/2025

Se continua con encofrado para viga del muro para la malla contra impacto y armado acero refuerzo en sitio
Se procede con montaje de las 6 cerchas con sus respectivas platinas de apoyos y soldadura

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista
sub-contratista estructura metálica
Residente de Obra
Sisa
Almacenista
Oficial de obra
1 Ayudante de obra
Oficial carp metálica
4 Ayudantes carp metálica
Operador de grua

Ing. Residente Interventoría
Arq Residente Obra

FECHA: Lunes, 31/03/2025

Se continuo con armado de acero refuerzo en sitio para la viga del muro de la malla contra impacto y fundición de la misma. Por otro lado se realizo el montaje de la cerchas como vigas de amarres laterales en ambos lados de la estructura con sus respectivas platinas de apoyo y su soldadura.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana y tarde soleada

PERSONAL EN OBRA:

Sub-contratista
Sub-contratista estructura metálica

Scanned with

Residente de Obra
Sisa
Almacenista
Oficial de Obra
1 Ayudante de obra
Oficial carp metálica
4 Ayudantes carp. metálica
Operador de grua

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

FECHA: Martes, 01/04/2025

Se realiza formaleteria para nivelacion de pedestal y aplicacion de pintagrou, se realiza nivelacion de los pedestales, a la par, se procede con montaje de riostras superiores en angulos con su respectiva ubicacion, platinas de guia y apoyos y soldadura.

ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada, tarde lluviosa

PERSONAL EN OBRA:
Sub-contratista
Sub-contratista estructura metálica
Residente de obra
Sisa
Almacenista
Oficial de Obra
1 Ayudante de Obra
Oficial carp. metálica
4 Ayudantes carp metálica
Operador de grua

Arq. Residente Obra — Residente Interventoría

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO No. IND-23-5027 CONSTRUPACICOL S.A.S ZOMAC				ACTA DE AVANCE DE OBRA #5						
NUMERO DEL RP	NUMERO CDP	VALOR CONTRACTUAL	Objeto del Proyecto	ANTICIPO	ACTA 5	AMORT	NETO X PAGAR ACTA 5	SALDO AMORT ACTA 5	SALDO X PAGAR AL ACTA 5	NOTA
1123 22/12/2023 - 225 30/01/2025	1023 25/07/2023 - 225 30/01/2025	1.426.801.042	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"		224.977.791		224.977.791		546.543.491	LA AFECTACION DEL ACTA #5 DEBE REALIZARSE POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL 225 01/30/2025 (SGR)
424 03/12/2024 525 30/01/2025	924 31/10/2025 - 525 30/01/2025	44.358.903			30.471.724		30.471.724		13.887.179	LA AFECTACION DEL ACTA #5 DEBE REALIZARSE POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL 525 30/01/2025 (SGR)
19008 03/12/2024	6246 31/10/2024	396.739.850				-		-		
TOTALES		1.867.899.795			255.449.515	-	255.449.515	-	560.430.670	

ELABORÓ: ANGELA MARIA GIL/CONTRATISTA PROFESIONAL	ANGELA MARIA GIL
APROBÓ: NICOLAS TRIANA CASTILLO/SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
REVISÓ: MARIA ANGELICA SALAZAR RAMIREZ/CONTRATISTA PROFESIONAL	
REVISÓ: MAY STIVEN PARAMO/CONTRATISTA PROFESIONAL	

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACTA DE EJECUCIÓN DE OBRA	CÓDIGO:	PM-FO-600-013
		VERSIÓN:	3
		APROBACIÓN:	18/OCT/23

ACTA No.	5		FECHA DEL ACTA	1 DE ABRIL DE 2025	PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 09 DE MAYO DE 2025
CONTRATO No.	IND-23-5027					
OBJETO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"					
CONTRATISTA	CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC			NIT - CC	901526894-4	CDPs: No. 1023 del 25-07-2023 SGR / 924 del 31-10-2024 SGR / 6246 del 31-10-2024 RECURSOS PROPIOS / 225 y 525 del 30-01-2025 SGR
INTERVENTOR Y/O	CONSORCIO GRUPO 3 JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ			NIT - CC	901769200-8	RPC: No. 1163 del 22-12-2023 SGR / 424 del 03-10-2024 SGR / 19008 del 03-12-2024 RECURSOS PROPIOS / 225 y 525 del 30-01-2025 SGR

PERÍODO A PAGAR: DEL 01 DE FEBRERO AL 1 DE ABRIL DE 2025

Mediante el presente documento INDERVALLE, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR, dejan constancia de las actividades ejecutadas por el contratista en las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNID	CONTRATO. CONDICIONES ACTUALIZADAS				CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD INICIAL CONTRATADA	CANTIDAD ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE BALANCE No. 2	VALOR UNITARIO $	VALOR TOTAL $	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR $	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL $	CANT	VALOR $
1	PRELIMINARES													
1.1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	666,81	666,76	4.390	2.927.076,00	666,76		666,76	2.927.076	-	2.927.076	-	-
1.1.2	EXCAVACION MANUAL TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	35,55	30,06	21.850	656.811,00	30,06		30,06	656.811	-	656.811	-	-
1.1.3	DEMOL. CONCRETO REFORZADO	M3	0,88	1,44	177.170	255.125,00	1,44		1,44	255.125	-	255.125	-	-
1.1.4	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	37,93	40,95	19.780	809.991,00	40,95		40,95	809.991	-	809.991	-	-
1.1.5	PODA DE ARBOLES	UND	1,00	1,00	126.280	126.280,00			-	-	-	-	1,00	126.280,00
1.1.6	DESMONTE JUEGO	UND	2,00	2,00	53.270	106.540,00	2,00		2,00	106.540	-	106.540	-	-
					SUBTOTAL CAP. 1,1 PRELIMINARES:	4.881.823,00				4.755.543	-	4.755.543		126.280
1,2	CIMENTACION													
1.2.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	25,91	50,84	21.850	1.110.864,00	50,84		50,84	1.110.864	-	1.110.864	-	-
1.2.2	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	64,56	66,09	19.780	1.307.293,00	66,09		66,09	1.307.296	-	1.307.296	-	-
1.2.3	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	38,00	37,00	27.600	1.021.200,00	37,00		37,00	1.021.200	-	1.021.200	-	-
1.2.4	PILOTE CONCRETO REFORZADO	M3	23,75	23,75	630.870	14.983.440,00	23,75		23,75	14.983.440	-	14.983.440	-	-
1.2.5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	4.141,87	3.932,45	6.200	24.381.207,00	3.932,45		3 932,45	24.381.207	-	24.381.207	-	-
1.2.6	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	6,00	6,00	491.180	2.947.080,00	6,00		6,00	2.947.080	-	2.947.080	-	-
1.2.7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	402,28	401,76	6.200	2.490.912,00	401,76		401,76	2.490 912	-	2.490.912	-	-
1.2.8	VIGA CIMIENTO ENLACE 4000 PSI 28.0MPA	M3	13,00	13,00	865.180	11.247.340,00	13,00		13,00	11.247.340	-	11.247.340	-	-
1.2.9	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	1.802,64	1.795,60	6.200	11.132.720,00	1.795,60		1.795,60	11.132.720	-	11.132.720	-	-
1.2.10	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	6,29	6,14	551.830	3.390.444,00	6,14		6,14	3.390.444	-	3.390.444	-	-
1.2.11	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	2.211,28	2.853,02	6.200	17.688.749,00	2.853,02		2.853,02	17.688.749	-	17.688.749	-	-
1.2.12	SIKAGROUT PARA ANCLAJES	KG	731,86	614,40	29.540	18.149.376,00	-		-	-	-	-	614,40	18.149.376,00
					SUBTOTAL CAP. 1,2 CIMENTACION:	109.850.625,00				91.701.252	-	91.701.252		18.149.376
1,3	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA													
1.3.1	ACERO ESTRUCTURAL	KLS	30.550,40	30.423,53	17.260	525.110.054,00	18.995,01	7.407,18	26.402,20	327.853.942	127.847.989,84	455.701.932	4.021,33	69.408.121,84
					SUBTOTAL CAP. 1,3 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA:	525.110.054,00				327.853.942	127.847.990	455.701.932		69.408.122
1,4	CUBIERTA													
1.4.1	TEJA TERMOACUSTICA UPVC	KLS	607,21	607,52	79.540	48.322.340,00			-	-	-	-	607,52	48.322.339,65

					SUBTOTAL CAP. 1,3 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA:	48.322.340,00				-	-	-		48.322.340
2	CANCHA MULTIPLE													
2,1	GEOTEXTIL REPAV 450	M2	544,14	-	5.340	-			-	-	-	-	-	-
2,2	CARPETA ASFALTICA [ST]	M3	27,64		673.200	-			-	-	-	-	-	-
2,3	IMPRIMACION	M2	544,14	-	3.180	-			-	-	-	-	-	-
2,4	ACARREO ASFALTO VOLUMEN COMPCTADO	M3K	3.317,08	-	1.920				-	-	-	-	-	-
2,5	TRANSPORTE DE EQUIPO 31KM A 50 KM	T/K	6.000,00		1.090	-			-	-	-	-	-	-
2,6	LINEA DEMARCACION ACRILICA A=12CM	ML	345,39	345,02	2.530	872.888,00			-	-	-	-	345,02	872.888,48
2,7	PORTERIA MULT.FIJA MICROF. BALONC.TIPO 2 SIN CONCRE	JGO	1,00	1,00	5.915.850	5.915.850,00			-	-	-	-	1,00	5.915.850,00
2,8	SOPORTE PARA VOLEIBOL TRES POSICIONES + TUBO AUX	JGO	1,00	1,00	1.212.600	1.212.600,00			-	-	-	-	1,00	1.212.600,00
	ITEMS ADICIONALES					-			-	-	-	-	-	-
2.9 (1.1.3)	DEMOL. CONCRETO REFORZADO	M3		63,60	177.170	11.268.012,00	63,60		63,60	11.268.012	-	11.268.012	-	-
2.10 (1.2.1)	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3		362,52	21.850	7.921.062,00	362,52		362,52	7.921.062	-	7.921.062	-	-
2.11 (1,2,2)	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3		547,33	19.780	10.826.108,00	547,33		547,33	10.826.108	-	10.826.108	-	-
2.12 (5.2.5)	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3		267,12	31.670	8.459.690,00	267,12		267,12	8.459.690	-	8.459.690	-	-
2.13 (1.2.11)	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS		461,44	6.200	2.860.928,00	461,44		461,44	2.860.928	-	2.860.928	-	-
2.14 (4,5)	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS		1.590,00	7.910	12.578.900,00	1.590,00		1.590,00	12.578.900	-	12.578.900	-	-
2.15 (INP 001)	LOSA CONCRE.CANCHA MULTIP E=12CM 3500PSI	M2		636,00	120.998	76.954.728,00	636,00		636,00	76.954.728	-	76.954.728	-	-
2.16 (INP 002)	REVESTIMIENTO ACRILICO SOBRE PISO EN CONCRETO	M2		636,00	125.640	79.907.040,00	-		-	-	-	-	636,00	79.907.040,00
2.17 (INP 003)	TIERRA PARA SIEMBRA Y NIVELACION	M3		44,52	71.848	3.198.673,00	-		-	-	-	-	44,52	3.198.672,96
2.18 (INP 004)	S.E.I. PRADO TRENZA. INCLUYE RIEGO DE PRENDIMIENTO	M2		445,20	43.238	19.249.558,00	-		-	-	-	-	445,20	19.249.557,60
2.19 (2,14)	ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT	M3K		14.882,40	1.990	29.615.976,00	14.882,40		14.882,40	29 615.976	-	29.615.976	-	-
2.20 (INP 005)	GAVION DE CONTENCION DE ESTRUCTURA CANCHA MUL	M3		8,00	327.890	2.623.120,00	8,00		8,00	2.623.120	-	2.623.120	-	-
2.21 (INP 006)	SUB-BASE COMP.MAT.SELECC.	M3		95,40	83.743,00	7.989.082,00	47,70	47,70	95,40	3.994.541	3.994.541,10	7.989.082	-	-
2.22 (INP 007)	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOCELDA PARA MEJOR	M2		636,00	52.583,00	33.442.788,00	318,00	318,00	636,00	16.721.394	16.721.394,00	33.442.788	-	-
					SUBTOTAL CAP. 2 CANCHA MULTIPLE:	314.895.003,00				183.822.460	20.715.935	204.538.395		110.356.609
3,00	PANTALLAS DE PROTECCIÓN													
3,1	PRELIMINARES													
3.1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	ML	25,90	25,91	2.210	57.266,00	25,91		25,91	57.266	-	57.266	-	-
					SUBTOTAL CAP. 3,1 PRELIMINARES:	57.266,00				57.266	-	57.266		-
3,2	MOVIMIENTOS DE TIERRRA													
3.2.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	1,99	6,42	21.850	140.336,00	6,42		6,42	140.336	-	140.336	-	-
3.2.2	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	5,95	7,60	19.780	150.240,00	7,60		7,60	150.240	-	150.240	-	-
					SUBTOTAL CAP. 3,2 MOVIMIENTOS DE TIERRRA:	290.576,00				290.576	-	290.576		-
3,3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA													
3.3.1	SOLADO ESPESOR E=0 05M 3000 PSI 210 MPA	M2	9,26	9,77	27.600	269.751,00	9,77		9,77	269.751	-	269.751	-	-
3.3.2	VIGA CIMIENTO ENLACE 4000 PSI 28.0MPA	M3	3,71	2,20	865.180	1.904.227,00	2,20		2,20	1.904.227	-	1.904.227	-	-
3.3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	207,40	206,94	6.200	1.283.028,00	206,94		206,94	1.283.028	-	1.283.028	-	-
3.3.4	PILOTE CONCRETO REFORZADO	M3	3,96	2,51	630 870	1.585.549,00	2,51		2,51	1.585.549	-	1.585.549	-	-
3.3.5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	615,96	364,59	6.200	2.260.451,00	364,59		364,59	2.260.451	-	2.260.451	-	-
3.3 6	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	0,50	0,26	551.830	141.268,00	-	0,26	0,26	-	141.268,48	141.268	-	-
3.3.7	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	0,60	0,80	491.180	392.944,00	0,80		0,80	392.944	-	392.944	-	-
3.3.8	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	104,40	49,22	6 200	305.139,00	49,22		49,22	305.139	-	305.139	-	-
					SUBTOTAL CAP. 3,3 CIMENTACION Y ESTRUCTURA:	8.142.357,00				8.001.089	141.268	8.142.357		-

3,4	**MAMPOSTERIA**														
3.4.1	MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C	M2	9,26	9,60	61.250	588.288,00		9,60	9,60	-	588.288,00	588.288	-	-
3.4.2	CINTA CONFINAMIENTO MURO	ML	23,16	25,50	28.330	722.415,00		25,50	25,50	-	722.415,00	722.415	-	-
3.4.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	31,82	40,70	6.200	252.328,00		40,70	40,70	-	252.327,60	252.328	-	-
					SUBTOTAL CAP. 3,4 MAMPOSTERIA:	**1.563.031,00**				-	**1.563.031**	**1.563.031**		-
3,5	**MALLA**														
3.5.1	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"	M2	102,32	102,40	29.450	3.015.680,00			-	-	-	-	102,40	3.015.680,00
3.5.2	POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13	ML	119,44	143,70	30.950	4.447.515,00		67,20	67,20	-	2.079.840,00	2.079.840	76,50	2.367.675,00
3.5.3	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 1,1/2"	ML	112,64	34,08	16.640	567.091,00			-	-	-	-	34,08	567.091,20
3.5.4	ANGULO HIERRO 1 1/2"X3/16"	ML	25,58	25,50	19.980	509.490,00			-	-	-	-	25,50	509.490,00
					SUBTOTAL CAP. 3,5 MALLA:	**8.539.776,00**				-	**2.079.840**	**2.079.840**		**8.459.936**
4	**ANDENES**														
4,1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	7,91	8,06	21.850	176.029,00			-	-	-	-	8,06	176.029,06
4,2	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	7,91	10,47	19.780	207.158,00			-	-	-	-	10,47	207.158,41
4,3	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	M3	6,32	6,45	29.990	193.286,00			-	-	-	-	6,45	193.285,55
4,4	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	26,16	30,94	68.220	2.110.454,00			-	-	-	-	30,94	2.110.453,92
4,5	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	50,70	61,87	7.910	489.408,00			-	-	-	-	61,87	489.407,52
4,6	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	5,46	30,94	27.600	853.834,00			-	-	-	-	30,94	853.833,60
4,7	CORDON CONCRETO 3100 PSI	M3	1,09	1,55	1.039.620	1.608.084,00			-	-	-	-	1,55	1.608.084,22
4,8	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	135,23	135,13	6.200	837.829,00			-	-	-	-	135,13	837.828,94
4,9	ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT	M3K	78,42	216,55	1.990	430.938,00			-	-	-	-	216,55	430.938,48
					SUBTOTAL CAP. 4 ANDENES:	**6.907.020,00**				-	-	-		**6.907.020**
5,00	DRENAJE PLUVIAL														
5,1	**PRELIMINARES**														
5.1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	133,65	127,50	2.070	263.925,00	133,65	- 6,15	127,50	276.656	- 12.730,50	263.925	-	-
					SUBTOTAL CAP. 5,1 PRELIMINARES:	**263.925,00**				**276.656**	**-12.731**	**263.925**		-
5,2	**MOVIMIENTOS TIERRA, DEMOLICIONES Y RELLENOS**														
5.2.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	76,26	120,46	21.850	2.631.993,00	120,46		120,46	2 631.993	-	2.631.993	-	-
5.2.2	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	76,26	156,59	19.780	3.097.441,00	156,59		156,59	3.097.441	-	3.097.441	-	-
5.2.3	RELLENO ARENA MEDIANA (ST)	M3	2,40	3,99	75.050	299.450,00	4,01	0,02	3,99	300.608	- 1.158,02	299.450	-	-
5.2.4	RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO COMPACTAD	M3	4,16	12,02	98.470	1.183.117,00	12,01		12,01	1.183.115	-	1.183.115	0,00	2,00
5.2.5	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	33,52	34,04	31.670	1.078.125,00	34,04		34,04	1.078.125	-	1.078.125	-	-
5.2.6	RELLENO TIERRA-NIVELACION	M3	3,09	8,01	26.370	211.224,00	8,01		8,01	211.131	-	211.131	0,00	92,29
5.2.7	ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT	M3K	535,46	688,27	1.990	1.369 667,00	688,28	- 0,00	688,27	1.369.666	- 0,70	1.369.666	-	-
					SUBTOTAL CAP. 5,2 MOVIMIENTOS TIERRA, DEMOLICIONES Y RELLENOS:	**9.871.018,00**				**9.872.079**	**-1.159**	**9.870.920**		**94**
5,3	**FILTRO**														
5.3.1	GRAVA TRITURAD DE 1/2"	M3	1,73	1,84	87.010	160.142,00	1,84		1,84	160.142	-	160.142	-	-
5.3.2	GRAVA TRITURAD DE 1"	M3	1,73	1,84	69.340	127.620,00	1,84		1,84	127.620	-	127.620	-	-
5.3.3	GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	28,35	32,72	5.340	174.725,00	32,72		32,72	174.725	-	174.725	-	-
5.3.4	TUB.PVC 6 DREN.SF NOVAFOR	ML	20,45	20,45	51.680	1.056.856,00	20,45		20,45	1.056 856	-	1 056 856	-	-
					SUBTOTAL CAP. 5,3 FILTRO:	**1.519.343,00**				**1.519.343**	-	**1.519.343**		-

5,4	DRENAJE PLUVIAL														
5.4.1	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	1,00	1,00	340.150	340.150,00	1,00		1,00	340.150	-	340.150	-	-	
5.4.2	CAJA INSPECCIÓN 100X100 CM [CONCRETO]	UND	1,00	1,00	504.070	504.070,00	1,00		1,00	504.070	-	504.070	-	-	
5.4.3	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	UND	1,00	1,00	406.850	406.850,00	1,00		1,00	406.850	-	406.850	-	-	
5.4.4	CAJA INSPECCION 120x120 CM [CONCRETO]	UND	1,00	1,00	794.450	794.450,00	1,00		1,00	794.450	-	794.450	-	-	
5.4.5	CAJA INSPECCION 175x 80 CM DOM[CONCRETO]	UND	1,00	1,00	997.970	997.970,00	-		-	-	-	-	1,00	997.970,00	
5.4.6	CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.01-2.50 MTS	UND	1,00	1,00	1.930.280	1.930.280,00	1,00		1,00	1.930.280	-	1.930.280	-	-	
5.4.7	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	30,65	30,65	27.600	845.940,00	30,65		30,65	845.940	-	845.940	-	-	
5.4.8	CANAL CONCRETO PISO 50x25x08 CM DOBLE	ML	61,30	61,30	93.150	5.710.095,00	-	30,65	30,65	-	2.855.047,50	2.855.048	30,65	2.855.047,50	
5.4.9	TAPA CANAL CONCRETO PERFORADA PREF. ESP:8CM	UND	103,00	103,00	52.800	5.438.400,00	-		-	-	-	-	103,00	5.438.400,00	
5.4.10	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	273,56	518,40	6.200	3.214.082,00	-	272,54	272,54	-	1.689.744,28	1.689.744	245,86	1.524.338,20	
5.4.11	DESCOLMATACION CUNETAS,ZANJAS,DESCOLES (MANUA	ML	6,04	32,00	2.440	78.080,00	32,00		32,00	78.080	-	78.080	-	-	
5.4.12	TUBERIA PVC 4 RDE 21 - 200 PSI	ML	111,24	111,24	92.360	10.274.126,00			-	-	-	-	111,24	10.274.126,40	
5.4.13	TUB PVC NOVAFORT 8"	ML	1,14	1,14	77.250	88.065,00	1,14		1,14	88.065	-	88.065	-	-	
5.4.14	TUB PVC NOVAFORT 10"	ML	20,58	20,58	83.890	1.726.456,00	20,58		20,58	1.726.456	-	1.726.456	-	-	
5.4.15	TUB PVC NOVAFORT 12"	ML	24,31	24,31	164.460	3.998.023,00	24,31		24,31	3.998.023	-	3.998.023	-	-	
5.4.16	CODO PVC-UM 4 x 90	UND	36,00	36,00	113.210	4.075.560,00	-		-	-	-	-	36,00	4.075.560,00	
5.4.17	TRAGANTE LOSA TCI 4 ATRAPA MANTO-ALUM	UND	12,00	12,00	376.500	4.518.000,00	-		-	-	-	-	12,00	4.518.000,00	
5.4.18	ABRAZADERA SANITARIA 4"	UND	48,00	48,00	20.750	996.000,00	-		-	-	-	-	48,00	996.000,00	
5.4.19	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	60,60	61,00	98.660	6.018.260,00	-		-	-	-	-	61,00	6.018.260,00	
5.4.20	VÁLVULA ANTIRRETORNO PVC DE 300 MM, CLAPETA DE POLIPROPILENO, JUNTA LABIADA Y REGISTRO SUPERIOR	UND	1,00	1,00	2.595.090	2.595.090,00	-		-	-	-	-	1,00	2.595.090,00	
5.4.21	EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	27,00	13,00	120.250	1.563.250,00	27,00	14,00	13,00	3.246.750	- 1.683.500,00	1.563.250	-	-	
5.4.22	BATEA EN CONCRETO 3000 PSI	M3	2,11	2,14	523.130	1.116.883,00	2,14		2,14	1.116.883	-	1.116.883	-	-	
				SUBTOTAL CAP. 5,4 DRENAJE PLUVIAL:		57.230.080,00				15.075.998	2.881.292	17.937.288		39.292.792	
6	SISTEMA DE ILUMINACION														
6,1	EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	7,20	7,20	21.850	157.320,00		0,75	0,75	-	16.387,50	16.388	6,45	140.932,50	
6,2	ACOM.E.3F(3# 6+1# 8) 2"	ML	36,00	36,00	80.610	2.901.960,00			-	-	-	-	36,00	2.901.960,00	
6,3	CAPACETE GALV 2	UND	1,00	1,00	14.280	14.280,00			-	-	-	-	1,00	14.280,00	
6,4	CURVA PVC 2	ML	1,00	1,00	23.690	23.690,00			-	-	-	-	1,00	23.690,00	
6,5	TUBO GALV 2 X3 MTS	UND	2,00	2,00	109.510	219.020,00			-	-	-	-	2,00	219.020,00	
6,6	CONTADOR 3F-TRIFASICO 120/208V M.DIRECTA	UND	1,00	1,00	633.630	633.630,00			-	-	-	-	1,00	633.630,00	
6,7	CAJA CONTADOR 3F POLICARB C/PORTABREAKER	UND	1,00	1,00	154.770	154.770,00			-	-	-	-	1,00	154.770,00	
6,8	CAJA ELECTRICA 0,6 X 0,6 X 1 MT	UND	2,00	2,00	438.928	877.856,00			-	-	-	-	2,00	877.856,00	
6,9	MALLA A TIERRA 3 VARILLAS-PERNADA	UND	1,00	1,00	1.154.310	1.154.310,00			-	-	-	-	1,00	1.154.310,00	
6,10	TABLERO DE BAJA TENSION ILUMINACIÓN 220 V	UND	1,00	1,00	1.889.190	1.889.190,00			-	-	-	-	1,00	1.889.190,00	
6,11	ACOM.E.3F(3# 10+1#10) 1" EMT"	ML	70,00	70,00	38.510	2.695.700,00			-	-	-	-	70,00	2.695.700,00	
6,12	SAL LAMP EMT	UND	12,00	12,00	97.970	1.175.640,00			-	-	-	-	12,00	1.175.640,00	
6,13	LUMINARIA LED 150 W 13074 LUMENS INDUSTRIAL	UND	12,00	12,00	1.697.530	20.370.360,00			-	-	-	-	12,00	20.370.360,00	
6,14	PUNTA CAPTORA ACERO GAL	UND	12,00	12,00	87.300	1.047.600,00			-	-	-	-	12,00	1.047.600,00	
6,15	CONECTOR PARALELO BIMETALICO	UND	6,00	6,00	39.970	239.820,00			-	-	-	-	6,00	239.820,00	
6,16	CAJA RAWELT 3/4"	UND	6,00	6,00	22.540	135.240,00			-	-	-	-	6,00	135.240,00	
6,17	GRAPA SUJECION PUNTA CAPTORA	UND	12,00	12,00	40.930	491.160,00			-	-	-	-	12,00	491.160,00	
6,18	GRAPA CRUCE CABLE -PUNTA CAPTORA	UND	12,00	12,00	53.360	640.320,00			-	-	-	-	12,00	640.320,00	
6,19	GRAPA SOPORTE BAJANTE	UND	40,00	40,00	35.870	1.434.800,00			-	-	-	-	40,00	1.434.800,00	
6,20	MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE	UND	1,00	1,00	271.690	271.690,00			-	-	-	-	1,00	271.690,00	
6,21	MOLDE SOLDADURA CABLE-CABLE (1/0 A 4/0)	UND	1,00	1,00	271.690	271.690,00			-	-	-	-	1,00	271.690,00	

6,22	SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM	UND	16,00	16,00	29.160	466.560,00			-	-	-	-	16,00	466.560,00
6,23	ALAMBRON DE ALUMINIO DE 8 MM	ML	242,00	242,00	16.670	4.034.140,00			-	-	-	-	242,00	4.034.140,00
6,24	VARILLA CU-CU 9/16X 2.40	UND	6,00	6,00	190.140	1.140.840,00			-	-	-	-	6,00	1.140.840,00
6,25	CAJA ELECTRICA 0,3 X 0,3 X 0,5 MT + TAPA	UND	6,00	6,00	162.530	975.180,00		6,00	6,00	-	975.180,00	975.180	-	-
					SUBTOTAL CAP. 6 SISTEMA DE ILUMINACION:	43.416.766,00				-	991.568	991.568		42.425.199
7	ASEO Y LIMPIEZA													
7,1	LIMPIEZA GENERAL	M2	544,14	585,00	2.070	1.210.950,00			-	-	-	-	585,00	1.210.950,00
8	INCREMENTO POR TRANSPORTE Y GRADO DE DIFICULTAD (6% PARA L		0,06	0,06		68.524.317,00				38.593.572	9.371.222,02	47.964.794		20.559.522,86
9	ICOCIV (Construcción de obras civiles) - estimada por el DANE, s	%	0,14	0,14		162.859.460,00				91.724.056	22.272.271,00	113.996.327		48.863.132,59
					SUBTOTAL CAP. 7 ASEO Y LIMPIEZA:	232.594.728,00				130.317.629	31.643.493	161.961.122		70.633.605

	SUBTOTAL CAP. P2 ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA:	1.373.455.731				773.543.831	187.830.526	961.374.357		412.081.374

	COSTOS INDIRECTOS									
	VALOR COSTOS DIRECTOS		1.373.455.731				773.543.831	187.830.526	961.374.357	-	412.081.374,00
	ADMINISTRACION	29%	398.302.162				224.327.710	54.470.853	278.798.563		119.503.599,00
	IMPREVISTOS	1%	13.734.557				7.735.439	1.878.305	9.613.744	-	4.120.814,00
	UTILIDAD	5%	82.407.344				46.412.630	11.269.831	57.682.461	-	24.724.883,00
	TOTAL AIU	35%	494.444.064				278.475.779	67.618.989	346.094.768	-	148.349.296,00
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	0%						-	-	-	-
	COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS		1.867.899.795				1.052.019.610	255.449.515	1.307.469.125	-	560.430.670

AMORTIZACION ANITICIPO								
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA								

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	1.426.801.042,00			V/R ANTICIPO:		-
V/R ADICIONES:	441.098.753			% ANTICIPO :		-
V/R ACTUAL CONTRATO:	1.867.899.795			% RETEGARANTIA :		-

NO.	DESCRIPCIÓN ACTAS PARCIALES	FECHA	VALOR ACTA	AMORTIZACIÓ	RETENCIÓN GARANTÍA	ACUMULADO AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR ACUMULADO ACTAS
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	11/03/24	172.520.031	0	0	0	0	172.520.031
2	ACTA PARCIAL DE OBRA No 2	11/05/24	300.060.416	0	0	0	0	472.580.447
3	ACTA PARCIAL DE OBRA No 3	02/12/24	182.699.313	0	0	0	0	655.279.760
4	ACTA PARCIAL DE OBRA No 4	10/12/24	398.739.850	0	0	0	0	1.052.019.610
5	ACTA PARCIAL DE OBRA No 5	01/04/25	255.449.515	0	0	0	0	1.307.469.125
								-
TOTALES			1.307.469.125	0	0	0	0	1.307.469.125

El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales por parte del contratista

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la interventoría y/o supervisión y el contratista realizan las mediciones en campo y de las revisiones efectuadas por la interventoría.

La presente acta no exime al contratista de reparar, y/o enmendar las obras aquí contempladas o resarcir los daños por causas que le sean imputadas al contratista y queda sujeta en un todo a la liquidación del contrato.

EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

EL INTERVENTOR:
Firma:
Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ
REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

VB. INDERVALLE
Firma:
Nombre: JUAN CARLOS RUEDA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

Distrito Santiago de Cali, Abril 01 de 2025 CG3B-067-2025

Arquitecto
JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
Supervisor Contrato de Interventoría No. IND – 23 - 4484
Instituto del Deporte, la Educación Física y La Recreación
INDERVALLE
La Ciudad

Referencia: Contrato de obra **IND-23-5027**, cuyo objeto es: " CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES GRUPO 2 FRENTE 1: ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "

Asunto: Acta de Obra No. 05

CONTRATO No.	IND – 23 - 5027
FECHA DEL CONTRATO:	DICIEMBRE 2023
OBJETO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES GRUPO 2 FRENTE 1: ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FISICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE
CONTRATISTA:	CONSTRUPACICOL S.A. S ZOMAC - NIT 901.526.894-4 Representante Legal BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
INTERVENTOR:	CONSORCIO GRUPO 3 - NIT. 901.769.200-6 Representante Legal JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ
VALOR CONTRATO:	$ 1.426. 801.042.oo – INCLUIDO AIU (MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.)
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	$ 172.520.031.oo
VALOR ACTA PARCIAL No. 02	$ 300.060.416.oo
VALOR ACTA PARCIAL No. 03	$ 182.699.313.oo
VALOR ACTA PARCIAL No. 04	$ 396.739.850.oo
VALOR ACTA PARCIAL No. 05	$ 255.449.515.oo
FECHA ACTA DE INICIO:	28/12/2023
VALOR ADICIONADO SEGUN OTROSI No.02:	$ 441.098.753.oo

VALOR TOTAL:	$ 1.867.899.795.oo – INCLUIDO AIU (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE.)
FECHA DE SUSPENSION No. 01:	14 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION No. 01:	22 DE JULIO DE 2024
FECHA DE REINICIÓ No.01:	23 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE SUSPENSION No. 02:	26 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION No. 02:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIÓ No.02:	15 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSION No. 03:	23 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE REINICIÓ No.03:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
PRORROGA SEGUN OTROSI No. 02	HASTA EL 09 DE MAYO DE 2025
PORCENTAJE ACUMULADO EJECUTADO:	70.0 %

En el Distrito de Santiago de Cali, el día 01 de Abril de 2025, en la oficina de la interventoría, se reunieron: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1006.166.501, en calidad de Representante Legal del **CONSTRUPACICOL S.A.S ZOMAC** NIT. 901. 526.894-4, como contratista y JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.700.426 en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO GRUPO 3** NIT. 901.769.200-6, como Interventor del Contrato No. IND – 23 - 5027, con el propósito de elaborar y suscribir la presente acta, en los siguientes términos:

En mi calidad de interventor del Contrato No. IND – 23 - 5027, manifiesto que he recibido por parte del Contratista y a entera satisfacción, el resultado en la obra realizada en el frente de obra que hace parte del Contrato:

FOTO No. 01	DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION MURO DE PANTALLA DE PROTECCION

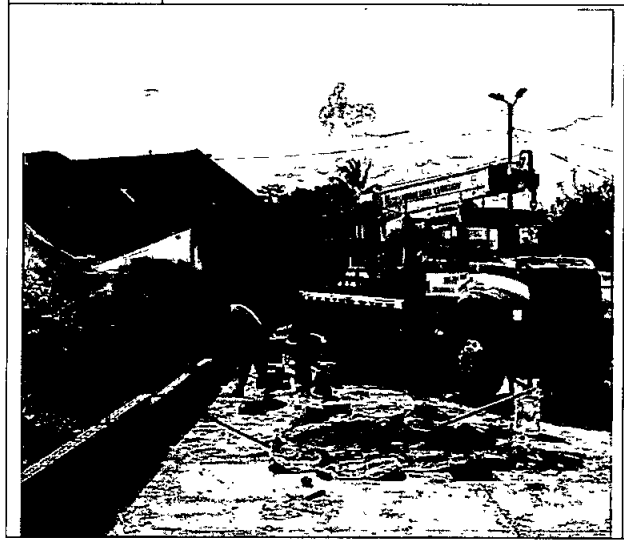

FOTO No. 02	DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION COLUMNAS DE PANTALLA DE PROTECCION

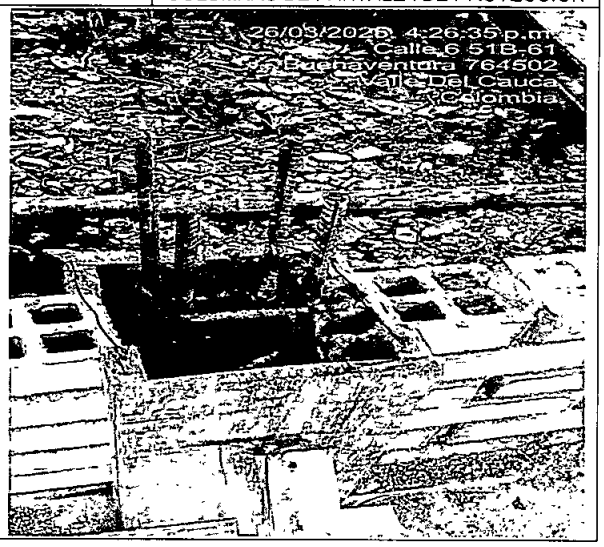

FOTO No. 03	DESCRIPCIÓN: INSTALACION TUBERIA GALVANIZADA PANTALLA DE PROTECCION

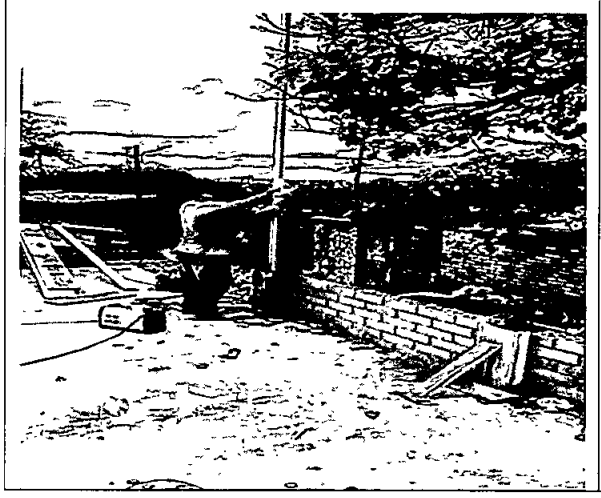

FOTO No. 04	DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION CANAL EN CONCRETO PERIMETRAL.

CALLE 18 N # 3N-70
OFICINA 401
EDIFICIO NOYRA
CALI-COLOMBIA

consorciogrupo3@gmail.com
cardenascivil99@gmail.com

301-2759200; 316-4918891, 602 668 55 24

FOTO No. 05	DESCRIPCIÓN: ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA.	FOTO No. 06	DESCRIPCIÓN: ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA.

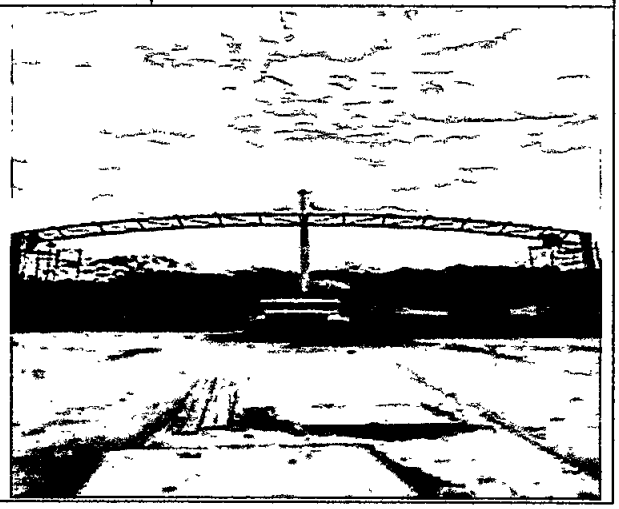

FOTO No. 07	DESCRIPCIÓN: ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA.	FOTO No. 08	DESCRIPCIÓN: ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA.

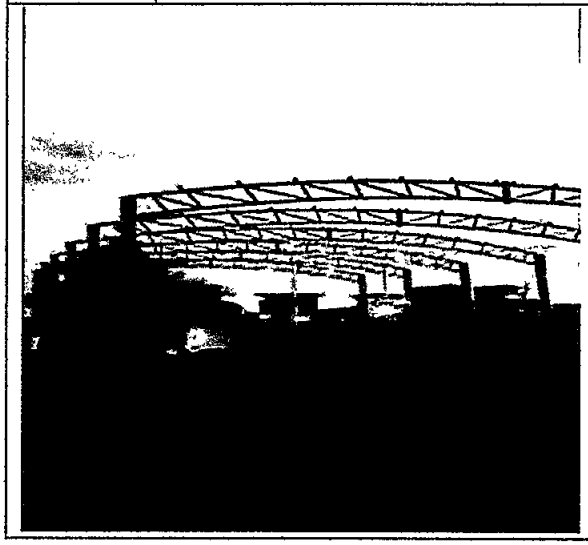

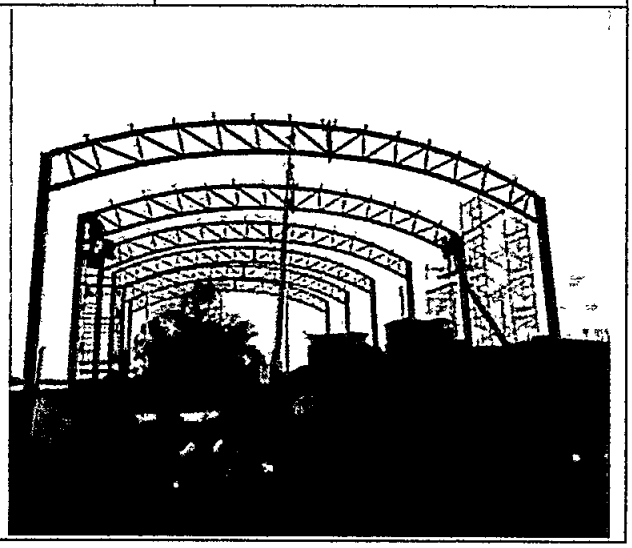

El detalle de liquidación de la presente acta parcial se encuentra en el paquete de informe del contratista y en el acta de avance de obra.

Que el Contratista ha entregado los informes de avance correspondientes, y se encuentra al día con los mismos.

EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRA:

ACTA	FECHA ACTA	VALOR DEL ACTA	VALOR ACUMULADO
ACTA 1	11/03/2024	$ 172.520.031.oo	$ 172.520.031.oo
ACTA 2	11/05/2024	$ 300.060.416.oo	$ 472.580.447.oo
ACTA 3	02/12/2024	$ 182.699.313.oo	$ 655.279.760.oo
ACTA 4	10/12/2024	$ 396.739.850.oo	$ 1.052.019.610.oo
ACTA 5	01/04/2025	$ 255.449.515.oo	$ 1.307.469.125.oo

Que el Contratista acreditó el pago de los aportes de sus empleados, al sistema de Seguridad Social y Parafiscales mediante certificación firmada por el Representante Legal.

Que, a la fecha de la presente acta, considero procedente en mi calidad de INTERVENTOR, autorizar el pago, por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($ 255.449.515.oo) al CONTRATISTA CONSTRUPACICOL S.A. S ZOMAC con NIT. 901.526.894-4.

Para constancia se firma el día primero (01) de Abril de 2025, la presente acta por quienes en ella intervinieron:

El Interventor,

JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO 3

El Contratista de Obra,

BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
Representante Legal
CONSTRUPACICOL S.A. S ZOMAC

Copia: Archivo

CONSTRUPACICOL S.A.S
ZOMAC

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES

Yo, **CARLOS ALBERTO ANACONA ORTEGA**, identificado con C.C. No. 5.348.778 de Colón Putumayo, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la Empresa **CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC** con Nit 901526894-4 de la cual soy el Revisor Fiscal ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de seguridad social (Salud y Pensiones), ARL señalados en el artículo 50 de la Ley 789 de 2022, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por sus conceptos.

La empresa se encuentra exonerado del pago de parafiscales y salud de conformidad a lo preceptuado por la Ley 1429 y Ley 607.

La presente certificación, se firma a los veintinueve (29) dias del mes de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ANACONA ORTEGA
C.C. No.5.348.778 de Colón
T.P.- No. 109371-T
Revisor Fiscal

321 449 8859
PROYECTOS.CONSTRUPACICOL@GMAIL.COM
construpacificosaszomac@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5.348.778
ANACONA ORTEGA

APELLIDOS
CARLOS ALBERTO

NOMBRES

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 13-OCT-1970
COLON
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

20-ENE-1989 COLON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-6400700-00168911-M-0005348778-20090813 0014871721A 1 26647128

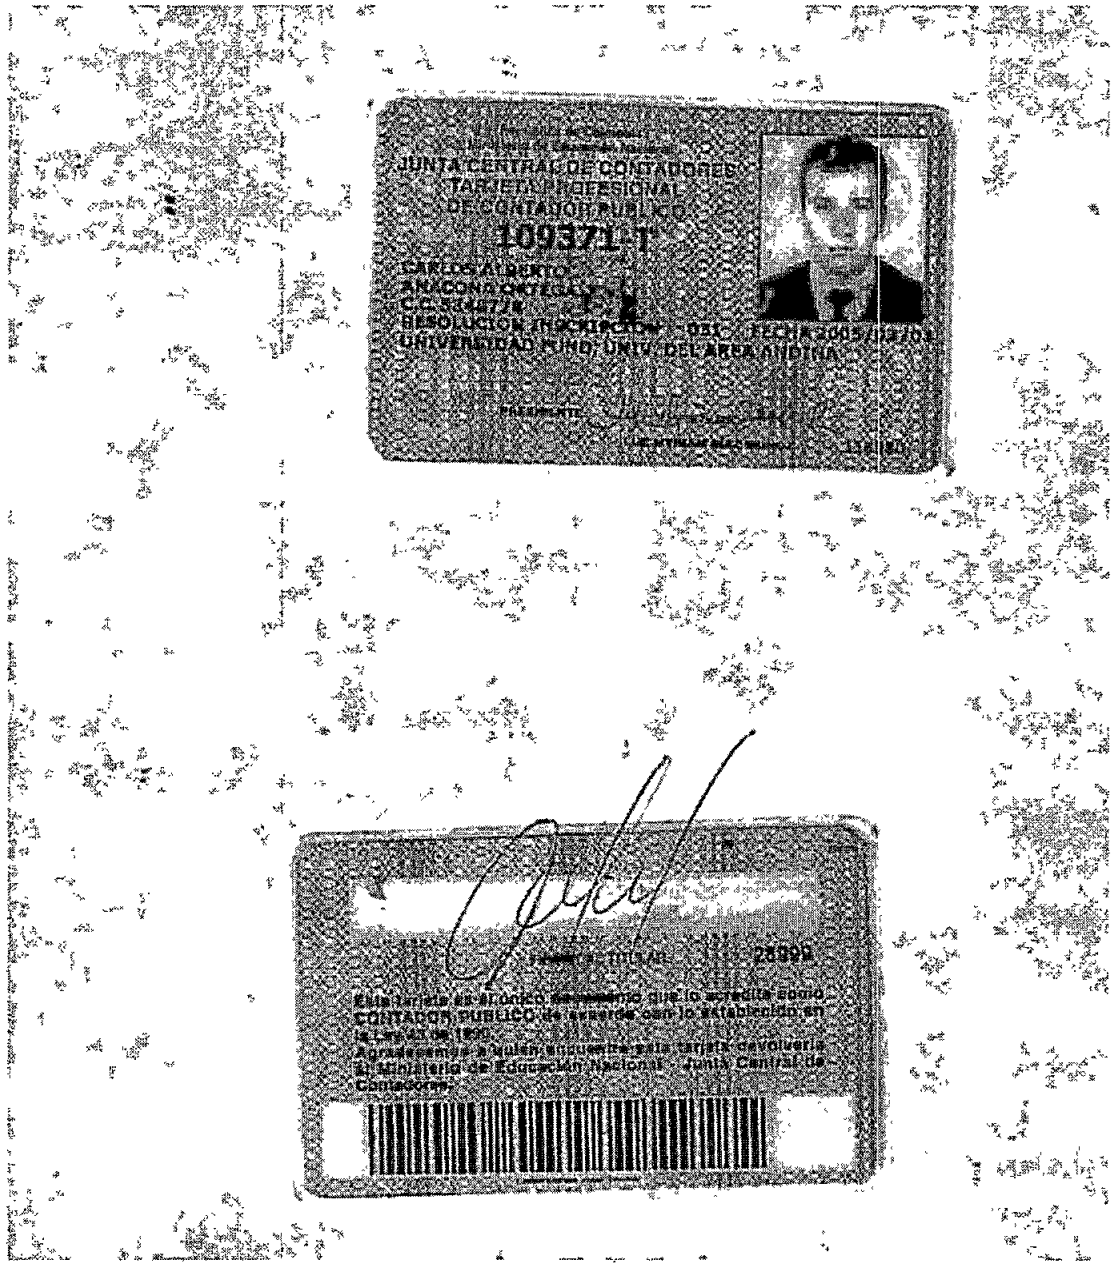
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
109371-T
CARLOS ALBERTO
ANACONA ORTEGA
C.C. 5'248.736
RESOLUCION INSCRIPCION 0331 FECHA 2005/03/03
UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS
CONTADOR PUBLICO
28999
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ALBERTO ANACONA ORTEGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 5348778 de COLON (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 109371-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTÍCULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

BBVA

Net Cash

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **CONSTRUPACICOL S.A.SZOMAC**, identificado(a) con NIT número **901.526.894-4** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA CORRIENTE** No. **0598027217** aperturada el **4 de mayo del 2023**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **28 de abril del 2025.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0598027217**
Cuenta de 16 dígitos:**0598000100027217**
Cuenta de 20 dígitos:**00130598000100027217**

Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSTRUPACICOL S.A.S

CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC
NIT 901.526.894-4
MZ H14A BARRIO HUASIPANGA
Tel: (undefined) 3218005123 - Ext. undefined
Mocoa - Colombia
construpacificosaszomac@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 16

Señores	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA		
NIT	805.012.896-4	Teléfono	(602) 5560112 - Ext. 000
Dirección	CR 36 5B 3 65 BRR SAN FERNANDO	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2025, 12:46
Expedición	29/04/2025, 12:47
Vencimiento	28/05/2025

Item	Descripción	Valor Impto.Rete.	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - ACTA PARCIAL 5	0.00	255,449,515.00	255,449,515.00

Total items: 1

Total Bruto	255,449,515.00
Total a Pagar	255,449,515.00

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos quince pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-28 por $ 255,449,515.00

Observaciones:
RETENCIONES EN LA FUENTE:
CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC NIT 901.526.894-4 TIENE BENEFICIO DE ACUERDO AL DECRETO 1650 DE 2017 ARTÍCULO 1.2.1.23.1.10. la tarifa de retención en la fuente se calculará en forma proporcional al porcentaje de la tarifa del impuesto sobre la renta y complementario de la sociedad beneficiaria, así: MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA: AÑO 2025 50%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092353796 aprobado en 20250425 prefijo FV desde el número 16 al 100 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa
CUFE: 0b71ea9fec102040091489a8081d81f99cd0d5c2d78bb002037503e39bd77655666e219ec8bd51121e26f51d139e7c43

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML
