

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE ANTIOQUIA

INFORME APOYO TÉCNICO PRF 80052-2022-41262- CORANTIOQUIA - Contrato 140-CNT1705-36



Elaborado por:

Daniela Castaño Cano
Ingeniera Ambiental - profesional universitario grado 01
Matricula profesional - 05238-347359 del 23/12/2016
Medellín, 18 de julio de 2024

1. Introducción

La Contraloría General de la República, a través de la Gerencia Departamental Colegiada Antioquia adelanta el trámite del Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF 80052-2022-41262– CORANTIOQUIA, con el fin de verificar el hallazgo que se originó dentro de la actuación especial realizada a la entidad CORANTIOQUIA vigencias 2018 y 2019, por presunto incumplimiento en las obligaciones del contrato 140-CNT1705-36 cuyo objeto era el *“Establecimiento y fortalecimiento de hogares ecológicos en municipios de jurisdicción de Corantioquia”*

El presente informe se elabora en cumplimiento de la asignación de apoyo técnico comunicada mediante oficio 2023IE0110889 20/10/2023 remitido por la Doctora Sorany Yiseht Telaja Flores Gerente Departamental Colegiada de Antioquia a través del cual se requiere brindar el apoyo técnico solicitado mediante 2023IE0104955 del 04/10/2023 con el propósito de que realice las siguientes actividades y absuelva las siguientes inquietudes:

se ordena decretar un apoyo técnico de un profesional en ingeniería y/o tecnología ambiental adscrito a la planta de cargos de la Gerencia Departamental colegiada de Antioquia, con el fin de que realice las siguientes actividades y resuelva el siguiente cuestionario:

Se realice visita especial a la Corporación De Estudios Educación E Investigación Ambiental -CEAM-, identificada con NIT 811037176-1 con domicilio en la dirección Calle 20 No 45ª-48 Marinilla – Antioquia, con el propósito de que se verifique las evidencias del contrato 140-CNT 1705-36 y del convenio interadministrativo COV-17038 de 2017 que allí reposan, constate la existencia de las mismas, verifique los soportes documentales de las actuaciones sobrevinientes a las auditorías efectuadas para la vigencia 2018 y 2019, tales como soportes de liquidaciones definitivas de contrato y convenio interadministrativo, los cuales fueron hechos contractuales posteriores a la auditoría y a la apertura del proceso y valide que la evidencia que se encuentra en dicha corporación corresponda a las actividades y/o alcances del contrato 140-CNT 1705-36 y del convenio interadministrativo COV-17038 de 2017.

Una vez verificadas la existencia de las evidencias del contrato 140-CNT 1705-36 y del convenio interadministrativo COV-17038 de 2017, se deberá realizar un informe técnico para determinar si la evidencia que reposa en la corporación CEAM corresponde al cumplimiento de todas las obligaciones del contrato CNT 1705-36 y del convenio interadministrativo COV-17038 de 2017, verificando cada actividad contractual.

Para cumplir la asignación, se realizó solicitud de información mediante oficios, 2024EE0042100 del 07/03/2024, 2024EE0118194 del 25/06/2024, información suministrada por el supervisor del contrato y el contratista (CEAM), además, se

realiza visita de verificación de la evidencia documental del contrato el 17, 18 y 19 de julio de 2024, al municipio de Marinilla, Antioquia.

2. Objetivo general

Brindar apoyo técnico mediante inspección y verificación de los expedientes físicos que reposan en la oficina de CEAM, para validar las actividades realizadas en el contrato 140-CNT1705-36 cuyo objeto era el “*Establecimiento y fortalecimiento de hogares ecológicos en municipios de jurisdicción de Corantioquia*” con el fin de constatar la presunta irregularidad del Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF 80052-2022-41262– CORANTIOQUIA.

3. Objetivos específicos

Realizar visita especial a la COORPORACIÓN DE ESTUDIOS EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL -CEAM-, con el propósito de verificar de las evidencias del contrato 140-CNT 1705-36 y del convenio interadministrativo COV-17038 de 2017 que allí reposan, y se constata la existencia de las pruebas de la ejecución de las actividades y/o alcances del contrato 140-CNT 1705-36 y del convenio interadministrativo COV-17038 de 2017.

Realizar un informe técnico para determinar si la evidencia obrante en la corporación CEAM corresponde al cumplimiento de todas las obligaciones del contrato CNT 1705-36 y del convenio interadministrativo COV-17038 de 2017, verificando cada actividad contractual con las evidencias obtenidas.

4. Información contractual

Tabla 1 Información del contrato 140-CNT1705-36

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
N° del contrato	N° 140-CNT1705-36
Valor Inicial	\$494.090.850
Valor otro sí	\$239.982.705
Valor TOTAL	\$734.073.555
Plazo	Ocho (8) meses
Plazo adición	Cuanto (4) meses
Plazo TOTAL	Doce (12) meses
Objeto: “ <i>Establecimiento y fortalecimiento de hogares ecológicos en municipios de jurisdicción de Corantioquia</i> ”.	

Lugar: Jurisdicción de Corantioquia - Ituango, Anori, Zaragoza, el Bagre, Amalfi, Yolombo, Puerto Berrio, Puerto Nare, Maceo, Cisneros, Carolina del Principe, Gomez Plata, Entrerrios, Yarumal, San Andres de Cuerquia, Angostura, Valdivia, Guadalupe, Caramanta, Valparaiso, Tamesis, Fredonia, Ebejico, Santa Fe de Antioquia, Anza, Buritica, Toledo, Belmira, Angelopolis, Jardín, Remedios, Segovia y Vegachi	
CORANTIOQUIA - Contratante	
Suscrito	Andrés Felipe Ocampo Zapata
Cedula	71.788.121
Cargo	Subdirector de Cultura Ambiental
NIT	811.000.231-7
Unión Temporal Ecobio III - Contratista	
Suscrito	María Consuelo Montoya Giraldo
Cedula	43.686.797
NIT	901.078.183-1
Unión Temporal Ecobio III	Integrada por: <ul style="list-style-type: none"> - La Corporación de Estudios, Educación e Investigación Ambiental CEAM - La Corporación Ambiental Voluntariado Universitario - CORAMVU
Contactos	
Supervisor	Jaime Madrigal Morares - Exfuncionario de Corantioquia Cedula: 70.322.906 Correo: Jaimemadrigal2@gmail.com Celular: 3128719632 John Mario Villegas Castro – funcionario de Corantioquia Cedula: 98.535.232 Correo: jvillegas@corantioquia.gov.co Celular: 3136535274
Representante legal CEAM	Doris Elena Zuasa Suescun Cedula: 43.495.782 Correo: doris.suaza@corpoceam.org Celular: 3146309224

Fuente: Información contractual

5. Visita

Se procede a realizar la visita técnica luego de validar por varios métodos digitales la entrega de los expedientes contractuales, como CDs, DVD, USB y OneDrive, y por el volumen de la información no se pudo acceder a la misma, requiriendo la visita técnica a las instalaciones de CEAM para validar la información.

Mediante radicado 2024EE0118194 del 25/06/2024 se solicitó el acompañamiento durante la visita realizada al municipio de marinilla, de un empleado de CEAM y de un funcionario de CORANTIOQUIA que conozca el contrato y se encuentre vinculado con su ejecución.

La visita técnica se realizó los días 17, 18 y 19 de julio de 2024, al municipio de Marinilla, en el Departamento de Antioquia.

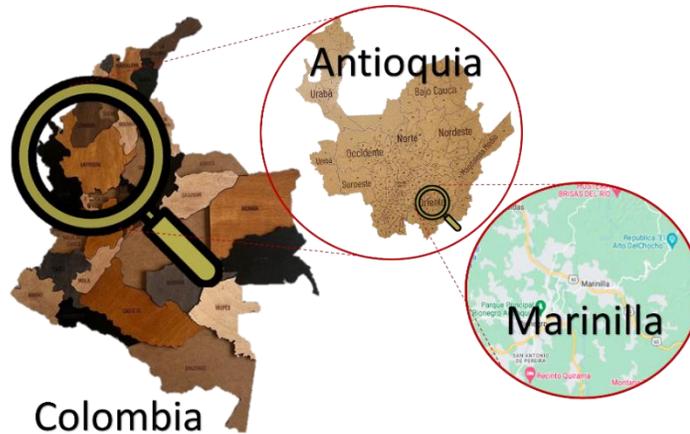


Ilustración 1 Ubicación de las instalaciones de CEAM visitadas Fuente: Elaboración propia – Google Earth

Las personas que participaron en la visita son las siguientes:

Tabla 2 personas participantes durante toda la visita

Supervisor	John Mario Villegas Castro – funcionario de Corantioquia Cedula: 98.535.232 Correo: jvillegas@corantioquia.gov.co Celular: 3136535274
Representante legal CEAM	Doris Elena Zuasa Suescun Cedula: 43.495.782 Correo: doris.suaza@corpoceam.org Celular: 3146309224

Fuente: Elaboración propia



Ilustración 2 Ubicación del contrato Fuente: [Gestión de Riesgos y Cambio Climático - Corantioquia](#)

Como aspectos generales de la visita se identifica que:

Se reúnen en las oficinas de CEAM el día 17/07/2024, Daniela Castaño Cano – funcionaria de la CGR, Jaime Madrigal Morares – exfuncionario de Corantioquia y supervisor del contrato, John Mario Villegas Castro – funcionario de Corantioquia y supervisor del contrato, Doris Elena Zuasa Suescun – representante legal de CEAM, Maria Victoria Aristizabal Villada – Apoderada del proceso por parte de CEAM, Amparo Davila Vides – Responsable del componente social CEAM, en la citada reunión se da una explicación general del contrato número 140-CNT1705-36 donde se desglosan las Fases, Alcances y Actividades que se contemplaron.

Anotando que la fase I hace relación a las especificaciones de la minuta contractual y la fase 2 del otro sí.

Tabla 3 Características generales del contrato

Alcance 1. (8702)	Acompañamiento de (1200) Hogares ecológicos establecidos en procesos anteriores
Actividad 1.	Visitas de caracterización, acompañamiento y evaluación
Actividad 2.	Transporte para entrega de insumos KIT
Actividad 3.	Encuentros formativos
Actividad 4.	Kit fortalecimiento hogares ecológicos
Alcance 2. (8703)	Establecimiento de 200- Hogares Ecológicos nuevos
Actividad 1.	Visitas de caracterización, acompañamiento y evaluación
Actividad 2.	Transporte para entrega de insumos KIT
Actividad 3.	Encuentros de formación
Actividad 4.	Kit establecimiento y fortalecimiento hogares establecidos
Actividad 5.	Kit de indumentaria para nuevas familias participantes (gorra y camiseta)
Actividad 6.	Bitácora de campo
Alcance 3. (8704)	Actividad de Restauración ecológica mediante reforestación
Actividad 1.	Visitas de asesoría en restauración ecológica
Actividad 2.	Kit restauración ecológica con hogares (abonos, material vegetal y materiales para restauración)
Alcance 4. (8705)	Fortalecimiento de red de promotores ecológicos rurales
Actividad 1.	Encuentros de fortalecimiento y acompañamiento de para promotores (apoyo logístico)
Actividad 2.	Kit de indumentaria para promotores antiguos camiseta
Actividad 3.	Encuentro de intercambio de semillas
Actividad 4.	Encuentro de buenas prácticas ambientales
Alcance 5. (8706)	Diseño e implementación de plan de medios
Actividad 1.	Pendón
Actividad 2.	Pieza comunicacional
Actividad 3.	Mercados verdes campesinos
Actividad 4.	Evento de socialización
Actividad 5.	Encuentro final

Fuente: Información contractual

Se presentan las 18 carpetas de la ejecución del contrato en la que reposan las evidencias físicas de la ejecución de este, los cuales fueron revisados por la

funcionaria de la CGR Daniela Castaño Cano, y el funcionario de CORANTIOQUIA John Mario Villegas Castro los días 17, 18 y 19 de julio de 2024, identificando las evidencias que corresponden a cada una de las actividades.



Ilustración 3 Registro fotográfico de la visita

Detalles de la contratación:

De acuerdo con el reparto financiero de cada una de las actividades CEAM informa la cual se constata con la información presentada en estudios previos, minuta del contrato y otro sí:

Tabla 4 Características generales del contrato

Concepto	Minuta contractual	otro sí	Total
SUBTOTAL (Costos Personal + Costos Directos)	\$361.045.561	\$175.361.860	\$536.407.421
ADMINISTRACION Y UTILIDAD (15%)	\$54.156.834	\$26.304.279	\$80.461.113
Subtotal antes de IVA	\$415.202.395	\$201.666.139	\$616.868.534
IVA (19%)	\$78.888.455	\$38.316.566	\$117.205.021
TOTAL	\$494.090.850	\$239.982.705	\$734.073.555

Fuente: Información presentada durante la visita

Según la información presentada en la tabla anterior, el valor a verificar corresponde a \$536.407.421 incluyendo adición, ya que lo gato de costos administrativos del 15% por \$80.461.113 e IVA del 19% por \$117.205.021, no se valida porque los porcentajes están establecidos.

Se desglosa de acuerdo con las actividades a continuación, información que coinciden con la minuta del contrato y el otro sí.

Tabla 5 Características del contrato 140-CNT1705-36 incluyendo otro sí N° 1

#	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Valor por Unidad de Medida	Valor Total por producto
0	Alcance 0.	Contratación			
0,1	Actividad 1. (Un) Coordinadora	Mes	8	\$5.500.000	\$44.000.000
0,2	Actividad 2. (Un) Profesional: Área social	Mes	7	\$4.600.000	\$32.200.000
0,3	Actividad 3. (Un) Profesional: Ingeniero forestal	Mes	3	\$4.600.000	\$13.800.000
0,4	Actividad 4. (Un) Tecnólogo de campo	Mes	7	\$2.500.000	\$17.500.000
0,5	Actividad 5. (Cinco) Técnicos de campo	Mes	30	\$2.400.000	\$72.000.000
0,4	Otro si Tecnólogo	Mes	4	\$2.500.000	\$10.000.000
0,3	Otro si Profesional: Área Forestal	Mes	5	\$4.300.000	\$21.500.000
0,5	Otro si Técnicos de campo	Mes	4	\$11.000.000	\$44.000.000
Total Alcance 0					\$255.000.000
1	Alcance 1.	Acompañamiento de (1200) Hogares ecológicos establecidos en procesos anteriores			
1,1	Actividad 1. Visitas de caracterización, acompañamiento y evaluación	Visitas	120	\$25.000	\$3.000.000
1,2	Actividad 2. Transporte para entrega de insumos KIT	Viajes - municipios	20	\$180.000	\$3.600.000

1,3	Actividad 3.	Encuentros formativos	Encuentros	200	\$100.000	\$20.000.000
1,4	Actividad 4.	Kit fortalecimiento hogares ecológicos	Kit	200	\$115.000	\$23.000.000
Total Alcance 1						\$49.600.000
2	Alcance 2.	Establecimiento de 200- Hogares Ecológicos nuevo				
2,1	Actividad 1.	Visitas de caracterización, acompañamiento y evaluación	Visitas	100	\$25.000	\$2.500.000
2,2	Actividad 2.	Transporte para entrega de insumos KIT	Viajes	20	\$180.000	\$3.600.000
2,3	Actividad 3.	Encuentros de formación	Encuentros	200	\$100.000	\$20.000.000
2,4	Actividad 4.	Kit establecimiento y fortalecimiento hogares establecidos	Paquetes	200	\$115.000	\$23.000.000
2,5	Actividad 5.	Kit de indumentaria para nuevas familias participantes (gorra y camiseta)	Paquetes	220	\$51.935	\$11.425.700
2,6	Actividad 6.	Bitácora de campo	Bitácora	200	\$25.000	\$5.000.000
2,1	Otro si	Visitas de caracterización, acompañamiento y evaluación	visitas	300	\$25.000	\$7.500.000
2,2	Otro si	Transporte para entrega de insumos- KIT	viajes- Municipio	13	\$240.000	\$3.120.000
2,3	Otro si	Encuentros formativos de hogares ecológicos (encuentros por núcleo*12)	encuentros nucleados familias	144	\$100.000	\$14.400.000
2,4	Otro si	Kit fortalecimiento hogares establecidos	kit	220	\$125.000	\$27.500.000
2,5	Otro si	Kit de indumentaria para nuevas familias participantes (gorra y camiseta)	kit	220	\$51.963	\$11.431.860
Total Alcance 2						\$129.477.560
3	Alcance 3.	Actividad de Restauración ecológica mediante reforestación				
3,1	Actividad 1.	Visitas de asesoría en restauración ecológica	Visitas	50	\$25.000	\$1.250.000
3,2	Actividad 2.	Kit restauración ecológica con hogares (abonos, material vegetal y	Kit	200	\$100.000	\$20.000.000

		materiales para restauración)				
3,1	Otro si	Visitas de asesoría en restauración ecológica	visitas	122	\$25.000	\$3.050.000
3,2	Otro si	Kit restauración ecológica con hogares	kit	110	\$100.000	\$11.000.000
Total Alcance 3						\$35.300.000
4	Alcance 4.	Fortalecimiento de red de promotores ecológicos rurales				
4,1	Actividad 1.	Encuentros de fortalecimiento y acompañamiento de para promotores (apoyo logístico)	Encuentros promotores	94	\$100.000	\$9.400.000
4,2	Actividad 2.	Kit de indumentaria para promotores antiguos camiseta	Kit	200	\$30.000	\$6.000.000
4,3	Actividad 3.	Encuentro de intercambio de semillas	Evento	1	\$2.000.000	\$2.000.000
4,4	Actividad 4.	Encuentro de buenas prácticas ambientales	Evento	1	\$2.000.000	\$2.000.000
Total Alcance 4						\$19.400.000
5	Alcance 5.	Diseño e implementación de plan de medios				
5,1	Actividad 1.	Pendón	Pendón	5	\$84.000	\$420.000
5,2	Actividad 2.	Pieza comunicacional	Pieza	1	\$6.300.000	\$6.300.000
5,3	Actividad 3.	Mercados verdes campesinos	Evento	35	\$450.000	\$15.750.000
5,4	Actividad 4.	Evento de socialización	Evento	1	\$1.300.000	\$1.300.000
5,5	Actividad 5.	Encuentro final	Evento	1	\$2.000.000	\$2.000.000
5,1	Otro si	Pendón	pendón	3	\$80.000	\$240.000
2,6	Otro si	Bitácora de campo	bitácora	220	\$25.000	\$5.500.000
5,2	Otro si	Pieza comunicacional	pieza	1	\$4.200.000	\$4.200.000
5,3	Otro si	Mercados verdes campesinos	evento	8	\$490.000	\$3.920.000
5,5	Otro si	Encuentro final hogares adición	evento	4	\$2.000.000	\$8.000.000
Total Alcance 5						\$47.630.000
TOTALES DEL CONTRATO						\$536.407.560

Fuente: Información contractual

6. Resultados

Durante la visita se revisan cada uno de los alcances con sus respectivas actividades, como metodología de la revisión se indica que las carpetas no se encontraban separadas por alcance y actividades sino por territoriales (Aburra Norte, Aburra Sur, Panzenú, Cartama, Zenufana, Tahamíes, Hevexico) con sus respectivos municipios, y dentro de estos se encuentran las actividades relacionadas con hogares nuevos y antiguos, dicho lo anterior se anexa al presente informe archivo en Excel en donde se describen las actividades y las respectivas agrupaciones que se realizaron para alcanzar los análisis que se describen a continuación para cada uno de los alcances.

6.1. Alcance 0: Contratación

Para la revisión del alcance cero, se solicitaron todos los contratos del personal mediante oficio 2024EE0118194 del 25/06/2024, y se revisó y verificó que los valores y tiempo correspondían a lo contratado, indicando que, para el alcance cero no hay irregularidades, entre lo contratado y lo ejecutado, ya que coinciden los valores \$255.000.000 entre lo que se presentó por el contratista en relación con lo identificado en la visita (columnas verdes).

Tabla 6 Características del contrato 140-CNT1705-36 incluyendo otro sí N° 1 vs visita técnica CGR

#	Descripción	Unidad de medida	Información contractual			Visita CGR			
			Cantidad	Valor por Unidad de Medida	Valor Total por producto	Cantidad	Valor por Unidad de Medida	Valor Total por producto	
0	Alcance 0.	Contratación							
0,1	Actividad 1.	(Un) Coordinador a	Mes	8	\$5.500.000	\$44.000.000	8	\$5.500.000	\$44.000.000
0,2	Actividad 2.	(Un) Profesional: Área social	Mes	7	\$4.600.000	\$32.200.000	7	\$4.600.000	\$32.200.000
0,3	Actividad 3.	(Un) Profesional: Ingeniero forestal	Mes	3	\$4.600.000	\$13.800.000	3	\$4.600.000	\$13.800.000
0,4	Actividad 4.	(Un) Tecnólogo de campo	Mes	7	\$2.500.000	\$17.500.000	7	\$2.500.000	\$17.500.000
0,5	Actividad 5.	(Cinco) Técnicos de campo	Mes	30	\$2.400.000	\$72.000.000	30	\$2.400.000	\$72.000.000
0,4	Otro si	Tecnólogo	Mes	4	\$2.500.000	\$10.000.000	4	\$2.500.000	\$10.000.000
0,3	Otro si	Profesional : Área Forestal	Mes	5	\$4.300.000	\$21.500.000	5	\$4.300.000	\$21.500.000
0,5	Otro si	Técnicos de campo	Contratos	4	\$11.000.000	\$44.000.000	4	\$11.000.000	\$44.000.000
	Total Alcance 0					\$255.000.000			\$255.000.000

Fuente: Información contractual y expedientes físicos de CEAM

6.2. Alcance 1: Acompañamiento de (1200) Hogares ecológicos establecidos en procesos anteriores

- Durante la revisión de la actividad 1, se revisan cada una de las territoriales y los municipios beneficiarios del acompañamiento, logrando identificar como se plasma en el anexo 1 (hoja de cálculo F1-1.1-.3-4-4.1-.2), que se realizan 438 visitas de caracterización correspondientes a la actividad 1, mientras que en la contratación solo se contemplaban realizar 120, indicando que se realizaron 318 caracterizaciones de más.

- Para la actividad 2 se presenta durante la visita técnicas las respectivas actas de entrega que soportan el transporte de los respectivos Kits.

- Por otra parte, en la actividad 3, se contrata la realización de 200 encuentros formativos para la capacitación de 1.200 hogares, sin embargo, en la evidencia presentada en las carpetas solo se identifican 123 encuentros formativos para 1.119 hogares (anexo 1 hoja de cálculo F1-1.1-.3-4-4.1-.2), no obstante, se aclara por parte del contratista que el trabajo con comunidades se dificulta ya que si se presentaron las debidas convocatorias sin embargo las personas citadas no acuden además indica que *“En relación con la convocatoria a los campesinos y campesinas participantes del proyecto HOGARES ECOLOGÍCOS, le informo que esta se hizo por municipio a través de dos mecanismos fundamentalmente:*

En los municipios donde había promotores ecológicos que venían de tiempo atrás en procesos con Corantioquia, se nos entregó por parte de esta la base de datos y se procedió a contactarlos telefónicamente para que colaboraran en la convocatoria de la gente para las reuniones y encuentros. Algunos promotores ya no estaban cuando los llamamos, porque habían migrado o cambiado de número. Pero la mayoría si se pudieron contactar

En municipios nuevos, donde no había promotores, contactamos a los funcionarios municipales, especialmente las UMATA, quienes nos ayudaron a buscar y seleccionar a los beneficiarios”. (Anexo 5)

No obstante, en temas logísticos si se generan los respectivos costos por lo que se optó por considerar lo expuesto por el contratista, por lo que en la actividad se contemplan los 200 encuentros formativos. (resaltado color azul)

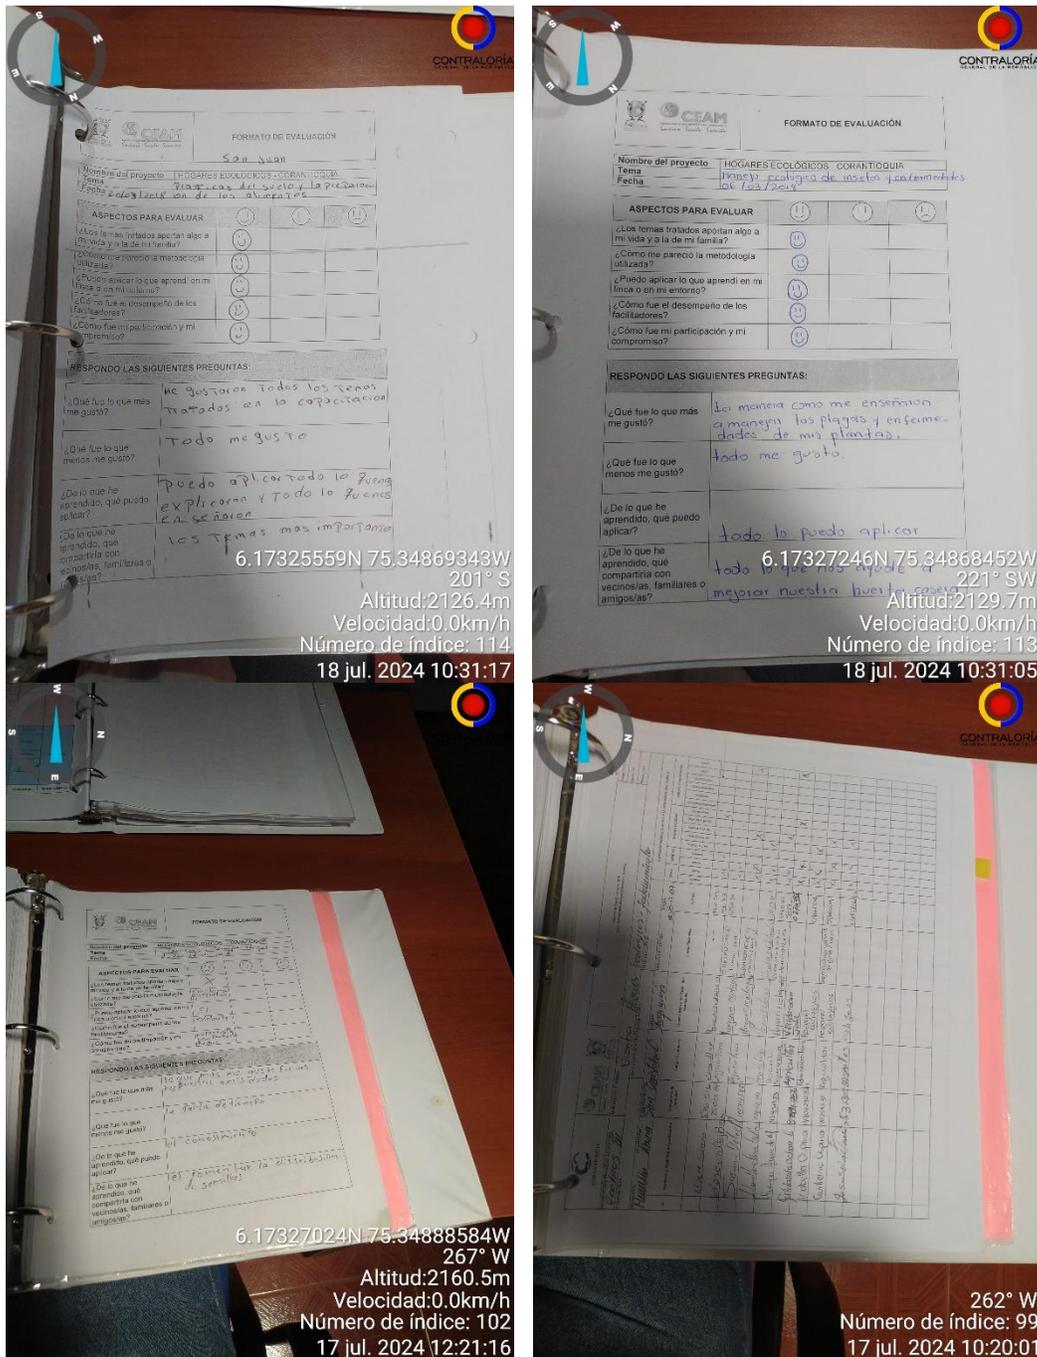


Ilustración 4 Registro fotográfico de la visita

- Con relación a actividad 4, se realiza la entrega de 359 Kit de fortalecimiento de hogares ecológicos, mientras que en la contratación solo se contemplaban realizar 200, indicando que se realizaron 159 entregas de más.

Tabla 7 Características del contrato 140-CNT1705-36 incluyendo otro sí N° 1 vs visita técnica CGR

#	Descripción	Unidad de medida	Información contractual			Visita CGR		
			Cantidad	Valor por Unidad de Medida	Valor Total por producto	Cantidad	Valor por Unidad de Medida	Valor Total por producto
1	Alcance 1.	Acompañamiento de (1200) Hogares ecológicos establecidos en procesos anteriores						
1,1	Actividad 1.	Visitas de caracterización, acompañamiento y evaluación	120	\$25.000	\$3.000.000	438	\$25.000	\$10.950.000
1,2	Actividad 2.	Transporte para entrega de insumos KIT	20	\$180.000	\$3.600.000	20	\$180.000	\$3.600.000
1,3	Actividad 3.	Encuentros formativos	200	\$100.000	\$20.000.000	200	\$100.000	\$20.000.000
1,4	Actividad 4.	Kit fortalecimiento hogares ecológicos	200	\$115.000	\$23.000.000	359	\$115.000	\$41.285.000
Total Alcance 1					\$49.600.000			\$75.835.000

Fuente: Información contractual y expedientes físicos de CEAM

6.3. Alcance 2: Establecimiento de 200 - Hogares Ecológicos nuevos

- De acuerdo a la información contractual de la actividad 1 incluyendo el otro sí (resaltado verde segunda columna) era de 400 visitas de caracterización, acompañamiento y evaluación, durante la visita técnica se identifican 554 (211+343) actas de visita, indicando que se realizaron 154 visitas adicionales a las contratadas.

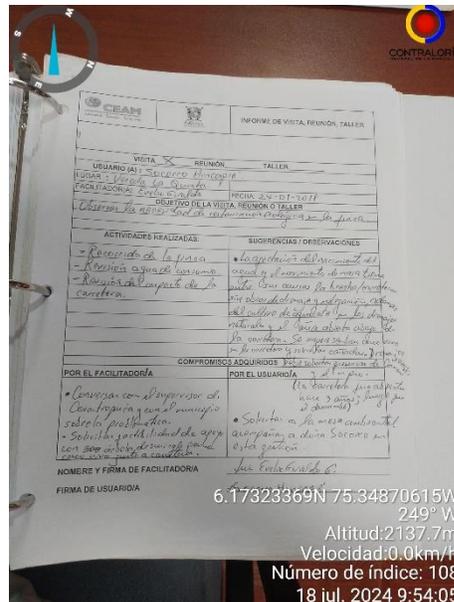
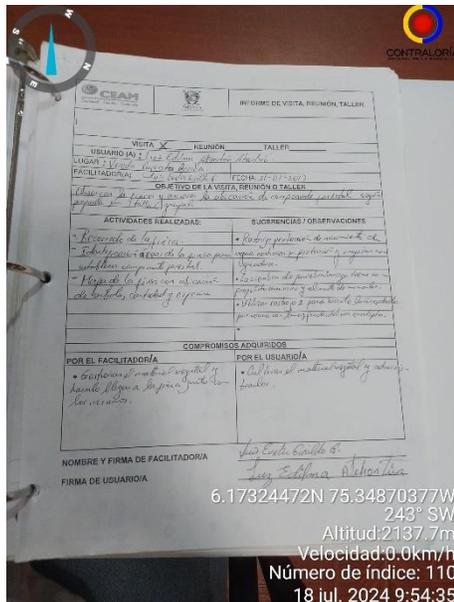


Ilustración 5 Registro fotográfico de la visita

- Para la actividad 2 de acuerdo a la información contractual y el otro sí se presentan 23 (resaltado azul claro segunda columna) se presenta durante la visita técnica las respectivas actas de entrega que soportan el transporte de los respectivos Kits.
- Por otra parte, en la actividad 3, se contrata la realización de 344 encuentros formativos incluyendo otro sí (resaltado rosado segunda columna), sin embargo, en la evidencia presentada en las carpetas solo se identifican 243 (140+103) encuentros formativos (anexo 1 hoja de cálculo F1 - 2.1-.3-.4-.5-.6-3.1-.2-4.1 y F2 - 2.3-.4-.5-.6-3.1-.2) no obstante, se aclara por parte del contratista que el trabajo con comunidades se dificulta ya que si se presentaron las debidas convocatorias sin embargo las personas citadas no acuden además indica que *“En relación con la convocatoria a los campesinos y campesinas participantes del proyecto HOGARES ECOLOGÍCOS, le informo que esta se hizo por municipio a través de dos mecanismos fundamentalmente:*

En los municipios donde había promotores ecológicos que venían de tiempo atrás en procesos con Corantioquia, se nos entregó por parte de esta la base de datos y se procedió a contactarlos telefónicamente para que colaboraran en la convocatoria de la gente para las reuniones y encuentros. Algunos promotores ya no estaban cuando los llamamos, porque habían migrado o cambiado de número. Pero la mayoría si se pudieron contactar

En municipios nuevos, donde no había promotores, contactamos a los funcionarios municipales, especialmente las UMATA, quienes nos ayudaron a buscar y seleccionar a los beneficiarios”. (Anexo 5)

No obstante, en temas logísticos si se generan los respectivos costos por lo que se optó por considerar lo expuesto por el contratista, por lo que en la actividad se contemplan los 344 encuentros formativos. (resaltado color azul)

- Para el Kit establecimiento y fortalecimiento hogares relacionado en la actividad 4 del presente alcance se contrata 420 incluyendo otro sí (resaltado morado segunda columna), de acuerdo a la información presentada en el contrato estos Kit no eran iguales para todas las comunidades si no que de acuerdo a las necesidades y el presupuesto del proyecto, podían incluir (pala, pica, baldes, manguera, abono, mayas, cercos, regaderas, entre otros) y la entrega se presentaba por núcleos, una vez revisadas las actas de entrega se presentan 287 (138+149) (anexo 1 hoja de cálculo F1 - 2.1-.3-.4-.5-.6-3.1-.2-4.1 y F2 - 2.3-.4-.5-.6-3.1-.2), sin embargo, en las actas se identifica que por una acta se entregan varios objetos con las mismas características es decir por ejemplo: 5 palas, 10 picas, 30 metros de maya; asumiendo que esto no le corresponde a un solo hogar lo que dificulto identificar en una única acta a cuantos hogares correspondía.

camisetas de más a lo contratado, compensado lo contratado con lo real ejecutado.

- Para la actividad 6 relacionado con la entrega de bitácoras se contrata 420 incluyendo otro sí (resaltado amarillo segunda columna), en las actas de entrega se identifican la entrega de 509 bitácoras (378+131) (anexo 1 hoja de cálculo F1 - 2.1-.3-.4-.5-.6-3.1-.2-4.1 y F2 - 2.3-.4-.5-.6-3.1-.2) lo que indica que se entregan 89 bitácoras de más a lo contratado, compensado lo contratado con lo real ejecutado.

Tabla 8 Características del contrato 140-CNT1705-36 incluyendo otro sí N° 1 vs visita técnica CGR

#	Descripción	Unidad de medida	Información contractual			Visita CGR			
			Cantidad	Valor por Unidad de Medida	Valor Total por producto	Cantidad	Valor por Unidad de Medida	Valor Total por producto	
2	Alcance 2.	Establecimiento de 200- Hogares Ecológicos nuevos							
2,1	Actividad 1.	Visitas de caracterización, acompañamiento y evaluación	Visitas	100	\$25.000	\$2.500.000	211	\$25.000	\$5.275.000
2,2	Actividad 2.	Transporte para entrega de insumos KIT	Viajes	20	\$180.000	\$3.600.000	20	\$180.000	\$3.600.000
2,3	Actividad 3.	Encuentros de formación	Encuentros	200	\$100.000	\$20.000.000	200	\$100.000	\$20.000.000
2,4	Actividad 4.	Kit establecimiento y fortalecimiento hogares establecidos	Paquetes	200	\$115.000	\$23.000.000	138	\$115.000	\$15.870.000
2,5	Actividad 5.	Kit de indumentaria para nuevas familias participantes (gorra y camiseta)	Paquetes	220	\$51.935	\$11.425.700	378	\$51.935	\$19.631.430
2,6	Actividad 6.	Bitácora de campo	Bitácora	200	\$25.000	\$5.000.000	378	\$25.000	\$9.450.000
2,1	Otro si	Visitas de caracterización, acompañamiento y evaluación	visitas	300	\$25.000	\$7.500.000	343	\$25.000	\$8.575.000
2,2	Otro si	Transporte para entrega de insumos- KIT	viajes- Municipio	13	\$240.000	\$3.120.000	13	\$240.000	\$3.120.000
2,3	Otro si	Encuentros formativos de hogares ecológicos (encuentros por núcleo*12)	encuentros nucleados familias	144	\$100.000	\$14.400.000	144	\$100.000	\$14.400.000
2,4	Otro si	Kit fortalecimiento hogares establecidos	kit	220	\$125.000	\$27.500.000	149	\$125.000	\$18.625.000
2,5	Otro si	Kit de indumentaria para nuevas	kit	220	\$51.963	\$11.431.860	188	\$51.963	\$9.769.044

#	Descripción	Unidad de medida	Información contractual			Visita CGR			
			Cantidad	Valor por Unidad de Medida	Valor Total por producto	Cantidad	Valor por Unidad de Medida	Valor Total por producto	
2	Alcance 2.	Establecimiento de 200- Hogares Ecológicos nuevos							
		familias participantes (gorra y camiseta)							
2,6	Otro si	Bitácora de campo	bitácora	220	\$25.000	\$5.500.000	131	\$25.000	\$3.275.000
	Total Alcance 2					\$134.977.560			\$128.315.474

Fuente: Información contractual y expedientes físicos de CEAM

6.4. Alcance 3: Actividad de Restauración ecológica mediante reforestación

- Para la actividad 1 del presente alcance se contrataron 172 visitas de asesoría en restauración ecológica incluyendo el otro sí (resaltado azul segunda columna), sin embargo, durante la visita se identifica que solo se realizaron 109 visitas, no obstante, estas visitas pueden ser compensadas con las visitas del alcance 2 en las cuales se identifica visitas de caracterización adicionales a las contratadas.
- Para el Kit restauración ecológica con hogares (abonos, material vegetal y materiales para restauración) relacionado en la actividad 2 del presente alcance se contrata 310 incluyendo otro sí (resaltado verde segunda columna), de acuerdo a la información presentada en el contrato estos Kit no eran iguales para todas las comunidades si no que de acuerdo a las necesidades y el presupuesto del proyecto de reforestaciones y la entrega se presentaba por núcleos, una vez revisadas las actas de entrega se presentan 240 (200+40) (anexo 1 hoja de cálculo F1 - 2.1-.3-.4-.5-.6-3.1-.2-4.1 y F2 - 2.3-.4-.5-.6-3.1-.2), sin embargo, en las actas se identifica que por una acta se entregan cantidades grandes de individuos arbóreos; asumiendo que esto no le corresponde a un solo hogar lo que dificulto identificar en una única acta a cuantos hogares correspondía.

Anotando, que para la entrega de las 200 kit relacionados inicialmente en el contrato, se sustenta la entrega de los mismo mediante un informe anexo 5 (Alcance 3 Restauración Fase I), en la cual, de acuerdo con las características climáticas, altura, suelo, entre otras del municipio se adquieren individuos arbóreos para proceder con la siembra, adjuntando en el mismo las facturas de compra y los registros fotográficos.

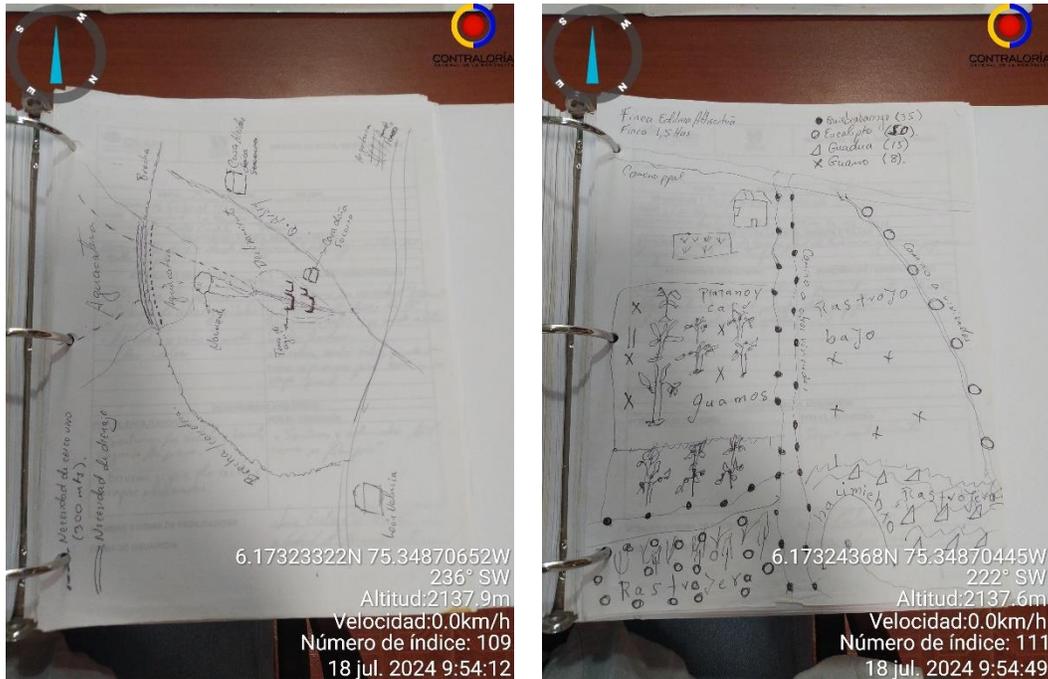


Ilustración 7 Registro fotográfico de la visita

Tabla 9 Características del contrato 140-CNT1705-36 incluyendo otro sí N° 1 vs visita técnica CGR

#	Descripción	Unidad de medida	Información contractual			Visita CGR		
			Cantidad	Valor por Unidad de Medida	Valor Total por producto	Cantidad	Valor por Unidad de Medida	Valor Total por producto
3	Alcance 3.	Actividad de Restauración ecológica mediante reforestación						
3,1	Actividad 1.	Visitas	50	\$25.000	\$1.250.000	42	\$25.000	\$1.050.000
3,2	Actividad 2.	Kit	200	\$100.000	\$20.000.000	200	\$100.000	\$20.000.000
3,1	Otro si	visitas	122	\$25.000	\$3.050.000	67	\$25.000	\$1.675.000
3,2	Otro si	kit	110	\$100.000	\$11.000.000	40	\$100.000	\$4.000.000
#	Total Alcance 3				\$35.300.000			\$26.725.000

Fuente: Información contractual y expedientes físicos de CEAM

6.5. Alcance 4: Fortalecimiento de red de promotores ecológicos rurales

- En la actividad 1, se contrata la realización de 94 encuentros formativos, sin embargo, en la evidencia presentada en las carpetas solo se identifican 15 encuentros formativos con la participación de 260 personas (anexo 1 hoja de cálculo F1 - 2.1-.3-.4-.5-.6-3.1-.2-4.1 y F1 - 2.1-.3-.4-.5-.6-3.1-.2-4.1) no obstante, se aclara por parte del contratista que el trabajo con comunidades se dificulta ya que si se presentaron las debidas convocatorias sin embargo las personas citadas no acuden además indica que *“En relación con la convocatoria a los campesinos y campesinas participantes del proyecto HOGARES ECOLÓGICOS, le informo que esta se hizo por municipio a través de dos mecanismos fundamentalmente:*

En los municipios donde había promotores ecológicos que venían de tiempo atrás en procesos con Corantioquia, se nos entregó por parte de esta la base de datos y se procedió a contactarlos telefónicamente para que colaboraran en la convocatoria de la gente para las reuniones y encuentros. Algunos promotores ya no estaban cuando los llamamos, porque habían migrado o cambiado de número. Pero la mayoría si se pudieron contactar

En municipios nuevos, donde no había promotores, contactamos a los funcionarios municipales, especialmente las UMATA, quienes nos ayudaron a buscar y seleccionar a los beneficiarios”. (Anexo 5)

Sin embargo, en temas logísticos si se generan los respectivos costos por lo que se optó por considerar lo expuesto por el contratista, por lo que en la actividad se contemplan los 94 encuentros formativos. (resaltado color azul)

- Con relación a la actividad 2, se identifica que se contrataron la entrega de 200 camisetras, sin embargo, en esta actividad únicamente entregaron 18, no obstante, en la actividad 5 del alcance 2 se entregaron 126 kits de gorras y camisetras de más a lo contratado, por lo que puede compensar las camisetras requeridas en la actividad 2 del alcance 4.
- En cuanto a la actividad 3 y 4 relacionadas con Encuentro de intercambio de semillas y Encuentro de buenas prácticas ambientales respectivamente se cumple con lo contratado.

Tabla 10 Características del contrato 140-CNT1705-36 incluyendo otro sí N° 1 vs visita técnica CGR

#	Descripción	Unidad de medida	Información contractual			Visita CGR Con ajuste de encuentros formativos			
			Cantidad	Valor por Unidad de Medida	Valor Total por producto	Cantidad	Valor por Unidad de Medida	Valor Total por producto	
4	Alcance 4.	Fortalecimiento de red de promotores ecológicos rurales							
4,1	Actividad 1.	Encuentros de fortalecimiento y acompañamiento de para promotores (apoyo logístico)	Encuentros promotores	94	\$100.000	\$9.400.000	94	\$100.000	\$9.400.000

4,2	Actividad 2.	Kit de indumentaria para promotores antiguos camiseta	Kit	200	\$30.000	\$6.000.000	18	\$30.000	\$540.000
4,3	Actividad 3.	Encuentro de intercambio de semillas	Evento	1	\$2.000.000	\$2.000.000	1	\$2.000.000	\$2.000.000
4,4	Actividad 4.	Encuentro de buenas prácticas ambientales	Evento	1	\$2.000.000	\$2.000.000	1	\$2.000.000	\$2.000.000
Total, Alcance 4						\$19.400.000			\$13.940.000

Fuente: Información contractual y expedientes físicos de CEAM

6.6. Alcance 5: Diseño e implementación de plan de medios

- En cuanto al alcance 5 se identifica que este no fue relacionado en el hallazgo, sin embargo, este fue revisado debido a que los valores del alcance no eran consecuentes, ya que el mismo correspondía a \$42.130.000 y no a \$30.070.000 como se indicó en el hallazgo, en cuanto a este componente se identifican las respectivas evidencias, salvo con 7 Mercados verdes campesinos que no fueron ejecutados, sin embargo, realizando las respectivas compensaciones en valor se identifica que se realizaron más actividades de las contratadas, como se describe en la conclusión.

Tabla 11 Características del contrato 140-CNT1705-36 incluyendo otro sí N° 1 vs visita técnica CGR

#	Descripción	Unidad de medida	Información contractual			Visita CGR Con ajuste de encuentros formativos			
			Cantidad	Valor por Unidad de Medida	Valor Total por producto	Cantidad	Valor por Unidad de Medida	Valor Total por producto	
5	Alcance 5.	Diseño e implementación de plan de medios							
5,1	Actividad 1.	Pendón	Pendón	5	\$84.000	\$420.000	5	\$84.000	\$420.000
5,2	Actividad 2.	Pieza comunicacional	Pieza	1	\$6.300.000	\$6.300.000	1	\$6.300.000	\$6.300.000
5,3	Actividad 3.	Mercados verdes campesinos	Evento	35	\$450.000	\$15.750.000	31	\$450.000	\$13.950.000
5,4	Actividad 4.	Evento de socialización	Evento	1	\$1.300.000	\$1.300.000	1	\$1.300.000	\$1.300.000
5,5	Actividad 5.	Encuentro final	Evento	1	\$2.000.000	\$2.000.000	1	\$2.000.000	\$2.000.000
5,1	Otro si	Pendón	pendón	3	\$80.000	\$240.000	3	\$80.000	\$240.000
5,2	Otro si	Pieza comunicacional	pieza	1	\$4.200.000	\$4.200.000	1	\$4.200.000	\$4.200.000
5,3	Otro si	Mercados verdes campesinos	evento	8	\$490.000	\$3.920.000	5	\$490.000	\$2.450.000
5,5	Otro si	Encuentro final hogares adición	evento	4	\$2.000.000	\$8.000.000	4	\$2.000.000	\$8.000.000
Total, Alcance 5						\$42.130.000			\$38.860.000

Fuente: Información contractual y expedientes físicos de CEAM

7. Conclusiones

Durante la visita realizada los días 17, 18 y 19 de julio de 2024, se logró identificar que el expediente físico del contrato se encuentra con todas las evidencias de la ejecución del mismo incluido otro sí, y la información presentada a la CGR el DVD, CDs, memorias, OneDrive contaba con inconvenientes al momento de ser leídos, por lo que se requirió el desplazamiento a ver las carpetas.

Al revisar los expedientes físicos se logra identificar que el contrato fue ejecutado en un 100%, salvo algunas actividades que fueron modificadas de acuerdo a la dinámica de un contrato con comunidades rurales, sin embargo, como se describe en la siguiente tabla donde se consolidan todas las fases (contrato y otro sí), alcances y actividades se logra identificar que, el contrato contemplaba un valor de \$536.407.560 y el sustentado durante la visita es de \$538.675.474, lo que indica que se dio una ejecución superior a lo contratado por \$ 2.267.914.

Tabla 12 Características del contrato 140-CNT1705-36 incluyendo otro sí N° 1 vs visita técnica CGR

#	Descripción	Unidad de medida	Información contractual			Visita CGR Con ajuste de encuentros formativos			
			Cantidad	Valor por Unidad de Medida	Valor Total por producto	Cantidad	Valor por Unidad de Medida	Valor Total por producto	
0	Alcance 0.	Contratación							
0,1	Actividad 1.	(Un) Coordinadora	Mes	8	\$5.500.000	\$44.000.000	8	\$5.500.000	\$44.000.000
0,2	Actividad 2.	(Un) Profesional: Área social	Mes	7	\$4.600.000	\$32.200.000	7	\$4.600.000	\$32.200.000
0,3	Actividad 3.	(Un) Profesional: Ingeniero forestal	Mes	3	\$4.600.000	\$13.800.000	3	\$4.600.000	\$13.800.000
0,4	Actividad 4.	(Un) Tecnólogo de campo	Mes	7	\$2.500.000	\$17.500.000	7	\$2.500.000	\$17.500.000
0,5	Actividad 5.	(Cinco) Técnicos de campo	Mes	30	\$2.400.000	\$72.000.000	30	\$2.400.000	\$72.000.000
0,4	Otro si	Tecnólogo	Mes	4	\$2.500.000	\$10.000.000	4	\$2.500.000	\$10.000.000
0,3	Otro si	Profesional: Área Forestal	Mes	5	\$4.300.000	\$21.500.000	5	\$4.300.000	\$21.500.000
0,5	Otro si	Técnicos de campo	Contratos	4	\$11.000.000	\$44.000.000	4	\$11.000.000	\$44.000.000
Total, Alcance 0						\$255.000.000			\$255.000.000
1	Alcance 1.	Acompañamiento de (1200) Hogares ecológicos establecidos en procesos anteriores							
1,1	Actividad 1.	Visitas de caracterización, acompañamiento y evaluación	Visitas	120	\$25.000	\$3.000.000	438	\$25.000	\$10.950.000
1,2	Actividad 2.	Transporte para entrega de insumos KIT	Viajes - municipios	20	\$180.000	\$3.600.000	20	\$180.000	\$3.600.000
1,3	Actividad 3.	Encuentros formativos	Encuentros	200	\$100.000	\$20.000.000	200	\$100.000	\$20.000.000
1,4	Actividad 4.	Kit fortalecimiento hogares ecológicos	Kit	200	\$115.000	\$23.000.000	359	\$115.000	\$41.285.000
Total, Alcance 1						\$49.600.000			\$75.835.000
2	Alcance 2.	Establecimiento de 200- Hogares Ecológicos nuevos							
2,1	Actividad 1.	Visitas de caracterización, acompañamiento y evaluación	Visitas	100	\$25.000	\$2.500.000	211	\$25.000	\$5.275.000
2,2	Actividad 2.	Transporte para entrega de insumos KIT	Viajes	20	\$180.000	\$3.600.000	20	\$180.000	\$3.600.000

#	Descripción		Unidad de medida	Información contractual			Visita CGR Con ajuste de encuentros formativos		
				Cantidad	Valor por Unidad de Medida	Valor Total por producto	Cantidad	Valor por Unidad de Medida	Valor Total por producto
2,3	Actividad 3.	Encuentros de formación	Encuentros	200	\$100.000	\$20.000.000	200	\$100.000	\$20.000.000
2,4	Actividad 4.	Kit establecimiento y fortalecimiento hogares establecidos	Paquetes	200	\$115.000	\$23.000.000	138	\$115.000	\$15.870.000
2,5	Actividad 5.	Kit de indumentaria para nuevas familias participantes (gorra y camiseta)	Paquetes	220	\$51.935	\$11.425.700	378	\$51.935	\$19.631.430
2,6	Actividad 6.	Bitácora de campo	Bitácora	200	\$25.000	\$5.000.000	378	\$25.000	\$9.450.000
2,1	Otro si	Visitas de caracterización, acompañamiento y evaluación	visitas	300	\$25.000	\$7.500.000	343	\$25.000	\$8.575.000
2,2	Otro si	Transporte para entrega de insumos- KIT	viajes- Municipio	13	\$240.000	\$3.120.000	13	\$240.000	\$3.120.000
2,3	Otro si	Encuentros formativos de hogares ecológicos (encuentros por núcleo*12)	encuentros nucleados familias	144	\$100.000	\$14.400.000	144	\$100.000	\$14.400.000
2,4	Otro si	Kit fortalecimiento hogares establecidos	kit	220	\$125.000	\$27.500.000	149	\$125.000	\$18.625.000
2,5	Otro si	Kit de indumentaria para nuevas familias participantes (gorra y camiseta)	kit	220	\$51.963	\$11.431.860	188	\$51.963	\$9.769.044
2,6	Otro si	Bitácora de campo	bitácora	220	\$25.000	\$5.500.000	131	\$25.000	\$3.275.000
Total, Alcance 2						\$134.977.560	554		\$128.315.474
3	Alcance 3.	Actividad de Restauración ecológica mediante reforestación							
3,1	Actividad 1.	Visitas de asesoría en restauración ecológica	Visitas	50	\$25.000	\$1.250.000	42	\$25.000	\$1.050.000
3,2	Actividad 2.	Kit restauración ecológica con hogares (abonos, material vegetal y materiales para restauración)	Kit	200	\$100.000	\$20.000.000	200	\$100.000	\$20.000.000
3,1	Otro si	Visitas de asesoría en restauración ecológica	visitas	122	\$25.000	\$3.050.000	67	\$25.000	\$1.675.000
3,2	Otro si	Kit restauración ecológica con hogares	kit	110	\$100.000	\$11.000.000	40	\$100.000	\$4.000.000
Total, Alcance 3						\$35.300.000			\$26.725.000
4	Alcance 4.	Fortalecimiento de red de promotores ecológicos rurales							
4,1	Actividad 1.	Encuentros de fortalecimiento y acompañamiento de para promotores (apoyo logístico)	Encuentros promotores	94	\$100.000	\$9.400.000	94	\$100.000	\$9.400.000

#	Descripción		Unidad de medida	Información contractual			Visita CGR Con ajuste de encuentros formativos		
				Cantidad	Valor por Unidad de Medida	Valor Total por producto	Cantidad	Valor por Unidad de Medida	Valor Total por producto
4,2	Actividad 2.	Kit de indumentaria para promotores antiguos camiseta	Kit	200	\$30.000	\$6.000.000	18	\$30.000	\$540.000
4,3	Actividad 3.	Encuentro de intercambio de semillas	Evento	1	\$2.000.000	\$2.000.000	1	\$2.000.000	\$2.000.000
4,4	Actividad 4.	Encuentro de buenas prácticas ambientales	Evento	1	\$2.000.000	\$2.000.000	1	\$2.000.000	\$2.000.000
Total, Alcance 4						\$19.400.000			\$13.940.000
5	Alcance 5. Diseño e implementación de plan de medios								
5,1	Actividad 1.	Pendón	Pendón	5	\$84.000	\$420.000	5	\$84.000	\$420.000
5,2	Actividad 2.	Pieza comunicacional	Pieza	1	\$6.300.000	\$6.300.000	1	\$6.300.000	\$6.300.000
5,3	Actividad 3.	Mercados verdes campesinos	Evento	35	\$450.000	\$15.750.000	31	\$450.000	\$13.950.000
5,4	Actividad 4.	Evento de socialización	Evento	1	\$1.300.000	\$1.300.000	1	\$1.300.000	\$1.300.000
5,5	Actividad 5.	Encuentro final	Evento	1	\$2.000.000	\$2.000.000	1	\$2.000.000	\$2.000.000
5,1	Otro si	Pendón	pendón	3	\$80.000	\$240.000	3	\$80.000	\$240.000
5,2	Otro si	Pieza comunicacional	pieza	1	\$4.200.000	\$4.200.000	1	\$4.200.000	\$4.200.000
5,3	Otro si	Mercados verdes campesinos	evento	8	\$490.000	\$3.920.000	5	\$490.000	\$2.450.000
5,5	Otro si	Encuentro final hogares adición	evento	4	\$2.000.000	\$8.000.000	4	\$2.000.000	\$8.000.000
Total, Alcance 5						\$42.130.000			\$38.860.000
TOTALES DEL CONTRATO						\$536.407.560			\$538.675.474

Fuente: Información contractual y expedientes físicos de CEAM

8. Documentos generados

Radicado	Fecha	Asunto
2023IE0104955	04/10/2023	Solicitud Apoyo Técnico – PRF 80052-2022-41262– CORANTIOQUIA
2023IE0110889	20/10/2023	Solicitud Apoyo Técnico – PRF 80052-2022-41262– CORANTIOQUIA
2024EE0042100	07/03/2024	Solicitud de expediente relacionados con el PRF 80052-2022
2024ER0048815	11/03/2024	Respuesta a requerimiento de expediente PRF 80052-2022-41262-CORANTIOQUIA-Contrato 140-CNT1705-36
2024IE0068134	25/06/2024	Solicitud de Prórroga para realizar apoyo técnico en atención al proceso de Responsabilidad Fiscal PRF 80052-2022-41262– CORANTIOQUIA.
2024EE0118194	25/06/2024	Solicitud de información del contrato 140-CNT1705-36 relacionado con el PRF 80052-2022-41262– CORANTIOQUIA y comunicación de visita a CEAM.

9. Anexos

Anexo 1: Matriz de visita técnica (Alcances y actividades)

Anexo 2: Autorización de comisión y legalización de viáticos

Anexo 3: Respuesta a solicitud de información 2024EE0042100 del 07/03/2024

Anexo 4: Respuesta a solicitud de información 2024EE0118194 del 25/06/2024

Anexo 5: Información presentada en la visita
