Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
Magistrada Claudia Patricia Alonso Pérez

Expediente Judicial

Datos de Clasificación (TRD)
Serie: 270
Subserie: 50

Datos de Contenido
No. Proceso:

50001-23-33-000-2020-00062-00

No. Cuadernos: _____
Cuaderno: 3 Folios: _____

Partes Procesales

Parte A:
ECOPETROL S.A.

Apoderado:
JAVIER ALEJANDRO MARIN BERMUDEZ
regionaljuridicaorinoquia@ecopetrol.com.co;
javieral.marin@ecopetrol.com.co

Parte B:
CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA, INDUSTRIA DE EXPLOTACION MINERA Y PETROLERA INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Procurador: 48
Tipo de Proceso:

Controversia Contractual

Fecha Inicio: 24/02/2020
Ubicación: _____

2020-00062-00

406

ecopetrol	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		
	ECP-UAB-F-015	Elaborado 13/08/2011	Versión: 2

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS Nro 3

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA-CHICHIMENE
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012
VALOR PRESENTE ACTA	CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS COLOMBIANOS ($ 4.468.492.200) SIN IVA

Mediante la suscripción de la presente Acta:

a) INDEPENDENCE DRILLING S.A., en adelante el CONTRATISTA, representado por JOSE HUBER SILVA ROJAS, mayor de edad, vecino de la ciudad de BOGOTA, identificado con C.C. Nº 18.109.052 DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y

b) LUIS JOSE ALMEIDA PINZON identificado con Cédula de Ciudadanía número 13.616.903 DE PUENTE NACIONAL , quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

Dejan constancia de que,

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012, prestó los servicios contemplados en el contrato MA-0009346 que se relaciona en la presente acta de recibo de cantidades. El valor del servicio prestado en el periodo es el siguiente:

Cantidades Equipo 550 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización Inicial	0,00	$ 350.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	0,00	$ 350.000.000	$ 0
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	2,00	$ 14.075.000	$ 28.150.000
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	2,00	$ 33.500.000	$ 67.000.000
1.5	Movilización entre pozos 10,1-30 km	7,00	$ 40.000.000	$ 280.000.000

1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	1,00	$ 60.000.000	$ 60.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 78.000.000	$ 0
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 90.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	82,65	$ 24.400.000	$ 2.016.562.400
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	31,35	$ 24.300.000	$ 761.902.20
2.3	Stand by	0,13	$ 18.000.000	$ 2.250.000
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	35,00	$ 1.300.000	$ 45.500.000
3.2	Campero sin conductor	12,00	$ 250.000	$ 3.000.000
3.3	Campero con conductor	60,00	$ 350.000	$ 21.000.000
3.4	Tarifa de planta	12,00	$ 450.000	$ 5.400.000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	11,00	$ 8.500.000	$ 93.500.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	0,00	$ 160.000	$ 0
3.7	Construcción de anclajes	0,00	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	95,00	$ 280.000	$ 26.600.000
3.9	Container adicional	0,00	$ 280.000	$ 0
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	13,00	$ 4.370.000	$ 56.810.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	62,00	$ 400.000	$ 24.800.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	1,00	$ 28.000.000	$ 28.000.000
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0,00	$ 250.000	$ 0
	TOTAL			$ 3.520.974.600

Cantidades Equipo 350 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	0,00	$ 360.000.000	$ -
1.2	Movilización final	0,00	$ 360.000.000	$ -

ecopetrol	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		
	ECP-UAB-F-015	Elaborado 13/08/2011	Versión: 2

				-
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	0,00	$ 28.000.000	$ -
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	2,00	$ 30.500.000	$ 61.000.000,00
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	3,00	$ 38.500.000	$ 115.500.000,00
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	0,00	$ 63.500.000	$ -
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 76.600.000	$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 84.000.000	$ -
2.1	Equipo activo con cuadrilla	24,88	$ 23.200.000	$ 577.100.000,00
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	2,90	$ 23.100.000	$ 66.897.600,00
2.3	Stand by	0,00	$ 18.000.000	$ -
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	7,00	$ 1.300.000	$ 9.100.000,00
3.2	Campero sin conductor	0,00	$ 250.000	$ -
3.3	Campero con conductor	0,00	$ 350.000	$ -
3.4	Tarifa de planta	9,00	$ 450.000	$ 4.050.000,00
3.5	Tarifa de circulación de pozos	0,00	$ 8.500.000	$ -
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	0,00	$ 160.000	$ -
3.7	Construcción de anclajes	0,00	$ 1.800.000	$ -
3.8	Obrero de patio adicional	16,00	$ 280.000	$ 4.480.000,00
3.9	Container adicional	93,00	$ 280.000	$ 26.040.000,00
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	5,00	$ 4.370.000	$ 21.850.000,00
3.11	Frac tank - 500 bbl	155,00	$ 400.000	$ 62.000.000,00
3.12	Tractomula adicional con cama alta	0,00	$ 28.000.000	$ -
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0,00	$ 250.000	$ -
	TOTAL			$ 948.017.600,00

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el COORDINADOR DE GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO.

En constancia, se firma en Villavicencio 21 de Septiembre de 2012, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

Por el CONTRATISTA
JOSE HUBER SILVA ROJAS
INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Por la GESTION TÉCNICA
LUIS JOSE ALMEIDA PINZON ECOPETROL S.A.

408

	ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL DE OBRA/SERVICIO		
ECOPETROL	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		
	ECP-UCN-F-020	Elaborado 30/09/2011	Versión: 2

ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL DE SERVICIO Nº 3 AL CONTRATO MA-0009346

CONTRATO:	**MA-0009346**
OBJETO DEL CONTRATO	**"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014, CON OPCION 2015-2016"**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**($122.351.947.960)** CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCEINTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESETA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	1005 DÍAS CALENDARIOS O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, LO QUE PRIMERO QUE OCURRA
MAYOR CANTIDAD 1	**($ 5.957.053.280)**CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
MAYOR CANTIDAD 2	**($ 4.049.217.320)**CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICIONALES	**($132.358.218.560)**CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR IVA
VALOR ACTUAL	**($106.040.851.457)** CIENTO SEIS MIL CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR IVA.
VALOR EJECUTADO	**($16.311.096.503.)** DIECISEIS MIL TRESCIENTOS ONCE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRES PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR IVA
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	09/06/2012
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO:	31/12/2014
FECHA DE CORTE:	15/9/2012
PORCENTAJE DE PAGO:	13.33%
ADMINISTRADOR:	LUIS ENRIQUE SARMIENTO TIRADO
GESTOR DELCONTRATO:	COPCO S.A.
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Mediante la suscripción de la presente Acta:

a) **INDEPENDENCE DRILLING S.A,** que para todos los efectos legales y para los de este documento se denomina el CONTRATISTA, **JOSE HUBER SILVA ROJAS** mayor de edad, identificado con Cédula 18.109.052, quien actúa en su calidad de representante autorizado de la empresa. Y

b) **LAURA JULIANA NIÑO FLOREZ** identificado con Cédula de Ciudadanía número 63.510.108 de Bucaramanga, quien actúa en su calidad de GESTOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

Dejan constancia de que,

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el **16 DE Agosto de 2012 al 15 de Septiembre de 2012**, prestó los servicios contemplados en el contrato **No. MA-0009346** que se relaciona en la presente acta de liquidación parcial de servicio. El valor del servicio prestado en el periodo es el siguiente:

Liquidación parcial Nro	Valor liquidado 2ª acta	Saldo del contrato	Valor pagado acumulado	% ejecución
1	$ 6.843.563.003	$ 115.508.384.957	$ 6.843.563.003	5.59%
2	$ 3.476.839.100	$ 112.031.545.857	$ 10.320.402.103	8.44%
2.1	$ 1.522.202.200	$ 110.509.343.657	$ 11.842.604.303	9.68%
3	$ 4.468.492.200	$ 106.040.851.457	$ 16.311.096.503	13.33%

- La presente Acta sirve de base para la presentación de la correspondiente factura o cuenta de cobro por parte del CONTRATISTA.
- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el GESTOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

En constancia, se firma en Castilla a los 21 días del mes de Septiembre del 2012, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

Por el CONTRATISTA
JOSE HUBER SILVA ROJAS
Representante Autorizado.

Por la GESTION ADMINISTRATIVA
LAURA JULIANA NIÑO FLOREZ
COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY S.A.

Por ECOPETROL S.A.
LUIS ENRIQUE SARMIENTO TIRADO
Administrador del Contrato MA-0009346

409

ECOPETROL S.A.
SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA- CHICHIMENE
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 9 - CONTRATO NA-0009346

El día 21 de Septiembre de 2012, se reunieron en las oficinas del Departamento de Producción de la Superintendencia de Operaciones Castilla- Chichimene, el Ing. Huber Silva en representación de Independence Drilling S.A. y el Ingeniero Luis Jose Almeida Pinzón en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes:

Periodo de Liquidación: 16 de agosto de 2012 **AL** 15 de septiembre de 2012

Equipo 850 HP -Tanque Bomba

	TARIFAS DE MOVILIZACION					
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$	350.000.000	0.0	$ -
1.2	Movilización final		$	350.000.000	0.0	$ -
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$	14.075.000	2.0	$ 28.150.000
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$	33.500.000	2.0	$ 67.000.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$	40.000.000	7.0	$ 280.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$	60.000.000	1.0	$ 60.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$	78.000.000	0.0	$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$	90.000.000	0.0	$ -
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$	24.400.000	82.646	$ 2.016.562.400
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$	24.300.000	31.354	$ 761.902.200
2.3	Stand by	DIA	$	18.000.000	0,125	$ 2.250.000
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$	1.300.000	35.000	$ 45.500.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$	250.000	12.000	$ 3.000.000
3.3	Campero con conductor	DIA	$	350.000	60.000	$ 21.000.000
3.4	Tarifa de planta	DIA	$	450.000	12.000	$ 5.400.000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$	8.500.000	11.000	$ 93.500.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$	160.000	0.000	$ -
3.7	Construcción de anclajes	EA	$	1.800.000	0,000	$ -
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$	280.000	95.000	$ 26.600.000
3.9	Container adicional	DIA	$	280.000	0.000	$ -
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con receria)	EA	$	4.370.000	13.000	$ 56.810.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$	400.000	62.000	$ 24.800.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$	28.000.000	1.000	$ 28.000.000
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$	250.000	0.000	$ -
	SUBTOTAL				427.126	$ 3.530.474.600
	BASE GRAVABLE					281.637.960
	FACTOR DE SERVICIO					0
	TOTAL BASE GRAVABLE					281.637.960
	BASE NO GRAVABLE					$ 3.248.836.640
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					$ 3.530.474.600
	IVA BASE GRAVABLE					$ 45.082.073
	TOTAL EQUIPO DE WO 850HP					$ 3.575.556.673

Equipo 250 HP

	TARIFAS DE MOVILIZACION					
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$	360.000.000	0,00	$ -
1.2	Movilización final		$	360.000.000	0,00	$ -
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$	28.000.000	0,00	$ -
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$	30.550.000	2,00	$ 61.000.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$	38.500.000	3,00	$ 115.500.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$	63.500.000	0,00	$ -
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$	76.800.000	0,00	$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$	84.000.000	0,00	$ -
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$	22.200.000	24,66	$ 577.100.000
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$	23.100.000	2,99	$ 68.997.600
2.3	Stand by	DIA	$	18.000.000	0,00	$ -
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$	1.300.000	7,00	$ 9.100.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$	250.000	0,00	$ -
3.3	Campero con conductor	DIA	$	350.000	0,00	$ -
3.4	Tarifa de planta	DIA	$	450.000	9,00	$ 4.050.000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$	8.500.000	0,00	$ -
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$	160.000	0,00	$ -
3.7	Construcción de anclajes	EA	$	1.800.000	0,00	$ -
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$	280.000	16,00	$ 4.480.000
3.9	Container adicional	DIA	$	280.000	93,00	$ 26.040.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con receria)	EA	$	4.370.000	5,00	$ 21.850.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$	400.000	155,00	$ 62.000.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$	28.000.000	0,00	$ -
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$	250.000	0,00	$ -
	SUBTOTAL				3917,77	$ 968.017.600
	BASE GRAVABLE					78.841.968
	FACTOR DE SERVICIO					0
	TOTAL BASE GRAVABLE					78.841.968
	BASE NO GRAVABLE					$ 889.175.632
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					$ 968.017.600
	IVA BASE GRAVABLE					$ 12.324.675
	TOTAL EQUIPO DE WO					$ 980.342.275

SUBTOTAL	$ 4.468.492.200
BASE GRAVABLE	367.479.376
FACTOR DE SERVICIO	0
TOTAL BASE GRAVABLE	367.479.376
TOTAL BASE NO GRAVABLE	$ 4.111.012.824
TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE	$ 4.468.492.200
IVA BASE GRAVABLE	$ 57.196.700
TOTAL EQUIPOS DE WO 850HP -250HP- TANQUE BOMBA	$ 4.525.688.900

Ecopetrol	50%
Cuenta La Nueva	44%
Sucursal	6%
Total	100%

En constancia de lo anterior firman los representantes de las partes:

HUBER SILVA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
REPRESENTANTE DELEGADO

LUIS JOSE ALMEIDA PINZON
ECOPETROL
GESTOR TECNICO

LUIS ENRIQUE BARRIENTOS TIRADO
ECOPETROL
ADMINISTRADOR

NIT 900.110.160-7
IVA REGIMEN COMUN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION 11904 DIC. 23/2004

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 1120
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 304, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 320000122497, FECHA 2012/09/25
FACTURACION AUTORIZADA No. 2420 a la 9999 POR COMPUTADOR

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

ORIGINAL

Independence

FECHA: 25/09/2012
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 Piso 1
VILLAVICENCIO

FACTURA DE VENTA No: 3042 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN : 6749 SP

UN: PT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

CONCEPTO: ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL N°03 PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012
HOJAS DE ENTRADA
1000785350 1000785400 1000785418 1000785584 1000785607 1000785619 1000785431 1000785450 1000785464 1000785628 1000785635 1000785642 1000785475 1000785482 1000785493 1000785501 1000785538 1000785554
APROBACIONES
5000944668 5000944672 5000944674 5000944697 5000944698 5000944700 5000944701 5000944702 5000944703 5000944715 5000944716 5000944717 5000944718 5000944719 5000944720 5000944721 5000944724 5000944745
Manifestamos que Independence Drilling S.A. ha efectuado los aportes a la seguridad social por los ingresos materia de esta facturación, dando cumplimiento al monto máximo dispuesto por la ley para la base de cotización. El pago de los aportes a seguridad social respectivos se realizó bajo la planilla número 8417804438 del mes de Agosto de año 2012.

ECOPETROL S. A.
OFICINA CUENTAS
BOGOTA
25 SEP 2012
RECIBIDO

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	5,000	4.370.000	21.850.000
2.000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	DI	7.000	1.300.000	9.100.000
3.000	CONTAINER ADICIONAL	DI	93.000	280.000	26.040.000
4.000	TARIFA DE FRAC TANK	DI	155.000	400.000	62.000.000
5.000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	16.000	280.000	4.480.000
6.000	TARIFA DE PLANTA	DI	9.000	450.000	4.050.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA AL MAXIMO ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptado - Cliente

410

[illegible]
IVA REGIMEN COMUN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION 11944 DEL 23/12/04

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 1120
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 3IA, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 320009012697, FECHA 2013-06-25
FACTURACION AUTORIZADA No. 3020 a la 9999 POR COMPUTADOR

ORIGINAL

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

FECHA: - 25/09/2012
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 55 7 21 Piso 1
VILLAVICENCIO

FACTURA DE VENTA No: - 3042 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1- 2344000

No. ORDEN : 6749 SP

UN: PT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012.2013.2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

7.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 0 A 10 KM	GL	2,000	30.500.000	61.000.000
8.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 10 A 30 KM	GL	3,000	38.500.000	115.500.000
9.000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	597,000	966.667	577.100.000
10.000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	69.500	962.556	66.897.617
11.000	TARIFA DE CIRCULACION DE POZOS (INCLUYE CUADRILLA BOMBA)	DI	11.000	8.500.000	93.500.000
12.000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	2.000	4.370.000	8.740.000
13.000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	DI	14.000	1.300.000	18.200.000
14.000	TARIFA DE FRAC TANK	DI	62.000	400.000	24.800.000
15.000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	24,000	280.000	6.720.000
16.000	TARIFA DE PLANTA	DI	2,000	450.000	900.000
17.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 0 A 10 KM	GL	1,000	33.500.000	33.500.000
18.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 30 A 60 KM	GL	1,000	60.000.000	60.000.000
19.000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	461,000	1.016.667	468.683.333

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptado - Cliente

NIT. 900.110.225-3
IVA REGIMEN COMUN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION 11944 DEL 23/12/04

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 1120
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 354 TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 32000013097, FECHA 2012-06-25
FACTURACION AUTORIZADA No. 2629 a la 9999 POR COMPUTADOR

ORIGINAL

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

FECHA: - 25/09/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 Piso 1
VILLAVICENCIO

FACTURA DE VENTA No: - 3042 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN : 6749 SP

UN: PT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

20.000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	225,000	1.012.500	227.812.500
21.000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	2.000	4.370.000	8.740.000
22.000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	DI	3,000	1.300.000	3.900.000
23,000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	14,000	280.000	3.920.000
24.000	TARIFA DE PLANTA	DI	6,000	450.000	2.700,000
25.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 10 A 30 KM	GL	2.000	40.000.000	80.000.000
26.000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	335.000	1.015.155	340.077.083
27.000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	108.000	1.012.500	109.350.000
28.000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	2.000	4.370.000	8.740.000
29.000	CAMPERO SIN CONDUCTOR	DI	12.000	250.000	3.000.000
30,000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	DI	3.000	1.300.000	3.900.000
31.000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	11,000	280.000	3.080.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO. ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptado - Cliente

4-17

NIT. 860.118.188-7
IVA REGIMEN COMUN, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL# RESOLUCION 11046 DEL 23/12/04

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 1120
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 304, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 3280009126997, FECHA 2012/06/29
FACTURACION AUTORIZADA No. 2638 a la 9999 POR COMPUTADOR

ORIGINAL

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

FECHA: - 25/09/2012
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 Piso 1
VILLAVICENCIO

FACTURA DE VENTA No: - 3042 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN : 6749 SP

UN: PT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

32.000	TARIFA DE PLANTA	DI	1.000	450.000	450.000
33.000	TRACTOMULA ADICIONAL (MENSUAL)	DI	30.000	933.333	28.000.000
34.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 10 A 30 KM	GL	1.000	40.000.000	40.000.000
35.000	MOVILIZACION EN LA MISMA LOCACIÓN	GL	1.000	14.075.000	14.075.000
36.000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	231.000	1.016.667	234.850.000
37.000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	30.000	1.012.500	30.375.000
38.000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	4.000	4.370.000	17.480.000
39.000	CAMPERO CON CONDUCTOR	DI	29.000	350.000	10.150.000
40.000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	DI	8.000	1.300.000	10.400.000
41.000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	20.000	280.000	5.600.000
42.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 10 A 30 KM	GL	3.000	40.000.000	120.000.000
43.000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	439.500	1.016.667	446.825.000
44.000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	214.000	1.012.500	216.675.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA AL MAXIMO ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptado - Cliente

NIT. 860.130.158-7
IVA REGIMEN COMUN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION 11946 DEL 23/12/04

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 1438
ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIO 304, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 320000012697, FECHA 2012/04/25
FACTURACION AUTORIZADA No. 2038 a la 4999 POR COMPUTADOR

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

ORIGINAL

Independence

FECHA: 25/09/2012
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 Piso 1
VILLAVICENCIO

FACTURA DE VENTA No: 3042 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN : 6749 SP

UN: PT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOEPTROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

45.000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	3,000	4.370.000	13.110.000
46.000	CAMPERO CON CONDUCTOR	DI	31,000	350.000	10.850.000
47.000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	DI	7,000	1.300.000	9.100.000
48.000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	26,000	280.000	7.280.000
49.000	TARIFA DE PLANTA	DI	3,000	450.000	1.350.000
50.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 0 A 10 KM	GL	1,000	33.500.000	33.500.000
51.000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	517,000	1.016.667	525.616.667
52.000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	176,000	1.012.500	178.200.000
53.000	MOVILIZACION EN LA MISMA LOCACIÓN	GL	1,000	14.075.000	14.075.000
54.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 10 A 30 KM	GL	1.000	40.000.000	40.000.000
55.000	EQUIPO EN STAND BY	HR	3.000	750.000	2.250.000

TOTAL: 4.468.492.200

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptado - Cliente

412

ORIGINAL

NIT. 900.110.188-7
IVA REGIMEN COMUN. GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION RESOLUCION 11946 DEL 25/12/04

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E RCA

ACTIVIDAD ECONOMICA 1120
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 204, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 320009128997, FECHA 2012/06/25
FACTURACION AUTORIZADA No. 3020 a la 9999 POR COMPUTADOR

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

No. PAGINA: - 6 of 6

FECHA: - 25/09/2012
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 Piso 1
VILLAVICENCIO

FACTURA DE VENTA No: - 3042 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN: 6749 SP

UN: PT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012-2013.2014 CON OPCION 2015 Y 2016.


BASE GRAVADA	357.479.376
BASE NO GRAVADA:	4.111.012.824
IVA 16 %	57.196.700
TOTAL A PAGAR	4.525.688.900

CONDICIONES DE PAGO: Contado a 30 dias
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OC
HO MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100 M.L. **********

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO ES Y INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE CONRASA INTERES POR MORA AL MAXIMO. ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CIAL)

Aceptado - Cliente

CL 100 7 33 T1 P 19 - BOGOTA PBX 57-1 5 87 53 33
FAX 57-1 Ext. 1006-1007 E-MAIL : info@independence.com.co
www.independence.com.co



LIQUIDACION PARCIAL 3
CONTRATO MA-0009346

Desde 16-Aug-12 Hasta 15-Sep-12


Torre 27 - 350 HP

[illegible]								17,0			1,0							1,0	3,0
[illegible]								15,0	6,0									1,0	3,0
[illegible]								15,0	4,5									1,0	3,0
[illegible]								20,0											3,0
[illegible]								7,0	2,0										3,0
[illegible]			1,00					2,0											
[illegible]								19,0	3,0		1,0							1,0	3,0
[illegible]								21,0	3,0										3,0
[illegible]								22,0	2,0										3,0
[illegible]								14,0	7,0										3,0
[illegible]								6,0						1,0					1,0
[illegible]				1,00				6,0											
[illegible]								21,0	3,0										3,0
[illegible]								14,0	11,0					1,0					3,0
[illegible]								24,0						1,0					3,0
[illegible]								21,0	2,5										3,0
[illegible]								7,0	3,5										3,0
[illegible]				1,00															
[illegible]								18,5	1,5					1,0					3,0
[illegible]								24,0						3,0					3,0
[illegible]								20,5	2,5					1,0					3,0
[illegible]								21,5	1,5									1,0	3,0
[illegible]								19,5	1,5									1,0	3,0
[illegible]				1,00															
[illegible]								17,5	4,5									1,0	3,0
[illegible]								24,0										1,0	3,0
[illegible]								24,0			1,0							1,0	3,0
[illegible]								20,5	3,5					1,0				1,0	3,0
[illegible]								21,5	2,5										3,0
[illegible]								18,0										1,0	3,0
[illegible]			1,00					1,5											
[illegible]								22,0			1,0							1,0	3,0
[illegible]								22,0	7,0		5,0							1,0	3,0
[illegible]								22,0	1,5		6,0			1,0				1,0	3,0
[illegible]								24,0										1,0	3,0
[illegible]								24,0			1,0			1,0				1,0	3,0

[illegible] (%) [redacted]

[illegible]

[illegible]

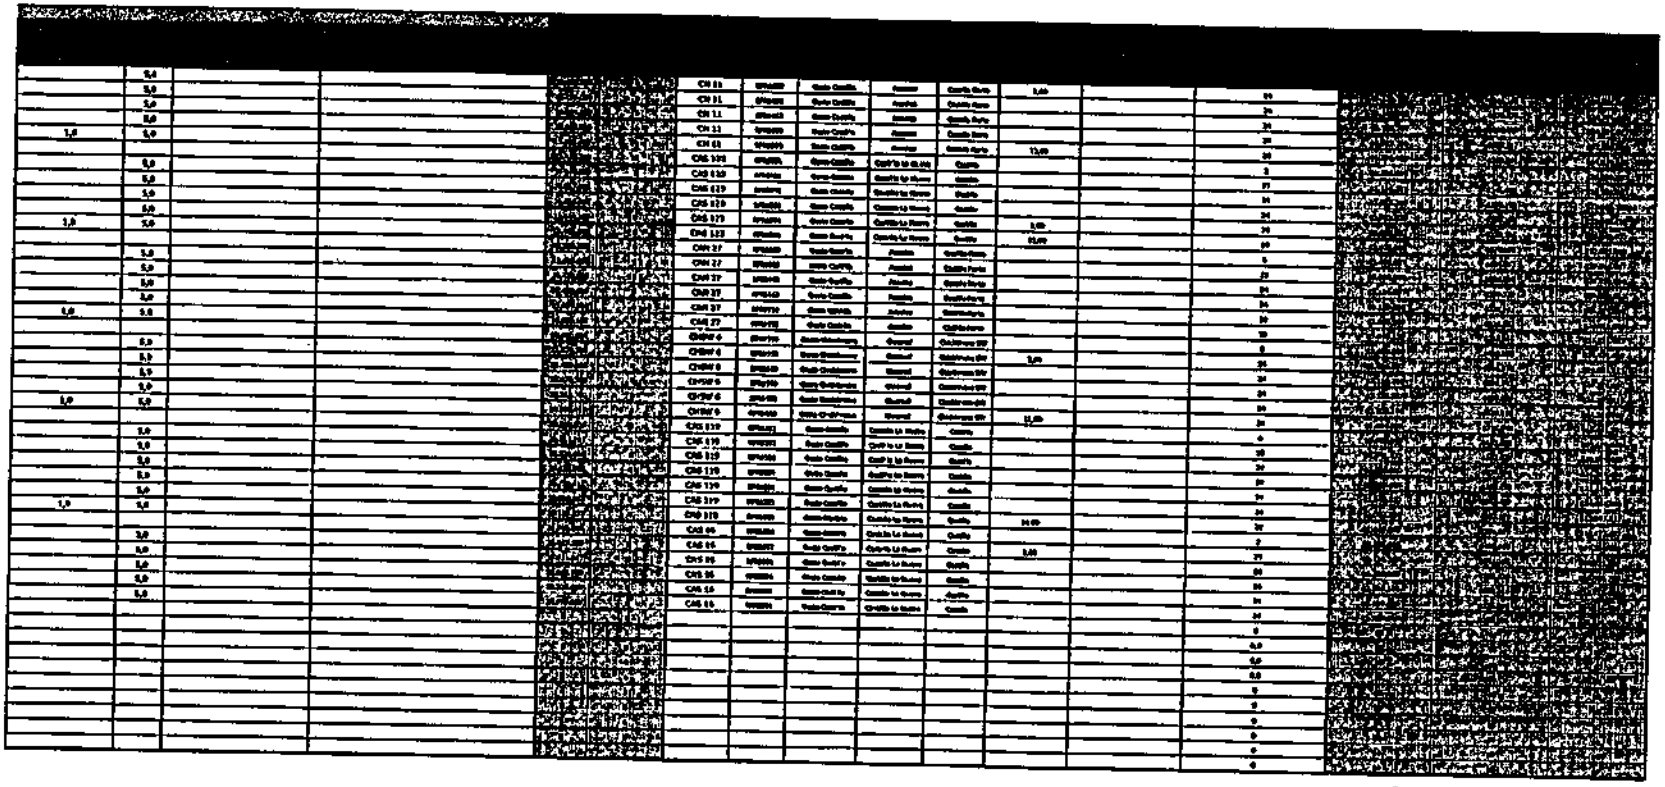


414


LIQUIDACION PARCIAL 3
CONTRATO MA-0009346

Desde 16-Aug-12 Hasta 15-Sep-12

Torre 123- 850 HP

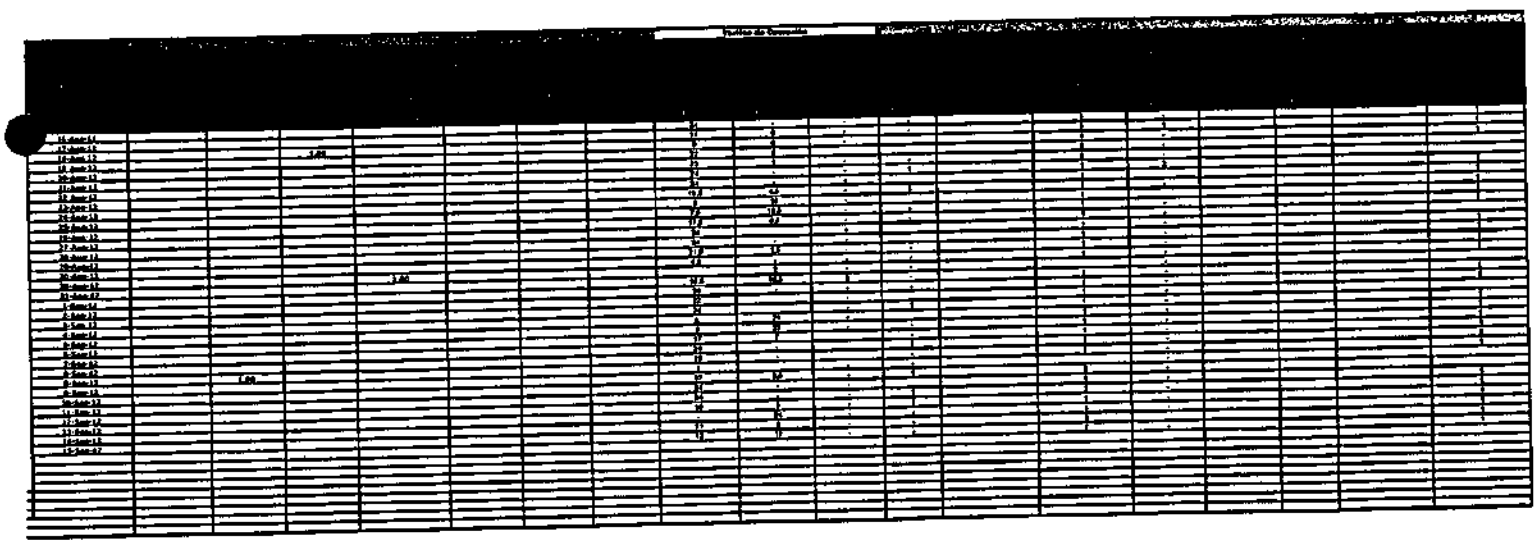

Helen Sánchez

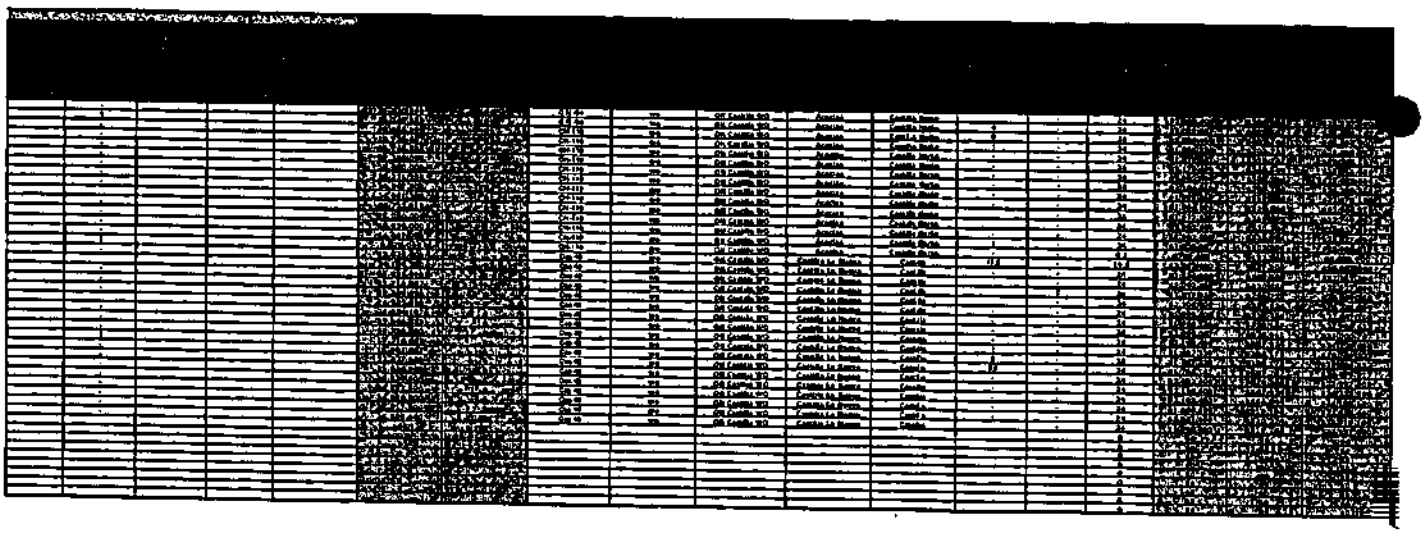


415


CONTRATO NA-0009346

Desde 16-Aug-12 Hasta 15-Sep-12

Tanque Bomba

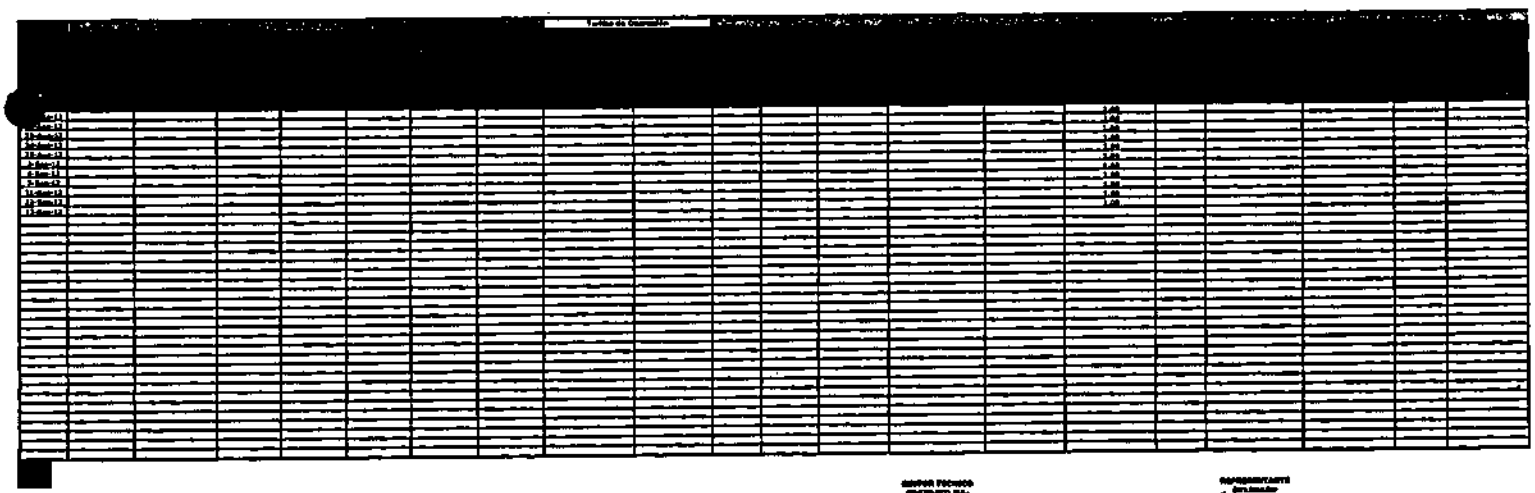


Julian Silva L

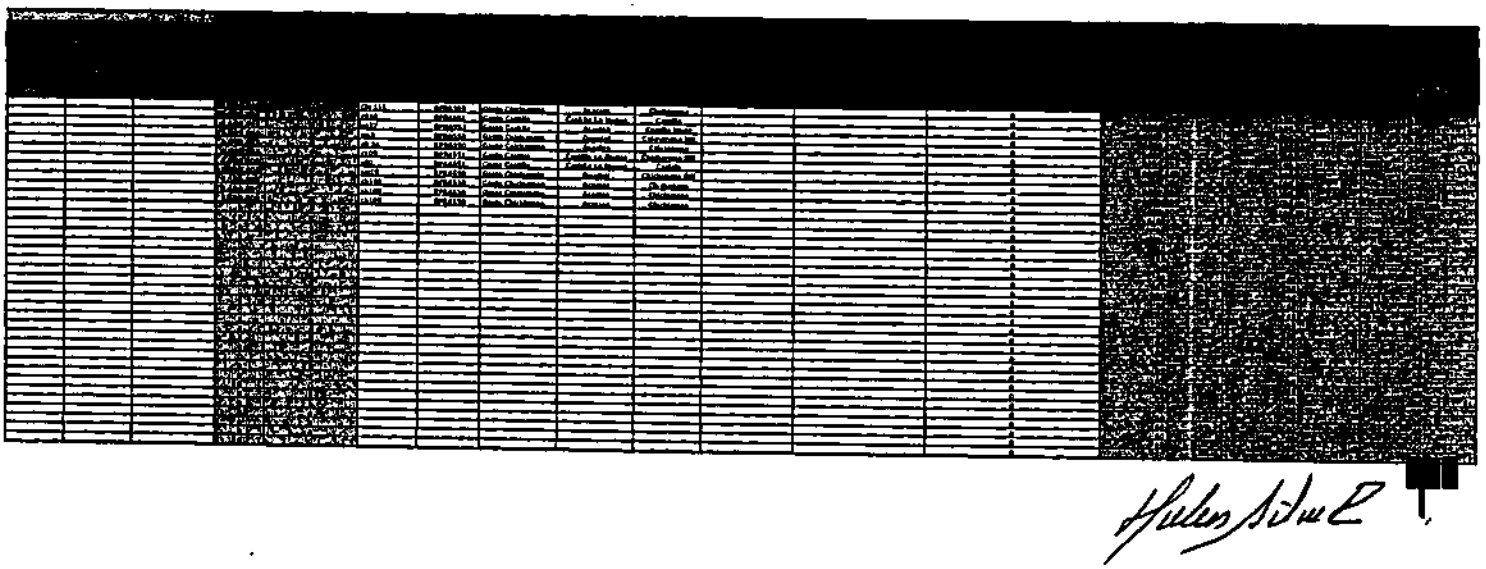

LIQUIDACION PARCIAL 3
CONTRATO MA-0009346

Desde 18-Aug-12 Hasta


Torre 31 - 550 HP

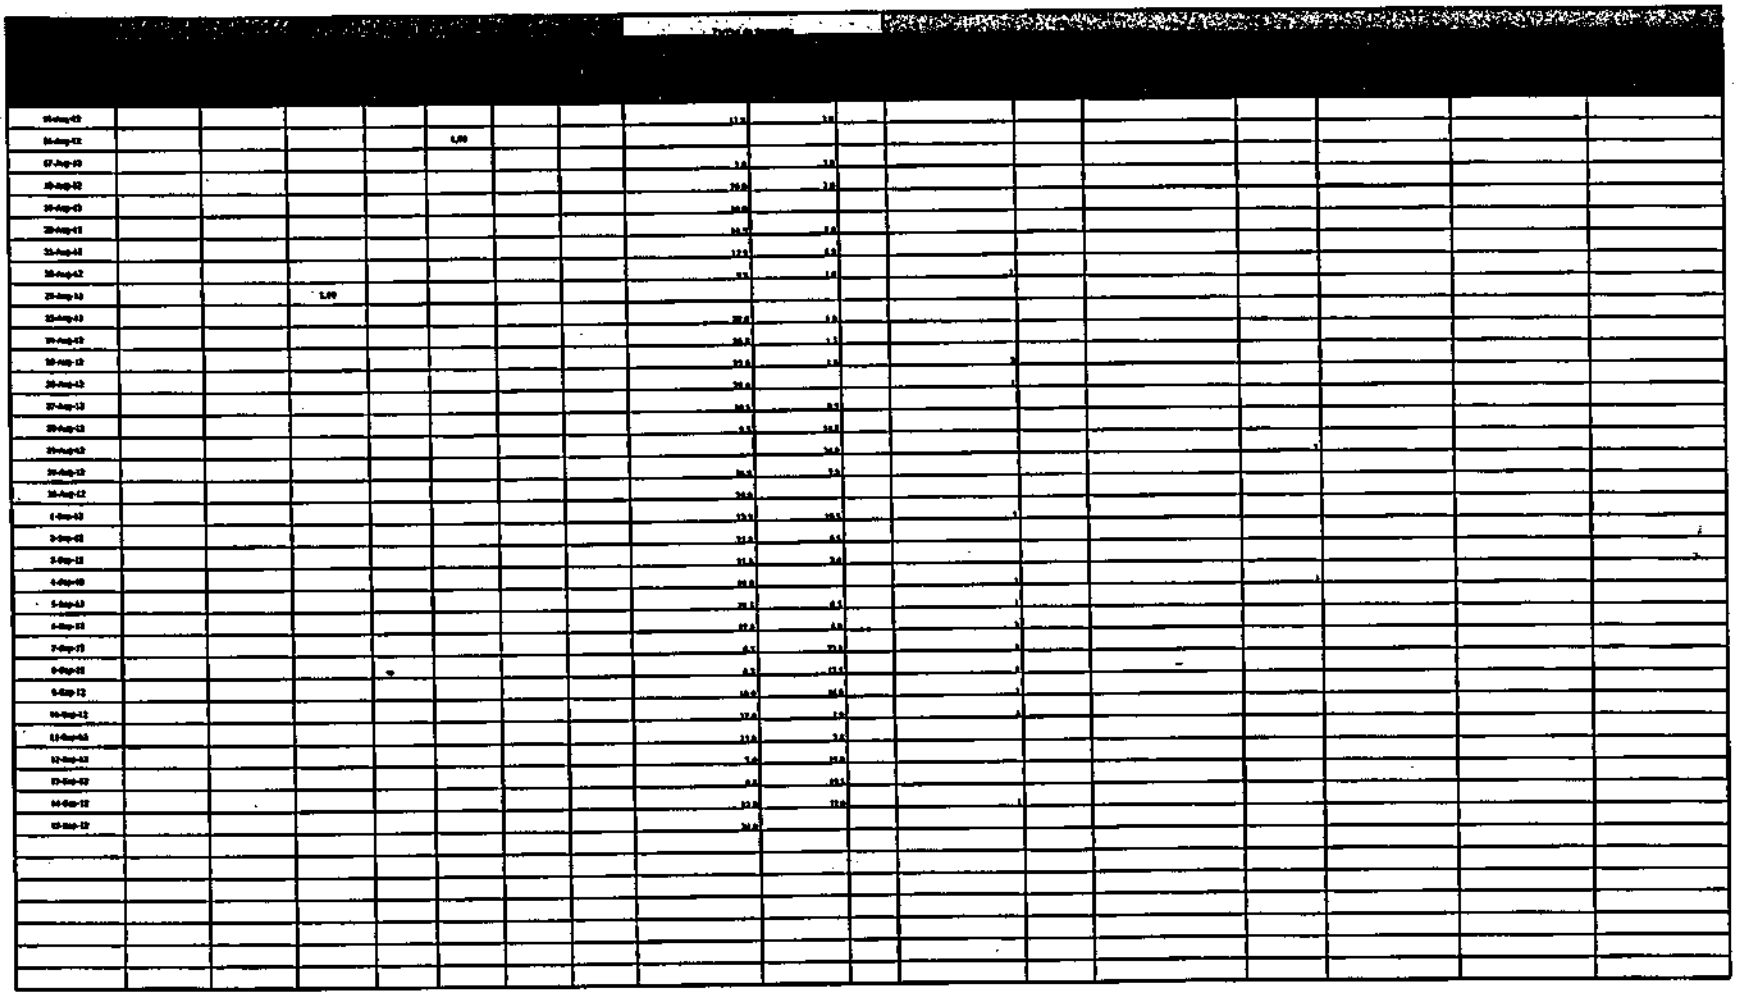



476


18-Dec-12

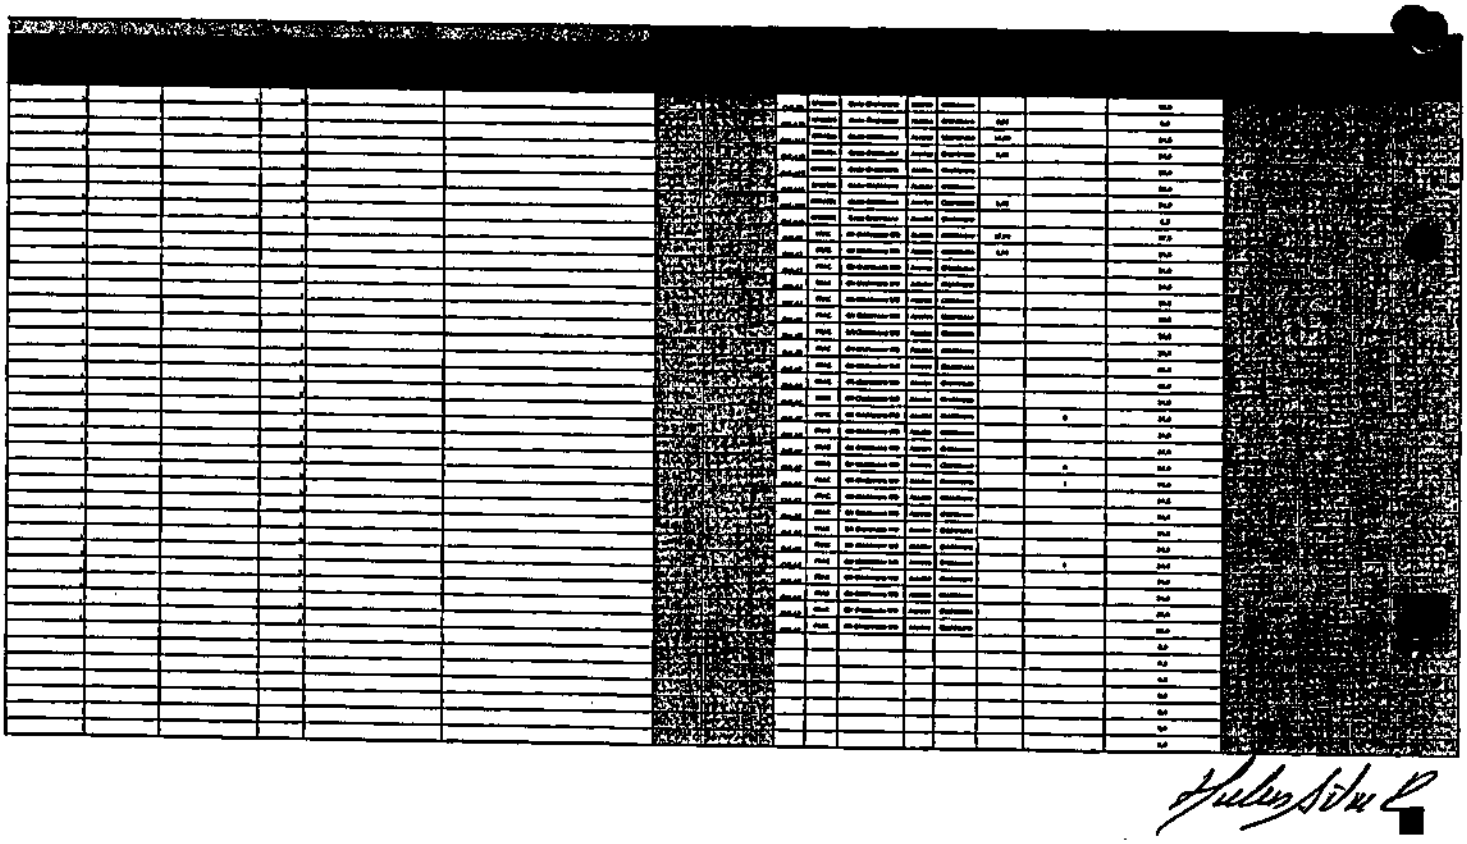

LIQUIDACION PARCIAL 3
CONTRATO MA-0000346


Desde 16-Aug-12 Hasta

Torre 32 - 850 HP

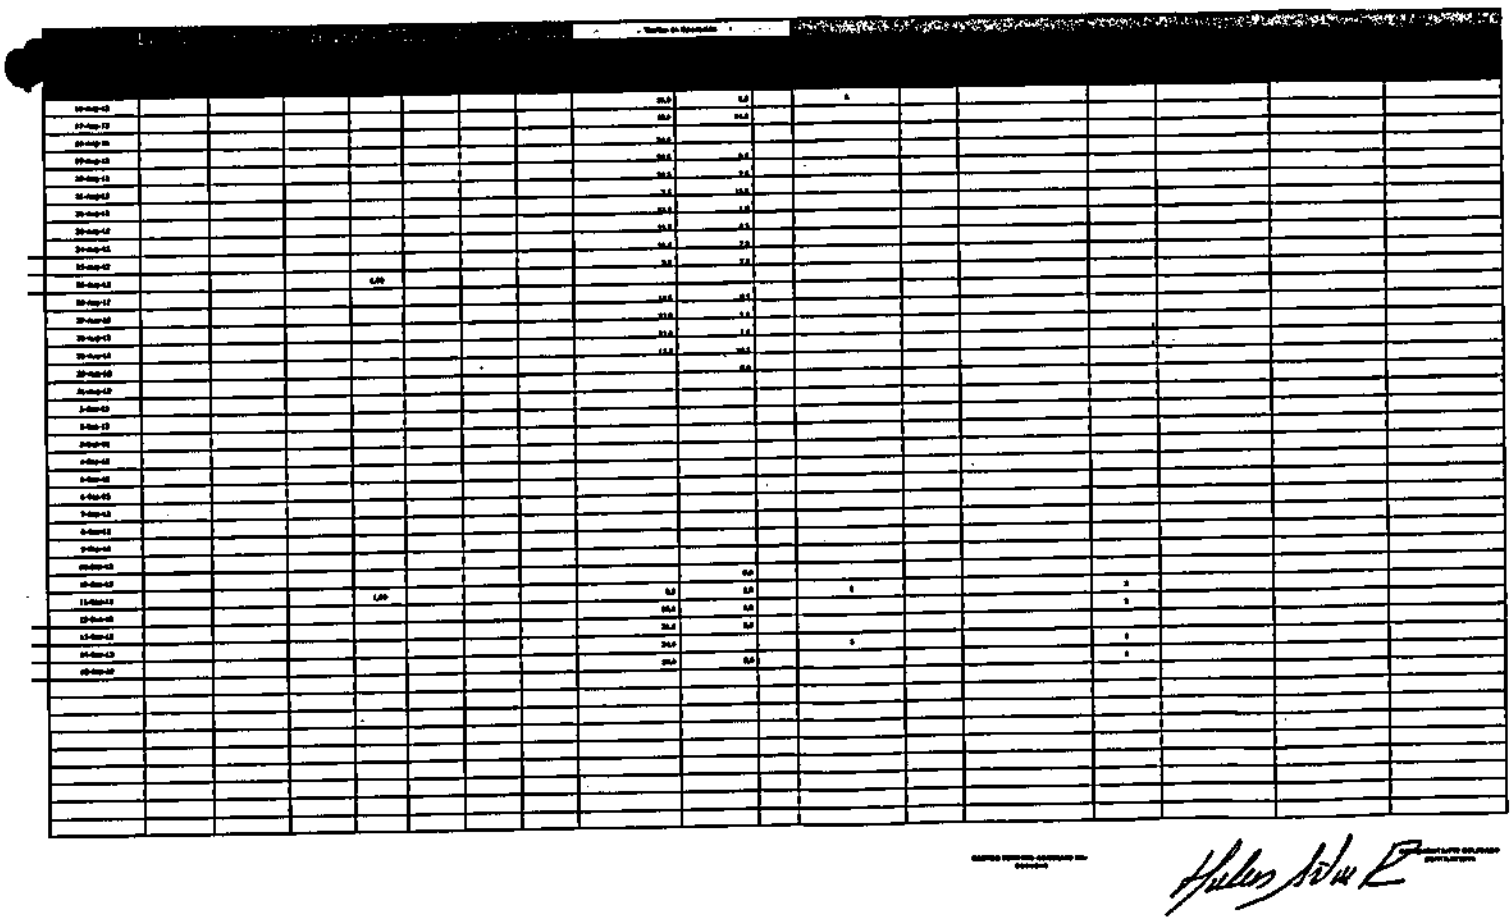

Helen Silva E

18-Sep-12

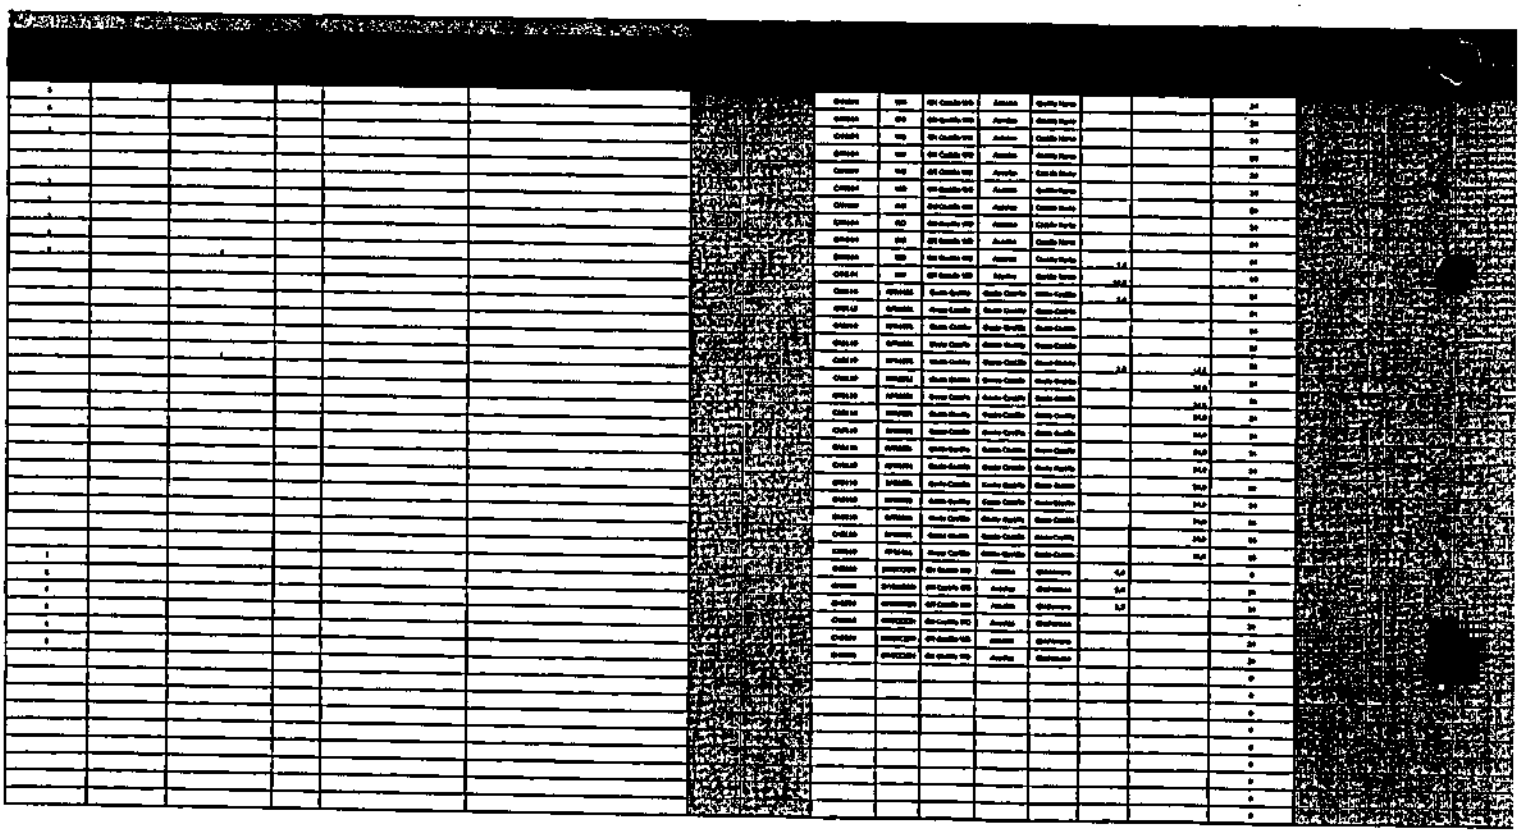


418

LIQUIDACION PARCIAL 2
CONTRATO HA-4003346


Desde 16-Aug-12 Hasta

Torre 34 - 250 HP

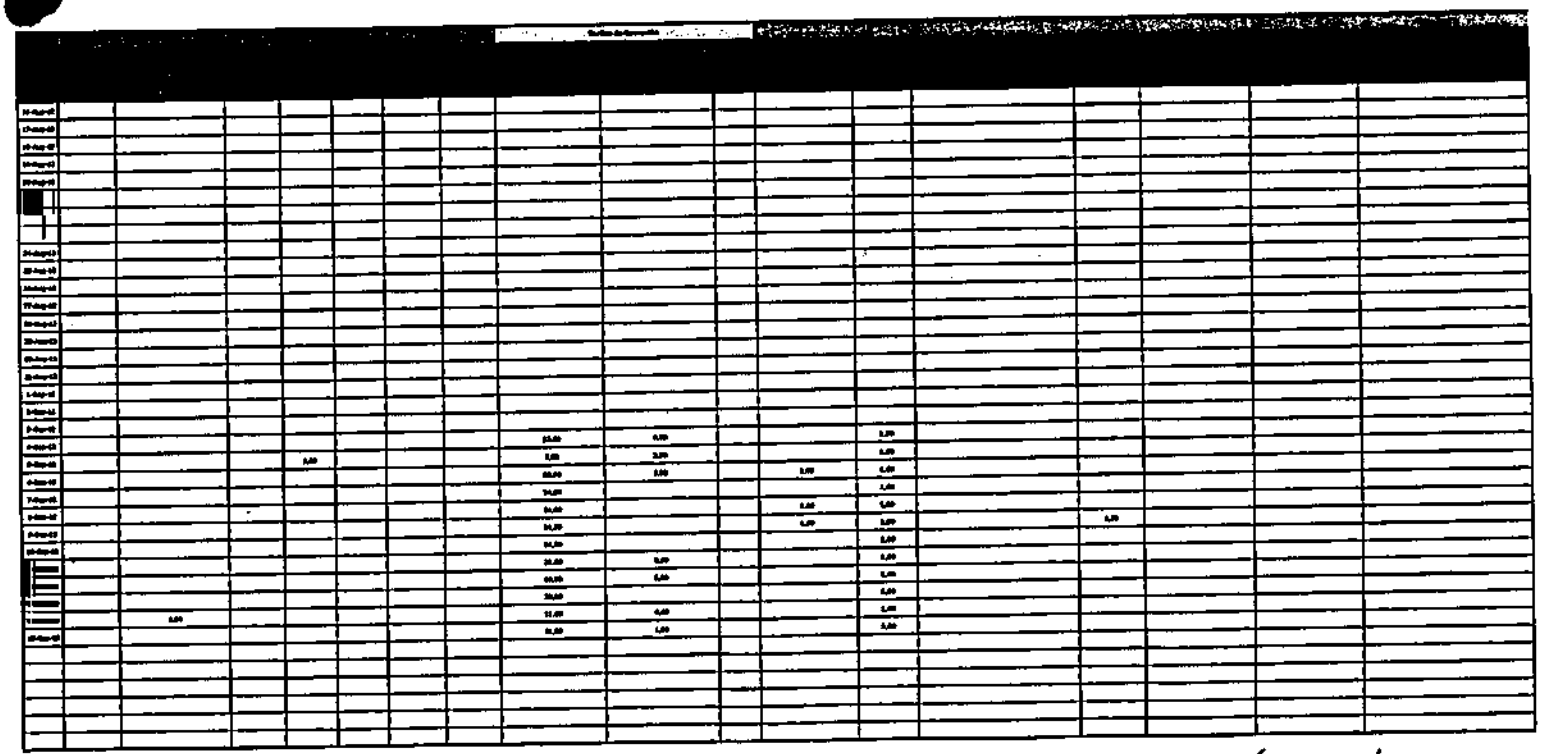

Julian Sitar L

15-Sep-12

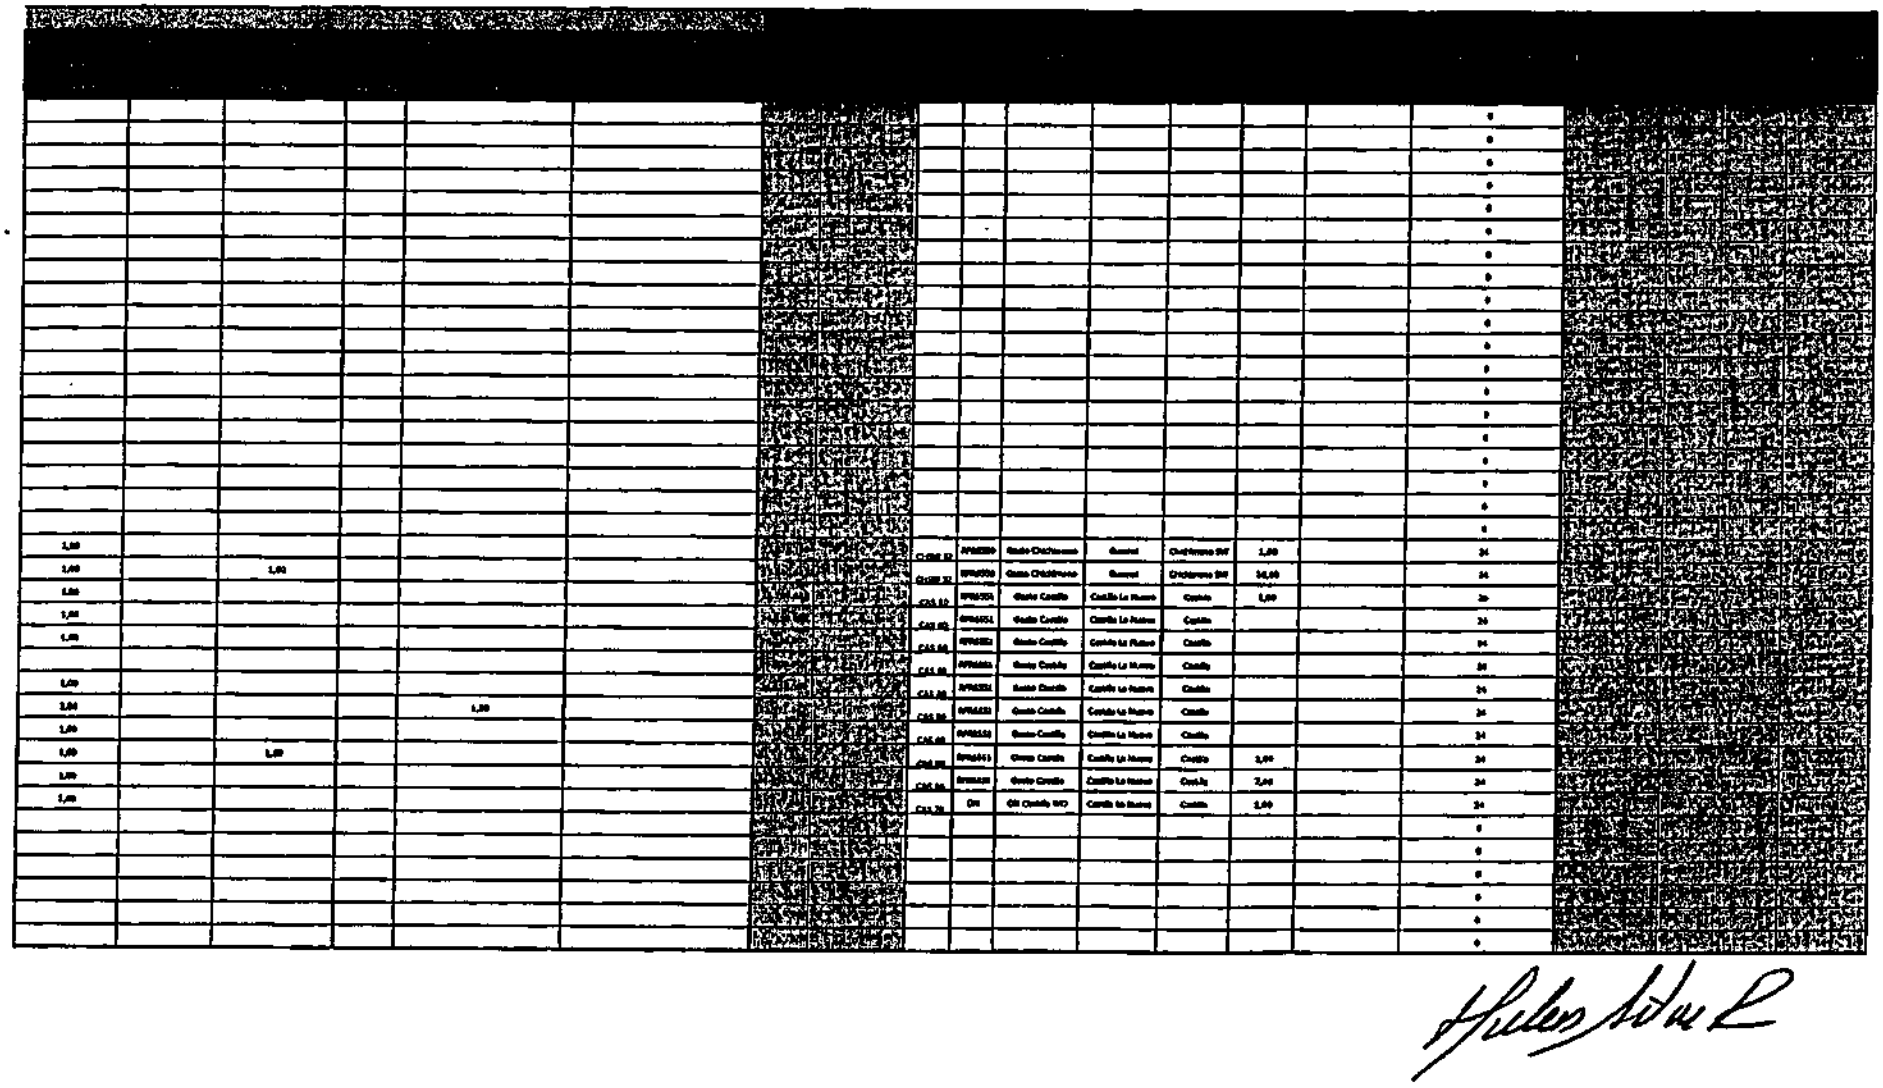


LIQUIDACION PARCIAL 3
CONTRATO HA-0000346

Desde 16-Aug-12


Torre 42 - 856 HP

Hasta

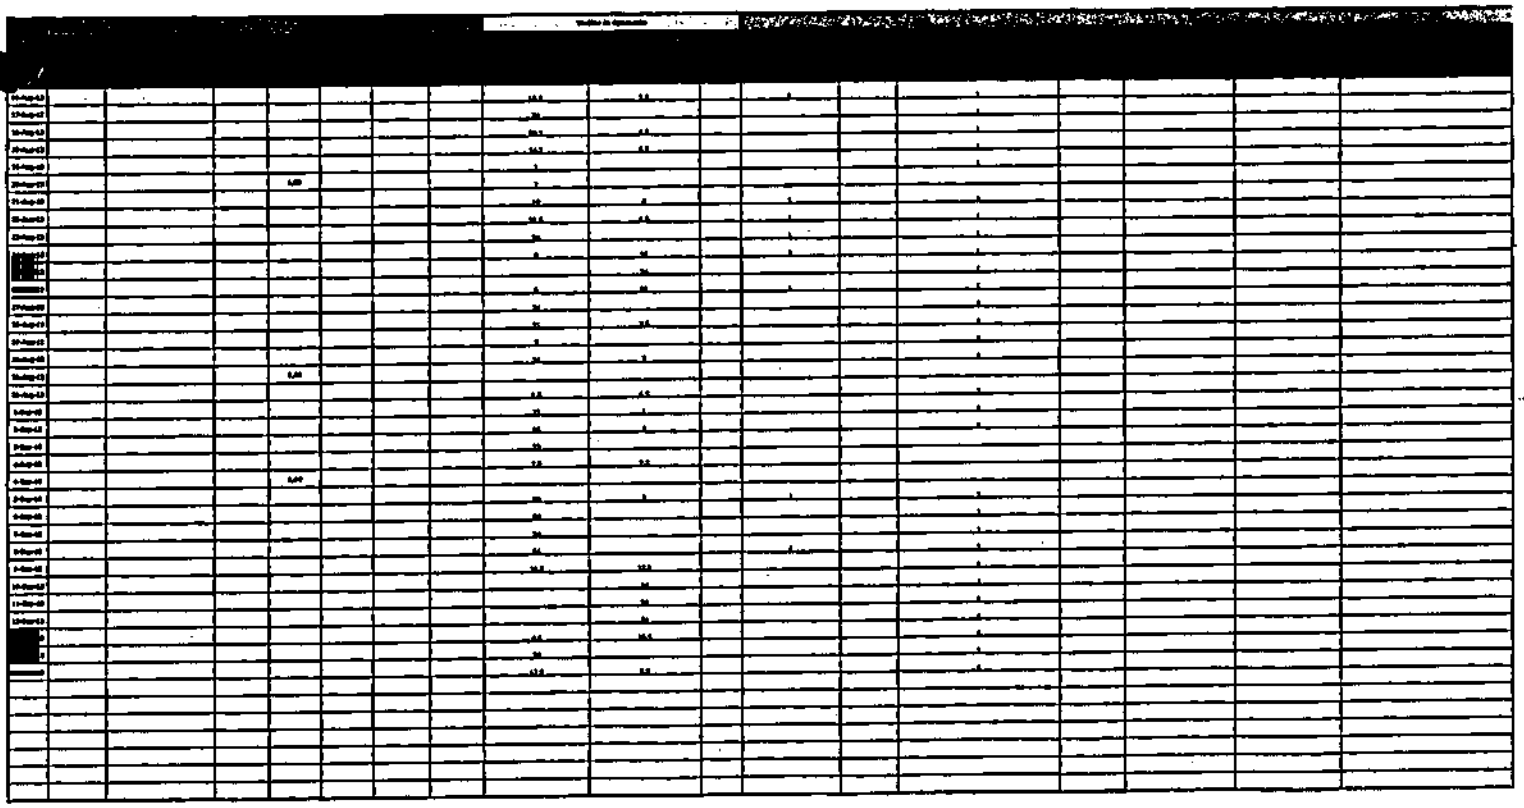

Julio Silva R

15-Sep-12

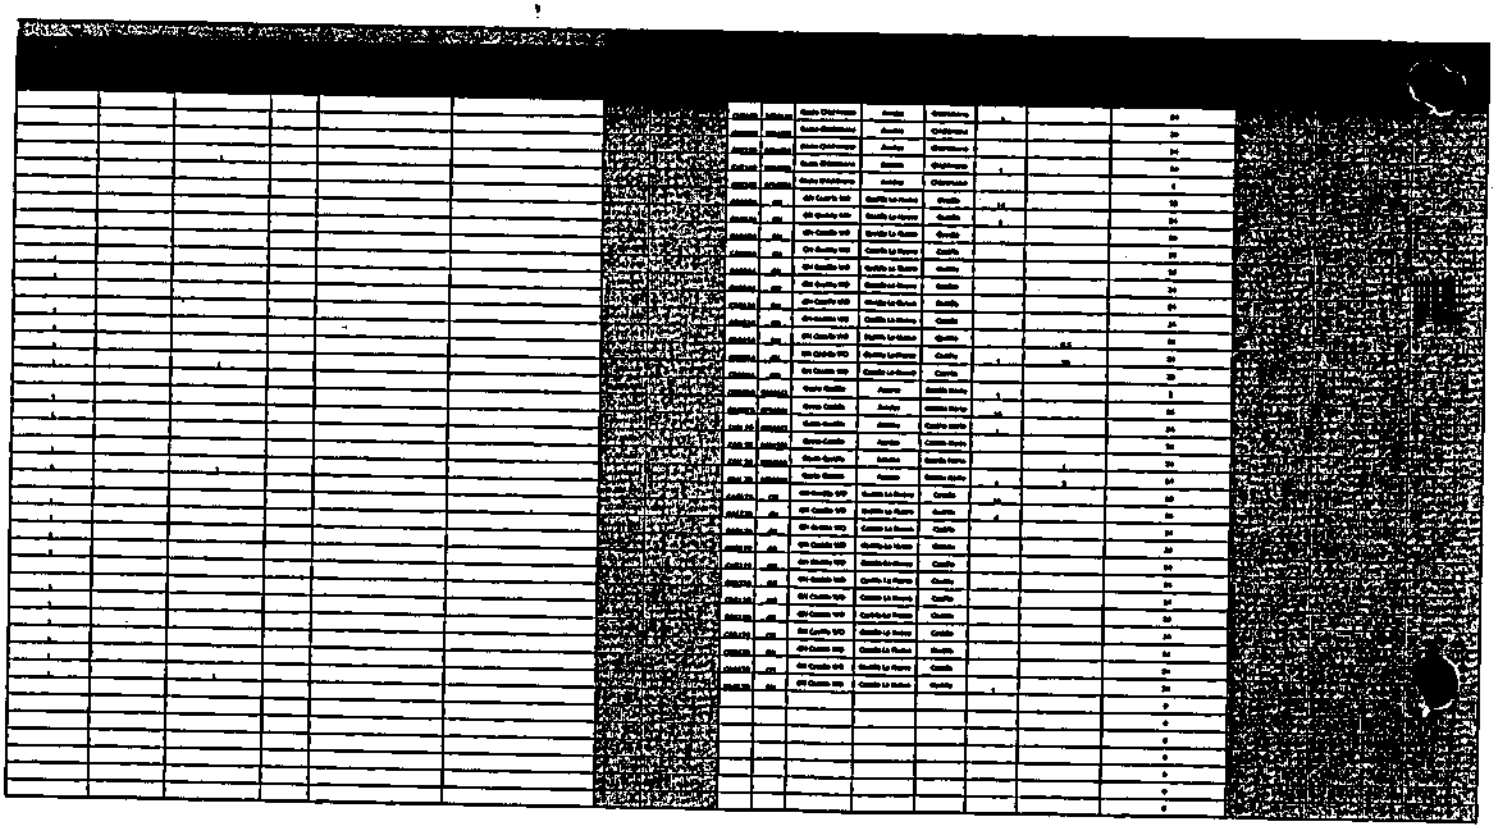

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
ECOPETROL	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		
	ECP-UAB-F-015	Elaborado 13/08/2011	Versión: 2

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS Nro 4

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA-CHICHIMENE
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2012
VALOR PRESENTE ACTA	CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 4.718.137.300) SIN IVA

Mediante la suscripción de la presente Acta:

a) INDEPENDENCE DRILLING S.A., en adelante el CONTRATISTA, representado por JOSE HUBER SILVA ROJAS, mayor de edad, vecino de la ciudad de BOGOTA, identificado con C.C. Nº 18.109.052 DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y

b) LUIS JOSE ALMEIDA PINZON identificado con Cédula de Ciudadanía número 13.616.903 DE PUENTE NACIONAL , quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

Dejan constancia de que,

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2012, prestó los servicios contemplados en el contrato MA-0009346 que se relaciona en la presente acta de recibo de cantidades. El valor del servicio prestado en el periodo es el siguiente:

Cantidades Equipo 550 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	0,00	$ 350.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	0,00	$ 350.000.000	$ 0
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	1,00	$ 14.075.000	$ 14.075.000
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	7,00	$ 33.500.000	$ 234.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	6,00	$ 40.000.000	$ 240.000.000

1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	1,00	$ 60.000.000	$ 60.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 78.000.000	$ 0
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 90.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	91,958	$ 24.400.000	$ 2.243.775.200
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	29,897	$ 24.300.000	$ 726.497.100
2.3	Stand by	0	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	39,00	$ 1.300.000	$ 50.700.000
3.2	Campero sin conductor	36,00	$ 250.000	$ 9.000.000
3.3	Campero con conductor	60,00	$ 350.000	$ 21.000.000
3.4	Tarifa de planta	31,00	$ 450.000	$ 13.950.000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	9,00	$ 8.500.000	$ 76.500.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	0,00	$ 160.000	$ 0
3.7	Construcción de anclajes	0,00	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	108,00	$ 280.000	$ 30.240.000
3.9	Container adicional	0,00	$ 280.000	$ 0
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	13,00	$ 4.370.000	$ 56.810.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	34,00	$ 400.000	$ 13.600.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	0,00	$ 28.000.000	$ 0
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0,00	$ 250.000	$ 0
	TOTAL			$ 3.790.647.300

ecopetrol	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		
	ECP-UAB-F-015	Elaborado 13/08/2011	Versión: 2

Cantidades Equipo 350 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	0,00	$ 360.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	0,00	$ 360.000.000	$ 0
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	0,00	$ 28.000.000	$ 0
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	0,00	$ 30.500.000	$ 0
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	5,00	$ 38.500.000	$ 192.500.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	0,00	$ 63.500.000	$ 0
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 76.600.000	$ 0
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 84.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	22,25	$ 23.200.000	$ 516.200.000
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	4	$ 23.100.000	$ 92.400.000
2.3	Stand by	0	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	9,00	$ 1.300.000	$ 11.700.000
3.2	Campero sin conductor	0,00	$ 250.000	$ 0
3.3	Campero con conductor	0,00	$ 350.000	$ 0
3.4	Tarifa de planta	13,00	$ 450.000	$ 5.850.000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	0,00	$ 8.500.000	$ 0
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	0,00	$ 160.000	$ 0
3.7	Construcción de anclajes	0,00	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	22,00	$ 280.000	$ 6.160.000
3.9	Container adicional	90,00	$ 280.000	$ 25.200.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	4,00	$ 4.370.000	$ 17.480.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	150,00	$ 400.000	$ 60.000.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	0,00	$ 28.000.000	$ 0

3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0,00	$ 250.000	$ 0
	TOTAL			$ 27.490.000

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el COORDINADOR DE GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO.

En constancia, se firma en Villavicencio 23 de Octubre de 2012, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

Por el CONTRATISTA

JOSE HUBER SILVA ROJAS
INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Por la GESTIÓN TÉCNICA

LUIS JOSE ALMEIDA PINZON ECOPETROL S.A.

ECOPETROL	ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL DE OBRA/SERVICIO		
	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		
	ECP-UCN-F-020	Elaborado 30/09/2011	Versión: 2

ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL DE SERVICIO Nº 4 AL CONTRATO MA-0009346

CONTRATO:	**MA-0009346**
OBJETO DEL CONTRATO:	**MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 – 2016.**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**($122.351.947.960)** CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR IVA.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	**(1005)** MIL CINCO DIAS CALENDARIO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 LO QUE OCURRA PRIMERO.
MAYOR CANTIDAD 1	**($5.957.053.280)** CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y TRES DOSCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
MAYOR CANTIDAD 2	**($4.049.217.320)** CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
MAYOR CANTIDAD 3	**($8.005.790.580)** OCHO MIL CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR IVA.
MAYOR CANTIDAD 4	**($3.670.955.320)** TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**($144.034.964.460)** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR IVA.
SALDO DEL CONTRATO:	**($123.070.620.260)** CIENTO VEINTITRES MIL SETENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
VALOR EJECUTADO:	**($20.964.344.200)** VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	09/06/2012
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO:	31/12/2014
FECHA DE CORTE:	15/10/2012
PERIODO FACTURADO:	15/09/2012 – 15/10/2012
PORCENTAJE DE PAGO:	17.13%
ADMINISTRADOR:	LUIS JOSE ALMEIDA PINZON
GESTOR DEL CONTRATO:	COPCO S.A.
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.

ecopetrol	ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL DE OBRA/SERVICIO		
	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		
	ECP-UCN-F-020	Elaborado 30/09/2011	Versión: 2

Mediante la suscripción de la presente Acta:

a) **INDEPENDENCE DRILLING S.A.**, que para todos los efectos legales y para los de este documento se denomina el CONTRATISTA, **FRANCISCO JAVIER VILLABONA.** mayor de edad, identificado con Cédula 17.419.403, quien actúa en su calidad de representante autorizado de la empresa y,

b) **LAURA JULIANA NIÑO FLOREZ** identificado con Cédula de Ciudadanía número 63.510.108 de Bucaramanga, quien actúa en su calidad de GESTOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

Dejan constancia de que,

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el **16 DE Septiembre de 2012 al 15 de Octubre de 2012**, prestó los servicios contemplados en el contrato **MA-0009346** que se relaciona en la presente acta de liquidación parcial de servicio. El valor del servicio prestado en el periodo es el siguiente:

ACTA Nº	VALOR ACTA	SALDO DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	6.778.373.400	137.256.591.060	6.778.373.400	5,54%
2	3.476.839.100	133.779.751.960	10.255.212.500	8,38%
2.1	1.522.502.200	132.257.249.760	11.777.714.700	9,63%
3	4.468.492.200	127.788.757.560	16.246.206.900	13,28%
4	4.718.137.300	123.070.620.260	20.964.344.200	17,13%

- La presente Acta sirve de base para la presentación de la correspondiente factura o cuenta de cobro por parte del CONTRATISTA.
- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el GESTOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

En constancia, se firma en Castilla a los 20 días del mes de Octubre del 2012, en dos ejemplares de idéntico tenor literal.

Por el CONTRATISTA
FRANCISCO JAVIER VILLABONA
Representante Autorizado.

Por la GESTION ADMINISTRATIVA
LAURA JULIANA NIÑO FLOREZ
COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY S.A.

Por ECOPETROL S.A.
LUIS JOSE ALMEIDA PINZON
Administrador del Contrato MA-0009346

ECOPETROL S.A.
SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA- CHICHIMENE
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 4 - CONTRATO MA-0000346

El día 23 de octubre de 2012, se reunieron en las oficinas del Departamento de Producción de la Superintendencia de Operaciones Castilla- Chichimene, el Ing. Huber Silva en representación de Independence Drilling S.A. y el Ingeniero Luis Jose Almeida Pinzon en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes:

Periodo de liquidación: 16 de septiembre de 2012 AL 15 de octubre de 2012

Equipo 550 HP

	TARIFAS DE MOVILIZACION					
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$	350.000.000	0,00	$ -
1.2	Movilización final		$	350.000.000	0,00	$ -
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$	14.075.000	1,00	$ 14.075.000
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$	33.500.000	7,00	$ 234.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$	40.000.000	6,00	$ 240.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$	60.000.000	1,00	$ 60.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$	78.000.000	0,00	$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$	99.000.000	0,00	$ -
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$	24.400.000	91,056	$ 2.243.775.200
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$	24.300.000	29,897	$ 726.497.100
2.3	Stand by	DIA	$	18.000.000		$ -
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$	1.300.000	39,00	$ 50.700.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$	250.000	36,00	$ 9.000.000
3.3	Campero con conductor	DIA	$	350.000	60,00	$ 21.000.000
3.4	Tarifa de planta	DIA	$	450.000	31,00	$ 13.950.000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$	8.500.000	9,00	$ 76.500.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$	160.000	0,00	$ -
3.7	Construcción de anclajes	EA	$	1.800.000	0,00	$ -
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$	280.000	108,00	$ 30.240.000
3.9	Container adicional	DIA	$	280.000	0,00	$ -
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con reciclo)	EA	$	4.378.000	13,00	$ 56.910.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$	400.000	34,00	$ 13.600.000
3.12	Tripomovil adicional con cama alta	MES	$	28.000.000	0,00	$ -
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EDES	GLOBAL	$	250.000	0,00	$ -
	SUBTOTAL					$ 3.799.647.300
	BASE GRAVABLE					$ 3.008.281.784
	FACTOR DE SERVICIO					0
	TOTAL BASE GRAVABLE					$ 3.008.281.784
	BASE NO GRAVABLE					$ 1.487.895.816
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					$ 4.799.647.300
	IVA BASE GRAVABLE					$ 480.530.785
	TOTAL EQUIPO DE WO 550HP					$ 5.039.167.685

Equipos 550 HP - Tanque Bomba

	TARIFAS DE MOVILIZACION					
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$	360.000.000	0,00	$ -
1.2	Movilización final		$	360.000.000	0,00	$ -
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$	28.000.000	0,00	$ -
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$	30.500.000	0,00	$ -
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$	38.500.000	5,00	$ 192.500.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$	81.500.000	0,00	$ -
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$	76.600.000	0,00	$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$	84.000.000	0,00	$ -
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$	23.200.000	22,29	$ 516.200.000
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$	23.100.000	4	$ 92.400.000
2.3	Stand by	DIA	$	18.000.000	0	$ -
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$	1.300.000	9,00	$ 11.700.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$	250.000	0,00	$ -
3.3	Campero con conductor	DIA	$	350.000	0,00	$ -
3.4	Tarifa de planta	DIA	$	450.000	13,00	$ 5.850.000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$	8.500.000	0,00	$ -
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$	160.000	0,00	$ -
3.7	Construcción de anclajes	EA	$	1.800.000	0,00	$ -
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$	280.000	22,00	$ 6.160.000
3.9	Container adicional	DIA	$	280.000	90,00	$ 25.200.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con reciclo)	EA	$	4.370.000	4,00	$ 17.480.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$	400.000	150,00	$ 60.000.000
3.12	Tripomovil adicional con cama alta	MES	$	28.000.000	0,00	$ -
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EDES	GLOBAL	$	250.000	0,00	$ -
	SUBTOTAL					$ 927.490.000
	BASE GRAVABLE					$ 74.199.200
	FACTOR DE SERVICIO					0
	TOTAL BASE GRAVABLE					$ 74.199.200
	BASE NO GRAVABLE					$ 853.290.800
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					$ 927.490.000
	IVA BASE GRAVABLE					$ 11.871.872
	TOTAL EQUIPO DE WO					$ 939.361.872

SUBTOTAL	$ 4.718.137.300
BASE GRAVABLE	$ 377.456.984
FACTOR DE SERVICIO	0
TOTAL BASE GRAVABLE	$ 377.456.984
TOTAL BASE NO GRAVABLE	$ 4.340.680.316
TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE	$ 4.718.137.300
IVA BASE GRAVABLE	$ 60.392.157
TOTAL EQUIPOS DE WO 550HP -350HP- TANQUE BOMBA	$ 4.778.529.457

Activos	207.649.917	23.128.547	2.360.670.550	2.631.139.014
Castilla La Nueva	125.918.467	20.306.475	1.459.527.867	1.805.743.809
Cusiana	43.924.600	6.919.125	520.187.900	599.941.625
Total	377.456.984	50.354.147	4.340.680.316	4.778.529.457

En constancia de lo anterior firman los representantes de las partes:

HUBER SILVA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
REPRESENTANTE DELEGADO

LUIS JOSE ALMEIDA PINZON
ECOPETROL
GESTOR TECNICO

JAVIER FERNANDO LEAL BARREGUE
ECOPETROL
ADMINISTRADOR

NIT 900.118.158-7
IVA REGIMEN COMUN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 11941 DEL 23 12 04

SOMOS AUTOR RETENEDORES DE IVA Y RICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 1120
ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIO 354, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 18500001892, FECHA 2012 06 29
FACTURACION AUTORIZADA No. 3038 a la 9999 POR COMPUTADOR

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

COPIA

Independence

No. PAGINA: - 1 of 5

FECHA: - 25/10/2012
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 55 7 21 P 3
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: - 3197 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN: 6933 SP

UN: PT32227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CNTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016

CONCEPTO: ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL N°04 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2012
HOJAS DE ENTRADA
1000800436 1000800504 1000800518 1000800533 1000800479 1000800488 1000800730 1000800738 1000800764 1000800769 1000800879 1000800887 1000800817 1000800829 1000800918 1000800923 1000800935 1000800940
APROBACIONES
5000966085 5000966086 5000966088 5000966089 5000966090 5000966091 5000966092 5000966093 5000966094 5000966115 5000966116 5000966117 5000966120 5000966121 5000966123 5000966124 5000966125 5000966126
Manifestamos que Independence Drilling S.A. ha efectuado los aportes a la seguridad social por los ingresos materia de esta facturación, dando cumplimiento al monto máximo dispuesto por la ley para la base de cotización. El pago de los aportes a seguridad social respectivos se realizó bajo la planilla número 84178044SS del mes de Agosto de año 2012.

ECOPETROL S.A.
OFICINA CUENTAS
BOGOTA
25 OCT 2012
RECIBIDO

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	DI	6,000	1.300.000	7.800.000
2,000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	16,000	280.000	4.480.000
3,000	TARIFA DE PLANTA	DI	7,000	450.000	3.150.000
4,000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 0 A 20 KM	GL	2,000	33.500.000	67.000.000
5,000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	294,000	1.016.667	298.900.000
6,000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	147,000	1.012.500	148.837.500

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY RECONSIDERACION DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.(CO.)

Aceptado - Cliente

424

NIT. 900.139.168-9
IVA RÉGIMEN COMÚN. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN DIAN No. 320012943, FECHA 2012-09-25
FACTURACIÓN AUTORIZADA No. 3125 a la 9999 POR COMPUTADOR

COPIA

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

No. PAGINA: - 2 of 5

FECHA: - 25/10/2012
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 95 7 21 P 1
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: - 3197 BJ
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN: 6933 SP

UN: PT32227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CNTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016

7,000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	2,000	4.370.000	8.740.000
8,000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	DI	2,000	1.300.000	2.600.000
9,000	TARIFA DE FRAC TANK	DI	34,000	400.000	13.600.000
10,000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	14,000	280.000	3.920.000
11,000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 0 A 10 KM	GL	2,000	33.500.000	67.000.000
12,000	MOVILIZACION EN LA MISMA LOCACIÓN	GL	1,000	14.075.800	14.075.800
13,000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	302,500	1.016.734	307.561.894
14,000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	65,500	1.012.500	66.318.750
15,000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	5,000	4.370.000	21.850.000
16,000	CAMPERO SIN CONDUCTOR	DI	36,000	250.000	9.000.000
17,000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	DI	9,000	1.300.000	11.700.000
18,000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	30,000	280.000	8.400.000
19,000	TARIFA DE PLANTA	DI	12,000	450.000	5.400.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA AL MAXIMO AUTORIZADO POR LA LEY. ESTA FACTURA PERMANECE EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO)

Aceptado - Cliente

NIT 900.115.116-9
RUA REGIMEN COMUN-NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION 2014 DEL 29-12-06

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 1120
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 104, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. XED000013007, FECHA 2012/06/29
FACTURACION AUTORIZADA No. 9056 a la 9999 POR POSITIVADOS

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

COPIA

Independence

FECHA: - 25/10/2012
CLIENTE ECOPETROL E.A.
DIRECCION: CL 95 7 21 P 1
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: - 5197 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. PAGINA: - 3 of 5

UN: PT32227

No. ORDEN: 6933 SP

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CNTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016

20,000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 10 A 30 KM	GL	3,000	40.000.000	120.000.000
21,000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	530,000	1.016.667	538.833.333
22,000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	267,000	1.012.500	270.337.500
23,000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 30 A 60 KM	GL	1,000	60.000.000	60.000.000
24,000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	3,000	4.370.000	13.110.000
25,000	CAMPERO CON CONDUCTOR	DI	30,000	350.000	10.500.000
26,000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	DI	14,000	1.300.000	18.200.000
27,000	TARIFA DIARIA DERRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	23,000	280.000	6.440.000
28,000	TARIFA DE PLANTA	DI	8,000	450.000	3.600.000
29,000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 0 A 10 KM	GL	1,000	33.500.000	33.500.000
30,000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 10 A 30 KM	GL	3,000	40.000.000	120.000.000
31,000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	558,500	1.016.667	567.808.333

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptado - Cliente

425

NIT. 830.130.881-7
IVA REGIMEN COMUN. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION 11946 DEL 23-12-04

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 1120
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 504, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 320006913097, FECHA 2012-06-25
FACTURACION AUTORIZADA No. 2650 a la 6000 POR COMPUTADOR.

COPIA

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

No. PAGINA: - 4 of 5

FECHA: - 25/10/2012
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 P 1
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: - 3197 B2
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN: 6933 SP

UN: PT32237
OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CNTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016

32,000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	93,500	1.012.900	94.668.750
33,000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	3,000	4.370.000	13.110.000
34,000	CAMPERO CON CONDUCTOR	DI	30,000	350.000	10.500.000
35,000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 13.000 GLS	DI	8,000	1.300.000	10.400.000
36,000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	25,000	280.000	7.000.000
37,000	TARIFA DE PLANTA	DI	4,000	450.000	1.800.000
38,000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 0 A 10 KM	GL	2,000	33.500.000	67.000.000
39,000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	522,000	1.016.667	530.700.000
40,000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	144,500	1.012.500	146.306.250
41,000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	4,000	4.370.000	17.480.000
42,000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	DI	9,000	1.300.000	11.700.000
43,000	CONTAINER ADICIONAL	DI	90,000	280.000	25.200.000
44,000	TARIFA DE FRAC TANK	DI	150,000	400.000	60.000.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA, EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptado - Cliente

NIT 860.156.168-3
IVA RÉGIMEN COMÚN - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN 11946 DEL 29-12-04

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA & ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 7120
ACTIVIDAD COMERCIAL Y COMERCIO 104, TARIFA 9-66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 320006012007, FECHA 2012-06-25
HABILITACION AUTORIZADA No. 2620 a 3000 POR COMPUTADOR

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

COPIA

Independence

No. PAGINA: 5 of 5

FECHA: 25/10/2012
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 P 3
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: 3197 R1
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN: 6933 SP

UN: PT52227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CNTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016

45,000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	22,000	280.000	6.160.000
46,000	TARIFA DE PLANTA	DI	13,000	450.000	5.850.000
47,000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 10 A 30 KM	GL	5,000	38.500.000	192.500.000
48,000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	534,000	966.667	516.200.000
49,000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	96,000	962.500	92.400.000
50,000	TARIFA DE CIRCULACION DE POZOS (INCLUYE CUADRILLA BOMBA)	DI	9,000	8.500.000	76.500.000

TOTAL:	4.718.137.300
BASE GRAVADA	377.450.984
BASE NO GRAVADA:	4.340.686.316
IVA 16 %	60.392.157
TOTAL A PAGAR	4.778.529.457

CONDICIONES DE PAGO: Contado a 30 días
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIU NUE VE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 M.L. ********

ESTA FACTURA SERÁ ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA AL MAXIMO PERMITIDO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 del C.CO.)


Aceptado - Cliente

LIQUIDACION PARCIAL
CONTRATO MA-0009346 ACTA 4

Desde 16-Sep-12 Hasta 15-Oct-12

Tanque Bombe

18-Sep-12															1,00			
19-Sep-12															1,00			
20-Sep-12															1,00			
21-Sep-12															1,00			
22-Sep-12															1,00			
27-Sep-12															1,00			
3-Oct-12															1,00			
10-Oct-12															1,00			
12-Oct-12															1,00			
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	-

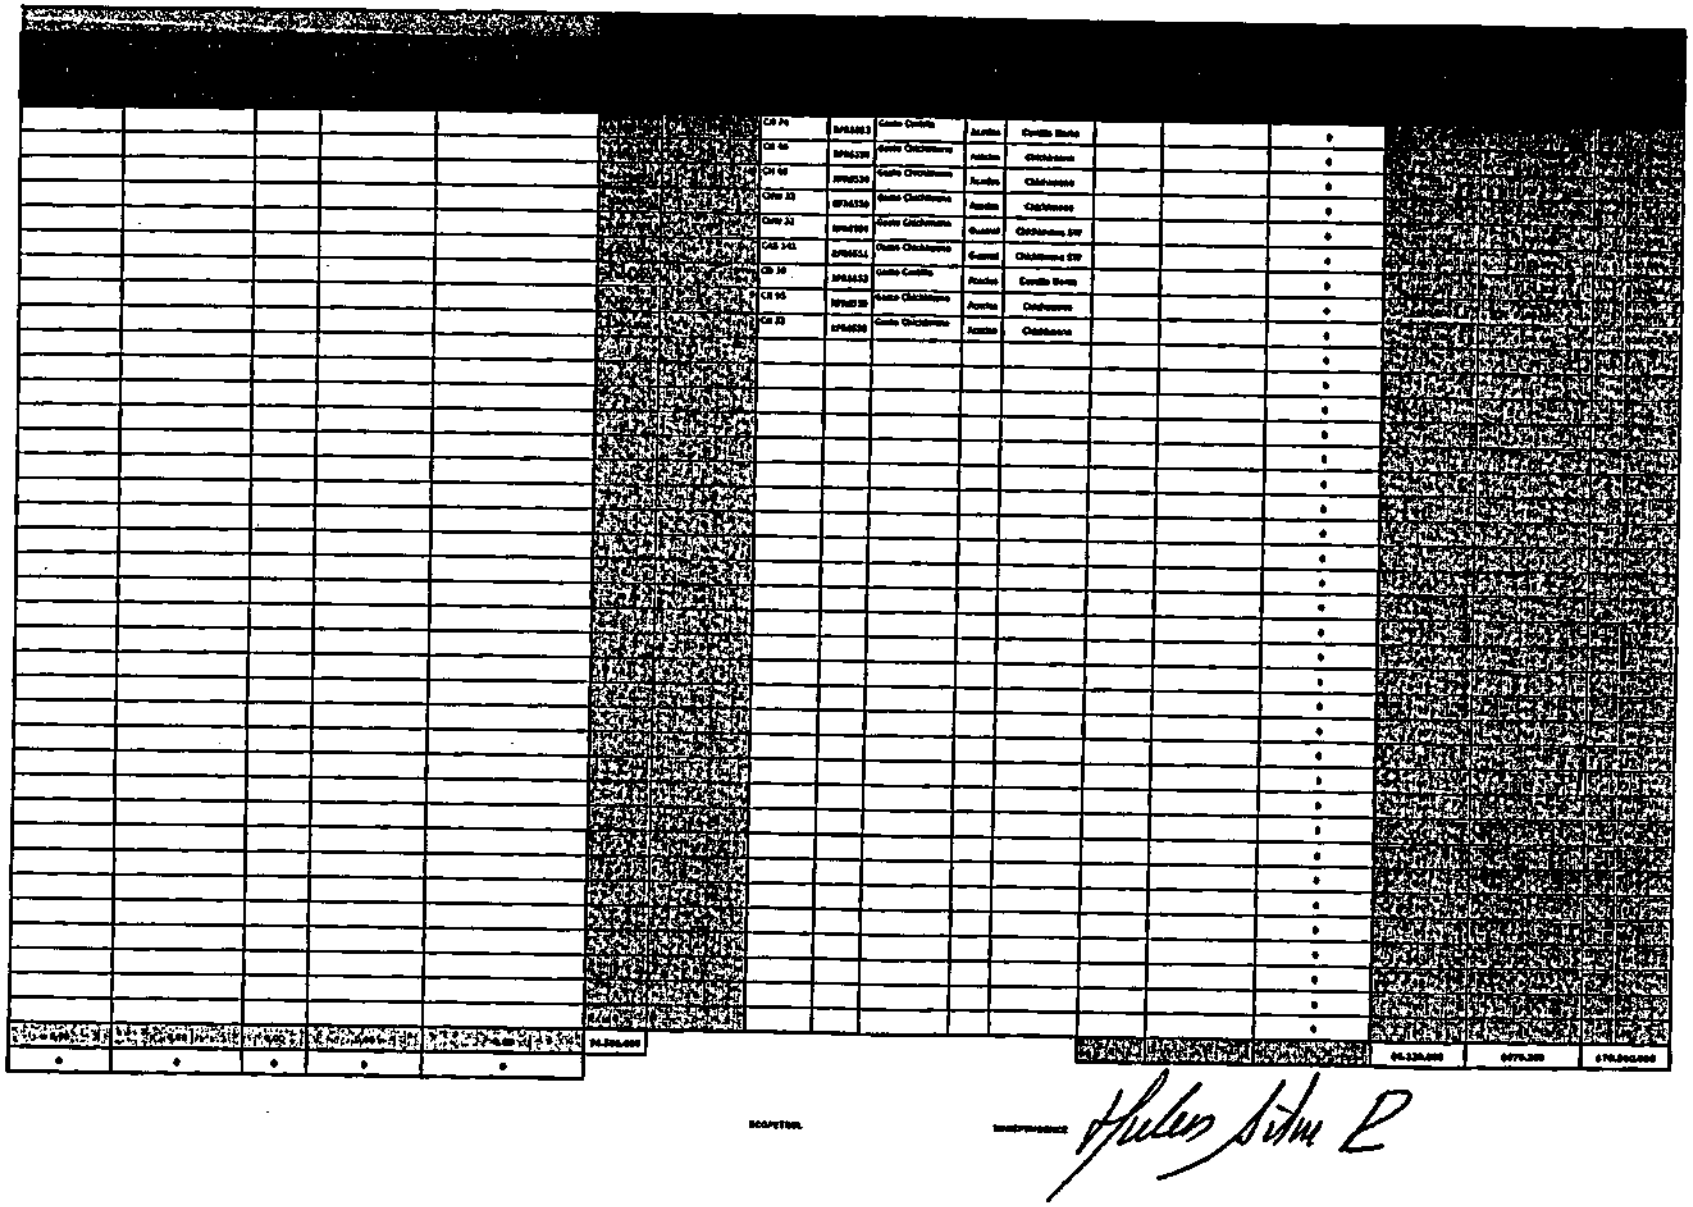


LIQUIDACION PARCIAL 4
CONTRATO MA-0009346

Desde **16-Sep-12** Hasta **15-Oct-12**

Torre 31 - 550 HP

16-Sep-12								24,00										
17-Sep-12								20,00	4,00									5,00
18-Sep-12								24,00										5,00
19-Sep-12								24,00										6,00
20-Sep-12								31,50	12,50									5,00
21-Sep-12								23,00	9,00									5,00
22-Sep-12								18,50	5,50									1,00
23-Sep-12		1,00						13,00	4,00									
24-Sep-12			1,00						11,00									1,00
25-Sep-12								14,00	5,00		1,00							1,00
26-Sep-12								13,00	1,00									2,00
27-Sep-12								23,00	1,00									1,00
28-Sep-12								24,00			1,00							1,00
29-Sep-12								22,00	1,00									1,00
30-Sep-12								22,50	1,50									
1-Oct-12								14,50	2,50									2,00
2-Oct-12			1,00					3,50	3,50									1,00
Total	0	14.075.000	57.000.000	0	0	0	0	397.501.667	96.711.750	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.130.000

Fulcro

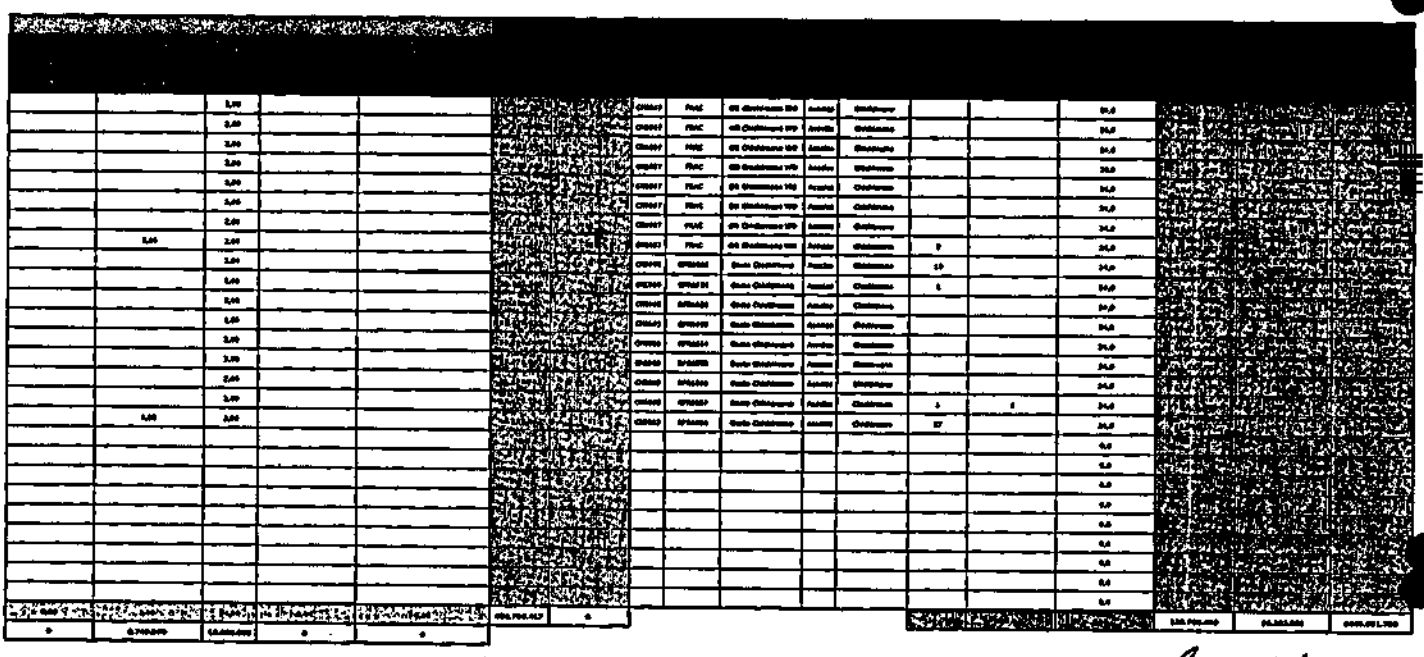


428

LIQUIDACION PARCIAL 4
CONTRATO MA-0009346

Desde 16-Sep-12 Hasta 15-Oct-12

Torre 32 - 950 HP

[illegible]								[illegible]	[illegible]					[illegible]					
[illegible]								[illegible]	[illegible]		[illegible]							[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]		[illegible]							[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]									[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]									[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]									[illegible]	
[illegible]																			
[illegible]																			
[illegible]									[illegible]										
[illegible]								[illegible]	[illegible]					[illegible]				[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]				[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]					[illegible]				[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]					[illegible]				[illegible]	
[illegible]								[illegible]			[illegible]			[illegible]				[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]				[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]		[illegible]								
[illegible]								[illegible]	[illegible]									[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]									[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]									[illegible]	
[illegible]								[illegible]										[illegible]	
[illegible]								[illegible]										[illegible]	
[illegible]																			
[illegible]																			
[illegible]																			
[illegible]																			
[illegible]																			
[illegible]																			
[illegible]																			
[illegible]																			
[illegible]			[illegible]																
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total	0	0	[illegible]	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	0	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0

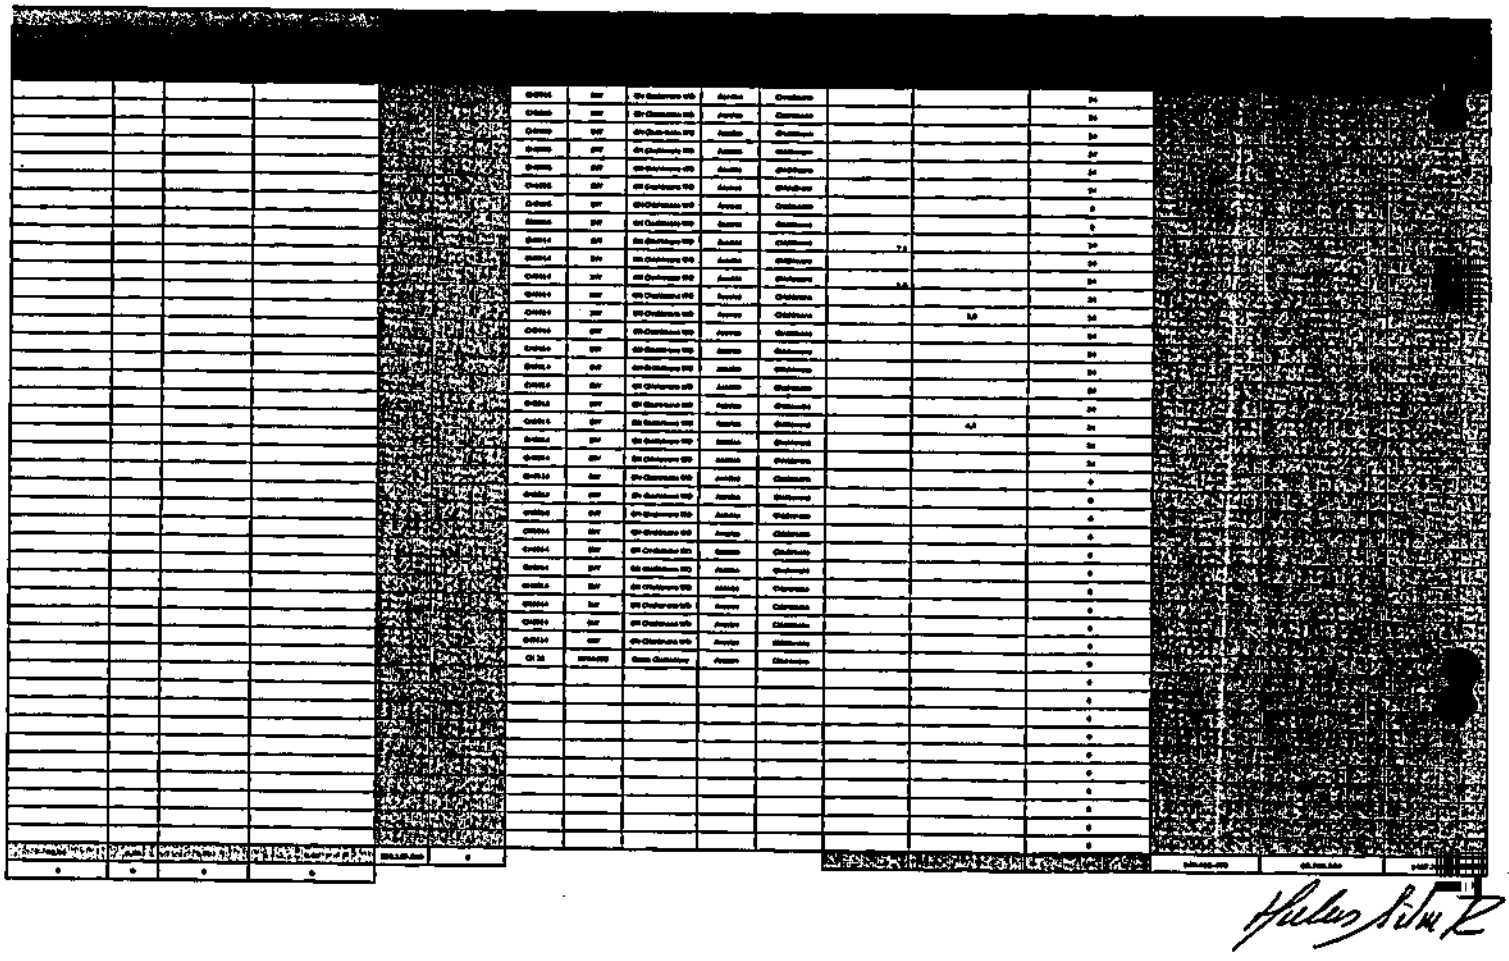


LIQUIDACION PARCIAL 4
CONTRATO MA-0009346

Desde 16-Sep-12 Hasta 15-Oct-12

Torre 34 - 650 HP

[illegible]								[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]			[illegible]						[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]			[illegible]							
[illegible]								[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						[illegible]	
[illegible]					[illegible]				[illegible]			[illegible]						[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]			[illegible]						[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]			[illegible]						[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]				[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]			[illegible]							
[illegible]								[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]				[illegible]	
[illegible]								[illegible]			[illegible]	[illegible]							
[illegible]								[illegible]				[illegible]		[illegible]				[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]			[illegible]						[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]			[illegible]						[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]			[illegible]						[illegible]	
[illegible]				[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]						[illegible]	
[illegible]																			
[illegible]								[illegible]	[illegible]			[illegible]							
[illegible]				[illegible]					[illegible]			[illegible]						[illegible]	
[illegible]									[illegible]			[illegible]						[illegible]	
[illegible]									[illegible]			[illegible]						[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]				[illegible]	
[illegible]								[illegible]				[illegible]							
[illegible]								[illegible]				[illegible]						[illegible]	
[illegible]								[illegible]				[illegible]						[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]			[illegible]						[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]			[illegible]						[illegible]	
[illegible]				[illegible]															
[illegible]								[illegible]	[illegible]			[illegible]						[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]			[illegible]							
[illegible]								[illegible]	[illegible]			[illegible]						[illegible]	
[illegible]								[illegible]	[illegible]			[illegible]						[illegible]	
[illegible]																			
[illegible]																			
[illegible]																			
[illegible]																			
[illegible]																			
[illegible]																			
[illegible]																			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[signature]

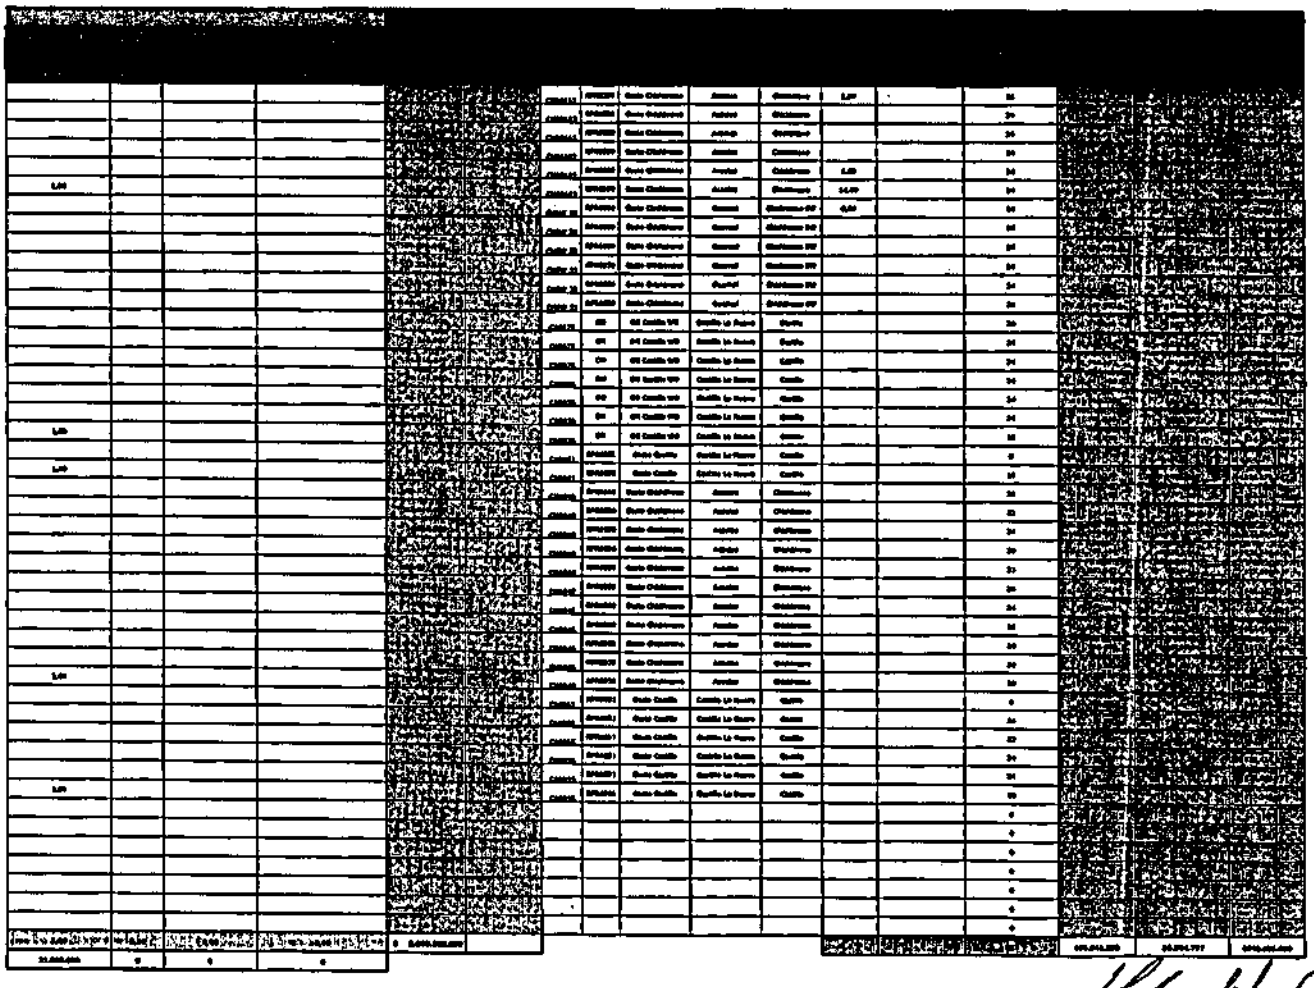


LIQUIDACION PARCIAL 4
CONTRATO MA-0008346

Desde 16-Sep-12 — Hasta 15-Oct-12

Torre 42 - 550 HP

[illegible]				1,00				7,00			[illegible]		[illegible]					
[illegible]								[illegible]										
[illegible]								[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]					[illegible]
[illegible]								24,00			[illegible]		[illegible]					[illegible]
[illegible]								[illegible]					[illegible]					[illegible]
[illegible]								[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]					[illegible]
[illegible]								[illegible]	[illegible]				[illegible]					[illegible]
[illegible]								[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]					[illegible]
[illegible]								[illegible]	[illegible]				[illegible]					
[illegible]								[illegible]	[illegible]				[illegible]					[illegible]
[illegible]								24,00					[illegible]					[illegible]
[illegible]								[illegible]	7,00				[illegible]					[illegible]
[illegible]				[illegible]				1,00										
[illegible]									[illegible]				[illegible]					[illegible]
[illegible]								[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]					[illegible]
[illegible]								[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]				
[illegible]																		
[illegible]								[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]				
[illegible]								[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]								[illegible]	[illegible]				[illegible]					[illegible]
[illegible]								[illegible]	[illegible]				[illegible]					[illegible]
[illegible]								[illegible]	[illegible]				[illegible]					[illegible]
[illegible]								[illegible]					[illegible]					[illegible]
[illegible]			[illegible]															
[illegible]								[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]								[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]				
[illegible]								[illegible]	[illegible]				[illegible]					[illegible]
[illegible]								[illegible]	[illegible]				[illegible]					[illegible]
[illegible]								[illegible]	[illegible]				[illegible]					[illegible]
[illegible]				[illegible]														
[illegible]								[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]								[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]								[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]								[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]					
[illegible]								[illegible]			[illegible]		[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]	0	0	0	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	0	0	[illegible]

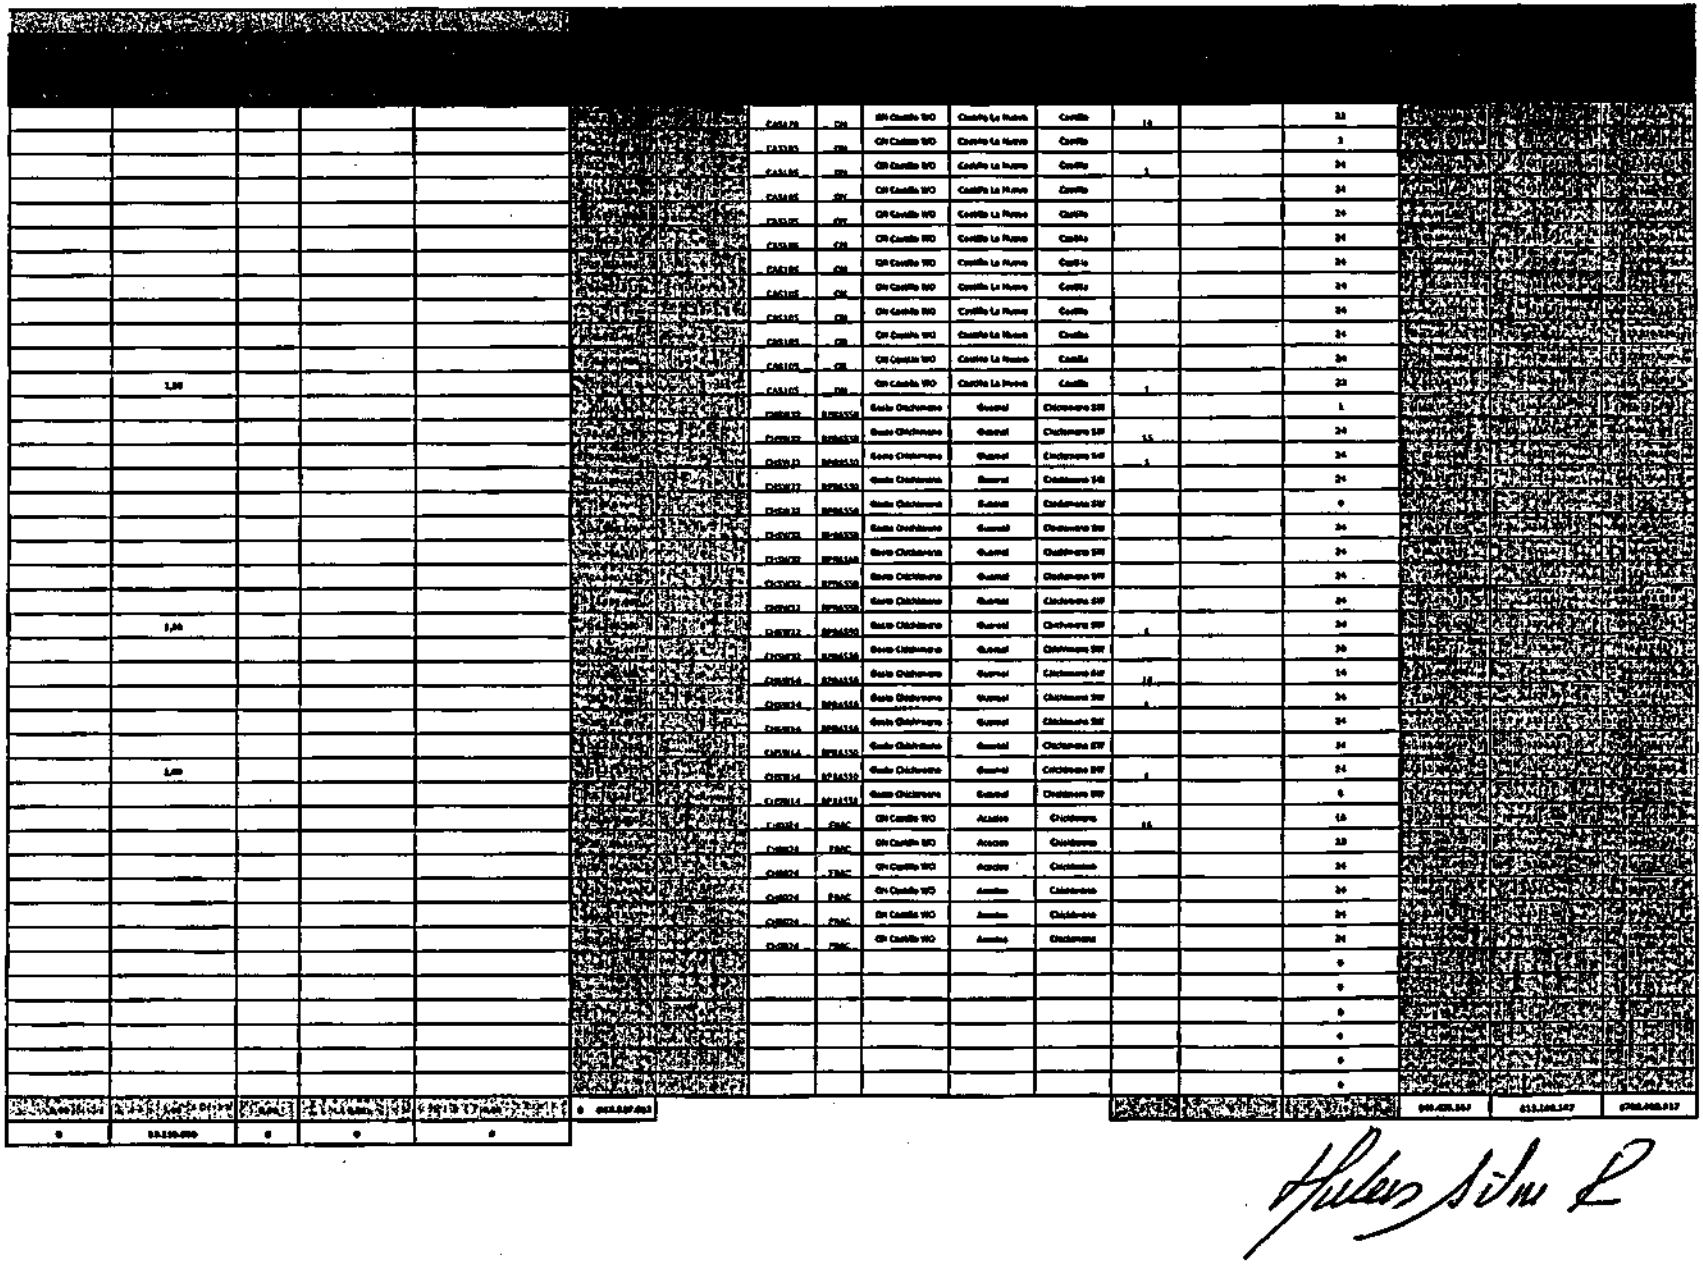


LIQUIDACION PARCIAL 4
CONTRATO MA-0009348

Desde 16-Sep-12 Hasta 15-Oct-12

Torre 123- 850 HP

								Tarifas de Operación											
[illegible]								16,00	6,00				1,00					1,00	
[illegible]								17,00	7,00		1,00		1,00					1,00	
[illegible]								24,00			1,00		1,00					1,00	
[illegible]								24,00			1,00		1,00					1,00	
[illegible]								24,00					1,00					1,00	
[illegible]								14,00	10,00				1,00					1,00	
[illegible]									24,00				1,00					1,00	
[illegible]								20,00	1,00				1,00						
[illegible]								24,00					1,00					1,00	
[illegible]								18,00	6,00				1,00					1,00	
[illegible]								20,00	3,00				1,00					1,00	
[illegible]								21,00					1,00					1,00	
[illegible]								3,00	6,00				1,00					1,00	
[illegible]								20,00	3,00		1,00		1,00					1,00	
[illegible]								24,00					1,00						
[illegible]								24,00			1,00		1,00					1,00	
[illegible]								24,00			1,00		1,00					1,00	
[illegible]								12,00	11,00				1,00					1,00	
[illegible]								4,00	20,00				1,00					1,00	
[illegible]								24,00	2,00				1,00					1,00	
[illegible]								16,00	7,00				1,00	1,00				1,00	
[illegible]								3,00					1,00						
[illegible]			1,00					3,00	1,00										
[illegible]								20,00					1,00					1,00	
[illegible]								21,00	2,00		1,00		1,00					1,00	
[illegible]								24,00					1,00	1,00				1,00	
[illegible]								24,00					1,00					1,00	
[illegible]			1,00						10,00				1,00					1,00	
[illegible]								13,00	8,00				1,00					1,00	
[illegible]								20,00	1,00		1,00		1,00	1,00					
[illegible]								12,00	12,00				1,00	1,00					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total	0	0	[illegible]	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0

Yulen Silva R

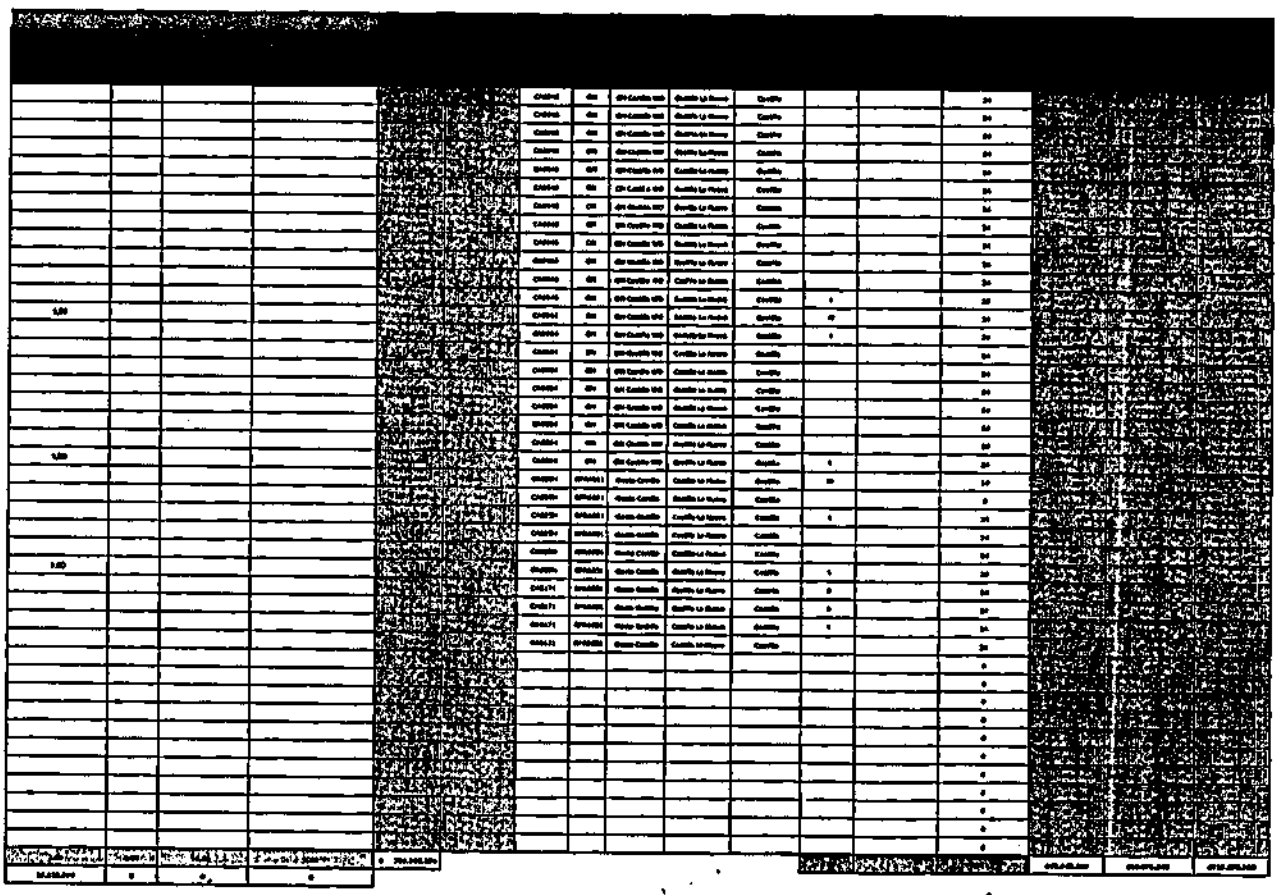

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
ECOPETROL	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		
	ECP-UAB-F-015	Elaborado 13/08/2011	Versión: 2

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS Nro 4.1

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA-CHICHIMENE
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2012
VALOR PRESENTE ACTA	MIL TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS ($ 1.036.578.128,00) SIN IVA

Mediante la suscripción de la presente Acta:

a) INDEPENDENCE DRILLING S.A., en adelante el CONTRATISTA, representado por JOSE HUBER SILVA ROJAS, mayor de edad, vecino de la ciudad de BOGOTA, identificado con C.C. Nº 18.109.052 DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y

b) LUIS JOSE ALMEIDA PINZON identificado con Cédula de Ciudadanía número 13.616.903 DE PUENTE NACIONAL , quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

Dejan constancia de que,

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2012, prestó los servicios contemplados en el contrato MA-0009346 que se relaciona en la presente acta de recibo de cantidades. El valor del servicio prestado en el periodo es el siguiente:

Cantidades Equipo 550 HP

1.1	Movilización inicial	0,00	$ 350.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	0,00	$ 350.000.000	$ 0
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	0,00	$ 14.075.000	$ 0
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	0,00	$ 33.500.000	$ 0

1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	2,00	$ 40.000.000	$ 80.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	0,00	$ 60.000.000	$ 0
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 78.000.000	$ 0
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 90.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	28,104	$ 24.400.000	$ 685.737.600
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	7,605	$ 24.300.000	$ 184.801.500
2.3	Stand by	0	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	9,00	$ 1.300.000	$ 11.700.000
3.2	Campero sin conductor	13,00	$ 250.000	$ 3.250.000
3.3	Campero con conductor	0,00	$ 350.000	$ 0
3.4	Tarifa de planta	17,00	$ 450.000	$ 7.650.000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	0,00	$ 8.500.000	$ 0
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	0,00	$ 160.000	$ 0
3.7	Construcción de anclajes	0,00	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	27,00	$ 280.000	$ 7.560.000
3.9	Container adicional	0,00	$ 280.000	$ 0
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	4,00	$ 4.370.000	$ 17.480.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	26,00	$ 400.000	$ 10.400.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	1,00	$ 28.000.000	$ 28.000.000
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0,00	$ 250.000	$ 0

ECOPETROL	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		
	ECP-UAB-F-015	Elaborado 13/08/2011	Versión: 2

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el COORDINADOR DE GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO.

En constancia, se firma en Villavicencio 23 de Octubre de 2012, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

Por el CONTRATISTA

JOSE HUBER SILVA ROJAS
INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Por la GESTION TECNICA

LUIS JOSE ALMEIDA PINZON ECOPETROL S.A.

ECOPETROL S.A.
SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA- CHICHIMENE
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 4.1 - CONTRATO NA-0009246

El día 23 de octubre de 2012, se reunieron en las oficinas del Departamento de Producción de la Superintendencia de Operaciones Castilla- Chichimene, el Ing. Huber Silva en representación de Independence Drilling S.A. y el Ingeniero Luis Jose Almeida Pinzón en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes:

Periodo de liquidación: **16 de Septiembre de 2012** **AL** **15 de Octubre de 2012**

Equipo 550 HP

	TARIFAS DE MOVILIZACION					
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$ 350.000.000	0,00	$	-
1.2	Movilización final	GLOBAL	$ 350.000.000	0,00	$	-
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 14.075.000	0,00	$	-
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 33.500.000	0,00	$	-
1.5	Movilización entre pozos 10,1-30 km	EA	$ 40.100.000	2,00	$	80.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30,1-60 km	EA	$ 60.000.000	0,00	$	-
1.7	Movilización entre pozos 60,1-100 km	EA	$ 78.000.000	0,00	$	-
1.8	Movilización entre pozos 100,1 km hasta 120 km	EA	$ 90.000.000	0,00	$	-
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 24.400.000	28,104	$	685.737.600
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 24.300.000	7,805	$	184.601.500
2.3	Stand by	DIA	$ 18.000.000	0,000	$	-
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$ 1.300.000	9,00	$	11.700.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$ 250.000	13,00	$	3.250.000
3.3	Campero con conductor	DIA	$ 350.000	0,00	$	-
3.4	Tarifa de planta	DIA	$ 450.000	17,00	$	7.650.000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$ 8.500.000	0,00	$	-
3.6	Cambuche de unidad de filtrado	EA	$ 160.000	0,00	$	-
3.7	Construcción de anclajes	EA	$ 1.800.000	0,00	$	-
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$ 280.000	27,00	$	7.560.000
3.9	Container adicional	DIA	$ 280.000	0,00	$	-
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con maceria)	EA	$ 4.370.000	4,00	$	17.480.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 400.000	16,00	$	10.200.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$ 28.000.000	1,00	$	28.000.000
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running ERES	GLOBAL	$ 250.000	0,00	$	-
	SUBTOTAL				$	1.036.678.128,00
	BASE GRAVABLE				$	82.936.250,24
	FACTOR DE SERVICIO				$	-
	TOTAL BASE GRAVABLE				$	82.936.250,24
	BASE NO GRAVABLE				$	953.451.877,76
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				$	1.036.678.128,00
	IVA BASE GRAVABLE				$	13.268.200,04
	TOTAL EQUIPO DE WO 550HP				$	1.049.946.328,04

Equipos 350 HP - Tanque Bomba

	TARIFAS DE MOVILIZACION					
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$ 360.000.000		$	-
1.2	Movilización final	GLOBAL	$ 360.000.000		$	-
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 28.000.000		$	-
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 30.500.000		$	-
1.5	Movilización entre pozos 10,1-30 km	EA	$ 38.500.000		$	-
1.6	Movilización entre pozos 30,1-60 km	EA	$ 63.500.000		$	-
1.7	Movilización entre pozos 60,1-100 km	EA	$ 76.600.000		$	-
1.8	Movilización entre pozos 100,1 km hasta 120 km	EA	$ 84.000.000		$	-
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 23.200.000		$	-
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 23.100.000		$	-
2.3	Stand by	DIA	$ 18.000.000		$	-
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$ 1.300.000		$	-
3.2	Campero sin conductor	DIA	$ 250.000		$	-
3.3	Campero con conductor	DIA	$ 350.000		$	-
3.4	Tarifa de planta	DIA	$ 450.000		$	-
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$ 8.500.000		$	-
3.6	Cambuche de unidad de filtrado	EA	$ 160.000		$	-
3.7	Construcción de anclajes	EA	$ 1.800.000		$	-
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$ 280.000		$	-
3.9	Container adicional	DIA	$ 280.000		$	-
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con maceria)	EA	$ 4.370.000		$	-
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 400.000		$	-
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$ 28.000.000		$	-
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running ERES	GLOBAL	$ 250.000		$	-
	SUBTOTAL				$	-
	BASE GRAVABLE					0
	FACTOR DE SERVICIO					0
	TOTAL BASE GRAVABLE					0
	BASE NO GRAVABLE					0
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					0
	IVA BASE GRAVABLE					0
	TOTAL EQUIPO DE WO					0

SUBTOTAL	
BASE GRAVABLE	$ 1.036.678.128,00
FACTOR DE SERVICIO	$ 82.936.250,24
TOTAL BASE GRAVABLE	$ -
TOTAL BASE NO GRAVABLE	$ 82.936.250,24
TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE	$ 953.451.877,76
IVA BASE GRAVABLE	$ 1.036.678.128,00
TOTAL EQUIPOS DE WO 550HP -350HP- TANQUE BOMBA	$ 13.268.200,04
	$ 1.049.946.328,04

Apiay	100%
Casanare	
Guamal	
Total	100%

En constancia de lo anterior firman los representantes de las partes:

HUBER SILVA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
REPRESENTANTE DELEGADO

LUIS JOSE ALMEIDA PINZON
ECOPETROL
GESTOR TECNICO

JAVIER FERNANDO LEAL JAUREGUI
ECOPETROL
ADMINISTRADOR

ecopetrol	ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL DE OBRA/SERVICIO		
	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		
	ECP-UCN-F-020	Elaborado 30/09/2011	Versión: 2

ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL DE SERVICIO Nº 4.1 AL CONTRATO MA-0009346

CONTRATO:	**MA-0009346**
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 – 2016.**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**($122.351.947.960)** CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR IVA.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	**(1005)** MIL CINCO DIAS CALENDARIO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 LO QUE OCURRA PRIMERO.
MAYOR CANTIDAD 1	**($5.957.053.280)** CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y TRES DOSCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
MAYOR CANTIDAD 2	**($4.049.217.320)** CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
MAYOR CANTIDAD 3	**($8.005.790.580)** OCHO MIL CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR IVA.
MAYOR CANTIDAD 4	**($3.670.955.320)** TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**($144.034.964.460)** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR IVA.
SALDO DEL CONTRATO	**($122.034.042.132)** CIENTO VEINTIDOS MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA
VALOR EJECUTADO	**($22.000.922.328.)** VEINTIDOS MIL MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	09/06/2012
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO:	31/12/2014
FECHA DE CORTE:	15/10/2012
PERIODO FACTURADO:	16/09/2012 – 15/10/2012
PORCENTAJE DE PAGO:	17.98%
ADMINISTRADOR:	LUIS JOSE ALMEIDA PINZON
GESTOR DEL CONTRATO:	COPCO S.A.
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.

	ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL DE OBRA/SERVICIO		
ecopetrol	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		
	ECP-UCN-F-020	Elaborado 30/09/2011	Versión: 2

Mediante la suscripción de la presente Acta:

a) **INDEPENDENCE DRILLING S.A.,** que para todos los efectos legales y para los de este documento se denomina el CONTRATISTA, **FRANCISCO JAVIER VILLABONA.** mayor de edad, identificado con Cédula 17.419.403, quien actúa en su calidad de representante autorizado de la empresa y,

b) **LAURA JULIANA NIÑO FLOREZ** identificado con Cédula de Ciudadanía número 63.510.108 de Bucaramanga, quien actúa en su calidad de GESTOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

Dejan constancia de que,

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el **16 De Septiembre de 2012 al 15 de Octubre de 2012,** prestó los servicios contemplados en el contrato **MA-0009346** que se relaciona en la presente acta de liquidación parcial de servicio. El valor del servicio prestado en el periodo es el siguiente:

ACTA Nº	VALOR ACTA	SALDO DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	6.778.373.400	137.256.591.060	6.778.373.400	5,54%
2	3.476.839.100	133.779.751.960	10.255.212.500	8,38%
2.1	1.522.502.200	132.257.249.760	11.777.714.700	9,63%
3	4.468.492.200	127.788.757.560	16.246.206.900	13,28%
4	4.718.137.300	123.070.620.260	20.964.344.200	17,13%
4.1	1.036.578.128	122.034.042.132	22.000.922.328	17.98%

- La presente Acta sirve de base para la presentación de la correspondiente factura o cuenta de cobro por parte del CONTRATISTA.

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el GESTOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

En constancia, se firma en Castilla a los 20 días del mes de Octubre del 2012, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

Por el CONTRATISTA
FRANCISCO JAVIER VILLABONA
Representante Autorizado.

Por la GESTION ADMINISTRATIVA
LAURA JULIANA NIÑO FLOREZ
COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY S.A.

Por ECOPETROL S.A.
LUIS JOSE ALMEIDA PINZON
Administrador del Contrato MA-0009346

ECOPETROL S.A.
SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA- CHICHIMENE
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 4.1 - CONTRATO NA-0009346

El día 23 de octubre de 2012, se reunieron en las oficinas del Departamento de Producción de la Superintendencia de Operaciones Castilla- Chichimene, el Ing. Huber Silva en representación de Independence Drilling S.A. y el Ingeniero Luis Jose Almeida Pinzón en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes:

Periodo de Liquidación: 10 de Septiembre de 2012 AL 15 de Octubre de 2012

Equipo 550 HP

1	TARIFAS DE MOVILIZACION					
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$	350.000.000	0,00	$ -
1.2	Movilización final	GLOBAL	$	350.000.000	0,00	$ -
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$	34.075.000	0,00	$ -
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$	33.500.000	0,00	$ -
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$	40.000.000	2,00	$ 80.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$	60.000.000	0,00	$ -
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$	76.000.000	0,00	$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$	90.000.000	0,00	$ -
2						
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$	24.400.000	28,104	$ 685.737.600
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$	24.300.000	7,805	$ 189.601.500
2.3	Stand by	DIA	$	18.000.000	0,000	$ -
3						
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$	1.300.000	9,00	$ 11.700.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$	250.000	13,00	$ 3.250.000
3.3	Campero con conductor	DIA	$	350.000	0,00	$ -
3.4	Tarifa de planta	DIA	$	450.000	17,00	$ 7.650.000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$	8.500.000	0,00	$ -
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$	160.000	0,00	$ -
3.7	Construcción de anclajes	EA	$	1.800.000	0,00	$ -
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$	280.000	27,00	$ 7.560.000
3.9	Container adicional	DIA	$	280.000	0,00	$ -
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con cuadrilla)	EA	$	4.370.000	4,00	$ 17.480.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$	400.000	38,00	$ 10.257.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$	28.000.000	1,00	$ 28.000.000
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBHS	GLOBAL	$	250.000	0,00	$ -
	SUBTOTAL					$ 1.034.578.128,00
	BASE GRAVABLE					$ 82.926.250,24
	FACTOR DE SERVICIO					$ -
	TOTAL BASE GRAVABLE					$ 82.926.250,24
	BASE NO GRAVABLE					$ 951.651.877,76
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					$ 1.034.578.128,00
	IVA BASE GRAVABLE					$ 13.268.200,04
	TOTAL EQUIPO DE WO 550HP					$ 1.047.846.328,04

Equipos 350 HP - Tanque Bomba

1	TARIFAS DE MOVILIZACION					
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$	360.000.000		$ -
1.2	Movilización final	GLOBAL	$	360.000.000		$ -
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$	28.000.000		$ -
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$	30.500.000		$ -
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$	38.500.000		$ -
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$	63.500.000		$ -
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$	76.600.000		$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$	84.000.000		$ -
2						
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$	23.200.000		$ -
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$	23.100.000		$ -
2.3	Stand by	DIA	$	18.000.000		$ -
3						
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$	1.300.000		$ -
3.2	Campero sin conductor	DIA	$	250.000		$ -
3.3	Campero con conductor	DIA	$	350.000		$ -
3.4	Tarifa de planta	DIA	$	450.000		$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$	8.500.000		$ -
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$	160.000		$ -
3.7	Construcción de anclajes	EA	$	1.800.000		$ -
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$	280.000		$ -
3.9	Container adicional	DIA	$	280.000		$ -
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con cuadrilla)	EA	$	4.370.000		$ -
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$	400.000		$ -
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$	28.000.000		$ -
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBHS	GLOBAL	$	250.000		$ -
	SUBTOTAL					0
	BASE GRAVABLE					0
	FACTOR DE SERVICIO					0
	TOTAL BASE GRAVABLE					0
	BASE NO GRAVABLE					0
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					0
	IVA BASE GRAVABLE					0
	TOTAL EQUIPO DE WO					0

SUBTOTAL	$ 1.034.578.128,00
BASE GRAVABLE	$ 82.926.250,24
FACTOR DE SERVICIO	$ -
TOTAL BASE GRAVABLE	$ 82.926.250,24
TOTAL BASE NO GRAVABLE	$ 951.651.877,76
TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE	$ 1.034.578.128,00
IVA BASE GRAVABLE	$ 13.268.200,04
TOTAL EQUIPOS DE WO 550HP -350HP- TANQUE BOMBA	$ 1.047.846.328,04

Agregar	100%
Servicio de Mayor	
Swivel	
Total	100%

En constancia de lo anterior firman los representantes de las partes:

HUBER SILVA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
REPRESENTANTE DELEGADO

LUIS JOSE ALMEIDA PINZÓN
ECOPETROL
GESTOR TECNICO

JAVIER FERNANDO LEAL JAIMES
ECOPETROL
ADMINISTRADOR

436

Nit. 900.110.188-7
IVA RÉGIMEN COMUN, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION 11544 DEL 23/12/04

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 1520
ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO 504, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 320000912691, FECHA 2012/04/25
FACTURACION AUTORIZADA No. 2638 a No 9999 POR COMPUTADOR

ORIGINAL

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

FECHA: 26/11/2012
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 P 1
BOGOTA, D.C.

FACTURA DE VENTA No: 3306 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN: 7135 SP

UN: PT31227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016

CONCEPTO: ACTA PARCIAL 4.1
HOJAS DE ENTRADA
1000821833 1000821841 1000821848 1000821849 1000821856 1000821857 1000821863 1000821865 1000821872 1000821874
APROBACIONES
5000997805 5000997762 5000997852 5000997848 5000997847 5000997846 5000997814 5000997807 5000997905 5000997854
Manifestamos que Independence Drilling S.A. ha efectuado los aportes a la seguridad social por los ingresos materia de esta facturación, dando cumplimiento al monto máximo dispuesto por la ley para la base de cotización. El pago de los aportes a seguridad social respectivos se realizó bajo la planilla número 8419159485 del mes de Octubre de año 2012.

ECOPETROL S.A.
OFICINA CUENTAS
BOGOTA
27 NOV 2012
RECIBIDO

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	UN	1.000	1.036.578.128	1.036.578.128

TOTAL:	1.036.578.128
BASE GRAVADA	82.926.250
BASE NO GRAVADA:	953.651.878
IVA 16 %	13.268.200
TOTAL A PAGAR	1.049.846.328

CONDICIONES DE PAGO: Contado a 30 días
VALOR EN LETRAS: UN MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESC

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptado - Cliente

Nit. 899.130.188-7
IVA RÉGIMEN COMÚN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCIÓN 11946 DEL 2012-04

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1120
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 304, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCIÓN DIAN No. 320000913097, FECHA 2012-06-25
FACTURACIÓN AUTORIZADA No. 2020 a la 9999 POR COMPUTADOR

ORIGINAL

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

FECHA: 26/11/2012
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 P 1
BOGOTA, D.C.

FACTURA DE VENTA No: 3306 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN : 7135 SP

UN: PT31227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016

IENTOS VEINTE Y OCHO PESOS CON 00/100 M.L. **********

ESTA FACTURA SE CONSIDERÁ ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN. DESPUES DE LA FECHA SE CUBRIRÁ INTERES POR MORA, AL MAXIMO ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptado - Cliente

437

	ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL DE OBRA/SERVICIO		
ECOPETROL	GESTION DE ABASTECIMIENTO DIRECCION ESTRATEGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-082	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL DE SERVICIO Nº 14 AL CONTRATO MA-0009346

CONTRATO:	**MA-0009346**
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 – 2016.**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**($122.351.947.960)** CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR IVA.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	**(1005)** MIL CINCO DIAS CALENDARIO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 LO QUE OCURRA PRIMERO.
MAYOR CANTIDAD 1	**($5.957.053.280)** CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y TRES DOSCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
MAYOR CANTIDAD 2	**($4.049.217.320)** CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
MAYOR CANTIDAD 3	**($8.005.790.580)** OCHO MIL CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR IVA.
MAYOR CANTIDAD 4	**($3.670.955.320)** TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**($144.034.964.460)** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR IVA.
SALDO DEL CONTRATO	**($63.594.220.754)** SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
VALOR EJECUTADO	**($80.440.743.706)** OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	09/06/2012
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO:	31/12/2014
FECHA DE CORTE:	15/07/2013
PERIODO FACTURADO:	16/06/2013 – 15/07/2013
PORCENTAJE DE PAGO:	65.75%
ADMINISTRADOR:	NIXON STIPH MOLINA BAQUERO
GESTOR DEL CONTRATO:	COPCO S.A.
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.

	ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL DE OBRA/SERVICIO		
ecopetrol	GESTION DE ABASTECIMIENTO DIRECCION ESTRATEGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-082	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

Mediante la suscripción de la presente Acta:

a) **INDEPENDENCE DRILLING S.A.,** que para todos los efectos legales y para los de este documento se denomina el CONTRATISTA, **FRANCISCO JAVIER VILLABONA.** mayor de edad, identificado con Cédula 17.419.403, quien actúa en su calidad de representante autorizado de la empresa y,
b) **LAURA JULIANA NIÑO FLOREZ** identificado con Cédula de Ciudadanía número 63.510.108 de Bucaramanga, quien actúa en su calidad de GESTOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.
c) **NIXON STIPH MOLINA BAQUERO** identificado con registro Ecopetrol Nº E0117279 quien actúa en calidad de Administrador del contrato.

Dejan constancia de que,

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el **16 de Junio de 2013 al 15 de Julio de 2013,** prestó los servicios contemplados en el contrato **MA-0009346** que se relaciona en la presente acta de liquidación parcial de servicio. El valor del servicio prestado en el periodo es el siguiente:

ACTA Nº	VALOR ACTA	SALDO DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	6.778.373.400	137.256.591.060,00	6.778.373.400,00	5,54%
2	3.476.839.100	133.779.751.960,00	10.255.212.500,00	8,38%
2.1	1.522.502.200	132.257.249.760,00	11.777.714.700,00	9,63%
3	4.468.492.200	127.788.757.560,00	16.246.206.900,00	13,28%
4	4.718.137.300	123.070.620.260,00	20.964.344.200,00	17,13%
4.1	1.036.578.128	122.034.042.132,00	22.000.922.328,00	17,98%
5	6.504.068.189	115.529.973.943,00	28.504.990.517,00	23,30%
6	5.512.239.600	110.017.734.343,00	34.017.230.117,00	27,80%
7	2.197.630.700	107.820.103.643,00	36.214.860.817,00	29,60%
8	4.210.389.900	103.609.713.743,00	40.425.250.717,00	33,04%
9	6.933.569.126	96.676.144.617,00	47.358.819.843,00	38,71%
10	6.111.735.800	90.564.408.817,00	53.470.555.643,00	43,70%
11	7.624.230.163	82.940.178.654,00	61.094.785.806,00	49,93%
12	5.801.203.900	77.138.974.754,00	66.895.989.706,00	54,68%
13	6.566.742.600	70.572.232.154,00	73.462.732.306,00	60,04%
14	6.978.011.400	63.594.220.754,00	80.440.743.706,00	65,75%

438

	ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL DE OBRA/SERVICIO		
ECOPETROL	GESTION DE ABASTECIMIENTO DIRECCION ESTRATEGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-082	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

- La presente acta es elaborada por la Gestoría Administrativa con base en la conciliación de cantidades realizadas por la Gestoría Técnica y el Contratista.
- La presente Acta sirve de base para la presentación de la correspondiente factura o cuenta de cobro por parte del CONTRATISTA, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de pago señalados contractualmente.
- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el Contratista, Administrador del contrato y Gestor Administrativo.

En constancia, se firma en Castilla a los 22 días del mes de Julio del 2013, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

POR EL CONTRATISTA
FRANCISCO JAVIER VILLABONA
Representante Autorizado.

POR LA GESTION ADMINISTRATIVA
LAURA JULIANA NIÑO FLOREZ
COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY S.A.

POR ECOPETROL S.A.
NIXON STIPH MOLINA BAQUERO
Administrador del Contrato MA-0009346

ECOPETROL	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS Nro 14

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA-CHICHIMENE
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2013
VALOR PRESENTE ACTA	SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 6.978.011.400) SIN IVA

Mediante la suscripción de la presente Acta:

a) INDEPENDENCE DRILLING S.A., en adelante el CONTRATISTA, representado por FRANCISCO JAVIER VILLABONA TAMAYO, mayor de edad, vecino de la ciudad de BOGOTA, identificado con C.C. Nº 17.419.403 DE ACACIAS, META, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y

b) JUAN CARLOS NAVARRO GARCIA Identificado con Cédula de Ciudadanía número 7.700.896 EXPEDIDA EN NEIVA - HUILA, quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

Dejan constancia de que,

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2013, prestó los servicios contemplados en el contrato MA-0009346 que se relaciona en la presente acta de recibo de cantidades. El valor del servicio prestado en el periodo es el siguiente:

Cantidades Equipo 550 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	0,00	$ 350.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	0,00	$ 350.000.000	$ 0
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	5,00	$ 14.075.000	$ 70.375.000
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	4,00	$ 33.500.000	$ 134.000.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	11,00	$ 40.000.000	$ 440.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	1,00	$ 60.000.000	$ 60.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 78.000.000	$ 0

ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
ECOPETROL	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO	
GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 90.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	153,085	$ 24.400.000	$ 3.735.274.000
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	39,104	$ 24.300.000	$ 950.227.200
2.3	Stand by	0,396	$ 18.000.000	$ 7.128.000
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	104,00	$ 1.300.000	$ 135.200.000
3.2	Campero sin conductor	60,00	$ 250.000	$ 15.000.000
3.3	Campero con conductor	90,00	$ 350.000	$ 31.500.000
3.4	Tarifa de planta	1,00	$ 450.000	$ 450.000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	13,00	$ 8.500.000	$ 110.500.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	40,00	$ 160.000	$ 6.400.000
3.7	Construcción de anclajes	0,00	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	99,00	$ 280.000	$ 27.720.000
3.9	Container adicional	30,00	$ 280.000	$ 8.400.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	23,00	$ 4.370.000	$ 100.510.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	569,00	$ 400.000	$ 227.600.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	2,00	$ 28.000.000	$ 56.000.000
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0,00	$ 250.000	$ 0
	FACTOR DE SERVICIO			$ 0
	TOTAL			**$ 6.116.284.200**

Cantidades Equipo 350 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	0,00	$ 360.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	0,00	$ 360.000.000	$ 0
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	0,00	$ 28.000.000	$ 0
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	3,00	$ 30.500.000	$ 91.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	0,00	$ 38.500.000	$ 0
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	1,00	$ 63.500.000	$ 63.500.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 76.600.000	$ 0
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 84.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	23,125	$ 23.200.000	$ 536.500.000
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	3,312	$ 23.100.000	$ 76.507.200
2.3	Stand by	0	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	11	$ 1.300.000	$ 14.300.000
3.2	Campero sin conductor	0	$ 250.000	$ 0
3.3	Campero con conductor	0	$ 350.000	$ 0
3.4	Tarifa de planta	0	$ 450.000	$ 0

3.5	Tarifa de circulación de pozos	0	$ 8.500.000	$ 0
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	0	$ 160.000	$ 0
3.7	Construcción de anclajes	0	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	24	$ 280.000	$ 6.720.000
3.9	Container adicional	57	$ 280.000	$ 15.960.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	2	$ 4.370.000	$ 8.740.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	120	$ 400.000	$ 48.000.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	0	$ 28.000.000	$ 0
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0	$ 250.000	$ 0
FACTOR DE SERVICIO				$ 0
TOTAL				**$ 861.727.200**

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el COORDINADOR DE GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO.

En constancia, se firma en Villavicencio 19 de Julio de 2013, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

Por el CONTRATISTA

FRANCISCO JAVIER VILLABONA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Por la GESTIÓN TÉCNICA

JUAN CARLOS NAVARRO GARCIA
ECOPETROL S.A.

440

ECOPETROL S.A.
SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA- CHICHIMENE
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 14 - CONTRATO MA-0009346

El día 19 de Juliode 2013, se reunieron en las oficinas del Departamento de Producción de la Superintendencia de Operaciones Castilla- Chichimene, el Ing. Francisco Villabona en representación de Independence Drilling S.A. y el Ingeniero Juan Carlos Navarro garcia en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes:

Periodo de liquidación: 16 de junio de 2013 **AL** 15 de julio de 2013

Equipo 550 HP

	TARIFAS DE MOVILIZACION					
1		GLOBAL				
1.1	Movilización inicial		$	350.000.000	0	$ -
1.2	Movilización final		$	350.000.000	0	$ -
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$	14.075.000	5	$ 70.375.000
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$	33.500.000	4	$ 134.000.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$	40.000.000	11	$ 440.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$	60.000.000	1	$ 60.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$	78.000.000	0	$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$	90.000.000	0	$ -
2	**TARIFAS DE OPERACION**					
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$	24.400.000	153	$ 3.735.274.000
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$	24.300.000	39	$ 950.227.200
2.3	Stand by	DIA	$	18.000.000	0	$ 7.128.000
3	**OTROS EQUIPOS**					
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$	1.300.000	104	$ 135.200.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$	250.000	60	$ 15.000.000
3.3	Campero con conductor	DIA	$	350.000	90	$ 31.500.000
3.4	Tarifa de planta	DIA	$	450.000	1	$ 450.000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$	8.500.000	13	$ 110.500.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$	160.000	40	$ 6.400.000
3.7	Construcción de anclajes	EA	$	1.800.000	0	$ -
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$	280.000	99	$ 27.720.000
3.9	Container adicional	DIA	$	280.000	30	$ 8.400.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	EA	$	4.370.000	23	$ 100.510.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$	400.000	569	$ 227.600.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$	28.000.000	2	$ 56.000.000
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$	250.000	0	$ -
	SUBTOTAL					6.116.284.200
	BASE GRAVABLE					489.302.736
	FACTOR DE SERVICIO				8%	
	TOTAL BASE GRAVABLE					489.302.736
	BASE NO GRAVABLE					5.626.981.464
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					6.116.284.200
	IVA BASE GRAVABLE					78.288.438
	TOTAL EQUIPO DE WO 550HP					6.194.572.638

Equipos 350 HP - Tanque Bomba

	TARIFAS DE MOVILIZACION					
1		GLOBAL				
1.1	Movilización inicial		$	360.000.000	0	$ -
1.2	Movilización final		$	360.000.000	0	$ -
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$	28.000.000	0	$ -
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$	30.500.000	3	$ 91.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$	38.500.000	0	$ -
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$	63.500.000	1	$ 63.500.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$	76.600.000	0	$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$	84.000.000	0	$ -
2	**TARIFAS DE OPERACION**					
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$	23.200.000	23	$ 536.500.000
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$	23.100.000	3	$ 76.507.200
2.3	Stand by	DIA	$	18.000.000	0	$ -
3	**OTROS EQUIPOS**					
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$	1.300.000	11	$ 14.300.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$	250.000	0	$ -
3.3	Campero con conductor	DIA	$	350.000	0	$ -
3.4	Tarifa de planta	DIA	$	450.000	0	$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$	8.500.000	0	$ -
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$	160.000	0	$ -
3.7	Construcción de anclajes	EA	$	1.800.000	0	$ -
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$	280.000	24	$ 6.720.000
3.9	Container adicional	DIA	$	280.000	57	$ 15.960.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	EA	$	4.370.000	2	$ 8.740.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$	400.000	120	$ 48.000.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$	28.000.000	0	$ -
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$	250.000	0	$ -
	SUBTOTAL					841.727.200
	BASE GRAVABLE					68.938.176
	FACTOR DE SERVICIO				8%	
	TOTAL BASE GRAVABLE					68.938.176
	BASE NO GRAVABLE					792.789.024
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					861.727.200
	IVA BASE GRAVABLE					11.039.108
	TOTAL EQUIPO DE WO					872.767.308

Acacias	$	5.118.140.816,39	52%
Castilla La Nueva	$	3.028.666.250,47	39%
Guamal	$	719.892.083,34	9%
Total	$	7.866.698.751,91	100%

En constancia de lo anterior firman los representantes de las partes:

FRANCISCO VILLABONA
SUPERINTENDENCE DRILLING S.A.
REPRESENTANTE DELEGADO

JUAN CARLOS NAVARRO GARCIA
ECOPETROL
GESTOR TECNICO

NELSON MOLINA BAQUERO
ECOPETROL
ADMINISTRADOR

LIQUIDACION PARCIAL 14
CONTRATO SLA-0089246

Desde 16-Jun-13 Hasta 15-Jul-13


Torre 27 - 350 HP

ACTOS CONTRACTUALES	VALOR
Valor Inicial del Contrato sin IVA (a)	$ 6.440.624.640,00
Valor Aprobado	$ 20.534.700.000
Valor a Pagar	$ 7.788.324.800
Valor Total Facturado	$ 19.137.311.400
Porcentaje de Ejecución Valor	94,85%
Plazo de Ejecución	730
Fecha de Inicio	09-Jun-11
Fecha Definitiva de Terminación	31-Dic-13
Plazo Real de Ejecución	570
Avance en tiempo (días)	483
Porcentaje de Ejecución de Tiempo	66%

Periodo del Informe	
Desde	16-Jun-13
Hasta	15-Jul-13


Independence ENERGY


SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO

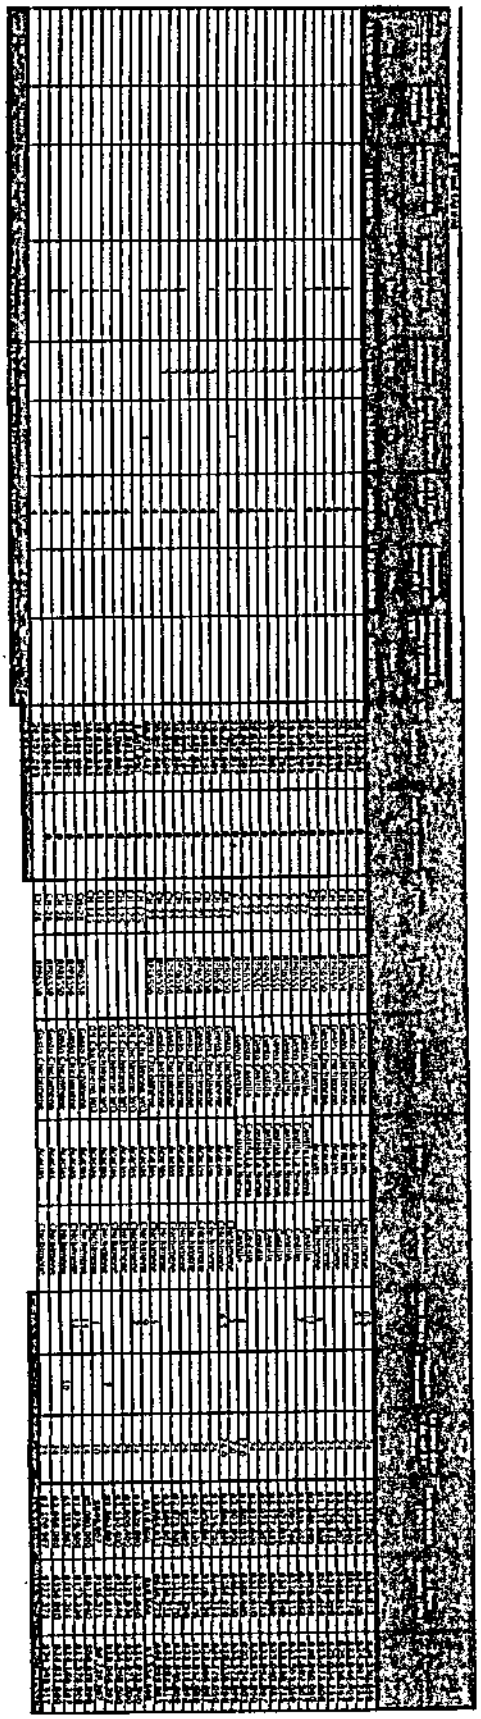

LIQUIDACION PARCIAL 14
CONTRATO MA-0009346

Desde 16-Jun-13 **Hasta** 15-Jul-13

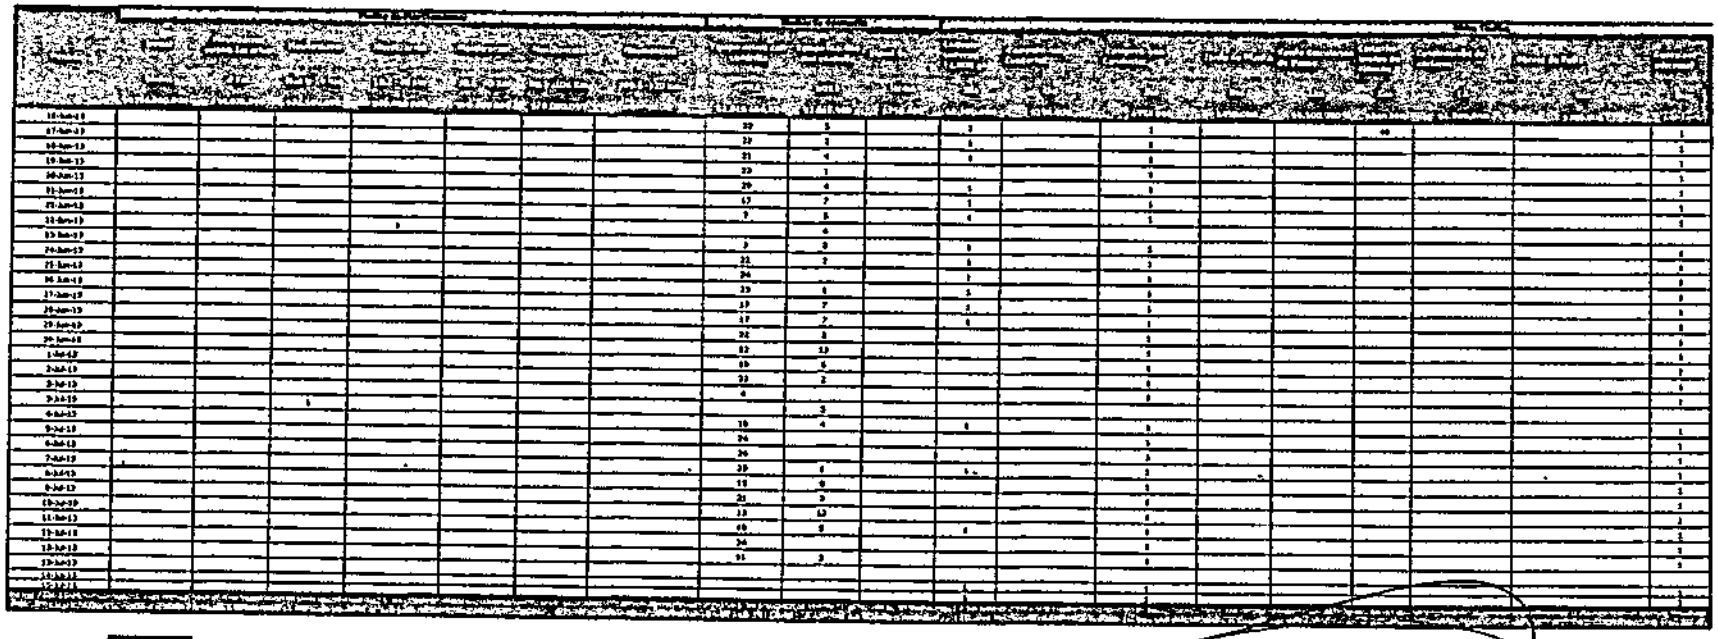

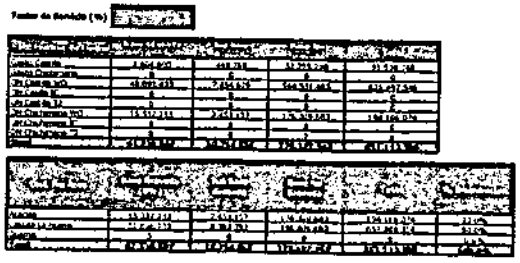


GESTOR TECNICO CONTRATO MA-0009346

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Independence ENERGY


SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO

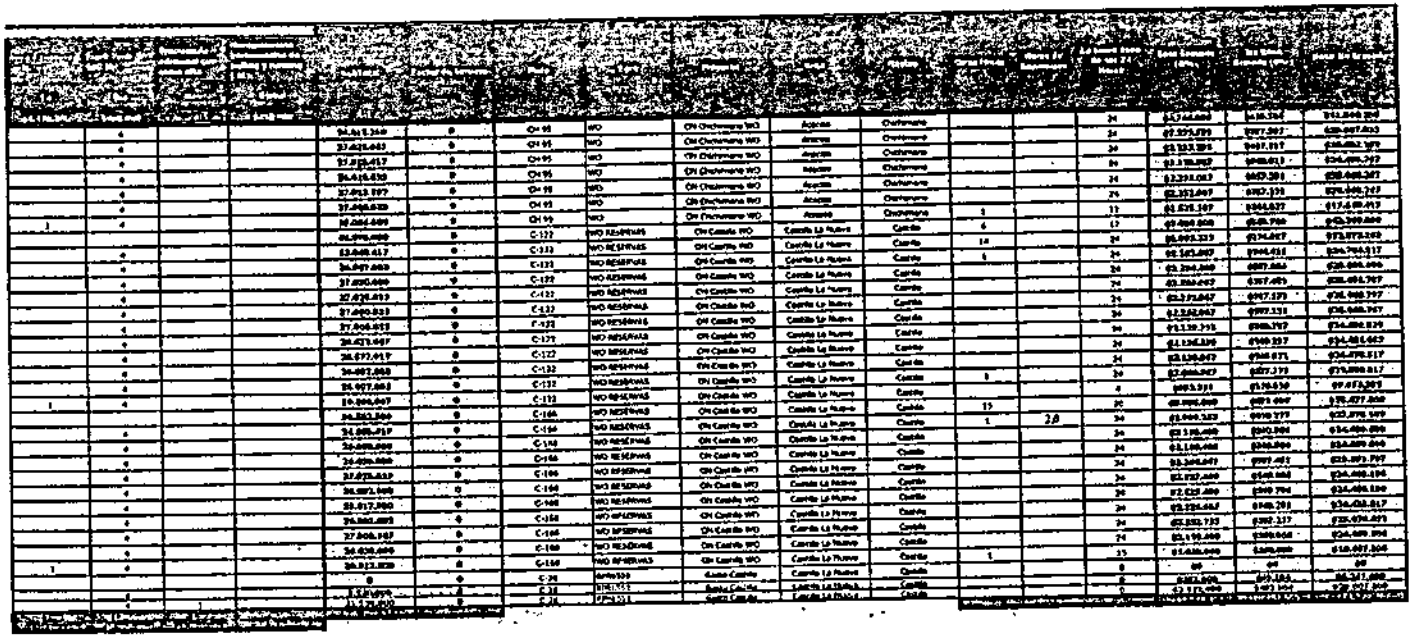

LIQUIDACI ON PARCIAL 14
CONTRATO MA-0009346


Desde 16-Jun-13 Hasta 15-Jul-13

Torre 31 - 550 HP

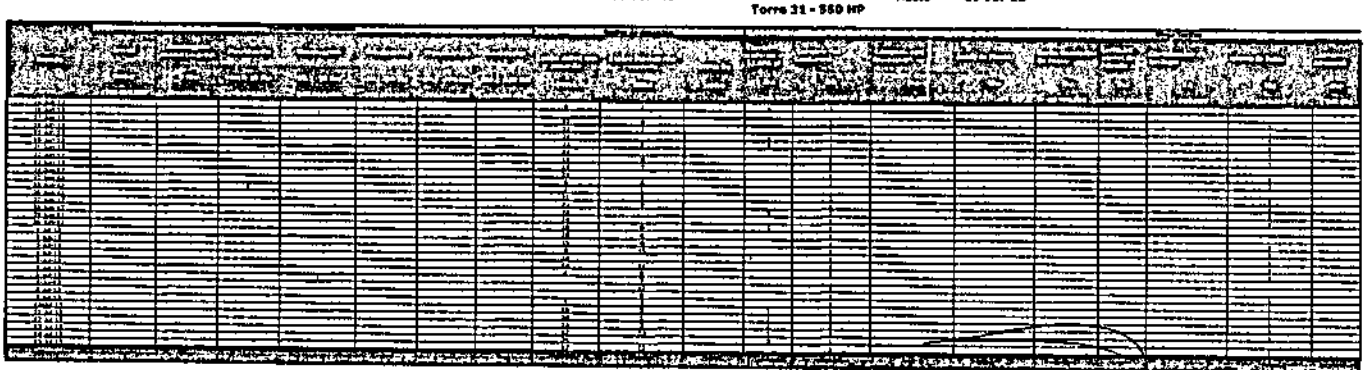

Independence ENERGY


SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO

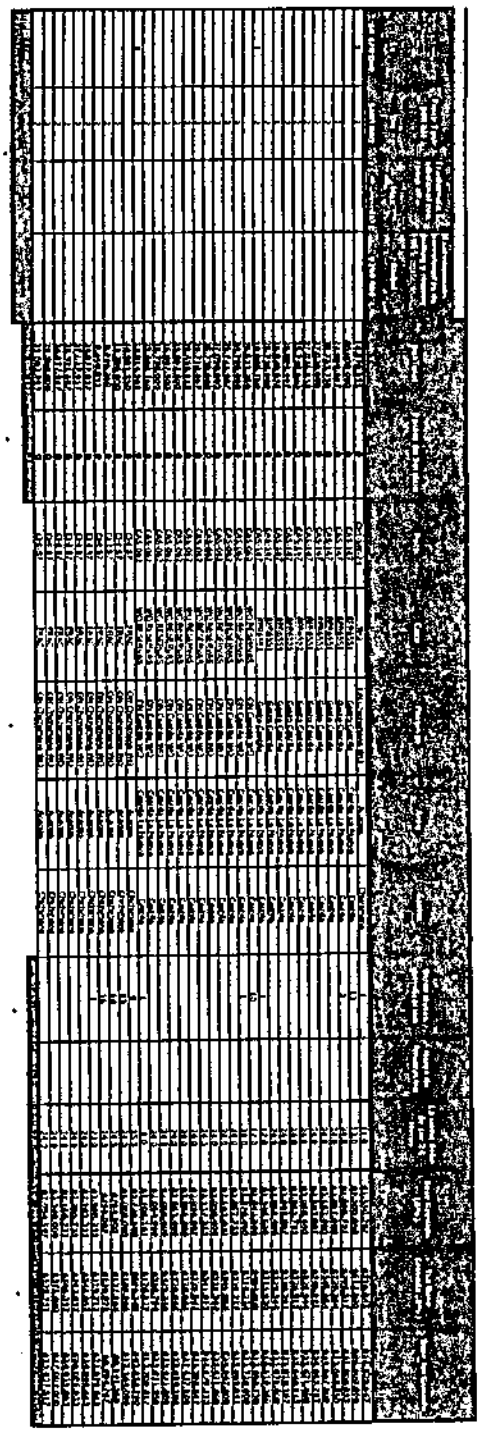



LIQUIDACION PARCIAL 14
CONTRATO MA-0009346

Desde 16-Jun-13 Hasta 15-Jul-13

Torre 32 - 550 HP

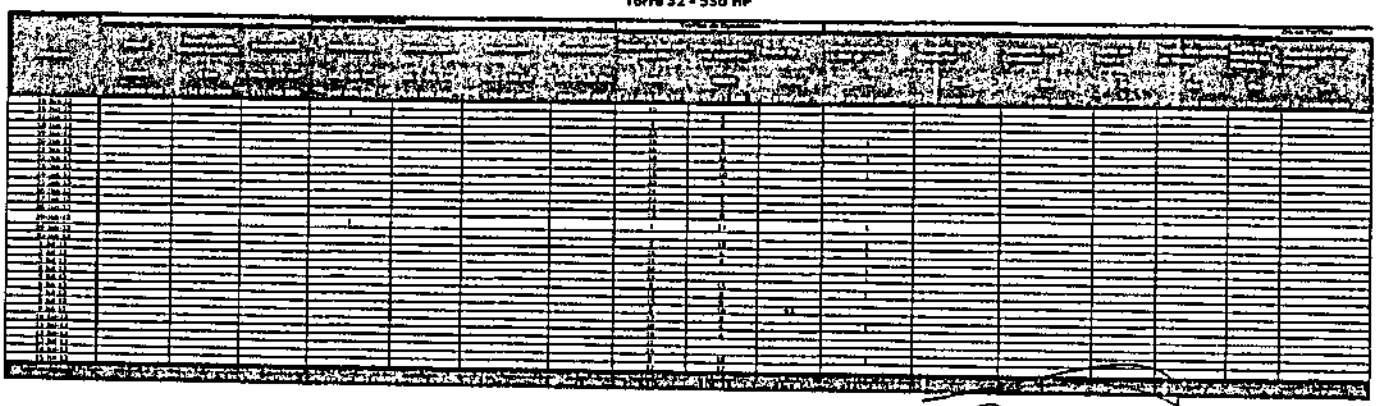











SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO


LIQUIDACION PARCIAL 14
CONTRATO MA-00093-06

Desde 16-Jun-13 Hasta 15-Jul-13

Torre 34 - 550 HP

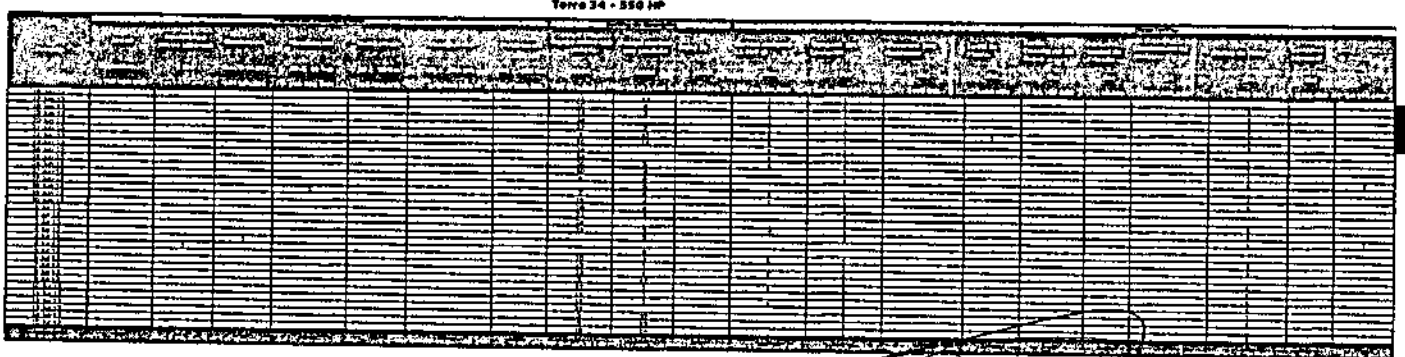











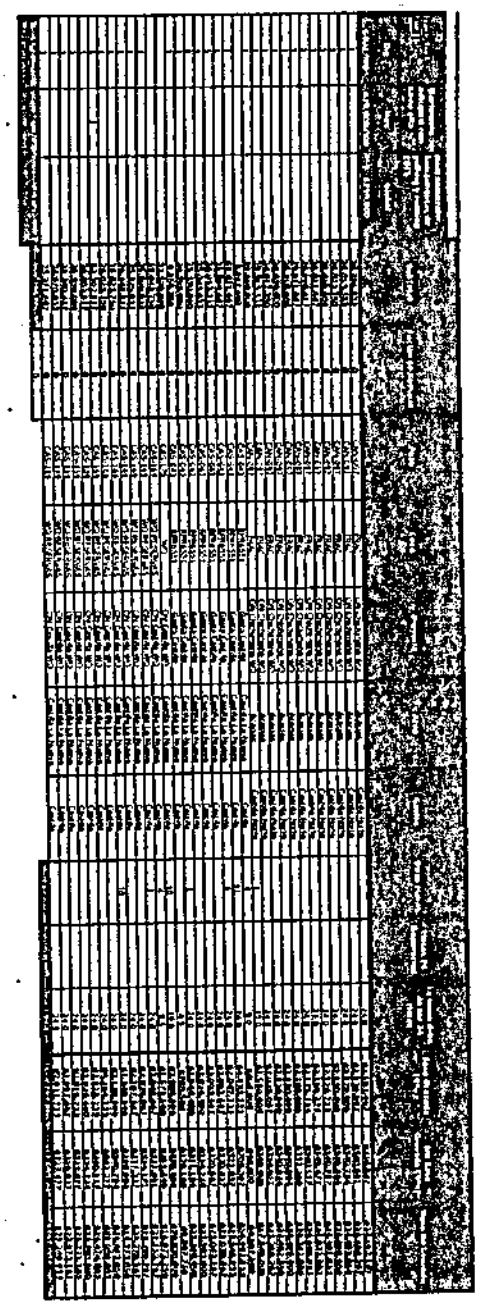



LIQUIDACION PARCIAL 14
CONTRATO MA-0009346

Desde 16-Jun-13 Hasta 15-Jul-13

Torre 42 - 550 HP

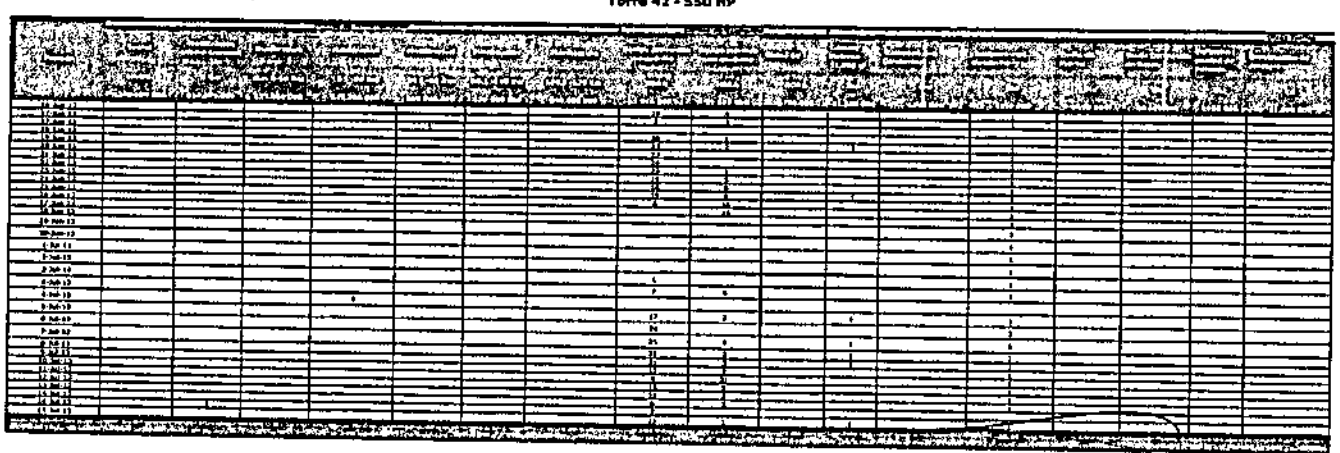











Independence
ENERGY
SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO

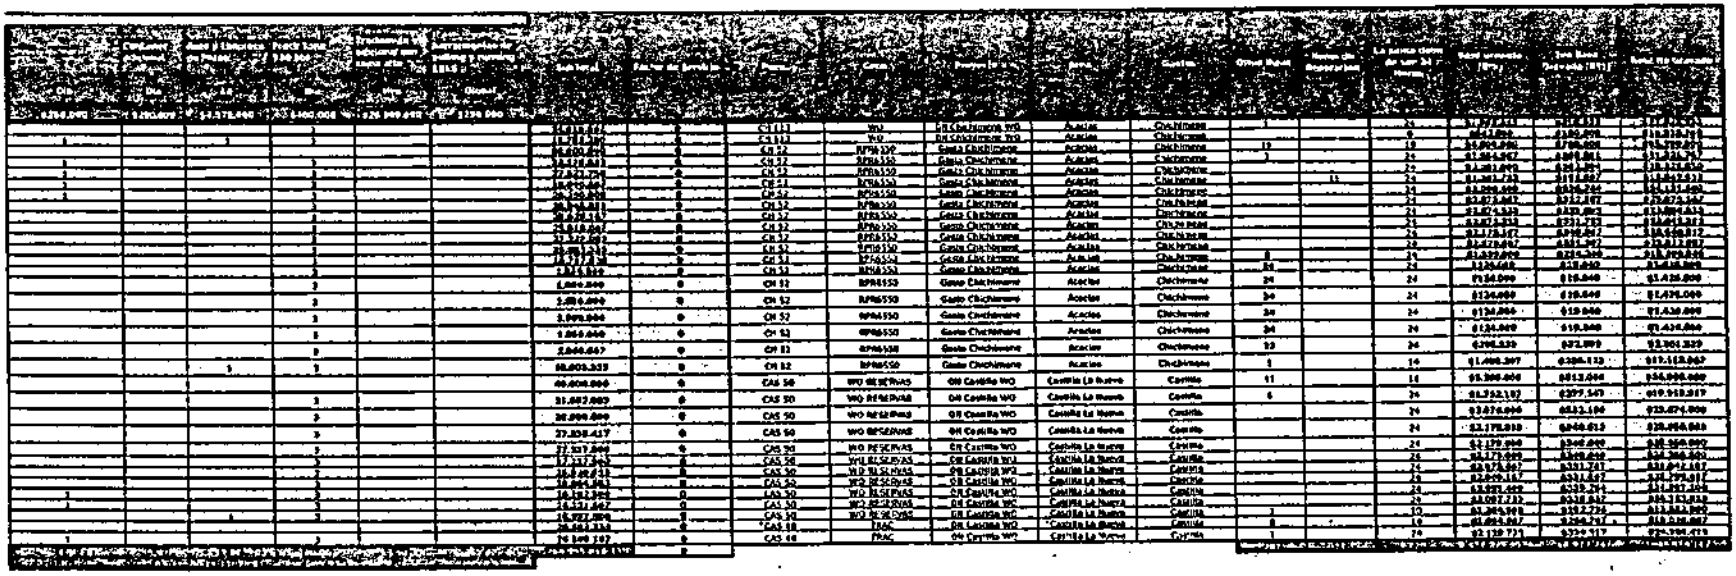



LIQUIDACION PARCIAL 14
CONTRATO MA-0009346

Desde 16-Jun-13 Hasta 15-Jul-13

Torre 53 - 550 HP

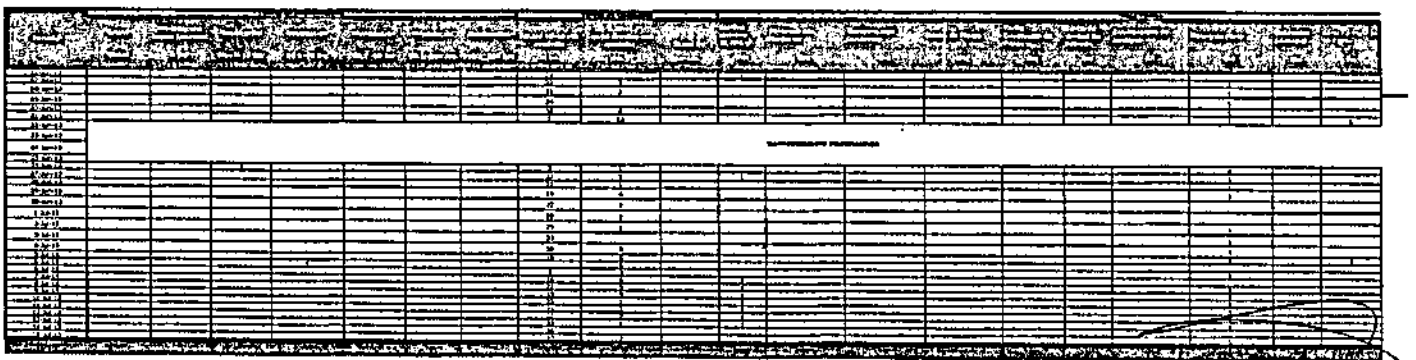











SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO

LIQUIDACION PARCIAL 14
CONTRATO HA-0009346

Desde 18-Jun-13 Hasta 15-Jul-13

Torre 123- 550 HP

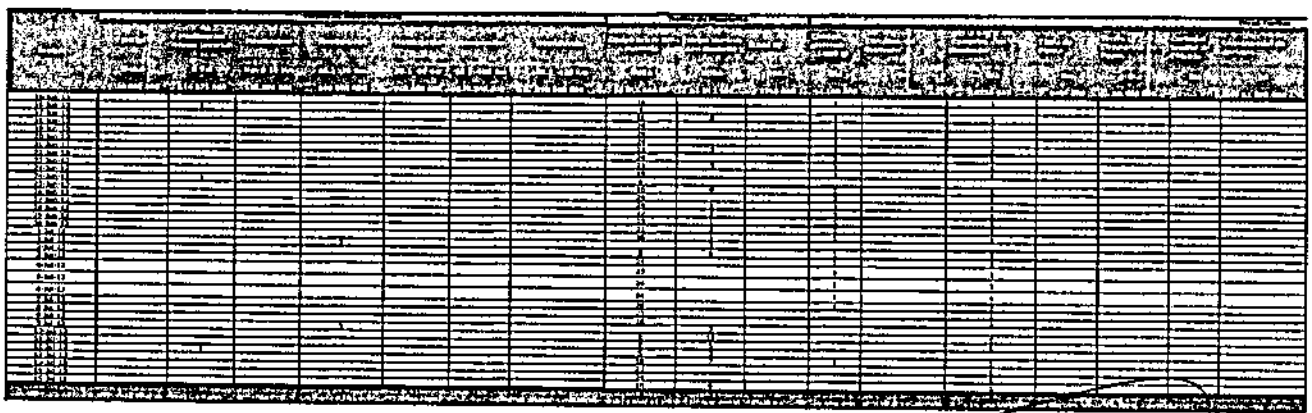








SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO

LIQUIDACION PARCIAL 14
CONTRATO MA-0008346

Desde 16-Jun-13 Hasta 15-Jul-13

Torre 126- 550 HP













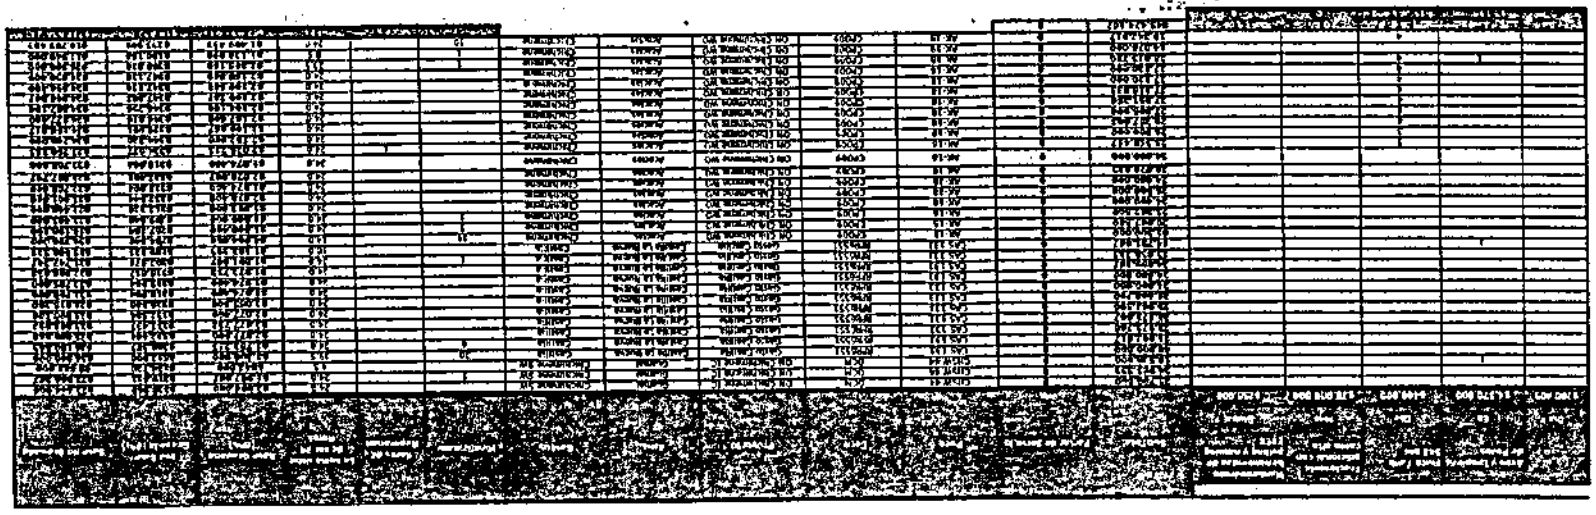



LIQUIDACION PARCIAL 14
CONTRATO MA-0009346

Desde 18-Jun-13 Hasta 19-Jul-13

Tanque Bombo

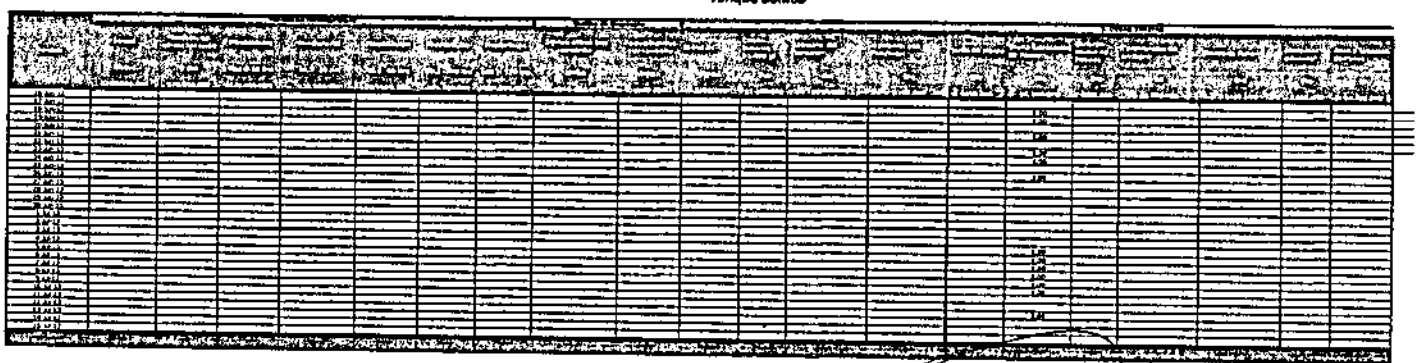










SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO

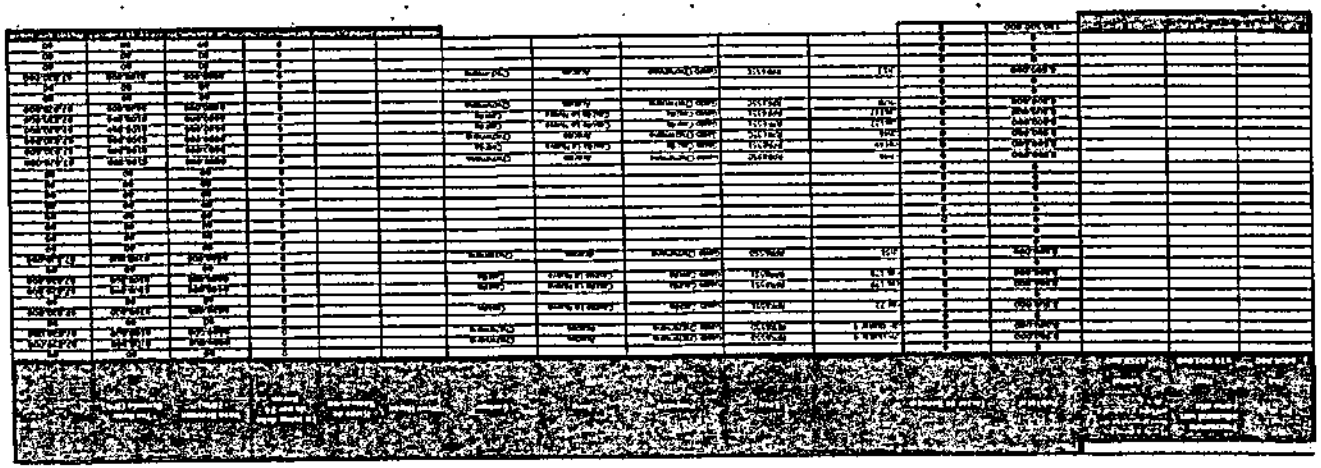

NIT 900.110.160-7
IVA REGIMEN COMUN, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION# 11944 DEL 23/12/08
SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCIÓN No. 010369 DEL 28/12/2012

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA RICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 0910
ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL 366, TARIFA 4.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 320000912947, FECHA 2012/06/25
FACTURACION AUTORIZADA No. 2830 a la 9999 POR COMPUTADOR

ORIGINAL

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

No. PAGINA: 1 of 10

FECHA: 24/07/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 Piso 1
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: 4182 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN: 8448 SP

UN: PT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

CONCEPTO: ACTA NO.14
PERIODO JUNIO 16 A JULIO 15/13
HOJAS DE ENTRADA
1000946193 1000946245 1000946196 1000946247 1000946200 1000946204 1000946235 1000946201 1000946209 1000946240 1000946222 1000946225 1000946232 1000946233 1000946212 1000946215 1000946228 1000946250 1000946229 1000946253 1000946210 1000946220

Manifestamos que Independence Drilling S.A. ha efectuado los aportes a la seguridad social por los ingresos materia de esta facturación, dando cumplimiento al monto máximo dispuesto por la ley para la base de cotización. El pago de los aportes a seguridad social respectivos se realizó bajo la planilla número 8424725392 del mes de Junio 2013

ECOPETROL S.A.
OFICINA CUENTAS
26 JUL 2013
RECIBIDO

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	2,000	4.370.000,0000	8.740.000
2.000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	11,000	1.300.000,0000	14.300.000
3.000	CONTAINER ADICIONAL	DI	57,000	280.000,0000	15.960.000
4.000	TARIFA DE FRAC TANK	DI	120,000	54.272,0833	6.512.650
5.000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	24,000	280.000,0000	6.720.000
6.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 30 A 60 KM	UN	1,000	63.500.000,0000	63.500.000
7.000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	79,500	962.500,0000	76.518.750

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA AL MAXIMO ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 774 DEL C.CO.)

Aceptado - Cliente

451

Nit. 830.110.959-7
IVA REGIMEN COMUN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION 11944 DEL 29/12/04
SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 010309 DEL 20/12/2012

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 0910
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 304, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 320000912647, FECHA 2012/06/25
FACTURACION AUTORIZADA No. 3628 a la 9999 POR COMPUTADOR

ORIGINAL

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

FECHA: 24/07/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 Piso 1
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: 4182 R1
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN: 8448 57

UN: PT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOEPTROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

CONCEPTO: ACTA NO.14
PERIODO JUNIO 16 A JULIO 15/13
HOJAS DE ENTRADA
1000945193 1000946245 1000946196 1000946247 1000946200 1000946204 1000946235 1000946201 1000946209
1000946240 1000946222 1000946225 1000946232 1000946233 1000946212 1000946215 1000946228 1000946250
1000946229 1000946253 1000946218 1000946220
Manifestamos que Independence Drilling S.A. ha efectuado los aportes a la seguridad social por los ingresos materia de esta facturación, dando cumplimiento al monto máximo dispuesto por la ley para la base de cotización. El pago de los aportes a seguridad social respectivos se realizó bajo la planilla número 8424725392 del mes de Junio 2013

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
8.000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	3,000	4.370.000,0000	13.110.000
9.000	CAMPERO CON CONDUCTOR	DI	30,000	350.000,0000	10.500.000
10.000	CARTUCHO UNIDAD DE FILTRADO	DI	40,000	160.000,0000	6.400.000
11.000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 18.000 GLS	UN	17,000	1.300.000,0000	22.100.000
12.000	CONTAINER ADICIONAL	DI	30,000	280.000,0000	8.400.000
13.000	TARIFA DE FRAC TANK	DI	120,000	400.000,0000	48.000.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA AL MAXIMO ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptado - Cliente

NIT 830 130 188-7
IVA RÉGIMEN COMÚN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCIÓN 11944 DEL 29/12/09
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000309 DEL 28/12/2012

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONÓMICA 0910
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 394, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCIÓN DIAN No. 320006013997, FECHA 2012-04-25
FACTURACIÓN AUTORIZADA No. 3630 a la 9999 POR COMPUTADOR

ORIGINAL

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

No. PAGINA: - 3 of 10

FECHA: - 24/07/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 Piso 1
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: - 4182 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN : 8448 SP

UN: PT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOEPTROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

CONCEPTO: ACTA NO.14
PERIODO JUNIO 16 A JULIO 15/13

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
14.000	TRACTOMULA ADICIONAL (MENSUAL)	DI	1.000	28.000.000,0000	28.000.000
15.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 0 A 10 KM	UN	1.000	33.500.000,0000	33.500.000
16.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 10 A 30 KM	UN	1.000	40.000.000,0000	40.000.000
17.000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	501.500	1.016.666,6660	509.858.333
18.000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	119.000	1.012.500,0000	120.487.500
19.000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	3.000	4.370.000,0000	13.110.000
20.000	CAMPERO SIN CONDUCTOR	DI	30.000	250.000,0000	7.500.000
21.000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	13.000	1.300.000,0000	16.900.000
22.000	TARIFA DE FRAC TANK	DI	59.000	400.000,0000	23.600.000
23.000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	24.000	280.000,0000	6.720.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA AL MAXIMO ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.C.)

Aceptado - Cliente

CL 100 7 33 T1 P 19 - BOGOTA PBX 57-1 5 87 53 33
FAX 57-1 Ext. 1006-1007 E-MAIL : info@independence.com.co
www.independence.com.co

452

NIT 830.110.164-7
IVA REGIMEN COMUN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION 11946 DEL 23/12/04
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCION No. 010589 DEL 28/12/2012

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 0910
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 304, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 320009128997, FECHA 2012/04/25
FACTURACION AUTORIZADA No. 2629 A la 5000 POR COMPUTADOR

ORIGINAL

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

FECHA: - 24/07/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 Piso 1
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: - 4182 RJ
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN: 8448 SP

UN: PT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOEPTROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

CONCEPTO: ACTA NO.14
PERIODO JUNIO 16 A JULIO 15/13

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
34.000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	470,500	1.016.666,6674	478.341.667
35.000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	189,000	1.012.500,0000	191.362.500
36.000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	CL	2,000	4.370.000,0000	8.740.000
37.000	CAMPERO SIN CONDUCTOR	DI	30,000	250.000,0000	7.500.000
38.000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	16,000	1.300.000,0000	20.800.000
39.000	TARIFA DE FRAC TANK	DI	30,000	400.000,0000	12.000.000
40.000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	24,000	280.000,0000	6.720.000
41.000	TARIFA DE PLANTA	DI	1,000	450.000,0000	450.000
42.000	TRACTOMULA ADICIONAL (MENSUAL)	DI	1,000	28.000.000,0000	28.000.000
43.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 10 A 30 KM	UN	1,000	40.000.000,0000	40.000.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.C.O.)

Aceptado - Cliente

NIT 900.110.186-7
IVA REGIMEN COMUN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION 11944 DEL 25/12/04
SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 010049 DEL 30/12/2013

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 0910
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 304, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 320000012647, FECHA 2012-08-23
FACTURACION AUTORIZADA No. 2650 a la 6000 POR COMPUTADOR

ORIGINAL

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

FECHA: - 24/07/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 Piso 1
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: - 4182 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN: 8448 SP

UN: PT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

CONCEPTO: ACTA NO.14
PERIODO JUNIO 16 A JULIO 15/13

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
24.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 0 A 10 KM	UN	1.000	33.500.000,0000	33.500.000
25.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 10 A 30 KM	UN	2.000	40.000.000,0000	80.000.000
26.000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	497.500	1.016.666,6673	505.791.667
27.000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	139.500	1.012.500,0000	141.243.750
28.000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	2.000	4.370.000,0000	8.740.000
29.000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	11.000	1.300.000,0000	14.300.000
30.000	TARIFA DE FRAC TANK	DI	60.000	400.000,0000	24.000.000
31.000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	7.000	280.000,0000	1.960.000
32.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 10 A 30 KM	UN	2.000	40.000.000,0000	80.000.000
33.000	EQUIPO EN STAND BY	HR	9.500	750.000,0000	7.125.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA ES ASIMILADA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO(ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptado - Cliente

453

NIT 900.110.088-7
IVA REGIMEN COMUN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION 11944 DEL 23/12/04
SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 010389 DEL 28/12/2012

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 0910
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 364, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 320000913697, FECHA 2012/06/25
FACTURACION AUTORIZADA No. 3629 a la 9999 POR COMPUTADOR

ORIGINAL

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

FECHA: - 24/07/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 Piso 1
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: - 4182 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN: 8448 SP

UN: PT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOEPTROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012.2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

CONCEPTO: ACTA NO.14
PERIODO JUNIO 16 A JULIO 15/13

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
44.000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	487.500	1.016.666.6667	495.625.000
45.000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	190.000	1.012.500.0000	192.375.000
46.000	MOVILIZACION EN LA MISMA LOCACIÓN	GL	1.000	14.075.000.0000	14.075.000
47.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 0 A 10 KM	GL	1.000	33.500.000.0000	33.500.000
48.000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	4.000	4.370.000.0000	17.480.000
49.000	CAMPERO CON CONDUCTOR	DI	45.000	350.000.0000	15.750.000
50.000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	15.000	1.300.000.0000	19.500.000
51.000	TARIFA DE FRAC TANK	DI	90.000	400.000.0000	36.000.000
52.000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	15.000	280.000.0000	4.200.000
53.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 10 A 30 KM	UN	2.000	40.000.000.0000	80.000.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO. ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptado - Cliente

NIT 830.110.186-7
IVA REGIMEN COMUN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION 11540 DEL 23/12/04
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 010169 DEL 29/12/2012

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 0910
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 304, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 3260009126#7, FECHA 2013/06/25
FACTURACION AUTORIZADA No. 2928 a la 4000 POR COMPUTADOR

ORIGINAL

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

FECHA: - 24/07/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 Piso 1
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: - 4182 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN : 8448 SP

UN: PT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

CONCEPTO: ACTA NO.14
PERIODO JUNIO 16 A JULIO 15/13

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
54,000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	568,000	1.016.666,6666	577.466,666
55,000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	147,000	1.012.500,0000	148.837,500
56,000	MOVILIZACION EN LA MISMA LOCACIÓN	GL	1,000	14.075.000,0000	14.075,000
57,000	MOVILIZACIÓN ENTRE POZOS DE 30 A 60 KM	GL	1,000	60.000.000,0000	60.000,000
58,000	TARIFA DE PLANTA	DI	3,000	450.000,0000	1.350,000
59,000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	2,000	4.370.000,0000	8.740,000
60,000	CAMPERO CON CONDUCTOR	DI	6,000	0,0000	
61,000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	9,000	1.300.000,0000	11.700,000
62,000	TARIFA DE FRAC TANK	DI	90,000	400.000,0000	36.000,000
63,000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	24,000	280.000,0000	6.720,000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptado - Cliente

454

NIT 900.110.190-7
IVA RÉGIMEN COMÚN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION 11944 DEL 25/12/04
SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 010589 DEL 28/12/2012

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 4910
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 504, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 18000091849, FECHA 2012-04-25
FACTURACION AUTORIZADA No. 3628 a la 5000 POR COMPUTADOR

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

ORIGINAL

Independence

FECHA: - 24/07/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 Piso 1
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: - 4182 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN: 8448 SP

UN: PT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

CONCEPTO: ACTA NO.14
PERIODO JUNIO 16 A JULIO 15/13

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
64.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 0 A 10 KM	UN	1,000	33.500.000,0000	33.500.000
65.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 10 A 30 KM	UN	1,000	40.000.000,0000	40.000.000
66.000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	488,500	1.016.666,6673	496.641.667
67.000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	79,000	1.012.500,0000	79.987.500
68.000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	6,000	4.370.000,0000	26.220.000
69.000	CAMPERO CON CONDUCTOR	DI	30,000	350.000,0000	10.500.000
70.000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	23,000	1.300.000,0000	29.900.000
71.000	TARIFA DE FRAC TANK	DI	120,000	400.000,0000	48.000.000
72.000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	1,000	280.000,0000	280.000
73.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 10 A 30 KM	UN	2,000	40.000.000,0000	80.000.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CCO.)

Aceptado - Cliente

Nit 830.119 188-2
IVA REGIMEN COMUN, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION 11946 DEL 23/12/04
SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCIÓN No. 010089 DEL 26/12/2012

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 9610
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 304, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 320000911997, FECHA 2012-06-25
FACTURACION AUTORIZADA No. 2620 a la 9999 POR COMPUTADOR

ORIGINAL

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

FECHA: 24/07/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 Piso 1
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: 4182 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN: 8448 SP

UN: PT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

CONCEPTO: ACTA NO.14
PERIODO JUNIO 16 A JULIO 15/13

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
74.000	MOVILIZACION EN LA MISMA LOCACIÓN	UN	3.000	14.075.000,0000	42.225.000
75.000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	600,500	1.016.666,6661	610.508.333
76.000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	69,500	1.012.500,0000	70.368.750
77.000	MOVILIZACION EN LA MISMA LOCACIÓN	UN	1.000	0,0000	
78.000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	3.000	4.370.000,0000	13.110.000
79.000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	14.000	1.300.000,0000	18.200.000
80.000	TARIFA DE FRAC TANK	DI	38.000	400.000,0000	15.200.000
81.000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	42.000	280.000,0000	11.760.000
82.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 30 A 60 KM	UN	1.000	60.000.000,0000	60.000.000
83.000	MOVILIZACION EN LA MISMA LOCACIÓN	UN	1.000	14.075.000,0000	14.075.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptado - Cliente

455

NIT 830.130.188-7
IVA REGIMEN COMUN, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION 11644 DEL 25/12/06
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 010809 DEL 26/12/2012

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 0910
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 304, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 320000012697, FECHA 2012/06/25
FACTURACION AUTORIZADA 1 No. 2628 a la 9999 POR COMPUTADOR

ORIGINAL

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

FECHA: - 24/07/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 Piso 1
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: - 4182 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN: 8448 SP

UN: PT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOEPTROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

CONCEPTO: ACTA NO.14
PERIODO JUNIO 16 A JULIO 15/13

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
84.000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	563,500	1.016.666,6673	572.891.667
85.000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	99.000	1.012.500,0000	100.237.500
86.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 10 A 30 KM	GL	1.000	40.000.000,0000	40.000.000

TOTAL	6.978.011.400,00
BASE GRAVADA	558.240.911,00
BASE NO GRAVADA	6.419.770.489,00
I.V.A 16%	89.318.545,00
TOTAL A PAGAR	7.067.329.945,00

CONDICIONES DE PAGO: Contado a 30 dias

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL NOVE CIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M.L. **********

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION, DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptada - Cliente

456

ecopetrol	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS Nro 14.1

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA-CHICHIMENE
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2013
VALOR PRESENTE ACTA	SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 788.515.400) SIN IVA

Mediante la suscripción de la presente Acta:

a) INDEPENDENCE DRILLING S.A., en adelante el CONTRATISTA, representado por FRANCISCO JAVIER VILLABONA TAMAYO, mayor de edad, vecino de la ciudad de BOGOTA, identificado con C.C. Nº 17.419.403 DE ACACIAS, META, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y

b) JUAN CARLOS NAVARRO GARCIA identificado con Cédula de Ciudadanía número 7.700.896 EXPEDIDA EN NEIVA - HUILA, quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

Dejan constancia de que,

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2013, prestó los servicios contemplados en el contrato MA-0009346 que se relaciona en la presente acta de recibo de cantidades. El valor del servicio prestado en el periodo es el siguiente:

Cantidades Equipo 550 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	0,00	$ 350.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	0,00	$ 350.000.000	$ 0
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	1,00	$ 14.075.000	$ 14.075.000
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	0,00	$ 33.500.000	$ 0
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	1,00	$ 40.000.000	$ 40.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	1,00	$ 60.000.000	$ 60.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 78.000.000	$ 0

457

ECOPETROL	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 90.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	20,979	$ 24.400.000	$ 511.887.600
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	3,896	$ 24.300.000	$ 94.672.800
2.3	Stand by	0,000	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	14,00	$ 1.300.000	$ 18.200.000
3.2	Campero sin conductor	0,00	$ 250.000	$ 0
3.3	Campero con conductor	15,00	$ 350.000	$ 5.250.000
3.4	Tarifa de planta	3,00	$ 450.000	$ 1.350.000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	1,00	$ 8.500.000	$ 8.500.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	0,00	$ 160.000	$ 0
3.7	Construcción de anclajes	0,00	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	38,00	$ 280.000	$ 10.640.000
3.9	Container adicional	0,00	$ 280.000	$ 0
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	2,00	$ 4.370.000	$ 8.740.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	38,00	$ 400.000	$ 15.200.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	0,00	$ 28.000.000	$ 0
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0,00	$ 250.000	$ 0
FACTOR DE SERVICIO				$ 0
TOTAL				**$ 788.515.400**

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el COORDINADOR DE GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO.

En constancia, se firma en Villavicencio 19 de Julio de 2013, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

Por el CONTRATISTA
FRANCISCO JAVIER VILLABONA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO

Por la GESTION TÉCNICA
JUAN CARLOS NAVARRO GARCIA
ECOPETROL S.A.

458

ECOPETROL S.A.
SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA- CHICHIMENE
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 14 - CONTRATO MA-0009346

El día 19 de Julio de 2013, se reunieron en las oficinas del Departamento de Producción de la Superintendencia de Operaciones Castilla- Chichimene, el Ing. Francisco Villabona en representación de Independence Drilling S.A. y el Ingeniero Juan Carlos Navarro garcia en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes:

Periodo de liquidación: 16 de junio de 2013 **AL** 15 de julio de 2013

Equipo 550 HP

No	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	TARIFAS DE MOVILIZACION				
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$ 350.000.000	0	$ -
1.2	Movilización final		$ 350.000.000	0	$ -
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 14.075.000	1	$ 14.075.000
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 33.500.000	0	$ -
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$ 40.000.000	1	$ 40.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$ 60.000.000	1	$ 60.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$ 78.000.000	0	$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$ 90.000.000	0	$ -
2	TARIFAS DE OPERACION				
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 24.400.000	21	$ 511.887.600
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 24.300.000	4	$ 94.672.800
2.3	Stand By	DIA	$ 18.000.000	0	$ -
3	OTRAS TARIFAS				
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$ 1.300.000	14	$ 18.200.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$ 250.000	0	$ -
3.3	Campero con conductor	DIA	$ 350.000	15	$ 5.250.000
3.4	Tanfa de planta	DIA	$ 450.000	3	$ 1.350.000
3.5	Tanfa de circulación de pozos	DIA	$ 8.500.000	1	$ 8.500.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$ 160.000	0	$ -
3.7	Construcción de anclajes	EA	$ 1.800.000	0	$ -
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$ 280.000	38	$ 10.640.000
3.9	Container adicional	DIA	$ 280.000	0	$ -
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	EA	$ 4.370.000	2	$ 8.740.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 400.000	38	$ 15.200.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$ 28.000.000	0	$ -
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$ 250.000	0	$ -
	SUBTOTAL				788.515.400
	BASE GRAVABLE				63.081.232
	FACTOR DE SERVICIO			16%	0
	TOTAL BASE GRAVABLE				63.081.232
	BASE NO GRAVABLE				725.434.168
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				788.515.400
	IVA BASE GRAVABLE				10.092.997
	TOTAL EQUIPO DE WO 550HP				798.608.397

Equipos 350 HP - Tanque Bomba

No	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	TARIFAS DE MOVILIZACION				
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$ 360.000.000	0	$ -
1.2	Movilización final		$ 360.000.000	0	$ -
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 28.000.000	0	$ -
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 30.500.000	0	$ -
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$ 38.500.000	0	$ -
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$ 63.500.000	0	$ -
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$ 76.600.000	0	$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$ 84.000.000	0	$ -
2	TARIFAS DE OPERACION				
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 23.200.000	0	$ -
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 23.100.000	0	$ -
2.3	Stand by	DIA	$ 18.000.000	0	$ -
3	OTRAS TARIFAS				
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$ 1.300.000	0	$ -
3.2	Campero sin conductor	DIA	$ 250.000	0	$ -
3.3	Campero con conductor	DIA	$ 350.000	0	$ -
3.4	Tanfa de planta	DIA	$ 450.000	0	$ -
3.5	Tanfa de circulación de pozos	DIA	$ 8.500.000	0	$ -
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$ 160.000	0	$ -
3.7	Construcción de anclajes	EA	$ 1.800.000	0	$ -
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$ 280.000	0	$ -
3.9	Container adicional	DIA	$ 280.000	0	$ -
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	EA	$ 4.370.000	0	$ -
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 400.000	0	$ -
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$ 28.000.000	0	$ -
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$ 250.000	0	$ -
	SUBTOTAL				0
	BASE GRAVABLE				0
	FACTOR DE SERVICIO			16%	0
	TOTAL BASE GRAVABLE				0
	BASE NO GRAVABLE				0
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				0
	IVA BASE GRAVABLE				0
	TOTAL EQUIPO DE WO				0

Campo Por Area	ICA	PORCENTAJE
Acacias	$ 788.515.400,00	100%
Castilla La Nueva		
Guamal		
Total	$ 788.515.400,00	100%

En constancia de lo anterior firman los siguientes las partes:

INDEPENDENCE DRILLING S.A.
REPRESENTANTE AUTORIZADO
SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO

JUAN CARLOS NAVARRO GARCIA
ECOPETROL
GESTOR TECNICO

NIXON MOLINA BAQUERO
ECOPETROL
ADMINISTRADOR

LIQUIDACION PARCIAL 14.1
CONTRATO MA-0009346

Desde **16-Jun-13** Hasta **15-Jul-13**

Torre 126- 550 HP

	Tarifas de Movilizacion							Tarifas de Operacion		Otras Tarifas						
8-Nov-12				1					4,00	1,00						
9-Nov-12								12,50	4,50	1,00		2,00				
10-Nov-12								22,00	1,00	1,00		2,00	1,00			
11-Nov-12								24,00		1,00		2,00	1,00			
12-Nov-12								16,50	5,50	1,00		2,00				
13-Nov-12								24,00		1,00		2,00	1,00			
14-Nov-12								23,00	1,00	1,00		2,00				
15-Nov-12								23,50	1,50	1,00		1,00				
16-Nov-12								18,00	6,00			1,00				
17-Nov-12								14,50	4,50			1,00				

Factor de Servicio (%)

Oh Castilla #60				

GESTOR TECNICO CONTRATO MA-0009346

REPRESENTANTE DELEGADO CONTRATISTA

Independence ENERGY

SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO


454

.						48.350.000	0	AK1		ON Chichimene WO	Acacias	Chichimene	-		4,0	$3.428.000	$500.480	$41.723.000
1,00						19.844.583	0	AK1		ON Chichimene WO	Acacias	Chichimene			17,0	$1.943.587	$388.171	$17.881.017
1,00						38.108.167	0	AK1		ON Chichimene WO	Acacias	Chichimene			23,0	$2.088.733	$334.197	$34.020.433
						26.650.000	0	AK1		ON Chichimene WO	Acacias	Chichimene			24,0	$2.140.000	$343.480	$24.702.000
						36.377.083	0	AK1		ON Chichimene WO	Acacias	Chichimene			24,0	$2.110.167	$337.627	$34.356.917
1,00						27.130.000	0	AK1		ON Chichimene WO	Acacias	Chichimene			24,0	$2.170.400	$347.264	$24.050.690
1,00						26.675.833	0	AK1		ON Chichimene WO	Acacias	Chichimene			24,0	$2.134.087	$341.451	$24.541.767
1,00						36.323.750	0	AK1		ON Chichimene WO	Acacias	Chichimene			24,0	$2.105.000	$336.964	$34.217.850
1,00						25.005.000	0	AK1		ON Chichimene WO	Acacias	Chichimene			24,0	$2.000.400	$320.064	$23.004.600
1,00		1,00				24.292.917	0	AK1		ON Chichimene WO	Acacias	Chichimene			19,0	$1.943.433	$311.019	$22.354.083
						0	0								0,0	$0	$0	$0
						0	0								0,0	$0	$0	$0
						0	0								0,0	$0	$0	$0
						0	0								0,0	$0	$0	$0
						0	0								0,0	$0	$0	$0
						0	0								0,0	$0	$0	$0
						0	0								0,0	$0	$0	$0
						0	0								0,0	$0	$0	$0


LIQUIDACION PARCIAL 14.1
CONTRATO MA-0009346


Desde **16-Jun-13** Hasta **15-Jul-13**

Torre 126- 550 HP

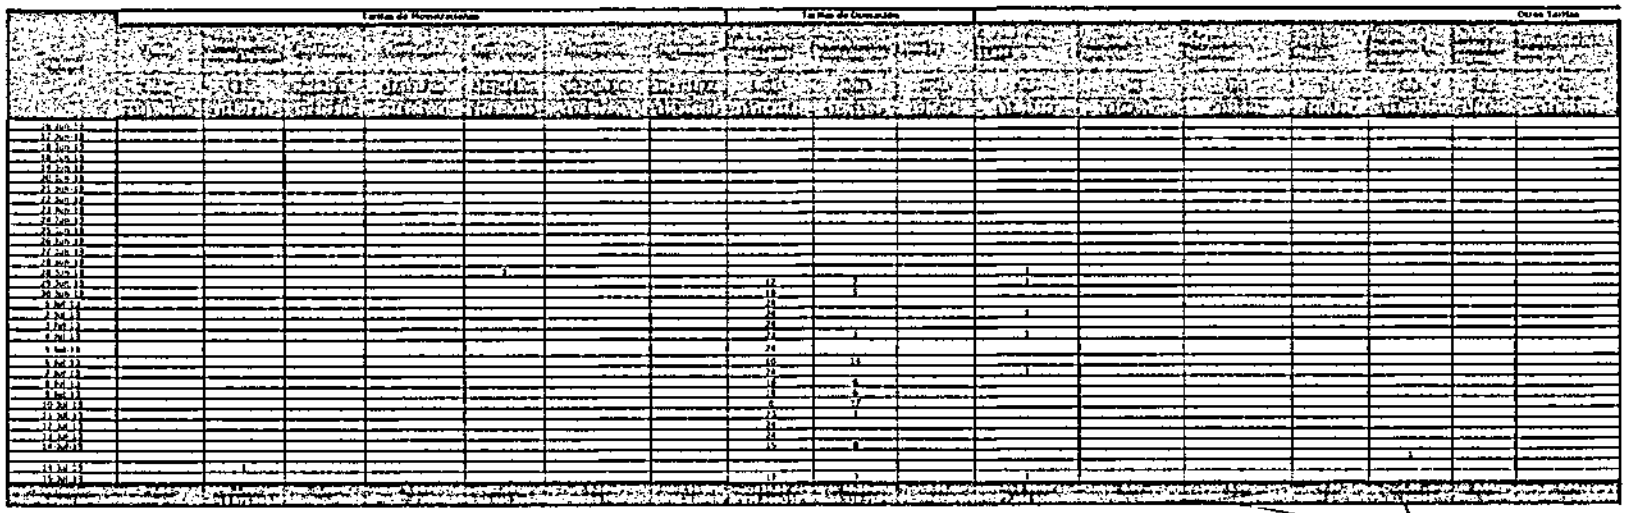


Factor de Eficiencia (%) **0%**







GESTOR TECNICO CONTRATO MA-0009346



REPRESENTANTE DELEGADO CONTRATISTA

SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO

460

Radicado Nro: 2-2013-013-9240 Para responder citelo
Ecopetrol - CASTILLA
Fecha: Oct 30 2013 2:02PM
Dependencia: CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS
Destino: LAURA JULIANA NIÑO FLOREZ (COPCO)
Original Folios: 1 Anexos: 1

2-2013-013-9240

461

ECOPETROL

SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA-CHICHIMENE

Castilla La Nueva, 23 de Septiembre de 2013

Doctora
LAURA JULIANA NIÑO FLOREZ
Gestora Administrativa
COPCO S.A.
Castilla La Nueva

Asunto: Entrega Pago Parcial No 16 Contrato MA-0009346

Estimada Laura, por medio de la presente hago entrega de los soportes correspondientes al pago parcial No 15 del contrato MA-0009346, cuyo Objeto es: "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."; suscrito con la Empresa INDEPENDENCE DRILLING S.A.

En consecuencia, relaciono los soportes:

- Acta de Gestoría Técnica GAB-F-080
- Acta de cantidades parcial No 16
- Distribución orden interna
- Informe de Gestoría técnica- Soportes Operaciones

Atentamente,

Nixon Molina Baquero
Gestor Técnico Contrato MA-0009346

Anexos: Documentos relacionados
NMB/RJHR

Superintendencia de Operaciones Castilla Chichimene
Castilla La Nueva Vía a Cacayal - Meta
Teléfonos: (098) 66163 81 Fax: (098) 675 01 15

ecopetrol	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS Nro 16

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA-CHICHIMENE
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013
VALOR PRESENTE ACTA	OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 8.404.057.065,60) SIN IVA

Mediante la suscripción de la presente Acta:

a) INDEPENDENCE DRILLING S.A., en adelante el CONTRATISTA, representado por FRANCISCO JAVIER VILLABONA TAMAYO, mayor de edad, vecino de la ciudad de BOGOTA, identificado con C.C. Nº 17.419.403 DE ACACIAS, META, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y

b) NIXON MOLINA BAQUERO Identificado con Cédula de Ciudadanía número 12.114.775 DE BOGOTA, quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

Dejan constancia de que,

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013, prestó los servicios contemplados en el contrato MA-0009346 que se relaciona en la presente acta de recibo de cantidades. El valor del servicio prestado en el periodo es el siguiente:

Cantidades Equipo 550 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	0,00	$ 350.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	0,00	$ 350.000.000	$ 0
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	2,00	$ 14.075.000	$ 28.150.000
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	6,00	$ 33.500.000	$ 201.000.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	11,00	$ 40.000.000	$ 440.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	4,00	$ 60.000.000	$ 240.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 78.000.000	$ 0

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
PETROL	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 90.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	167,939	$ 24.400.000	$ 4.097.711.600
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	63,687	$ 24.300.000	$ 1.547.594.100
2.3	Stand by	0,000	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	141,00	$ 1.300.000	$ 183.300.000
3.2	Campero sin conductor	62,00	$ 250.000	$ 15.500.000
3.3	Campero con conductor	93,00	$ 350.000	$ 32.550.000
3.4	Tarifa de planta	33,00	$ 450.000	$ 14.850.000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	9,00	$ 8.500.000	$ 76.500.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	132,00	$ 160.000	$ 21.120.000
3.7	Construcción de anclajes	0,00	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	232,00	$ 280.000	$ 64.960.000
3.9	Container adicional	31,00	$ 280.000	$ 8.680.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	21,00	$ 4.370.000	$ 91.770.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	777,00	$ 400.000	$ 310.800.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	3,00	$ 28.000.000	$ 84.000.000
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0,00	$ 250.000	$ 0
	FACTOR DE SERVICIO			$ 59.667.886
	TOTAL			**$ 7.518.153.586**

Cantidades Equipo 350 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	0,00	$ 360.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	0,00	$ 360.000.000	$ 0
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	0,00	$ 28.000.000	$ 0
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	1,00	$ 30.500.000	$ 30.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	2,00	$ 38.500.000	$ 77.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	0,00	$ 63.500.000	$ 0
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 76.600.000	$ 0
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 84.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	24,668	$ 23.200.000	$ 572.297.600
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	4,479	$ 23.100.000	$ 103.464.900
2.3	Stand by	0	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	15	$ 1.300.000	$ 19.500.000
3.2	Campero sin conductor	0	$ 250.000	$ 0
3.3	Campero con conductor	0	$ 350.000	$ 0
3.4	Tarifa de planta	0	$ 450.000	$ 0
3.5	Tarifa de circulación de pozos	0	$ 8.500.000	$ 0

3.6	Cartucho de unidad de filtrado	40	$ 160.000	$ 6.400.000
3.7	Construcción de anclajes	0	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	25	$ 280.000	$ 7.000.000
3.9	Container adicional	0	$ 280.000	$ 0
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	3	$ 4.370.000	$ 13.110.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	124	$ 400.000	$ 49.600.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	0	$ 28.000.000	$ 0
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0	$ 250.000	$ 0
FACTOR DE SERVICIO				$ 7.030.980
TOTAL				**$ 885.903.480**

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el COORDINADOR DE GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO.

En constancia, se firma en Villavicencio 20 de Septiembre de 2013, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

Por el CONTRATISTA

FRANCISCO JAVIER VILLABONA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Por la GESTION TÉCNICA

NIXON MOLINA BAQUERO ECOPETROL S.A.

463

ECOPETROL S.A.
SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA- CHICHIMENE
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 16 - CONTRATO MA-0009346

El dia 20 de Agosto de 2013, se reunieron en las oficinas del Departamento de Producción de la Superintendencia de Operaciones Castilla- Chichimene, el Ing. Francisco Villabona en representación de Independence Drilling S.A. y el Ingeniero Nixon Molina Baquero en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes:

Periodo de liquidación: 16 de agosto de 2013 **Al** 15 de septiembre de 2013

Equipo 550 HP

No	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	TARIFAS DE MOVILIZACION				
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$ 350.000.000	0	$ -
1.2	Movilización final		$ 350.000.000	0	$ -
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 14.075.000	2	$ 28.150.000
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 33.500.000	6	$ 201.000.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$ 40.000.000	11	$ 440.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$ 60.000.000	4	$ 240.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$ 78.000.000	0	$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$ 90.000.000	0	$ -
2	TARIFAS DE OPERACION				
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 24.400.000	167,939	$ 4.097.711.600
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 24.300.000	63,687	$ 1.547.594.100
2.3	Stand by	DIA	$ 18.000.000	0,000	$ -
3	OTRAS TARIFAS				
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$ 1.300.000	141,000	$ 183.300.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$ 250.000	62,000	$ 15.500.000
3.3	Campero con conductor	DIA	$ 350.000	93,000	$ 32.550.000
3.4	Tarifa de planta	DIA	$ 450.000	33,000	$ 14.850.000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$ 8.500.000	9,000	$ 76.500.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$ 160.000	132,000	$ 21.120.000
3.7	Construcción de anclajes	EA	$ 1.800.000	0,000	$ -
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$ 280.000	232,000	$ 64.960.000
3.9	Container adicional	DIA	$ 280.000	31,000	$ 8.680.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	EA	$ 4.370.000	21,000	$ 91.770.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 400.000	777,000	$ 310.800.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$ 28.000.000	3,000	$ 84.000.000
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$ 250.000	0,000	$ -
	SUBTOTAL				7.458.485.700
	BASE GRAVABLE				596.678.856
	FACTOR DE SERVICIO			10%	59.667.886
	TOTAL BASE GRAVABLE				656.346.742
	BASE NO GRAVABLE				6.861.806.844
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				7.518.153.586
	IVA BASE GRAVABLE				105.018.479
	TOTAL EQUIPO DE WO 550HP				7.623.169.064

Equipos 350 HP - Tanque Bombe

No	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	TARIFAS DE MOVILIZACION				
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$ 360.000.000	0	$ -
1.2	Movilización final		$ 360.000.000	0	$ -
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 28.000.000	0	$ -
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 30.500.000	1	$ 30.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$ 38.500.000	2	$ 77.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$ 63.500.000	0	$ -
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$ 76.600.000	0	$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$ 84.000.000	0	$ -
2	TARIFAS DE OPERACION				
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 23.200.000	25	$ 572.297.600
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 23.100.000	4	$ 103.464.900
2.3	Stand by	DIA	$ 18.000.000	0	$ -
3	OTRAS TARIFAS				
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$ 1.300.000	15	$ 19.500.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$ 250.000	0	$ -
3.3	Campero con conductor	DIA	$ 350.000	0	$ -
3.4	Tarifa de planta	DIA	$ 450.000	0	$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$ 8.500.000	0	$ -
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$ 160.000	40	$ 6.400.000
3.7	Construcción de anclajes	EA	$ 1.800.000	0	$ -
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$ 280.000	25	$ 7.000.000
3.9	Container adicional	DIA	$ 280.000	0	$ -
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	EA	$ 4.370.000	3	$ 13.110.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 400.000	124	$ 49.600.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$ 28.000.000	0	$ -
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$ 250.000		$ -
	SUBTOTAL				878.872.500
	BASE GRAVABLE				70.309.800
	FACTOR DE SERVICIO			10%	7.030.980
	TOTAL BASE GRAVABLE				77.340.780
	BASE NO GRAVABLE				808.562.700
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				885.903.480
	IVA BASE GRAVABLE				12.374.525
	TOTAL EQUIPO DE WO				898.278.005

Inv. Por Area	ICA	Porcentaje
Acacias	$ 5.201.246.683,67	62%
Castilla La Nueva	$ 2.410.300.620,66	29%
Guamal	$ 792.657.764,97	9%
Total	$ 8.404.197.069,60	100%

En constancia de lo anterior firman los representantes de las partes:

FRANCISCO VILLABONA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
REPRESENTANTE DELEGADO

NIXON MOLINA BAQUERO
ECOPETROL
GESTOR TECNICO

RODRIGO J HERNANDEZ R
ECOPETROL
ADMINISTRADOR

ECOPETROL

ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. [illegible] - CONTRATO No. [illegible]

El día 30 de Agosto de 2013, se reunieron en las oficinas [illegible] de la Superintendencia de Operaciones Castilla - Chichimene, el Ing. [illegible] en representación de [illegible] S.A. y el Ingeniero [illegible] en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACIÓN DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCIÓN 2015 Y [illegible]."

Los valores relacionados son los siguientes:

Equipo [illegible] HP

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD GASTO CASTILLA ELECTROSUMERGIBLE [illegible]	CANTIDAD GASTO [illegible]	CANTIDAD GASTO CHICHIMENE ELECTROSUMERGIBLE [illegible]	WO CASTILLA	WO CHI	CANTIDAD GASTO CHICHIMENE [illegible]	AC [illegible]	AC [illegible]	VALOR TOTAL
1		TARIFAS DE MOVILIZACION											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2		TARIFAS DE OPERACION											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3		OTRAS TARIFAS											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		SUBTOTAL											[illegible]
	[illegible]	SERVICIO WORKOVER BASE GRAVABLE			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	FACTOR DE SERVICIO			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		BASE NO GRAVABLE											[illegible]
		TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE											[illegible]
		IVA BASE GRAVABLE											[illegible]
		TOTAL EQUIPO DE WO [illegible]											[illegible]

Equipo [illegible] HP

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VR. UNITARIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VALOR TOTAL
1		[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2		TARIFAS DE OPERACION							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3		OTRAS TARIFAS							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		SUBTOTAL							[illegible]
	[illegible]	SERVICIO WORKOVER BASE GRAVABLE			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	FACTOR DE SERVICIO			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		TOTAL BASE GRAVABLE							[illegible]
		BASE NO GRAVABLE							[illegible]
		TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE							[illegible]
		IVA BASE GRAVABLE							[illegible]
		TOTAL EQUIPO DE WO [illegible]							[illegible]

LIQUIDACION PARCIAL 16
CONTRATO MA-0009346
Desde 16-Aug-13 Hasta 15-Sep-13
Torre 27 - 350 HP

30 de septiembre de 2013

PARA: RODOLFO HERNANDEZ
Administrador del Contrato

ASUNTO: Informe Semanal Técnico

CONTRATO: MA-0009346

OBJETO: PARTICIPANTE EN LA PERFORACION, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016

CONTRATISTA: REDIPERFORACIONES DRILLING S.A.

Periodo del Informe	
Desde	16-sep-13
Hasta	15-sep-13

ACTOS CONTRACTUALES		VALOR
Costo inicial del Contrato sin AVR (S)	$	644.884.644.666,00
Valor Ejecutado	$	95.986.798.656,91
Valor a Pagar	$	8.681.837.943,00
Valor Total Ejecutado	$	93.910.837.692,66
Porcentaje de Ejecucion Valor		65,19%
Plazo de Ejecucion		420
Fecha de Inicio		09-jun-11
Fecha estimada de terminacion		31-dic-14
Plazo Real de Ejecucion		936
Avance en tiempo (dias)		464
Porcentaje de Ejecucion en Tiempo		99%

Fecha de Corte (dia) [redacted]

Costa Costilla	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Costa Chichimene	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ch Costilla 5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ch Costilla 10	0	0	0	0
Ch Costilla 12	0	0	0	0
Ch Chichimene 45	0	0	0	0
Ch Chichimene 46	0	0	0	0
Ch Chichimene 47	0	0	0	0
Total	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Total	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]


Independence ENERGY


SUPERINTENDENTE

464

LIQUIDACION PARCIAL 16
CONTRATO MA-0009346

Desde 16-Aug-13 Hasta 15-Sep-13

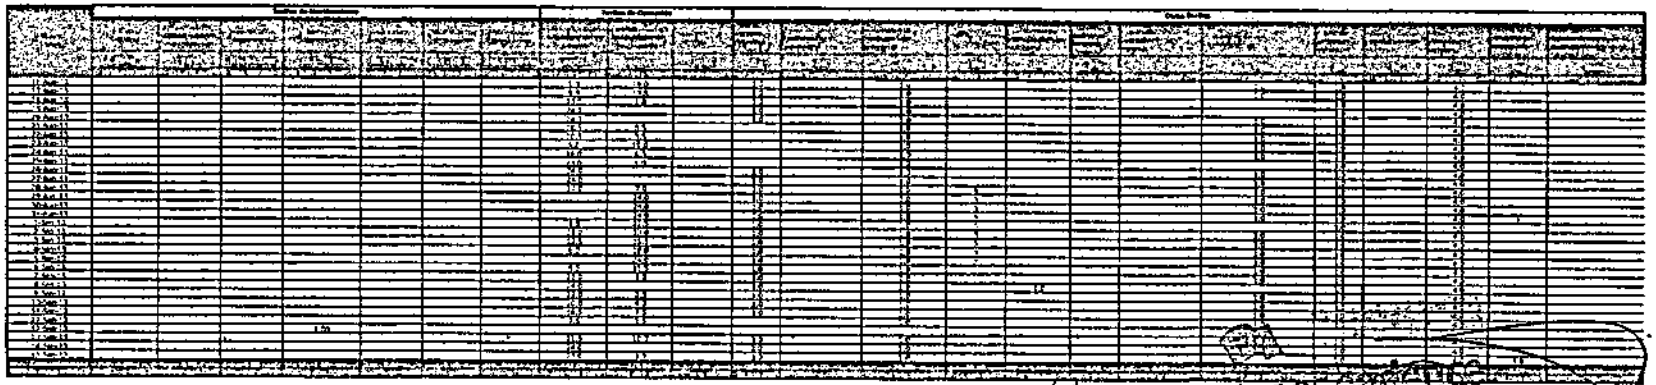






LIQUIDACI ON PARCIAL 16
CONTRATO HA-0009348

Desde 18-Ago-13 Hasta 15-Sep-13

Torre 31 - 990 HP

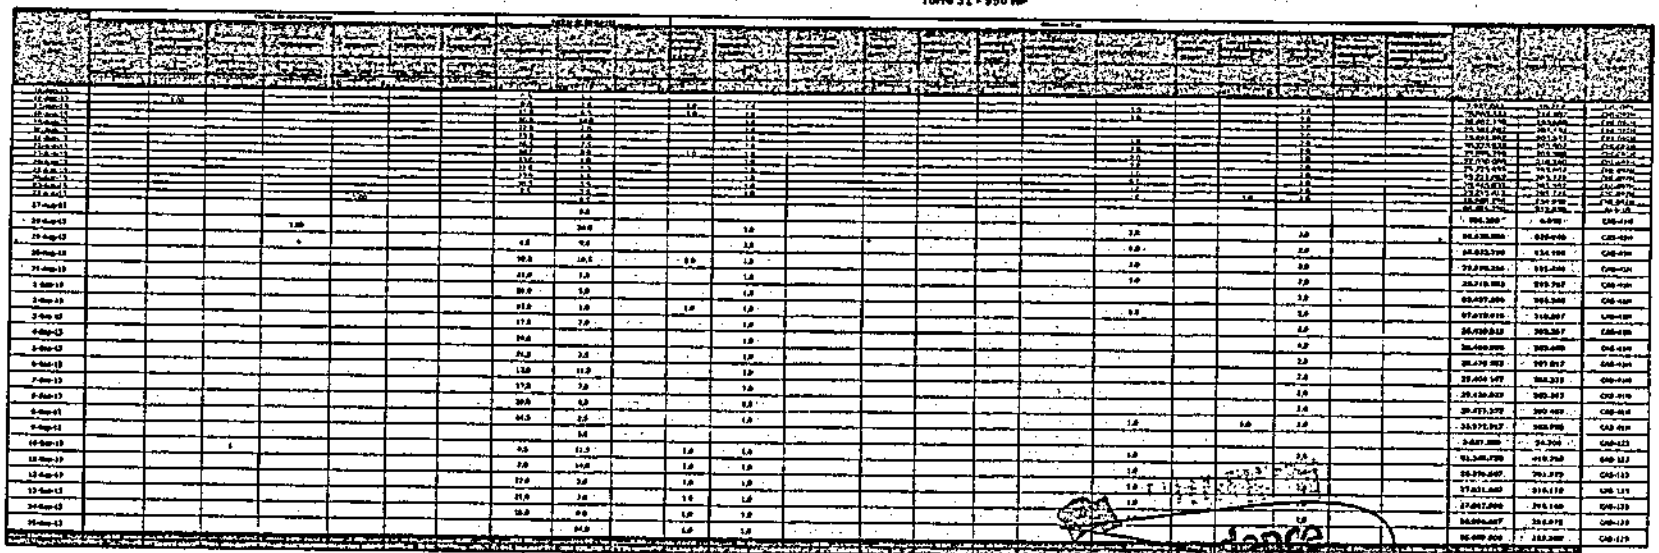





LIQUIDACION PARCIAL 16
CONTRATO MA-0009346

Desde **16-Aug-13** Hasta


Torre 32 - 550 HP


	Tarifas de Movilizaciones							Tarifas de Operación			Otras Tarifas						
16-Aug-13								16.0	5.0								
17-Aug-13								21.0	1.0		1.0						
18-Aug-13								24.0			1.0						
19-Aug-13								24.0			1.0						
20-Aug-13								17.0	7.0		1.0						
21-Aug-13								7.0	15.0		1.0						
22-Aug-13																	
23-Aug-13																	
24-Aug-13																	
25-Aug-13																	
26-Aug-13																	
27-Aug-13																	
28-Aug-13																	
29-Aug-13																	
30-Aug-13					1.00				3.5								
31-Aug-13									0.5								
1-Sep-13				3.00					18.0		1.0						
2-Sep-13								14.0	6.0		1.0						
3-Sep-13								24.0			1.0						
4-Sep-13								23.0			1.0						
5-Sep-13								23.0	1.0		1.0						
6-Sep-13								21.0	2.0		1.0						
7-Sep-13								13.0	6.0		1.0						
8-Sep-13																	
9-Sep-13																	
10-Sep-13																	
11-Sep-13																	
12-Sep-13																	
13-Sep-13																	
14-Sep-13																	
15-Sep-13																	

Factor de Servicio (%) 10%

Costo Cantina	14.806.328	7.334.613	151.240.368	168.379.311
Costo Choferes	15.111.581	1.977.031	199.882.917	216.971.529
Vol Cantina VID	0	0	0	0
Vol Cantina IC	0	0	0	0
Vol Cantina 12	0	0	0	0
Vol Choferes VID	5.865.890	868.418	81.316.455	88.114.354
Vol Choferes IC	0	0	0	0
Vol Choferes 12	0	0	0	0
Total	35.783.799	10.180.062	432.439.740	473.465.194

Servicio	23.442 vid	9.312.184	432.439.740	473.465.194	100.0%
Cantina Ia Nueva	0	0	0	0	0.0%
Traslado	0	0	0	0	0.0%
Total	23.442 vid	9.312.184	432.439.740	473.465.194	100.0%





LIQUIDACION PARCIAL 16
CONTRATO MA-0009346

Desde **16-Aug-13** Hasta **15-Sep-13**

Torre 34 - 550 HP

	Tarifas de Movilizaciones							Tarifas de Operación										Otros Tarifas	
16-Aug-13								19.0	5.0		1.0	1.0							
17-Aug-13								24.0			1.0	1.0							1.0
18-Aug-13								18.0	6.0		1.0	1.0							1.0
19-Aug-13								24.0			1.0	1.0							
20-Aug-13								24.0			1.0	1.0							
21-Aug-13								19.0	5.0		1.0	1.0							1
22-Aug-13								15.0	8.0		1.0	1.0							1
23-Aug-13				1.00				9.0	6.0		1.0	1.0							1
24-Aug-13									9.0										1
25-Aug-13								32.0	1.0		1.0	1.0							1
26-Aug-13								23.0	1.0		1.0	1.0							
27-Aug-13								21.5	2.5		1.0	1.0							1
28-Aug-13								24.0			1.0	1.0							1
29-Aug-13								13.0	11.0			1.0							1
30-Aug-13								24.0				1.0							1
31-Aug-13								17.0	7.0			1.0							1
1-Sep-13								23.0	1.0			1.0							1
2-Sep-13								1.0	23.0		1.0	1.0							
3-Sep-13								0.5	23.5		1.0	1.0							1
4-Sep-13									24.0		1.0	1.0							1
5-Sep-13								0.5	17.5		1.0	1.0							1
6-Sep-13								20.5	3.5		1.0	1.0							1
7-Sep-13								24.0			1.0	1.0							1
8-Sep-13								24.0			1.0	1.0							1
9-Sep-13		1.00						21.0	3.0		1.0	1.0							
9-Sep-13								11.0	5.8		1.0	1.0							1
10-Sep-13									6.0										
11-Sep-13								10.0	13.0		1.0	1.0							1
12-Sep-13								24.0			1.0	1.0							1
13-Sep-13								22.0	2.0		1.0	1.0							1
14-Sep-13				1.00				22.0	2.0			1.0							1
14-Sep-13								7.0	4.5			1.0							1
14-Sep-13								15.0	3.5										
									6.0		1.0	1.0							

Factor de Servicio (%): 50%

Cuadrilla	19.656.572	2.670.172	173.471.453	194.818.197
Cuadrilla Descanso	0	0	0	0
Gtt Cuadrilla WO	42.535.682	6.806.157	444.732.287	494.074.126
Gtt Cuadrilla 1C	0	0	0	0
Gtt Cuadrilla 2J	0	0	0	0
Gtt Ctr Hombre WO	21.379.787	3.414.787	223.692.331	247.815.931
Gtt Ctr Hombre 1C	0	0	0	0
Gtt Ctr Hombre 2J	0	0	0	0
Total	80.567.441	12.891.721	841.896.071	936.354.371

Cuadrilla	19.782.713	3.167.155	268.301.583	291.251.451	30.90%
Cuadrilla La Nueva	60.784.730	9.724.567	573.594.488	644.103.785	68.10%
Gtt Ctr Hombre	0	0	0	0	0.00%
Total	80.567.441	12.891.721	841.896.071	935.354.371	99.0%

GESTOR TECNICO CONTRATO MA-

Independence ENERGY VILLAVICENCIO

C. REPRESENTANTE DELEGADO CONTRATISTA

996

LIQUIDACION PARCIAL
LIQUIDACION PARCIAL 16
CONTRATO MA-0009346

Desde **16-Aug-13** Hasta


Torre 42 - 550 HP

	Tarifas de Movilizaciones							Tarifas de Operación										Otras Tarifas	
16-Aug-13								21,0	2,0		1,0		1,0						
17-Aug-13								24,0			1,0		1,0						
18-Aug-13								24,0			1,0		1,0						
19-Aug-13								24,0			1,0		1,0						
20-Aug-13								18,0	6,0		1,0		1,0						
21-Aug-13								24,0			1,0		1,0				16,0		
22-Aug-13								21,5	2,5		1,0		1,0						
23-Aug-13								8,0	16,0		1,0		1,0						
24-Aug-13									24,0		1,0		1,0						
25-Aug-13									24,0		1,0		1,0						
26-Aug-13									24,0		1,0		1,0						
27-Aug-13								5,5	18,5		1,0		1,0						
28-Aug-13								24					1,0						
29-Aug-13								24					1,0						
30-Aug-13								22	2,0				1,0						
31-Aug-13								20,0	4,0				1,0						
1-Sep-13								30,0	3,0				1,0						
2-Sep-13				1					1,0										
3-Sep-13									24,0		1,0		1,0						
4-Sep-13								22			1		1						
5-Sep-13								23			1		1						
6-Sep-13								22	2		1		1						
7-Sep-13								23			1		1						
8-Sep-13								19,5	3,5		1		1						
9-Sep-13								21,0	3,0		1		1						
9-Sep-13				1				12,0			1,0		1,0						
10-Sep-13								4,0											
11-Sep-13								19,5	1,5		1,0		1,0						
12-Sep-13								24,0			1,0		1,0						
13-Sep-13								24,0			1,0		1,0						
14-Sep-13								24,0			1,0		1,0						
15-Sep-13								24,0					1,0				6,0		
								17,0	7,0		1		1,0						

Factor de división (%) 100%

Tarifa Castilla	28.926.299	2.148.456	218.774.859	243.849.614
Tarifa CHALLENGER	0	0	0	0
DH Castilla W0	58.056.299	9.289.086	466.957.359	434 303.326
DH Castilla W	0	0	0	0
DH Castilla 37	0	0	0	0
DH Challenger 265	0	0	0	0
DH Challenger 70	0	0	0	0
DH Challenger 52	0	0	0	0
Total	78.982.598	12.437.542	685.732.218	917.152.940


Arriendo	28.926.299	2.148.456	218.774.859	243.849.614	26,6 %
Castilla La Nueva	28.926.299	7.140.630	248.182.500	284.249.429	31,0%
Comodin	0	0	0	0	0,0%
Total	78.982.598	12.437.542	685.732.218	917.152.940	100,0%





LIQUIDACION PARCIAL 16
CONTRATO MA-0009346

Desde 16-Aug-13 Hasta 19-Sep-13

Torre $3 - 550 HP

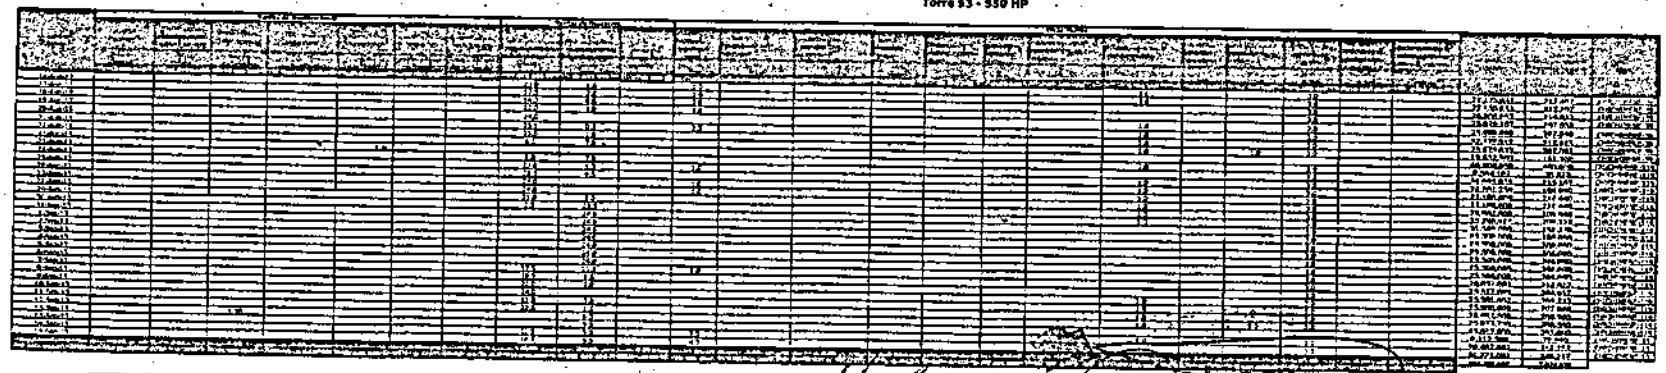





LIQUIDACION PARCIAL 16
CONTRATO MA-0009346

Desde **16-Aug-13** Hasta **15-Sep-13**

Torre 123- 550 HP

	Tarifas de Movilizaciones							Tarifas de Operación			Otras Tarifas							
16-Aug-13								6.5	7.5				1.0					
16-Aug-13				1														1.0
17-Aug-13								9.5	8.5		1.0		1.0					1.0
18-Aug-13								23.0			1.0		1.0					
19-Aug-13								24.0			1.0		1.0					
20-Aug-13								22.5	1.5		1.0		1.0					1.0
21-Aug-13								24.0			1.0		1.0					1.0
22-Aug-13								24.0					1.0					1.0
23-Aug-13								23.5	1.5				1.0					1.0
24-Aug-13								19.0	5.0				1.0					1.0
25-Aug-13				1				7.5										
25-Aug-13								2.0					1.0					
26-Aug-13								23.0					1.0					1.0
27-Aug-13								24.0					1.0					1.0
28-Aug-13								15.5	8.5				1.0					1.0
29-Aug-13								20.0	4.0				1.0					1.0
30-Aug-13								22.5	1.5				1.0					1.0
31-Aug-13								14.0	10.0				1.0					1.0
1-Sep-13								7.5	16.5				1.0					
1-Sep-13								24.0					1.0		46			1.0
2-Sep-13								20.0	3.0		1.0		1.0					1.0
3-Sep-13								4.5										
4-Sep-13									16.5				1.0					1.0
5-Sep-13									24.0				1.0					1.0
6-Sep-13				1					17.0				1.0					1.0
7-Sep-13								23.0			1.0		1.0					1.0
8-Sep-13				+				22.5	1.5		1.0		1.0					
9-Sep-13								24.0			1.0		1.0					1.0
10-Sep-13								24.0			1.0		1.0					1.0
11-Sep-13				1				8.0	7.5				1.0					
11-Sep-13																		
12-Sep-13								17.0	2.0		2.0		1.0					1.0
13-Sep-13								24.0					1.0					1.0
14-Sep-13								24.0					1.0					1.0
15-Sep-13								22.0	2.0		1.0		1.0					

Factor de Servicio (%) 39%

Costo Tarifa	50.304.949	8.805.100	528.997.100	588.107.149
Costo Mecanizado	8.129.739	1.450.458	33.448.500	43.028.697
Dif Costo WO	22.484.730	3.829.877	237.179.450	263.494.057
Dif Costo IC	0	0	0	0
Dif Costo M TJ	0	0	0	0
Dif Costo Mecanizado WO	1.830.583	762.893	19.167.917	21.761.393
Dif Costo Mecanizado IC	0	0	0	0
Dif Costo Mecanizado TJ	0	0	0	0
Total	84.249.378	15.478.328	888.793.167	918.420.296

Ingreso	37.692.187	6.600.318	396.445.317	440.737.822	-52.1%
Factura La Riviera	46.568.187	7.882.710	484.440.317	548.836.030	-64.9%
Ajustes	0	0	0	0	0.0%
Total	84.249.378	14.478.328	888.793.167	978.420.296	-129.8%

GESTOR DECIDO
CONTRATO MA-0009346

Independence ENERGY
SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO

REPRESENTANTE
DELEGADO
CONTRATISTA

LIQUIDACION PARCIAL 16
CONTRATO MA-0009346

Desde **16-Aug-13** Hasta **15-Sep-13**

Torre 126- 550 HP

	Tarifas de Movilización							Tarifas de Operación										Otras Tarifas		
16-Aug-13								23.0			0.0									
17-Aug-13								18.5	5.5		0.0									0.0
18-Aug-13								21.5	2.5		0.0									0.0
19-Aug-13								20.0	3.0		0.0									0.0
20-Aug-13								2.5	9.5		0.0									0.0
21-Aug-13				1.0							0.0									1.0
22-Aug-13								17.5	3.0		0.0									0.0
23-Aug-13								23.0	1.0		1.0							24		1.0
24-Aug-13								20.0	4.0		1.0									1.0
25-Aug-13								23.0	1.0		1.0									1.0
26-Aug-13								13.5	10.5		1.0									1.0
27-Aug-13								19.0	5.0		1.0									0.0
28-Aug-13				1.0				9.0	7.0		0.0									1.0
29-Aug-13									5.5		0.0									1.0
30-Aug-13			1.0					0.0	11.0		0.0									0.0
31-Aug-13								6.0	6.0		0.0									1.0
1-Sep-13								24.0			0.0									0.0
2-Sep-13								17.0	7.0		0.0									1.0
3-Sep-13								20.5	3.5		0.0									1.0
4-Sep-13				1				7.5	6.0		0.0									1.0
5-Sep-13									6.0		0.0									0.0
6-Sep-13								4.5	7.5		1.0									1.0
7-Sep-13								16.5	6.5		0.0									1.0
8-Sep-13								23.5	0.5		1.0									1.0
9-Sep-13								22.5	1.5		1.0									1.0
10-Sep-13								22.5	1.5		0.0									0.0
11-Sep-13								19.0	5.0		1.0									1.0
12-Sep-13								15.5	8.5		0.0									1.0
13-Sep-13								3.5	4.5		0.0									1.0
14-Sep-13									10.0		0.0									0.0
15-Sep-13								1.0	7.5		1.0									1.0
								19.0	5.0		1.0									1.0
								22.5	1.5		1.0									1.0
								24.0			1.0									1.0

Factor de Servicio
(%)

Tarifa Contrato	41.001.117	8.149.119	399.102.541	438.401.869
Tarifa Efectiva	32.056.157	9.128.985	396.896.183	441.481.325
Diff Contra WO	•	•	•	•
Diff Contra SC	0	0	0	0
Diff Contra 32	0	0	0	0
Diff Efectivo WO	9.241.077	1.020.134	99.205.771	287.920.324
Diff Efectivo SC	0	0	0	0
Diff Efectivo 32	0	0	0	0
Total	50.238.347	18.297.238	895.204.495	1.167.803.518

Nacional	57.997.151	11.156.975	716.911.353	5.214.065.155	50.9%
Unidad La Llanura	5.992.213	958.704	82.549.867	68.586.471	10.2%
Especial	10.616.435	1.102.119	111.216.456	137.360.549	10.5%
Total	74.799.809	13.217.798	910.677.676	1.420.012.175	100.0%

Independence ENERGY
LLAVICENCIO
SUPERINTENDENTE DELEGADO
CONTRATISTA

19275

468

Radicado Nro: 2-2013-013-9239 Para responder citelo
Ecopetrol - CASTILLA
Fecha: Oct 30 2013 1:58PM
Dependencia: CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS
Destino: LAURA JULIANA NIÑO FLOREZ (COPCO)
Original Folios: 1 Anexos: 1

2-2013-013-9239

469

ECOPETROL

SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA-CHICHIMENE

Castilla La Nueva, 23 de Octubre de 2013

Doctora
LAURA JULIANA NIÑO FLOREZ
Gestora Administrativa
COPCO S.A.
Castilla La Nueva

Asunto: Entrega Pago Parcial No 17 Contrato MA-0009346

Estimada Laura, por medio de la presente hago entrega de los soportes correspondientes al pago parcial No 17 del contrato MA-0009346, cuyo Objeto es: "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."; suscrito con la Empresa INDEPENDENCE DRILLING S.A.

En consecuencia, relaciono los soportes:

- Acta de Gestoría Técnica GAB-F-080
- Acta de cantidades parcial No 17
- Distribución orden interna
- Informe de Gestoría técnica- Soportes Operaciones

Atentamente,

EC1003316.

Johanna Blanco Simbaqueba
Gestor Técnico Contrato MA-0009346

Anexos: Documentos relacionados
JBS/RJHR

Superintendencia de Operaciones Castilla Chichimene
Castilla La Nueva Via a Cacayal - Meta
Teléfonos: (098) 66163 81 Fax: (098) 675 01 15

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS Nro 17

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA-CHICHIMENE
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2013
VALOR PRESENTE ACTA	SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 7.139.773.065,60) SIN IVA

Mediante la suscripción de la presente Acta:

a) INDEPENDENCE DRILLING S.A., en adelante el CONTRATISTA, representado por FRANCISCO JAVIER VILLABONA TAMAYO, mayor de edad, vecino de la ciudad de BOGOTA, identificado con C.C. Nº 17.419.403 DE ACACIAS, META, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y

b) JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA identificado con Cédula de Ciudadanía número 52.866.785 DE BOGOTA, quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

Dejan constancia de que,

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2013, prestó los servicios contemplados en el contrato MA-0009346 que se relaciona en la presente acta de recibo de cantidades. El valor del servicio prestado en el periodo es el siguiente:

Cantidades Equipo 550 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	0,00	$ 350.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	0,00	$ 350.000.000	$ 0
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	0,00	$ 14.075.000	$ 0
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	7,00	$ 33.500.000	$ 234.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	7,00	$ 40.000.000	$ 280.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	1,00	$ 60.000.000	$ 60.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 78.000.000	$ 0

470

PETROL	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 90.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	123,958	$ 24.400.000	$ 3.024.575.200
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	63,750	$ 24.300.000	$ 1.549.125.000
2.3	Stand by	0,000	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	150,00	$ 1.300.000	$ 195.000.000
3.2	Campero sin conductor	51,00	$ 250.000	$ 12.750.000
3.3	Campero con conductor	90,00	$ 350.000	$ 31.500.000
3.4	Tarifa de planta	0,00	$ 450.000	$ 0
3.5	Tarifa de circulación de pozos	14,00	$ 8.500.000	$ 119.000.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	40,00	$ 160.000	$ 6.400.000
3.7	Construcción de anclajes	0,00	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	200,00	$ 280.000	$ 56.000.000
3.9	Container adicional	30,00	$ 280.000	$ 8.400.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	17,00	$ 4.370.000	$ 74.290.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	710,00	$ 400.000	$ 284.000.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	2,00	$ 28.000.000	$ 56.000.000
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0,00	$ 250.000	$ 0
	FACTOR DE SERVICIO			$ 47.932.322
	TOTAL			**$ 6.039.472.522**

Cantidades Equipo 350 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	1,00	$ 360.000.000	$ 360.000.000
1.2	Movilización final	0,00	$ 360.000.000	$ 0
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	0,00	$ 28.000.000	$ 0
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	1,00	$ 30.500.000	$ 30.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	1,00	$ 38.500.000	$ 38.500.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	0,00	$ 63.500.000	$ 0
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 76.600.000	$ 0
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 84.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	20,854	$ 23.200.000	$ 483.812.800
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	4,292	$ 23.100.000	$ 99.145.200
2.3	Stand by	0	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	15	$ 1.300.000	$ 19.500.000
3.2	Campero sin conductor	0	$ 250.000	$ 0
3.3	Campero con conductor	0	$ 350.000	$ 0
3.4	Tarifa de planta	0	$ 450.000	$ 0
3.5	Tarifa de circulación de pozos	0	$ 8.500.000	$ 0

EO1C00316

b

3.6	Cartucho de unidad de filtrado	0	$ 160.000	$ 0
3.7	Construcción de anclajes	0	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	25	$ 280.000	$ 7.000.000
3.9	Container adicional	0	$ 280.000	$ 0
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	3	$ 4.370.000	$ 13.110.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	100	$ 400.000	$ 40.000.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	0	$ 28.000.000	$ 0
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0	$ 250.000	$ 0
FACTOR DE SERVICIO				$ 8.732.544
TOTAL				**$ 1.100.300.544**

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el COORDINADOR DE GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO.

En constancia, se firma en Villavicencio 21 de Octubre de 2013, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

Independence

Por el CONTRATISTA
FRANCISCO JAVIER VILLABONA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.

T.O1000316.

Por la GESTION TÉCNICA
JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
ECOPETROL S.A.

471

ECOPETROL S.A.
SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA- CHICHIMENE
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 17 - CONTRATO 4A-0009346

El dia 21 de Octubre de 2013, se reunieron en las oficinas del Departamento de Producción de la Superintendencia de Operaciones Castilla- Chichimene, el Ing. Francisco Villabona en representación de Independence Drilling S.A. y la Ingeniera Johanna Blanco Simbaqueba en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes:

Periodo de liquidación: 16 de septiembre de 2013 AL 15 de octubre de 2013

Equipo 550 HP

No	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	TARIFAS DE MOVILIZACION				
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$ 350.000.000	0	$ -
1.2	Movilización final		$ 320.000.000	0	$ -
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 14.075.000	0	$ -
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 33.500.000	7	$ 234.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$ 40.000.000	7	$ 280.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$ 60.000.000	1	$ 60.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$ 78.000.000	0	$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$ 90.000.000	0	$ -
2	TARIFAS DE OPERACION				
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 24.400.000	123,958	$ 3.024.575.200
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 24.300.000	63,750	$ 1.549.125.000
2.3	Stand by	DIA	$ 18.000.000	0,000	$ -
3	OTRAS TARIFAS				
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$ 1.300.000	150,000	$ 195.000.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$ 250.000	51,000	$ 12.750.000
3.3	Campero con conductor	DIA	$ 350.000	90,000	$ 31.500.000
3.4	Tarifa de planta	DIA	$ 450.000	0,000	$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$ 8.500.000	14,000	$ 119.000.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$ 160.000	40,000	$ 6.400.000
3.7	Construcción de anclajes	EA	$ 1.800.000	0,000	$ -
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$ 280.000	200,000	$ 56.000.000
3.9	Container adicional	DIA	$ 280.000	30,000	$ 8.400.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	EA	$ 4.370.000	17,000	$ 74.290.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 400.000	710,000	$ 284.000.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$ 28.000.000	2,000	$ 56.000.000
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$ 250.000	0,000	$ -
	SUBTOTAL				$ 5.991.540.200
	BASE GRAVABLE				$ 479.323.216
	FACTOR DE SERVICIO			10%	$ 47.932.322
	TOTAL BASE GRAVABLE				$ 527.255.538
	BASE NO GRAVABLE				$ 5.512.216.984
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				$ 6.039.472.522
	IVA BASE GRAVABLE				$ 84.360.886
	TOTAL EQUIPO DE WO 550HP				$ 6.123.833.408

Equipos 350 HP

No	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	TARIFAS DE MOVILIZACION				
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$ 360.000.000	1,00	$ 360.000.000
1.2	Movilización final		$ 350.000.000	0,00	$ -
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 28.000.000	0,00	$ -
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 30.500.000	1,00	$ 30.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$ 38.500.000	1,00	$ 38.500.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$ 63.500.000	0,00	$ -
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$ 76.800.000	0,00	$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$ 84.000.000	0,00	$ -
2	TARIFAS DE OPERACION				
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 23.200.000	20,85	$ 483.812.800
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 23.100.000	4,29	$ 99.145.200
2.3	Stand by	DIA	$ 18.000.000	0,00	$ -
3	OTRAS TARIFAS				
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$ 1.300.000	15,00	$ 19.500.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$ 250.000	0,00	$ -
3.3	Campero con conductor	DIA	$ 350.000	0,00	$ -
3.4	Tarifa de planta	DIA	$ 450.000	0,00	$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$ 8.500.000	0,00	$ -
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$ 160.000	0,00	$ -
3.7	Construcción de anclajes	EA	$ 1.800.000	0,00	$ -
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$ 280.000	25,00	$ 7.000.000
3.9	Container adicional	DIA	$ 280.000	0,00	$ -
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	EA	$ 4.370.000	3,00	$ 13.110.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 400.000	100,00	$ 40.000.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$ 28.000.000	0,00	$ -
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$ 250.000	0,00	$ -
	SUBTOTAL				$ 1.091.568.000
	BASE GRAVABLE				$ 87.325.440
	FACTOR DE SERVICIO			10%	$ 8.732.544
	TOTAL BASE GRAVABLE				$ 96.057.984
	BASE NO GRAVABLE				$ 1.004.242.560
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				$ 1.100.300.544
	IVA BASE GRAVABLE				$ 15.369.277
	TOTAL EQUIPO DE WO				$ 1.115.669.821

Dist. Por Area	Total	% Participación
Acacias	$ 5.612.489.844,76	79%
Castilla La Nueva	$ 766.004.759,95	11%
Guamal	$ 739.230.940,87	10%
Total	$ 7.139.723.045,60	100%

En constancia de lo anterior firman los representantes de las partes,


FRANCISCO VILLABONA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
REPRESENTANTE DELEGADO


JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
ECOPETROL
GESTOR TECNICO

FD100316

RODRIGO J HERNANDEZ R
ECOPETROL
ADMINISTRADOR

PETROL

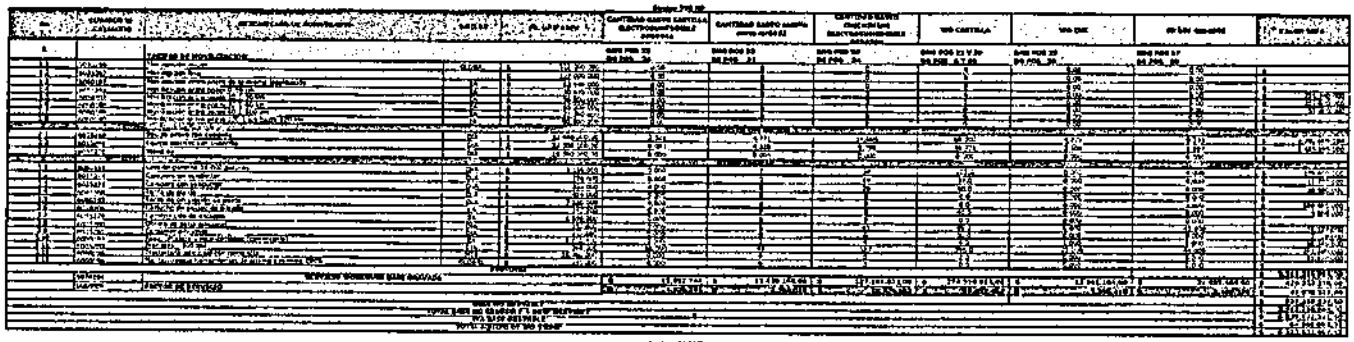


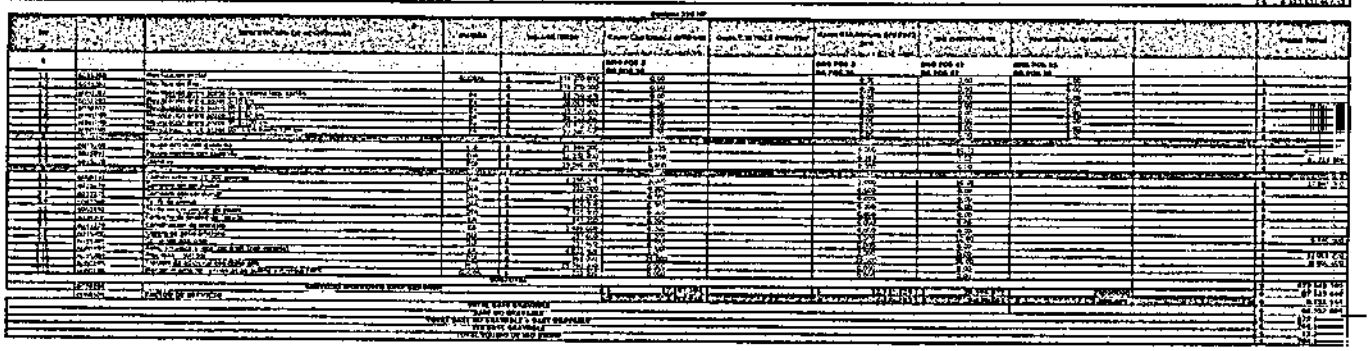


Vobo
EO100316.

Independence ENERGY
SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO

LIQUIDACION PARCIAL 17
CONTRATO HA-60053346
Desde 16-Sep-13 Hasta 15-Oct-13
Torre 27 - 350 MP

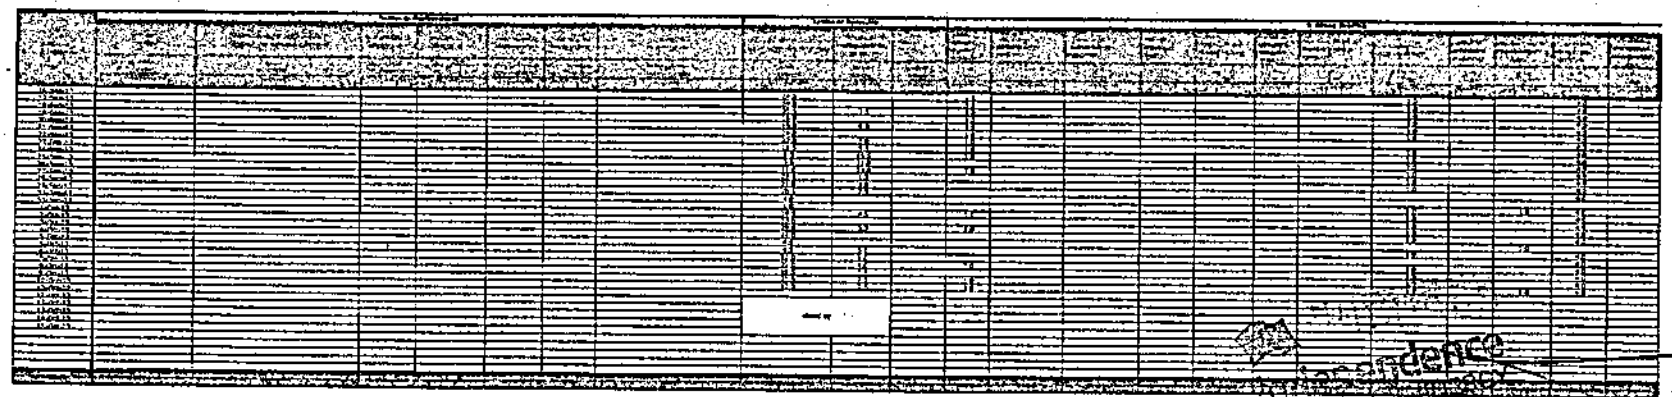



LIQUIDACION PARCIAL 17
CONTRATO MA-0009346

Desde **16-Sep-13** Hasta **15-Oct-13**

Torre 41 - 550 HP

	Tarifas de Movilizacion							Tarifas de Operacion										& OTRAS TARIFAS
Fecha																		
16-Sep-13																		
17-Sep-13																		
18-Sep-13																		
19-Sep-13																		
20-Sep-13																		
21-Sep-13																		
22-Sep-13																		
23-Sep-13																		
24-Sep-13																		
25-Sep-13																		
26-Sep-13																		
27-Sep-13																		
28-Sep-13																		
29-Sep-13																		
30-Sep-13																		
1-Oct-13																		
2-Oct-13	1.00							14.0										
3-Oct-13								24.0										
4-Oct-13								13.5	0.5									
5-Oct-13																		
6-Oct-13																		
7-Oct-13																		
8-Oct-13																		
9-Oct-13																		
10-Oct-13																		
11-Oct-13																		
12-Oct-13																		
13-Oct-13																		
14-Oct-13																		
15-Oct-13																		

Factor de Servicio (%) 100%

Descripcion Contrato	Movilizacion	Operacion	Otras Tarifas	Total
Costo Capilla	0	0	0	0
Costo Chichimene	36.093.337	6.774.742	377.326.683	419.193.762
DM Capilla WO	0	0	0	0
DM Capilla PC	0	0	0	0
DM Capilla T2	0	0	0	0
DM Chichimene WO	0	0	0	0
DM Chichimene PC	0	0	0	0
DM Chichimene T2	0	0	0	0
Total	36.093.337	6.774.742	377.326.683	419.193.762

Descripcion Contrato	Movilizacion	Operacion	Otras Tarifas	Total	%
Arauca	36.093.337	6.774.742	377.326.683	419.193.762	100.0%
Capilla La Punta	0	0	0	0	0.0%
Suelmal	0	0	0	0	0.0%
Total	36.093.337	6.774.742	377.326.683	419.193.762	100.0%

419 419 929
3 281.303

0100316.


GESTOR TECNICO
CONTRATO MA-0009346

Independence ENERGY
SUPERINTENDENTE

REPRESENTANTE DELEGADO
CONTRATISTA

LIQUIDACION PARCIAL 17
CONTRATO MA-0009348

Desde 16-Sep-13 Hasta 15-Oct-13

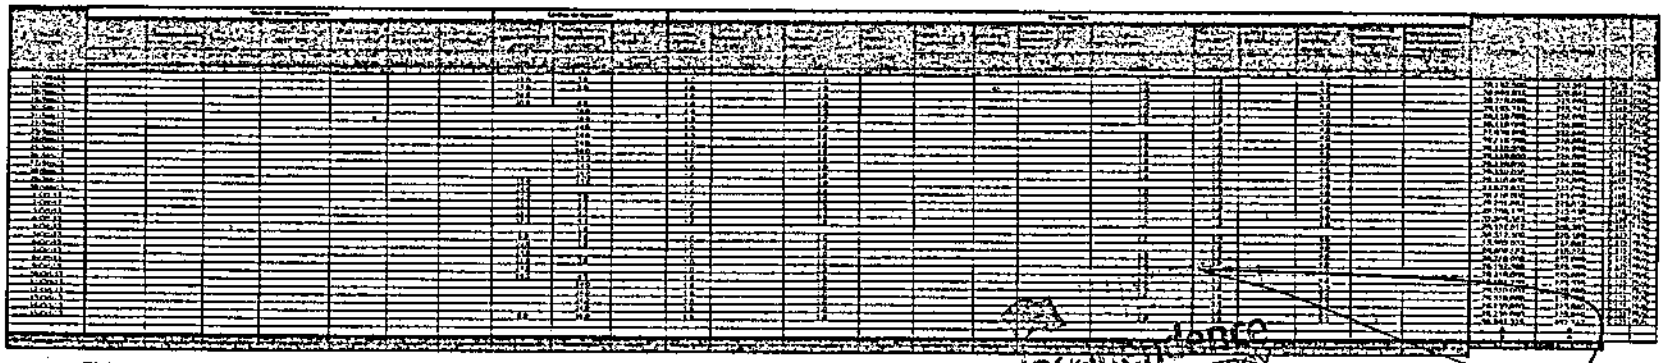


Independence ENERGY
EO100316 SUPERINTENDENCIA VICENCIO

425

LIQUIDACI ON PARCIAL 17
CONTRATO MA-0009346

Desde 16-Sep-12 Hasta 15-Oct-12

Torre 31 - 530 MP

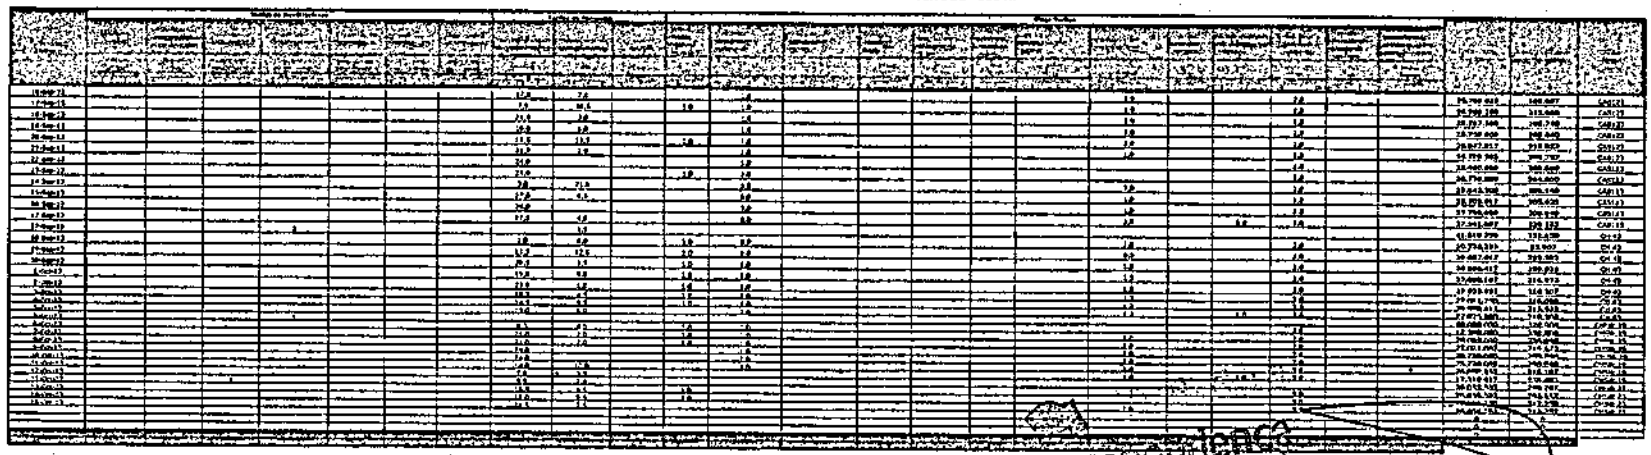

Independence ENERGY

SUPERINTENDENTE

LIQUIDACION PARCIAL 17
CONTRATO MA-0009346

Desde **16-Sep-13** Hasta **15-Oct-13**

Torre 34 - 550 HP

	Tarifas de Movilizaciones							Tarifas de Operación										Otras Tarifas
16-Sep-13								23.0	1.0		1.0	1.0						
17-Sep-13								20.5	3.5		1.0	1.0						
18-Sep-13								24.0			1.0	1.0						
19-Sep-13								23.0	1.0		1.0	1.0						
20-Sep-13								24.0			1.0	1.0						
21-Sep-13								15.0	9.0		1.0	1.0						
22-Sep-13									24.0		1.0	1.0						
23-Sep-13									24.0		1.0	1.0						
24-Sep-13									24.0		1.0	1.0						
25-Sep-13									24.0		1.0	1.0						
26-Sep-13									24.0		1.0	1.0						
27-Sep-13								1.00	23.0		1.0	1.0						
28-Sep-13								0.50	23.5		1.0	1.0						
29-Sep-13								12.5	13.5		1.0	1.0						
30-Sep-13								24.0			1.0	1.0						
1-Oct-13								24.0			1.0	1.0						
2-Oct-13								24.0			1.0	1.0						
3-Oct-13								17.0	6.0		1.0	1.0						
4-Oct-13								4.0	3.5		1.0	1.0						
5-Oct-13								2.5	4.0									
6-Oct-13								20.0	3.0		1.0	1.0						
7-Oct-13								22.0	2.0		1.0	1.0						
8-Oct-13								24.0			1.0	1.0						
9-Oct-13								24.0			1.0	1.0						
10-Oct-13								23.5	0.5		1.0	1.0						
11-Oct-13									24.0		1.0							
12-Oct-13								1.0	24.0		1.0							
13-Oct-13									23.0		1.0							
14-Oct-13								1.0	24.0		1.0							
15-Oct-13									23.0		1.0							

Factor de Servicio (%) 10%

Gasto Cerrada	0	0	0	0
Gasto Cf-stamina	0	0	0	0
CN Castilla WO	77 136.143	12 341.783	806.423.317	995.901.243
CN Castilla IC	0	0	0	0
CN Castilla T2	0	0	0	0
CN Chichimene WO	0	0	0	0
CN Chichimene IC	0	0	0	0
CN Chichimene T2	0	0	0	0
Total	77.136.143	12.341.783	806.423.317	995.901.243

Apiay	77.136.143	12.341.783	806.423.317	995.901.243	100.0 %
Castilla La Nueva	0	0	0	0	0.0%
Guaicaral	0	0	0	0	0.0%
Total	77.136.143	12.341.783	806.423.317	995.901.243	100.0%

803.939.460
7 012.377

GESTOR TECNICO
CONTRATO MA-0009346

Independence ENERGY
SUPERINTENDENTE

REPRESENTANTE DELEGADO
CONTRATISTA

474

LIQUIDACION PARCIAL
LIQUIDACION PARCIAL 17
CONTRATO MA-0009346

Desde 16-Sep-13 Hasta 15-Oct-13

Torre 42 - 550 HP

	Tarifa de Movilizaciones							Tarifas de Operación									Otras Tarifas
16-Sep-13									24.0		1.0	1					
17-Sep-13									24.0		1.0	1					
18-Sep-13									24.0		1.0	1					
19-Sep-13								2.0	22.0		1.0	1					
20-Sep-13								23.0	2.0		1.0	1					
21-Sep-13								23.0			1.0	1					
22-Sep-13								24.0			1.0	1					
23-Sep-13								23.5	0.5		1.0	1					
24-Sep-13								24.0			1.0	1					
25-Sep-13								19.0	5.0		1.0	1					
26-Sep-13								7.0			1.0	1					
27-Sep-13			1.00					7.0									
28-Sep-13								18.5	5.5		1.0	1					
29-Sep-13								22.5	1.5		1.0	1					
30-Sep-13								23.0	1.0		1.0	1					
1-Oct-13								19.5	4.5		1.0	1					
2-Oct-13								22.0	2.0		1.0	1					
3-Oct-13								14.0	10.0		1.0	1					
4-Oct-13									24.0		1.0	1					
5-Oct-13									24.0		1.0	1					
6-Oct-13									24.0		1.0	1					
7-Oct-13								3.0	21.0		1.0	1					
8-Oct-13								23.0	1.0		1.0	1					
9-Oct-13								22.0	2.0		1.0	1					
10-Oct-13								12.0	12.0		1.0	1					
11-Oct-13								24.0			1.0	1					
12-Oct-13								17.0	6.9		1.0	1					
13-Oct-13								3.0	2.5		1.0						
14-Oct-13								8.5									
15-Oct-13								23.0			1.0	1					
								24.0			1.0	1					
								22.0	2.0		1.0	1					

Factor de Servicio (%) 100.00%

Tarifa Estándar	0	0	0	0
Tarifa Diferencial	0	0	0	0
30 Costo WO	77.071.178	12.331.387	805.744.950	895.146.663
0% Costo EC	0	0	0	0
0% Costo FZ	0	0	0	0
0% Diferencial WO	0	0	0	0
0% Diferencial EC	0	0	0	0
0% Diferencial FZ	0	0	0	0
Total	77.071.178	12.331.387	805.744.950	895.146.663

Costo WO	77.071.178	12.331.387	805.744.950	895.146.663	100.0 %
Tarifa de Diferencial	0	0	0	0	0.0 %
Diferencial	0	0	0	0	0.0%
Total	77.071.178	12.331.387	805.744.950	895.146.663	100.0%

642.835.329

7.906.479.87

10/03/16

GESTOR TECNICO
CONTRATO MA-0009346


Independence ENERGY


REPRESENTANTE OPLEGADO CONTRATISTA


LIQUIDACION PARCIAL 17
CONTRATO MA-0009348

Desde 16-Sep-13 Hasta 15-Oct-13

Torre 53 - 550 HP

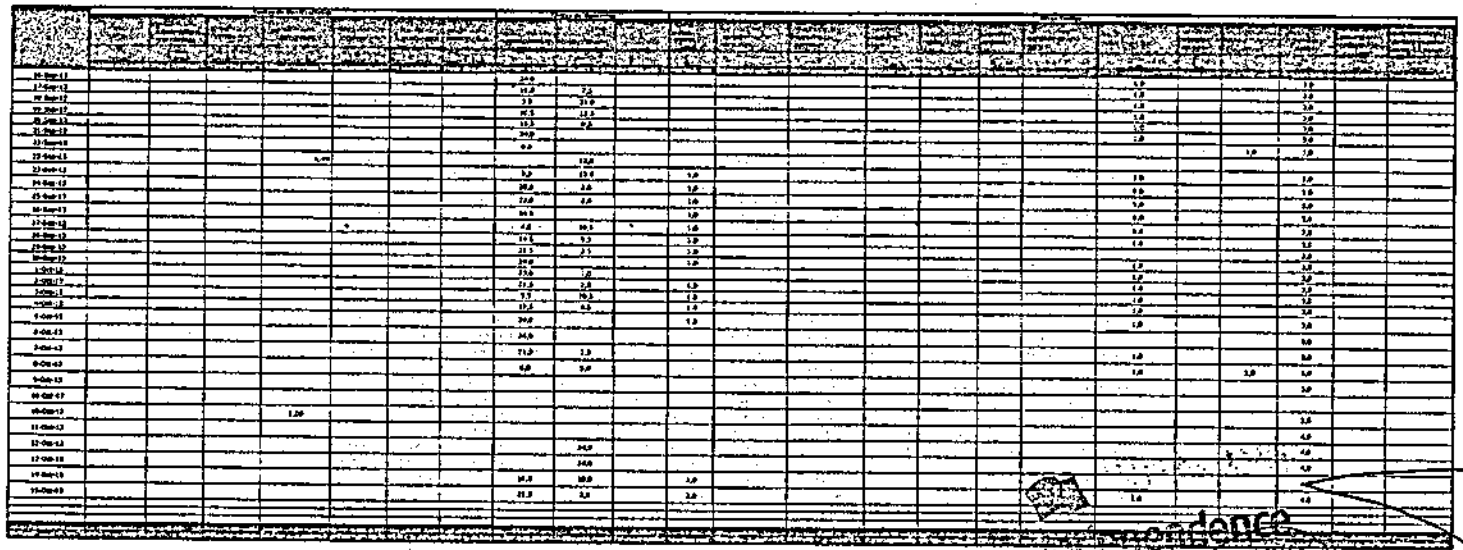





4R5

LIQUIDACION PARCIAL 17
CONTRATO MA-0009346

Desde **16-Sep-13** Hasta **15-Oct-13**

Torre 123- 550 HP

	Tarifas de Movilizaciones							Tarifas de Operación										Otras Tarifas						
16-Sep-13								23,0	1,0															
17-Sep-13								18,5	5,5									1,0						1,0
18-Sep-13								19,5	3,5									1,0						1,0
19-Sep-13								4,5	5,5									1,0						1,0
20-Sep-13					1			2,5										1,0						1,0
21-Sep-13								23,0																
22-Sep-13								24,0										1,0						1,0
23-Sep-13								11,0	2,0									1,0						1,0
24-Sep-13					1				6,0															
25-Sep-13								8,5	6,0		1,0							1,0						1,0
26-Sep-13								20,0	3,0		1,0							1,0						1,0
27-Sep-13								24,0			1,0							1,0						1,0
28-Sep-13								24,0										1,0						1,0
29-Sep-13								24,0			1,0							1,0						1,0
30-Sep-13								18,0	6,0		1,0							1,0						1,0
1-Oct-13								15,0	9,0		1,0							1,0						1,0
1-Oct-13					1			15,5	8,5		1,0							1,0						1,0
2-Oct-13								4,0	2,0									1,0						1,0
3-Oct-13								7,0																
4-Oct-13								23,0	1,0		1,0							1,0						1,0
5-Oct-13								24,0			1,0							1,0						1,0
6-Oct-13								18,5	5,5		1,0							1,0						1,0
7-Oct-13								17,5	6,5		1,0							1,0						1,0
8-Oct-13								17,5	5,5		1,0							1,0						1,0
9-Oct-13								0,5	0,5		1,0							1,0						1,0
10-Oct-13																		1,0						1,0
11-Oct-13																		1,0						1,0
12-Oct-13								19,0										1,0						1,0
13-Oct-13								20,0	4,0									1,0						1,0
14-Oct-13								22,5	1,5		1,0							1,0						
15-Oct-13					1			14,0	8,0		1,0							1,0						
																		1,0						1,0

Factor de Servicio (%)

Costo Logístico	19.944.131	1.671.961	103.185.867	124.801.961
Costo Diciembre	61.908.550	8.905.368	647.325.758	719.639.466
Dif. Costo MO	0	0	0	0
Dif. Costo MC	0	0	0	0
Dif. Cost. Rig	0	0	0	0
Dif. Cost. Turnos MO	0	0	0	0
Dif. Cost. Turnos MC	0	0	0	0
Dif. Cost. Turnos TJ	0	0	0	0
Total	81.852.681	10.577.329	750.511.625	844.441.426

Sub Tot	593.746.419	2.219.270	904.511.458	520.812.730	93,5 %
Costo a la Fuente	19.944.131	1.671.961	103.185.867	131.303.961	10,5 %
Impuesto	3.715.240	566.598	48.931.806	43.163.478	10,0%
Total	77.659.371	10.457.829	756.511.625	694.281.170	100,0%

828.707.100
6.577.317

GESTOR TECNICO
CONTRATO MA-0009346

01/10/2013.

Independence Energy

SUPERINTENDENTE

REPRESENTANTE DELEGADO CONTRATISTA

LIQUIDACION PARCIAL 17
CONTRATO MA-0009346

Desde 16-Sep-13 **Hasta** 15-Oct-13

Torre 126- 550 HP

	Tarifas de Movilización							Tarifas de Operación			Otros Tarifas						
16-Sep-13								22,0	2,0								
17-Sep-13								22,5	1,5		1,0						4,0
18-Sep-13								24,0	1,0								4,0
19-Sep-13								18,5	5,5								4,0
20-Sep-13								24,0									4,0
21-Sep-13								19,5	5,0		1,0						4,0
22-Sep-13								15,5	8,5								4,0
23-Sep-13								24,0									3,0
24-Sep-13								24,0			1,0						4,0
25-Sep-13								24,0									4,0
26-Sep-13			1					7,5	4,5								4,0
27-Sep-13									8,0		0,0			1			4,0
28-Sep-13								3,0	9,0		1,0						
29-Sep-13								19,0	4,0		1,0						1,0
30-Sep-13								24,0			1,0						1,0
1-Oct-13								24,0			1,0						
2-Oct-13								20,5	3,5		1,0						1,0
3-Oct-13								11,5	8,5		1,0						3,0
4-Oct-13								16,5	7,5		1,0						1,0
4-Oct-13					1			4,5	10,0								1,0
5-Oct-13									1,5								1,0
6-Oct-13								1,0	6,0								
7-Oct-13								23,0			1,0						1,0
8-Oct-13								13,0	11,0		1,0						1,0
9-Oct-13								12,5	11,5		1,0						1,0
10-Oct-13								16,5	7,5		1,0						1,0
12-Oct-13								16,5	7,5								1,0
13-Oct-13																	
14-Oct-13								STAND BY									
15-Oct-13																	

Factor de Servicio (%) 10%

Costo Cuadrilla	0	0	0	0
Costos Civil/Mecanico	39.376.917	8.868.307	415.845.583	463.990.807
DR Cuadrilla VFD	0	0	0	0
DR Civil/Mecanico PC	0	0	0	0
DR Cuadrilla PC	0	0	0	0
DR Civil/Mecanico PC	48.723.833	9.217.418	270.959.742	328.901.990
DR Electricistas_C	0	0	0	0
DR Civil/Mecanico PC	0	0	0	0
Total	88.100.750	18.085.725	686.805.325	792.891.797

Adicional	88.100.750	18.085.725	686.805.325	792.891.797	100,0%
Cuadrilla Nueva	0	0	0	0	0,0%
Cautivo	0	0	0	0	0,0%
Total	88.100.750	18.085.725	686.805.325	792.891.797	100,0%

765.650.160
6.048.430

80100316

GESTOR TECNICO
CONTRATO MA-0009346

independencia


SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO
REPRESENTANTE DELEGADO CONTRATISTA

476

LIQUIDACION PARCIAL 14
CONTRATO MA-0009348

Desde 16-Sep-13 Hasta 0-Jan-00

Tanque Bomba



E01008816. SUPERINTENDENTE

477

ECOPETROL

SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA-CHICHIMENE

Castilla La Nueva, 22 de Noviembre de 2013

Doctora
LAURA JULIANA NIÑO FLOREZ
Gestora Administrativa
COPCO S.A.
Castilla La Nueva

Asunto: Entrega Pago Parcial No 18, 18.1 y 18.2 Contrato MA-0009346- Contrato Asoc MA-0026724

Estimada Laura, por medio de la presente hago entrega de los soportes correspondientes al pago parcial No 18, 18.1 y 18,2 del contrato MA-0009346, cuyo Objeto es: "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."; suscrito con la Empresa INDEPENDENCE DRILLING S.A.

En consecuencia, relaciono los soportes:

- Acta de Gestoría Técnica GAB-F-080
- Acta de cantidades parcial No 18, 18.1 y 18,2
- Distribución orden interna
- Informe de Gestoría técnica- Soportes Operaciones

Atentamente,

EO100316
Johanna Blanco Simbaqueba
Gestor Técnico Contrato MA-0009346

Anexos: Documentos relacionados
JBS/RJHR

Radicado Nro: 2-2014-013-642 Para responder citelo
Ecopetrol - CASTILLA
Fecha: Jan 24 2014 2:41PM
Dependencia: COPCO
Destino: LAURA NINO
Original Folios: 1 Anexos: 1

2-2014-013-642

Superintendencia de Operaciones Castilla Chichimene
Castilla La Nueva Vía a Cacayal - Meta
Teléfonos: (098) 66163 81 Fax: (098) 675 01 15

ecopetrol	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS Nro 18

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA-CHICHIMENE
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013
VALOR PRESENTE ACTA	CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 5.949.952.344) SIN IVA

Mediante la suscripción de la presente Acta:

a) INDEPENDENCE DRILLING S.A., en adelante el CONTRATISTA, representado por FRANCISCO JAVIER VILLABONA TAMAYO, mayor de edad, vecino de la ciudad de BOGOTA, Identificado con C.C. Nº 17.419.403 DE ACACIAS, META, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y

b) JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA Identificado con Cédula de Ciudadanía número 52.866.785 DE BOGOTA, quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

Dejan constancia de que,

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, prestó los servicios contemplados en el contrato MA-0009346 que se relaciona en la presente acta de recibo de cantidades. El valor del servicio prestado en el periodo es el siguiente:

Cantidades Equipo 550 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	0,00	$ 350.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	0,00	$ 350.000.000	$ 0
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	1,00	$ 14.075.000	$ 14.075.000
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	5,00	$ 33.500.000	$ 167.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	9,00	$ 40.000.000	$ 360.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	1,00	$ 60.000.000	$ 60.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 78.000.000	$ 0

EO100316

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
PETROL	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 90.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	93,293	$ 24.400.000	$ 2.276.349.200
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	40,876	$ 24.300.000	$ 993.286.800
2.3	Stand by	0,000	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	115,00	$ 1.300.000	$ 149.500.000
3.2	Campero sin conductor	37,00	$ 250.000	$ 9.250.000
3.3	Campero con conductor	93,00	$ 350.000	$ 32.550.000
3.4	Tarifa de planta	0,00	$ 450.000	$ 0
3.5	Tarifa de circulación de pozos	9,00	$ 8.500.000	$ 76.500.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	38,00	$ 160.000	$ 6.080.000
3.7	Construcción de anclajes	0,00	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	115,00	$ 280.000	$ 32.200.000
3.9	Contalner adicional	31,00	$ 280.000	$ 8.680.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	15,00	$ 4.370.000	$ 65.550.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	568,00	$ 400.000	$ 227.200.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	1,00	$ 28.000.000	$ 28.000.000
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0,00	$ 250.000	$ 0
	FACTOR DE SERVICIO			$ 36.053.768
	TOTAL			**$ 4.542.774.768**

Cantidades Equipo 350 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	0,00	$ 360.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	0,00	$ 360.000.000	$ 0
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	0,00	$ 28.000.000	$ 0
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	1,00	$ 30.500.000	$ 30.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	3,00	$ 38.500.000	$ 115.500.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	2,00	$ 63.500.000	$ 127.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 76.600.000	$ 0
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 84.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	34,517	$ 23.200.000	$ 800.794.400
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	8,521	$ 23.100.000	$ 196.835.100
2.3	Stand by	0	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	17	$ 1.300.000	$ 22.100.000
3.2	Campero sin conductor	11	$ 250.000	$ 2.750.000
3.3	Campero con conductor	20	$ 350.000	$ 7.000.000
3.4	Tarifa de planta	0	$ 450.000	$ 0
3.5	Tarifa de circulación de pozos	0	$ 8.500.000	$ 0

20100316

3.6	Cartucho de unidad de filtrado	0	$ 160.000	$ 0
3.7	Construcción de anclajes	0	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	36	$ 280.000	$ 10.080.000
3.9	Container adicional	0	$ 280.000	$ 0
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	5	$ 4.370.000	$ 21.850.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	154	$ 400.000	$ 61.600.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	0	$ 28.000.000	$ 0
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0	$ 250.000	$ 0
FACTOR DE SERVICIO				$ 11.168.076
TOTAL				**$ 1.407.177.576**

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el COORDINADOR DE GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO.

En constancia se firma en Villavicencio 22 de Noviembre de 2013, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

Independence ENERGY VILLAVICENCIO

E0100316

Por el CONTRATISTA

FRANCISCO JAVIER VILLABONA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Por la GESTION TÉCNICA

JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
ECOPETROL S.A.

ECOPETROL S.A.
SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA- CHICHIMENE
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 18 - CONTRATO MA-0009366

El día 22 de Noviembre de 2013, se reunieron en las oficinas del Departamento de Producción de la Superintendencia de Operaciones Castilla- Chichimene, el Ing. Francisco Villabona en representación de Independence Drilling S.A. y la Ingeniera Johanna Blanco Simbaqueba en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes:

Periodo de liquidación: 16 de octubre de 2013 **AL** 15 de noviembre de 2013

Equipo 550 HP

No	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	TARIFAS DE MOVILIZACION				
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$ 350.000.000	0	$ -
1.2	Movilización final		$ 320.000.000	0	$ -
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 14.075.000	1	$ 14.075.000
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 33.500.000	5	$ 167.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$ 40.000.000	9	$ 360.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$ 60.000.000	1	$ 60.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$ 78.000.000	0	$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$ 90.000.000	0	$ -
2	TARIFAS DE OPERACION				
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 24.400.000	93,293	$ 2.276.349.200
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 24.300.000	40.876	$ 993.296.800
2.3	Stand by	DIA	$ 18.000.000	0,000	$ -
3	OTRAS TARIFAS				
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$ 1.300.000	115	$ 149.500.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$ 250.000	37	$ 9.250.000
3.3	Campero con conductor	DIA	$ 350.000	93	$ 32.550.000
3.4	Tarifa de planta	DIA	$ 450.000	0	$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$ 8.500.000	9	$ 76.500.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$ 160.000	38	$ 6.080.000
3.7	Construcción de anclajes	EA	$ 1.800.000	0	$ -
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$ 280.000	115	$ 32.200.000
3.9	Container adicional	DIA	$ 280.000	31	$ 8.680.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	EA	$ 4.370.000	15	$ 65.550.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 400.000	568	$ 227.200.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$ 28.000.000	1	$ 28.000.000
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$ 250.000	0	$ -
	SUBTOTAL				$ 4.506.721.000
	BASE GRAVABLE				$ 360.537.680
	FACTOR DE SERVICIO			10%	$ 36.053.768
	TOTAL BASE GRAVABLE				$ 396.591.448
	BASE NO GRAVABLE				$ 4.146.183.320
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				$ 4.542.774.768
	IVA BASE GRAVABLE				$ 63.454.632
	TOTAL EQUIPO DE WO 550HP				$ 4.606.229.400

Equipos 350 HP

No	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	TARIFAS DE MOVILIZACION				
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$ 360.000.000	0,00	$ -
1.2	Movilización final		$ 360.000.000	0,00	$ -
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 20.000.000	0,00	$ -
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 30.500.000	1,00	$ 30.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$ 38.500.000	3,00	$ 115.500.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$ 63.500.000	2,00	$ 127.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$ 76.600.000	0,00	$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$ 84.000.000	0,00	$ -
2	TARIFAS DE OPERACION				
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 23.200.000	34,517	$ 800.794.400
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 23.100.000	8,521	$ 196.835.100
2.3	Stand by	DIA	$ 18.000.000	0,000	$ -
3	OTRAS TARIFAS				
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$ 1.300.000	17,000	$ 22.100.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$ 250.000	11,000	$ 2.750.000
3.3	Campero con conductor	DIA	$ 350.000	20.000	$ 7.000.000
3.4	Tarifa de planta	DIA	$ 450.000	0.000	$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$ 8.500.000	0,000	$ -
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$ 160.000	0.000	$ -
3.7	Construcción de anclajes	EA	$ 1.800.000	0,000	$ -
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$ 280.000	36,000	$ 10.080.000
3.9	Container adicional	DIA	$ 280.000	0,000	$ -
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	EA	$ 4.370.000	5,000	$ 21.850.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 400.000	154,000	$ 61.600.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$ 28.000.000	0,000	$ -
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$ 250.000	0,000	$ -
	SUBTOTAL				$ 1.396.009.500
	BASE GRAVABLE				$ 111.680.760
	FACTOR DE SERVICIO			10%	$ 11.168.076
	TOTAL BASE GRAVABLE				$ 122.849.836
	BASE NO GRAVABLE				$ 1.284.328.740
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				$ 1.407.177.576
	IVA BASE GRAVABLE				$ 19.655.814
	TOTAL EQUIPO DE WO				$ 1.426.833.390

Campo	Valor	Porcentaje
Acacias	$ 3.603.236.616	61%
Castilla La Nueva	$ 2.118.929.123	36%
Guamal	$ 227.786.604	4%
Total	$ 5.949.952.344	100%

En constancia de lo anterior firman los representantes:

FRANCISCO VILLABONA AVILLA
INDEPENDENCE DRICLING S.A.
REPRESENTANTE DELEGADO

JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
ECOPETROL
GESTOR TECNICO
E0100816

RODRIGO J HERNANDEZ R
ECOPETROL
ADMINISTRADOR

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL No. [illegible] - CONTRATO No. [illegible]

PETROL

El día 21 de noviembre de 2013, se reunieron en las oficinas de Coordinación de Producción de la Superintendencia de Operaciones Castilla-Chichimene, el Ing. Fernando Villarreal en representación de Independencia Energy S.A., y la Ingeniera Johanna Rubio Fonseca en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de tener a cabo la liquidación parcial del contrato cuyo tenor literal dice: objeto "MANTENIMIENTO, MANTENIBILIDAD, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS PARA LA RECUPERACIÓN CENTRAL DE RECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCIÓN 2015 Y 2016."

Los valores reconocidos son los siguientes:

Periodo 100 HP

Item	Código del Servicio	Descripción de Actividad	Unidad	Valor Unitario	Cantidad Gasto Castilla Electrónicamente Enviada	Cantidad Gasto Chichimene Electrónicamente Enviada	Cantidad Gasto Castilla Electrónicamente Enviada	Mto Castilla	Mto Castilla	Mto Chi	Gcia Chichimene	Prueba de Unidad Pozo	Combustible en Sitio	Valor Total
1		TARIFAS DE MOVILIZACIÓN			Base Pos 12 Pc Pos 31	Base Pos 3 y 33 Pc Pos 34	Base Pos 35 Pc Pos 36	Base Pos 5 Pc Pos 23	Base Pos 21 Pc Pos 23, 25, 33 y 47	Base Pos 42 Pc Pos 42	Base Pos 38 Pc Pos 43	Base Pos 37 Pc Pos 39		
1.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ -
1.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ -
1.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
1.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
1.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
1.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
1.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
1.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
2		EQUIPOS DE OPERACIÓN												
2.1	[illegible]	[illegible]	DÍA	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
2.2	[illegible]	[illegible]	DÍA	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
2.3	[illegible]	[illegible]	DÍA	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ -
3		[illegible]												
3.1	[illegible]	[illegible]	DÍA	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
3.2	[illegible]	[illegible]	DÍA	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
3.3	[illegible]	[illegible]	DÍA	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
3.4	[illegible]	[illegible]	DÍA	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
3.5	[illegible]	[illegible]	DÍA	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
3.6	[illegible]	[illegible]	DÍA	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
3.7	[illegible]	[illegible]	DÍA	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
3.8	[illegible]	[illegible]	DÍA	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
3.9	[illegible]	[illegible]	DÍA	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
3.10	[illegible]	[illegible]	DÍA	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
		SUBTOTAL												$ [illegible]
	[illegible]	SERVICIO TECNOLÓGICO BASE GRAVADA			$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
	[illegible]	FACTOR DE SERVICIO												
		BASE NO GRAVABLE												
		TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE												
		IVA SOBRE GRAVABLE												
		TOTAL NETO DE NO GRAVADO												

Periodo 200 HP

Item	Código del Servicio	Descripción de Actividad	Unidad	Valor Unitario	Base Pos 10 Pc Pos 30	Base Pos 30 Pc Pos 34	Base Pos 40 Pc Pos 40	Base Pos 41 Pc Pos 41	Base Pos 36 Pc Pos 36					Valor Total
1														
1.1	[illegible]	[illegible]	GLOBAL	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ -
1.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ -
1.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
1.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
1.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
1.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
1.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
1.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
2		EQUIPOS DE OPERACIÓN												
2.1	[illegible]	[illegible]	DÍA	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
2.2	[illegible]	[illegible]	DÍA	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
2.3	[illegible]	[illegible]	DÍA	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
3		[illegible]												
3.1	[illegible]	[illegible]	DÍA	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
3.2	[illegible]	[illegible]	DÍA	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
3.3	[illegible]	[illegible]	DÍA	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
3.4	[illegible]	[illegible]	DÍA	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
3.5	[illegible]	[illegible]	DÍA	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
3.6	[illegible]	[illegible]	DÍA	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
3.7	[illegible]	[illegible]	DÍA	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
3.8	[illegible]	[illegible]	DÍA	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
3.9	[illegible]	[illegible]	DÍA	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
3.10	[illegible]	[illegible]	DÍA	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]
		SUBTOTAL												$ [illegible]
	[illegible]	SERVICIO TECNOLÓGICO BASE GRAVADA			$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
	[illegible]	FACTOR DE SERVICIO												
		TOTAL BASE GRAVABLE												
		BASE NO GRAVABLE												
		TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE												
		IVA SOBRE GRAVABLE												
		TOTAL NETO DE NO GRAVADO												

[illegible]
20100316

480

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
ecopetrol	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS Nro 18.1

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346- ASOC MA-0026724
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA-CHICHIMENE
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013
VALOR PRESENTE ACTA	SETECIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($ 760.402.238) SIN IVA

Mediante la suscripción de la presente Acta:

a) INDEPENDENCE DRILLING S.A., en adelante el CONTRATISTA, representado por FRANCISCO JAVIER VILLABONA TAMAYO, mayor de edad, vecino de la ciudad de BOGOTA, identificado con C.C. Nº 17.419.403 DE ACACIAS, META, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y

b) JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA identificado con Cédula de Ciudadanía número 52.866.785 DE BOGOTA, quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

Dejan constancia de que,

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, prestó los servicios contemplados en el contrato MA-0009346 que se relaciona en la presente acta de recibo de cantidades. El valor del servicio prestado en el periodo es el siguiente:

Cantidades Equipo 550 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	0,00	$ 350.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	0,00	$ 350.000.000	$ 0
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	0,00	$ 14.075.000	$ 0
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	0,00	$ 33.500.000	$ 0
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	1,00	$ 40.000.000	$ 40.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	1,00	$ 60.000.000	$ 60.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 78.000.000	$ 0

1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 90.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	13,667	$ 24.400.000	$ 333.474.800
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	6,875	$ 24.300.000	$ 167.062.500
2.3	Stand by	0,000	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	18,00	$ 1.300.000	$ 23.400.000
3.2	Campero sin conductor	7,00	$ 250.000	$ 1.750.000
3.3	Campero con conductor	0,00	$ 350.000	$ 0
3.4	Tarifa de planta	0,00	$ 450.000	$ 0
3.5	Tarifa de circulación de pozos	9,00	$ 8.500.000	$ 76.500.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	0,00	$ 160.000	$ 0
3.7	Construcción de anclajes	0,00	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	38,00	$ 280.000	$ 10.640.000
3.9	Container adicional	0,00	$ 280.000	$ 0
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	2,00	$ 4.370.000	$ 8.740.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	82,00	$ 400.000	$ 32.800.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	0,00	$ 28.000.000	$ 0
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0,00	$ 250.000	$ 0
	FACTOR DE SERVICIO			$ 6.034.938
	TOTAL			**$ 760.402.238**

Cantidades Equipo 350 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización Inicial	0,00	$ 360.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	0,00	$ 360.000.000	$ 0
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	0,00	$ 28.000.000	$ 0
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	0,00	$ 30.500.000	$ 0
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	0,00	$ 38.500.000	$ 0
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	0,00	$ 63.500.000	$ 0
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 76.600.000	$ 0
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 84.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	0	$ 23.200.000	$ 0
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	0	$ 23.100.000	$ 0
2.3	Stand by	0	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	0	$ 1.300.000	$ 0
3.2	Campero sin conductor	0	$ 250.000	$ 0
3.3	Campero con conductor	0	$ 350.000	$ 0
3.4	Tarifa de planta	0	$ 450.000	$ 0
3.5	Tarifa de circulación de pozos	0	$ 8.500.000	$ 0

ECOPETROL	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

3.6	Cartucho de unidad de filtrado	0	$ 160.000	$ 0
3.7	Construcción de anclajes	0	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	0	$ 280.000	$ 0
3.9	Container adicional	0	$ 280.000	$ 0
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	0	$ 4.370.000	$ 0
3.11	Frac tank - 500 bbl	0	$ 400.000	$ 0
3.12	Tractomula adicional con cama alta	0	$ 28.000.000	$ 0
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0	$ 250.000	$ 0
	FACTOR DE SERVICIO			$ 0
	TOTAL			**$ 0**

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el COORDINADOR DE GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO.

En constancia, se firma en Villavicencio 22 de Noviembre de 2013, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

Independence ENERGY VILLAVICENCIO

E0100316

Por el CONTRATISTA

FRANCISCO JAVIER VILLABONA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Por la GESTION TÉCNICA

JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
ECOPETROL S.A.

ECOPETROL S.A.
SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA- CHICHIMENE
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 10.1- CONTRATO MA-0009346

El día 22 de Noviembre de 2013, se reunieron en las oficinas del Departamento de Producción de la Superintendencia de Operaciones Castilla- Chichimene, el Ing. Francisco Villabona en representación de Independence Drilling S.A. y la Ingeniera Johanna Blanco Simbaqueba en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes:

Periodo de liquidación: 16 de octubre de 2013 AL 15 de noviembre de 2013

Equipo 550 HP

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	TARIFAS DE MOVILIZACION				
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$ 350.000.000	0	$ -
1.2	Movilización final		$ 320.000.000	0	$ -
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 14.075.000	0	$ -
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 33.500.000	0	$ -
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$ 40.000.000	1	$ 40.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$ 60.000.000	1	$ 60.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$ 78.000.000	0	$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$ 90.000.000	0	$ -
2	TARIFAS DE OPERACION				
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 24.400.000	13,667	$ 333.474.800
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 24.300.000	6,875	$ 167.062.500
2.3	Stand by	DIA	$ 18.000.000	0,000	$ -
3	OTRAS TARIFAS				
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$ 1.300.000	18	$ 23.400.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$ 250.000	7	$ 1.750.000
3.3	Campero con conductor	DIA	$ 350.000	0	$ -
3.4	Tarifa de planta	DIA	$ 450.000	0	$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$ 8.500.000	9	$ 76.500.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$ 160.000	0	$ -
3.7	Construcción de anclajes	EA	$ 1.800.000	0	$ -
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$ 280.000	38	$ 10.640.000
3.9	Container adicional	DIA	$ 280.000	0	$ -
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	EA	$ 4.370.000	2	$ 8.740.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 400.000	82	$ 32.800.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$ 28.000.000	0	$ -
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$ 250.000	0	$ -
	SUBTOTAL				$ 754.367.300
	BASE GRAVABLE				$ 60.349.384
	FACTOR DE SERVICIO			10%	$ 6.034.938
	TOTAL BASE GRAVABLE				$ 66.384.322
	BASE NO GRAVABLE				$ 694.017.916
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				$ 760.402.238
	IVA BASE GRAVABLE				$ 10.6
	TOTAL EQUIPO DE WO 550HP				$ 771.0

Equipos 350 HP

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	TARIFAS DE MOVILIZACION				
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$ 360.000.000	-	$ -
1.2	Movilización final		$ 360.000.000		$ -
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 28.000.000		$ -
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 30.500.000		$ -
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$ 38.500.000		$ -
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$ 63.500.000		$ -
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$ 76.600.000		$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$ 84.000.000		$ -
2	TARIFAS DE OPERACION				
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 23.200.000		$ -
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 23.100.000		$ -
2.3	Stand by	DIA	$ 18.000.000		$ -
3	OTRAS TARIFAS				
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$ 1.300.000		$ -
3.2	Campero sin conductor	DIA	$ 250.000		$ -
3.3	Campero con conductor	DIA	$ 350.000		$ -
3.4	Tarifa de planta	DIA	$ 450.000		$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$ 8.500.000		$ -
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$ 160.000		$ -
3.7	Construcción de anclajes	EA	$ 1.800.000		$ -
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$ 280.000		$ -
3.9	Container adicional	DIA	$ 280.000		$ -
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	EA	$ 4.370.000		$ -
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 400.000		$ -
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$ 28.000.000		$ -
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$ 250.000		$ -
	SUBTOTAL				$ -
	BASE GRAVABLE				$ -
	FACTOR DE SERVICIO			10%	$ -
	TOTAL BASE GRAVABLE				$ -
	BASE NO GRAVABLE				$ -
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				$ -
	IVA BASE GRAVABLE				$ -
	TOTAL EQUIPO DE WO				$ -

CPM Pto Arga	BES	PORCENTAJE
Acacias	$ 420.290.890,41	61%
Castilla La Nueva	$ 247.157.403,82	36%
Guamal	$ 26.569.621,97	4%
Total	$ 694.017.916,20	100%

En constancia de lo anterior firman los representantes de las partes:

ING. FRANCISCO VILLABONA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
REPRESENTANTE DELEGADO

JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
ECOPETROL
GESTOR TECNICO

RODRIGO J HERNANDEZ R
ECOPETROL
ADMINISTRADOR

ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 18 - CONTRATO NA-0009346

ECOPETROL

El día 22 de Noviembre de 2013, se reunieron en las oficinas del Departamento de Producción de la Superintendencia de Operaciones Castilla- Chichimene, el Ing. Francisco Villabona en representación de Independence Drilling S.A. y la Ingeniera Johanna Blanco Simbaqueba en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes:

Equipo 650 HP

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VR. UNITARIO	AX 18/ 4044092 SNG POS 17 SG POS 18	VALOR TOTAL
1		TARIFAS DE MOVILIZACION				
1.1	6035260	Movilización inicial	GLOBAL	$ 322.000.000	0,00	$ -
1.2	6035267	Movilización final		$ 327.000.000	0,00	$ -
1.3	6060187	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 12.949.000	0,00	$ -
1.4	6051292	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 30.820.000	0,00	$ -
1.5	6034202	Movilización entre pozos 10,1-30 km	EA	$ 36.800.000	1,00	$ 36.800.000
1.6	6060188	Movilización entre pozos 30,1-60 km	EA	$ 55.200.000	1,00	$ 55.200.000
1.7	6060189	Movilización entre pozos 60,1-100 km	EA	$ 71.760.000	0,00	$ -
1.8	6060190	Movilización entre pozos 100,1 km hasta 120 km	EA	$ 87.800.000	0,00	$ -
2		TARIFAS DE OPERACION				
2.1	6035268	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 22.448.000,00	13,667	$ 306.796.816
2.2	6015891	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 27.356.000,00	6,875	$ 153.897.500
2.3	6035270	Stand by	DIA	$ 18.560.000,00	0,000	$ -
3		OTRAS TARIFAS				
3.1	6060191	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$ 1.196.000	18,00	$ 21.528.000
3.2	6035274	Campero sin conductor	DIA	$ 230.000	7,00	$ 1.610.000
3.3	6035275	Campero con conductor	DIA	$ 322.000	0,00	$ -
3.4	6043568	Tarifa de planta	DIA	$ 414.000	0,00	$ -
3.5	6060192	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$ 7.820.000	9,00	$ 70.380.000
3.6	6034206	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$ 147.200	0,00	$ -
3.7	6035279	Construcción de anclajes	EA	$ 1.656.000	0,00	$ -
3.8	6035280	Obrero de patio adicional	DIA	$ 257.600	38,00	$ 9.788.800
3.9	6035281	Contenedor adicional	DIA	$ 257.600	0,00	$ -
3.10	6060193	Aseo, limpieza y localizaciones (con retoma)	EA	$ 4.020.400	2,00	$ 8.040.800
3.11	6035283	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 368.000	82,00	$ 30.176.000
3.12	6060195	Tractomula adicional con cama alta	MES	$ 25.760.000	0,00	$ -
3.13	6060196	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$ 230.000	0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ 694.017.916,00
	6068504	SERVICIO WORKOVER BASE GRAVADA			$ 60.349.384,00	$ 60.349.384,00
	6074294	FACTOR DE SERVICIO			$ 6.034.938,40	$ 6.034.938,40
						$ 66.384.322,40
		BASE NO GRAVABLE				$ 694.017.916,00
		TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				$ 760.402.238,40
		IVA BASE GRAVABLE				$ 10.621.491,58
		TOTAL EQUIPO DE WO 650HP				$ 771.023.729,98

Equipos 350 HP

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VR. UNITARIO		VALOR TOTAL
1						
1.1	6035262	Movilización inicial	GLOBAL	$ 331.200.000		$ -
1.2	6035267	Movilización final		$ 331.200.000		$ -
1.3	6060187	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 25.760.000		$ -
1.4	6051292	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 28.060.000		$ -
1.5	6034202	Movilización entre pozos 10,1-30 km	EA	$ 35.420.000		$ -
1.6	6060188	Movilización entre pozos 30,1-60 km	EA	$ 56.420.000		$ -
1.7	6060189	Movilización entre pozos 60,1-100 km	EA	$ 70.472.000		$ -
1.8	6060190	Movilización entre pozos 100,1 km hasta 120 km	EA	$ 77.280.000		$ -
2		TARIFAS DE OPERACION				
2.1	6035268	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 28.344.000		$ -
2.2	6015891	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 21.252.000		$ -
2.3	6035270	Stand by	DIA	$ 16.560.000		$ -
3		OTRAS TARIFAS				
3.1	6060191	Camión cisterna 11 000 galones	DIA	$ 1.196.000		$ -
3.2	6035274	Campero sin conductor	DIA	$ 230.000		$ -
3.3	6035275	Campero con conductor	DIA	$ 322.000		$ -
3.4	6043568	Tarifa de planta	DIA	$ 414.000		$ -
3.5	6060192	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$ 7.820.000		$ -
3.6	6034206	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$ 147.200		$ -
3.7	6035279	Construcción de anclajes	EA	$ 1.656.000		$ -
3.8	6035280	Obrero de patio adicional	DIA	$ 257.600		$ -
3.9	6035281	Contenedor adicional	DIA	$ 257.600		$ -
3.10	6060193	Aseo, limpieza y localizaciones (con retoma)	EA	$ 4.020.400		$ -
3.11	6035283	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 368.000		$ -
3.12	6060195	Tractomula adicional con cama alta	MES	$ 25.760.000		$ -
3.13	6060196	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$ 230.000		$ -
		SUBTOTAL				$ -
	6068504	SERVICIO WORKOVER BASE GRAVADA				$ -
	6074294	FACTOR DE SERVICIO				$ -
		TOTAL BASE GRAVABLE				$ -
		BASE NO GRAVABLE				$ -
		TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				$ -
		IVA BASE GRAVABLE				$ -
		TOTAL EQUIPO DE WO 350HP				$ -

LIQUIDACION PARCIAL 17
CONTRATO MA-0009346

Desde **16-Oct-13** Hasta **14-Nov-13**

Torre 123 - 350 HP

	Tarifas de Horas Extraordinarias							Tarifas de Operación			Otros Fijos						
16-Oct-13								20,5	2,5				1,0				1,0
17-Oct-13								22,0	2,0		1,0		1,0				1,0
18-Oct-13								21,0	3,0				1,0				1,0
19-Oct-13								20,5	3,5		1,0		1,0				1,0
20-Oct-13								6,0	10,0		1,0		1,0				
21-Oct-13									7,0								
22-Oct-13				1				5,0	9,0				1,0				1,0
23-Oct-13								20,5	2,5				1,0				1,0
24-Oct-13								23,0	1,0		1,0		1,0				1,0
25-Oct-13								23,5	0,5		1,0		1,0				1,0
26-Oct-13								24,0			1,0		1,0				1,0
27-Oct-13								20,0	4,0				1,0				1,0
28-Oct-13								22,0	1,0				1,0				
29-Oct-13									2,0				1,0				1,0
30-Oct-13			1					1,0	10,5								
31-Oct-13								10,5	13,5				1,0				1,0
1-Nov-13								15,0	9,0				1,0				1,0
2-Nov-13								23,5	1,5				1,0				1,0
3-Nov-13								24,0					1,0				1,0
4-Nov-13								22,5	1,5				1,0				1,0
5-Nov-13								23,0	1,0				1,0				
6-Nov-13								24,0					1,0				
7-Nov-13						1											
8-Nov-13								24,0			1,0	1					1,0
9-Nov-13								14,5	8,5		1,0	1					1,0
10-Nov-13								10,5	1,0		1,0	1					1,0
11-Nov-13																	
12-Nov-13								20,0	0,5		1,0	1					1,0
13-Nov-13								23,0	1,0		1,0	1					1,0
14-Nov-13								24,0			1,0	1					
14-Nov-13								24,0			1,0	1					
15-Nov-13								23,0	1,0		1,0	1					1,0
								23,0			1,0	1					1,0
									6,0			1					1,0
				1					18,0								
								2,5	7,5			1					1,0

Factor de Servicio (%) 10% - F2

Gestión Costo M...	7.834.157	1.356.761	81.565.152	90.848.699
Gestión CEVI Servicios	76.139.461	17.182.854	796.092.826	884.324.531
Gti Costo Mo	0	0	0	0
Gti Cost a M	0	0	0	0
Gti Costo Tr	0	0	0	0
Gti Gestionamiento MO	0	0	0	0
Gti Gestionamiento MC	0	0	0	0
Gti Gestionamiento Tr	0	0	0	0
Total	83.944.157	18.431.855	877.658.048	975.973.230

Alquiler	76.139.461	17.182.854	796.092.826	884.324.531	90,6%
Gestión Gti Mo/Mc	7.834.757	1.248.761	81.565.152	90.848.659	9,3%
Otros	0	0	0	0	0,0%
Total	83.944.157	18.431.855	877.658.048	975.973.230	100,0%

961.542.143

9.431.287

GESTION TECNICO CONTRATO MA-0009346 ID100316

SUPERINTENDENTE REPRESENTANTE DELEGADO CONTRATISTA

		4,0			26.492.997	193.425	CHISW-03	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme SW	1,0		74	$2.151.953	$344.297	$23.446.976
		4,0			26.731.661	213.773	CHISW-03	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme SW			24	$2.361.865	$376.261	$26.583.930
		4,0			25.617.600	205.340	CHISW-03	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme SW			24	$2.268.779	$357.870	$23.304.667
		4,0			26.719.483	213.723	CHISW-03	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme SW			24	$2.359.956	$376.183	$26.578.171
	1,0	4,0			23.844.998	184.300	CHISW-03	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme SW	1,0		37	$2.037.900	$324.674	$23.201.998
					6.737.100	53.808	CHIC-78	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme			7	$593.900	$94.884	$6.990.900
		3,0			96.725.830	482.867	CHIC-78	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme	10,0		34	$8.903.873	$1.780.820	$91.207.764
		4,0			20.483.901	165.825	CHIC-78	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme	1,0		34	$2.101.859	$360.297	$22.498.675
		4,0			26.725.816	213.807	CHIC-78	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme			24	$2.361.873	$376.300	$26.587.753
		4,0			26.727.991	213.825	CHIC-78	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme			24	$2.352.855	$376.329	$26.569.668
		4,0			26.729.984	213.840	CHIC-78	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme			24	$2.362.238	$376.358	$26.591.589
		4,0			26.811.920	282.387	CHIC-78	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme			24	$2.356.373	$287.820	$23.306.284
	1,0	4,0			29.569.161	228.393	CHIC-78	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme	1,0		24	$2.393.226	$441.873	$26.269.226
		4,0			4.185.648	33.348	CHIC-78	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme			2	$165.648	$58.943	$3.923.880
					44.871.819	350.303	CHIC-48	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme	10,5		22	$3.923.457	$627.587	$43.907.863
		4,0			25.973.708	202.698	CHIC-46	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme			24	$2.293.680	$357.262	$23.343.864
		4,0			26.392.406	203.646	CHIC-46	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme			24	$2.294.530	$357.524	$23.360.893
		4,0			26.457.669	165.677	CHIC-46	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme	1,0		24	$2.152.273	$344.516	$22.506.501
		3,0			25.819.994	200.240	CHIC-46	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme			24,0	$1.302.679	$332.421	$23.027.365
		3,0			25.819.735	200.198	CHIC-46	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme			24,0	$2.302.099	$332.334	$23.021.836
		3,0			24.745.810	192.867	CHIC-46	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme			24,0	$2.177.832	$346.421	$22.766.163
		3,0			24.749.984	192.900	CHIC-46	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme			24,0	$2.177.899	$346.998	$22.766.915
		3,0			26.329.984	205.049	CHIC-46	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme			24,0	$2.308.339	$368.318	$24.134.536
		3,0			25.327.987	201.833	CHIC-46	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme	1,0		24	$2.220.050	$358.300	$23.299.676
	1,0	3,0			78.817.403	613.198	CHIC-46	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme			12	$6.999.099	$1.103.456	$73.224.699
					0	0	CHIC-118	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme	12,5		12	$0	$0	$0
		3,0			23.844.570	182.737	CHIC-118	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme	8,5		24	$2.040.313	$321.453	$21.417.089
		3,0			26.225.818	209.809	CHIC-118	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme			24	$2.307.872	$360.360	$24.127.783
		3,0			23.049.964	207.800	CHIC-118	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme			24	$2.283.599	$365.376	$23.873.985
		3,0			25.849.984	207.800	CHIC-118	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme			24	$2.283.999	$365.376	$23.873.985
		3,0			26.225.818	209.807	CHIC-118	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme			24	$2.307.873	$369.259	$24.127.753
		3,0			25.342.318	203.139	CHIC-118	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme	8,0		24	$2.238.173	$358.108	$23.393.293
	1,0	3,0			11.879.000	95.000	CHIC-118	RP86550	Gasto Chichimeme	Acacias	Chichimeme			6	$1.045.000	$167.200	$10.918.000
					77.125.000	610.000	C-16	RP86550	Gasto Castilla	Castilla La Nueva	Castilla			10	$6.804.000	$1.088.720	$70.839.000
		3,0			11.365.418	90.933	C-16	RP86550	Gasto Castilla	Castilla La Nueva	Castilla	14,0		24	$1.004.157	$160.625	$10.438.102
					933.918.878	7.551.287											

LIQUIDACION PARCIAL 17
CONTRATO MA-0009346

Desde 16-Oct-13 **Hasta** 15-Nov-13

Torre 126- 550 HP

	Tarifas de Movilizaciones							Tarifas de Operacion			Otras Tarifas							
16-Oct-13																		
17-Oct-13																		
18-Oct-13																		
19-Oct-13																		
20-Oct-13																		
21-Oct-13																		
22-Oct-13																		
23-Oct-13																		
24-Oct-13																		
25-Oct-13																		
26-Oct-13																		
27-Oct-13																		
28-Oct-13																		
29-Oct-13																		
30-Oct-13																		
31-Oct-13					1			7.0	6.0									
1-Nov-13								7.0	7.0		1.0							1.0
2-Nov-13								13.0			1.0							1.0
3-Nov-13								10.0	14.0		1.0							2.0
4-Nov-13								12.0	7.0		1.0							3.0
5-Nov-13								24.0			1	1						1.0
6-Nov-13								24.0			4.0	1						4.0
7-Nov-13								33.0	2.0		1.0	1						4.0
8-Nov-13								20.0	4.0		1.0	1						4.0
9-Nov-13								16.5	3.5		1.0	1						4.0
10-Nov-13								16.0	9.0		1.0	1						3.0
11-Nov-13								9.0	8.0		1.0	1						3.0
12-Nov-13									8.0									
13-Nov-13					1			8.0	3.0		1.0	1						1.0
14-Nov-13								17.5	3.5		1.0	1						1.0
15-Nov-13								23.0	3.0		1.0	1						1.0
								21.0	3.0		1.0	1						1.0

standby

Factor de Servicio (%) 30% T

Costo Tarifa	0	0	0	0
Costo Chichimene	39.678.677	2.316.500	131.367.963	168.363.340
Old Castilla MO	0	0	0	0
Old Castilla MC	0	0	0	0
Old Castilla 12	0	0	0	0
Old Chichimene MO	30.914.317	4.944.691	322.090.583	358.939.591
Old Chichimene MC	0	0	0	0
Old Chichimene 12	0	0	0	0
Total	69.592.993	7.261.191	453.458.547	527.302.930

$69.841.946
4.125.727

Nombre	69.592.993	7.261.191	453.458.547	527.302.930
Costo de la Tarifa	0	0	0	0
Diario	0	0	0	0
Total	69.592.993	7.261.191	453.458.547	527.302.930

Independence ENERGY

SUPERINTENDENCIA

GESTOR TECNICO CONTRATO MA-0009346

EO1000316

REPRESENTANTE DELEGADO CONTRATISTA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					0	0	CH-109	RPP6553	Gesto Castilla	Castilla La Nueva	Castilla Norte		24	24,0	$0	$0	$0
					0	0	CH-109	RPP6553	Gesto Castilla	Castilla La Nueva	Castilla Norte		24	24,0	$0	$0	$0
					0	0	CH-109	RPP6553	Gesto Castilla	Castilla La Nueva	Castilla Norte		24	24,0	$0	$0	$0
					0	0	CH-109	RPP6553	Gesto Castilla	Castilla La Nueva	Castilla Norte		24	24,0	$0	$0	$0
					0	0	CH-109	RPP6553	Gesto Castilla	Castilla La Nueva	Castilla Norte		24	24,0	$0	$0	$0
					0	0	CH-109	RPP6553	Gesto Castilla	Castilla La Nueva	Castilla Norte		24	24,0	$0	$0	$0
					0	0	CH-109	RPP6553	Gesto Castilla	Castilla La Nueva	Castilla Norte		24	24,0	$0	$0	$0
					0	0	CH-109	RPP6553	Gesto Castilla	Castilla La Nueva	Castilla Norte		24	24,0	$0	$0	$0
					0	0	CH-109	RPP6553	Gesto Castilla	Castilla La Nueva	Castilla Norte		24	24,0	$0	$0	$0
					0	0	CH-109	RPP6553	Gesto Castilla	Castilla La Nueva	Castilla Norte		24	24,0	$0	$0	$0
					0	0	CH-109	RPP6553	Gesto Castilla	Castilla La Nueva	Castilla Norte		24	24,0	$0	$0	$0
					0	0	CH-109	RPP6553	Gesto Castilla	Castilla La Nueva	Castilla Norte		24	24,0	$0	$0	$0
					0	0	CH-109	RPP6553	Gesto Castilla	Castilla La Nueva	Castilla Norte		24	24,0	$0	$0	$0
					0	0	CH-109	RPP6553	Gesto Castilla	Castilla La Nueva	Castilla Norte		24	24,0	$0	$0	$0
					0	0	CH-109	RPP6553	Gesto Castilla	Castilla La Nueva	Castilla Norte		24	24,0	$0	$0	$0
					64.873.894	820.000	AKAC-19	CP 09	OH Chichimene WO	Acacias	Chichimene	12,0	4	24,0	$5.814.000	$930.339	$46.789.000
		30			60.864.187	135.873	AKAC-19	CP 09	OH Chichimene WO	Acacias	Chichimene	10,0		24,0	$1.484.967	$239.137	$15.820.433
		33			26.163.333	209.307	AKAC-19	CP 09	OH Chichimene WO	Acacias	Chichimene	1,0		24,0	$2.103.373	$360.380	$24.070.767
		30			27.881.467	221.483	AKAC-19	CP 09	OH Chichimene WO	Acacias	Chichimene			24,0	$2.473.987	$389.750	$25.407.133
		34			27.736.487	221.893	AKAC-19	CP 09	OH Chichimene WO	Acacias	Chichimene			24,0	$2.440.307	$390.402	$28.113.135
		34			27.430.000	219.440	AKAC-19	CP 09	OH Chichimene WO	Acacias	Chichimene			24,0	$2.413.846	$386.214	$28.735.000
		30			28.270.800	226.166	AKAC-19	CP 09	OH Chichimene WO	Acacias	Chichimene			24,0	$2.487.700	$398.042	$28.040.400
		30			28.261.667	226.093	AKAC-19	CP 09	OH Chichimene WO	Acacias	Chichimene			24,0	$2.487.027	$397.924	$28.900.735
		30			28.292.333	226.327	AKAC-19	CP 09	OH Chichimene WO	Acacias	Chichimene			24,0	$2.490.393	$397.807	$26.993.087
		34			26.347.633	225.077	AKAC-19	CP 09	OH Chichimene WO	Acacias	Chichimene			24,0	$2.485.743	$397.719	$25.992.717
		30			27.845.000	222.720	AKAC-19	CP 09	OH Chichimene WO	Acacias	Chichimene			24,0	$2.450.839	$393.747	$28.727.000
	1,0	34			18.112.500	144.900	AKAC-19	CP 09	OH Chichimene WO	Acacias	Chichimene	1,0		11,4	$1.904.760	$250.169	$18.873.700
					8.112.500	73.600	CHT 61	APR6550	Gesto Chichimene	Acacias	Chichimene	4,0		13,0	$901.900	$120.304	$8.363.600
		33			74.186.307	393.473	CHT 61	APR6550	Gesto Chichimene	Acacias	Chichimene	33,0		24,4	$4.320.307	$1.044.913	$66.240.433
		33			26.397.417	211.133	CHT 61	APR6550	Gesto Chichimene	Acacias	Chichimene	1,0		24,0	$2.322.357	$371.177	$24.378.183
		34			27.430.833	219.407	CHT 61	APR6550	Gesto Chichimene	Acacias	Chichimene			24,0	$2.413.873	$386.156	$25.326.767
		12			27.417.500	219.340	CHT 61	APR6550	Gesto Chichimene	Acacias	Chichimene			24,0	$2.412.740	$386.038	$25.334.100
					0	0								0,0	$0	$0	$0
					0	0								0,0	$0	$0	$0
					0	0								0,0	$0	$0	$0
					0	0								0,0	$0	$0	$0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	917.715.038	4.129.737						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

484

Justin Dell
20100316

LIQUIDACION PARCIAL 18
CONTRATO HA-0009346

Desde **16-Oct-13** Hasta **15-Nov-13**

Tanque Bomba

	Tarifas de Movilizacion							Tarifas de Operacion												
16-Oct-13																				
18-Oct-13																				
19-Oct-13																				
21-Oct-13																				
22-Oct-13																				
23-Oct-13																				
25-Oct-13																				
27-Oct-13																				
28-Oct-13																				
29-Oct-13																				
30-Oct-13																				
1-Nov-13																				
2-Nov-13																				
4-Nov-13																				
11-Nov-13																				
12-Nov-13																				
14-Nov-13																				

Factor de Servicio (%)	50%			
Gasto Capilla	3.288.000	394.560	39.109.800	42.616.488
Gasto Checktimes	2.548.068	552.840	33.468.840	36.067.848
DB Cambio WO	0	0	0	0
DB Cambio IC	0	0	0	0
DB Cambio T2	0	0	0	0
DB Checktimes WO	6.717.000	1.417.128	70.588.800	78.189.528
DB Checktimes IC	0	0	0	0
DB Checktimes T2	0	0	0	0
Total	12.718.000	2.674.840	132.949.000	147.860.568

Arenas	11.230.000	1.755.250	117.300.000	130.315.250	88.1%
Grava / La Balsa	1.598.000	229.360	15.649.000	17.476.360	11.8%
Agua	0	0	0	0	0.0%
Total	12.718.000	2.674.840	132.949.000	147.860.568	100.0%

GESTOR TECNICO CONTRATO HA-0009346 50100316

REPRESENTANTE DELEGADO CONTRATISTA

Independence ENERGY VILLAVICENCIO

485

						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						8.500.000	48.000	AK 1	cp009	OH Chichimene WO	Acacias	Chichimene			0	$748.000	$119.680	$7.620.000
						8.500.000	48.000	AK 1	cp009	OH Chichimene WO	Acacias	Chichimene			0	$748.000	$119.680	$7.620.000
						8.500.000	48.000	AK 1	cp009	OH Chichimene WO	Acacias	Chichimene			0	$748.000	$119.680	$7.620.000
						8.500.000	48.000	AK 1	cp009	OH Chichimene WO	Acacias	Chichimene			0	$748.000	$119.680	$7.620.000
						8.500.000	48.000	AK 1	cp009	OH Chichimene WO	Acacias	Chichimene			0	$748.000	$119.680	$7.620.000
						8.500.000	48.000	AK 1	cp009	OH Chichimene WO	Acacias	Chichimene			0	$748.000	$119.680	$7.620.000
						8.500.000	48.000	AK 1	cp009	OH Chichimene WO	Acacias	Chichimene			0	$748.000	$119.680	$7.620.000
						8.800.000	48.000	C 245	cp6551	Gesta Castilla	Castilla La Nueva	Castilla			0	$748.000	$119.680	$7.620.000
						8.500.000	48.000	AK 1	cp009	OH Chichimene WO	Acacias	Chichimene			0	$748.000	$119.680	$7.620.000
						8.500.000	48.000	AK 1	cp009	OH Chichimene WO	Acacias	Chichimene			0	$748.000	$119.680	$7.620.000
						8.800.000	48.000	C 523	cp6551	Gesta Castilla	Castilla La Nueva	Castilla			0	$748.000	$119.680	$7.620.000
						8.500.000	48.000	CN 44	cp6551	Gesta Castilla	Acacias	Castilla Norte			0	$748.000	$119.680	$7.620.000
						8.500.000	48.000	CH 45	cp5550	Gesta Chichimene	Acacias	Chichimene			0	$748.000	$119.680	$7.620.000
						8.500.000	48.000	CH Ext 23	cp5550	Gesta Chichimene	Acacias	Chichimene			0	$748.000	$119.680	$7.620.000
						8.500.000	48.000	C 122	cp6551	Gesta Castilla	Acacias	Castilla Norte			0	$748.000	$119.680	$7.620.000
						8.500.000	48.000	C 144	cp6551	Gesta Castilla	Acacias	Castilla Norte			0	$748.000	$119.680	$7.620.000
						8.500.000	48.000	CHSW 16	cp5550	Gesta Chichimene	Acacias	Chichimene			0	$748.000	$119.680	$7.620.000

LIQUIDACION PARCIAL 18
CONTRATO HA-0009346

Desde **16-Oct-13** Hasta **15-Nov-13**

16-Oct-13										16,7	6,1			1,0			8,0					1,0		1,0
17-Oct-13										15,5	5,2			1,0			8,0					1,0		1,0
18-Oct-13										23,0				1,0			8,0					1,0		1,0
19-Oct-13										22,9	3,0			1,0			8,0					1,0		1,0
20-Oct-13										6,3	3,0			1,0			8,0					1,0		1,0
21-Oct-13				1,02						7,0	4,0													
22-Oct-13										20,9	3,0			1,0			8,0					1,0		1,0
23-Oct-13										24,0				1,0			8,0					1,0		1,0
24-Oct-13										19,0	4,0			1,0			8,0					1,0		1,0
25-Oct-13										23,0	3,0			1,0			8,0					1,0		1,0
26-Oct-13										20,3	3,4			1,0			8,0					1,0		1,0
27-Oct-13										24,0				1,0			8,0					1,0		1,0
28-Oct-13										21,5	3,5			1,0			8,0					1,0		1,0
29-Oct-13											24,0			1,0			8,0					1,0		1,0
30-Oct-13											24,0			1,0			8,0					1,0		1,0
31-Oct-13										18,5	5,5			1,0			8,0					1,0		1,0
1-Nov-13										21,0	3,0			1,0			7,0					1,0		1,0
2-Nov-13										22,0	3,0			1,0			8,0					1,0		1,0
3-Nov-13										19,0	5,0			1,0			7,0							1,0
4-Nov-13										14,5	6,5			1,0			8,0							1,0
5-Nov-13										9,0	2,5			1,0	1		4,0					1,0		1,0
6-Nov-13											8,0													
7-Nov-13											15,0			1,0			8,0					1,0		1,0
8-Nov-13										13,5	3,0			1,0			8,0					1,0		1,0
9-Nov-13										17,0	11,0			1,0			8,0					2,0		1,0
10-Nov-13										13,0	11,0			1,0			8,0					1,0		1,0
11-Nov-13										12,0	5,0			1,0			8,0							1,0
12-Nov-13										17,0	3,0			1,0			8,0							1,0
13-Nov-13										19,0				1,0			8,0					1,0		1,0
14-Nov-13										21,0	3,0			1,0			8,0					1,0		1,0
										8,2	3,0			1,0			8,0					1,0		1,0
14-Nov-13				1,00							4,0													
15-Nov-13										18,0	2,5			1,0	1,00		8,0					1,0		1,0

Factor de Servicio (%) 10%

Costo Calilla	0	0	0	0
Costo Chichimene	0	0	0	0
Cto Calilla $/U	78.294.368	12.519.178	818.015.180	908.776.726
Cto Chimi $/C	0	0	0	0
Cto CAMPA $/	0	0	0	0
Cto Chichimene $/U	0	0	0	0
COMBUSTIBLE BTU	5.772.497	923.759	60.356.343	67.036.539
Cto Chichimene $/	0	0	0	0
Cto Chichimene $/	0	0	0	0
Total	84.066.865	13.443.000	878.371.523	975.813.265


Petrolco	5.772.497	923.759	60.356.343	67.036.539	80,0%
Central La Punta	78.294.368	12.519.178	818.015.180	908.776.726	20,0%
Chimichi	0	0	0	0	0,0%
Total	84.066.865	13.443.000	878.371.523	975.813.265	100,0%

963.269.429
2.626.995

GESTOR TECNICO CONTRATO HA-0009346

#0100316

REPRESENTANTE LEGAL
APODERADO
CONTRATISTA

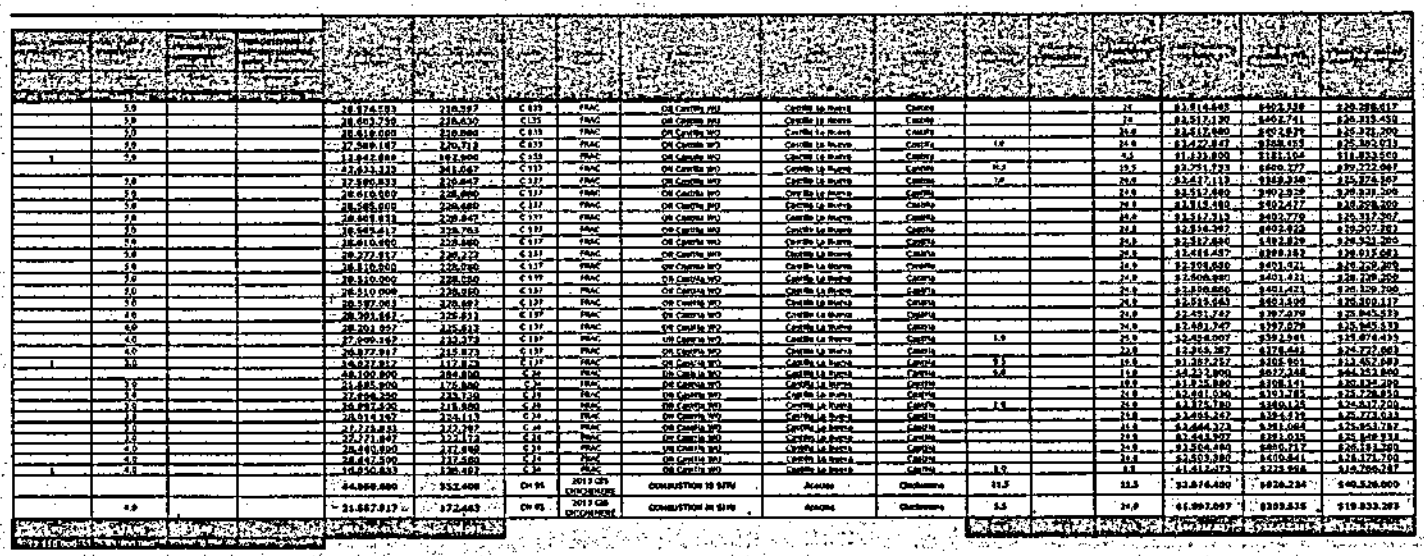

	5.0			38.874.583	210.567	C 835	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla			24	$3.814.645	$402.338	$29.288.617
	5.0			38.663.750	216.450	C 135	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla			24	$3.517.190	$402.741	$26.315.450
	5.0			38.610.000	210.000	C 835	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla			24.0	$3.617.680	$403.839	$29.321.200
	5.0			37.989.167	220.712	C 835	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla	1.0		24.0	$3.427.847	$388.455	$25.302.913
1	5.0			13.942.000	102.000	C 135	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla			4.5	$1.233.800	$181.104	$11.833.500
				42.833.333	341.667	C 135	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla	0.5		25.5	$3.751.723	$600.277	$39.722.067
	5.0			37.890.833	220.667	C 137	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla	1.0		24.0	$3.417.119	$388.338	$25.274.567
	5.0			38.610.000	228.000	C 137	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla			24.0	$3.512.880	$402.329	$26.837.200
	5.0			38.565.000	226.000	C 137	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla			24.0	$3.515.480	$402.477	$26.828.200
	5.0			38.665.833	228.667	C 137	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla			24.0	$3.512.713	$402.770	$26.837.907
	5.0			38.565.417	228.763	C 137	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla			23.8	$3.534.347	$403.829	$26.907.283
	5.0			38.610.000	228.000	C 137	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla			24.0	$3.512.880	$402.829	$26.921.200
	5.0			38.777.917	230.333	C 137	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla			24.0	$3.486.487	$399.382	$26.915.683
	5.0			38.610.000	228.000	C 137	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla			24.0	$3.508.080	$401.421	$26.909.200
	5.0			38.610.000	228.000	C 137	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla			24.0	$3.508.080	$401.421	$26.909.200
	5.0			38.610.000	228.000	C 137	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla			24.0	$3.508.080	$401.421	$26.909.200
1	5.0			38.597.083	228.083	C 137	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla			24.0	$3.513.643	$402.059	$26.909.117
	5.0			38.991.667	225.833	C 137	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla			24.0	$3.421.762	$397.079	$26.845.533
	6.0			38.291.667	225.833	C 137	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla			24.0	$3.421.762	$397.079	$26.845.533
	4.0			37.999.167	232.373	C 137	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla	1.0		25.0	$3.454.007	$391.941	$25.874.433
	4.0			38.877.917	215.873	C 137	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla			23.8	$3.363.387	$376.661	$24.727.883
1	5.0			39.027.917	217.823	C 137	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla	0.5		24.0	$3.357.257	$388.991	$25.457.983
				48.100.000	284.000	C 36	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla	5.0		24.0	$4.232.960	$467.248	$44.353.000
	5.0			38.685.000	176.000	C 36	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla			18.0	$3.015.880	$398.141	$30.834.200
	5.0			37.896.250	183.750	C 39	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla			24.0	$3.441.030	$393.785	$25.728.850
	5.0			38.887.500	218.500	C 39	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla	1.5		24.0	$3.375.780	$380.126	$24.917.200
	5.0			38.914.167	224.113	C 39	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla			24.0	$3.466.267	$394.679	$25.773.033
	5.0			37.728.833	222.797	C 39	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla			23.8	$3.444.323	$391.084	$25.853.787
	5.0			37.771.667	222.173	C 39	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla			24.0	$3.448.907	$391.035	$25.849.934
	4.0			38.440.000	217.000	C 39	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla			24.0	$3.504.480	$400.717	$26.193.280
	4.0			38.447.500	217.500	C 39	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla			24.0	$3.503.880	$400.641	$26.191.700
1	4.0			38.950.667	230.667	C 36	FRAC	Oil Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla	1.0		23.5	$3.412.473	$378.968	$24.796.287
				84.850.000	552.400	CH 95	2013 CPS CHICHIMENE	COMBUSTION 10 SITU	Acacias	Chichimene	21.5		23.5	$3.876.400	$426.284	$40.526.000
	4.9			21.667.917	172.663	CH 95	2013 CPS CHICHIMENE	COMBUSTION IN SITU	Apiay	Chichimene	5.5		24.0	$1.997.097	$203.535	$19.833.283

LIQUIDS ON PARCEL 18

CHOKE 64/64 WHP 1500 HRS 15-Nov-13

TOTAL 21 - 58 BOPD 13-Oct-13 RDMO 15-Oct-13

Independence ENERGY

SUPERINTENDENT: VINCENCIO

LIQUIDACION PARCIAL 17
CONTRATO MA-0009346

Desde 16-Oct-13 Hasta 15-Nov-13

Torre 34 - 550 HP

	Tarifas de Movilización							Tarifas de Operación		Otras Tarifas							
16-Oct-13								9.5	22.5	1		1					1
17-Oct-13								20	4	1		1					1
18-Oct-13								24	8	1		1					1
19-Oct-13								21	8	1		1					1
20-Oct-13								24	8	1		1					1
21-Oct-13								16.5	6.5	1		1					1
22-Oct-13								24	6.5	1		0					1
23-Oct-13				1.00				4.5	2.5	0		1					0
24-Oct-13								20.5	3.5	1		1					1
25-Oct-13								24.0	8.0	1		1					1
26-Oct-13								18.5	4.5	1		1					1
27-Oct-13								6.00	1.0	1		1					1
28-Oct-13		1.00						11.50	2.5	0		0					0
29-Oct-13								23.5	1.5	1		1					0
30-Oct-13								23.0	3.0	1		1					1
31-Oct-13								21.1	0.5	1		1					1
1-Nov-13								22.0	2.0	1		1					1
2-Nov-13								21.5	2.5	1		1					1
3-Nov-13								2.0	22.0	1		1					1
4-Nov-13				1.00				7.5	16.5	1		1					1
5-Nov-13								5.0	0.0	1		1					1
6-Nov-13								4.5	4.0	0		0					0
7-Nov-13								14.0	0.5	1		1					1
8-Nov-13								24.0		1	1.0	1					1
9-Nov-13					1.00			22.0	7.0	1.0	1.0	1					1
10-Nov-13								10.0	5.0	1.0	1.0	1					1
11-Nov-13								6.0	5.0	1.0	1.0	1					1
12-Nov-13									3.5								
13-Nov-13								13.0	9.0	1.0	1.0	1					1
14-Nov-13								22.0		1.0	1.0	1					1
15-Nov-13								24.0		1.0	1.0	1					1
								24.0		1.0	1.0	1					1
								20.5	3.5	1.0	1.0	1					1
								24.0		1.0	1.0	1					1

Factor de Servicio (%): 20%

Arpet Castilla	24.719.923	4.275.052	379.326.747	408.321.852
Casia Chichimene	0	0	0	0
CH Castilla WO	37.297.447	5.967.585	389.937.033	433.202.425
CH Castilla TC	0	0	0	0
CH Castilla T2	0	0	0	0
CH Chichimene WO	23.190.337	37.05.587	268.193.313	328.310.587
CH Chichimene TC	0	0	0	0
CH Chichimene T2	0	0	0	0
Total	87.307.707	13.199.143	1.037.457.093	1.169.833.931

1.009.063.610
7.937.812

Bogotá	49.642.193	6.347.317	474.178.417	460.163.917	96.0 %
Casilla la Morena	47.637.963	7.852.826	499.038.317	551.289.806	90.5%
Sucursal	0	0	0	0	0.0%
Total	87.307.707	13.199.143	912.798.533	1.011.453.831	888.9%

GESTOR TECNICO CONTRATO MA-0009346

20100316

Independence ENERGY

SUPERVISOR

REPRESENTANTE DELEGADO CONTRATISTA

					28,372,003	228,057	CA0059	FRAC	OH Castilla WO	Acuejas	Castilla la Nueva			24.0	$2,484,423	$397,508	$15,975,517
		3			28,333,333	226,597	CA0059	FRAC	OH Castilla WO	Acuejas	Castilla la Nueva			24.0	$2,481,973	$396,662	$16,849,267
		3			28,330,000	226,640	CA0059	FRAC	OH Castilla WO	Acuejas	Castilla la Nueva			24.0	$2,482,840	$396,858	$16,852,608
		3			28,330,000	226,640	CA0059	FRAC	OH Castilla WO	Acuejas	Castilla la Nueva			24.0	$2,482,840	$396,856	$16,852,609
		3			28,050,000	224,400	CA0059	FRAC	OH Castilla WO	Acuejas	Castilla la Nueva			24.0	$2,458,400	$392,944	$15,806,808
		3			27,286,250	218,290	CA0059	FRAC	OH Castilla WO	Acuejas	Castilla la Nueva	1		24.0	$2,391,590	$382,190	$15,102,356
	1	3			37,581,250	148,650	CA0059	FRAC	OH Castilla WO	Acuejas	Castilla la Nueva			9.5	$1,317,150	$197,566	$16,176,750
		9			48,936,750	227,850	CA0035	RPM551	Gasco Castilla	Castilla La Nueva	Castilla	7.5		24.5	$3,404,250	$578,681	$37,079,750
		5			27,300,833	218,407	CA0035	RPM551	Gasco Castilla	Castilla La Nueva	Castilla	1		24.0	$2,403,273	$384,396	$25,110,767
		5			28,330,000	226,640	CA0035	RPM551	Gasco Castilla	Castilla La Nueva	Castilla			24.0	$2,493,840	$398,846	$26,963,600
		5			27,293,583	218,357	CA0035	RPM551	Gasco Castilla	Castilla La Nueva	Castilla	1		24.0	$2,401,923	$384,308	$25,111,817
	1	5			9,312,500	74,500	CA0035	RPM551	Gasco Castilla	Castilla La Nueva	Castilla			8.0	$819,588	$131,130	$8,647,500
		9			33,360,417	266,883	CA0036	FRAC	OH Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla	4		11.5	$2,935,717	$469,715	$30,691,583
		5			27,037,083	216,297	CA0036	FRAC	OH Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla	1		24.0	$2,378,383	$380,541	$24,664,917
		5			28,331,667	226,573	CA0036	FRAC	OH Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla			24.0	$2,492,307	$398,769	$26,055,333
		5			28,327,917	226,623	CA0036	FRAC	OH Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla			24.0	$2,492,857	$398,857	$26,052,683
		5			28,331,667	226,573	CA0036	FRAC	OH Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla			24.0	$2,492,307	$398,769	$26,055,333
		5			28,319,583	226,557	CA0036	FRAC	OH Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla			24.0	$2,492,133	$398,741	$26,053,417
		4			27,618,333	221,707	CA0036	FRAC	OH Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla			24.0	$2,440,773	$390,524	$25,851,667
		4			27,641,250	221,890	CA0036	FRAC	OH Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla			24.0	$2,442,790	$390,846	$25,872,750
		4			8,333,333	66,667	CA0036	FRAC	OH Castilla WO	Castilla La Nueva	Castilla	1		5.0	$733,333	$117,333	$7,866,667
		9			41,816,667	334,933	CA0152	RPM551	Gasco Castilla	Castilla La Nueva	Castilla	10		19.0	$3,682,267	$589,963	$38,197,333
		4			26,393,833	212,747	CA0152	RPM551	Gasco Castilla	Castilla La Nueva	Castilla	1		24.0	$2,340,453	$374,488	$24,868,167
		3			27,750,000	222,000	CA0152	RPM551	Gasco Castilla	Castilla La Nueva	Castilla			24.0	$2,464,440	$394,544	$25,552,800
		3			27,721,667	222,173	CA0152	RPM551	Gasco Castilla	Castilla La Nueva	Castilla			24.0	$2,462,907	$394,295	$25,549,833
		3			27,755,000	222,440	CA0152	RPM551	Gasco Castilla	Castilla La Nueva	Castilla			24.0	$2,465,796	$394,728	$25,556,000
	1	3			18,912,500	151,300	CA0152	RPM551	Gasco Castilla	Castilla La Nueva	Castilla	1		12.0	$1,344,300	$215,188	$17,399,509
		7			45,544,750	364,358	Qt-137	2013 EST (MY AGUA CH)	OH Chichimeca WO	Acuejas	Chichimeca	8.5		12.0	$4,010,858	$641,737	$41,923,350
		7			28,709,167	229,673	Qt-137	2013 EST (MY AGUA CH)	OH Chichimeca WO	Acuejas	Chichimeca	2		24.0	$2,202,417	$352,387	$23,851,833
		7			54,438,333	435,507	Qt-137	2013 EST (MY AGUA CH)	OH Chichimeca WO	Acuejas	Chichimeca	1		24.0	$3,794,533	$727,125	$40,124,667
		3			37,500,000	300,000	Qt-137	2013 EST (MY AGUA CH)	OH Chichimeca WO	Acuejas	Chichimeca			24.0	$2,628,000	$420,480	$25,000,000
		4			28,490,000	227,920	Qt-137	2013 EST (MY AGUA CH)	OH Chichimeca WO	Acuejas	Chichimeca			24.0	$2,478,540	$396,726	$25,965,600
		4			28,189,000	225,512	Qt-137	2013 EST (MY AGUA CH)	OH Chichimeca WO	Acuejas	Chichimeca			24.0	$2,479,940	$396,724	$25,705,640
		4			28,155,417	225,243	Qt-137	2013 EST (MY AGUA CH)	OH Chichimeca WO	Acuejas	Chichimeca			24.0	$2,478,553	$396,568	$25,692,183
		7			25,897,000	218,888	Qt-137	2013 EST (MY AGUA CH)	OH Chichimeca WO	Acuejas	Chichimeca			24.0	$2,365,640	$378,670	$24,179,480
						7,917,811											

EO100316

LIQUIDACION PARCIAL 18
CONTRATO HA-0009346

Desde **16-Oct-13** Hasta **15-Nov-13**

Torre 41 - 350 HP

	Tarifas de Movilizaciones							Tarifas de Operacion			Otras Tarifas						
16-Oct-13																	
17-Oct-13																	
18-Oct-13																	
19-Oct-13																	
20-Oct-13																	
21-Oct-13																	
22-Oct-13																	
23-Oct-13																	
24-Oct-13																	
25-Oct-13																	
26-Oct-13																	
27-Oct-13																	
28-Oct-13																	
29-Oct-13																	
30-Oct-13				1.00													
31-Oct-13									7.0								
1-Nov-13								7.0	12.0								
2-Nov-13								18.8	5.0		1.0						
3-Nov-13								19.8	5.0								
4-Nov-13								17.5	6.5								
5-Nov-13								25.0									
6-Nov-13								12.0	12.0								
7-Nov-13								18.0	6.0								
8-Nov-13								21.5	2.5								
9-Nov-13								17.5	6.5								
10-Nov-13								22.0	1.0								
11-Nov-13								13.0	5.5								
12-Nov-13				1.00													
13-Nov-13								12.9									
14-Nov-13								21.0	3.0								
15-Nov-13								24.0									
								24.0			1.0						

Factor de Servicio (%) 85% 100%

Gastos Castilla	11.033.160	1.773.306	115.869.800	128.726.266
Gastos Chichimene	27.659.323	4.417.436	786.639.767	320.001.626
CH Castilla W1	0	0	0	0
CH Castilla W	0	0	0	0
CH Castilla E1	0	0	0	0
CH Chichimene W1	0	0	0	0
CH Chichimene 1C	0	0	0	0
CH Chichimene 2	0	0	0	0
Total	38.692.483	6.190.741	902.509.566	448.727.892

Arenas	0	0	0	0	0.0%
Castilla La Nueva	11.033.160	1.773.306	115.869.800	128.726.266	30.0%
Chichimene	27.659.323	4.417.436	786.639.767	320.001.626	70.0%
Total	38.692.483	6.190.741	902.509.566	448.727.892	100.0%

443.300.891
2.517.667

GESTOR TECNICO CONTRATO HA-0009346

E01003316

Independence ENERGY

REPRESENTANTE DELEGADO CONTRATISTA

LIQUIDACION PARCIAL
LIQUIDACION PARCIAL 18

Desde **16-Oct-13** Hasta

Torre 42 - 550 HP

	Turno de Montaje/arribo							Turno de Operación									Otros Turnos	
16-Oct-13								23.0	1.0		1.0		1.0					
17-Oct-13								24.0			1.0		1.0					
18-Oct-13								24.0			1.0		1.0					
19-Oct-13								17.0	7.0		1.0		1.0					
20-Oct-13									24.0		1.0		1.0					
21-Oct-13									24.0		1.0		1.0					
22-Oct-13									24.0		1.0		1.0					
23-Oct-13									24.0		1.0		1.0					
24-Oct-13								12.5	11.5		1.0		1.0					
25-Oct-13								24.0			1.0		1.0					
26-Oct-13								21.0	3.0		1.0		1.0		1.0			
27-Oct-13								23.5	0.5		1.0		1.0					
28-Oct-13								23.5	0.5		1.0		1.0					
29-Oct-13								16.0	8.0		1.0		1.0					
30-Oct-13								20.0	4.0		1.0		1.0					
31-Oct-13								20.0	4.0		1.0		1.0					
1-Nov-13								21.0	3.0		1.0		1.0					
2-Nov-13								7.0	2.0		1.0		1.0					
3-Nov-13					8.0			3.0										
3-Nov-13								19.5	3.5		1.0		1.0					
3-Nov-13					8.0													
4-Nov-13									11.5		1.0		1.0					
5-Nov-13									23.0		1.0	1.0	1.0					
6-Nov-13								11.0	13.0		1.0	1.0	1.0					
7-Nov-13								20.5	3.5		1.0	1.0	1.0					
8-Nov-13								24.0			1.0	1.0	1.0					
9-Nov-13								20.5	3.5		1.0	1.0	1.0					
10-Nov-13									24.0		1.0	1.0	1.0					
11-Nov-13									24.0		1.0	1.0	1.0					
12-Nov-13									24.0		1.0	1.0	1.0					
13-Nov-13									24.0			1.0	1.0					
14-Nov-13								21.0	24.0			1.0	1.0					
15-Nov-13									3.0			1.0	1.0					

Factor de Servicio (%) 69%

Casa Castilla	8.652.163	1.045.463	59.618.317	77.342.923
Casa Chichamene	0	0	0	0
CR Castilla MD	43.324.850	6.931.848	452.533.250	503.189.948
CR Castilla IC	0	0	0	0
CR Castilla T2	0	0	0	0
CR Chichamene MD	0	0	0	0
CR Chichamene IC	31.965.477	4.954.478	323.729.981	358.649.936
CR Chichamene T2	0	0	0	0
Total	83.943.490	13.931.787	835.881.550	933.182.807

Apiay	43.324.850	6.931.848	452.533.250	503.189.948	53.6%
Casa La Nueva	8.652.163	1.045.463	59.618.317	77.342.923	13.0%
General	31.965.477	4.954.478	323.729.981	358.649.936	33.0%
Total	83.943.490	13.931.787	835.881.550	933.182.807	100.0%

927.330.220

7.258.969.96

GESTOR TECNICO CONTRATO HA-909046 E0100316

REPRESENTANTE DELEGADO CONTRATISTA

490

15-Nov-13


1.0			4.0			27,912,833	223,407	CN 99	PNAC	ON Castilla WO	Acacias	Castilla Norte			24	$3,487,478	$392,196	$18,883,787
1.0			4.0			27,930,960	223,440	CN 99	PNAC	ON Castilla WO	Acacias	Castilla Norte			24	$3,457,840	$392,354	$19,895,808
1.0			4.0			27,930,889	223,440	CN 99	PNAC	ON Castilla WO	Acacias	Castilla Norte			24	$3,497,840	$392,354	$19,895,808
1.0			4.0			27,906,833	223,247	CN 99	PNAC	ON Castilla WO	Acacias	Castilla Norte			24	$3,456,273	$392,846	$19,868,787
			4.0			27,859,080	220,872	CN 99	PNAC	ON Castilla WO	Acacias	Castilla Norte			24	$3,519,400	$387,906	$19,346,903
1.0			4.0			27,890,880	223,046	CN 99	PNAC	ON Castilla WO	Acacias	Castilla Norte			24	$3,440,640	$391,849	$19,843,408
1.0			4.0			27,890,640	223,840	CN 99	PNAC	ON Castilla WO	Acacias	Castilla Norte			24	$3,449,040	$391,848	$19,843,408
1.0			4.0			27,870,000	223,840	CN 99	PNAC	ON Castilla WO	Acacias	Castilla Norte			24	$3,449,040	$391,848	$19,843,408
1.0			4.0			27,882,063	223,047	CN 99	PNAC	ON Castilla WO	Acacias	Castilla Norte			24	$3,483,823	$392,589	$19,851,897
1.0			4.0			27,930,000	223,440	CN 99	PNAC	ON Castilla WO	Acacias	Castilla Norte			24	$3,497,880	$392,894	$19,869,000
1.0			4.0			26,417,280	221,340	CN 99	PNAC	ON Castilla WO	Acacias	Castilla Norte			24	$3,268,746	$917,758	$23,844,108
			4.0			27,639,383	221,117	CN 99	PNAC	ON Castilla WO	Acacias	Castilla Norte			24	$3,472,593	$388,169	$19,418,457
1.0			4.0			27,927,917	223,423	CN 99	PNAC	ON Castilla WO	Acacias	Castilla Norte			24	$3,457,897	$393,239	$19,683,861
1.0			4.0			27,905,999	223,240	CN 99	PNAC	ON Castilla WO	Acacias	Castilla Norte			24	$3,459,640	$392,902	$19,673,804
1.0			4.0			27,949,333	223,607	CN 99	PNAC	ON Castilla WO	Acacias	Castilla Norte			24	$3,459,373	$393,230	$19,689,367
1.0			4.0			27,933,333	223,307	CN 99	PNAC	ON Castilla WO	Acacias	Castilla Norte			24	$3,456,373	$392,938	$19,689,367
1.0			2.0			26,305,999	211,640	CN 99	PNAC	ON Castilla WO	Acacias	Castilla Norte	6		24	$3,332,666	$372,199	$18,304,800
1.0		1.0	2.0			11,538,333	92,667	CN 99	PNAC	ON Castilla WO	Acacias	Castilla Norte			8	$1,817,153	$162,741	$10,633,867
						49,888,333	399,667	C 12	RP86551	Goma Castilla	Castilla La Nueva	Cusiana	35		20	$2,957,333	$634,775	$41,476,667
		1.0	2.0			38,586,750	304,719	C 12	RP86551	Goma Castilla	Castilla La Nueva	Castilla			23	$3,893,810	$838,090	$38,148,660
						80,000,000	938,000	CHSW 41	2013 OCH CHICHIMENE	ON Chichimene IC	Guamal	Chichimene SW	1		1	$3,930,000	$843,300	$10,800,000
			2.0			14,492,750	119,958	CHSW 41	2013 OCH CHICHIMENE	ON Chichimene IC	Guamal	Chichimene SW	12.5		24	$1,238,450	$304,872	$13,334,250
1.0			3.0			25,655,000	203,200	CHSW 41	2013 OCH CHICHIMENE	ON Chichimene IC	Guamal	Chichimene SW	2		24	$3,297,640	$381,332	$23,802,480
1.0			2.0			26,712,333	213,707	CHSW 41	2013 OCH CHICHIMENE	ON Chichimene IC	Guamal	Chichimene SW	1		24	$3,350,773	$376,136	$24,576,167
1.0			2.0			27,788,417	222,133	CHSW 41	2013 OCH CHICHIMENE	ON Chichimene IC	Guamal	Chichimene SW			24	$3,449,387	$388,937	$23,546,183
1.0			3.0			27,786,000	222,240	CHSW 41	2013 OCH CHICHIMENE	ON Chichimene IC	Guamal	Chichimene SW			24	$3,444,660	$387,262	$23,957,600
1.0			3.0			27,765,417	222,123	CHSW 41	2013 OCH CHICHIMENE	ON Chichimene IC	Guamal	Chichimene SW			24	$3,443,357	$386,937	$23,546,183
			3.0			27,469,560	219,100	CHSW 41	2013 OCH CHICHIMENE	ON Chichimene IC	Guamal	Chichimene SW			24	$3,411,200	$383,792	$23,208,000
			3.0			27,469,000	219,200	CHSW 41	2013 OCH CHICHIMENE	ON Chichimene IC	Guamal	Chichimene SW			24	$3,411,200	$383,792	$23,208,000
1.0			3.0			27,880,888	221,440	CHSW 41	2013 OCH CHICHIMENE	ON Chichimene IC	Guamal	Chichimene SW			24	$3,438,640	$386,734	$23,440,800
1.0			2.0			26,388,000	211,040	CHSW 41	2013 OCH CHICHIMENE	ON Chichimene IC	Guamal	Chichimene SW			24	$3,321,440	$373,662	$22,598,800
1.0			3.0			27,750,999	221,800	CHSW 41	2013 OCH CHICHIMENE	ON Chichimene IC	Guamal	Chichimene SW			24	$3,426,360	$373,838	$23,911,000
1.0			2.0			8,117,500	40,848	CHSW 41	2013 OCH CHICHIMENE	ON Chichimene IC	Guamal	Chichimene SW			3	$459,340	$72,884	$4,709,100
							7,358,979											


Lucia Tarazona

LIQUIDACION PARCIAL 18
CONTRATO MA-00009346

- Desde 16-Oct-13 Hasta 15-Nov-13

Torre 53 - 850 NP

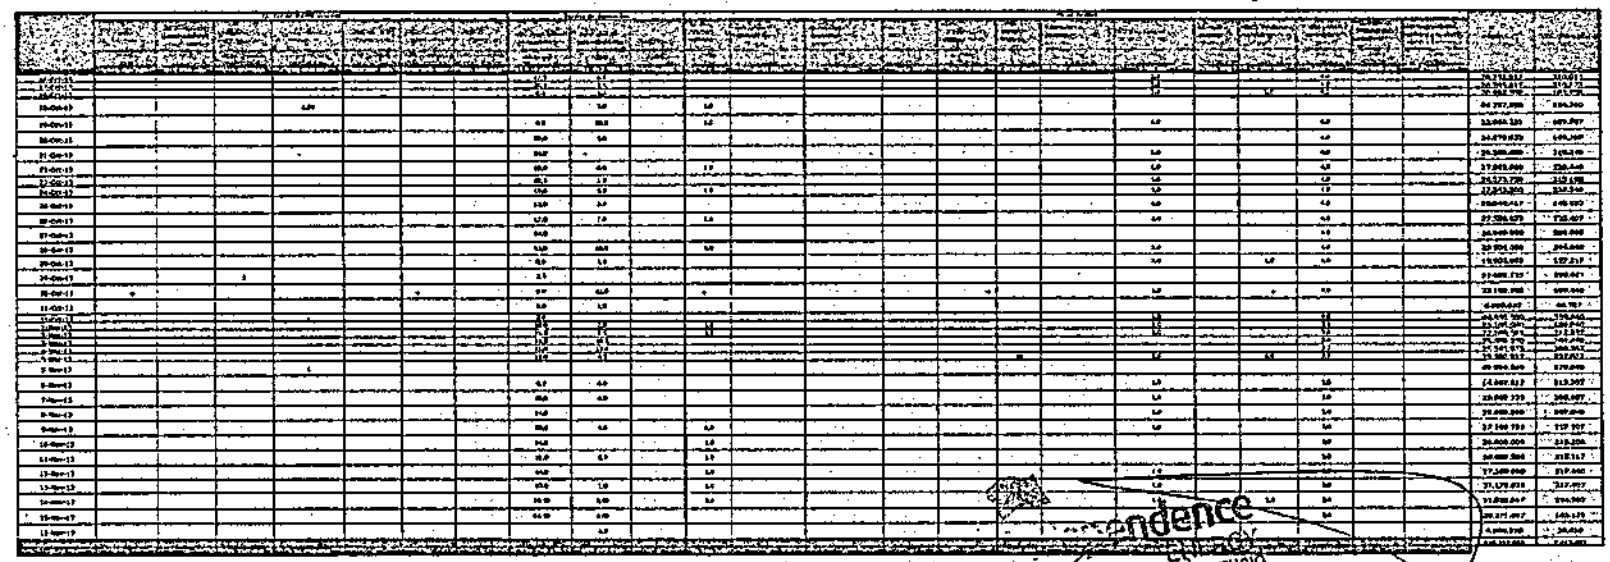



491

ecopetrol	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS Nro 18.2

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA-CHICHIMENE
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013
VALOR PRESENTE ACTA	MIL MILLONES DE PESOS ($ 1.000.000.000) SIN IVA

Mediante la suscripción de la presente Acta:

a) INDEPENDENCE DRILLING S.A., en adelante el CONTRATISTA, representado por FRANCISCO JAVIER VILLABONA TAMAYO, mayor de edad, vecino de la ciudad de BOGOTA, identificado con C.C. Nº 17.419.403 DE ACACIAS, META, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y

b) JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA identificado con Cédula de Ciudadanía número 52.866.785 DE BOGOTA, quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

Dejan constancia de que,

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, prestó los servicios contemplados en el contrato MA-0009346 que se relaciona en la presente acta de recibo de cantidades. El valor del servicio prestado en el periodo es el siguiente:

Cantidades Equipo 550 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	0,00	$ 350.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	2,00	$ 350.000.000	$ 700.000.000
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	0,00	$ 14.075.000	$ 0
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	0,00	$ 33.500.000	$ 0
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	0,00	$ 40.000.000	$ 0
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	0,00	$ 60.000.000	$ 0
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 78.000.000	$ 0
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 90.000.000	$ 0

EDC0316

2.1	Equipo activo con cuadrilla	0,000	$ 24.400.000	$ 0
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	0,000	$ 24.300.000	$ 0
2.3	Stand by	0,000	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	0,00	$ 1.300.000	$ 0
3.2	Campero sin conductor	0,00	$ 250.000	$ 0
3.3	Campero con conductor	0,00	$ 350.000	$ 0
3.4	Tarifa de planta	0,00	$ 450.000	$ 0
3.5	Tarifa de circulación de pozos	0,00	$ 8.500.000	$ 0
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	0,00	$ 160.000	$ 0
3.7	Construcción de anclajes	0,00	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	0,00	$ 280.000	$ 0
3.9	Container adicional	0,00	$ 280.000	$ 0
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	0,00	$ 4.370.000	$ 0
3.11	Frac tank - 500 bbl	0,00	$ 400.000	$ 0
3.12	Tractomula adicional con cama alta	0,00	$ 28.000.000	$ 0
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0,00	$ 250.000	$ 0
	FACTOR DE SERVICIO			$ 0
	TOTAL			**$ 700.000.000**

Cantidades Equipo 350 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	0,00	$ 360.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	1,00	$ 360.000.000	$ 360.000.000
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	0,00	$ 28.000.000	$ 0
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	0,00	$ 30.500.000	$ 0
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	0,00	$ 38.500.000	$ 0
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	0,00	$ 63.500.000	$ 0
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 76.600.000	$ 0
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 84.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	0	$ 23.200.000	$ 0
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	0	$ 23.100.000	$ 0
2.3	Stand by	0	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	0	$ 1.300.000	$ 0
3.2	Campero sin conductor	0	$ 250.000	$ 0
3.3	Campero con conductor	0	$ 350.000	$ 0
3.4	Tarifa de planta	0	$ 450.000	$ 0
3.5	Tarifa de circulación de pozos	0	$ 8.500.000	$ 0
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	0	$ 160.000	$ 0
3.7	Construcción de anclajes	0	$ 1.800.000	$ 0

80100816

ECOPETROL	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

3.8	Obrero de patio adicional	0	$ 280.000	$ 0
3.9	Container adicional	0	$ 280.000	$ 0
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	0	$ 4.370.000	$ 0
3.11	Frac tank - 500 bbl	0	$ 400.000	$ 0
3.12	Tractomula adicional con cama alta	0	$ 28.000.000	$ 0
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0	$ 250.000	$ 0
FACTOR DE SERVICIO				$ 0
TOTAL				**$ 360.000.000**

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el COORDINADOR DE GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO.

En constancia se firma en Villavicencio 22 de Noviembre de 2013, en dos ejemplares de Idéntico tenor literal:

Independence ENERGY VILLAVICENCIO

Por el CONTRATISTA

FRANCISCO JAVIER VILLABONA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.

E-0100316

Por la GESTION TÉCNICA

JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
ECOPETROL S.A.

ecopetrol	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS Nro 18.2

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA-CHICHIMENE
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013
VALOR PRESENTE ACTA	MIL MILLONES DE PESOS ($ 1.000.000.000) SIN IVA

Mediante la suscripción de la presente Acta:

a) INDEPENDENCE DRILLING S.A., en adelante el CONTRATISTA, representado por FRANCISCO JAVIER VILLABONA TAMAYO, mayor de edad, vecino de la ciudad de BOGOTA, Identificado con C.C. Nº 17.419.403 DE ACACIAS, META, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y

b) JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA Identificado con Cédula de Ciudadanía número 52.866.785 DE BOGOTA, quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

Dejan constancia de que,

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, prestó los servicios contemplados en el contrato MA-0009346 que se relaciona en la presente acta de recibo de cantidades. El valor del servicio prestado en el periodo es el siguiente:

Cantidades Equipo 550 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	0,00	$ 350.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	2,00	$ 320.000.000	$ 640.000.000
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	0,00	$ 14.075.000	$ 0
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	0,00	$ 33.500.000	$ 0
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	0,00	$ 40.000.000	$ 0
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	0,00	$ 60.000.000	$ 0
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 78.000.000	$ 0
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 90.000.000	$ 0

20100316

PETROL	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

2.1	Equipo activo con cuadrilla	0,000	$ 24.400.000	$ 0
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	0,000	$ 24.300.000	$ 0
2.3	Stand by	0,000	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	0,00	$ 1.300.000	$ 0
3.2	Campero sin conductor	0,00	$ 250.000	$ 0
3.3	Campero con conductor	0,00	$ 350.000	$ 0
3.4	Tarifa de planta	0,00	$ 450.000	$ 0
3.5	Tarifa de circulación de pozos	0,00	$ 8.500.000	$ 0
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	0,00	$ 160.000	$ 0
3.7	Construcción de anclajes	0,00	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	0,00	$ 280.000	$ 0
3.9	Contalner adicional	0,00	$ 280.000	$ 0
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	0,00	$ 4.370.000	$ 0
3.11	Frac tank - 500 bbl	0,00	$ 400.000	$ 0
3.12	Tractomula adicional con cama alta	0,00	$ 28.000.000	$ 0
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0,00	$ 250.000	$ 0
	FACTOR DE SERVICIO			$ 0
	TOTAL			**$ 640.000.000**

Cantidades Equipo 350 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	0,00	$ 360.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	1,00	$ 360.000.000	$ 360.000.000
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	0,00	$ 28.000.000	$ 0
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	0,00	$ 30.500.000	$ 0
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	0,00	$ 38.500.000	$ 0
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	0,00	$ 63.500.000	$ 0
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 76.600.000	$ 0
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 84.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	0	$ 23.200.000	$ 0
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	0	$ 23.100.000	$ 0
2.3	Stand by	0	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	0	$ 1.300.000	$ 0
3.2	Campero sin conductor	0	$ 250.000	$ 0
3.3	Campero con conductor	0	$ 350.000	$ 0
3.4	Tarifa de planta	0	$ 450.000	$ 0
3.5	Tarifa de circulación de pozos	0	$ 8.500.000	$ 0
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	0	$ 160.000	$ 0
3.7	Construcción de anclajes	0	$ 1.800.000	$ 0

20100316

3.8	Obrero de patio adicional	0	$ 280.000	$ 0
3.9	Container adicional	0	$ 280.000	$ 0
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	0	$ 4.370.000	$ 0
3.11	Frac tank - 500 bbl	0	$ 400.000	$ 0
3.12	Tractomula adicional con cama alta	0	$ 28.000.000	$ 0
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0	$ 250.000	$ 0
	FACTOR DE SERVICIO			$ 0
	TOTAL			**$ 360.000.000**

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el COORDINADOR DE GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO.

En constancia se firma en Villavicencio 22 de Noviembre de 2013, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

Independence ENERGY
DENTE VILLAVICENCIO

E0100316

Por el CONTRATISTA

FRANCISCO JAVIER VILLABONA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Por la GESTION TÉCNICA

JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
ECOPETROL S.A.

494

ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 18.3 - CONTRATO HA-0009346

ECOPETROL

El día 22 de Noviembre de 2013, se reunieron en las oficinas del Departamento de Producción de la Superintendencia de Operaciones Castilla- Chichimene, el Ing. Francisco Villabona en representación de Independence Drilling S.A. y la Ingeniera Johanna Blanco Simbaqueba en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes:

Equipo 550 HP

No	CODIGOS DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VR. UNITARIO	ON CASTILLA RESERVAS	VALOR TOTAL
1		TARIFAS DE MOVILIZACION			9NG POS 25 86 POS 26	
1.1	6035260	Movilización inicial	GLOBAL	$ 322.000.000	0,00	$ -
1.2	6035267	Movilización final	GLOBAL	$ 294.400.000	2,00	$ 588.800.000
1.3	6060187	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 12.949.000	0,00	$ -
1.4	6051292	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 30.820.000	0,00	$ -
1.5	6034202	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$ 36.800.000	0,00	$ -
1.6	6060188	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$ 55.200.000	0,00	$ -
1.7	6060189	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$ 71.760.000	0,00	$ -
1.8	6060190	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$ 82.800.000	0,00	$ -
2		TARIFAS DE OPERACION				
2.1	6035268	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 22.448.000,00		$ -
2.2	6015891	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 22.356.000,00		$ -
2.3	6035270	Stand by	DIA	$ 16.560.000,00		$ -
3		OTRAS TARIFAS				
3.1	6060191	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$ 1.496.000		$ -
3.2	6035274	Campero sin conductor	DIA	$ 230.000		$ -
3.3	6035275	Campero con conductor	DIA	$ 322.000		$ -
3.4	6043268	Tarifa de planta	DIA	$ 414.000		$ -
3.5	6060192	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$ 7.820.000		$ -
3.6	6034206	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$ 147.200		$ -
3.7	6035279	Construcción de anclajes	EA	$ 1.656.000		$ -
3.8	6035280	Obrero de patio adicional	DIA	$ 257.600		$ -
3.9	6035281	Contáiner adicional	DIA	$ 257.600		$ -
3.10	6060193	Aseo, limpieza y localizaciones (con rociería)	EA	$ 4.020.400		$ -
3.11	6035283	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 368.000		$ -
3.12	6060195	Tractomula adicional con cama alta	MES	$ 25.760.000		$ -
3.13	6060196	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$ 230.000		$ -
		SUBTOTAL				$ 588.800.000,00
	6068504	SERVICIO WORKOVER BASE GRAVADA			$ 51.200.000	$ 51.200.000,00
	6074294	FACTOR DE SERVICIO				$ -
						$ 51.200.000,00
		BASE NO GRAVABLE				$ 588.800.000,00
		TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				$ 640.000.000,00
		IVA BASE GRAVABLE				$ 9.192.000,00
		TOTAL EQUIPO DE WO 550HP				$ 646.192.000,00

Equipos 350 HP

No		DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VR. UNITARIO	ON CASTILLA WO	VALOR TOTAL
1					6NG POS 23, 29, 41 89 POS 10, 24, 42	
1.1	6035280	Movilización inicial	GLOBAL	$ 331.200.000	0,00	$ -
1.2	6035267	Movilización final		$ 331.200.000	1,00	$ 331.200.000
1.3	6060187	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 25.760.000	0,00	$ -
1.4	6051292	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 28.060.000	0,00	$ -
1.5	6034202	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$ 35.420.000	0,00	$ -
1.6	6060188	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$ 58.420.000	0,00	$ -
1.7	6060189	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$ 70.472.000	0,00	$ -
1.8	6060190	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$ 82.280.000	0,00	$ -
2		TARIFAS DE OPERACION				
2.1	6035268	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 21.344.000		$ -
2.2	6015891	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 21.252.000		$ -
2.3	6035270	Stand by	DIA	$ 16.560.000		$ -
3		OTRAS TARIFAS				
3.1	6060191	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$ 1.196.000		$ -
3.2	6035274	Campero sin conductor	DIA	$ 230.000		$ -
3.3	6035275	Campero con conductor	DIA	$ 322.000		$ -
3.4	6043268	Tarifa de planta	DIA	$ 414.000		$ -
3.5	6060192	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$ 7.820.000		$ -
3.6	6034206	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$ 147.200		$ -
3.7	6035279	Construcción de anclajes	EA	$ 1.656.000		$ -
3.8	6035280	Obrero de patio adicional	DIA	$ 257.600		$ -
3.9	6035281	Contáiner adicional	DIA	$ 257.600		$ -
3.10	6060193	Aseo, limpieza y localizaciones (con rociería)	EA	$ 4.020.400		$ -
3.11	6035283	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 368.000		$ -
3.12	6060195	Tractomula adicional con cama alta	MES	$ 25.760.000		$ -
3.13	6060196	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$ 230.000		$ -
		SUBTOTAL				$ 331.200.000
	6068504	SERVICIO WORKOVER BASE GRAVADA			$ 28.800.000	$ 28.800.000
	6074294	FACTOR DE SERVICIO				$ -
		TOTAL BASE GRAVABLE				$ 28.800.000
		BASE NO GRAVABLE				$ 331.200.000
		TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				$ 360.000.000
		IVA BASE GRAVABLE				$ 4.608.000
		TOTAL EQUIPO DE WO 350HP				$ 364.608.000

ED100316

Independence ENERGY
LLANOS ORIENTALES

ECOPETROL S.A.
SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA- CHICHIMENE
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 18.2 - CONTRATO MA-0009346

El día 22 de Noviembre de 2013, se reunieron en las oficinas del Departamento de Producción de la Superintendencia de Operaciones Castilla- Chichimene, el Ing. Francisco Villabona en representación de Independence Drilling S.A. y la Ingeniera Johanna Blanco Simbaqueba en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes:

Periodo de liquidación: 18 de octubre de 2013 AL 15 de noviembre de 2013

Equipo 550 HP

No	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	TARIFAS DE MOVILIZACION				
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$ 350.000.000		$ -
1.2	Movilización final		$ 320.000.000	2	$ 640.000.000
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 14.075.000		$ -
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 33.500.000		$ -
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$ 40.000.000		$ -
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$ 60.000.000		$ -
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$ 78.000.000		$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$ 90.000.000		$ -
2	TARIFAS DE OPERACION				
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 24.400.000		$ -
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 24.300.000		$ -
2.3	Stand by	DIA	$ 18.000.000		$ -
3	OTRAS TARIFAS				
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$ 1.300.000		$ -
3.2	Campero sin conductor	DIA	$ 250.000		$ -
3.3	Campero con conductor	DIA	$ 350.000		$ -
3.4	Tarifa de planta	DIA	$ 450.000		$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$ 8.500.000		$ -
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$ 160.000		$ -
3.7	Construcción de anclajes	EA	$ 1.800.000		$ -
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$ 280.000		$ -
3.9	Container adicional	DIA	$ 290.000		$ -
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	EA	$ 4.370.000		$ -
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 400.000		$ -
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$ 28.000.000		$ -
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$ 250.000		$ -
	SUBTOTAL				$ 640.000.000
	BASE GRAVABLE				$ 51.200.000
	FACTOR DE SERVICIO				$ -
	TOTAL BASE GRAVABLE				$ 51.200.000
	BASE NO GRAVABLE				$ 588.800.000
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				$ 640.000.000
	IVA BASE GRAVABLE				$ 8.[redacted]
	TOTAL EQUIPO DE WO 550HP				$ 648.[redacted]

Equipos 350 HP

No	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANT. DÍAS	VALOR TOTAL
1	TARIFAS DE MOVILIZACION				
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$ 360.000.000		$ -
1.2	Movilización final		$ 360.000.000	1,00	$ 360.000.000
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 28.000.000		$ -
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 30.500.000		$ -
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$ 38.500.000		$ -
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$ 63.500.000		$ -
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$ 76.600.000		$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$ 84.000.000		$ -
2	TARIFAS DE OPERACION				
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 23.200.000		$ -
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 23.100.000		$ -
2.3	Stand by	DIA	$ 18.000.000		$ -
3	OTRAS TARIFAS				
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$ 1.300.000		$ -
3.2	Campero sin conductor	DIA	$ 250.000		$ -
3.3	Campero con conductor	DIA	$ 350.000		$ -
3.4	Tarifa de planta	DIA	$ 450.000		$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$ 8.500.000		$ -
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$ 160.000		$ -
3.7	Construcción de anclajes	EA	$ 1.800.000		$ -
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$ 280.000		$ [redacted]
3.9	Container adicional	DIA	$ 290.000		$ -
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	EA	$ 4.370.000		$ -
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 400.000		$ -
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$ 28.000.000		$ -
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$ 250.000		$ -
	SUBTOTAL				$ 360.000.000
	BASE GRAVABLE				$ 28.800.000
	FACTOR DE SERVICIO				$ -
	TOTAL BASE GRAVABLE				$ 28.800.000
	BASE NO GRAVABLE				$ 331.200.000
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				$ 360.000.000
	IVA BASE GRAVABLE				$ 4.[redacted]
	TOTAL EQUIPO DE WO				$ 364.[redacted]

Dist. por Area	ACA	PORCENTAJE
Acacias	605.590.836	61%
Castilla La Nueva	356.125.394	36%
Guamal	39.283.770	4%
Total	1.000.000.000	100%

En constancia de lo anterior firmamos los representantes de las partes:

FRANCISCO VILLABONA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
REPRESENTANTE DELEGADO

JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
ECOPETROL
GESTOR TECNICO

E0100316

RODRIGO J HERNANDEZ R
ECOPETROL
ADMINISTRADOR

495

ecopetrol	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS Nro 19

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA-CHICHIMENE
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013
VALOR PRESENTE ACTA	SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS (6.551.388.043,20) SIN IVA

Mediante la suscripción de la presente Acta:

a) INDEPENDENCE DRILLING S.A., en adelante el CONTRATISTA, representado por FRANCISCO JAVIER VILLABONA TAMAYO, mayor de edad, vecino de la ciudad de BOGOTA, identificado con C.C. Nº 17.419.403 DE ACACIAS, META, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y

b) JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA identificado con Cédula de Ciudadanía número 52.866.785 DE BOGOTA, quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

Dejan constancia de que,

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013, prestó los servicios contemplados en el contrato MA-0009346 que se relaciona en la presente acta de recibo de cantidades. El valor del servicio prestado en el periodo es el siguiente:

Cantidades Equipo 550 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	0,00	$ 350.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	2,00	$ 320.000.000	$ 640.000.000
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	0,00	$ 14.075.000	$ 0
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	7,00	$ 33.500.000	$ 234.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	4,00	$ 40.000.000	$ 160.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	0,00	$ 60.000.000	$ 0
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 78.000.000	$ 0

E0100316

1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 90.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	105,018	$ 24.400.000	$ 2.562.439.200
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	33,852	$ 24.300.000	$ 822.603.600
2.3	Stand by	0,000	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	119,00	$ 1.300.000	$ 154.700.000
3.2	Campero sin conductor	137,50	$ 250.000	$ 34.375.000
3.3	Campero con conductor	86,00	$ 350.000	$ 30.100.000
3.4	Tarifa de planta	0,00	$ 450.000	$ 0
3.5	Tarifa de circulación de pozos	10,00	$ 8.500.000	$ 85.000.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	40,00	$ 160.000	$ 6.400.000
3.7	Construcción de anclajes	0,00	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	109,00	$ 280.000	$ 30.520.000
3.9	Container adicional	30,00	$ 280.000	$ 8.400.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	13,00	$ 4.370.000	$ 56.810.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	390,00	$ 400.000	$ 156.000.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	3,00	$ 28.000.000	$ 84.000.000
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0,00	$ 250.000	$ 0
	FACTOR DE SERVICIO			$ 40.526.782
	TOTAL			**$ 5.106.374.582**

Cantidades Equipo 350 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	0,00	$ 360.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	0,00	$ 360.000.000	$ 0
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	0,00	$ 28.000.000	$ 0
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	4,00	$ 30.500.000	$ 122.000.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	3,00	$ 38.500.000	$ 115.500.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	0,00	$ 63.500.000	$ 0
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 76.600.000	$ 0
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 84.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	36,293	$ 23.200.000	$ 841.997.600
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	9,376	$ 23.100.000	$ 216.585.600
2.3	Stand by	0	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	16	$ 1.300.000	$ 20.800.000
3.2	Campero sin conductor	50	$ 250.000	$ 12.500.000
3.3	Campero con conductor	0	$ 350.000	$ 0
3.4	Tarifa de planta	0	$ 450.000	$ 0
3.5	Tarifa de circulación de pozos	0	$ 8.500.000	$ 0

ecopetrol	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

3.6	Cartucho de unidad de filtrado	44	$ 160.000	$ 7.040.000
3.7	Construcción de anclajes	0	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	42	$ 280.000	$ 11.760.000
3.9	Container adicional	0	$ 280.000	$ 0
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	8	$ 4.370.000	$ 34.960.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	126	$ 400.000	$ 50.400.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	0	$ 28.000.000	$ 0
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0	$ 250.000	$ 0
FACTOR DE SERVICIO				$ 11.468.361
TOTAL				**$ 1.445.013.461**

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el COORDINADOR DE GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO.

En constancia, se firma en Villavicencio 20 de Diciembre de 2013, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

Por el CONTRATISTA

FRANCISCO JAVIER VILLABONA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Por la GESTION TÉCNICA

JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
ECOPETROL S.A.

ECOPETROL S.A.
SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA- CHICHIMENE
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 19 - CONTRATO NA-0009346

El día 20 de Diciembre de 2013, se reunieron en las oficinas del Departamento de Producción de la Superintendencia de Operaciones Castilla- Chichimene, el Ing. Francisco Villabona en representación de Independence Drilling S.A. y la Ingeniera Johanna Blanco Simbaqueba en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes:

Periodo de liquidación: 16 de noviembre de 2013 AL 15 de diciembre de 2013

Equipo 550 HP

No.	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	TARIFAS DE MOVILIZACIÓN				
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$ 350.000.000	0	$ -
1.2	Movilización final	GLOBAL	$ 320.000.000	2	$ 640.000.000
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 14.075.000	0	$ -
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 33.500.000	7	$ 234.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$ 40.000.000	4	$ 160.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$ 60.000.000	0	$ -
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$ 78.000.000	0	$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$ 90.000.000	0	$ -
2	TARIFAS DE OPERACIÓN				
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 24.400.000	105,018	$ 2.562.439.200
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 24.300.000	33,852	$ 822.603.600
2.3	Stand by	DIA	$ 18.000.000	0,000	$ -
3	OTRAS TARIFAS				
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$ 1.300.000	119	$ 154.700.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$ 250.000	137,5	$ 34.375.000
3.3	Campero con conductor	DIA	$ 350.000	86	$ 30.100.000
3.4	Tarifa de planta	DIA	$ 450.000	0	$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$ 8.500.000	10	$ 85.0
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$ 160.000	40	$ 6.4
3.7	Construcción de anclajes	EA	$ 1.800.000	0	$ -
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$ 280.000	109	$ 30.520.000
3.9	Container adicional	DIA	$ 280.000	30	$ 8.400.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	EA	$ 4.370.000	13	$ 56.810.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 400.000	390	$ 156.000.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$ 28.000.000	3	$ 84.000.000
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$ 250.000	0	$ -
	SUBTOTAL				$ 5.043.847.800
	BASE GRAVABLE				$ 405.267.824
	FACTOR DE SERVICIO			10%	$ 40.526.782
	TOTAL BASE GRAVABLE				$ 445.794.606
	BASE NO GRAVABLE				$ 4.660.579.976
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				$ 5.106.374.
	IVA BASE GRAVABLE				$ 71.32
	TOTAL EQUIPO DE WO 550HP				$ 5.177.70

Equipos 350 HP

No.	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	TARIFAS DE MOVILIZACION				
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$ 360.000.000	0,00	$ -
1.2	Movilización final	GLOBAL	$ 360.000.000	0,00	$ -
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 28.000.000	0,00	$ -
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 30.500.000	4,00	$ 122.000.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$ 38.500.000	3,00	$ 115.500.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$ 63.500.000	0,00	$ -
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$ 76.600.000	0,00	$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$ 84.000.000	0,00	$ -
2	TARIFAS DE OPERACIÓN				
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 23.200.000	36,293	$ 841.997.600
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 23.100.000	9,376	$ 216.585.600
2.3	Stand by	DIA	$ 18.000.000	0,000	$ -
3	OTRAS TARIFAS				
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$ 1.300.000	16,00	$ 20.800.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$ 250.000	50,00	$ 12.500.000
3.3	Campero con conductor	DIA	$ 350.000	0,00	$ -
3.4	Tarifa de planta	DIA	$ 450.000	0,00	$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$ 8.500.000	0,00	$ -
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$ 160.000	44,00	$ 7.0
3.7	Construcción de anclajes	EA	$ 1.800.000	0,00	$ -
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$ 280.000	42,00	$ 11.7
3.9	Container adicional	DIA	$ 280.000	0,00	$ -
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	EA	$ 4.370.000	8,00	$ 34.960.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 400.000	126,00	$ 50.400.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$ 28.000.000	0,00	$ -
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$ 250.000	0,00	$ -
	SUBTOTAL				$ 1.433.545.300
	BASE GRAVABLE				$ 114.683.608
	FACTOR DE SERVICIO			10%	$ 11.468.361
	TOTAL BASE GRAVABLE				$ 126.181.969
	BASE NO GRAVABLE				$ 1.318.861.492
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				$ 1.445.013.461
	IVA BASE GRAVABLE				$ 20.18
	TOTAL EQUIPO DE WO				$ 1.465.19

Dist. Por Area	VTA	PORCENTAJE
Acacias	$ 3.967.460.540	61%
Castilla La Nueva	$ 2.333.115.643	36%
Guamal	$ 250.811.630	4%
Total	$ 6.551.389.028	100%

En constancia de lo anterior firman los representantes de las partes:

FRANCISCO VILLABONA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
REPRESENTANTE DELEGADO

LUIS JOSE ALMEIDA
ECOPETROL
ADMINISTRADOR

EO100316

JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
ECOPETROL
GESTOR TECNICO

ecopetrol	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS Nro 19.1

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346- ASOC MA-0026724
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMIŃACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA-CHICHIMENE
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013
VALOR PRESENTE ACTA	DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 271.815.181,34) SIN IVA

Mediante la suscripción de la presente Acta:

a) INDEPENDENCE DRILLING S.A., en adelante el CONTRATISTA, representado por FRANCISCO JAVIER VILLABONA TAMAYO, mayor de edad, vecino de la ciudad de BOGOTA, identificado con C.C. Nº 17.419.403 DE ACACIAS, META, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y

b) JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA identificado con Cédula de Ciudadanía número 52.866.785 DE BOGOTA, quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

Dejan constancia de que,

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013, prestó los servicios contemplados en el contrato MA-0009346 que se relaciona en la presente acta de recibo de cantidades. El valor del servicio prestado en el periodo es el siguiente:

Cantidades Equipo 550 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	0,00	$ 350.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	0,00	$ 320.000.000	$ 0
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	0,00	$ 14.075.000	$ 0
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	0,00	$ 33.500.000	$ 0
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	0,00	$ 40.000.000	$ 0
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	0,00	$ 60.000.000	$ 0
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 78.000.000	$ 0

EO1003316

1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 90.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	0,000	$ 24.400.000	$ 0
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	0,000	$ 24.300.000	$ 0
2.3	Stand by	0,000	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	0,00	$ 1.300.000	$ 0
3.2	Campero sin conductor	0,00	$ 250.000	$ 0
3.3	Campero con conductor	0,00	$ 350.000	$ 0
3.4	Tarifa de planta	0,00	$ 450.000	$ 0
3.5	Tarifa de circulación de pozos	0,00	$ 8.500.000	$ 0
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	0,00	$ 160.000	$ 0
3.7	Construcción de anclajes	0,00	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	0,00	$ 280.000	$ 0
3.9	Container adicional	0,00	$ 280.000	$ 0
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	0,00	$ 4.370.000	$ 0
3.11	Frac tank - 500 bbl	0,00	$ 400.000	$ 0
3.12	Tractomula adicional con cama alta	0,00	$ 28.000.000	$ 0
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0,00	$ 250.000	$ 0
	FACTOR DE SERVICIO			$ 0
	TOTAL			**$ 0**

Cantidades Equipo 350 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	0,00	$ 360.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	0,00	$ 360.000.000	$ 0
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	0,00	$ 28.000.000	$ 0
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	0,00	$ 30.500.000	$ 0
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	1,00	$ 38.500.000	$ 38.500.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	0,00	$ 63.500.000	$ 0
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 76.600.000	$ 0
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 84.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	8,542	$ 23.200.000	$ 198.174.400
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	0,687	$ 23.100.000	$ 15.869.700
2.3	Stand by	0	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	0	$ 1.300.000	$ 0
3.2	Campero sin conductor	14	$ 250.000	$ 3.500.000
3.3	Campero con conductor	4	$ 350.000	$ 1.400.000
3.4	Tarifa de planta	0	$ 450.000	$ 0
3.5	Tarifa de circulación de pozos	0	$ 8.500.000	$ 0

Lectura
EO1000316

ECOPETROL	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

3.6	Cartucho de unidad de filtrado	0	$ 160.000	$ 0
3.7	Construcción de anclajes	0	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	8	$ 280.000	$ 2.240.000
3.9	Container adicional	0	$ 280.000	$ 0
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	1	$ 4.370.000	$ 4.370.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	14	$ 400.000	$ 5.600.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	0	$ 28.000.000	$ 0
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0	$ 250.000	$ 0
FACTOR DE SERVICIO				$ 2.157.263
TOTAL				**$ 271.815.181,34**

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el COORDINADOR DE GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO.

En constancia, se firma ~~en Villavicencio~~ 20 de Diciembre de 1013, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

Por el CONTRATISTA

FRANCISCO JAVIER VILLABONA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.

E0100316

Por la GESTION TÉCNICA

JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
ECOPETROL S.A.

ECOPETROL S.A.
SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA- CHICHIMENE
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 19.1- CONTRATO MA-0009346

El día 20 de Diciembre de 2013, se reunieron en las oficinas del Departamento de Producción de la Superintendencia de Operaciones Castilla- Chichimene, el Ing. Francisco Villabona en representación de Independence Drilling S.A. y la Ingeniera Johanna Blanco Simbaqueba en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes:

Periodo de liquidación: 16 de noviembre de 2013 AL 15 de diciembre de 2013

Equipo 350 HP

No	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	TARIFAS DE MOVILIZACION				
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$ 350.000.000		$ -
1.2	Movilización final		$ 320.000.000		$ -
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 14.075.000		$ -
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 33.500.000		$ -
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$ 40.000.000		$ -
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$ 60.000.000		$ -
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$ 78.000.000		$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$ 90.000.000		$ -
2	TARIFAS DE OPERACION				
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 24.400.000		$ -
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 24.300.000		$ -
2.3	Stand by	DIA	$ 18.000.000		$ -
3	OTRAS TARIFAS				
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$ 1.300.000		$ -
3.2	Campero sin conductor	DIA	$ 250.000		$ -
3.3	Campero con conductor	DIA	$ 350.000		$ -
3.4	Tarifa de planta	DIA	$ 450.000		$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$ 8.500.000		$ -
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$ 160.000		$ -
3.7	Construcción de anclajes	EA	$ 1.800.000		$ [redacted]
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$ 280.000		$ -
3.9	Container adicional	DIA	$ 280.000		$ -
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con roceria)	EA	$ 4.370.000		$ -
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 400.000		$ -
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$ 28.000.000		$ -
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$ 250.000		$ -
	SUBTOTAL				$ -
	BASE GRAVABLE				$ -
	FACTOR DE SERVICIO				$ -
	TOTAL BASE GRAVABLE				$ -
	BASE NO GRAVABLE				$ -
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				$ [redacted]
	IVA BASE GRAVABLE				$ -
	TOTAL EQUIPO DE WO 350HP				$ -

Equipos 350 HP

No	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	TARIFAS DE MOVILIZACION				
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$ 360.000.000		$ -
1.2	Movilización final		$ 360.000.000		$ -
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 28.000.000		$ -
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 30.500.000		$ -
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$ 38.500.000	1	$ 38.500.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$ 63.500.000		$ -
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$ 76.600.000		$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$ 84.000.000		$ -
2	TARIFAS DE OPERACION				
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 23.200.000	8,542	$ 198.174.400
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 23.100.000	0,687	$ 15.869.700
2.3	Stand by	DIA	$ 18.000.000		$ -
3	OTRAS TARIFAS				
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$ 1.300.000		$ -
3.2	Campero sin conductor	DIA	$ 250.000	14	$ 3.500.000
3.3	Campero con conductor	DIA	$ 350.000	4	$ 1.400.000
3.4	Tarifa de planta	DIA	$ 450.000		$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$ 8.500.000		$ -
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$ 160.000		$ [redacted]
3.7	Construcción de anclajes	EA	$ 1.800.000		$ -
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$ 280.000	8	$ 2.24
3.9	Container adicional	DIA	$ 280.000		$ -
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con roceria)	EA	$ 4.370.000	1	$ 4.370.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 400.000	14	$ 5.600.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$ 28.000.000		$ -
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$ 250.000		$ -
	SUBTOTAL				$ 269.657.017
	BASE GRAVABLE				$ 21.572.433
	FACTOR DE SERVICIO			10%	$ 2.157.263
	TOTAL BASE GRAVABLE				$ 23.729.697
	BASE NO GRAVABLE				$ 248.085.284
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				$ 271.815.181
	IVA BASE GRAVABLE				$ 3.796 [redacted]
	TOTAL EQUIPO DE WO				$ 275.611

Dist. Periódica	IVA	PORCENTAJE
Acacias	$ 164.608.783	61%
Castilla La Nueva	$ 96.800.288	36%
Guamal	$ 10.406.110	4%
Total	$ 271.815.181	100%

En constancia de lo anterior firman los representantes de las partes:

FRANCISCO VILLABONA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
REPRESENTANTE DELEGADO

JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
ECOPETROL
GESTOR TECNICO

E01000316

LUIS JOSE ALMEIDA PINZON
ECOPETROL
ADMINISTRADOR

499

ECOPETROL

SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA-CHICHIMENE

Castilla La Nueva, 22 de Noviembre de 2012

Doctora
LAURA JULIANA NIÑO FLOREZ
Gestora Administrativa
COPCO S.A.
Castilla La Nueva

Asunto: Entrega Pago Parcial No 5 Contrato MA-0009346

Estimada Laura, por medio de la presente hago entrega de los soportes correspondientes al pago parcial No 5 del contrato MA-0009346, cuyo Objeto es: "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."; suscrito con la Empresa INDEPENDENCE DRILLING S.A.

En consecuencia, relaciono los soportes:

- Acta de Gestoría Técnica ECP-U-A-F-015
- Acta de cantidades parcial No 5
- Informe de Gestoría técnica

Atentamente,

Rodrigo J Hernandez Ropain.
Gestor Técnico Contrato MA-0009346

Anexos: Documentos relacionados

Superintendencia de Operaciones Castilla Chichimene
Castilla La Nueva Via a Cacayal - Meta
Teléfonos: (098) 66163 81 Fax: (098) 675 01 15

4 grupo de

ECOPETROL	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		
	ECP-UAB-F-015	Elaborado 13/08/2011	Versión: 2

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS Nro 5

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA-CHICHIMENE
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012
VALOR PRESENTE ACTA	SEIS QUINIENTOS CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MOL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 6.504.068.189) SIN IVA

Mediante la suscripción de la presente Acta:

a) INDEPENDENCE DRILLING S.A., en adelante el CONTRATISTA, representado por JOSE HUBER SILVA ROJAS, mayor de edad, vecino de la ciudad de BOGOTA, identificado con C.C. Nº 18.109.052 DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y

b) RODRIGO J HERNANDEZ R identificado con Cédula de Ciudadanía número 79.521.811 DE BOGOTA, quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

Dejan constancia de que,

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012, prestó los servicios contemplados en el contrato MA-0009346 que se relaciona en la presente acta de recibo de cantidades. El valor del servicio prestado en el periodo es el siguiente:

Cantidades Equipo 550 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	0,00	$ 350.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	0,00	$ 350.000.000	$ 0
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	1,00	$ 14.075.000	$ 14.075.000
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	4,00	$ 33.500.000	$ 134.000.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	8,00	$ 40.000.000	$ 320.000.000

PETROL	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		
	ECP-UAB-F-015	Elaborado 13/08/2011	Versión: 2

1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	2,00	$ 60.000.000	$ 120.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	2,00	$ 78.000.000	$ 156.000.000
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 90.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	129,48	$ 24.400.000	$ 3.159.312.000
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	41,418	$ 24.300.000	$ 1.006.457.400
2.3	Stand by	0	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	80,00	$ 1.300.000	$ 104.000.000
3.2	Campero sin conductor	36,00	$ 250.000	$ 9.000.000
3.3	Campero con conductor	63,00	$ 350.000	$ 22.050.000
3.4	Tarifa de planta	23,00	$ 450.000	$ 10.350.000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	13,00	$ 8.500.000	$ 110.500.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	0,00	$ 160.000	$ 0
3.7	Construcción de anclajes	0,00	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	137,00	$ 280.000	$ 38.360.000
3.9	Container adicional	0,00	$ 280.000	$ 0
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	14,00	$ 4.370.000	$ 61.180.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	72,00	$ 400.000	$ 28.800.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	1,00	$ 28.000.000	$ 28.000.000
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0,00	$ 250.000	$ 0
TOTAL				**$ 5.322.084.400**

Cantidades Equipo 350 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	0,00	$ 360.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	0,00	$ 360.000.000	$ 0
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	2,00	$ 28.000.000	$ 56.000.000
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	1,00	$ 30.500.000	$ 30.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	4,00	$ 38.500.000	$ 154.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	0,00	$ 63.500.000	$ 0
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 76.600.000	$ 0

1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 84.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	26,459	$ 23.200.000	$ 613.848.800
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	4,834	$ 23.100.000	$ 111.665.400
2.3	Stand by	0	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	13	$ 1.300.000	$ 16.900.000
3.2	Campero sin conductor	0	$ 250.000	$ 0
3.3	Campero con conductor	0	$ 350.000	$ 0
3.4	Tarifa de planta	10	$ 450.000	$ 4.500.000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	0	$ 8.500.000	$ 0
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	0	$ 160.000	$ 0
3.7	Construcción de anclajes	0	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	29	$ 280.000	$ 8.120.000
3.9	Container adicional	108	$ 280.000	$ 30.240.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	7	$ 4.370.000	$ 30.590.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	185	$ 400.000	$ 74.000.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	0	$ 28.000.000	$ 0
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0	$ 250.000	$ 0
TOTAL				**$ 1.130.364.200**

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el COORDINADOR DE GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO.

En constancia, se firma en Villavicencio 22 de Noviembre de 2012, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

Independence ENERGY
SUPERINTENDENTE

Por el CONTRATISTA

JOSE HUBER SILVA ROJAS
INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Por la GESTION TÉCNICA


RODRIGO J HERNANDEZ R ECOPETROL S.A.


5D1


LIQUIDACION PARCIAL 5
CONTRATO MA-0009346


Desde 16-Oct-12 Hasta 20-Nov-12

Torre 123- 850 HP

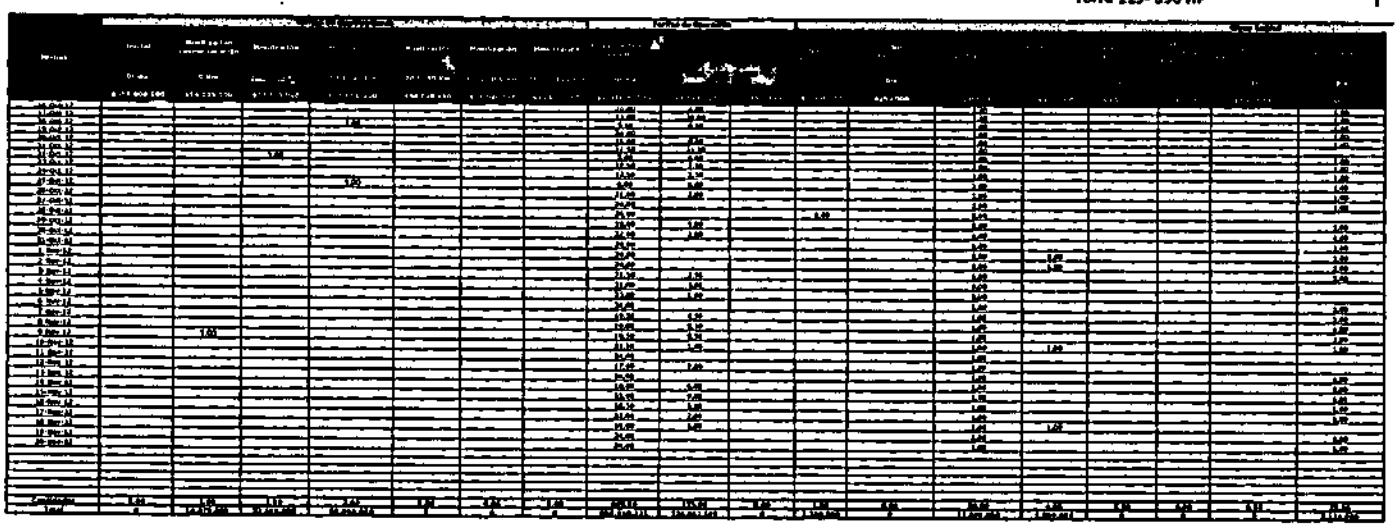



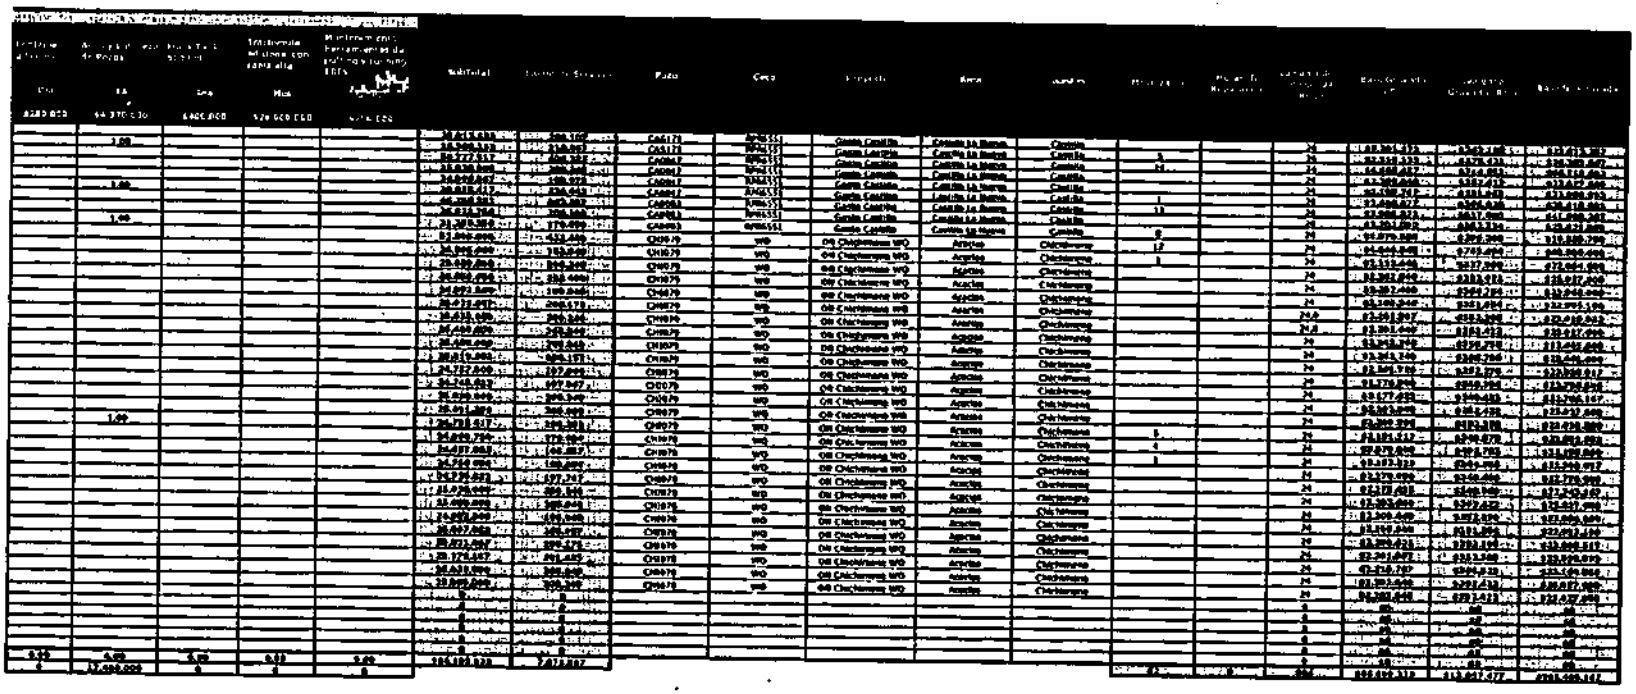


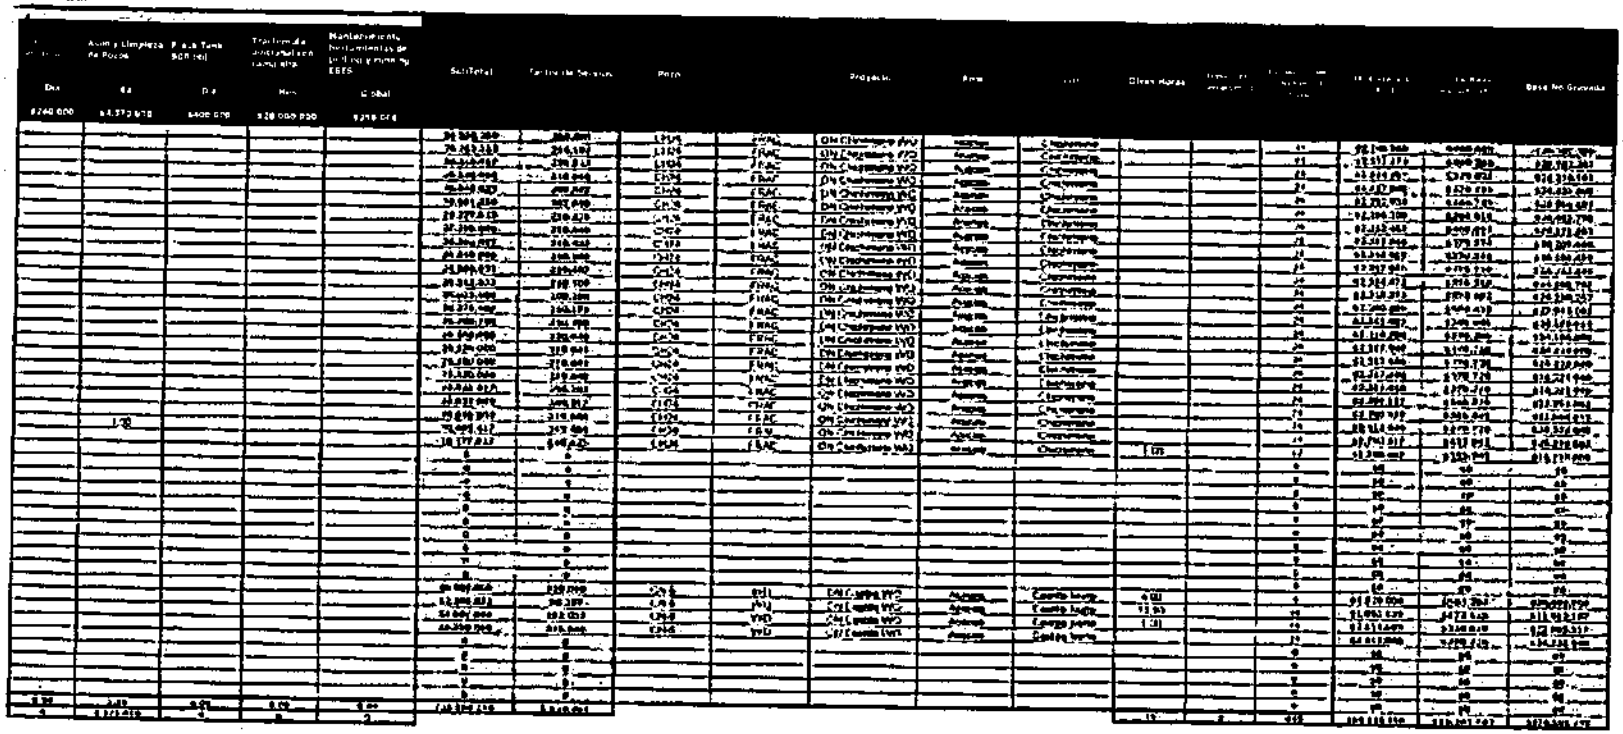


LIQUIDACION PARCIAL 5
CONTRATO MA-0009146


Desde 16-Oct-12 Hasta 20-Nov-12

Torre 42 - 550 HP

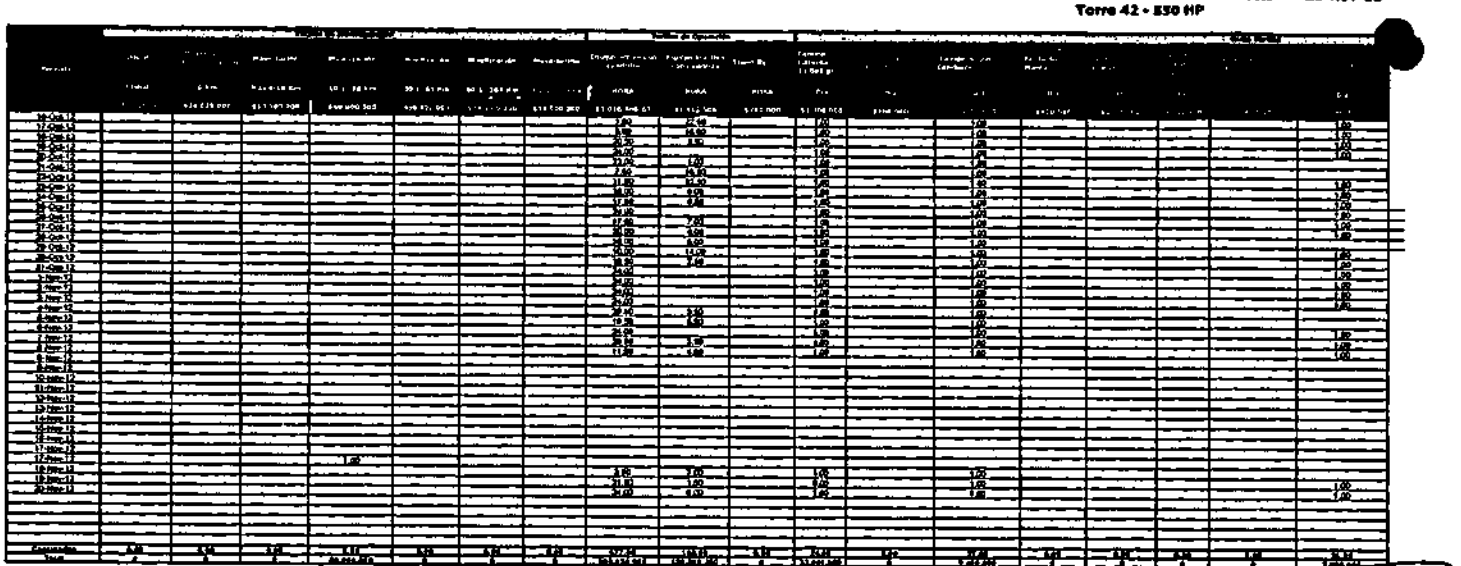






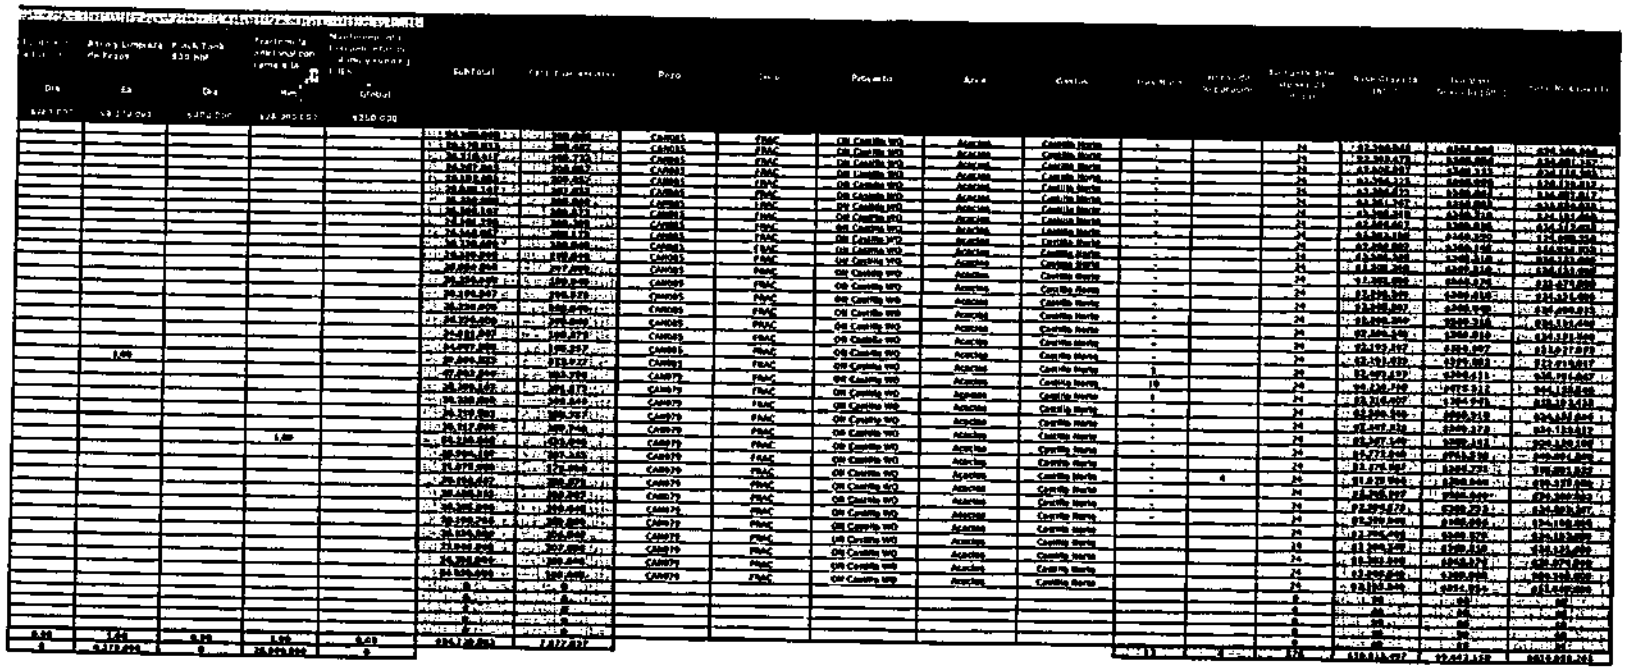


LIQUIDACION PARCIAL 5
CONTRATO MA-0009346


Desde #¡REF! Hasta 20-Nov-12

Torre 34 - 850 HP

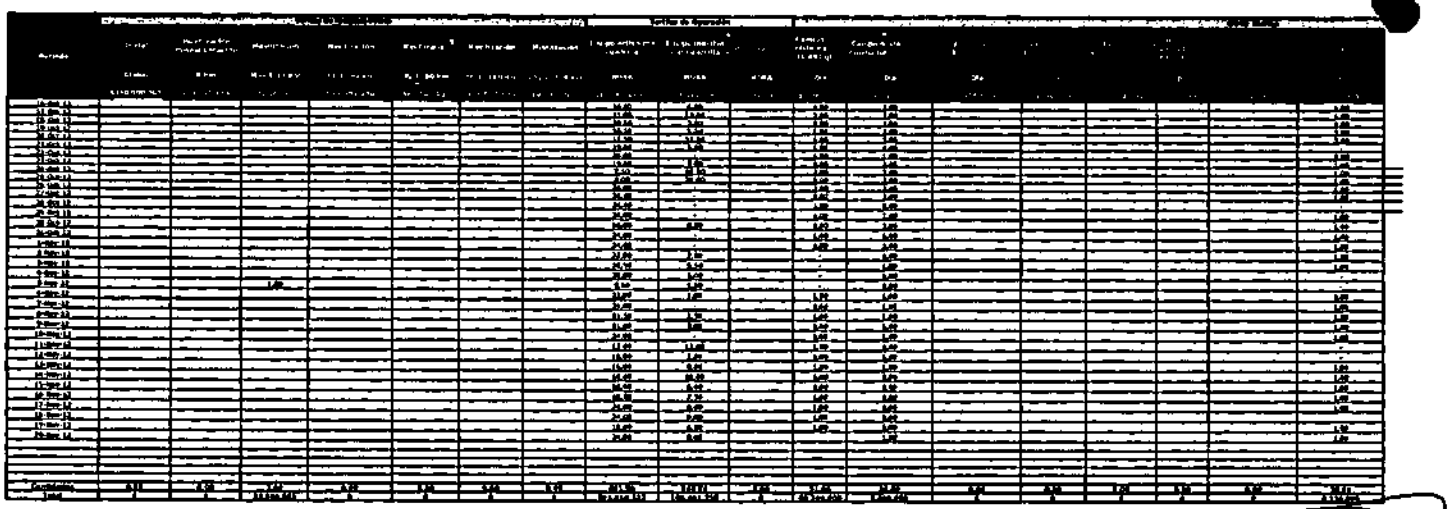






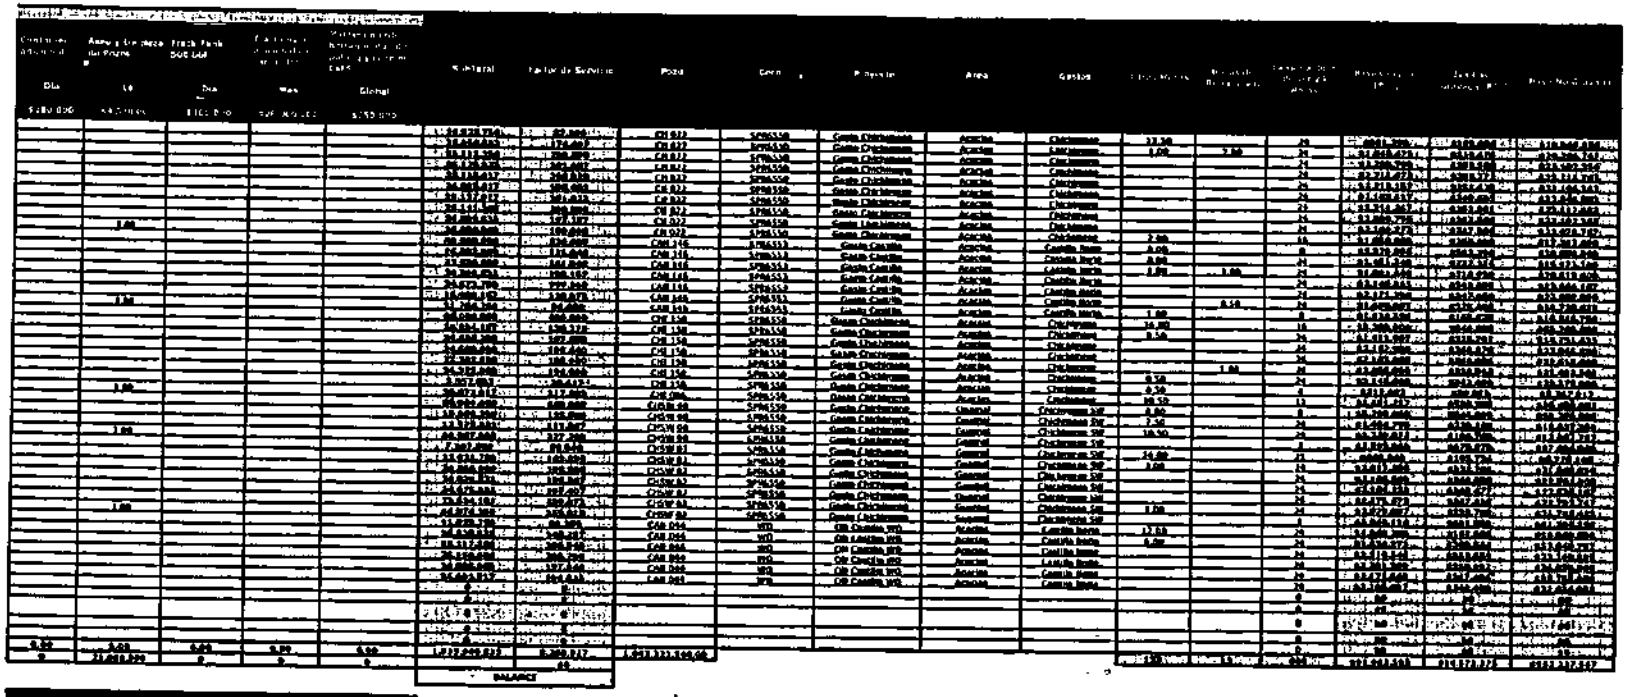

LIQUIDACION PARCIAL 8
CONTRATO HA-0009345

Desde 16-Oct-12 Hasta 20-Nov-12


Torre 32 - 550 HP

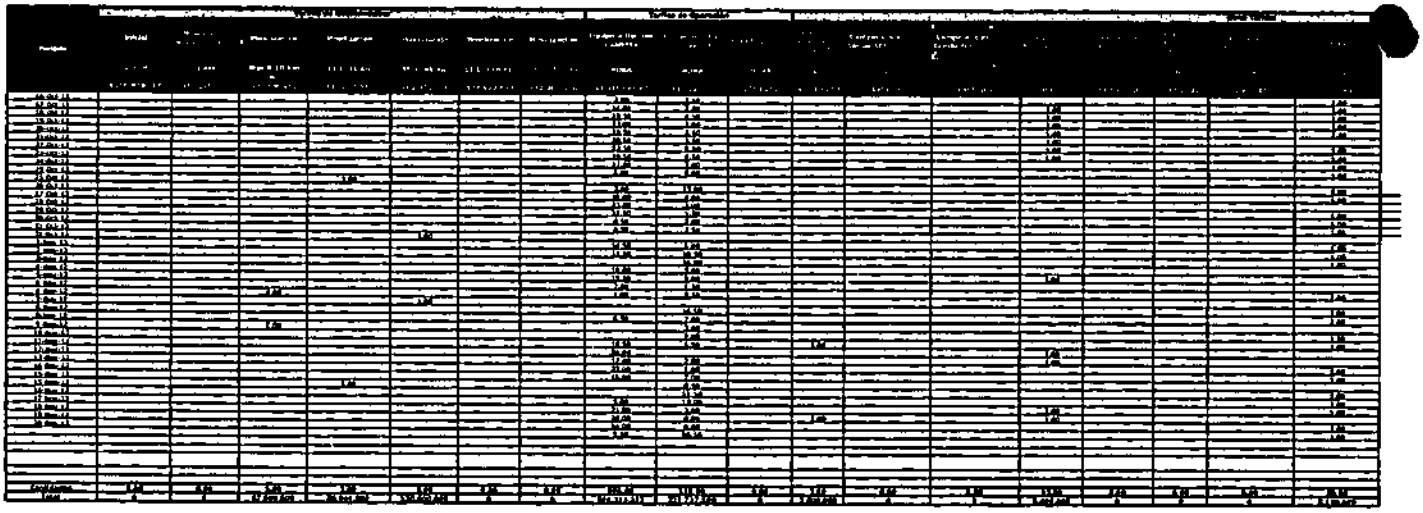











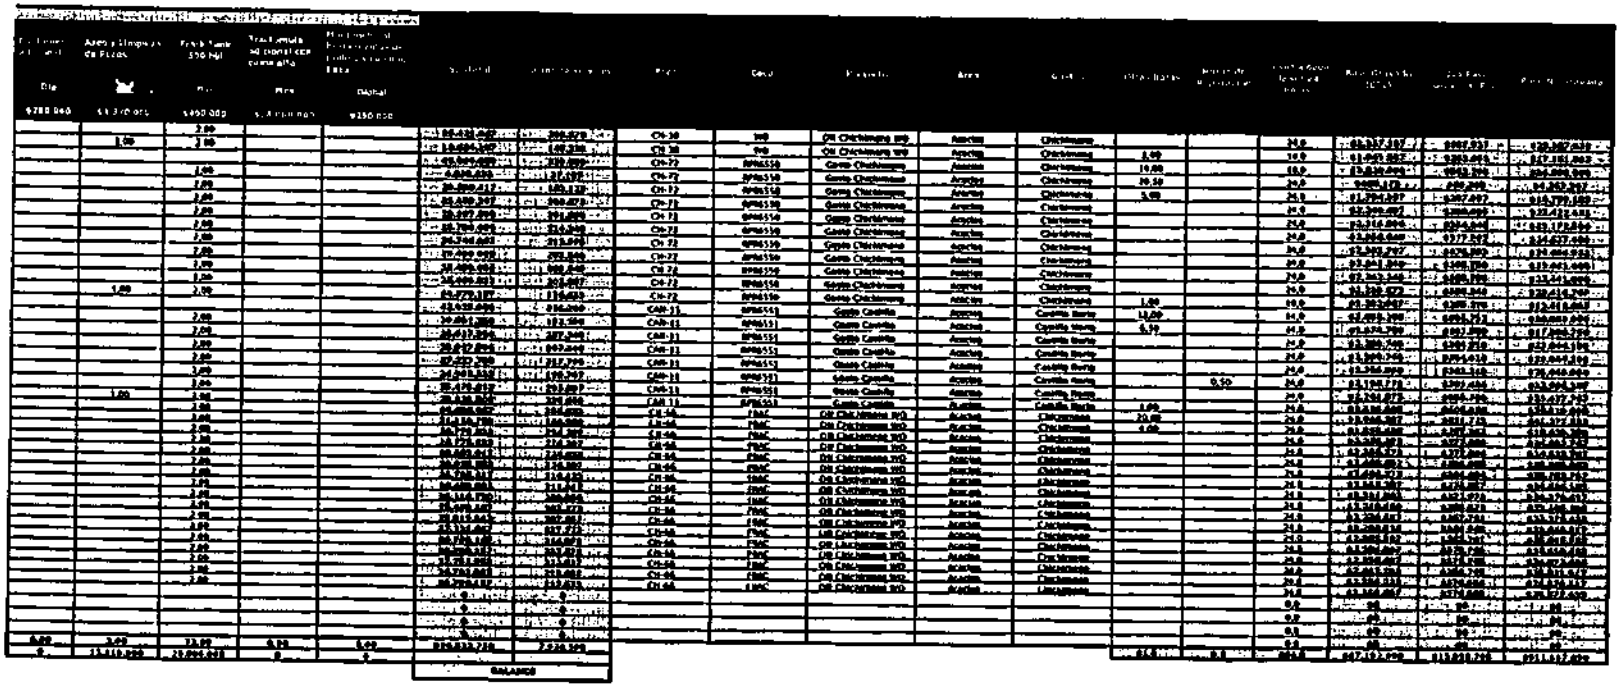

LIQUIDACION PARCIAL 5
CONTRATO MA-0009346


Desde 16-Oct-12 Hasta 20-Nov-12

Torre 31 - 550 HP

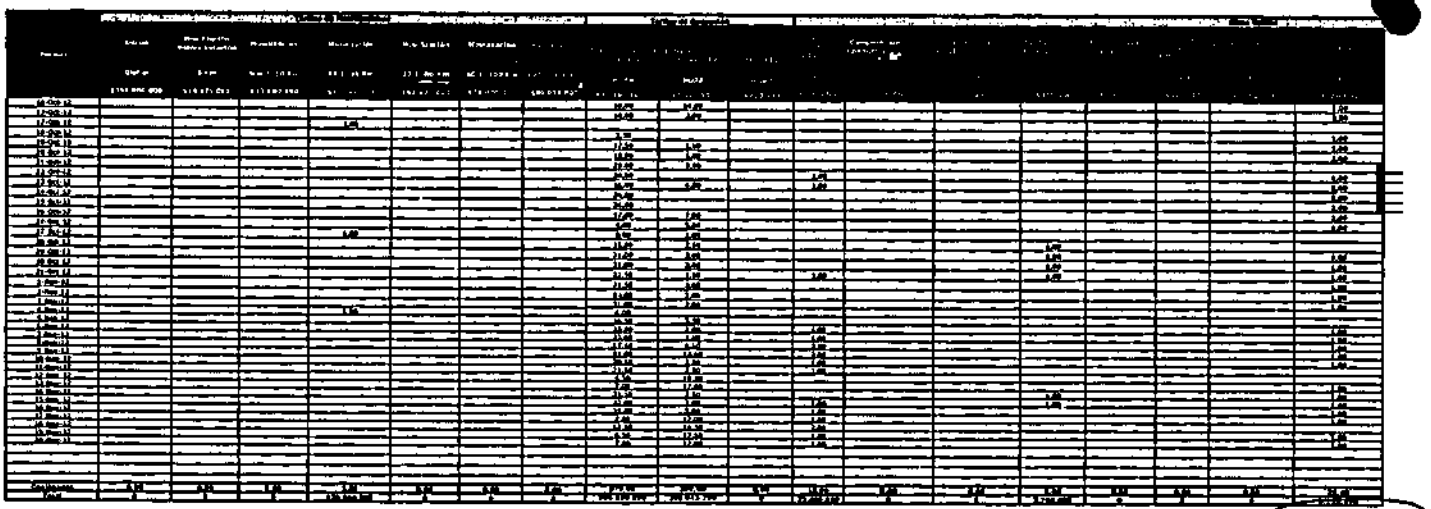





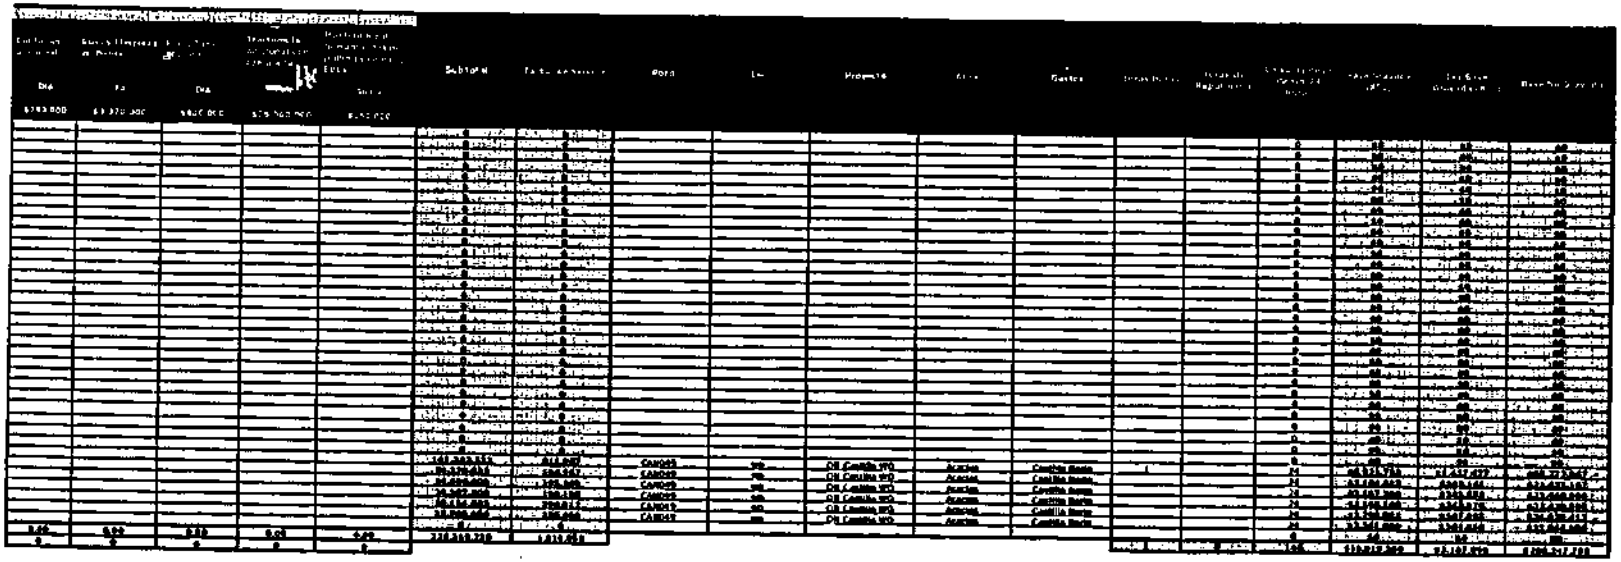

LIQUIDACION PARCIAL 5
CONTRATO MA-0009346

Desde **16-Oct-12** **Hasta** **20-Nov-12**

Torre 28 - 550 HP

Periodo	Jornal		Movilización	Movilización			Horas de Operación			Otros Montos							
	Dólar			30.1 - 60 Km			HORA	HORA	HORA	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	
	$ 1.800,00	$ 834.375,00	$ 1.500,00	$ 45.000,00	$ 90.000,00	$ 28.000,00	$ 2.000,00	$ 1.312,50	$ 750,00	$ 1.200,00	$ 625,00	$ 1.000,00	$ 1.000,00	$ 500,00	$ 1.000,00	$ 1.000,00	$ 1.000,00
16-Oct-12																	
17-Oct-12																	
18-Oct-12																	
19-Oct-12																	
20-Oct-12																	
21-Oct-12																	
22-Oct-12																	
23-Oct-12																	
24-Oct-12																	
25-Oct-12																	
26-Oct-12																	
27-Oct-12																	
28-Oct-12																	
29-Oct-12																	
30-Oct-12																	
31-Oct-12																	
1-Nov-12																	
2-Nov-12																	
3-Nov-12																	
4-Nov-12																	
5-Nov-12																	
6-Nov-12																	
7-Nov-12																	
8-Nov-12																	
9-Nov-12																	
10-Nov-12																	
11-Nov-12																	
12-Nov-12																	
13-Nov-12																	
14-Nov-12																	
15-Nov-12						1.00			23.00								
16-Nov-12									17.00	7.00							
17-Nov-12									20.00	8.00							
18-Nov-12									21.00	3.00							
19-Nov-13									15.50	8.50							
20-Nov-13									24.00	6.00		1.00		1.00			
												1.00					
Cantidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	134.50	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Total	0	0	0	0	0	28.000,00	0	269.000,00	107.625,00	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0

Factor de Servicio (%) [redacted]


Dist. Contratista	Base Gravada	Sin Base Gravada	Base No Gravada	Total
Costa Caribe	0	0	0	0
Costa Chichimene	0	0	0	0
Dir Casilla MO	23.919.350	3.187.096	304.247.754	331.354.196
Dir Casilla IC	0	0	0	0
Dir Casilla T2	0	0	0	0
Dir Chichimene MO	0	0	0	0
Dir Chichimene IC	0	0	0	0
Dir Chichimene T2	0	0	0	0
Total	23.919.350	3.187.096	304.247.754	331.354.196

Dist. Facturas	Base Gravada	Sin Base Gravada	Base No Gravada	Total	% Dist. Total
Aurora	23.919.350	3.187.096	304.247.754	331.354.196	100,0%
Casilla La Reina	0	0	0	0	0,0%
Shanai	0	0	0	0	0,0%
Total	23.919.350	3.187.096	304.247.754	331.354.196	100,0%


LIQUIDACION PARCIAL 5
CONTRATO MA-0009346


Desde 16-Oct-12 Hasta 20-Nov-12

Torre 26 - 550 HP

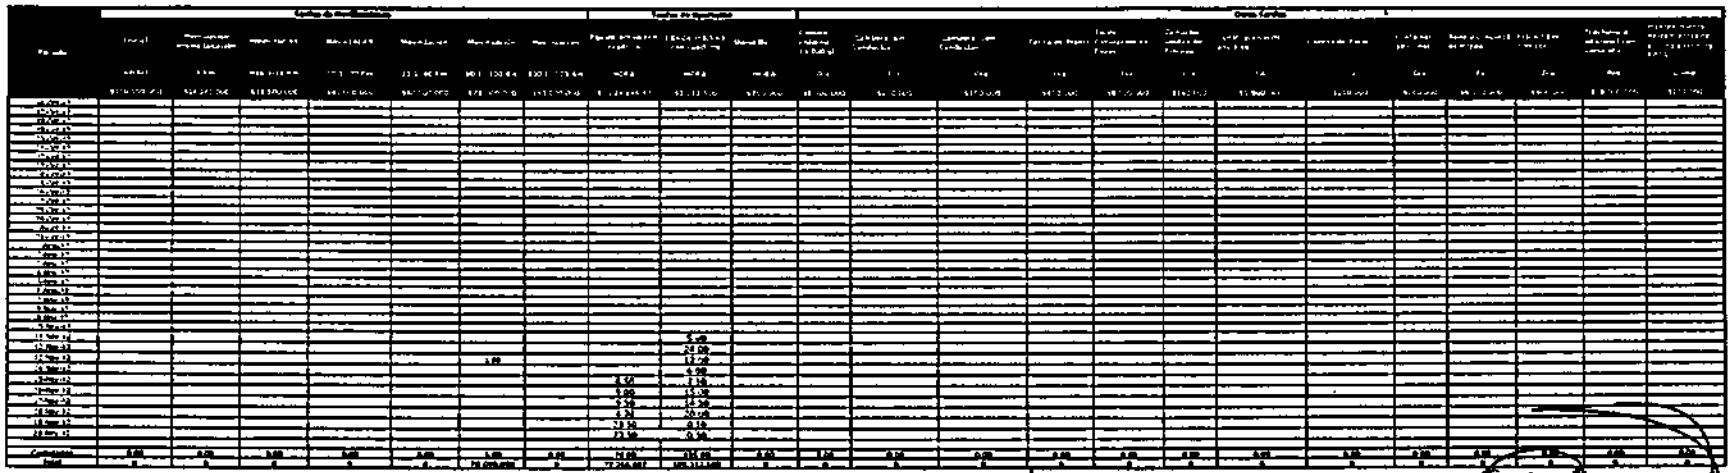








58

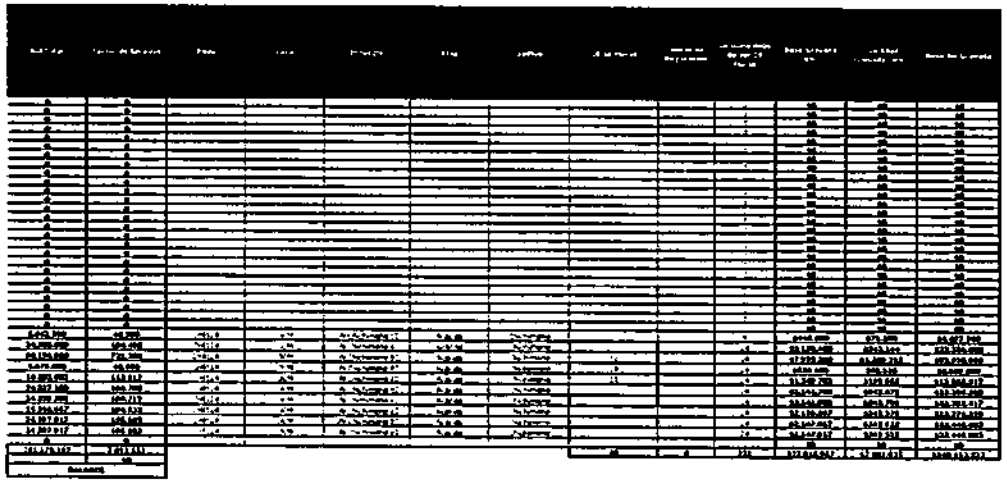

Independence ENERGY
SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO

15-Oct-12

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Subtotal	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]													
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]													
						[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Independence ENERGY
SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO

508

ECOPETROL S.A.
SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA- CHICHIMENE
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 9 - CONTRATO MA-0009346

El día 21 de Noviembre de 2012, se reunieron en las oficinas del Departamento de Producción de la Superintendencia de Operaciones Castilla- Chichimene, el Ing. Huber Silva en representación de Independence Drilling S.A. y el Ingeniero Rodrigo J Hernandez R en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes:

Periodo de liquidación: 16 de octubre de 2012 **AL** 20 de noviembre de 2012

Equipo 550 HP

1	**TARIFAS DE MOVILIZACION**				
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$ 350.000.000	0,00	$ -
1.2	Movilización final		$ 350.000.000	0,00	$ -
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 14.075.000	1,00	$ 14.075.000
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 33.500.000	4,00	$ 134.000.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$ 40.000.000	8,00	$ 320.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$ 60.000.000	2,00	$ 120.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$ 78.000.000	2,00	$ 156.000.000
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$ 90.000.000	0,00	$ -
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 24.400.000	129,460	$ 3.159.312.000
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 24.300.000	41,418	$ 1.006.457.400
2.3	Stand by	DIA	$ 18.000.000	0,00	$ -
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$ 1.300.000	80,00	$ 104.000.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$ 250.000	36,00	$ 9.000.000
3.3	Campero con conductor	DIA	$ 350.000	63,00	$ 22.050.000
3.4	Tarifa de planta	DIA	$ 450.000	23,00	$ [redacted]50.000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$ 8.500.000	13,00	$ [redacted]0.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$ 160.000	0,00	$ -
3.7	Construcción de anclajes	EA	$ 1.800.000	0,00	$ -
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$ 280.000	137,00	$ 38.360.000
3.9	Container adicional	DIA	$ 280.000	0,00	$ -
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	EA	$ 4.370.000	14,00	$ 61.180.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 400.000	72,00	$ 28.800.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$ 28.000.000	1,00	$ 28.000.000
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$ 250.000	0,00	$ -
	SUBTOYAL				$ 5.322.084.400
	BASE GRAVABLE				435.764.752
	FACTOR DE SERVICIO				[redacted]675
	TOTAL BASE GRAVABLE				[redacted]427
	BASE NO GRAVABLE				[redacted]648
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				$ 5.364.601.025
	IVA BASE GRAVABLE				74.934.948
	TOTAL EQUIPO DE WO 550HP				5.439.586.024

Equipos 350 HP + Tanque Bomba

1	**TARIFAS DE MOVILIZACION**				
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$ 360.000.000	0,00	$ -
1.2	Movilización final		$ 360.000.000	0,00	$ -
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 28.000.000	2,00	$ 56.000.000
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 30.500.000	1,00	$ 30.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$ 38.500.000	4,00	$ 154.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$ 63.500.000	0,00	$ -
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$ 76.000.000	0,00	$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$ 84.000.000	0,00	$ -
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 23.200.000	26,459	$ 613.848.800
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 23.100.000	4,834	$ 111.665.400
2.3	Stand by	DIA	$ 18.000.000		$ -
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$ 1.300.000	13,000	$ 16.900.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$ 250.000	0,000	$ -
3.3	Campero con conductor	DIA	$ 350.000	0,000	$ -
3.4	Tarifa de planta	DIA	$ 450.000	10,000	$ [redacted]00]
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$ 8.500.000	0,000	$ -
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$ 160.000	0,000	$ -
3.7	Construcción de anclajes	EA	$ 1.800.000	0,000	$ -
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$ 280.000	29,000	$ 8.120.000
3.9	Container adicional	DIA	$ 280.000	108,000	$ 30.240.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	EA	$ 4.370.000	7,000	$ 30.590.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 400.000	185,000	$ 74.000.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$ 28.000.000	0,000	$ -
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$ 250.000	0,000	$ -
	SUBTOTAL				1.130.364.200
	BASE GRAVABLE				[redacted]36
	FACTOR DE SERVICIO				[redacted]14
	TOTAL BASE GRAVABLE				[redacted]050
	BASE NO GRAVABLE				1.039.935.064
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				1.139.407.114
	IVA BASE GRAVABLE				15.915.528
	TOTAL EQUIPO DE WO				1.155.322.642


Acciones	88%
Cesantía e Nueva	6%
[redacted]	[redacted]

En [redacted] representantes de las partes:


HUBER SILVA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
REPRESENTANTE DELEGADO

RODRIGO J HERNANDEZ R
ECOPETROL
GESTOR TECNICO

LUIS JOSE ALMEIDA PINZON
ECOPETROL
ADMINISTRADOR

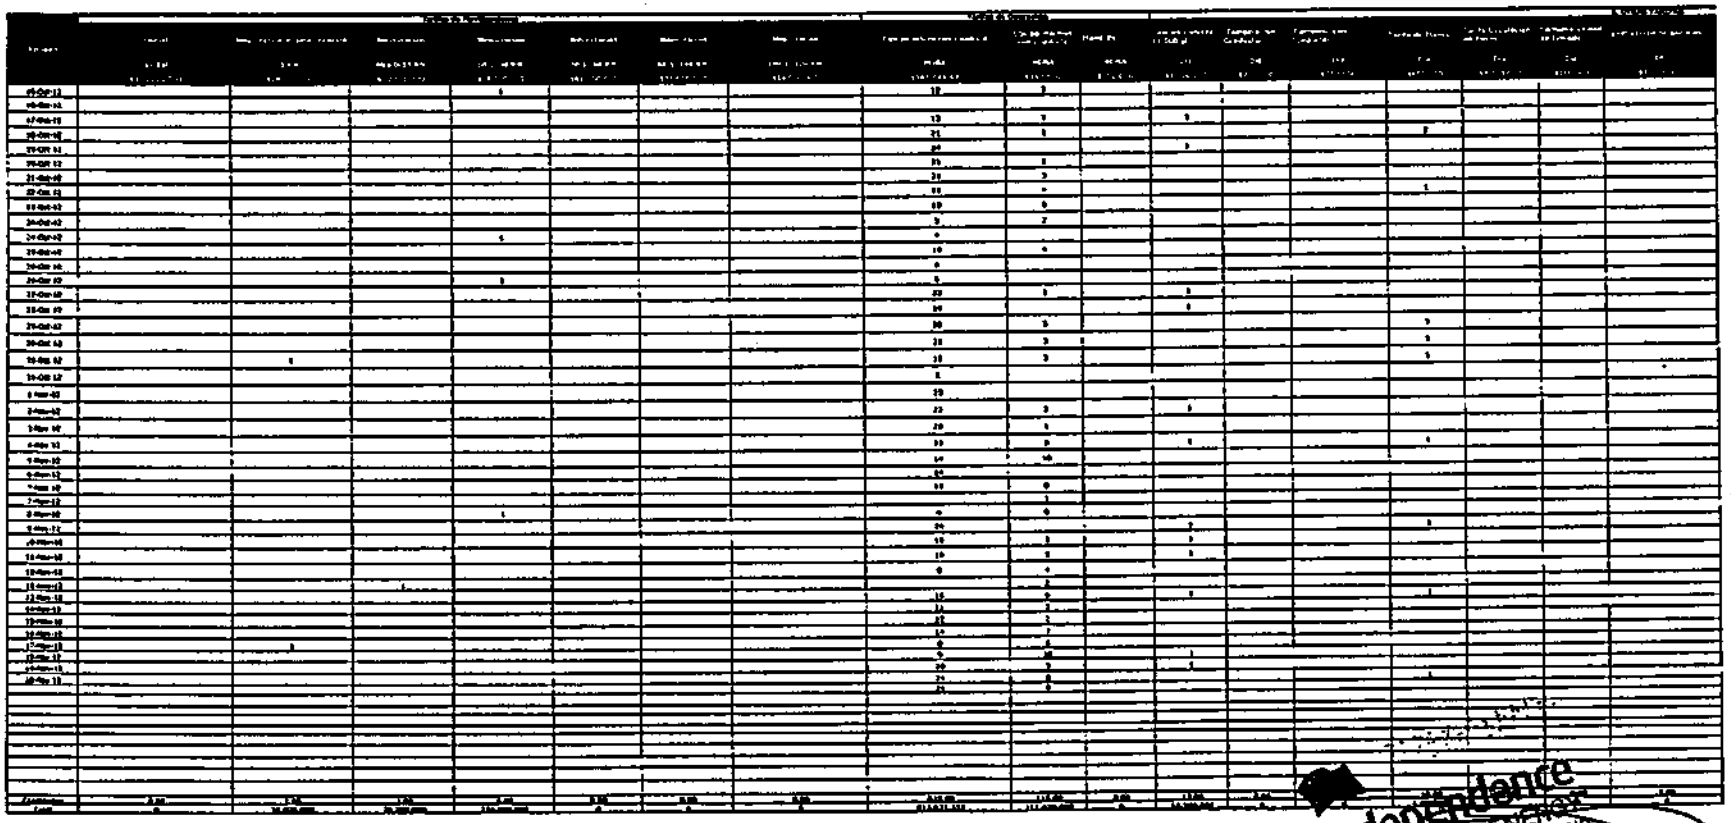


Independence
ENERGY
SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO

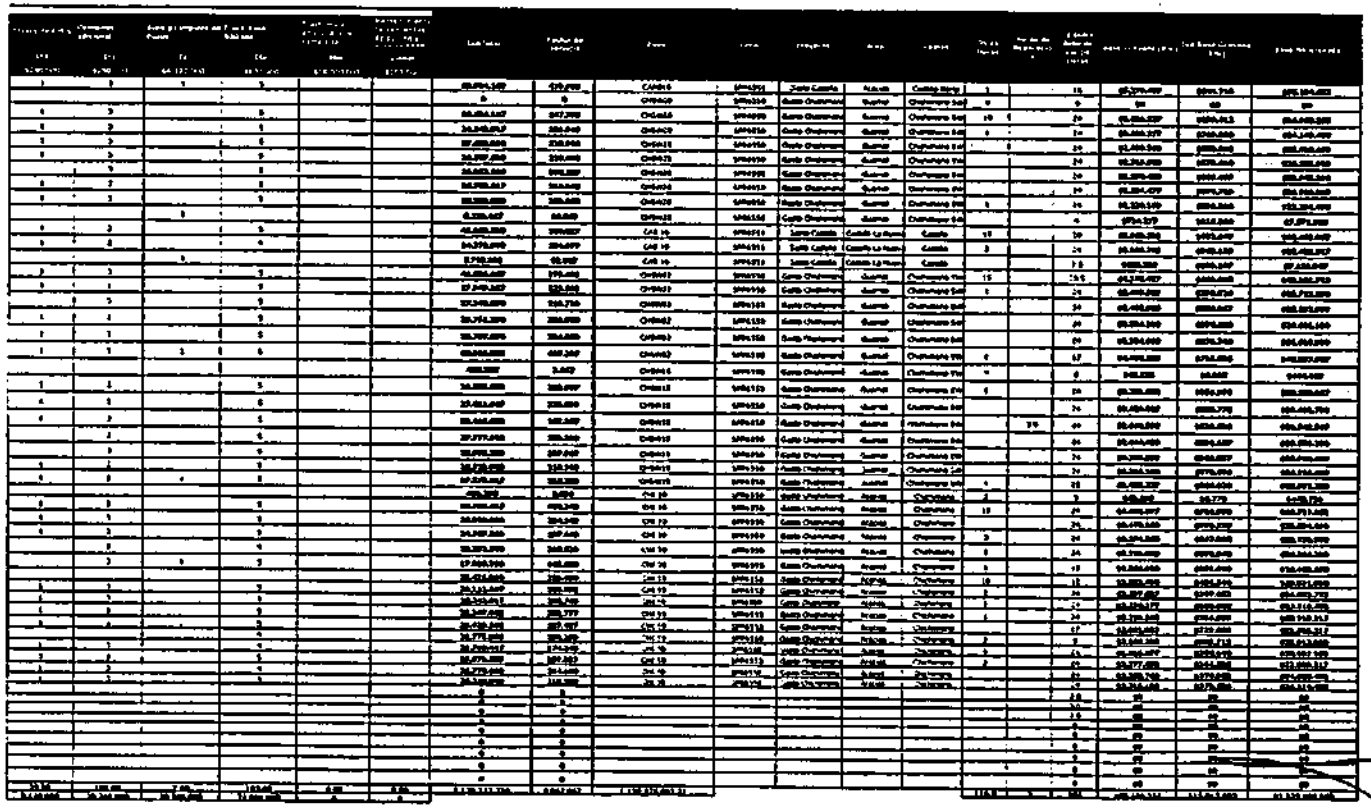

Independence ENERGY

SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO

LIQUIDACION PARCIAL
CONTRATO MA-0009346

Desde **16-Oct-12** **Hasta**

Tanque Bomba

Periodo	Tarifas de Servicios Auxiliares							Tarifas de Operación		Suministros								
	Diesel	Mantenimiento Tanque Almacenamiento	Mantenimiento	Mantenimiento	Mantenimiento	Mantenimiento	Mantenimiento	Estándar de Mantenimiento Combustible	Equipo Auxiliar Mantenimiento	Diesel Hp	Equipo Auxiliar Combustible	Equipo Auxiliar Combustible	Equipo Auxiliar Combustible	Equipo Auxiliar Combustible	Equipo Auxiliar Combustible	Equipo Auxiliar Combustible	Equipo Auxiliar Combustible	Equipo Auxiliar Combustible
	Global	Hp	Hp	Hp	Hp	Hp	Hp	HORA	HORA	Hp/Hr	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día
	$ 140.000.000	$ 28.000.000	$ 36.500.000	$ 28.500.000	$ 28.500.000	$ 26.000.000	$ 26.000.000	$ 966.666,67	$ 962.500	$ 500.000	$ 1.200.000	$ 210.000	$ 150.000	$ 450.000	$ 28.500.000	$ 140.000	$ 80.000.000	
16-Oct-12															1,00			
20-Oct-12															1,00			
21-Oct-12															1,00			
22-Oct-12															1,00			
24-Oct-12															1,00			
25-Oct-12															1,00			
26-Oct-12															1,00			
31-Oct-12															1,00			
2-Nov-12															1,00			
5-Nov-12															1,00			
6-Nov-12															1,00			
10-Nov-12															1,00			
14-Nov-12															1,00			
Cantidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.500.000	0	0	

Factor de Bombeo Plus

Dist. Centros de Costos	Base Gravada (Bbls)	Vrs Base Gravada	Base No Gravada	Total
TQ Lanza 69	0	0	0	0
Total	8.726.000	5.515.000	103.680.000	103.920.000

Dist. Por Bomb	Base Gravada (Bbls)	Vrs Base Gravada	Base No Gravada	Total	% Distribucion
Total	8.726.000	5.515.000	103.680.000	103.920.000	100,0%

GESTOR TECNICO CONTRATO MA-0009346

APODERADO ESPECIAL

independence ENERGY

SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO

510

511

ECOPETROL

SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA-CHICHIMENE

Castilla La Nueva, 21 de Diciembre de 2012

Doctora
LAURA JULIANA NIÑO FLOREZ
Gestora Administrativa
COPCO S.A.
Castilla La Nueva

Asunto: Entrega Pago Parcial No 6 Contrato MA-0009346

Estimada Laura, por medio de la presente hago entrega de los soportes correspondientes al pago parcial No 6 del contrato MA-0009346, cuyo Objeto es: "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."; suscrito con la Empresa INDEPENDENCE DRILLING S.A.

En consecuencia, relaciono los soportes:

- Acta de Gestoría Técnica GAB-F-080
- Acta de cantidades parcial No 6
- Informe de Gestoría técnica

Atentamente,

Rodrigo J Hernandez Ropain
Gestor Técnico Contrato MA-0009346

Anexos: Documentos relacionados

Superintendencia de Operaciones Castilla Chichimene
Castilla La Nueva Via a Cacayal - Meta
Teléfonos: (098) 66163 81 Fax: (098) 675 01 16

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
ecopetrol	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS Nro 6

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA-CHICHIMENE
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	21 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE
VALOR PRESENTE ACTA	CINCO MIL QUINIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS (5.512.239.600) SIN IVA

Mediante la suscripción de la presente Acta:

a) INDEPENDENCE DRILLING S.A., en adelante el CONTRATISTA, representado por FRANCISCO JAVIER VILLABONA TAMAYO, mayor de edad, vecino de la ciudad de BOGOTA, Identificado con C.C. Nº 17.419.403 DE ACACIAS, META, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y

b) RODRIGO J HERNANDEZ R Identificado con Cédula de Ciudadanía número 79.521.811 DE BOGOTA, quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

Dejan constancia de que,

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el 21 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE, prestó los servicios contemplados en el contrato MA-0009346 que se relaciona en la presente acta de recibo de cantidades. El valor del servicio prestado en el periodo es el siguiente:

Cantidades Equipo 550 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	0	$ 350.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	0	$ 350.000.000	$ 0
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	1	$ 14.075.000	$ 14.075.000
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	5	$ 33.500.000	$ 167.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	10	$ 40.000.000	$ 400.000.000

PETROL	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	1	$ 60.000.000	$ 60.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0	$ 78.000.000	$ 0
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0	$ 90.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	124,905	$ 24.400.000	$ 3.047.682.000
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	35,095	$ 24.300.000	$ 852.808.500
2.3	Stand by	0	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	65	$ 1.300.000	$ 84.500.000
3.2	Campero sin conductor	25	$ 250.000	$ 6.250.000
3.3	Campero con conductor	48	$ 350.000	$ 16.800.000
3.4	Tarifa de planta	14	$ 450.000	$ 6.300.000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	0	$ 8.500.000	$ 0
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	0	$ 160.000	$ 0
3.7	Construcción de anclajes	0	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	117	$ 280.000	$ 32.760.000
3.9	Container adicional	0	$ 280.000	$ 0
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	17	$ 4.370.000	$ 74.290.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	50	$ 400.000	$ 20.000.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	1	$ 28.000.000	$ 28.000.000
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0	$ 250.000	$ 0
	TOTAL			$ 4.810.965.500

Cantidades Equipo 350 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	0,00	$ 360.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	0,00	$ 360.000.000	$ 0
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	1,00	$ 28.000.000	$ 28.000.000
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	1,00	$ 30.500.000	$ 30.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	1,00	$ 38.500.000	$ 38.500.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	0,00	$ 63.500.000	$ 0
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 76.600.000	$ 0
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 84.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	16,959	$ 23.200.000	$ 393.448.800

2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	0,563	$ 23.100.000	$ 13.005.300
2.3	Stand by	0	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	2	$ 1.300.000	$ 2.600.000
3.2	Campero sin conductor	0	$ 250.000	$ 0
3.3	Campero con conductor	2	$ 350.000	$ 700.000
3.4	Tarifa de planta	5	$ 450.000	$ 2.250.000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	12	$ 8.500.000	$ 102.000.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	0	$ 160.000	$ 0
3.7	Construcción de anclajes	0	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	22	$ 280.000	$ 6.160.000
3.9	Container adicional	75	$ 280.000	$ 21.000.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	3	$ 4.370.000	$ 13.110.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	125	$ 400.000	$ 50.000.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	0	$ 28.000.000	$ 0
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0	$ 250.000	$ 0
	TOTAL			**$ 701.274.100**

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el COORDINADOR DE GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO.

En constancia, se firma en Villavicencio 21 de Diciembre de 2012, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

Por el CONTRATISTA

FRANCISCO JAVIER VILLABONA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Por la GESTION TÉCNICA

RODRIGO J HERNANDEZ ECOPETROL S.A.

513

ECOPETROL S.A.
SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA- CHICHIMENE
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 6 - CONTRATO 4600009346

El dia 21 de Diciembre de 2012, se reunieron en las oficinas del Departamento de Producción de la Superintendencia de Operaciones Castilla- Chichimene, el Ing. Francisco Villabona en representación de Independence Drilling S.A. y el Ingeniero Rodrigo J Hernandez R en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes:

Periodo de liquidación: 21 de Noviembre de 2012 AL 15 de Diciembre de 2012

Equipo 550 HP

1	**TARIFAS DE MOVILIZACIÓN**					
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$ 350.000.000	0	$	-
1.2	Movilización final	GLOBAL	$ 350.000.000	0	$	-
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 14.075.000	1	$	14.075.000
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 33.500.000	5	$	167.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$ 40.000.000	10	$	400.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$ 60.000.000	1	$	60.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$ 78.000.000	0	$	-
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$ 90.000.000	0	$	-
2						
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 24.400.000	124,905	$	3.047.682.000
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 24.300.000	35,1	$	852.808.500
2.3	Stand by	DIA	$ 18.000.000	0,0	$	-
3						
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$ 1.300.000	65	$	84.500.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$ 250.000	25	$	6.250.000
3.3	Campero con conductor	DIA	$ 350.000	48	$	[illegible]000
3.4	Tarifa de planta	DIA	$ 450.000	14	$	[illegible]000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$ 8.500.000	0	$	-
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$ 160.000	0	$	-
3.7	Construcción de anclajes	EA	$ 1.800.000	0	$	-
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$ 280.000	117	$	32.760.000
3.9	Container adicional	DIA	$ 280.000	0	$	-
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	EA	$ 4.370.000	17	$	74.290.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 400.000	50	$	20.000.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$ 28.000.000	1	$	28.000.000
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running ERES	GLOBAL	$ 250.000	0	$	-
	SUBTOTAL					**4.810.865.500**
	BASE GRAVABLE					**384.877.240**
	FACTOR DE SERVICIO					0
	TOTAL BASE GRAVABLE					**384.877.240**
	BASE NO GRAVABLE					**4.426.088.260**
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					**4.810.965.500**
	IVA BASE GRAVABLE					**61.980.398**
	TOTAL EQUIPO DE WO 550HP					**4.872.845.898**

Equipos 350 HP - Tanque Bombe

1	**TARIFAS DE MOVILIZACION**					
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$ 360.000.000	0,00	$	-
1.2	Movilización final	GLOBAL	$ 360.000.000	0,00	$	-
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 28.000.000	1,00	$	28.000.000
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 30.500.000	1,00	$	30.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$ 38.500.000	1,00	$	38.500.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$ 63.500.000	0,00	$	-
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$ 76.600.000	0,00	$	-
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$ 84.000.000	0,00	$	-
2						
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 23.200.000	16,959	$	393.448.800
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 23.100.000	0,563	$	13.005.300
2.3	Stand by	DIA	$ 18.000.000		$	-
3						
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$ 1.300.000	2	$	2[illegible]00
3.2	Campero sin conductor	DIA	$ 250.000	0	$	[illegible]
3.3	Campero con conductor	DIA	$ 350.000	2	$	700.000
3.4	Tarifa de planta	DIA	$ 450.000	5	$	2.250.000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$ 8.500.000	12	$	102.000.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$ 160.000	0	$	-
3.7	Construcción de anclajes	EA	$ 1.800.000	0	$	-
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$ 280.000	22	$	6.160.000
3.9	Container adicional	DIA	$ 280.000	75	$	21.000.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	EA	$ 4.370.000	3	$	13.110.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 400.000	125	$	50.000.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$ 28.000.000	0,000	$	-
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running ERES	GLOBAL	$ 250.000	0,000	$	-
	SUBTOTAL					**701.274.100**
	BASE GRAVABLE					**56.101.928**
	FACTOR DE SERVICIO					0
	TOTAL BASE GRAVABLE					**56.101.928**
	BASE NO GRAVABLE					**645.172.172**
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					**701.274.100**
	IVA BASE GRAVABLE					**8.976.308**
	TOTAL EQUIPO DE WO					**710.250.408**

Acacias	45%
Castilla La Nueva	45%
Guamal	10%
Total	100%

En constancia de lo anterior firman los representantes de las partes:

FRANCISCO VILLABONA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
REPRESENTANTE DELEGADO

RODRIGO J HERNANDEZ R
ECOPETROL
GESTOR TECNICO


LUIS JOSE ALMEIDA PINZON
ECOPETROL


514

LIQUIDACION PARCIAL 8
CONTRATO NA-0009348

Desde 21-Nov-12 Hasta 19-Dec-12


Torre 34 - 550 HP

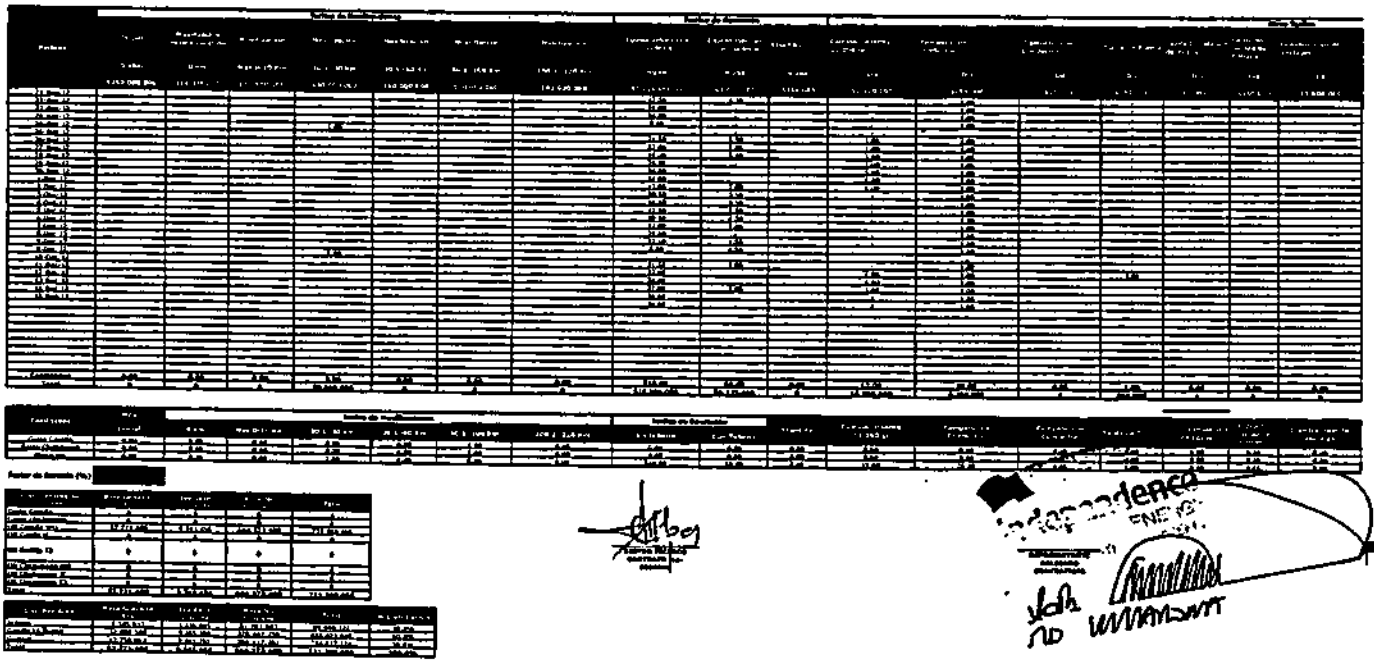

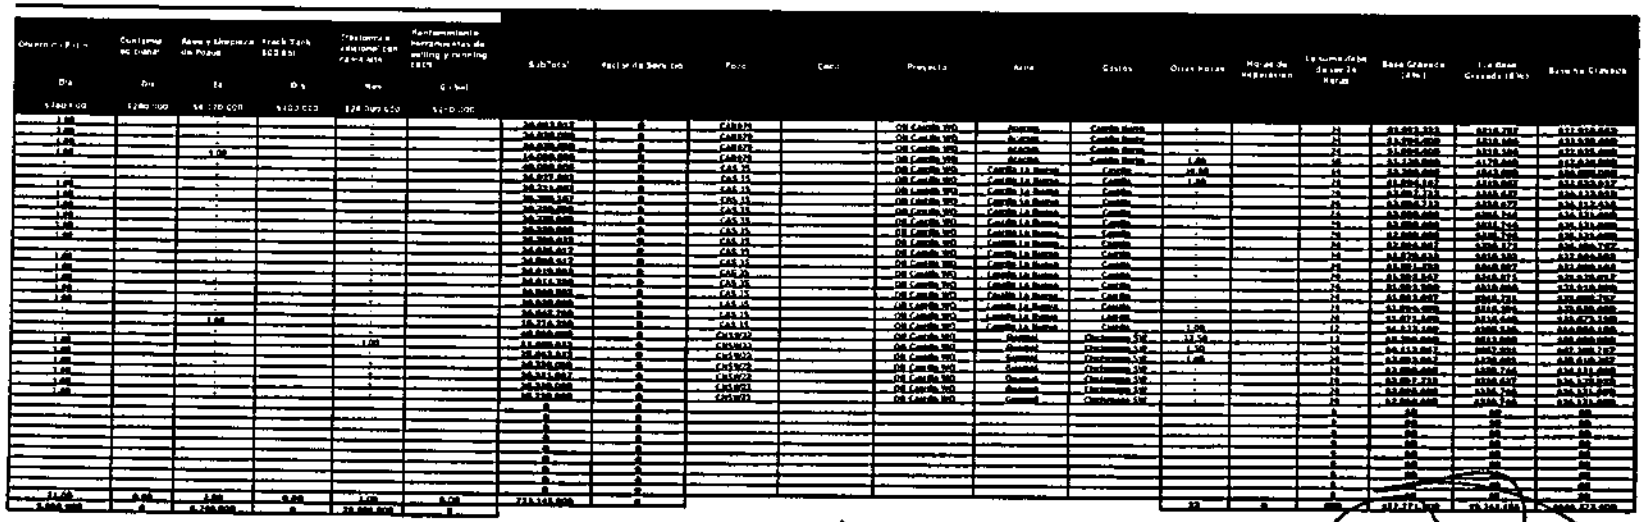








Independence
ENERGY


LIQUIDACION PARCIAL 6
CONTRATO MA-0009346

Desde 21-Nov-12 Hasta 15-Dec-12

Torre 32 - 550 HP

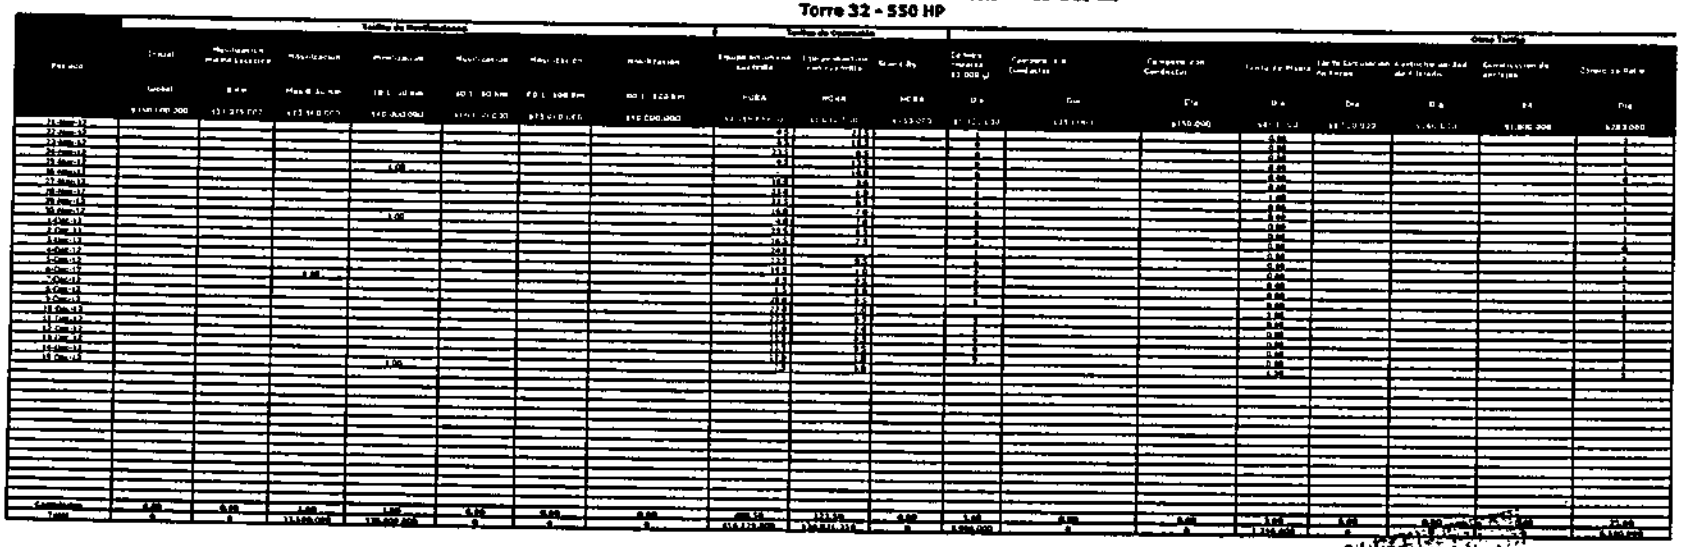










Vo Bo
No

516

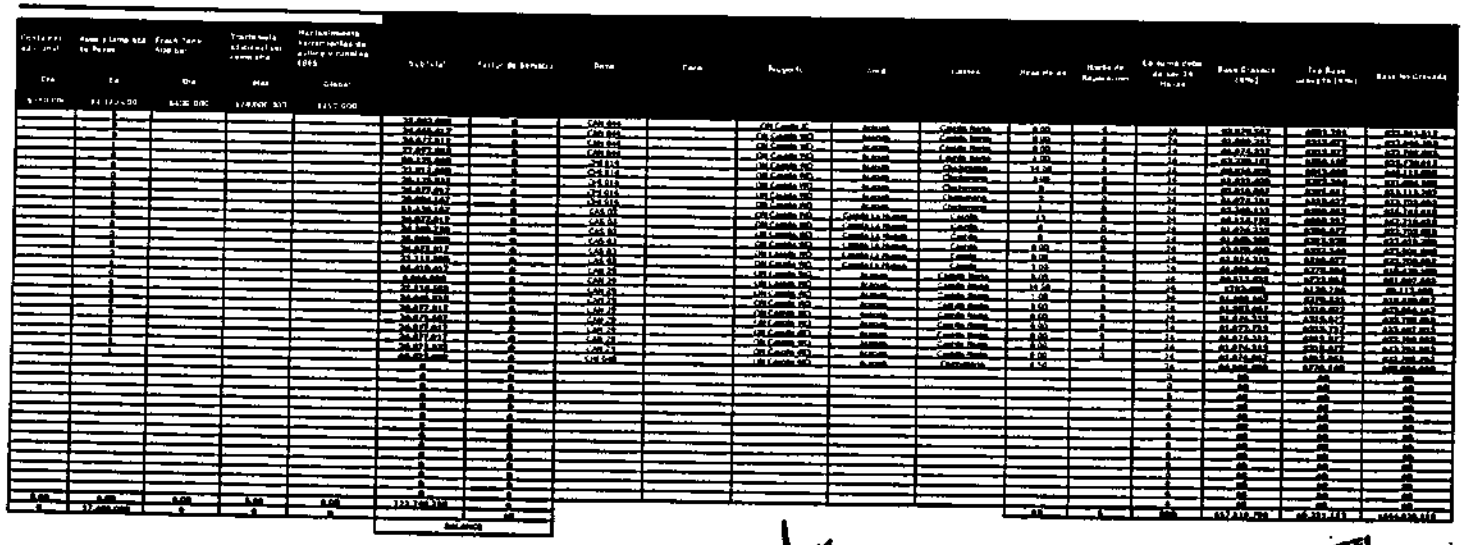

Independence ENERGY

SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO


567


518

LIQUIDACION PARCIAL 8
CONTRATO MA-0009346

Desde 21-Nov-12 Hasta 15-Dec-12


Torre 31 - 550 HP

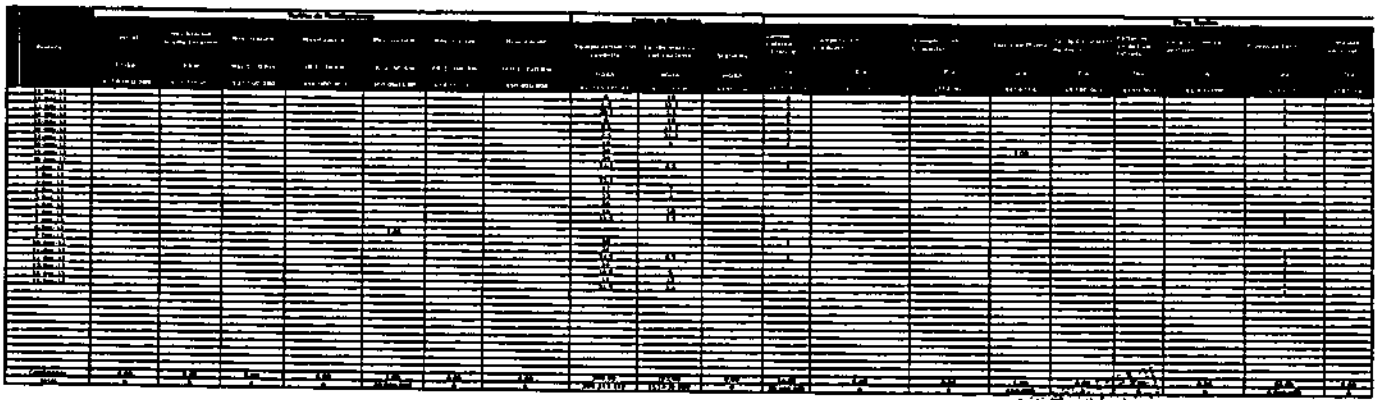










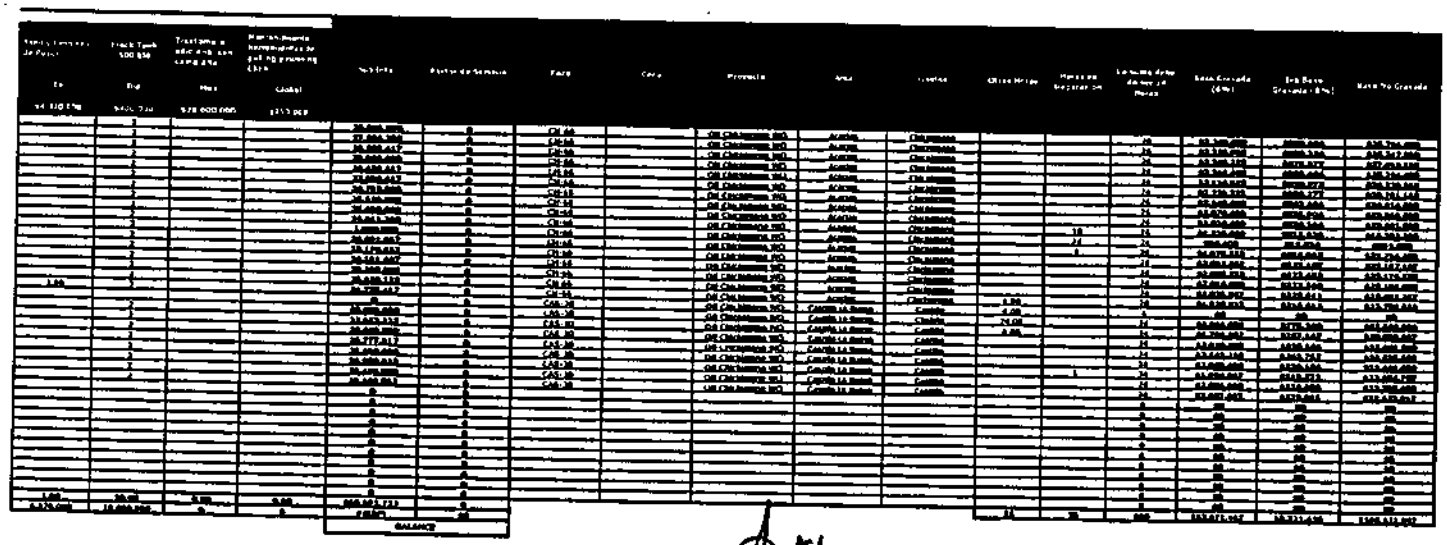


Independence ENERGY
SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO

520


LIQUIDACION PARCIAL 6
CONTRATO HA-0099346

Desde 21-Nov-12 Hasta 15-Dec-12

Torre 28 - 550 HP

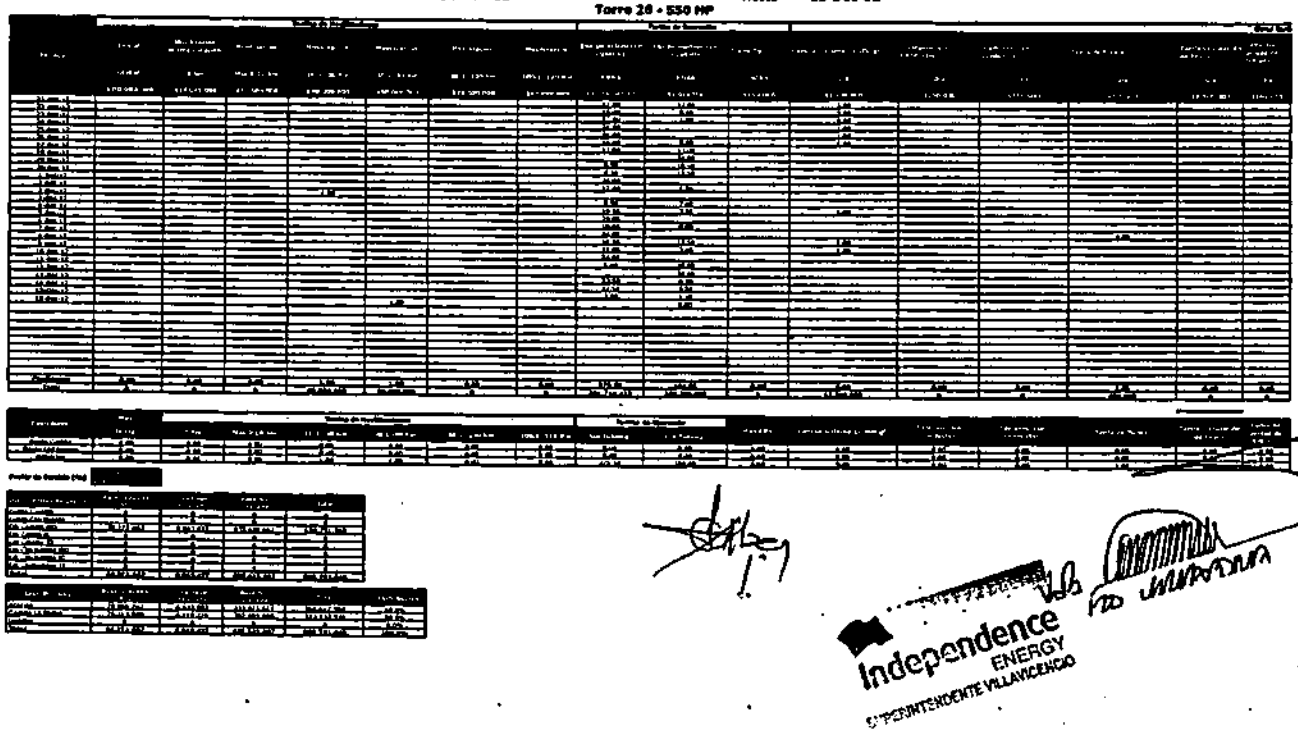

Independence ENERGY
SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO

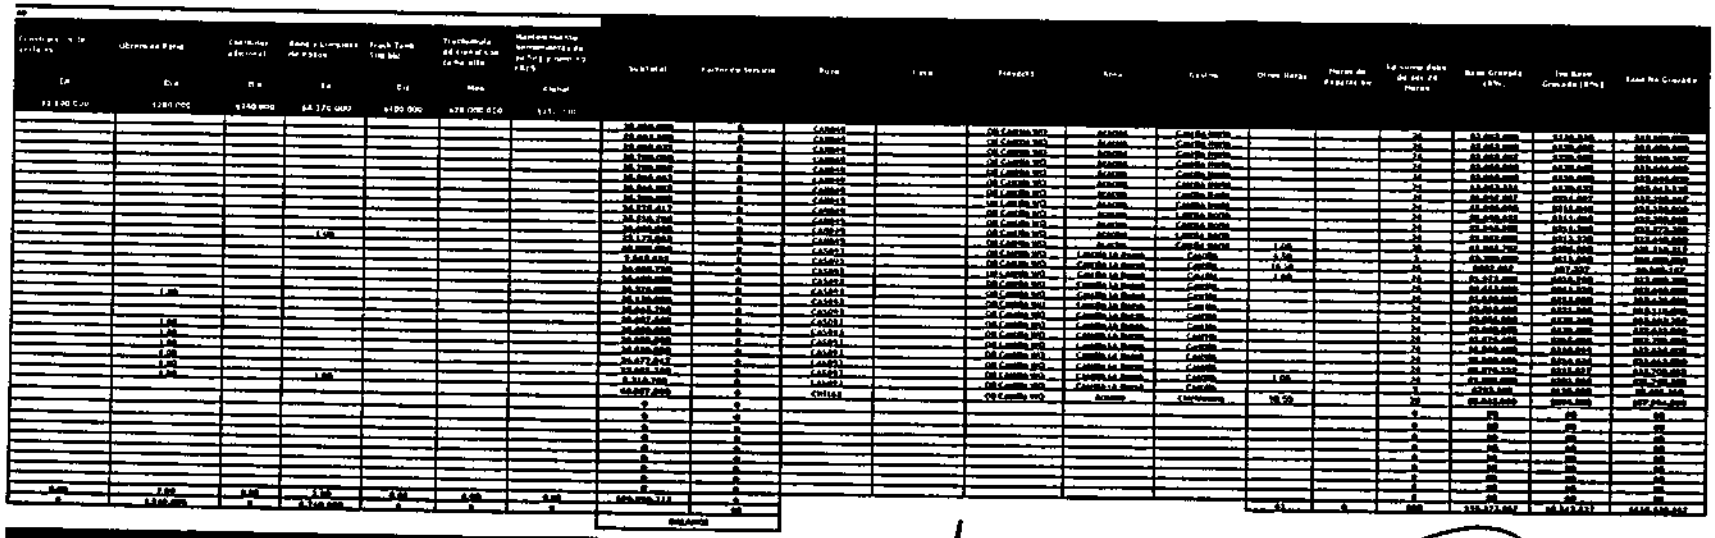





Independence ENERGY
SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO

CONTRATO MA-0009346 6


Desde 21-Nov-12 **Hasta** 15-Dec-12


Torre 27 - 350 HP

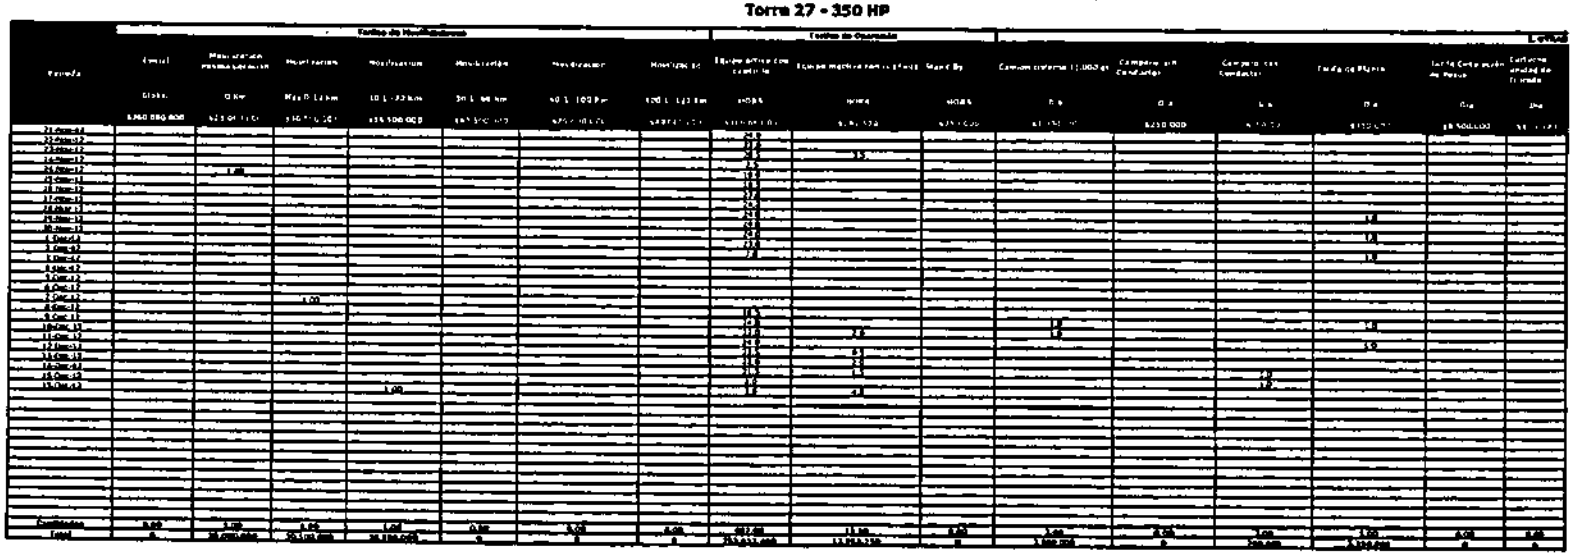















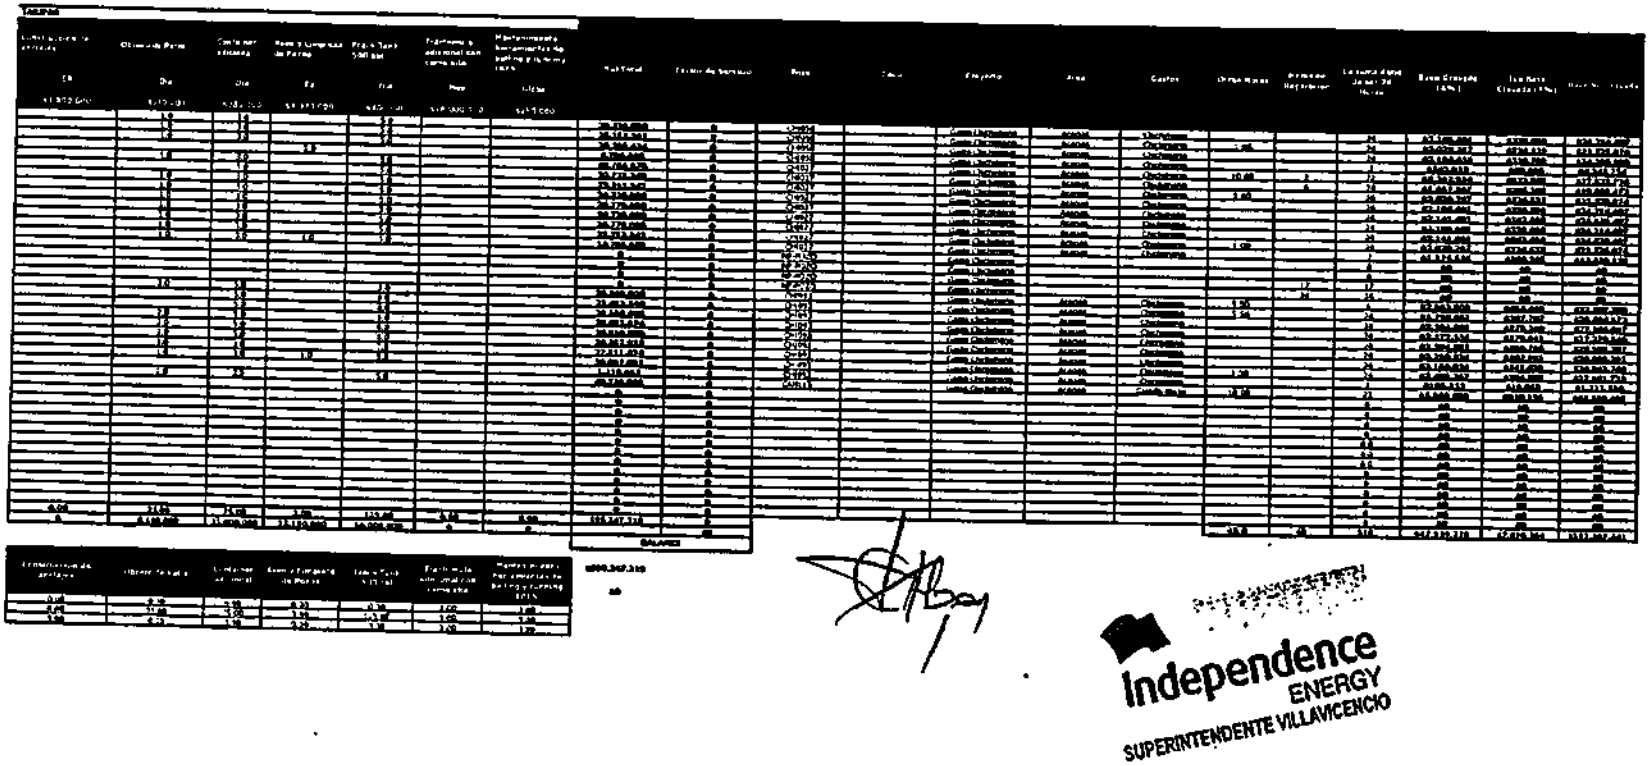


Independence ENERGY
SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO


524


LIQUIDACION PARCIAL 8
CONTRATO NA-0009346

Desde 21-Nov-12 Hasta 15-Dec-12

Torre 26 - 550 HP

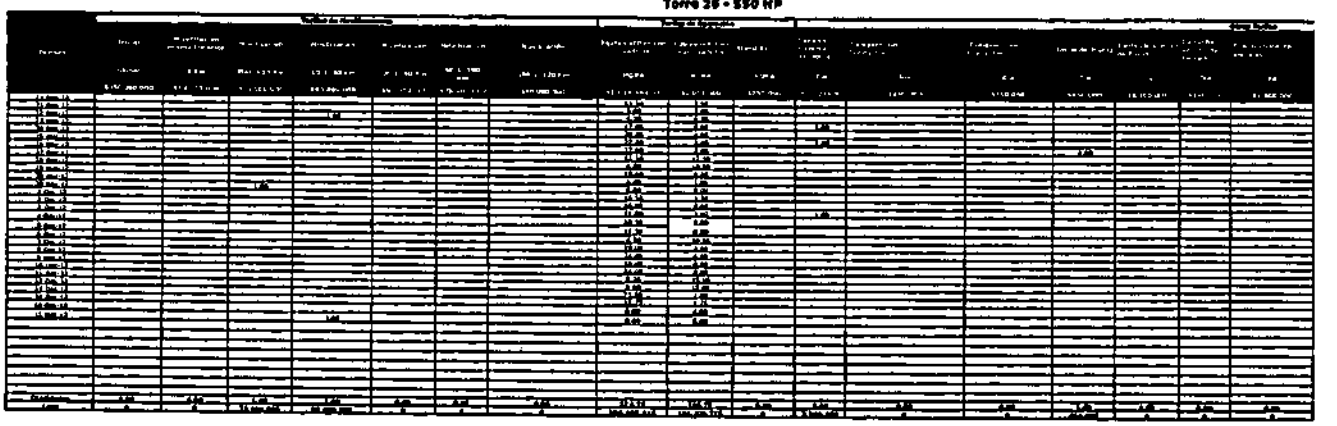






Independence ENERGY

SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO

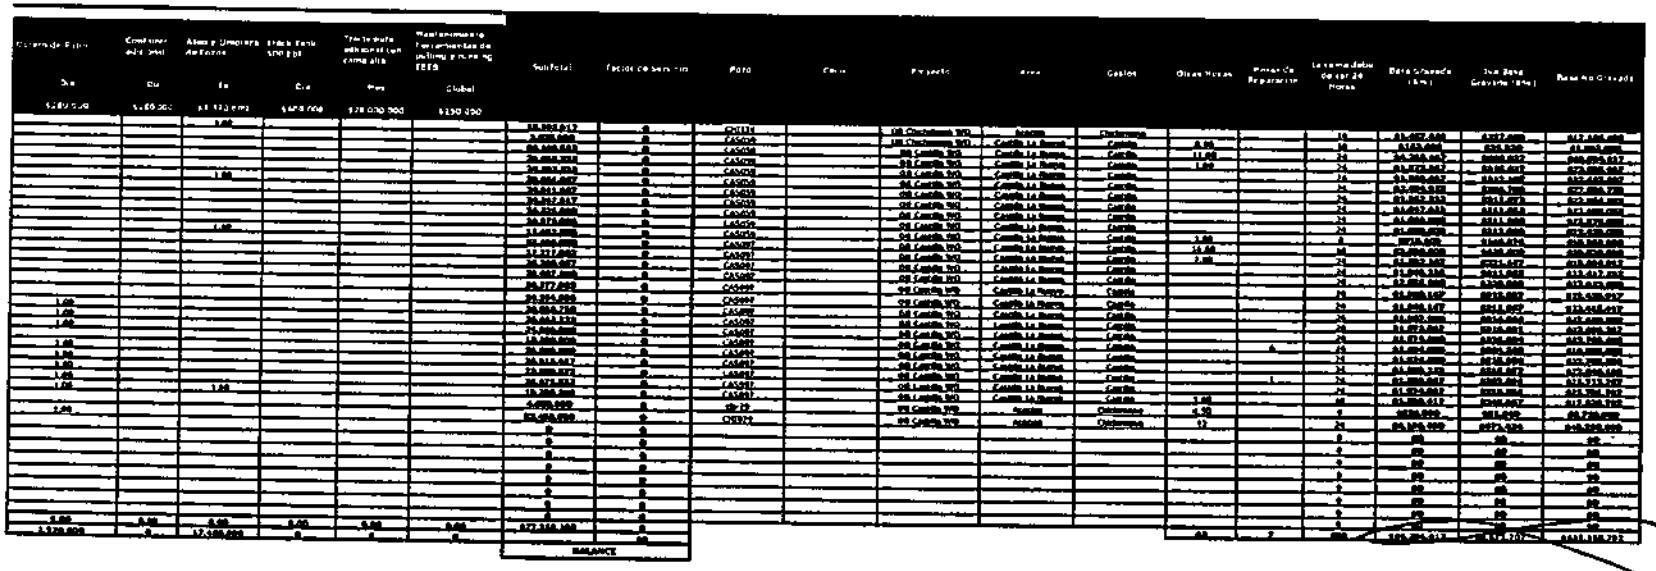

Independence ENERGY
SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO


525


LIQUIDACION PARCIAL


CONTRATO MA-0009346 6

Desde 21-Nov-12 **Hasta** 15-Dec-12


Tanque Bomba

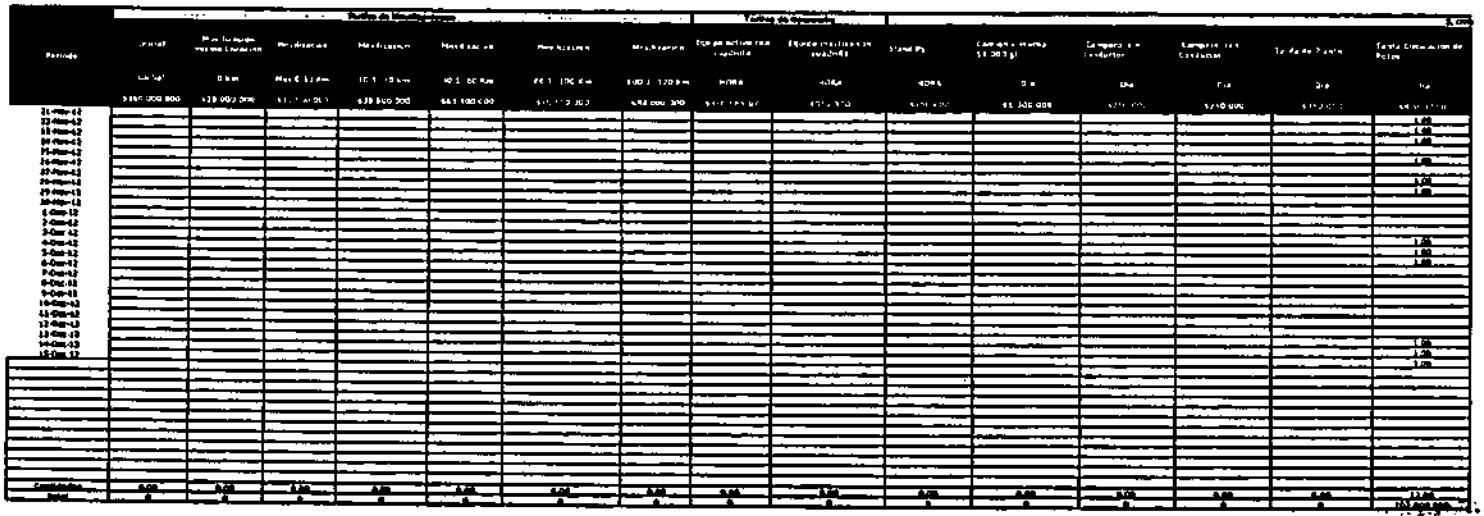










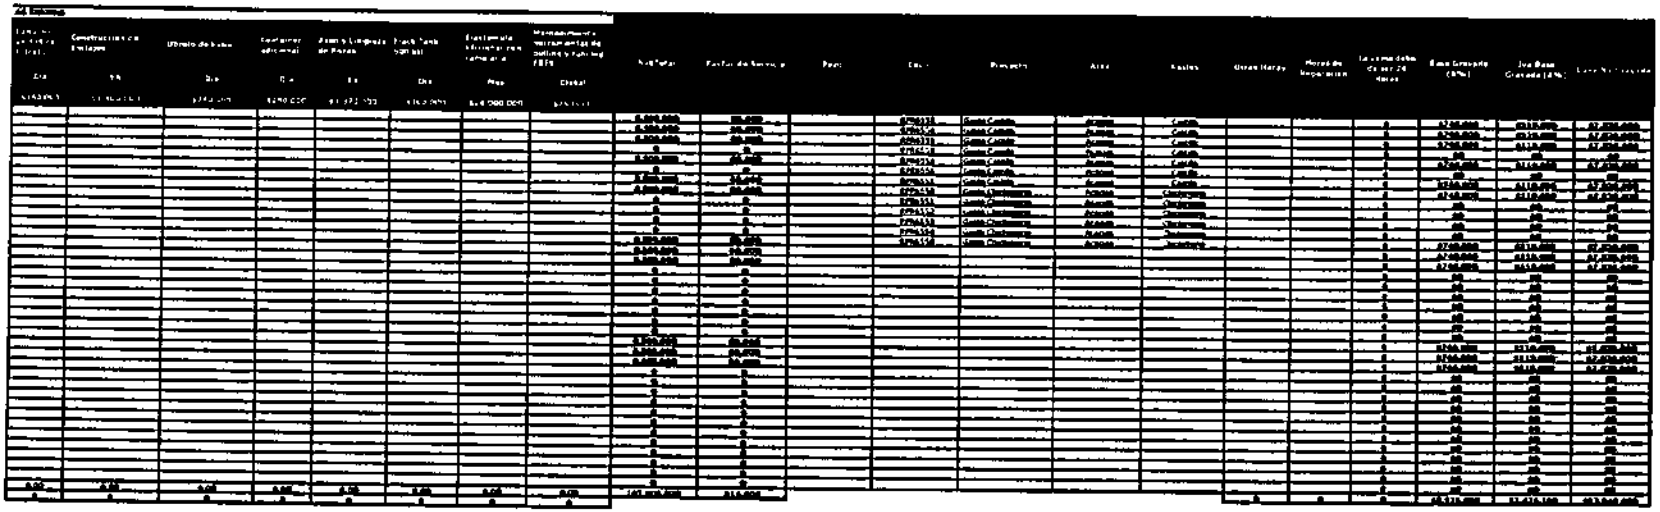


Independence ENERGY
SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO


528


LIQUIDACION PARCIAL 6
CONTRATO MA-8009346

Desde 21-Nov-12 Hasta 19-Dec-12


Torre 123- 850 HP

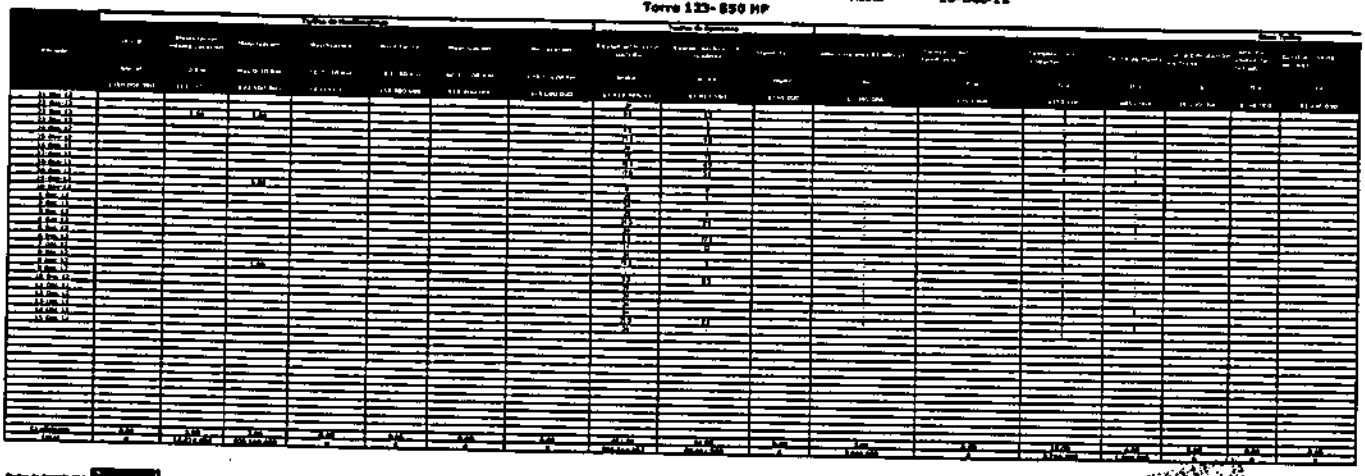










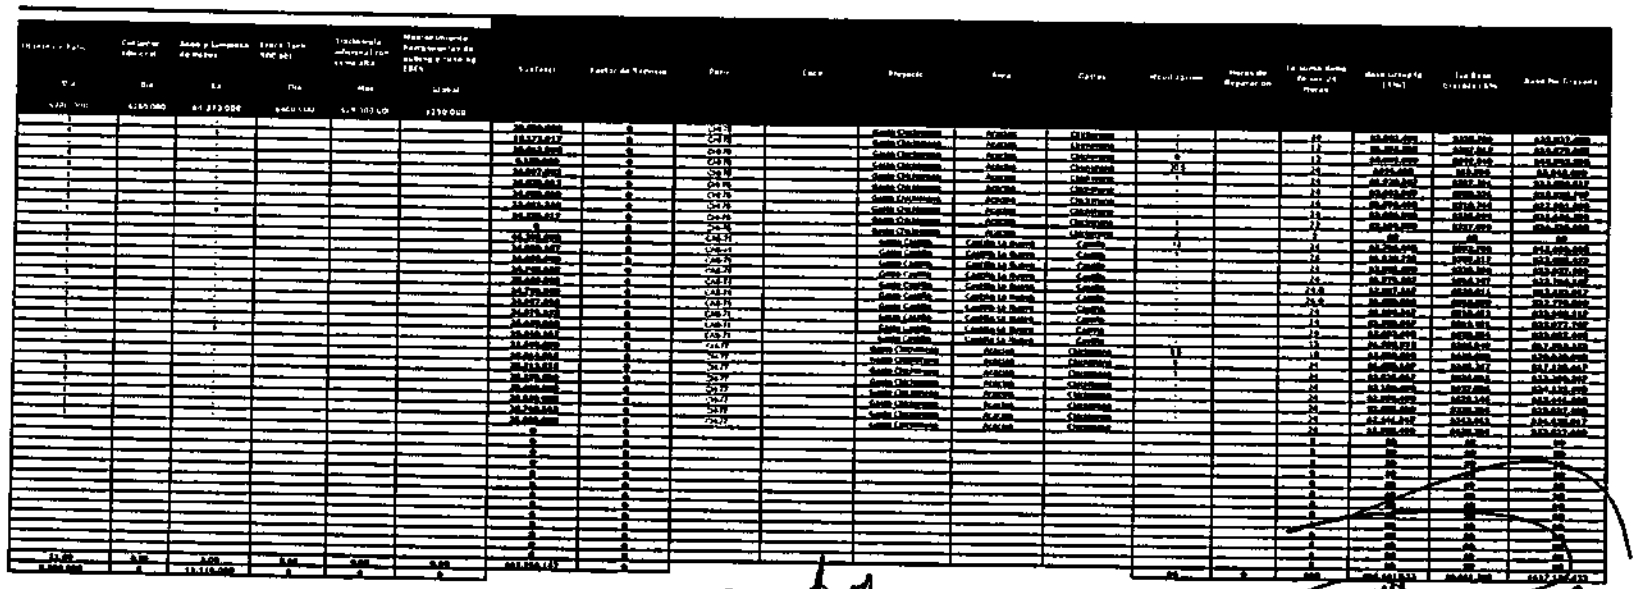


Independence Energy
SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO


530


LIQUIDACION PARCIAL 6
CONTRATO HA-0009348

Desde 21-Nov-12 **Hasta** 15-Dec-12

Torre 42 - 550 HP

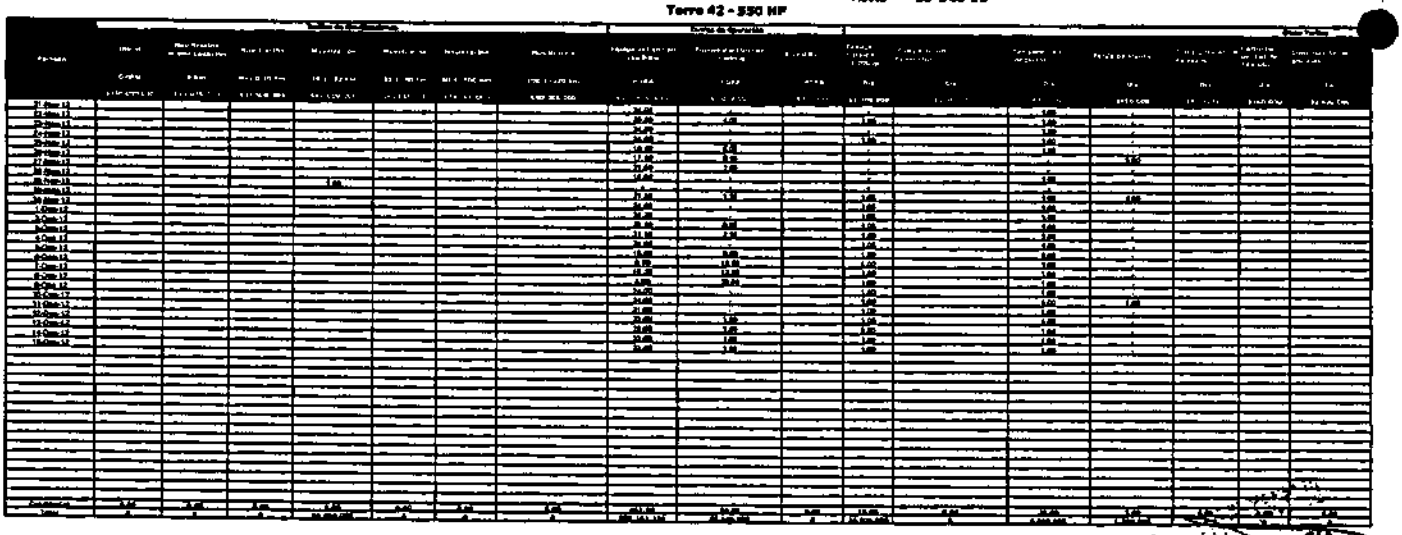










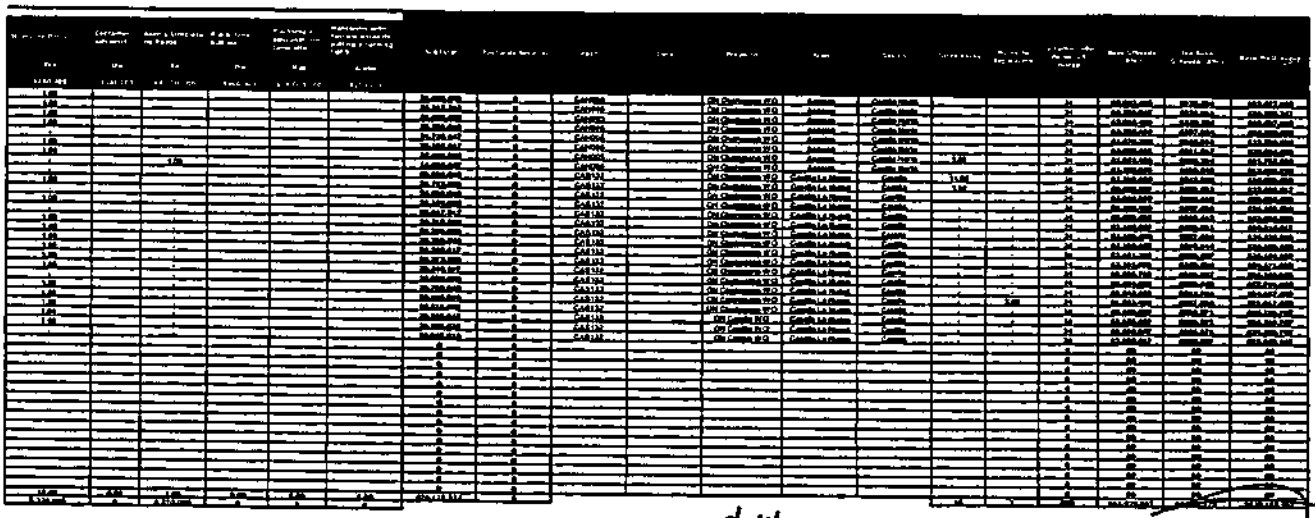

Independence ENERGY
SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO

532

ecopetrol	ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL DE OBRA/SERVICIO		
	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		
	ECP-UCN-F-020	Elaborado 30/09/2011	Versión: 2

ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL DE SERVICIO Nº 7 AL CONTRATO MA-0009346

CONTRATO:	**MA-0009346**
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 – 2016.**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**($122.351.947.960)** CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR IVA.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	**(1005)** MIL CINCO DIAS CALENDARIO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 LO QUE OCURRA PRIMERO.
MAYOR CANTIDAD 1	**($5.957.053.280)** CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y TRES DOSCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
MAYOR CANTIDAD 2	**($4.049.217.320)** CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
MAYOR CANTIDAD 3	**($8.005.790.580)** OCHO MIL CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR IVA.
MAYOR CANTIDAD 4	**($3.670.955.320)** TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**($144.034.964.460)** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR IVA.
SALDO DEL CONTRATO	**($107.820.103.643)** CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA
VALOR EJECUTADO	**($36.214.860.817)** TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	09/06/2012
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO:	31/12/2014
FECHA DE CORTE:	26/12/2012
PERIODO FACTURADO:	16/12/2012 – 26/12/2012
PORCENTAJE DE PAGO:	29.60%
ADMINISTRADOR:	LUIS JOSE ALMEIDA PINZON
GESTOR DEL CONTRATO:	COPCO S.A.
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.

ecopetrol	ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL DE OBRA/SERVICIO		
	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		
	ECP-UCN-F-020	Elaborado 30/09/2011	Versión: 2

Mediante la suscripción de la presente Acta:

a) **INDEPENDENCE DRILLING S.A.,** que para todos los efectos legales y para los de este documento se denomina el CONTRATISTA, **FRANCISCO JAVIER VILLABONA.** mayor de edad, identificado con Cédula 17.419.403, quien actúa en su calidad de representante autorizado de la empresa y,
b) **LAURA JULIANA NIÑO FLOREZ** identificado con Cédula de Ciudadanía número 63.510.108 de Bucaramanga, quien actúa en su calidad de GESTOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

Dejan constancia de que,

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el **16 De Diciembre de 2012 al 26 de Diciembre de 2012**, prestó los servicios contemplados en el contrato **MA-0009346** que se relaciona en la presente acta de liquidación parcial de servicio. El valor del servicio prestado en el periodo es el siguiente:

ACTA Nº	VALOR ACTA	SALDO DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	6.778.373.400	197.256.591.060	6.778.373.400	5,54%
2	3.476.839.100	133.779.751.960	10.255.212.500	8,38%
2.1	1.522.502.200	132.257.249.760	11.777.714.700	9,63%
3	4.468.492.200	127.788.757.560	16.246.206.900	13,28%
4	4.718.137.300	123.070.620.260	20.964.344.200	17,13%
4.1	1.036.578.128	122.034.042.132	22.000.922.328	17.98%
5	6.504.068.189	115.529.973.943	28.504.990.517	23.30%
6	5.512.239.600	110.017.734.343	34.017.230.117	27.80%
7	2.197.630.700	107.820.103.643	36.214.860.817	29.60%

533

ecopetrol	ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL DE OBRA/SERVICIO		
	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		
	ECP-UCN-F-020	Elaborado 30/09/2011	Versión: 2

- La presente Acta sirve de base para la presentación de la correspondiente factura o cuenta de cobro por parte del CONTRATISTA.
- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el GESTOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

En constancia, se firma en Castilla a los 26 días del mes de Diciembre del 2012, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

Por el CONTRATISTA
FRANCISCO JAVIER VILLABONA
Representante Autorizado.

Por la GESTION ADMINISTRATIVA
LAURA JULIANA NIÑO FLOREZ
COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY S.A.

Por ECOPETROL S.A.
LUIS JOSE ALMEIDA PINZON
Administrador del Contrato MA-0009346

(7)

COPIA

NIT 830.810.196-7
IVA REGIMEN COMUN. NO SOY GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION 11946 DEL 29 12 98

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 1120
ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIO 106, TARIFA 7 X 96 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 320006012997, FECHA 2012 04 25
FACTURACION AUTORIZADA No. 3630 a la 4000 POR COMPUTADOR

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

No. PAGINA: - 1 of 2

FECHA: - 28/12/2012
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 55 7 21 Piso 1
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: - 3652 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL.: 57-1 2344000

No. ORDEN : 7527 SP

UN: PT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

CONCEPTO: ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL N°07
PERIODO DEL 16 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2012
HOJAS DE ENTRADA
1000848840 1000848845 1000848847 1000848851 1000848857 1000848860 1000848865 1000848867 1000848871 1000848877 1000848879 1000848882 1000848885 1000848886 1000848891 1000848895 1000848896 1000848899 1000848902
APROBACIONES
5001031531 5001031533 5001031534 5001031565 5001031566 5001031567 5001031568 5001031569 5001031570 5001031571 5001031572 5001031573 5001031574 5001031595 5001031596 5001031597 5001031598 5001031599 5001031600
Manifestamos que Independence Drilling S.A. ha efectuado los aportes a la seguridad social por los ingresos materia de esta facturación, dando cumplimiento al monto mínimo dispuesto por la ley para la base de cotización. El pago de los aportes a seguridad social respectivos se realizó bajo la planilla número 841984496 del mes de Noviembre de año 2012.

ECOPETROL S.A.
OFICINA CUENTAS
BOGOTA
28 DIC 2012
RECIBIDO

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,000	EQUIPO EN OPERACION	UN	1,000	304.307.709	304.307.709
2,000	EQUIPO EN OPERACION	UN	1,000	251.797.707	251.797.707
3,000	EQUIPO EN OPERACION	UN	1,000	287.684.207	287.684.207
4,000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	1,000	259.397.545	259.397.545
5,000	EQUIPO EN OPERACION	UN	1,000	253.940.474	253.940.474

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C CO)

Acepado - Cliente

534

NIT 830.120.168-7
IVA RÉGIMEN COMÚN/ NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RENTA RESOLUCION 11968 DEL 30-12-04

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 1520
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 366, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 320000012695, FECHA 2011-04-28
FACTURACION AUTORIZADA No. 2628 a la 5000 NO COMPUTADOR.

COPIA

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

FECHA: 28/12/2012
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 Piso 1
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: 3653 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1- 2344000

No. ORDEN: 7527 SP

UN: PT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

6.000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	UN	1.000	277.867.134	277.867.134
7.000	OPERACION DE EQUIPO	UN	1.000	292.378.803	292.378.803
8.000	OPERACION DE EQUIPO	UN	1.000	290.257.121	290.257.121

TOTAL:	2.197.650.700
BASE GRAVADA	175.810.456
BASE NO GRAVADA:	2.021.820.244
IVA 16 %	28.129.673
TOTAL A PAGAR	2.225.760.373

CONDICIONES DE PAGO: Contado a 30 días
VALOR EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL TRE SCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 00/100 M.L. **********

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptado - Cliente

535

ECOPETROL	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS Nro 8

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA-CHICHIMENE
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	26 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 15 DE ENERO DE 2013
VALOR PRESENTE ACTA	CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($ 4.210.390.000) SIN IVA

Mediante la suscripción de la presente Acta:

a) INDEPENDENCE DRILLING S.A., en adelante el CONTRATISTA, representado por FRANCISCO JAVIER VILLABONA TAMAYO, mayor de edad, vecino de la ciudad de BOGOTA, identificado con C.C. Nº 17.419.403 DE ACACIAS, META, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y

b) RODRIGO J HERNANDEZ R identificado con Cédula de Ciudadanía número 79.521.811 DE BOGOTA, quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

Dejan constancia de que,

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el 26 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 15 DE ENERO DE 2013, prestó los servicios contemplados en el contrato MA-0009346 que se relaciona en la presente acta de recibo de cantidades. El valor del servicio prestado en el periodo es el siguiente:

Cantidades Equipo 550 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	0,00	$ 350.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	0,00	$ 350.000.000	$ 0
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	3,00	$ 14.075.000	$ 42.225.000
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	9,00	$ 33.500.000	$ 301.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	2,00	$ 40.000.000	$ 80.000.000

PETROL	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	2,00	$ 60.000.000	$ 120.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 78.000.000	$ 0
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 90.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	96,67	$ 24.400.000	$ 2.358.674.800
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	20,02	$ 24.300.000	$ 486.510.300
2.3	Stand by	0,00	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	38,00	$ 1.300.000	$ 49.400.000
3.2	Campero sin conductor	37,00	$ 250.000	$ 9.250.000
3.3	Campero con conductor	42,00	$ 350.000	$ 14.700.000
3.4	Tarifa de planta	20,00	$ 450.000	$ 9.000.000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	0,00	$ 8.500.000	$ 0
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	0,00	$ 160.000	$ 0
3.7	Construcción de anclajes	0,00	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	84,00	$ 280.000	$ 23.520.000
3.9	Container adicional	0,00	$ 280.000	$ 0
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	17,00	$ 4.370.000	$ 74.290.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	42,00	$ 400.000	$ 16.800.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	1,00	$ 28.000.000	$ 28.000.000
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0,00	$ 250.000	$ 0
		TOTAL		$ 3.613.870.000

PETROL	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

Cantidades Equipo 350 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	0,00	$ 360.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	0,00	$ 360.000.000	$ 0
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	0,00	$ 28.000.000	$ 0
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	2,00	$ 30.500.000	$ 61.000.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	0,00	$ 38.500.000	$ 0
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	0,00	$ 63.500.000	$ 0
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 76.600.000	$ 0
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 84.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	16,271	$ 23.200.000	$ 377.487.200
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	0,917	$ 23.100.000	$ 21.182.700
2.3	Stand by	0	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	7	$ 1.300.000	$ 9.100.000
3.2	Campero sin conductor	0	$ 250.000	$ 0
3.3	Campero con conductor	6	$ 350.000	$ 2.100.000
3.4	Tarifa de planta	5	$ 450.000	$ 2.250.000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	7	$ 8.500.000	$ 59.500.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	0	$ 160.000	$ 0
3.7	Construcción de anclajes	0	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	14	$ 280.000	$ 3.920.000
3.9	Container adicional	33	$ 280.000	$ 9.240.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	2	$ 4.370.000	$ 8.740.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	105	$ 400.000	$ 42.000.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	0	$ 28.000.000	$ 0

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
PETROL	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0	$ 250.000	$ 0
		TOTAL		$ 596[illegible]

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el COORDINADOR DE GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO.

En constancia, se firma en Villavicencio 21 de Enero de 2013, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

Por el CONTRATISTA

FRANCISCO JAVIER VILLABONA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Por la GESTION TÉCNICA

RODRIGO J HERNANDEZ ECOPETROL S.A.

539

	ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL DE OBRA/SERVICIO		
ecopetrol	GESTION DE ABASTECIMIENTO DIRECCION ESTRATEGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-082	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL DE SERVICIO Nº 8 AL CONTRATO MA-0009346

CONTRATO:	**MA-0009346**
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 – 2016.**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**($122.351.947.960)** CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR IVA.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	**(1005)** MIL CINCO DIAS CALENDARIO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 LO QUE OCURRA PRIMERO.
MAYOR CANTIDAD 1	**($5.957.053.280)** CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y TRES DOSCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
MAYOR CANTIDAD 2	**($4.049.217.320)** CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
MAYOR CANTIDAD 3	**($8.005.790.580)** OCHO MIL CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR IVA.
MAYOR CANTIDAD 4	**($3.670.955.320)** TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**($144.034.964.460)** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR IVA.
SALDO DEL CONTRATO	**($103.609.713.743)** CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA
VALOR EJECUTADO	**($40.425.250.717)** CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	09/06/2012
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO:	31/12/2014
FECHA DE CORTE:	15/01/2013
PERIODO FACTURADO:	27/12/2012 – 15/01/2013
PORCENTAJE DE PAGO:	33.04%
ADMINISTRADOR:	LUIS JOSE ALMEIDA PINZON
GESTOR DEL CONTRATO:	COPCO S.A.
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.

540

ECOPETROL S.A.
SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA- CHICHIMENE
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 8 - CONTRATO MA-0005346

El día 21 de Enero de 2013, se reunieron en las oficinas del Departamento de Producción de la Superintendencia de Operaciones Castilla- Chichimene, el Ing. Francisco Villabona en representación de Independence Drilling S.A. y el Ingeniero Rodrigo J Hernandez R en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes:

Periodo de liquidación: 26 de diciembre de 2012 **AL** 15 de enero de 2013

Equipo 550 HP

1	**TARIFAS DE MOVILIZACION**					
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$ 350.000.000		$	-
1.2	Movilización final		$ 350.000.000		$	-
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 14.075.000	3,00	$	42.225.000
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 33.500.000	9,00	$	301.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$ 40.000.000	2,00	$	80.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$ 60.000.000	2,00	$	120.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$ 76.000.000		$	-
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$ 90.000.000		$	-
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 24.400.000	96,667	$	2.358.674.800
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 24.300.000	20,021	$	486.510.300
2.3	Stand by	DIA	$ 18.000.000		$	-
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$ 1.300.000	38,00	$	49.400.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$ 250.000	37,00	$	9.250.000
3.3	Campero con conductor	DIA	$ 350.000	42,00	$	14.700.000
3.4	Tarifa de planta	DIA	$ 450.000	20,00	$	9.000.000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$ 8.500.000		$	-
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$ 160.000		$	-
3.7	Construcción de anclajes	EA	$ 1.800.000		$	-
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$ 280.000	84,00	$	23.520.000
3.9	Container adicional	DIA	$ 280.000		$	-
3.10	Aseo, limpieza y locatizaciones (con rocería)	EA	$ 4.370.000	17,00	$	74.290.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 400.000	42,00	$	16.800.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	HES	$ 28.000.000	1,00	$	28.000.000
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$ 250.000		$	-
	SUBTOTAL				$	**3.613.870.100,00**
	BASE GRAVABLE				$	**289.109.608,00**
	FACTOR DE SERVICIO				$	-
	TOTAL BASE GRAVABLE				$	**289.109.608,00**
	BASE NO GRAVABLE				$	**3.324.760.492,00**
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				$	**3.613.870.100,00**
	IVA BASE GRAVABLE				$	**46.257.537,28**
	TOTAL EQUIPO DE WO 550HP				$	**3.660.127.637,28**

Equipos 550 HP - Tanque Bomba

1	**TARIFAS DE MOVILIZACION**					
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$ 360.000.000		$	-
1.2	Movilización final		$ 360.000.000		$	-
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 29.000.000		$	-
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 30.500.000	2,00	$	61.000.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$ 38.500.000		$	-
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$ 63.500.000		$	-
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$ 76.600.000		$	-
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$ 84.000.000		$	-
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 23.200.000	16,271	$	377.487.200
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 23.100.000	0,917	$	21.182.700
2.3	Stand by	DIA	$ 18.000.000		$	-
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$ 1.300.000	7	$	9.100.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$ 250.000		$	-
3.3	Campero con conductor	DIA	$ 350.000	6	$	2.100.000
3.4	Tarifa de planta	DIA	$ 450.000	5	$	2.250.000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$ 8.500.000	7	$	59.500
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$ 160.000		$	-
3.7	Construcción de anclajes	EA	$ 1.800.000		$	-
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$ 280.000	14	$	3.920.000
3.9	Container adicional	DIA	$ 280.000	33	$	9.240.000
3.10	Aseo, limpieza y locatizaciones (con rocería)	EA	$ 4.370.000	2	$	8.740.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 400.000	105	$	42.000.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	HES	$ 28.000.000		$	-
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$ 250.000		$	-
	SUBTOTAL				$	**596.519.900,00**
	BASE GRAVABLE				$	**47.721.592,00**
	FACTOR DE SERVICIO				$	-
	TOTAL BASE GRAVABLE				$	**47.721.592,00**
	BASE NO GRAVABLE				$	**548.798.308,00**
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				$	**596.519.900,00**
	IVA BASE GRAVABLE				$	**7.635.454,72**
	TOTAL EQUIPO DE WO				$	**604.155.354,72**

Acacias	$ 2.076.772.750,00	49%
Castilla La Nueva	$ 1.709.529.583,34	40%
Cusiana	$ 475.666,66	11%
Total	$ 4.286.778.000	100%

En constancia de lo anterior firman los representantes de las partes:

FRANCISCO VILLABONA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
REPRESENTANTE DELEGADO

RODRIGO J HERNANDEZ R
ECOPETROL
GESTOR TECNICO

LUIS JOSE ALMEIDA PINZON
ECOPETROL
ADMINISTRADOR

3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0	$ 250.000	$ 0
	TOTAL			$ 596.519.900

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el COORDINADOR DE GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO.

En constancia, se firma en Villavicencio 21 de Enero de 2013, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

Independence ENERGY VILLAVICENCIO

Por el CONTRATISTA

FRANCISCO JAVIER VILLABONA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Por la GESTIÓN TÉCNICA

RODRIGO J HERNANDEZ ECOPETROL S.A.

541

ECOPETROL S.A.
SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA- CHICHIMENE
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 8 - CONTRATO MA-0009348

El día 21 de Enero de 2013, se reunieron en las oficinas del Departamento de Producción de la Superintendencia de Operaciones Castilla- Chichimene, el Ing. Francisco Villabona en representación de Independence Drilling S.A. y el Ingeniero Rodrigo J Hernandez R en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes:

Periodo de liquidación: 26 de diciembre de 2012 AL 15 de enero de 2013

Equipo 550 HP

1	**TARIFAS DE MOVILIZACION**						
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$	350.000.000		$	-
1.2	Movilización final		$	350.000.000		$	-
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$	14.075.000	3,00	$	42.225.000
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$	33.500.000	9,00	$	301.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10,1-30 km	EA	$	40.000.000	2,00	$	80.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30,1-60 km	EA	$	60.000.000	2,00	$	120.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60,1-100 km	EA	$	78.000.000		$	-
1.8	Movilización entre pozos 100,1 km hasta 120 km	EA	$	90.000.000		$	-
2							
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$	24.400.000	96,667	$	2.358.674.800
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$	24.300.000	20,021	$	486.510.300
2.3	Stand by	DIA	$	18.000.000		$	-
3							
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$	1.300.000	38,00	$	49.400.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$	250.000	37,00	$	9.250.000
3.3	Campero con conductor	DIA	$	350.000	42,00	$	14.700.000
3.4	Tarifa de planta	DIA	$	450.000	20,00	$	9.000.000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$	8.500.000		$	-
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$	160.000		$	-
3.7	Construcción de anclajes	EA	$	1.800.000		$	-
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$	280.000	84,00	$	23.520.000
3.9	Container adicional	DIA	$	280.000		$	-
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	EA	$	4.370.000	17,00	$	74.290.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$	400.000	42,00	$	16.800.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$	28.000.000	1,00	$	28.000.000
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EDES	GLOBAL	$	250.000		$	-
	SUBTOTAL					$	**3.613.870.100,00**
	BASE GRAVABLE					$	**289.109.608,00**
	FACTOR DE SERVICIO					$	-
	TOTAL BASE GRAVABLE					$	**289.109.608,00**
	BASE NO GRAVABLE					$	**3.324.760.492,00**
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					$	**3.613.870.100,00**
	IVA BASE GRAVABLE					$	**46.257.537,28**
	TOTAL EQUIPO DE WO 550HP					$	**3.660.127.637,28**

Equipos 350 HP - Tanque Bombe

1	**TARIFAS DE MOVILIZACION**						
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$	360.000.000		$	-
1.2	Movilización final		$	360.000.000		$	-
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$	28.000.000		$	-
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$	30.500.000	2,00	$	61.000.000
1.5	Movilización entre pozos 10,1-30 km	EA	$	38.500.000		$	-
1.6	Movilización entre pozos 30,1-60 km	EA	$	61.500.000		$	-
1.7	Movilización entre pozos 60,1-100 km	EA	$	76.600.000		$	-
1.8	Movilización entre pozos 100,1 km hasta 120 km	EA	$	84.000.000		$	-
2							
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$	23.290.000	16,271	$	377.487.200
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$	23.100.000	0,917	$	21.182.700
2.3	Stand by	DIA	$	18.000.000		$	-
3							
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$	1.300.000	7	$	9.100.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$	250.000		$	-
3.3	Campero con conductor	DIA	$	350.000	6	$	2.100.000
3.4	Tarifa de planta	DIA	$	450.000	5	$	2.250.000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$	8.500.000	7	$	59.500.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$	160.000		$	-
3.7	Construcción de anclajes	EA	$	1.800.000		$	-
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$	280.000	14	$	3.920.000
3.9	Container adicional	DIA	$	280.000	33	$	9.240.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	EA	$	4.370.000	2	$	8.740.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$	400.000	105	$	42.000.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$	28.000.000		$	-
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EDES	GLOBAL	$	250.000		$	-
	SUBTOTAL					$	**596.519.900,00**
	BASE GRAVABLE					$	**47.721.592,00**
	FACTOR DE SERVICIO					$	-
	TOTAL BASE GRAVABLE					$	**47.721.592,00**
	BASE NO GRAVABLE					$	**548.798.308,00**
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					$	**596.519.900,00**
	IVA BASE GRAVABLE					$	**7.635.454,72**
	TOTAL EQUIPO DE WO					$	**604.155.354,72**

Acacias	[redacted]	49%
Castilla La Nueva	[redacted]	40%
Guamal	[redacted]	11%
Total	[redacted]	100%

En constancia de lo anterior firman los representantes de las partes:

FRANCISCO VILLABONA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
REPRESENTANTE DELEGADO

RODRIGO J HERNANDEZ R
ECOPETROL
GESTOR TECNICO

LUIS JOSE ALMEIDA PINZON
ECOPETROL
ADMINISTRADOR

ECOPETROL S.A.
SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA- CHICHIMENE
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 8 - CONTRATO HA-0009346

El día 21 de Enero de 2013, se reunieron en las oficinas del Departamento de Producción de la Superintendencia de Operaciones Castilla- Chichimene, el Ing. Francisco Villabona en representación de Independence Drilling S.A. y el Ingeniero Rodrigo J Hernandez R en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes:

Periodo de liquidación: 26 de diciembre de 2012 AL 15 de enero de 2013

Equipo 550 HP

	TARIFAS DE MOVILIZACION					
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$	350.000.000		$ -
1.2	Movilización final		$	350.000.000		$ -
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$	14.075.000	3,00	$ 4[redacted]000
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$	33.500.000	9,00	$ 30[redacted]000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$	40.000.000	2,00	$ 8[redacted]000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$	60.000.000	2,00	$ 120.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$	78.000.000		$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$	90.000.000		$ -
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$	24.400.000	96,67	$ 2.358.674.800
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$	24.300.000	20,02	$ 486.510.300
2.3	Stand by	DIA	$	18.000.000		$ -
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$	1.300.000	38,00	$ 49.400.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$	250.000	37,00	$ 9.250.000
3.3	Campero con conductor	DIA	$	350.000	42,00	$ 14.700.000
3.4	Tarifa de planta	DIA	$	450.000	20,00	$ 9.000.000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$	8.500.000		$ -
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$	160.000		$ -
3.7	Construcción de anclajes	EA	$	1.800.000		$ -
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$	280.000	84,00	$ 23.520.000
3.9	Container adicional	DIA	$	200.000		$ -
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	EA	$	4.370.000	17,00	$ 74.290.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$	400.000	42,00	$ 16.800.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$	28.000.000	1,00	$ 28.000.000
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$	250.000		$ -
	SUBTOTAL					$ 3.[redacted]00
	BASE GRAVABLE					$ [redacted]00
	FACTOR DE SERVICIO					$ [redacted]
	TOTAL BASE GRAVABLE					$ 289.[redacted]00
	BASE NO GRAVABLE					$ 3.324.760.493,00
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					$ 3.613.870.700,00
	IVA BASE GRAVABLE					$ 46.257.527,28
	TOTAL EQUIPO DE WO 550HP					$ 3.660.127.927,28

Equipos 350 HP - Tanque Bomba

	TARIFAS DE MOVILIZACION					
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$	360.000.000		$ [redacted]
1.2	Movilización final		$	360.000.000		$ [redacted]
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$	28.000.000		$ -
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$	30.500.000	2,00	$ 61.000.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$	38.500.000		$ -
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$	63.500.000		$ -
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$	76.600.000		$ -

1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$	84.000.000		$ -
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$	23.200.000	16,271	$ 377.487.200
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$	23.100.000	0,917	$ 21.182.700
2.3	Stand by	DIA	$	18.000.000		$ -
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$	1.300.000	7	$ 9.100.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$	250.000		$ -
3.3	Campero con conductor	DIA	$	350.000	6	$ 2.100.000
3.4	Tanfa de planta	DIA	$	450.000	5	$ 2.250.000
3.5	Tanfa de circulación de pozos	DIA	$	8.500.000	7	$ 59.500.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$	160.000		$ -
3.7	Construcción de anclajes	EA	$	1.800.000		$ -
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$	280.000	14	$ 3.920.000
3.9	Container adicional	DIA	$	280.000	33	$ 9.240.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	EA	$	4.370.000	2	$ 8.740.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$	400.000	105	$ 42.000.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$	28.000.000		$ -
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$	250.000		$ -
	SUBTOTAL					$ 594.519.900,00
	BASE GRAVABLE					$ 47.721.592,00
	FACTOR DE SERVICIO					
	TOTAL BASE GRAVABLE					$ 47.721.592,00
	BASE NO GRAVABLE					$ 546.798.308,00
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					$ 594.519.900,00
	IVA BASE GRAVABLE					$ 7.633.458,72
	TOTAL EQUIPO DE WO					$ 604.153.358,72

Acacías	$ 2.007.886.750,00	48%
Castilla La Nueva	$ 1.737.529.583,34	41%
Guamal	$ 464.971.666,66	11%
Total	$ 4.210.390.000	100%

En constancia de lo anterior firman los representantes de las partes:

FRANCISCO VILLABONA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
REPRESENTANTE DELEGADO

RODRIGO J HERNANDEZ R
ECOPETROL
GESTOR TECNICO

LUIS JOSE OLMEDA PINZON
ECOPETROL
ADMINISTRADOR

CONTRATO MA-0009346 8

Desde **26-Dec-12** Hasta **15-Jan-13**

Tanque Bomba

[illegible]	[illegible]
26-Dec-12	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Cantidades	[illegible]
Total	[illegible]


Factor de Servicio (%) [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	0	0	0	0
[illegible]	0	0	0	0
[illegible]	0	0	0	0
[illegible]	0	0	0	0
[illegible]	0	0	0	0
[illegible]	0	0	0	0
Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	0	0	0	0	[illegible]
Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

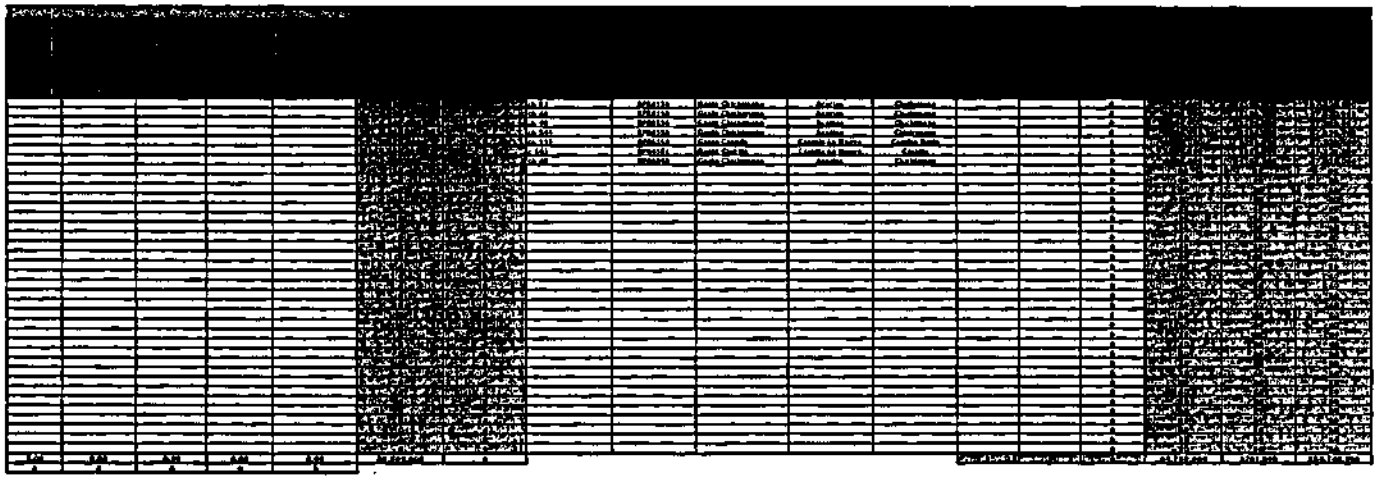

LIQUIDACION PARCIAL

Tarifas de Operación

10/12/2012									27.0									1.0
27/12/2012								13.0	8.5		2.0							1.0
28/12/2012								16.0	6.0									1.0
29/12/2012								19.5	9.5									
30/12/2012								15.0										1.0
31/12/2012																		
01/01/2013																		1.0
02/01/2013								8.5	10.5									1.0
03/01/2013								10.0	1.0									
04/01/2013									3.5									
05/01/2013								3.0	0.0									1.0
06/01/2013								21.0	2.0									1.0
07/01/2013								13.5	1.5									
08/01/2013								13.0	1.0									1.0
09/01/2013								13.0	1.0		1.0							1.0
10/01/2013								13.5	0.5									1.0
11/01/2013								14.0	0.0									1.0
12/01/2013								13.5	11.5									1.0
13/01/2013								19.0	1.0									
14/01/2013								17.50										1.0
15/01/2013								23.0	1.0									1.0
								22.5	1.5									
Cantidades	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	115.50	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
Total	0	0	33.699.808	0	0	0	0	364.491.807	116.643.750	0	3.599.904	0	0	0	0	0	0	1000.000


Tasas de Servicio (%)

Costa Castilla	0	0	0	0
Costa Chichimene	0	0	0	0
CM Castilla MD	74.864.933	5.595.873	287.162.731	318.106.606
CM Castilla IF	0	0	0	0
CM Castilla TF	0	0	0	0
CM Chichimene MD	12.615.366	2.993.366	143.127.856	157.565.864
CM Chichimene IF	0	0	0	0
CM Chichimene TF	0	0	0	0
Total	87.614.833	8.868.373	430.290.683	473.671.790

Arauco	12.615.366	2.993.366	143.127.856	157.565.864	33.6%
Castilla La Nueva	74.868.933	5.595.873	287.162.731	318.106.606	78.4%
Chirimia	0	0	0	0	0.0%
Total	87.614.833	8.868.373	430.290.683	473.671.790	112.0%

GERENTE TECNICO
ECOPETROL

REPRESENTANTE
DELEGADO
TRANSPORDINCE

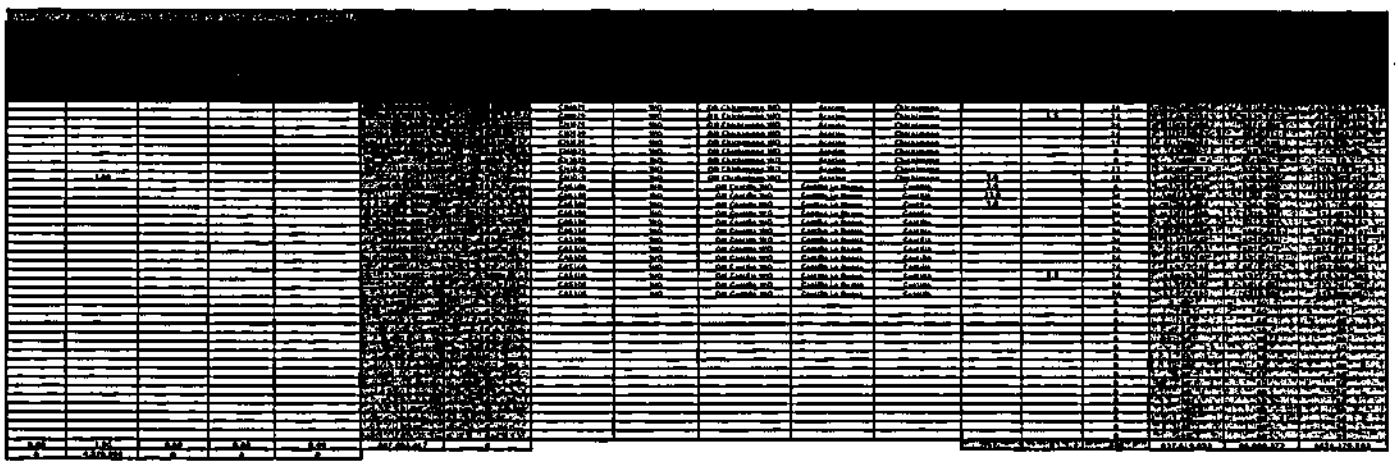

Desde 26-Dec-12
Torre 27 - 350 MP

Hasta 15-Jan-13

21 de enero de 2013

PARA: LUIS JOSE ALMEDA PINEDA
Administrador del Contrato

APROBÓ: Johanna Gutierrez Montes


CONTRATO: 04-0000345

ASUNTO: MANTENIMIENTO, RECONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE POZOS PDVSA, S.A. CRUDOS LAS MERCEDES 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y


CONTRATISTA: INCOMPOSINCE HALLIBURTON S.A.


Desde	26-dic-12
Hasta	15-ene-13

Valor Contrato sin IVA (Bs)	Bs 344.834.944,000
Valor Ejecutado	Bs 36.300.000,417
Valor a Pagar	Bs 4.356.720,000
Valor Total Ejecutado	Bs 40.656.440,417
Porcentaje de Ejecución Valor	11,11 %
Plazo de Ejecución	336
Fecha de Inicio	09-Jun-12
Fecha estimada de Terminación	31-dic-13
Plazo Real de Ejecución	939
Avance de Tiempo (días)	336
Porcentaje de Ejecución en Tiempo	24%

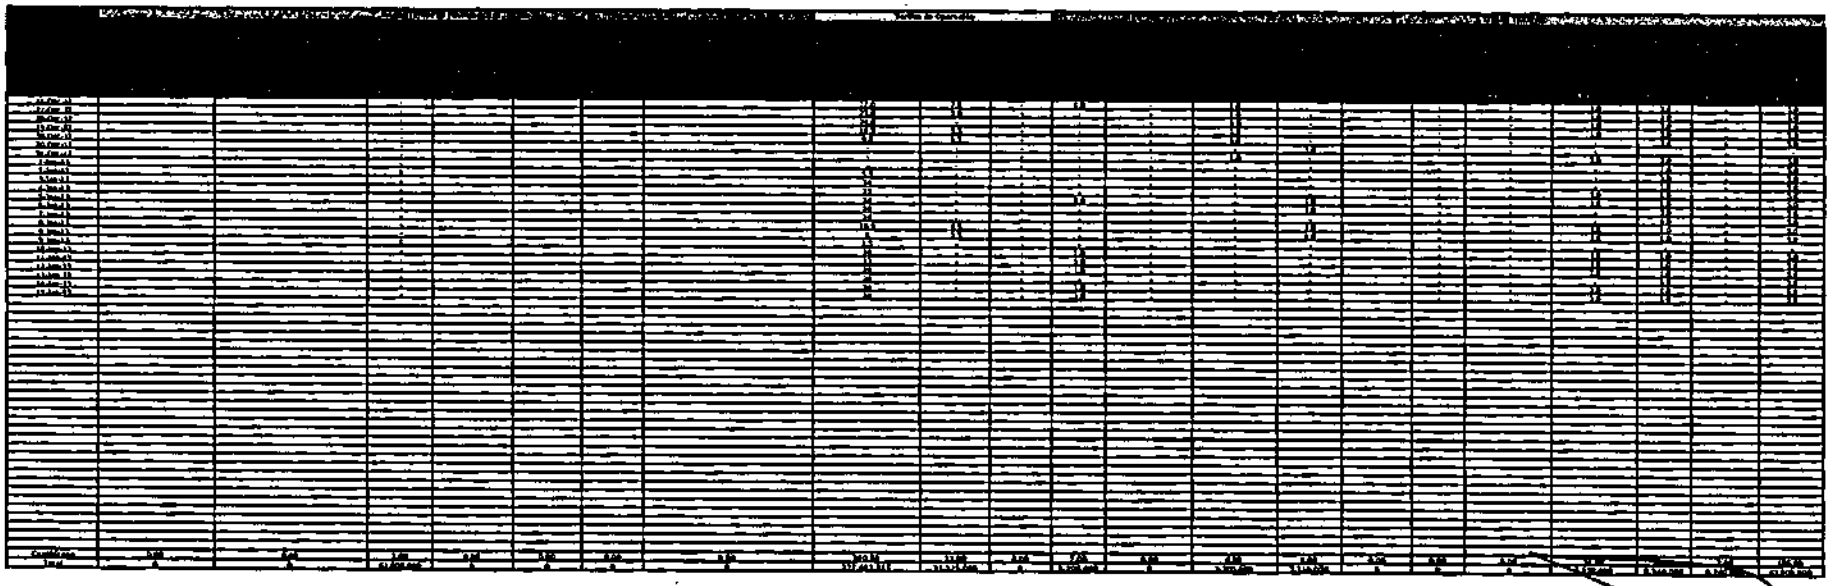


Fecha de Corte: [redacted]










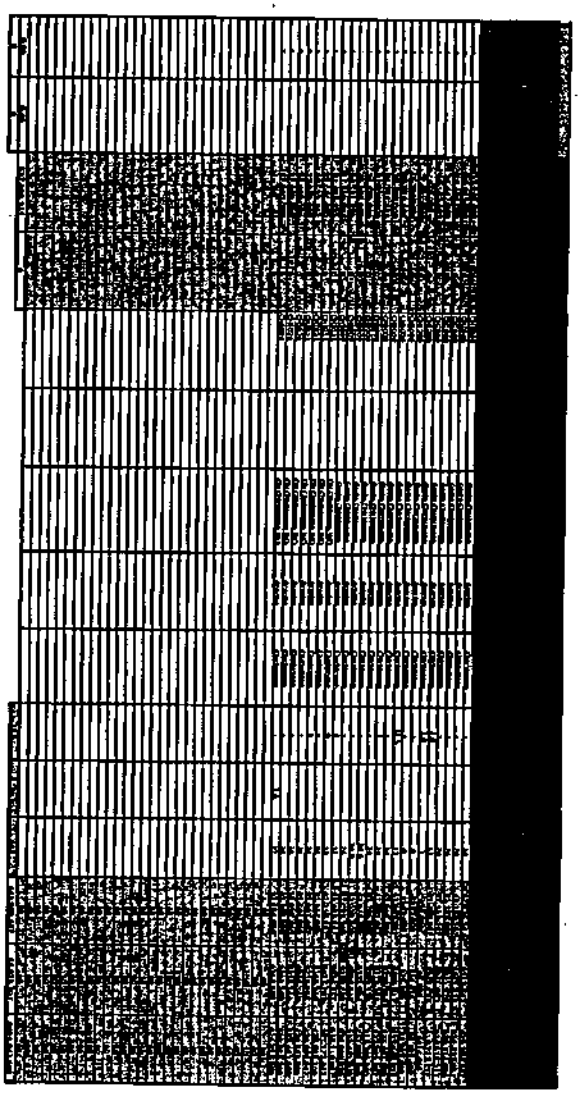

LIQUIDACION PARCIAL 8
CONTRATO MA-0009346

Desde 26-Dec-12 **Hast**

Torre 28 - 550 HP

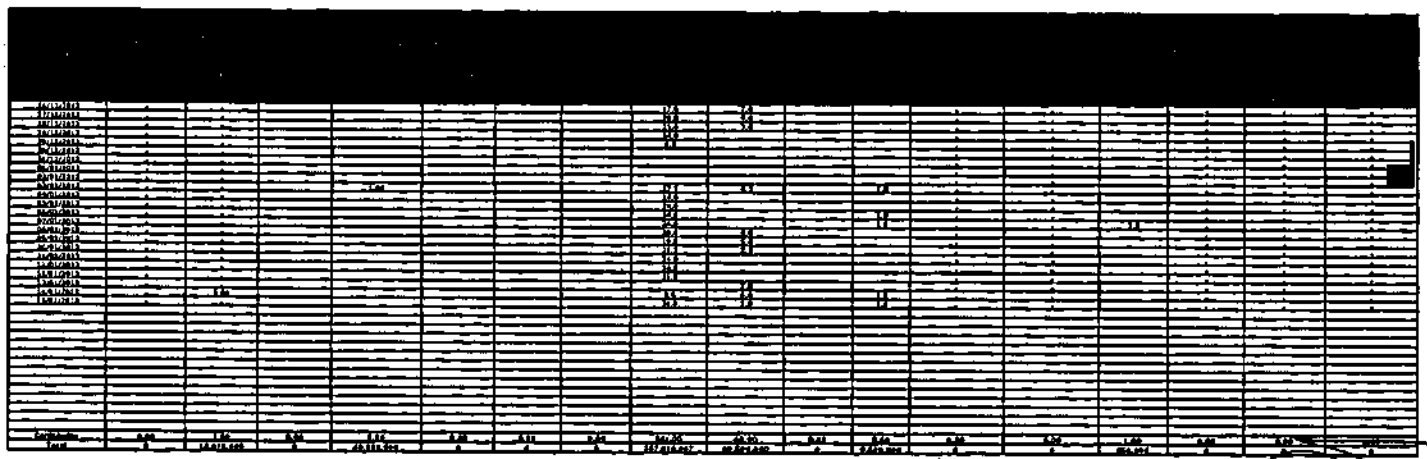


Factor de Servicio (%) [redacted]

[redacted]					

[redacted]					

5446


15-Jan-13

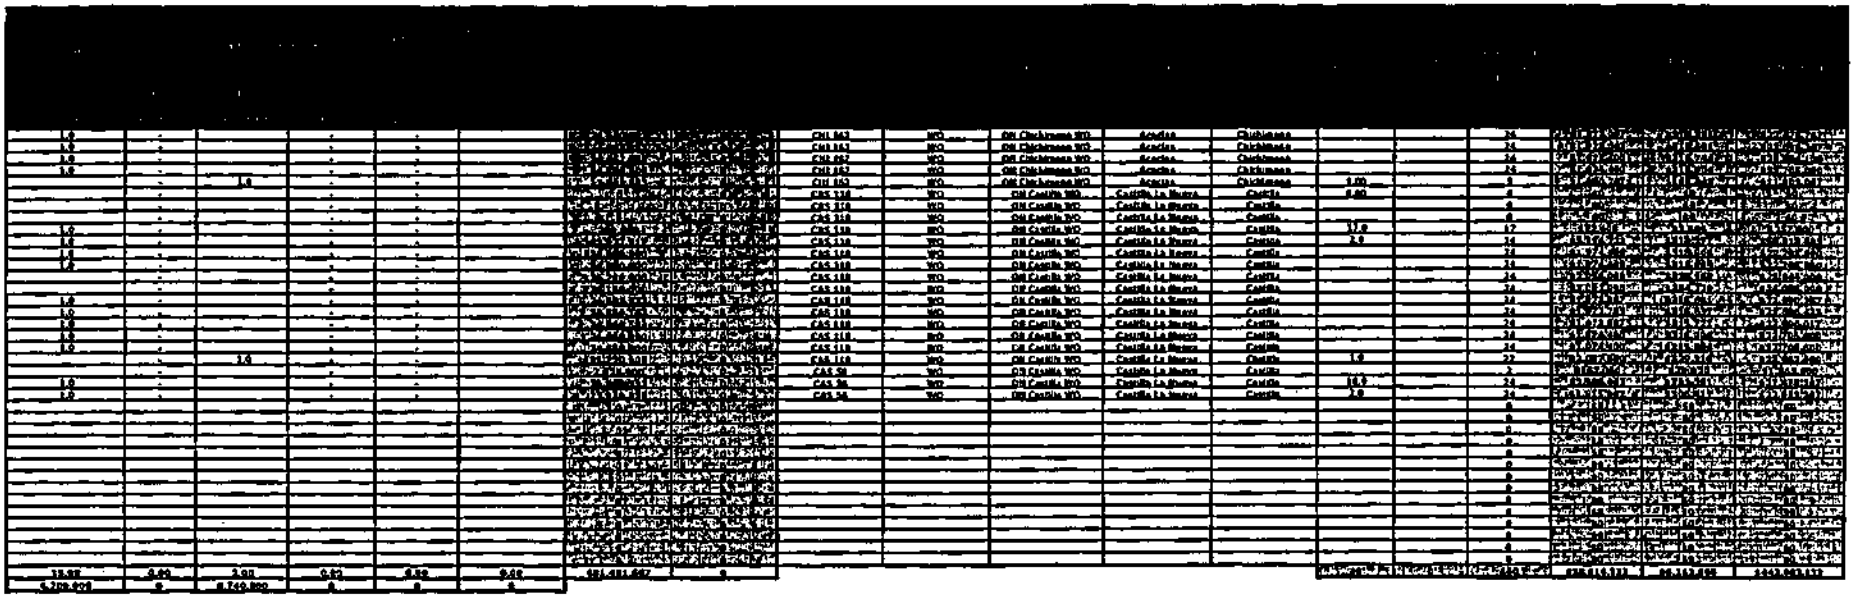


LIQUIDACION PARCIAL 6
CONTRATO MA-0009346


Desde **26-Dec-12** Hasta **15-Jan-13**


Torre 31 - 850 HP

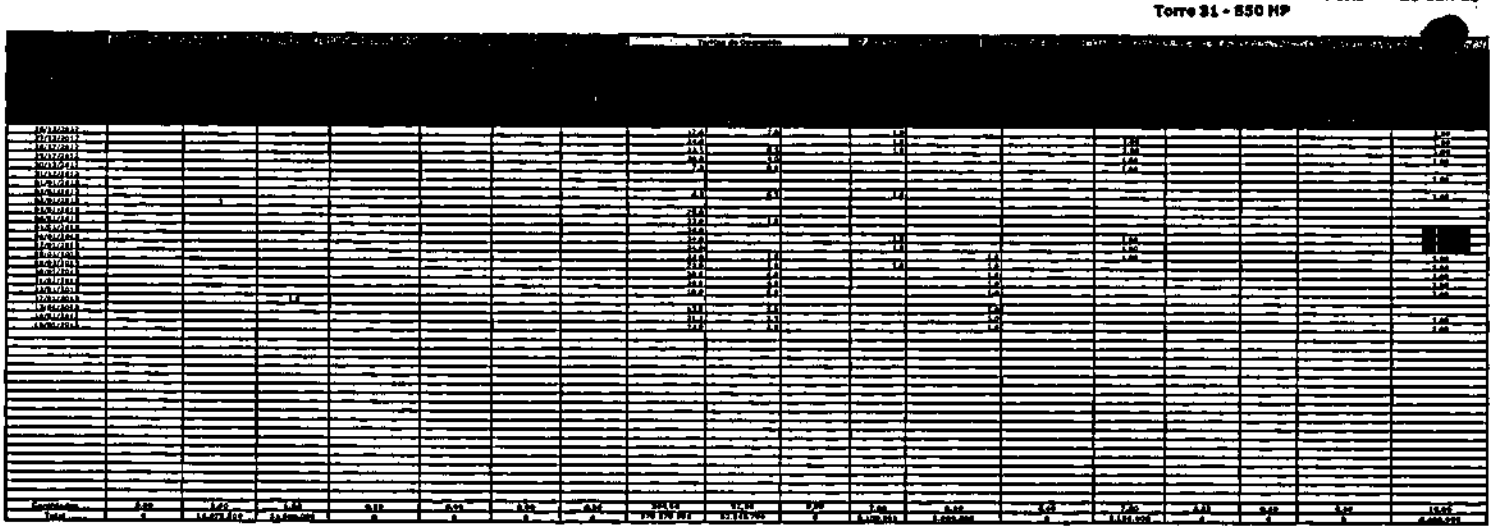

Factor de Servicio (%) [redacted]










LIQUIDACION PARCIAL 8
CONTRATO MA-0009346


Desde 26-Dec-12 Hasta 15-Jan-13

Torre 32 - 550 HP

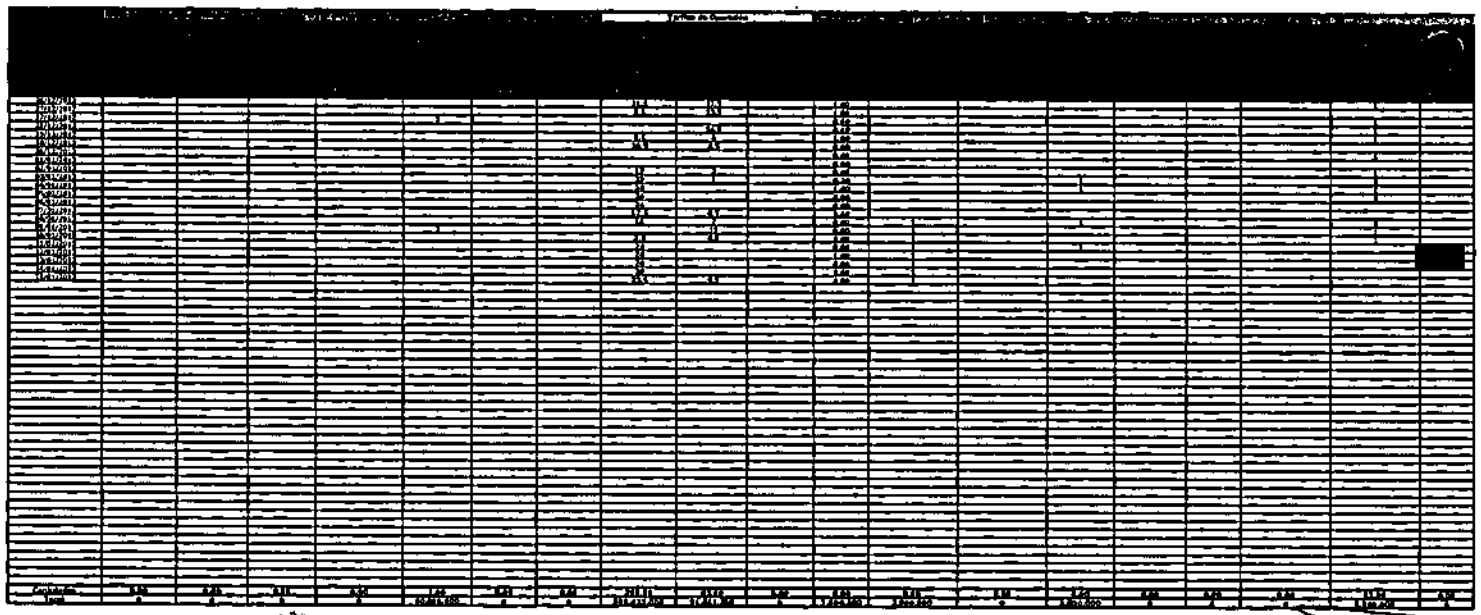






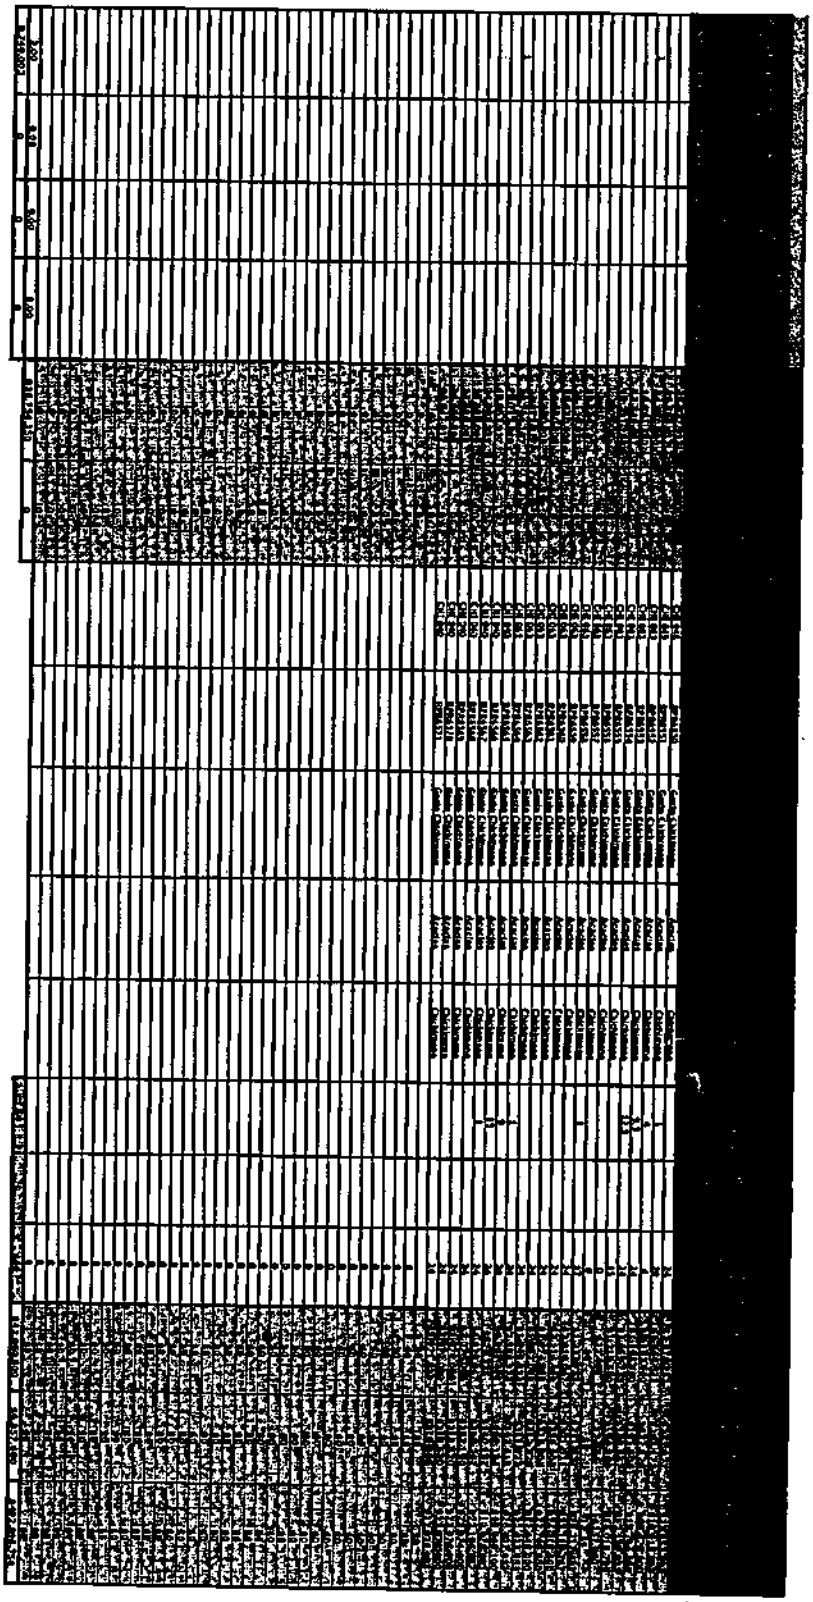

LIQUIDACION PARCIAL 8
CONTRATO NA-0009246


Desde 26-Dec-12 Hasta 15-Jan-13

Torre 34 - 550 MP

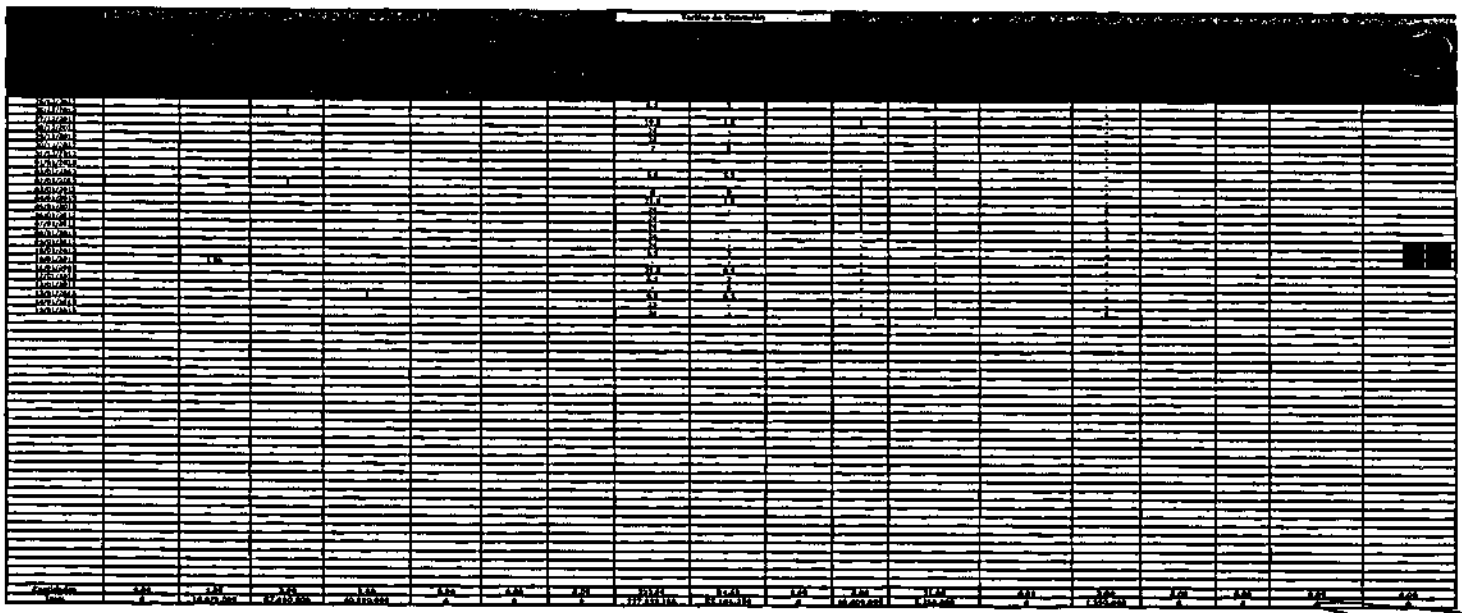






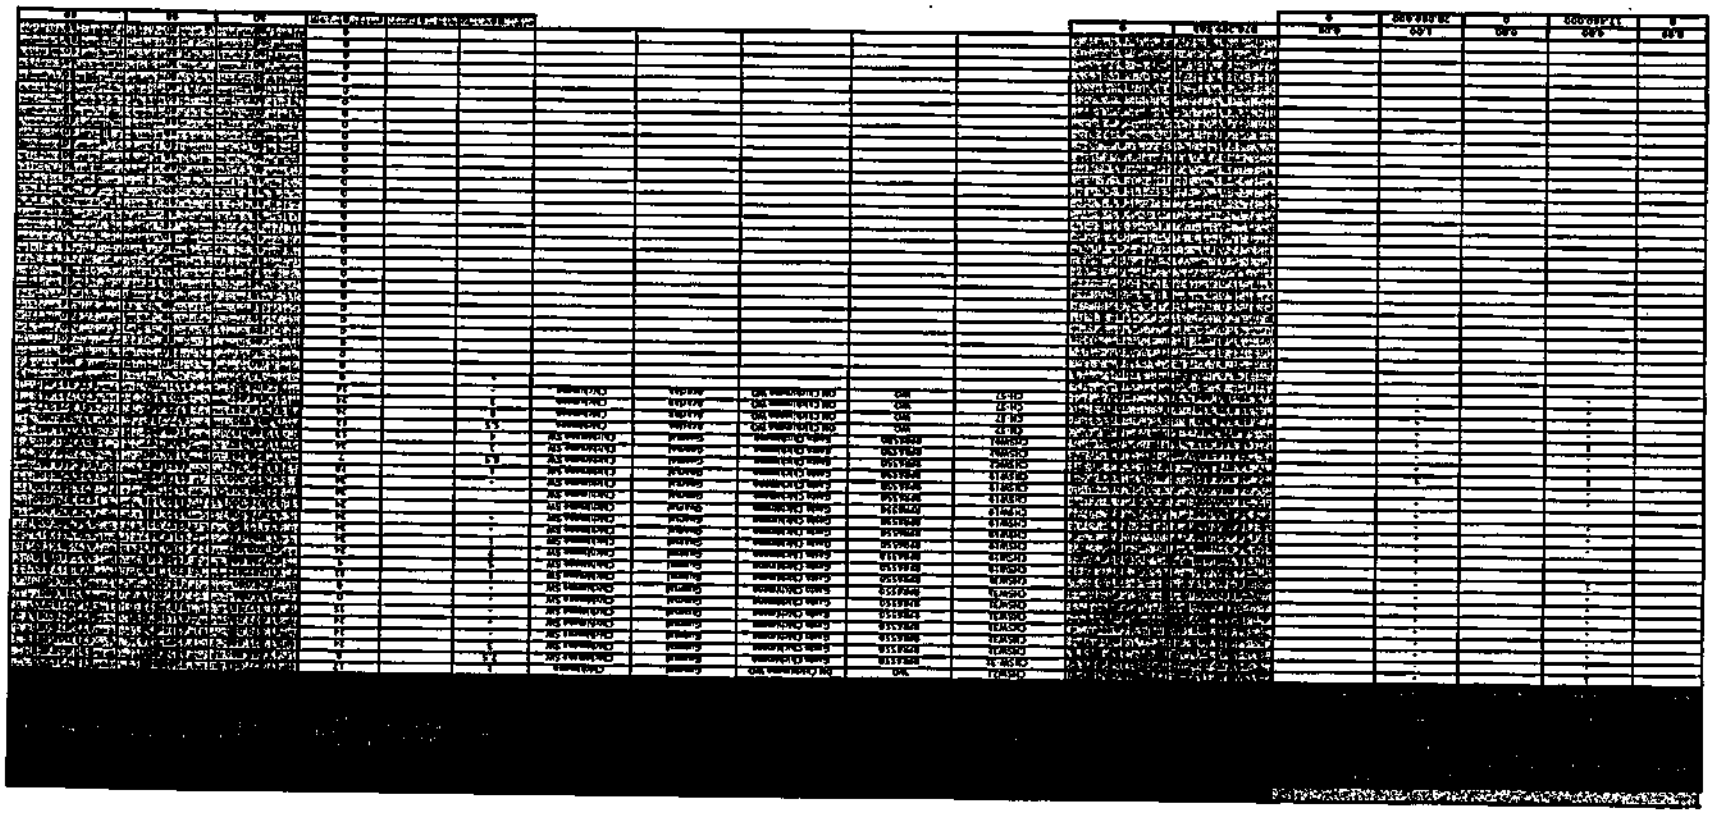

LIQUIDACION PARCIAL 8
CONTRATO MA-0009346

Desde 26-Dec-12 Hasta 15-Jan-13

Torre 42 - 550 HP

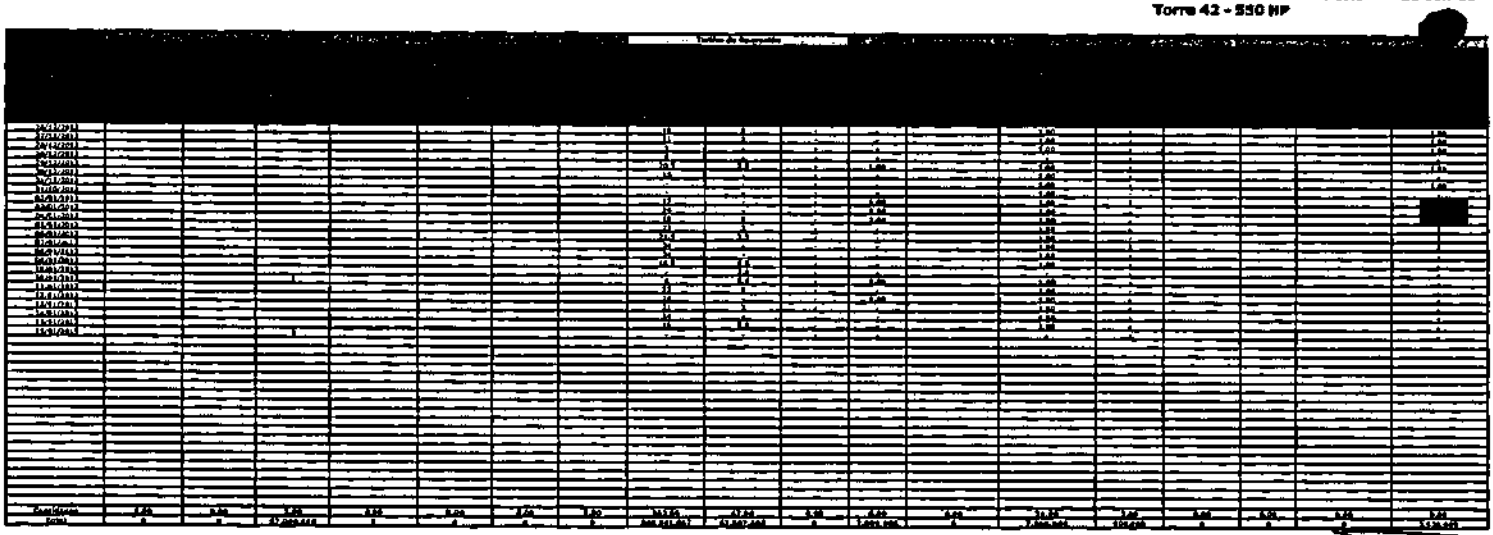

Factor de duración (%) [redacted]


[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Otr Costo UPS	22.573.000	2 376.519	304.170.000	300.605.520
Otr Costo BC	0	0	0	0
Otr Costo SC	0	0	0	0
Otr Obras/Mano BC	0	0	0	0
Otr Obras/Mano SC	0	0	0	0
Otr Obras/Mano TP	0	0	0	0
Total	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Acreedor	0	0	0	0	0.0%
Cuentas por Cobrar	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Deudor	0	0	0	0	0.0%
Total	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	100.0%

LIQUIDACION PARCIAL 8
CONTRATO MA-0009348


Desde 26-Dec-12 Hasta 15-Jan-13

Torre 123- 550 HP

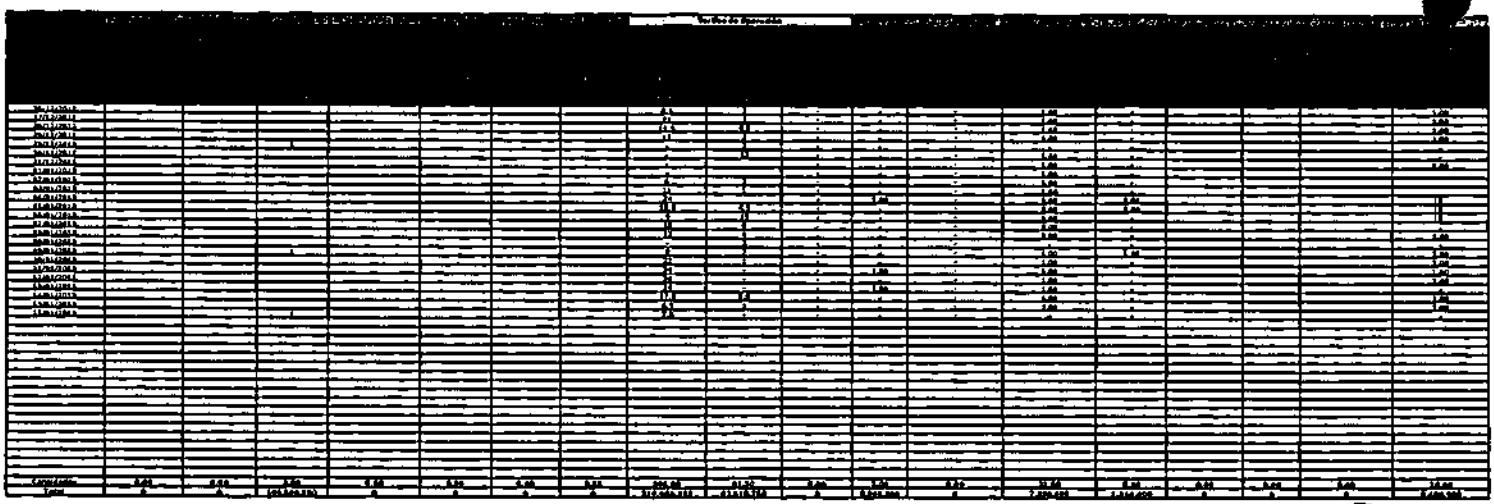





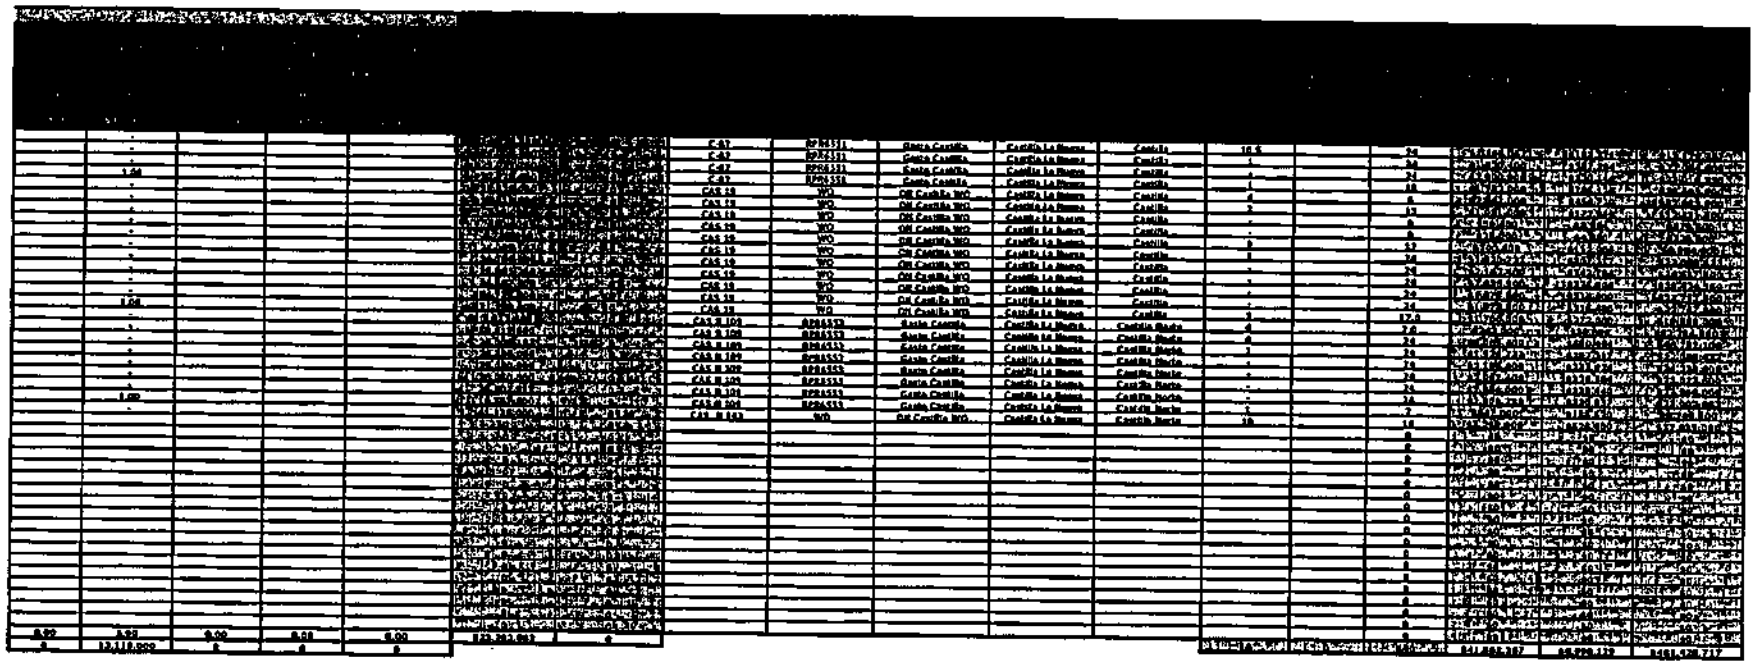

NIT. 830 110 894-7
IVA REGIMEN COMUN SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION 11944 DEL 23 12 61
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 041250 DEL 26 12 2012

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 1120
ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIO 204, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUTION DIAN No. 320009128997, FECHA 2011-06-28
FACTURACION AUTORIZADA No. 2620 a la 5000 POR COMPUTADOR

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

ORIGINAL

Independence

No. PAGINA: - 1 of 7

FECHA: - 15/02/2013 FACTURA DE VENTA No: - 3769 RI

CLIENTE ECOPETROL S.A. NIT: 899.999.068-1

DIRECCION: CL 35 7 21 Piso 1 TEL.: 57-1 2344000
BOGOTA

No. ORDEN: 7668 SP

UN: PT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

CONCEPTO: ACTA LIQUIDACION PARCIAL No. 8 . PERIODO 26 DE DIC DE 2012 AL 15 DE ENERO DE 2013
HOJAS DE ENTRADA
1000866560 1000866558 1000866561 1000866566 1000866572 1000866579 1000866582 1000866589 1000866583
1000866591 1000866596 1000866599 1000866600 1000866602 1000866606 1000866607 1000866711 1000866652
1000866646 1000866713 1000866653 1000866648 1000866714 1000866655 1000866715 1000866657 1000866744
1000866747 1000866752 1000866748 1000866755 1000866750
APROBACIONES
5001056895 5001056899 5001056902 5001056903 5001056907 5001056908 5001056911 5001056912 5001056927
5001056928 5001056929 5001056930 5001056931 5001056934 5001056955 5001056956 5001057057 5001057058
5001057248 5001057060 5001057061 5001057062 5001057063 5001057064 5001057105 5001057106 5001057107
5001057249 5001057109 5001057250 5001057252 5001057112
Manifestamos que Independence Drilling S.A. ha efectuado los aportes a la seguridad social por los ingresos materia de esta facturación, dando cumplimiento al monto máximo dispuesto por la ley para la base de cotización. El pago de los aportes a seguridad social respectivos se realizó bajo la planilla número 84211997966 del mes de Enero 2013

ECOPETROL S.A. OFICINA CUENTAS BOGOTA 18 FEB 2013 RECIBIDO

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 0 A 30 KM	UN	2.000	30.500.000	61.000.000
2.000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	390.500	966.667	377.483.335
3.000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	22.000	962.850	21.182.700
4.000	CAMPERO CON CONDUCTOR	DI	6.000	350.000	2.100.000
5.000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	DI	7.000	1.300.000	9.100.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION DESPUES DE LA FECHA SE CONSIDERA INTERES POR MORA, AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.).

Aceptado - Cliente

592

NIT 899 999 068-1
IVA RÉGIMEN COMÚN. GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCIÓN 11934 DEL 27-12-04
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 010039 DEL 26-12-2012

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE ICA

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1120
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL 354, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCIÓN DIAN No. 320004923687, FECHA 2013-06-25
FACTURACIÓN AUTORIZADA No. 2430 a la 4999 POR COMPUTADOR

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

ORIGINAL

Independence

FECHA: 15/02/2013 — FACTURA DE VENTA No: 3768 RI

CLIENTE: ECOPETROL S.A. — NIT: 899.999.068-1

DIRECCION: CL 55 7 21 Piso 1 — TEL: 57-1 2344000

BOGOTA

No. ORDEN: 7665 SP

UN: PT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

6,000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	14,000	280.000	3.920.000
7,000	CONTAINER ADICIONAL	DI	33,000	280.000	9.240.000
8,000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	DI	2,000	4.370.000	8.740.000
9,000	TARIFA DE FRAC TANK	DI	105,000	400.000	42.000.000
10,000	TARIFA DE PLANTA	DI	5,000	450.000	2.250.000
11,000	TARIFA DE CIRCULACION DE POZOS (INCLUYE CUADRILLA BOMBA)	GL	7,000	8.500.000	59.500.000
12,000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	1,000	4.370.000	4.370.000
13,000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	3,000	1.300.000	3.900.000
14,000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	16,000	280.000	4.480.000
15,000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 0 A 10 KM	UN	1,000	33.500.000	33.500.000
16,000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	299,500	1.016.920	304.507.615
17,000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	115,500	1.012.500	116.943.750

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA TÁCITAMENTE DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN. DESPUES DE LA CUAL SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.C.O.)

Aceptado - Cliente

[redacted]

ORIGINAL

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

FECHA: - 15/02/2013 FACTURA DE VENTA No: - 3768 RI

CLIENTE ECOPETROL S.A. NIT: 899.999.068-1

DIRECCION: CL 35 7 21 Piso 1 TEL: 57-1 2344000
BOGOTA

No. ORDEN: 7668 SP

UN: PT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

18,000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	2,000	4.370.000	8.740.000
19,000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	5,000	1.300.000	6.500.000
20,000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	15,000	280.000	4.200.000
21,000	TARIFA DE PLANTA	DI	1,000	450.000	450.000
22,000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 10 A 30 KM	UN	1,000	40.000.000	40.000.000
23,000	MOVILIZACION EN LA MISMA LOCACIÓN	UN	1,000	14.075.000	14.075.000
24,000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	361.000	1.016.667	367.016.667
25,000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	40,000	1.012.500	40.500.000
26,000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	2,000	4.370.000	8.740.000
27,000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	7,000	1.300.000	9.100.000
28,000	TARIFA DE FRAC TANK	DI	42,000	400.000	16.800.000
29,000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	16,000	280.000	4.480.000
30,000	TARIFA DE PLANTA	DI	7,000	450.000	3.150.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION, DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptada - Cliente

553

Nit 830 130 109-7
GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 01948 DEL 29-12-04
AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 010599 DEL 28-12-2012

AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 1120
ACTIVIDAD EXPENDEDORA Y CONSUMO 100, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 320009062407, FECHA 2012-06-21
FACTURACION AUTORIZADA No. 2630 a la 5000 POR COMPUTADOR

ORIGINAL

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

No. PAGINA: - 4 of 7

FECHA: - 15/02/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 Piso 1
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: - 3765 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN : 7668 SP

UN: PT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

31,000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 0 A 10 KM	UN	1,000	33.500.000	33.500.000
32,000	MOVILIZACION EN LA MISMA LOCACIÓN	UN	1,000	14.075.000	14.075.000
33,000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	364,500	1.016.667	370.575.000
34,000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	51,500	1.012.500	52.143.750
35,000	CAMPERO SIN CONDUCTOR	DI	8,000	250.000	2.000.000
36,000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	2.000	4.370.000	8.740.000
37,000	CAMPERO SIN CONDUCTOR	DI	8,000	250.000	2.000.000
38,000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	6,000	1.300.000	7.800.000
39,000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	12,000	280.000	3.360.000
40,000	TARIFA DE PLANTA	DI	4,000	450.000	1.800.000
41,000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 0 A 10 KM	DI	1,000	0	
42,000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 0 A 10 KM	UN	8,000	0	

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CIO)

Aceptado - Cliente

NIT. 830 123 985-7
IVA RÉGIMEN COMÚN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN 11546 DEL 31-12-04
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 010300 DEL 28-12-2011

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1120
ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIO 204. TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCIÓN DIAN No. 320000012007, FECHA 2012-06-26
FACTURACIÓN AUTORIZADA No. 5630 A la 9999 POR COMPUTADOR

ORIGINAL

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

FECHA: - 15/03/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 39 7 21 Piso 1
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: - 5768 RI
NIT: 899.099.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN: 7668 SP

UN: PT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

43,000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 10 A 30 KM	UN	8,000	0	
44,000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 30 A 60 KM	UN	2,000	60.000.000	120.000.000
45,000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	295,500	1.016.667	300.425.000
46,000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	90,500	1.012.500	91.631.250
47,000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	4,000	4.370.000	17.480.000
48,000	CAMPERO SIN CONDUCTOR	DI	21,000	250.000	5.250.000
49,000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	8,000	1.300.000	10.400.000
50,000	TARIFA DE PLANTA	DI	3,000	450.000	1.350.000
51,000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 0 A 10 KM	UN	2,000	33.500.000	67.000.000
52,000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 10 A 30 KM	UN	1,000	40.000.000	40.000.000
53,000	MOVILIZACION EN LA MISMA LOCACIÓN	UN	1,000	14.075.000	14.075.000
54,000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	332,000	1.016.667	337.533.333
55,000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	54,500	1.012.500	55.181.250

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY OBJECIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASUMIRA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptado - Cliente

554

[redacted]

ORIGINAL

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

No. PAGINA: - 6 of 7

FECHA: - 15/02/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 95 7 21 Piso 1
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: - 3768 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1- 2344000

No. ORDEN : 7668 SP

UN: FT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

56,000	TRACTOMULA ADICIONAL (MENSUAL)	GL	1,000	28.000.000	28.000.000
57,000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	3,000	4.370.000	13.110.000
58,000	CAMPERO CON CONDUCTOR	DI	21,000	350.000	7.350.000
59,000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	6,000	1.300.000	7.800.000
60,000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	9,000	280.000	2.520.000
61,000	TARIFA DE PLANTA	DI	2.000	450.000	900.000
62,000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 0 A 10 KM	UN	2.000	33.500.000	67.000.000
63,000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	362,500	1.016.667	368.541.667
64,000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	47,000	1.012.500	47.587.500
65,000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	3,000	4.370.000	13.110.000
66,000	CAMPERO CON CONDUCTOR	DI	21.000	350.000	7.350.000
67,000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	3.000	1.300.000	3.900.000

[redacted]

Aceptado - Cliente

CL 100 7 33 T1 P 19 - BOGOTA PBX 57-1 5 87 53 33
FAX 57-1 Ext. 1006-1007 E-MAIL : info@independence.com.co
www.independence.com.co

NIT 860 519.168-7
IVA RÉGIMEN COMÚN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCIÓN 0144 DEL 25 12 04
PAGOS AUTORRETENCIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000019 DEL 26 12 2012

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1120
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 354, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCIÓN DIAN No. 320000012995, FECHA 2012 06 26
FACTURACIÓN AUTORIZADA No. 2620 a la 3000 POR CONTINUADOS

ORIGINAL

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

FECHA: 15/02/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 Pso 1
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: 3768 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL.: 57-1 2344000

No. ORDEN : 7668 SP

UN: FT27127

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

68,000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	16,000	280.000	4.480.000
69,000	TARIFA DE PLANTA	DI	3,000	450.000	1.350.000
70,000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 0 A 10 KM	UN	5,000	33.500.000	100.500.000
71,000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	305,000	1.016.667	310.083.333
72,000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	81,500	1.012.500	82.518.750

TOTAL:	4.210.389.900
BASE GRAVADA	336.831.192
BASE NO GRAVADA:	3.873.558.708
IVA 16 %	53.892.991
TOTAL A PAGAR	4.264.282.891

CONDICIONES DE PAGO: Contado a 30 días
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 00/100 M.L. **********

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA PRESENTA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C CO)

Aceptado - Citrate

555

	ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL DE OBRA/SERVICIO		
ecopetrol	GESTION DE ABASTECIMIENTO DIRECCION ESTRATEGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-082	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL DE SERVICIO Nº 9 AL CONTRATO MA-0009346

CONTRATO:	**MA-0009346**
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 – 2016.**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**($122.351.947.960)** CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR IVA.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	**(1005)** MIL CINCO DIAS CALENDARIO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 LO QUE OCURRA PRIMERO.
MAYOR CANTIDAD 1	**($5.957.053.280)** CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y TRES DOSCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
MAYOR CANTIDAD 2	**($4.049.217.320)** CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
MAYOR CANTIDAD 3	**($8.005.790.580)** OCHO MIL CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR IVA.
MAYOR CANTIDAD 4	**($3.670.955.320)** TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**($144.034.964.460)** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR IVA.
SALDO DEL CONTRATO	**($96.676.144.617)** NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA T Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA
VALOR EJECUTADO	**($47.358.819.843)** CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	09/06/2012
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO:	31/12/2014
FECHA DE CORTE:	15/02/2013
PERIODO FACTURADO:	16/01/2013 – 15/02/2013
PORCENTAJE DE PAGO:	38.71%
ADMINISTRADOR:	LUIS JOSE ALMEIDA PINZON
GESTOR DEL CONTRATO:	COPCO S.A.
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.

	ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL DE OBRA/SERVICIO		
ecopetrol	GESTION DE ABASTECIMIENTO DIRECCION ESTRATEGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-082	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

Mediante la suscripción de la presente Acta:

a) **INDEPENDENCE DRILLING S.A.,** que para todos los efectos legales y para los de este documento se denomina el CONTRATISTA, **FRANCISCO JAVIER VILLABONA.** mayor de edad, identificado con Cédula 17.419.403, quien actúa en su calidad de representante autorizado de la empresa y,
b) **LAURA JULIANA NIÑO FLOREZ** Identificado con Cédula de Ciudadanía número 63.510.108 de Bucaramanga, quien actúa en su calidad de GESTOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.
c) **LUIS JOSE ALMEIDA PINZON** identificado con registro Ecopetrol Nº E0117252 quien actúa en calidad de Administrador del contrato.

Dejan constancia de que,

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el **16 De Enero de 2013 al 15 de Febrero de 2013**, prestó los servicios contemplados en el contrato **MA-0009346** que se relaciona en la presente acta de liquidación parcial de servicio. El valor del servicio prestado en el periodo es el siguiente:

ACTA Nº	VALOR ACTA	SALDO DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	6.778.373.400	137.256.591.060,00	6.778.373.400,00	5,54%
2	3.476.839.100	133.779.751.960,00	10.255.212.500,00	8,38%
2.1	1.522.502.200	132.257.249.760,00	11.777.714.700,00	9,63%
3	4.468.492.200	127.788.757.560,00	16.246.206.900,00	13,28%
4	4.718.137.300	123.070.620.260,00	20.964.344.200,00	17,13%
4.1	1.036.578.128	122.034.042.132,00	22.000.922.328,00	17,98%
5	6.504.068.189	115.529.973.943,00	28.504.990.517,00	23,30%
6	5.512.239.600	110.017.734.343,00	34.017.230.117,00	27,80%
7	2.197.630.700	107.820.103.643,00	36.214.860.817,00	29,60%
8	4.210.389.900	103.609.713.743,00	40.425.250.717,00	33,04%
9	6.933.569.126	96.676.144.617,00	47.358.819.843,00	38,71%

ecopetrol	ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL DE OBRA/SERVICIO		
	GESTION DE ABASTECIMIENTO DIRECCION ESTRATEGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-082	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

- La presente acta es elaborada por la Gestoría Administrativa con base en la conciliación de cantidades realizadas por la Gestoría Técnica y el Contratista.
- La presente Acta sirve de base para la presentación de la correspondiente factura o cuenta de cobro por parte del CONTRATISTA, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de pago señalados contractualmente.
- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el Contratista, Administrador del contrato y Gestor Administrativo.

En constancia, se firma en Castilla a los 21 días del mes de Febrero del 2013, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

Por el CONTRATISTA
FRANCISCO JAVIER VILLABONA
Representante Autorizado.

Por la GESTION ADMINISTRATIVA
LAURA JULIANA NIÑO FLOREZ
COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY S.A.

Por ECOPETROL S.A.
LUIS JOSE ALMEIDA PINZON
Administrador del Contrato MA-0009346

ecopetrol	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS Nro 9

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA-CHICHIMENE
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2013
VALOR PRESENTE ACTA	SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS ($ 6.933.569.126) SIN IVA

Mediante la suscripción de la presente Acta:

a) INDEPENDENCE DRILLING S.A., en adelante el CONTRATISTA, representado por FRANCISCO JAVIER VILLABONA TAMAYO, mayor de edad, vecino de la ciudad de BOGOTA, identificado con C.C. Nº 17.419.403 DE ACACIAS, META, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y

b) NIXON MOLINA BAQUERO Identificado con Cédula de Ciudadanía número 12.114.775 DE BOGOTA, quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

Dejan constancia de que,

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2013, prestó los servicios contemplados en el contrato MA-0009346 que se relaciona en la presente acta de recibo de cantidades. El valor del servicio prestado en el periodo es el siguiente:

Cantidades Equipo 550 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	0,00	$ 350.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	0,00	$ 350.000.000	$ 0
1.3	Movilización entre pozos de la misma locaización	1,00	$ 14.075.000	$ 14.075.000
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	7,00	$ 33.500.000	$ 234.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	6,00	$ 40.000.000	$ 240.000.000

ecopetrol	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	1,00	$ 60.000.000	$ 60.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 78.000.000	$ 0
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 90.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	158,210	$ 24.400.000	$ 3.860.324.000
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	43,959	$ 24.300.000	$ 1.068.203.700
2.3	Stand by	3,292	$ 18.000.000	$ 59.256.000
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	74,00	$ 1.300.000	$ 96.200.000
3.2	Campero sin conductor	93,00	$ 250.000	$ 23.250.000
3.3	Campero con conductor	76,00	$ 350.000	$ 26.600.000
3.4	Tarifa de planta	3,00	$ 450.000	$ 1.350.000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	9,00	$ 8.500.000	$ 76.500.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	0,00	$ 160.000	$ 0
3.7	Construcción de anclajes	0,00	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	151,00	$ 280.000	$ 42.280.000
3.9	Container adicional	8,00	$ 280.000	$ 2.240.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	15,00	$ 4.370.000	$ 65.550.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	78,00	$ 400.000	$ 31.200.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	2,00	$ 28.000.000	$ 56.000.000
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0,00	$ 250.000	$ 0
	FACTOR DE SERVICIO			$ 47.660.230
	TOTAL			$ 6.005.198.930

Cantidades Equipo 350 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	0,00	$ 360.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	0,00	$ 360.000.000	$ 0
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	0,00	$ 28.000.000	$ 0
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	2,00	$ 30.500.000	$ 61.000.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	2,00	$ 38.500.000	$ 77.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	0,00	$ 63.500.000	$ 0
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 76.600.000	$ 0
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 84.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	25,599	$ 23.200.000	$ 593.896.800
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	2,063	$ 23.100.000	$ 47.655.300
2.3	Stand by	0	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	13	$ 1.300.000	$ 16.900.000
3.2	Campero sin conductor	0	$ 250.000	$ 0
3.3	Campero con conductor	0	$ 350.000	$ 0
3.4	Tarifa de planta	0	$ 450.000	$ 0
3.5	Tarifa de circulación de pozos	0	$ 8.500.000	$ 0
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	0	$ 160.000	$ 0
3.7	Construcción de anclajes	0	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	24	$ 280.000	$ 6.720.000
3.9	Container adicional	137	$ 280.000	$ 38.360.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	4	$ 4.370.000	$ 17.480.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	155	$ 400.000	$ 62.000.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	0	$ 28.000.000	$ 0

ecopetrol	ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL DE OBRA/SERVICIO		
	GESTION DE ABASTECIMIENTO DIRECCION ESTRATEGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-082	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

- La presente acta es elaborada por la Gestoría Administrativa con base en la conciliación de cantidades realizadas por la Gestoría Técnica y el Contratista.
- La presente Acta sirve de base para la presentación de la correspondiente factura o cuenta de cobro por parte del CONTRATISTA, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de pago señalados contractualmente.
- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el Contratista, Administrador del contrato y Gestor Administrativo.

En constancia, se firma en Castilla a los 22 días del mes de Abril del 2013, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

Por el CONTRATISTA
FRANCISCO JAVIER VILLABONA
Representante Autorizado.

Por la GESTION ADMINISTRATIVA
LAURA JULIANA NIÑO FLOREZ
COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY S.A.

Por ECOPETROL S.A.
LUIS JOSE ALMEIDA PINZON
Administrador del Contrato MA-0009346

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
ECOPETROL	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS Nro 11

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA-CHICHIMENE
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2013
VALOR PRESENTE ACTA	SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS ($ 7.624.230.163) SIN IVA

Mediante la suscripción de la presente Acta:

a) INDEPENDENCE DRILLING S.A., en adelante el CONTRATISTA, representado por FRANCISCO JAVIER VILLABONA TAMAYO, mayor de edad, vecino de la ciudad de BOGOTA, identificado con C.C. Nº 17.419.403 DE ACACIAS, META, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y

b) NIXON MOLINA BAQUERO identificado con Cédula de Ciudadanía número 12.114.775 DE BOGOTA, quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

Dejan constancia de que,

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2013, prestó los servicios contemplados en el contrato MA-0009346 que se relaciona en la presente acta de recibo de cantidades. El valor del servicio prestado en el periodo es el siguiente:

Cantidades Equipo 550 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	0,00	$ 350.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	0,00	$ 350.000.000	$ 0
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	4,00	$ 14.075.000	$ 56.300.000
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	8,00	$ 33.500.000	$ 268.000.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	9,00	$ 40.000.000	$ 360.000.000

ecopetrol	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	2,00	$ 60.000.000	$ 120.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 78.000.000	$ 0
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 90.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	170,688	$ 24.400.000	$ 4.164.787.200
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	46,583	$ 24.300.000	$ 1.131.966.900
2.3	Stand by	0,000	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	67,00	$ 1.300.000	$ 87.100.000
3.2	Campero sin conductor	99,00	$ 250.000	$ 24.750.000
3.3	Campero con conductor	82,00	$ 350.000	$ 28.700.000
3.4	Tarifa de planta	0,00	$ 450.000	$ 0
3.5	Tarifa de circulación de pozos	0,00	$ 8.500.000	$ 0
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	106,00	$ 160.000	$ 16.960.000
3.7	Construcción de anclajes	0,00	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	191,00	$ 280.000	$ 53.480.000
3.9	Container adicional	0,00	$ 280.000	$ 0
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	23,00	$ 4.370.000	$ 100.510.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	114,00	$ 400.000	$ 45.600.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	2,00	$ 28.000.000	$ 56.000.000
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0,00	$ 250.000	$ 0
	FACTOR DE SERVICIO			$ 52.113.233
	TOTAL			$ [illegible]

Cantidades Equipo 350 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	0,00	$ 360.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	0,00	$ 360.000.000	$ 0
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	0,00	$ 28.000.000	$ 0
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	1,00	$ 30.500.000	$ 30.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	2,00	$ 38.500.000	$ 77.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	0,00	$ 63.500.000	$ 0
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 76.600.000	$ 0
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 84.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	26,105	$ 23.200.000	$ 605.636.000
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	4,813	$ 23.100.000	$ 111.180.300
2.3	Stand by	0	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	10	$ 1.300.000	$ 13.000.000
3.2	Campero sin conductor	0	$ 250.000	$ 0
3.3	Campero con conductor	0	$ 350.000	$ 0
3.4	Tarifa de planta	0	$ 450.000	$ 0
3.5	Tarifa de circulación de pozos	13	$ 8.500.000	$ 110.500.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	40	$ 160.000	$ 6.400.000
3.7	Construcción de anclajes	0	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	25	$ 280.000	$ 7.000.000
3.9	Container adicional	33	$ 280.000	$ 9.240.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	3	$ 4.370.000	$ 13.110.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	165	$ 400.000	$ 66.000.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	0	$ 28.000.000	$ 0

560

ECOPETROL S.A.
SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA- CHICHIMENE
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 11 - CONTRATO HA-0008346

El día 19 de Abril de 2013, se reunieron en las oficinas del Departamento de Producción de la Superintendencia de Operaciones Castilla- Chichimene, el Ing. Francisco Villabona en representación de Independence Drilling S.A. y el Ingeniero Nixon Molina Baquero en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes:

Periodo de liquidación: 14 de marzo de 2013 **AL** 13 de abril de 2013

Equipo 550 HP

	TARIFAS DE MOVILIZACION				
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$ 350.000.000	0	$ -
1.2	Movilización final		$ 350.000.000	0	$ -
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 14.075.000	4	$ 56.300.000
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 33.500.000	8	$ 268.000.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$ 40.000.000	9	$ 360.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$ 60.000.000	2	$ 120.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$ 78.000.000	0	$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$ 90.000.000	0	$ -
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 24.400.000	170,688	$ 4.164.787.200
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 24.300.000	46,583	$ 1.131.966.900
2.3	Stand by	DIA	$ 18.000.000	0,000	$ -
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$ 1.300.000	67,000	$ 87.100.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$ 250.000	99,000	$ 24.750.000
3.3	Campero con conductor	DIA	$ 350.000	82,000	$ 28.700.000
3.4	Tarifa de planta	DIA	$ 450.000	0,000	$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$ 8.500.000	0,000	$ -
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$ 160.000	106,000	$ 16.960.000
3.7	Construcción de anclajes	EA	$ 1.800.000	0,000	$ -
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$ 280.000	191,000	$ 53.480.000
3.9	Container adicional	DIA	$ 280.000	0,000	$ -
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	EA	$ 4.370.000	23,000	$ 100.510.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 400.000	114,000	$ 45.600.000
3.12	Tractomula adicional con carro alta	MES	$ 28.000.000	2,000	$ 56.000.000
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running ESES	GLOBAL	$ 250.000	0,000	$ -
	SUBTOTAL				$ 6.814.154.100
	BASE GRAVABLE				$ 821.177.828
	FACTOR DE SERVICIO				$ 52.113.233
	TOTAL BASE GRAVABLE				$ 873.291.061
	BASE NO GRAVABLE				$ 5.993.021.772
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				$ 6.866.267.333
	IVA BASE GRAVABLE				$ 91.719.290
	TOTAL EQUIPO DE WO 550HP				$ 6.437.386.823

Equipos 550 HP - Tanque Bomba

	TARIFAS DE MOVILIZACION				
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$ 350.000.000	0	$ -
1.2	Movilización final		$ 350.000.000	0	$ -
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 28.000.000	0	$ -
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 30.500.000	1	$ 30.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$ 38.500.000	2	$ 77.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$ 63.500.000	0	$ -
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$ 76.000.000	0	$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$ 64.000.000	0	$ -
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 23.200.000	26,105	$ 605.636.000
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 23.100.000	4,813	$ 111.180.300
2.3	Stand by	DIA	$ 18.000.000	0,000	$ -
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$ 1.300.000	10,000	$ 13.000.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$ 250.000	0,000	$ -
3.3	Campero con conductor	DIA	$ 350.000	0,000	$ -
3.4	Tarifa de planta	DIA	$ 450.000	0,000	$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$ 8.500.000	13,000	$ 110.500.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$ 160.000	40,000	$ 6.400.000
3.7	Construcción de anclajes	EA	$ 1.800.000	0,000	$ -
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$ 280.000	25,000	$ 7.000.000
3.9	Container adicional	DIA	$ 280.000	33,000	$ 9.240.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	EA	$ 4.370.000	3,000	$ 13.110.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 400.000	165,000	$ 66.000.000
3.12	Tractomula adicional con carro alta	MES	$ 28.000.000	0,000	$ -
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running ESES	GLOBAL	$ 250.000	0,000	$ -
	SUBTOTAL				$ 1.049.566.300
	BASE GRAVABLE				$ 89.981.394
	FACTOR DE SERVICIO				$ 8.396.830
	TOTAL BASE GRAVABLE				$ 98.341.694
	BASE NO GRAVABLE				$ 965.600.996
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				$ 1.057.942.830
	IVA BASE GRAVABLE				$ 14.777.894
	TOTAL EQUIPO DE WO				$ 1.072.720.724

Acacías	$ [illegible]	61%
Castilla La Nueva	$ 896.641.430,00	12%
Guamal	$ 2.049.320.282,00	27%
Total	$ 7.424.[illegible]	100%

En constancia de lo enterior firman:

FRANCISCO VILLABONA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
REPRESENTANTE DELEGADO


NIXON MOLINA BAQUERO
ECOPETROL
GESTOR TECNICO

LUIS [illegible] ALMEIDA PINZON
ECOPETROL
ADMINISTRADOR

LIQUIDACION PARCIAL 11
CONTRATO MA-0000340


Desde 14-Nov-13 Hasta 15-Apr-19

Torre 17 - 328 HP

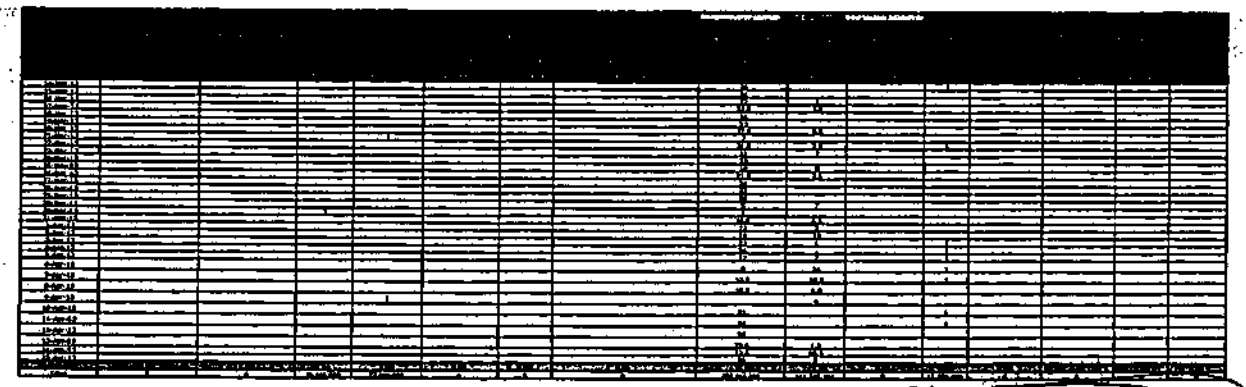






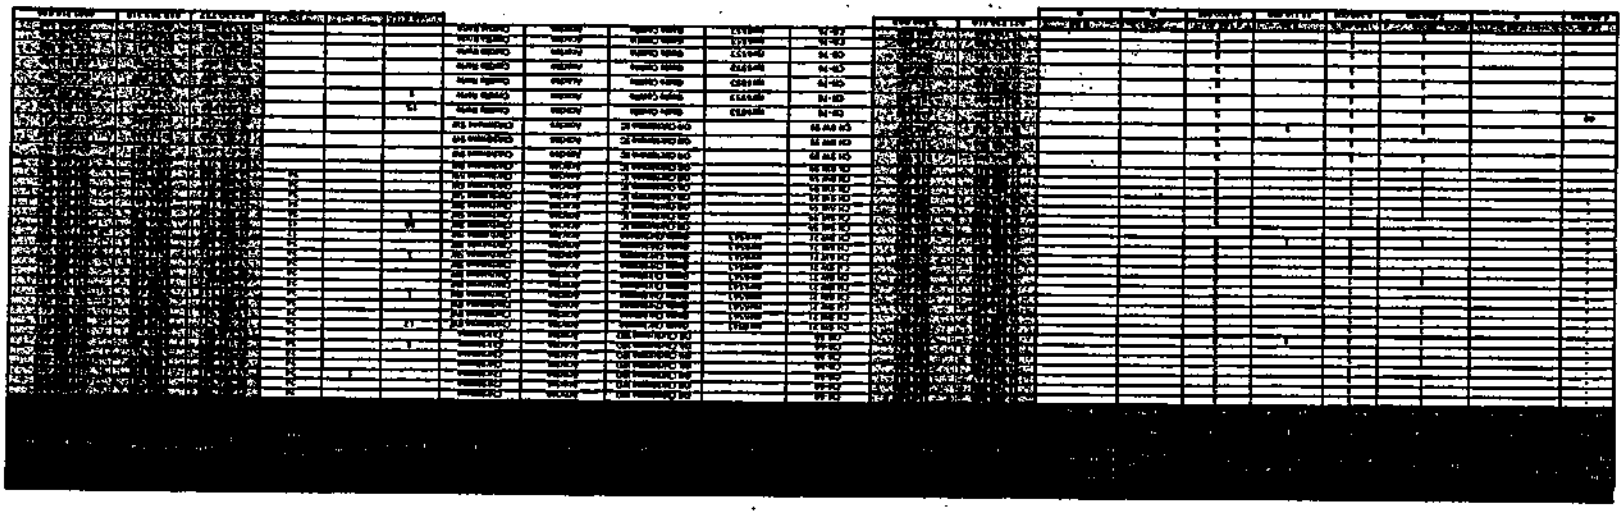


LIQUIDACION PARCIAL 11
CONTRATO MA-6009346

Desde 14-Mar-13 Hasta 15-Apr-13


Torre 26- BSB HP

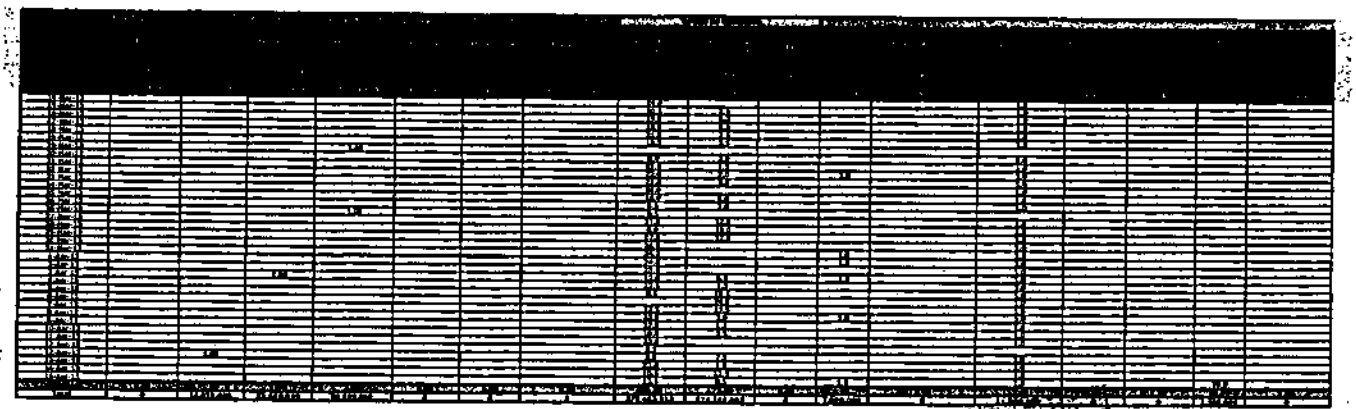








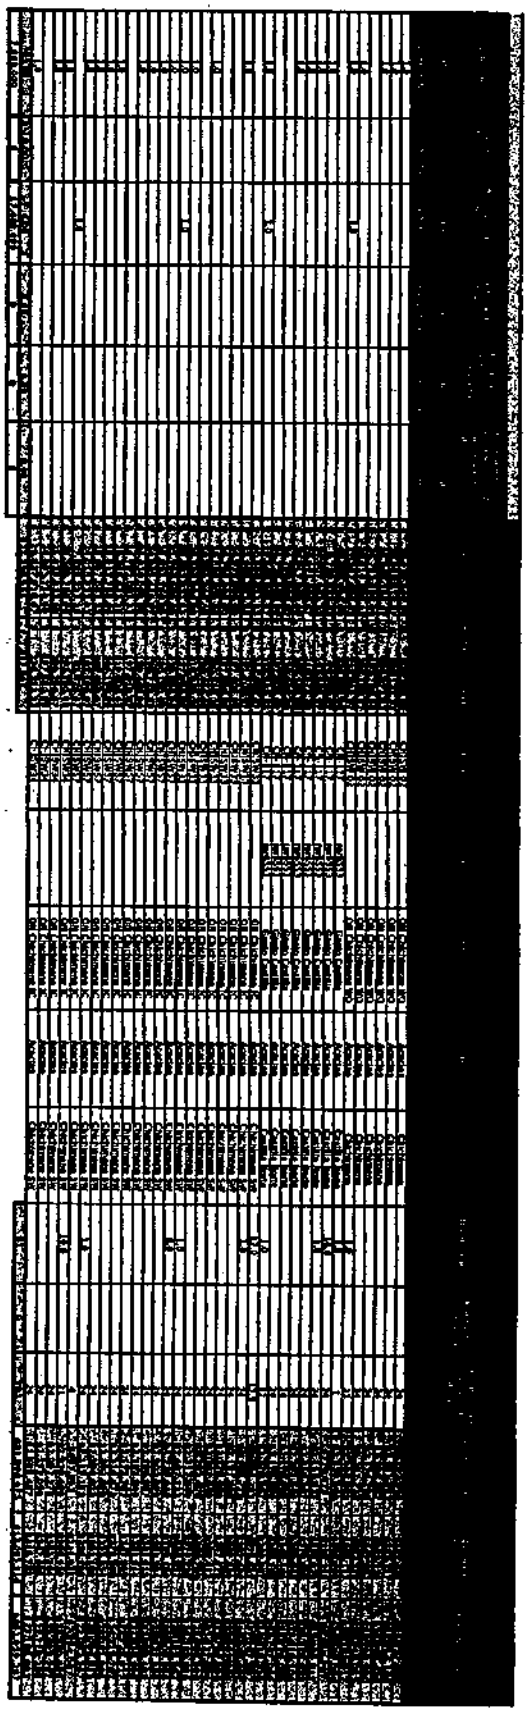


LIQUIDACION PARCIAL 11
CONTRATO MA-0009346

Desde 14-Mar-13 Hasta 15-Apr-13


Torre 28 - 550 MP

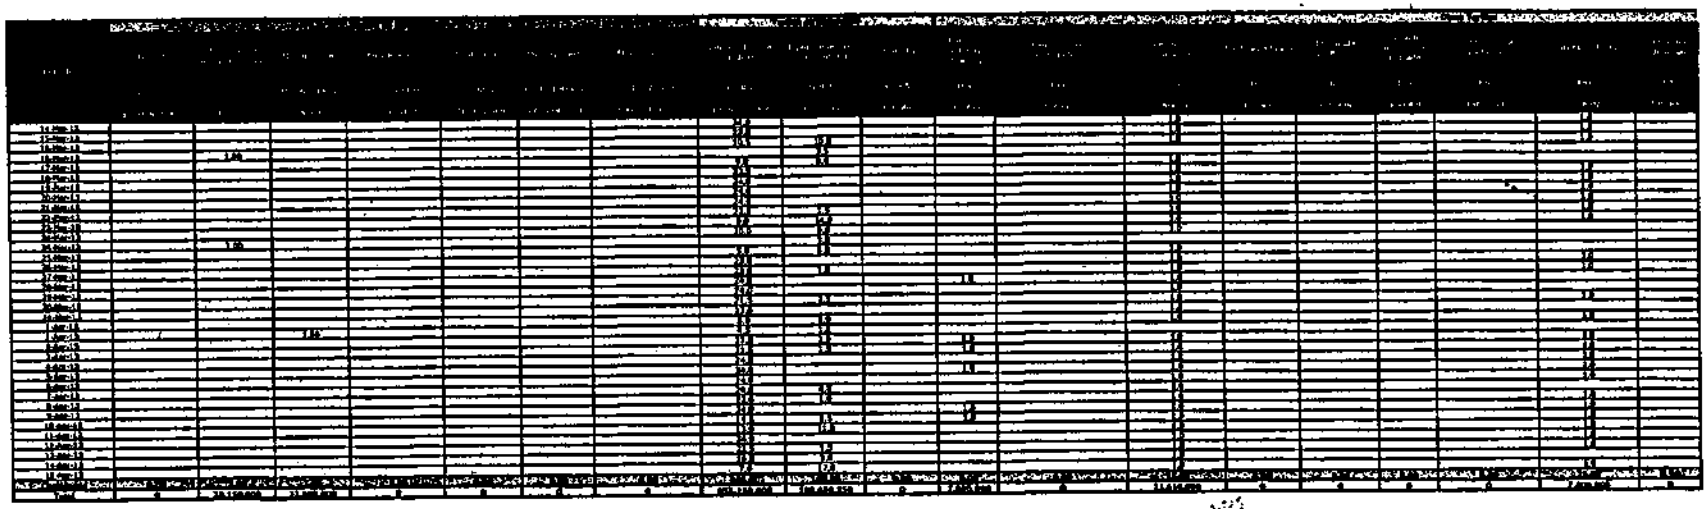











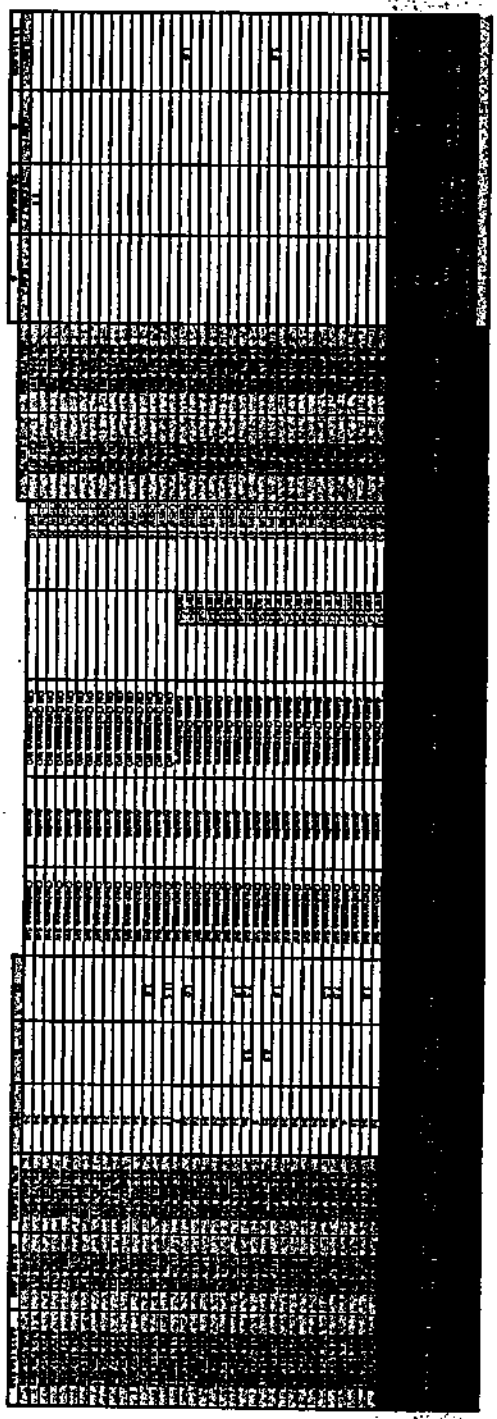


LIQUIDACION PARCIAL 11
CONTRATO MA-0009346


Desde 14-Mar-13 Hasta 15-Apr-13

Torre 31 - 550 HP

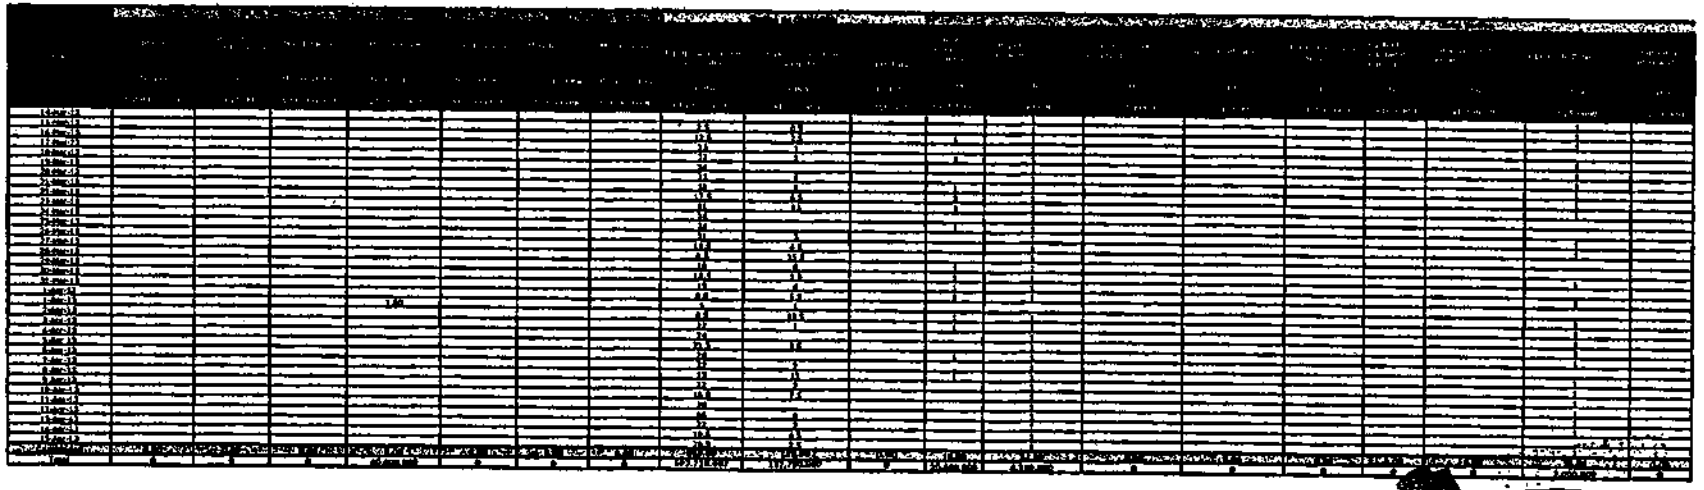






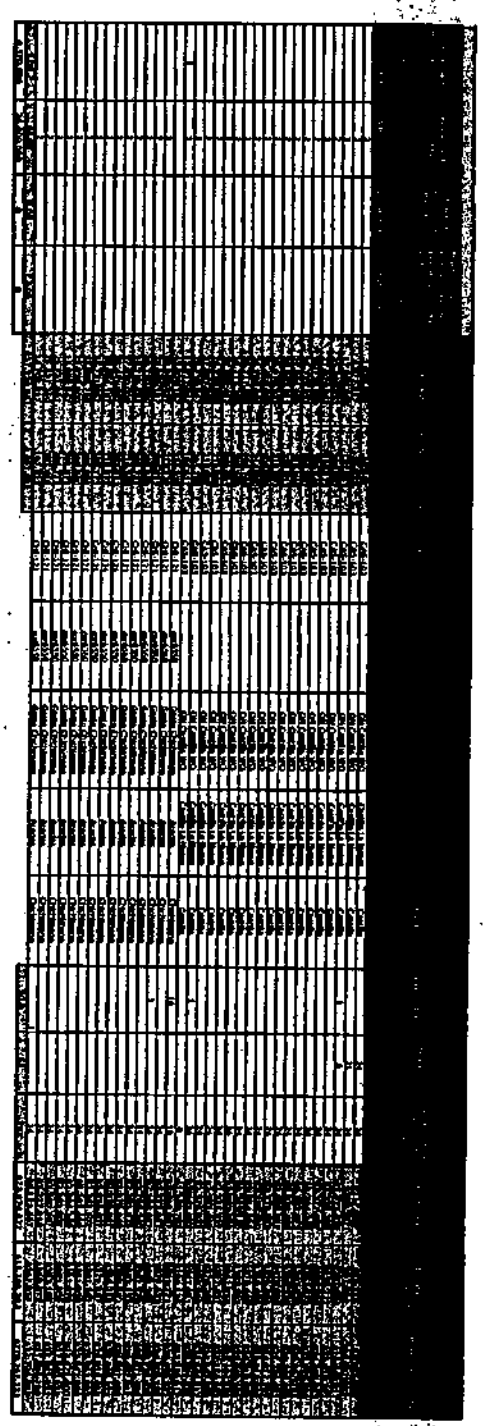

LIQUIDACION PARCIAL 11
CONTRATO MA-0009346


Desde 14-Mar-13 Hasta 15-Apr-13


Torre 32 - 550 HP

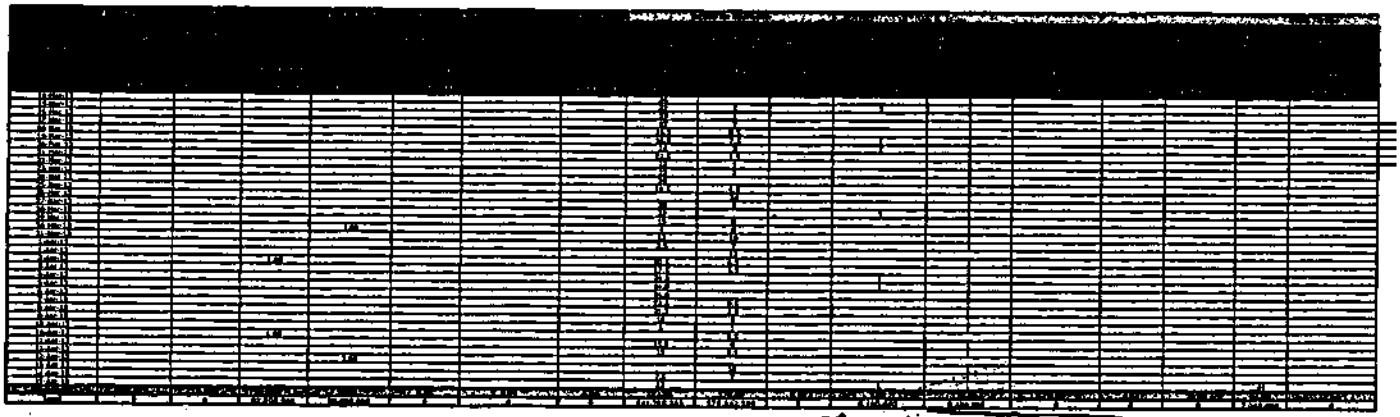








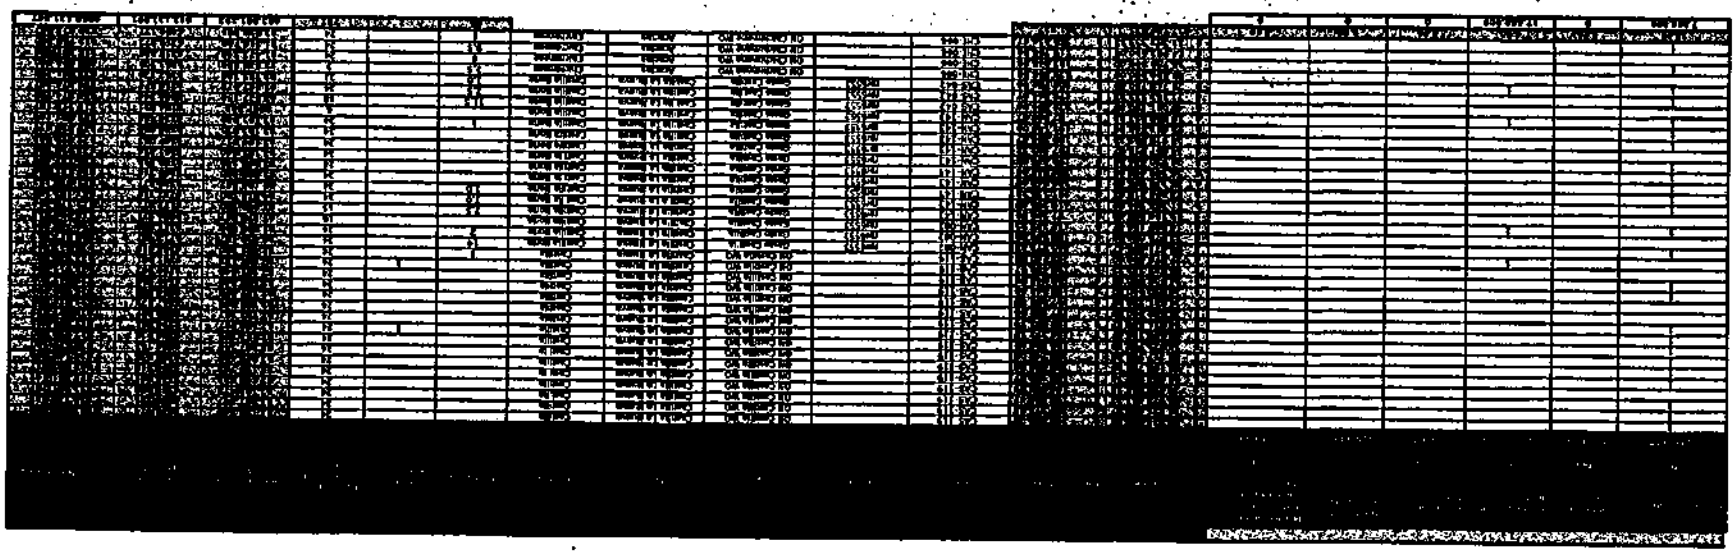



LIQUIDACION PARCIAL 11
CONTRATO MA-0009246


Desde 14-Mar-13 Hasta 15-Apr-13


Torre 24 - 550 HP

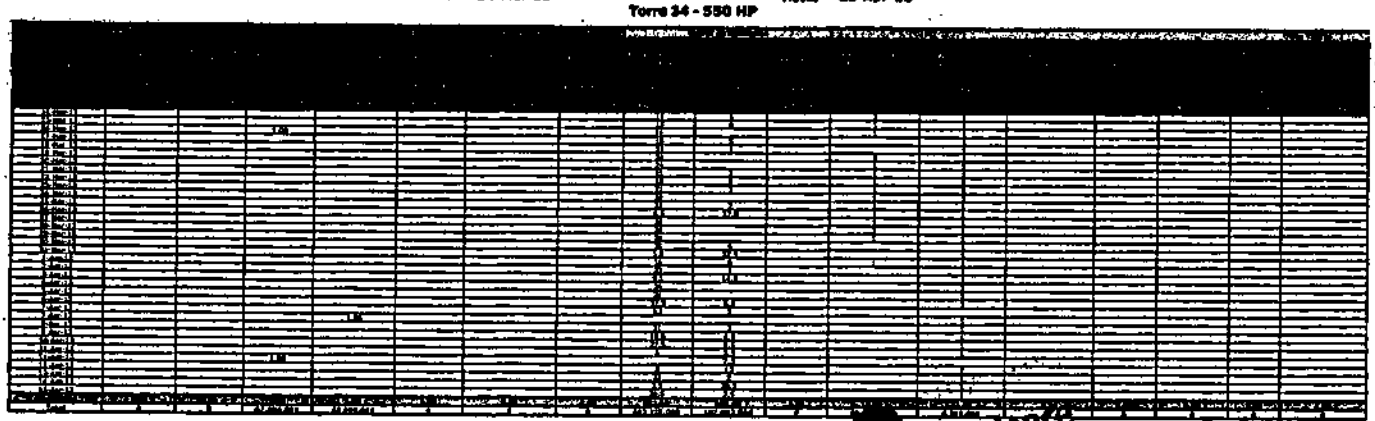










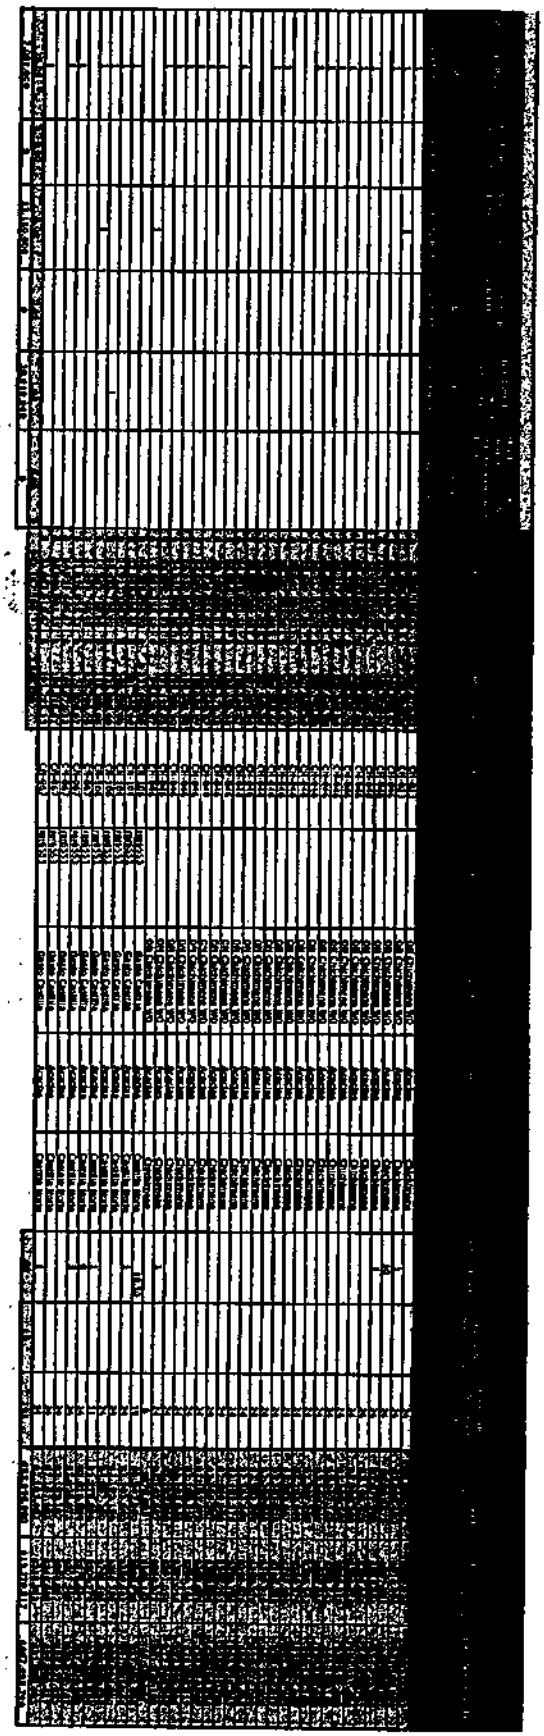



LIQUIDACION PARCIAL

CONTRATO MA-0009346 P


Desde 14-Mar-13 Hasta 18-Apr-13


Torre 42 - 550 HP

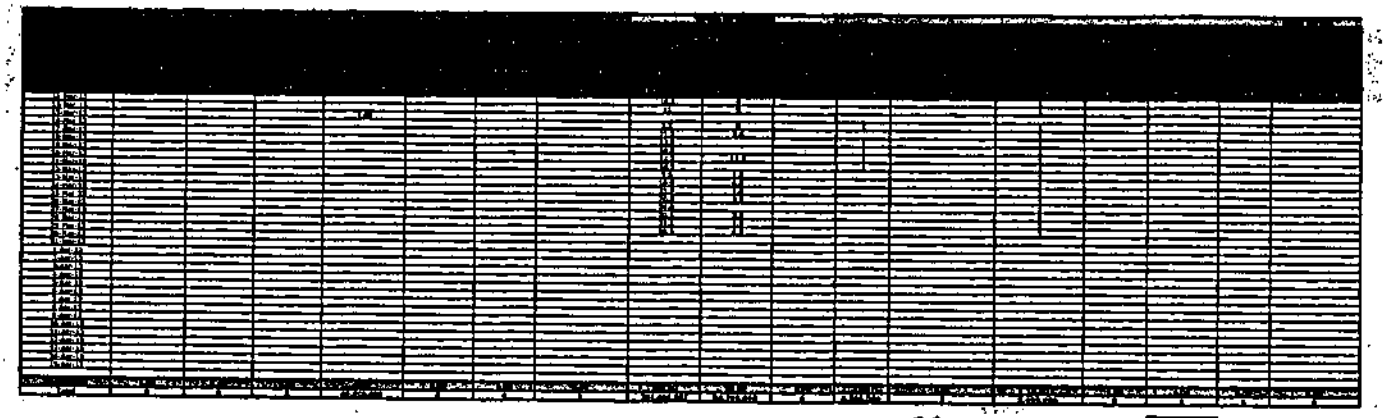








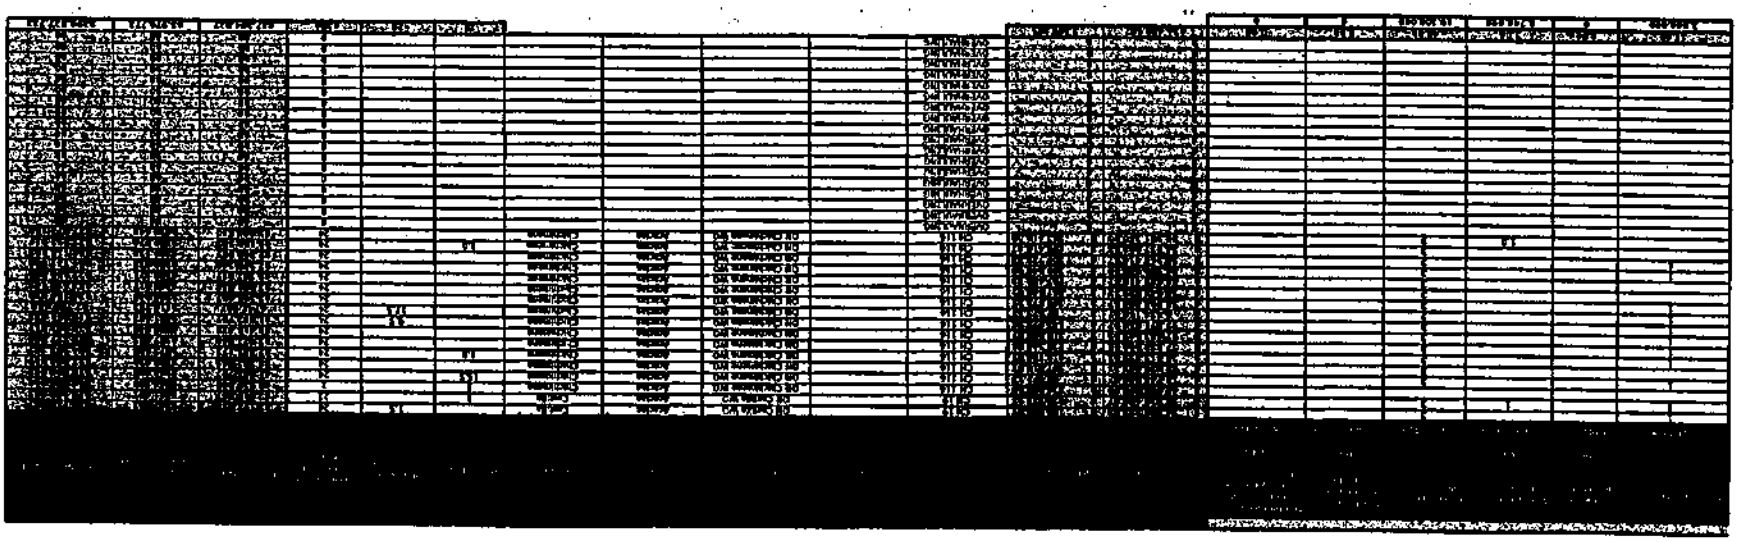


LIQUIDACION PARCIAL 11
CONTRATO HA-0009346


Desde 14-Mar-13 Hasta 15-Apr-13

Torre 53 - 550 HP

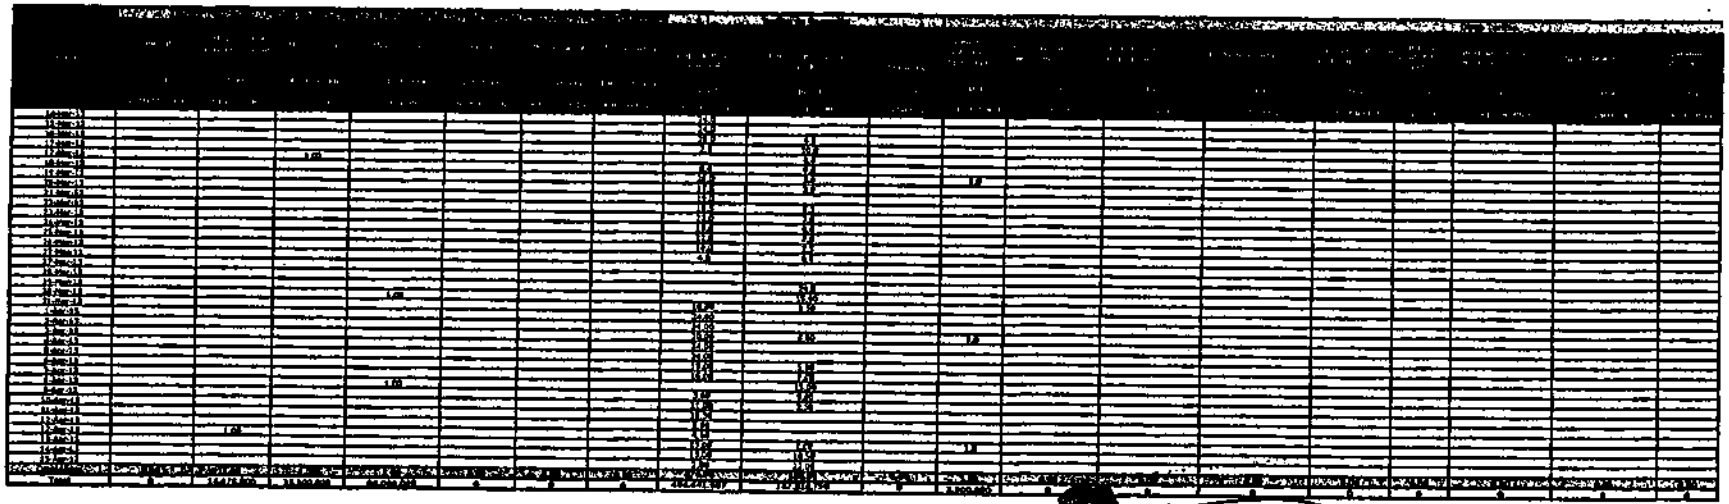





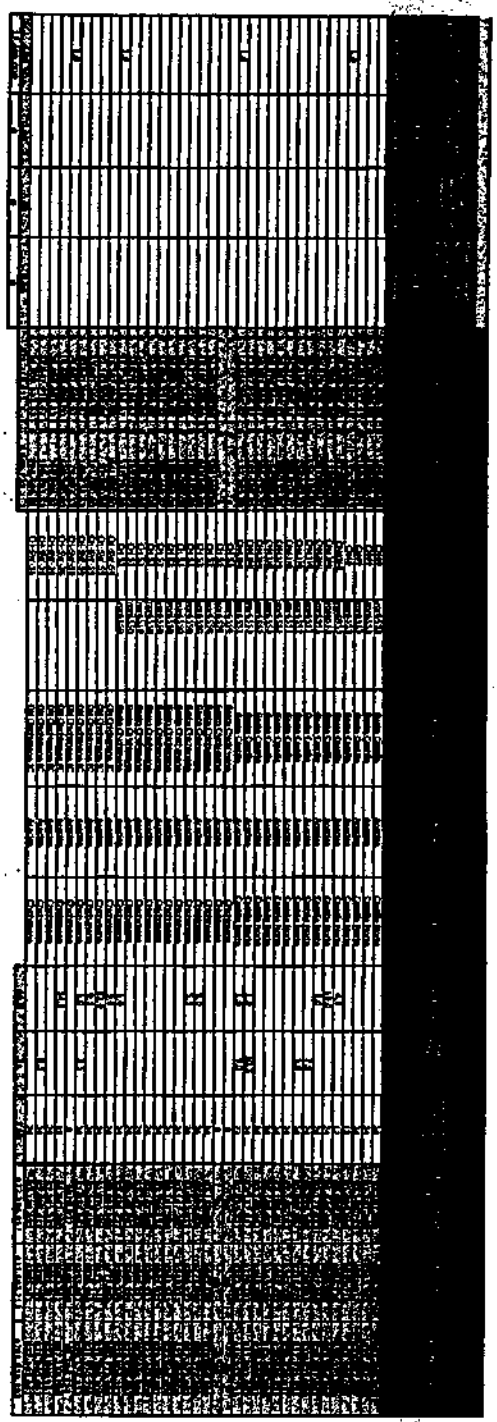



LIQUIDACION PARCIAL


CONTRATO HA-0009346 B


Desde 14-Mar-13 Hasta 8-Apr-13

Tanque Bombe

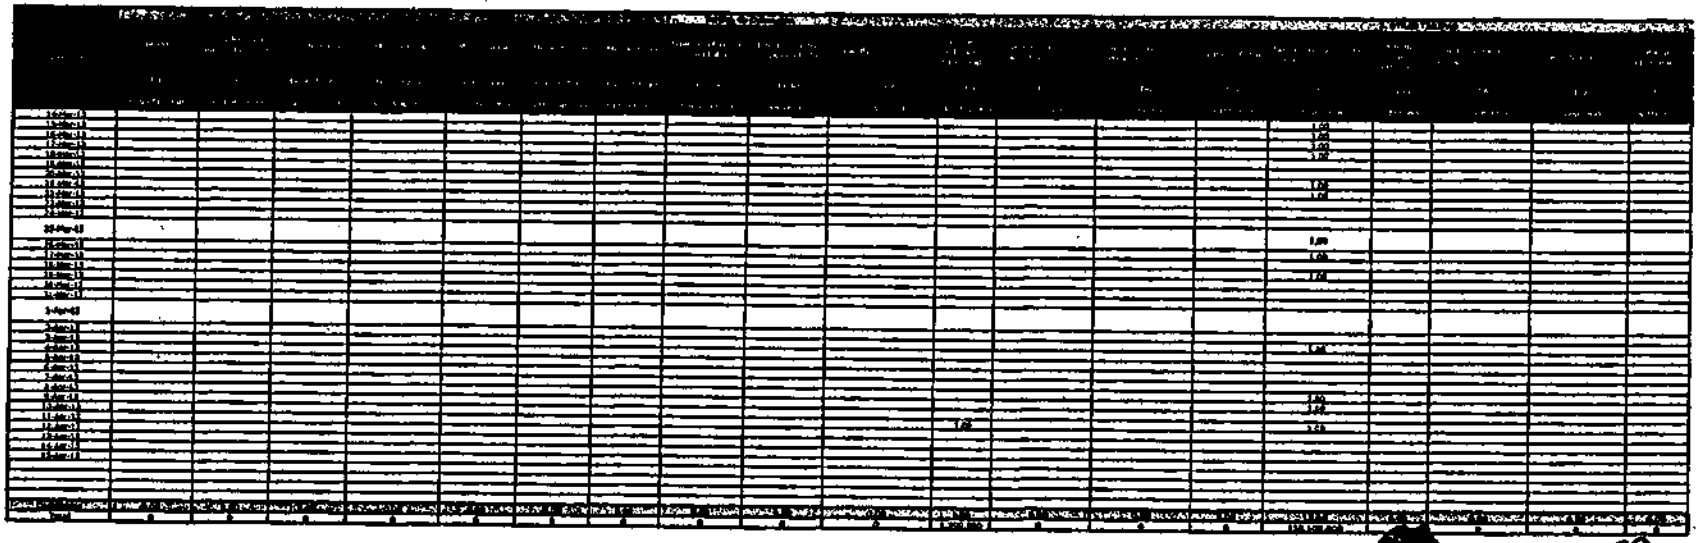





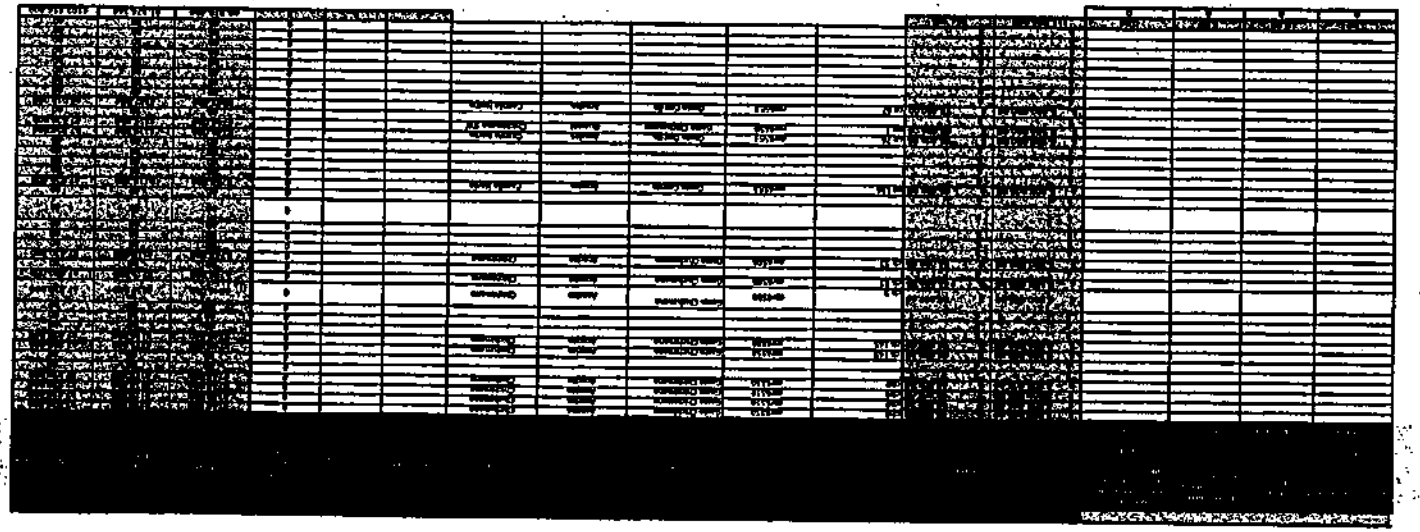

NIT 860 120 916-7
IVA REGIMEN COMUN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION 0040 DEL 29-12-04
SOMOS AUTO RETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000030 DEL 28-12-2012

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 1120
ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIO ICA, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUTION DIAN No. 320000012899, FECHA 2012-06-25
FACTURACION AUTORIZADA No. 3628 A la 5000 POR COMPUTADOR

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

ORIGINAL

Independence

No. PAGINA: - 1 of 13

FECHA: - 24/04/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 P 1
BOGOTA, D.C.

FACTURA DE VENTA No: - 3973 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN: 8065 SP

UN: PT26227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016

CONCEPTO: ACTA 11
PERIODO: 14 - 31 DE MARZO A101 - 15 DE ABRIL DE 2013
HOJA DE ENTRADA
1000884748 1000899852 1000884752 1000899835 1000899744 1000899795 1000899894 1000899910 1000899751
1000899782 1000899905 1000899914 1000899793 1000899798 1000899844 1000899935 1000899847 1000899936
1000899822 1000899925 1000899831 1000899926
APROBACIONES
5001110625 5001110626 5001110627 5001110628 5001110629 5001110630 5001110631 5001110632 5001110633
5001110634 5001110645 5001110646 5001110647 5001110648 5001110649 5001110650 5001110651 5001110652
5001110653 5001110654 5001110665 5001110666
Manifestamos que Independence Drilling S.A. ha efectuado los aportes a la seguridad social por los ingresos materia de esta facturación, dando cumplimiento al monto máximo dispuesto por la ley para la base de cotización. El pago de los aportes a seguridad social respectivos se realizó bajo la planilla número 8422568183 del mes de Marzo 2013

ECOPETROL S.A.
OFICINA CUENTAS
BOGOTA
25 ABR 2013
RECIBIDO

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	2,000	4.370.000,0000	8.740.000
2,000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	9,000	1.300.000,0000	11.700.000
3,000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	55,000	280.000,0000	15.400.000
4,000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 0 A 10 KM	UN	1,000	33.500.000,0000	33.500.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptado - Citeste

540

NIT 900.190.209-7
IVA REGIMEN COMUN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION 11944 DEL 25 12 06
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 010100 DEL 28 12 2012

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA Y RICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 5120
ACTIVIDAD EXPORTERA Y COMERCIO 100, TARIFA 0.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 18000012007, FECHA 2012 06 28
FACTURACION AUTORIZADA No. 2828 a la 3000 POR COMPUTADOR

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

ORIGINAL

Independence

FECHA: 24/04/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 95 7 21 P 1
BOGOTA, D.C.

FACTURA DE VENTA No: 3973 RJ
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN: 8065 SP

UN: PT26227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016

CONCEPTO: ACTA 11
PERIODO: 14 - 31 DE MARZO A 01 - 15 DE ABRIL DE 2013
HOJA DE ENTRADA
1000884748 1000899852 1000884752 1000899875 1000899744 1000899765 1000899894 1000899910 1000899751
1000899782 1000899903 1000899914 1000899793 1000899798 1000899845 1000899935 1000899837 1000899938
1000899822 1000899925 1000899831 1000899926
APROBACIONES
5001110625 5001110626 5001110627 5001110628 5001110629 5001110630 5001110631 5001110632 5001110633
5001110634 5001110645 5001110646 5001110647 5001110648 5001110649 5001110650 5001110651 5001110652
5001110653 5001110654 5001110665 5001110666
Manifestamos que Independence Drilling S.A. ha efectuado los aportes a la seguridad social por los ingresos materia de esta facturación, dando cumplimiento al monto mínimo dispuesto por la ley para la base de cotización. El pago de los aportes a seguridad social respectivos se realizó bajo la planilla número 8422568183 del mes de Marzo 2013

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
5.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 50 A 60 KM	UN	2,000	60.000.000,0000	120.000.000
6.000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	407,000	1.016.666,6667	413.783.333
7.000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	122,000	1.012.500,0000	123.525.000
8.000	CARTUCHO UNIDAD DE FILTRADO	UN	42,000	160.000,0000	6.720.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY RECONVENCIONES DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION, DESPUES DE LA CUAL SE COBRARA INTERES POR MORA AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptado - Cliente

NIT: 830.110.319-3
IVA RÉGIMEN COMÚN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION 11946 DEL 23 12 04
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000169 DEL 20 12 2012

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1120
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 964, TARIFA 0.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 3260000012607, FECHA 2013 04 25
FACTURACION AUTORIZADA No. 3628 a 6 9999 POR COMPUTADOR

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

ORIGINAL

Independence

FECHA: 24/04/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 55 7 21 P 1
BOGOTA, D.C.

FACTURA DE VENTA No: 3973 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN: 8065 SP

UN: PT26227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016

CONCEPTO: ACTA 11
PERIODO: 14 - 31 DE MARZO AL 01 - 15 DE ABRIL DE 2013
HOJA DE ENTRADA
Manifestamos que Independence Drilling S.A. ha efectuado los aportes a la seguridad social por los ingresos materia de esta liquidación, dando cumplimiento al monto máximo dispuesto por la ley para la base de cotización. El pago de los aportes a seguridad social respectivos se realizo bajo la planilla número 8422568183 del mes de Marzo 2013

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
9,000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	3,000	4.370.000,0000	13.110.000
10,000	CARTUCHO UNIDAD DE FILTRADO	DI	40,000	160.000,0000	6.400.000
11,000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	9,000	1.300.000,0000	11.700.000
12,000	CONTAINER ADICIONAL	DI	33,000	280.000,0000	9.240.000
13,000	TARIFA DE FRAC TANK	DI	165,000	400.000,0000	66.000.000
14,000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	25,000	280.000,0000	7.000.000
15,000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 0 A 10 KM	UN	1,000	30.500.000,0000	30.500.000
16,000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 10 A 30 KM	UN	2,000	38.500.000,0000	77.000.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO)

Aceptado - Cliente

571

NIT 900116188-9
IVA RÉGIMEN COMÚN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION 11646 DEL 25/11/06
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000169 DEL 26/12/2012

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA Y ICA

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1120
ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN 504, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 18000018897, FECHA 2012-06-25
FACTURACION AUTORIZADA No. 3973 a la 4000 POR COMPUTADOR

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

ORIGINAL

Independence

No. PAGINA: - 5 of 13

FECHA: - 21/04/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 P 1
BOGOTA, D.C.

FACTURA DE VENTA No: - 3973 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1- 2344000

No. ORDEN : 8065 SP

UN: PT26227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016

CONCEPTO: ACTA 11
PERIODO: 14 - 31 DE MARZO A101 - 15 DE ABRIL DE 2013
HOJA DE ENTRADA
Manifestamos que Independence Drilling S.A. ha efectuado los aportes a la seguridad social por los ingresos materia de esta facturación, dando cumplimiento al monto máximo dispuesto por la ley para la base de cotización. El pago de los aportes a seguridad social respectivos se realizó bajo la planilla número 8422568183 del mes de Marzo 2013

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
24,000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	645,000	1.016.666,6667	655.750.000
25,000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	108,500	1.012.500,0000	109.856.250
26,000	MOVILIZACION EN LA MISMA LOCACIÓN	HR	2,000	14.075.000,0000	28.150.000
27,000	TRACTOMULA ADICIONAL (MENSUAL)	UN	1,000	28.000.000,0000	28.000.000
28,000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	1,000	4.370.000,0000	4.370.000
29,000	CAMPERO SIN CONDUCTOR	DI	33,000	250.000,0000	8.250.000
30,000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	16,000	1.300.000,0000	20.800.000
31,000	TARIFA DE FRAC TANK	DI	66,000	400.000,0000	26.400.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C CO)

Aceptado - Cliente

NR 899 999 068-1
IVA REGIMEN COMUN. GRANDES CONTRIBUYENTES
FIRMA RESOLUCION 1068 DEL 25-11-94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000169 DEL 26-12-2012

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 4720
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 864, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 18000018005, FECHA 2012-04-16
FACTURACION AUTORIZADA No. 2538 a la 4040 POR COMPUTADOR

ORIGINAL

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

FECHA: 26/04/2013 FACTURA DE VENTA No: 3973 RI

CLIENTE ECOPETROL S.A. NIT: 899.999.068-1

DIRECCION: CL 95 7 21 P 1 TEL: 57-1 2344000
BOGOTA, D.C.

No. ORDEN: 8065 SP

UN: PT26227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016

CONCEPTO: ACTA 11
PERIODO: 16 - 31 DE MARZO A 01 - 15 DE ABRIL DE 2013
HOJA DE ENTRADA
Manifestamos que Independence Drilling S.A. ha efectuado los aportes a la seguridad social por los ingresos materia de esta facturación, dando cumplimiento al monto máximo dispuesto por la ley para la base de cotización. El pago de los aportes a seguridad social respectivos se realizó bajo la planilla número 8422568123 del mes de Marzo 2013

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
17,000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	626,500	966.666,6704	605.616.669
18,000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	115,500	962.500,0000	111.168.750
19,000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	3,000	4.370.000,0000	13.110.000
20,000	CAMPERO CON CONDUCTOR	DI	33,000	350.000,0000	11.550.000
21,000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11,000 GLS	UN	6,000	1.300.800,0000	7.800.000
22,000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	25,000	280.000,0000	7.000.000
23,000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 0 A 10 KM	UN	1.000	33.500.000,0000	33.500.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY OBJECIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DENTRO DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptado - Cliente

572

NIT 800 119 916-7
ICA REGIMEN COMUN. NO SOY GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. RESOLUCION 11954 DEL 23 12 04
DANOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 010108 DEL 26 12 2012

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 1720
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 166, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 320000013097, FECHA 2012 06 25
FACTURACION AUTORIZADA No. 9528 a la 9999 POR COMPUTADOR

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

ORIGINAL

Independence

No. PAGINA: - 6 of 13

FECHA: - 24/04/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 P 1
BOGOTA, D.C.

FACTURA DE VENTA No: - 3973 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN: 6065 SP

UN: PT26227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016

CONCEPTO: ACTA 11
PERIODO: 14 - 31 DE MARZO AI 01 - 15 DE ABRIL DE 2013
HOJA DE ENTRADA
Manifestamos que Independence Drilling S.A. ha efectuado los aportes a la seguridad social por los ingresos materia de esta facturación, dando cumplimiento al monto máximo dispuesto por la ley para la base de cotización. El pago de los aportes a seguridad social respectivos se realizó bajo la planilla número 8422568183 del mes de Marzo 2013

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
32,000	TARIFA DIARIA CERRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	25,000	280.000,0000	7.000.000
33,000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 10 A 30 KM	UN	1,000	40.000.000,0000	40.000.000
34,000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	583,000	1.016.666,6667	592.716.667
35,000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	136,000	1.012.500,0000	137.700,000
36,000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	4,000	4.370.000,0000	17.480.000
37,000	CASIPERO SIN CONDUCTOR	DI	33,000	250.000,0000	8.250.000
38,000	CARTUCHO UNIDAD DE FILTRADO	DI	44,000	160.000,0000	7.040.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION, DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO. ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA ES ASIMILADA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C CO.)

Aceptado - Cliente

Nit 899.139.116-9
IVA REGIMEN COMUN. GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION 0018 DEL 29/12/04
GRANDES AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 010166 DEL 26 12/2012

GRANDES AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 4290
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 10A, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 320060012695, FECHA 2012-04-26
FACTURACION AUTORIZADA No. 2620 a la 5000 POR COMPUTADOR

ORIGINAL

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

FECHA: - 24/04/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 P 1
BOGOTA, D.C.

FACTURA DE VENTA No: - 3973 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN: 8065 SP

UN: PT26277

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016

CONCEPTO: ACTA 11
PERIODO: 14 - 31 DE MARZO Al 01 - 15 DE ABRIL DE 2013
HOJA DE ENTRADA
Manifestamos que Independence Drilling S.A. ha efectuado los aportes a la seguridad social por los ingresos materia de esta facturación, dando cumplimiento al monto mínimo dispuesto por la ley para la base de cotización. El pago de los aportes a seguridad social respectivos se realizó bajo la planilla número 8422568183 del mes de Marzo 2013

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
39,000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 1 1.000 GLS	UN	7,000	1.300.000,0000	9.100.000
40,000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	25,000	280.000,0000	7.000.000
41.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 0 A 10 KM	UN	2,000	33.500.000,0000	67.000.000
42,000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 10 A 30 KM	UN	2,000	40.000.000,0000	80.000.000
43,000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	552,500	1.016.666,6667	561.708.333
44,000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	373,000	1.012.500,0000	175.162.500
45,000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	3,000	4.370.000,0000	13.110.000
46,000	CAMPERO SIN CONDUCTOR	DI	33,000	250.000,0000	8.250.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA AL MAXIMO PERMITIDO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptado - Cliente

5:73

NIT 900.190.165-3
IVA REGIMEN COMUN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION 11944 DEL 23 12 04
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. [illegible] DEL [illegible]2013

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 1120
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 304, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 320000912897, FECHA 2012 04 25
FACTURACION AUTORIZADA No. 2620 a la 9999 POR COMPUTADOR

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

ORIGINAL

Independence

No. PAGINA: - 7 of 7

FECHA:	- 25/02/2013	FACTURA DE VENTA No:	- 3790 RI
CLIENTE	ECOPETROL S.A.	NIT:	899.999.068-1
DIRECCION:	CL 35 7 21 P 1	TEL:	57-1 2344000
	BOGOTA, D.C.		

No. ORDEN: 7730 SP

UN: PT26227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012.2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016

IVA 16 %	96.861.286
FACTOR DE SERVICIO	95.105.987
TOTAL A PAGAR	7.030.430.412

CONDICIONES DE PAGO: Contado a 30 días

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON 00/100 M.L. ***

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA AL MAXIMO ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptado - Cliente

CL 100 7 33 T1 P 19 - BOGOTA PBX 57-1 5 87 53 33
FAX 57-1 Ext. 1006-1007 E-MAIL: info@independence.com.co
www.independence.com.co

NIT 830.119.188-9
IVA REGIMEN COMUN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION 11946 DEL 23 12 04
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 010659 DEL 26 12 2012

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 1130
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 304, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 320000018695, FECHA: 2012-06-25
FACTURACION AUTORIZADA No. 2438 a la 3500 POR COMPUTADOR

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

ORIGINAL

Independence

FECHA: - 25/02/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 55 7 21 P 1
BOGOTA, D.C.

FACTURA DE VENTA No: - 3790 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN: 7738 SP

UN: PT26227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012.2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016

32,000	CAMPERO SIN CONDUCTOR	DI	31,000	250,000	7.750.000
33,000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	13,000	1.300.000	16.900.000
34,000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	26,000	280.000	7.280.000
35,000	TARIFA DE PLANTA	DI	3,000	450.000	1.350.000
36,000	TRACTOMULA ADICIONAL (MENSUAL)	DI	1,000	28.000.000	28.000.000
37,000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 0 A 10 KM	UN	1,000	33.500.000	33.500.000
38,000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	584,000	1.016.667	593.733.528
39,000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	148,000	1.012.500	149.850.000
40,000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	2,000	4.370.000	8.740.000
41,000	CAMPERO CON CONDUCTOR	DI	31,000	350.000	10.850.000
42,000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	15,000	1.300.000	19.500.000
43,000	TARIFA DE FRAC TANK	DI	16,000	400.000	6.400.000
44,000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	26,000	280.000	7.280.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO)

Aceptado - Cliente

574

NR.900.180.181-7
RA REGIMEN COMUN. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABILIDAD 11 04 DEL 23/12/04
RESOLUCION AUTORIZADORA RESOLUCIÓN No. 610169 DEL 26/12/2012

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 1420
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO ICA TARIFA 0.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 320000912660, FECHA 2013-06-20
FACTURACION AUTORIZADA No. 2020 a la 5000 POR COMPUTADOR

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

ORIGINAL

Independence

FECHA: 25/02/2019
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 P 1
BOGOTA, D.C.

FACTURA DE VENTA No: 3790 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN: 7738 SP

UN: PT26227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016

6,000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	469,000	1.016.667	476.816.667
7,000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	227,000	1.012.501	229.837.656
8,000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	4,000	4.370.000	17.480.000
9,000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	13,000	1.300.000	16.900.000
10,000	CONTAINER ADICIONAL	DI	137,000	280.000	38.360.000
11,000	TARIFA DE FRAC TANK	DI	155,000	400.000	62.000.000
12,000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	27,000	280.000	7.560.000
13,000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 0 A 10 KM	UN	2,000	30.500.000	61.000.000
14,000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 10 A 30 KM	UN	2,000	38.500.000	77.000.000
15,000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	614,000	966.667	593.533.333
16,000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	49,000	962.501	47.162.705
17,000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	1,000	4.370.000	4.370.000
18,000	CAMPERO SIN CONDUCTOR	DI	31,000	250.000	7.750.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA A LAS TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptado - Cliente

NIT. 900.100.160-7
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

ACTIVIDAD ECONOMICA 4120
ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIO 104, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. [illegible], FECHA 2013-04-23
FACTURACION AUTORIZADA No. 3630 a la 9999 POR COMPUTADOR

ORIGINAL

INDEPENDENCE DRILLING S.A.



No. PAGINA: 1 of 7

FECHA: 25/02/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 P 1
BOGOTA, D.C.

FACTURA DE VENTA No: 3790 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN: 7738 SP

UN: PT26227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016

CONCEPTO: Contrato MA-009346 Acta parcial No. 9 periodo 16 de Enero de 2013 al 15 de Febrero de 2012
HOJA DE ENTRADA
1000872068 1000872078 1000872098 1000872106 1000872122 1000872145 1000872204 1000872208 1000872158
1000872165 1000872318 1000872326 1000872290 1000872299 1000872340 1000872313 1000872310 1000872335
1000872328 1000872331
APROBACIONES
5001063830 5001063831 5001063832 5001063833 5001063834 5001063985 5001063986 5001063988 5001063989
5001063990 5001063991 5001063992 5001064067 5001064019 5001064020 5001064021 5001064022 5001064023
5001064024 5001066065
Manifestamos que Independence Drilling S.A. ha efectuado los aportes a la seguridad social por los ingresos materia de esta facturación, dando cumplimiento al monto máximo dispuesto por la ley para la base de cotización. El pago de los aportes a seguridad social respectivos se realizó bajo la planilla número 8421197966 del mes de Enero 2013.

ECOPETROL S.A.
OFICINA CUENTAS
BOGOTA
27 FEB 2013
RECIBIDO

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	3,000	4.370.000	13.110.000
2,000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	11,000	1.300.000	14.300.000
3,000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	27,000	280.000	7.560.000
4,000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 0 A 10 KM	UN	2,000	33.500.000	67.000.000
5,000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 10 A 30 KM	UN	1,000	40.000.000	40.000.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.C.O.)

Aceptado - Cliente


CL 100 7 33 T1 P 19 - BOGOTA PBX 57-1 5 87 53 33
FAX 57-1 Ext. 1006-1007 E-MAIL : info@independence.com.co
www.independence.com.co

575

CONTRATO MA-0009346 9

Desde 18-Jan-13 Hasta 15-Feb-

Tanque Bomba

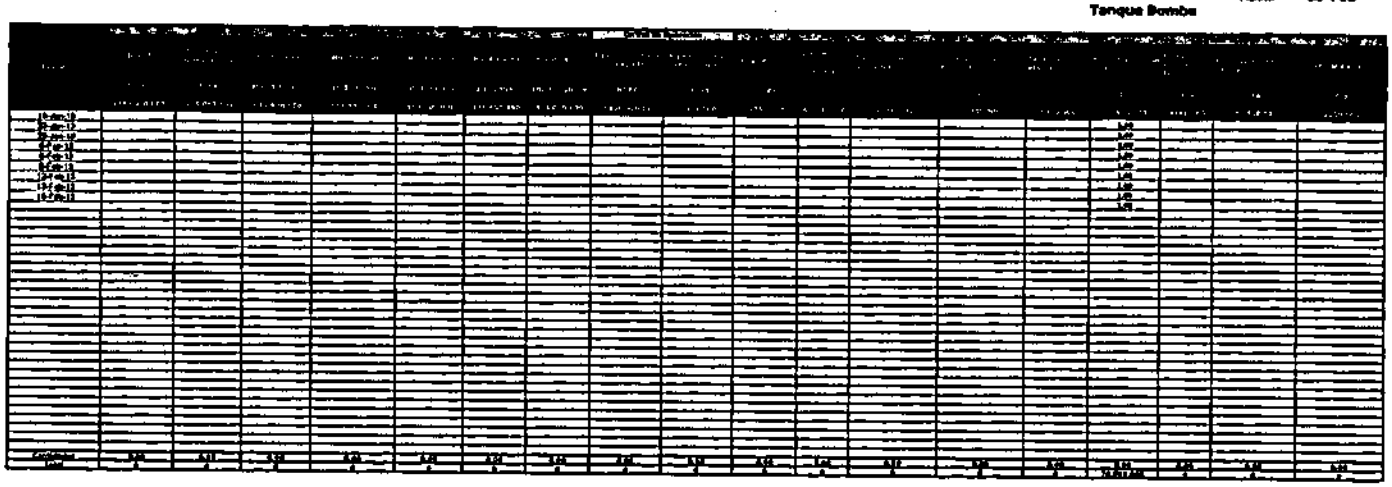




LIQUIDACION PARCIAL 9
CONTRATO MA-0009346

Desde 16-Jan-13 Hasta 15-Feb-13

Torre 123- 930 HP

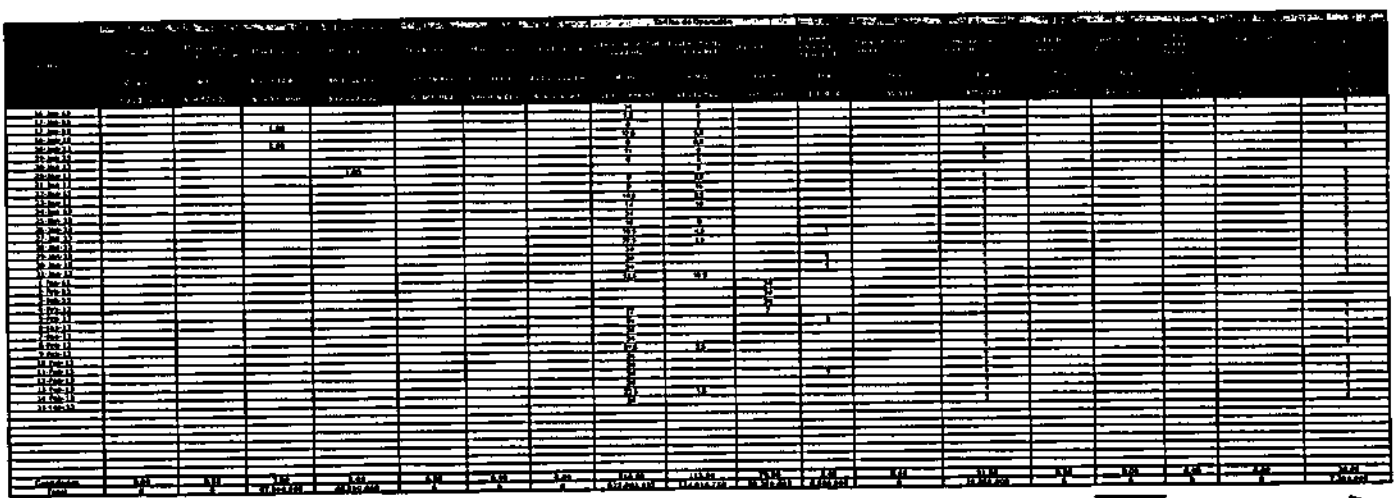




576

LIQUIDACION PARCIAL 9
CONTRATO MA-0009346

Desde 16-Jan-13 Hasta 15-Feb-13

Torre 34 - 550 HP

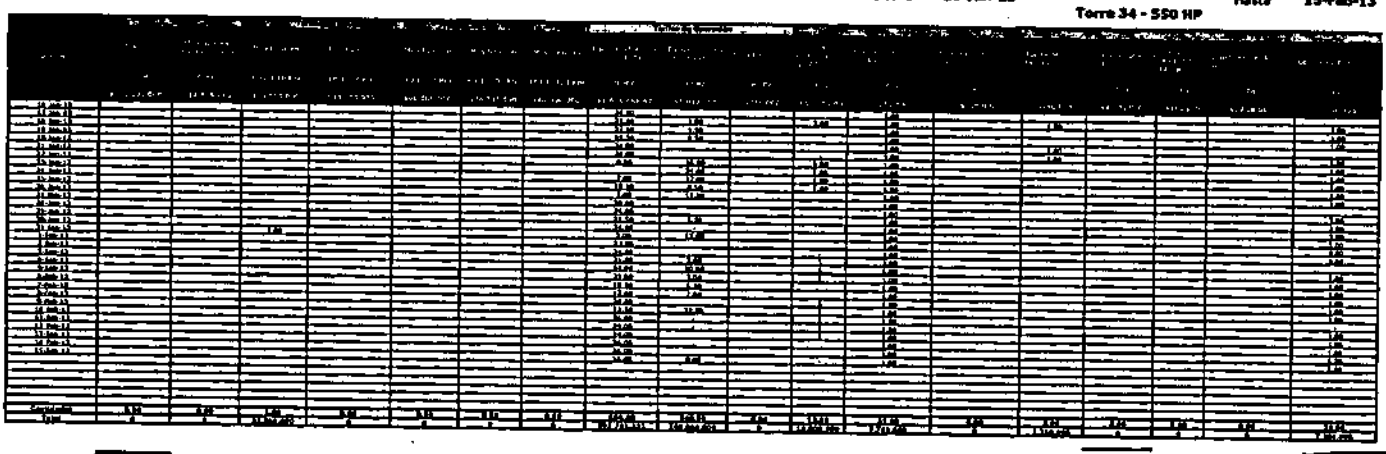




CONTRATO MA-0009346 9

Desde 16-Jan-13 Hasta 15-Feb-13

Torre 42 - 550 HP

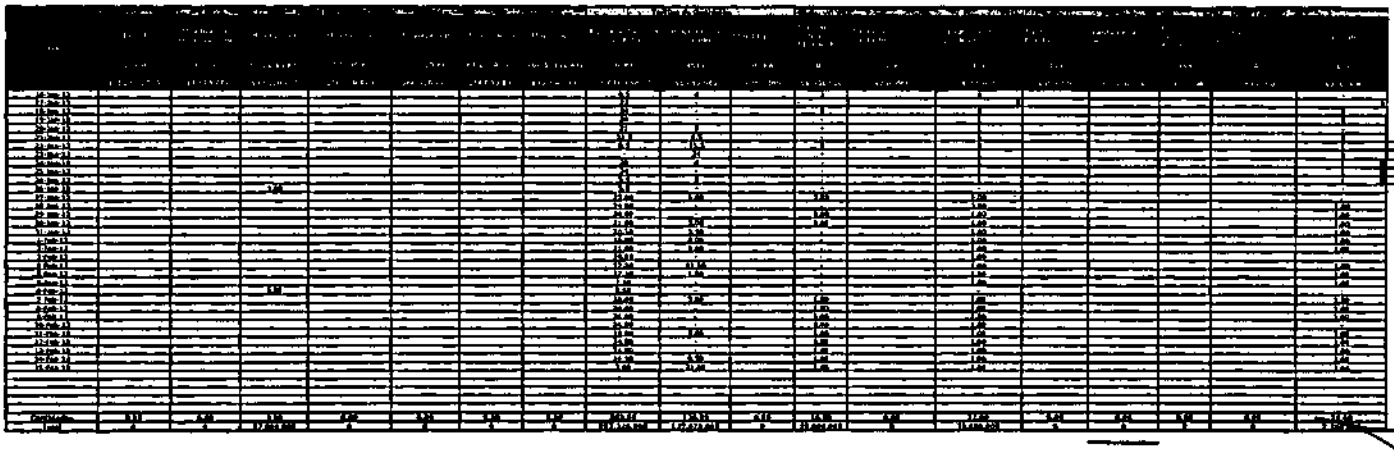



577


Independence ENERGY


SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO


LIQUIDACION PARCIAL 9
CONTRATO HA-0009346


Desde 16-Jan-13 Hasta 15-Feb-13

Torre 32 - 550 HP

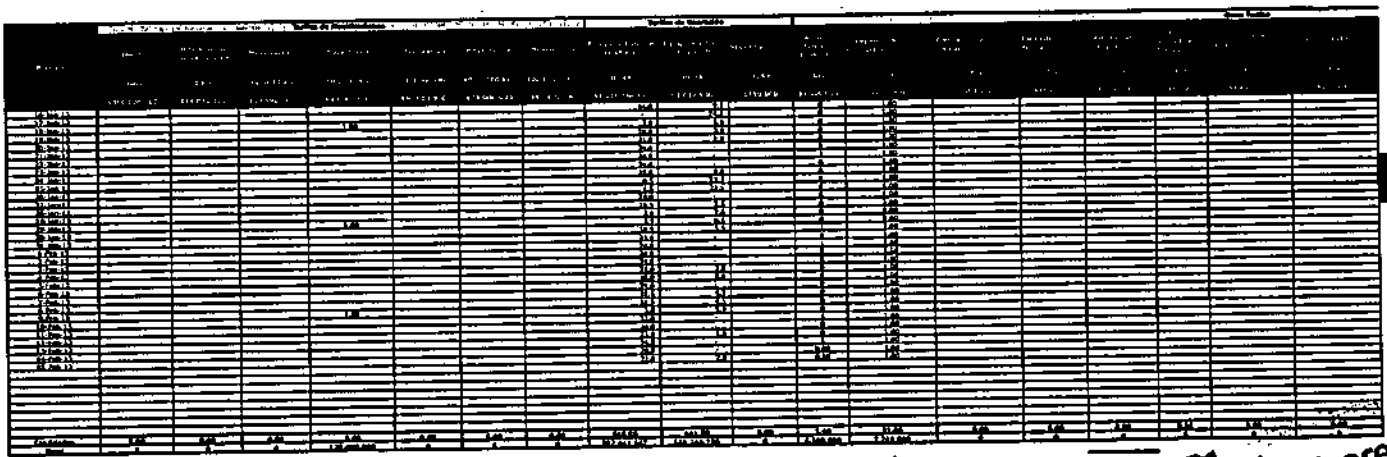








578

LIQUIDACION PARCIAL9
CONTRATO MA-0009346


Desde 16-Jan-13 Hasta 1 13


Torre 31 - 550 HP

[redacted]

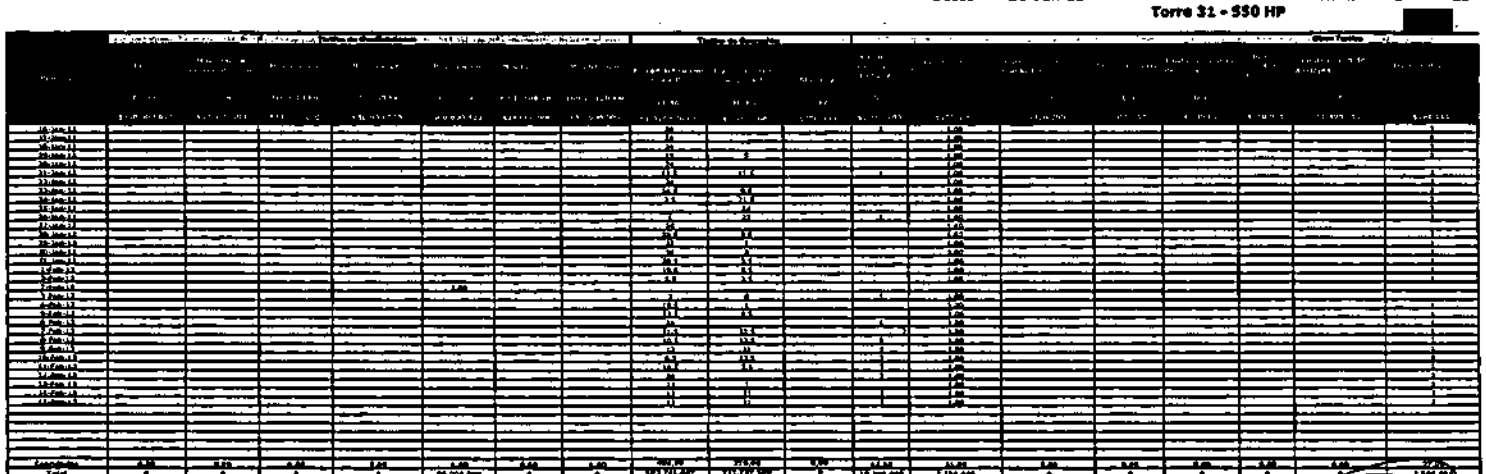

Factor de Servicio (%) [redacted]









LIQUIDACION PARCIAL 9
CONTRATO MA-0069346

Desde 16-Jan-13 Hasta


Terra 28 - 350 HP

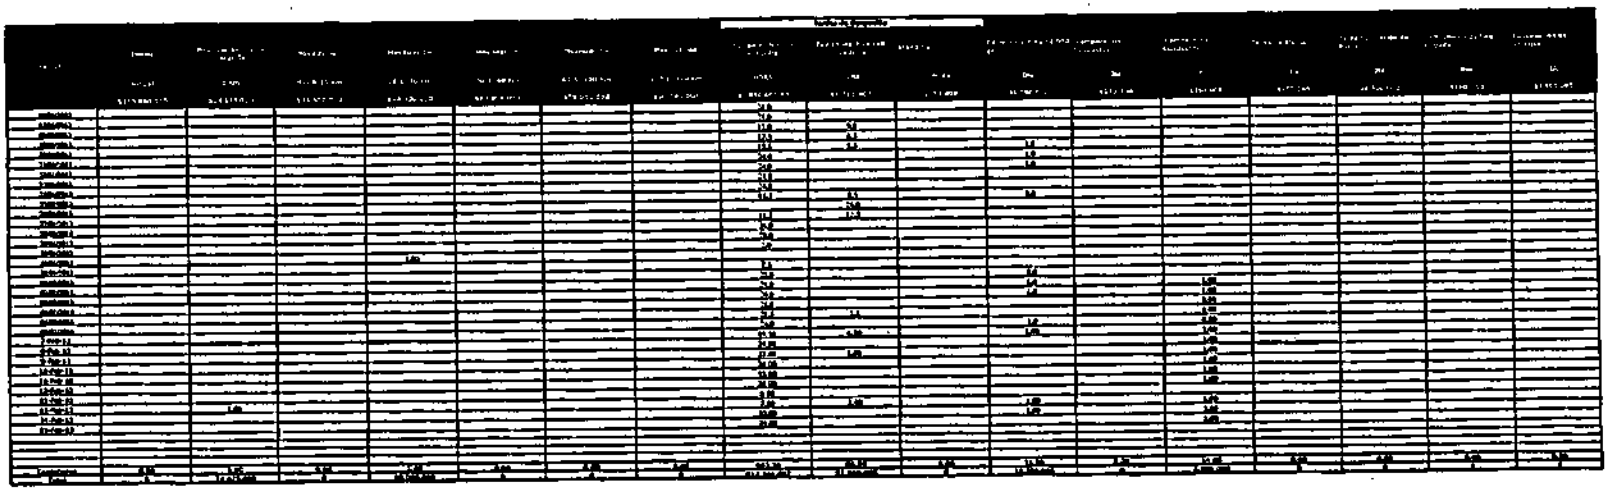







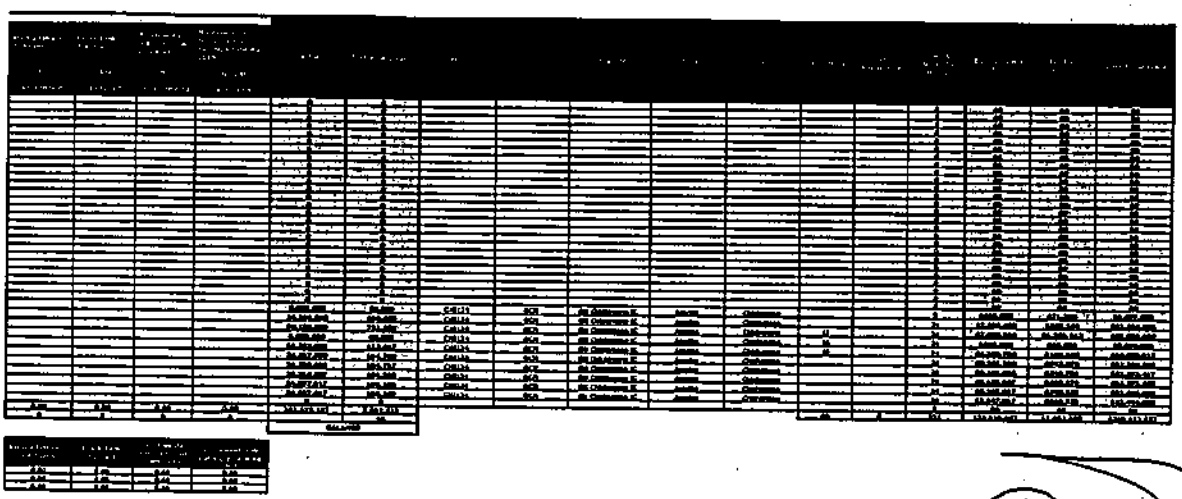


Independence ENERGY
SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO


LIQUIDACION PARCIAL 9
CONTRATO MA-0089346


Desde 18-Oct-12 Hasta 20-Nov-12

Torre 26 - 850 HP

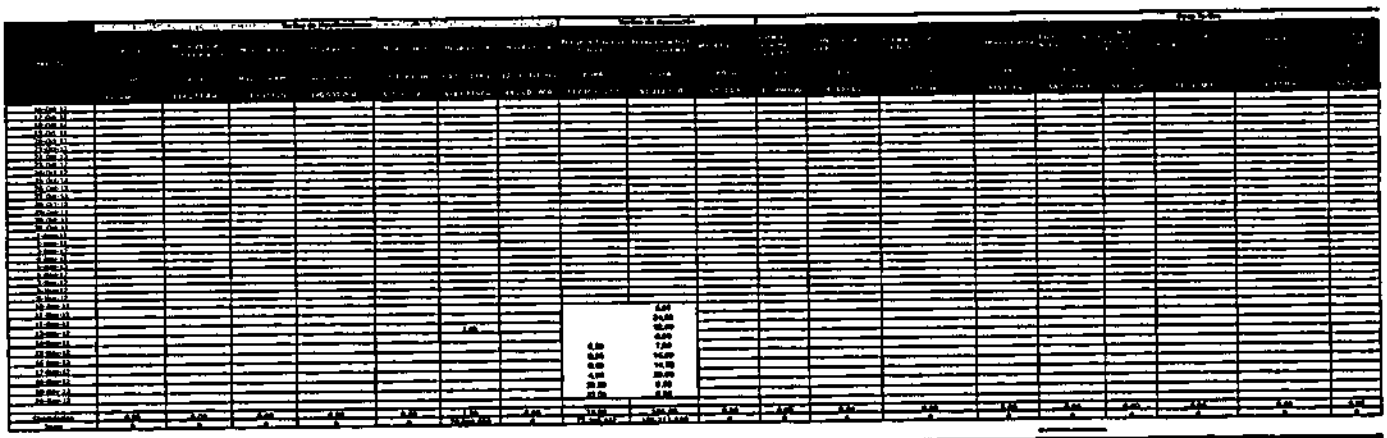








Independence ENERGY
SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO

580

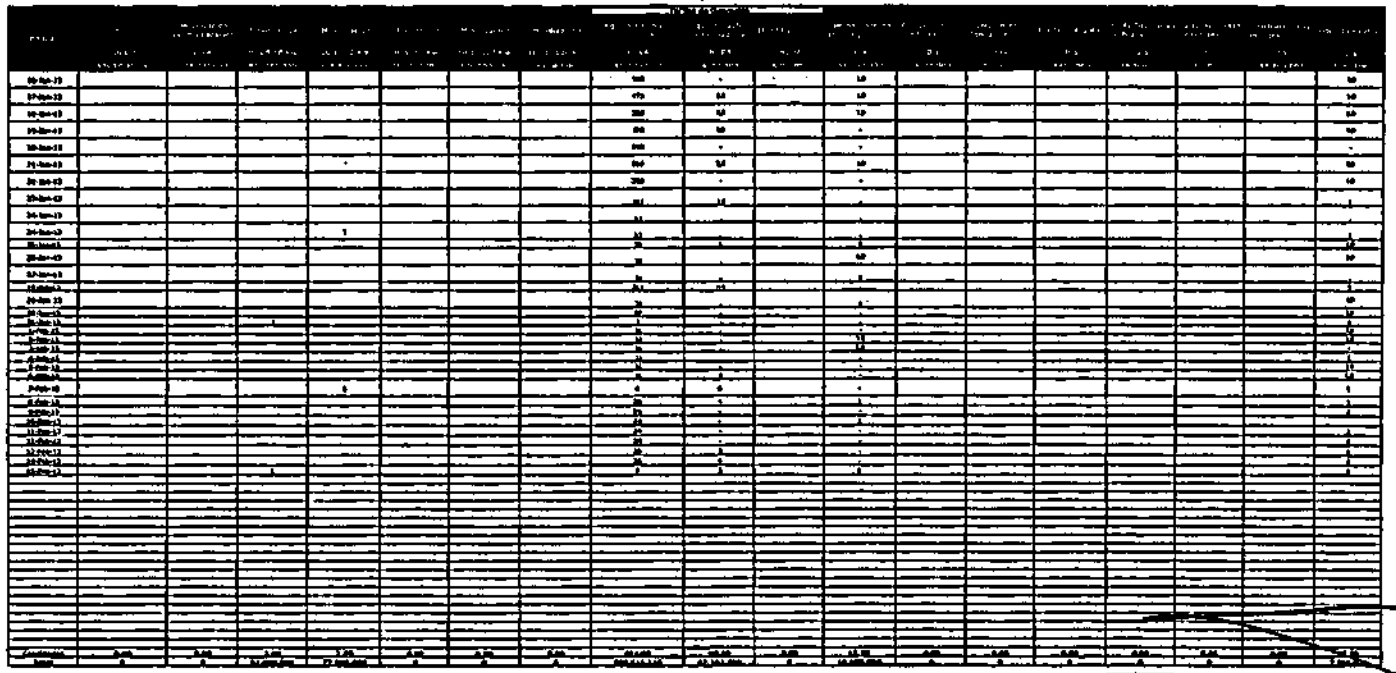

Independence ENERGY
SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO

ECOPETROL S.A.
SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA- CHICHIMENE
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 9 - CONTRATO HA-0009348

El día 18 de Febrero de 2013, se reunieron en las oficinas del Departamento de Producción de la Superintendencia de Operaciones Castilla- Chichimene, el Ing. Francisco Villabona en representación de Independence Drilling S.A. y el Ingeniero Nixon Molina Baquero en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes:

Periodo de liquidación: 18 de enero de 2013 **AL** 18 de febrero de 2013

Equipo 550 HP

1	TARIFAS DE MOVILIZACION					
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$ 350.000.000	0	$	-
1.2	Movilización final		$ 350.000.000	0	$	-
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 14.075.000	1	$	14.075.000
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 33.500.000	7	$	234.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$ 40.000.000	6	$	240.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$ 60.000.000	1	$	60.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$ 78.000.000	0	$	-
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$ 90.000.000	0	$	-
2						
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 24.400.000	158,210	$	3.860.324.000
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 24.300.000	43,959	$	1.068.203.700
2.3	Stand by	DIA	$ 18.000.000	3,292	$	59.256.000
3						
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$ 1.300.000	74,000	$	96.200.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$ 250.000	93,000	$	23.250.000
3.3	Campero con conductor	DIA	$ 350.000	76,000	$	26.600.000
3.4	Tarifa de planta	DIA	$ 450.000	3,000	$	1.350.000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$ 8.500.000	9,000	$	76.500.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$ 160.000	0,000	$	-
3.7	Construcción de anclajes	EA	$ 1.800.000	0,000	$	-
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$ 280.000	151,000	$	42.280.000
3.9	Container adicional	DIA	$ 280.000	8,000	$	2.240.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	EA	$ 4.370.000	15,000	$	65.550.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 400.000	78,000	$	31.200.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$ 28.000.000	2,000	$	56.000.000
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$ 250.000	0,000	$	-
	SUBTOTAL					8.317.578.700
	BASE GRAVABLE					476.602.296
	FACTOR DE SERVICIO					47.660.230
	TOTAL BASE GRAVABLE					524.262.526
	BASE NO GRAVABLE					5.480.926.404
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					6.005.189
	IVA BASE GRAVABLE					83.883
	TOTAL EQUIPO DE WO 550HP					6.089.072

Equipos 350 HP + Tanque Bomba

1	TARIFAS DE MOVILIZACION					
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$ 360.000.000	0	$	-
1.2	Movilización final		$ 350.000.000	0	$	-
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$ 28.000.000	0	$	-
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$ 30.500.000	2	$	61.000.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$ 38.500.000	2	$	77.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$ 62.500.000	0	$	-
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$ 76.600.000	0	$	-
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$ 84.000.000	0	$	-
2						
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$ 23.200.000	25,599	$	593.896.800
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$ 23.100.000	2,063	$	47.655.300
2.3	Stand by	DIA	$ 18.000.000	0,000	$	-
3						
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$ 1.300.000	13,000	$	16.900.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$ 250.000	0,000	$	-
3.3	Campero con conductor	DIA	$ 350.000	0,000	$	-
3.4	Tarifa de planta	DIA	$ 450.000	0,000	$	-
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$ 8.500.000	0,000	$	-
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$ 160.000	0,000	$	-
3.7	Construcción de anclajes	EA	$ 1.800.000	0,000	$	-
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$ 280.000	24,000	$	6.720.000
3.9	Container adicional	DIA	$ 280.000	137,000	$	38.360.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	EA	$ 4.370.000	4,000	$	17.480.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$ 400.000	155,000	$	62.000.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$ 28.000.000	0,000	$	-
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$ 250.000	0,000	$	-
	SUBTOTAL					921.012.100
	BASE GRAVABLE					73.680.968
	FACTOR DE SERVICIO					7.368.097
	TOTAL BASE GRAVABLE					81.049.065
	BASE NO GRAVABLE					847.933
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					928.980
	IVA BASE GRAVABLE					12.967
	TOTAL EQUIPO DE WO					941.248.042

Ataque	$ 4.005.[illegible]	42%
Castilla La Nueva	$ [illegible]	32%
Guamal	$ 8.372.260,55	10%
Total	$ 9.[illegible]	100%

En constancia se firman los representantes de las partes:

FRANCISCO VILLABONA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
REPRESENTANTE DELEGADO

NIXON MOLINA BAQUERO
ECOPETROL
GESTOR TECNICO

RODRIGO J HERNANDEZ R
ECOPETROL
ADMINISTRADOR

581

ECOPETROL S.A.
SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA- CHICHIMENE
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 9 - CONTRATO HA-0009346

El día 18 de Febrero de 2013, se reunieron en las oficinas del Departamento de Producción de la Superintendencia de Operaciones Castilla- Chichimene, el Ing. Francisco Villabona en representación de Independence Drilling S.A. y el Ingeniero Nixon Molina Baquero en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes:

Periodo de liquidación: 18 de enero de 2013 **AL** 18 de febrero de 2013

Equipo 550 HP

1	TARIFAS DE MOVILIZACION					
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$	350.000.000	0	$ -
1.2	Movilización final		$	350.000.000	0	$ -
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$	14.075.000	1	$ 14.075.000
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$	33.500.000	7	$ 234.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$	40.000.000	6	$ 240.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$	60.000.000	1	$ 60.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$	78.000.000	0	$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$	90.000.000	0	$ -
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$	24.400.000	158,210	$ 3.860.324.000
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$	24.300.000	43,959	$ 1.068.203.700
2.3	Stand by	DIA	$	18.000.000	3,292	$ 59.256.000
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$	1.300.000	74,000	$ 96.200.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$	250.000	93,000	$ 23.250.000
3.3	Campero con conductor	DIA	$	350.000	76,000	$ 26.600.000
3.4	Tarifa de planta	DIA	$	450.000	3,000	$ 1.350.000
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$	8.500.000	9,000	$ 76.500.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$	160.000	0,000	$
3.7	Construcción de anclajes	EA	$	1.800.000	0,000	$
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$	280.000	151,000	$ 42.280.000
3.9	Container adicional	DIA	$	280.000	8,000	$ 2.240.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con recerla)	EA	$	4.370.000	15,000	$ 65.550.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$	400.000	78,000	$ 31.200.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$	28.000.000	2,000	$ 56.000.000
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$	250.000	0,000	$ -
	SUBTOTAL					6.957.528.700
	BASE GRAVABLE					476.402.396
	FACTOR DE SERVICIO					47.640.230
	TOTAL BASE GRAVABLE					524.262.626
	BASE NO GRAVABLE					5.480.926.404
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					6.005.188.930
	IVA BASE GRAVABLE					83.841.004
	TOTAL EQUIPO DE WO 550HP					6.089.070.934

Equipos 350 HP - Tanque Bombo

1	TARIFAS DE MOVILIZACION					
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$	360.000.000	0	$ -
1.2	Movilización final		$	360.000.000	0	$ -
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$	28.000.000	0	$ -
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$	30.500.000	2	$ 61.000.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$	38.500.000	2	$ 77.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$	63.500.000	0	$ -
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$	76.600.000	0	$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$	84.000.000	0	$ -
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$	23.200.000	25,599	$ 593.896.800
2.2	Equipo inactiva con cuadrilla	DIA	$	23.100.000	2,063	$ 47.655.300
2.3	Stand by	DIA	$	18.000.000	0,000	$ -
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$	1.300.000	13,000	$ 16.900.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$	250.000	0,000	$ -
3.3	Campero con conductor	DIA	$	350.000	0,000	$ -
3.4	Tarifa de planta	DIA	$	450.000	0,000	$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$	8.500.000	0,000	$
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$	160.000	0,000	$
3.7	Construcción de anclajes	EA	$	1.800.000	0,000	$
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$	280.000	24,000	$ 6.720.000
3.9	Container adicional	DIA	$	280.000	137,000	$ 38.360.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocerla)	EA	$	4.370.000	4,000	$ 17.480.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$	400.000	155,000	$ 62.000.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$	28.000.000	0,000	$ -
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$	250.000	0,000	$ -
	SUBTOTAL					921.012.100
	BASE GRAVABLE					73.680.968
	FACTOR DE SERVICIO					7.368.097
	TOTAL BASE GRAVABLE					81.049.065
	BASE NO GRAVABLE					847.331.132
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					928.380.197
	IVA BASE GRAVABLE					12.967.850
	TOTAL EQUIPO DE WO					941.348.047

Aceites	$	4.005.383	58%
Castilla La Nueva	$	2.198.180	32%
Guamal	$	760.55	10%
Total	$	6.964.123	100%

En constancia de lo anterior firman los representantes de las partes:

Independence ENERGY

FRANCISCO VILLABONA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
REPRESENTANTE DELEGADO

NIXON MOLINA BAQUERO
ECOPETROL
GESTOR TECNICO

RODRIGO J HERNANDEZ R
ECOPETROL
ADMINISTRADOR

3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0	$ 250.000	$ 0
	FACTOR DE SERVICIO			$ 7.368.097
	TOTAL			$ 628.380.197

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el COORDINADOR DE GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO.

En constancia, se firma en Villavicencio 18 de Febrero de 2013, en dos ejemplares de Idéntico tenor literal:

Por el CONTRATISTA

FRANCISCO JAVIER VILLABONA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Por la GESTION TÉCNICA

NIXON MOLINA BAQUERO ECOPETROL S.A.

582

ecopetrol	ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL DE OBRA/SERVICIO		
	GESTION DE ABASTECIMIENTO DIRECCION ESTRATEGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-082	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

Mediante la suscripción de la presente Acta:

a) **INDEPENDENCE DRILLING S.A.,** que para todos los efectos legales y para los de este documento se denomina el CONTRATISTA, **FRANCISCO JAVIER VILLABONA.** mayor de edad, identificado con Cédula 17.419.403, quien actúa en su calidad de representante autorizado de la empresa y,
b) **LAURA JULIANA NIÑO FLOREZ** identificado con Cédula de Ciudadanía número 63.510.108 de Bucaramanga, quien actúa en su calidad de GESTOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.
c) **LUIS JOSE ALMEIDA PINZON** identificado con registro Ecopetrol Nº E0117252 quien actúa en calidad de Administrador del contrato.

Dejan constancia de que,

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el **16 de Marzo de 2013 al 15 de Abril de 2013,** prestó los servicios contemplados en el contrato **MA-0009346** que se relaciona en la presente acta de liquidación parcial de servicio. El valor del servicio prestado en el periodo es el siguiente:

ACTA Nº	VALOR ACTA	SALDO DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	6.778.373.400	137.256.591.060,00	6.778.373.400,00	5,54%
2	3.476.839.100	133.779.751.960,00	10.255.212.500,00	8,38%
2.1	1.522.502.200	132.257.249.760,00	11.777.714.700,00	9,63%
3	4.468.492.200	127.788.757.560,00	16.246.206.900,00	13,28%
4	4.718.137.300	123.070.620.260,00	20.964.344.200,00	17,13%
4.1	1.036.578.128	122.034.042.132,00	22.000.922.328,00	17,98%
5	6.504.068.189	115.529.973.943,00	28.504.990.517,00	23,30%
6	5.512.239.600	110.017.734.343,00	34.017.230.117,00	27,80%
7	2.197.630.700	107.820.103.643,00	36.214.860.817,00	29,60%
8	4.210.389.900	103.609.713.743,00	40.425.250.717,00	33,04%
9	6.933.569.126	96.676.144.617,00	47.358.819.843,00	38,71%
10	6.111.735.800	90.564.408.817,00	53.470.555.643,00	43,70%
11	7.624.230.163	82.940.178.654,00	61.094.785.806,00	49,93%

	ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL DE OBRA/SERVICIO		
ecopetrol	GESTION DE ABASTECIMIENTO DIRECCION ESTRATEGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-082	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL DE SERVICIO Nº 11 AL CONTRATO MA-0009346

CONTRATO:	**MA-0009346**
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 – 2016.**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**($122.351.947.960)** CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR IVA.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	**(1005)** MIL CINCO DIAS CALENDARIO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 LO QUE OCURRA PRIMERO.
MAYOR CANTIDAD 1	**($5.957.053.280)** CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y TRES DOSCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
MAYOR CANTIDAD 2	**($4.049.217.320)** CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
MAYOR CANTIDAD 3	**($8.005.790.580)** OCHO MIL CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR IVA.
MAYOR CANTIDAD 4	**($3.670.955.320)** TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**($144.034.964.460)** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR IVA.
SALDO DEL CONTRATO	**($82.940.178.654)** OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISICIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
VALOR EJECUTADO	**($61.094.785.806)** SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	09/06/2012
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO:	31/12/2014
FECHA DE CORTE:	15/04/2013
PERIODO FACTURADO:	16/03/2013 – 15/04/2013
PORCENTAJE DE PAGO:	49.93%
ADMINISTRADOR:	LUIS JOSE ALMEIDA PINZON
GESTOR DEL CONTRATO:	COPCO S.A.
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
ecopetrol	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS Nro 10

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA-CHICHIMENE
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	16 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2013
VALOR PRESENTE ACTA	SEIS MIL CIENTO ONCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 6.111.735.800) SIN IVA

Mediante la suscripción de la presente Acta:

a) INDEPENDENCE DRILLING S.A., en adelante el CONTRATISTA, representado por FRANCISCO JAVIER VILLABONA TAMAYO, mayor de edad, vecino de la ciudad de BOGOTA, identificado con C.C. Nº 17.419.403 DE ACACIAS, META, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y

b) NIXON MOLINA BAQUERO identificado con Cédula de Ciudadanía número 12.114.775 DE BOGOTA, quien actúa en su calidad de GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

Dejan constancia de que,

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el 16 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2013, prestó los servicios contemplados en el contrato MA-0009346 que se relaciona en la presente acta de recibo de cantidades. El valor del servicio prestado en el periodo es el siguiente:

Cantidades Equipo 550 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	1,00	$ 350.000.000	$ 350.000.000
1.2	Movilización final	0,00	$ 350.000.000	$ 0
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	2,00	$ 14.075.000	$ 28.150.000
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	5,00	$ 33.500.000	$ 167.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	6,00	$ 40.000.000	$ 240.000.000

ecopetrol	**ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL DE OBRA/SERVICIO**		
	GESTION DE ABASTECIMIENTO DIRECCION ESTRATEGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-082	**Elaborado 29/11/2012**	**Versión: 1**

ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL DE SERVICIO Nº 10 AL CONTRATO MA-0009346

CONTRATO:	**MA-0009346**
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 – 2016.**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**($122.351.947.960)** CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR IVA.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	**(1005)** MIL CINCO DIAS CALENDARIO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 LO QUE OCURRA PRIMERO.
MAYOR CANTIDAD 1	**($5.957.053.280)** CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y TRES DOSCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
MAYOR CANTIDAD 2	**($4.049.217.320)** CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
MAYOR CANTIDAD 3	**($8.005.790.580)** OCHO MIL CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR IVA.
MAYOR CANTIDAD 4	**($3.670.955.320)** TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**($144.034.964.460)** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR IVA.
SALDO DEL CONTRATO	**($90.564.408.817)** NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
VALOR EJECUTADO	**($53.470.555.643)** CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISICIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	09/06/2012
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO:	31/12/2014
FECHA DE CORTE:	15/03/2013
PERIODO FACTURADO:	16/02/2013 – 15/03/2013
PORCENTAJE DE PAGO:	43.70%
ADMINISTRADOR:	LUIS JOSE ALMEIDA PINZON
GESTOR DEL CONTRATO:	COPCO S.A.
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
PETROL	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 29/11/2012	Versión: 1

1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	2,00	$ 60.000.000	$ 120.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 78.000.000	$ 0
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 90.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	125,791	$ 24.400.000	$ 3.069.300.400
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	38,271	$ 24.300.000	$ 929.985.300
2.3	Stand by	0,000	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	64,00	$ 1.300.000	$ 83.200.000
3.2	Campero sin conductor	78,00	$ 250.000	$ 19.500.000
3.3	Campero con conductor	78,00	$ 350.000	$ 27.300.000
3.4	Tarifa de planta	0,00	$ 450.000	$ 0
3.5	Tarifa de circulación de pozos	11,00	$ 8.500.000	$ 93.500.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	84,00	$ 160.000	$ 13.440.000
3.7	Construcción de anclajes	0,00	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	130,00	$ 280.000	$ 36.400.000
3.9	Container adicional	0,00	$ 280.000	$ 0
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	15,00	$ 4.370.000	$ 65.550.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	130,00	$ 400.000	$ 52.000.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	2,00	$ 28.000.000	$ 56.000.000
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0,00	$ 250.000	$ 0
	FACTOR DE SERVICIO			$ 0
	TOTAL			$ 5.351.825.700

Cantidades Equipo 350 HP

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización inicial	0,00	$ 360.000.000	$ 0
1.2	Movilización final	0,00	$ 360.000.000	$ 0
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	0,00	$ 28.000.000	$ 0
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	1,00	$ 30.500.000	$ 30.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	2,00	$ 38.500.000	$ 77.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	0,00	$ 63.500.000	$ 0
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	0,00	$ 76.600.000	$ 0
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	0,00	$ 84.000.000	$ 0
2.1	Equipo activo con cuadrilla	21,75	$ 23.200.000	$ 504.600.000
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	2,271	$ 23.100.000	$ 52.460.100
2.3	Stand by	0	$ 18.000.000	$ 0
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	8	$ 1.300.000	$ 10.400.000
3.2	Campero sin conductor	0	$ 250.000	$ 0
3.3	Campero con conductor	0	$ 350.000	$ 0
3.4	Tarifa de planta	0	$ 450.000	$ 0
3.5	Tarifa de circulación de pozos	0	$ 8.500.000	$ 0
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	40	$ 160.000	$ 6.400.000
3.7	Construcción de anclajes	0	$ 1.800.000	$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	22	$ 280.000	$ 6.160.000
3.9	Container adicional	26	$ 280.000	$ 7.280.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	3	$ 4.370.000	$ 13.110.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	130	$ 400.000	$ 52.000.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	0	$ 28.000.000	$ 0

585

ECOPETROL S.A.
SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA- CHICHIMENE
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 18 - CONTRATO 5A-6000346

El día 18 de Marzo de 2013, se reunieron en las oficinas del Departamento de Producción de la Superintendencia de Operaciones Castilla- Chichimene, el Ing. Francisco Villabona en representación de Independence Drilling S.A. y el Ingeniero Hiron Molina Baquero en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes:

Periodo de liquidación: 16 de febrero de 2013 **AL** 13 de marzo de 2013

Equipo 350 HP

1	TARIFAS DE MOVILIZACION					
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$	350.000.000	1	$ 350.000.000
1.2	Movilización final		$	350.000.000	0	$ -
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$	14.075.000	2	$ 28.150.000
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$	23.500.000	5	$ 167.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$	40.000.000	6	$ 240.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$	60.000.000	2	$ 120.000.000
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$	78.000.000	0	$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$	90.000.000	0	$ -
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$	24.400.000	125,791	$ 3.069.300.400
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$	24.300.000	38,271	$ 929.985.300
2.3	Stand by	DIA	$	18.000.000	0,000	$ -
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	$	1.300.000	64	$ 83.200.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$	250.000	78	$ 19.500.000
3.3	Campero con conductor	DIA	$	350.000	78	$ 27.300.000
3.4	Tarifa de planta	DIA	$	450.000	0	$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$	8.500.000	11	$ 93.500.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$	160.000	84	$ 13.440.000
3.7	Construcción de anclajes	EA	$	1.800.000	0	$ -
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$	280.000	130	$ 36.400.000
3.9	Container adicional	DIA	$	280.000	0	$ -
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	EA	$	4.370.000	15	$ 65.550.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$	400.000	130	$ 52.000.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$	28.000.000	2	$ 56.000.000
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$	250.000	0	$ -
	SUBTOTAL					$ 5.151.825.700
	BASE GRAVABLE					$ 428.349.056
	FACTOR DE SERVICIO					0
	TOTAL BASE GRAVABLE					$ 428.349.056
	BASE NO GRAVABLE					$ 4.723.476.644
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					$ 5.151.825.700
	IVA BASE GRAVABLE					$ 68.343.368
	TOTAL EQUIPO DE WO 350HP					$ 5.220.169.068

Equipos 250 HP - Tanque Bomba

1	TARIFAS DE MOVILIZACION					
1.1	Movilización inicial	GLOBAL	$	360.000.000	0	$ -
1.2	Movilización final		$	360.000.000	0	$ -
1.3	Movilización entre pozos de la misma localización	EA	$	28.000.000	0	$ -
1.4	Movilización entre pozos 0-10 km	EA	$	30.500.000	1	$ 30.500.000
1.5	Movilización entre pozos 10.1-30 km	EA	$	38.500.000	2	$ 77.000.000
1.6	Movilización entre pozos 30.1-60 km	EA	$	43.500.000	0	$ -
1.7	Movilización entre pozos 60.1-100 km	EA	$	76.600.000	0	$ -
1.8	Movilización entre pozos 100.1 km hasta 120 km	EA	$	84.000.000	0	$ -
2.1	Equipo activo con cuadrilla	DIA	$	23.200.000	21,750	$ 504.600.000
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla	DIA	$	23.100.000	2,271	$ 52.460.100
2.3	Stand by	DIA	$	18.000.000	0,000	$ -
3.1	Camión cisterna 11.800 galones	DIA	$	1.300.000	8	$ 10.400.000
3.2	Campero sin conductor	DIA	$	250.000	0	$ -
3.3	Campero con conductor	DIA	$	350.000	0	$ -
3.4	Tarifa de planta	DIA	$	450.000	0	$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	$	8.500.000	0	$ -
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	$	160.000	40	$ 6.400.000
3.7	Construcción de anclajes	EA	$	1.800.000	0	$ -
3.8	Obrero de patio adicional	DIA	$	280.000	21	$ 5.160.000
3.9	Container adicional	DIA	$	280.000	26	$ 7.280.000
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	EA	$	4.370.000	3	$ 13.110.000
3.11	Frac tank - 500 bbl	DIA	$	400.000	130	$ 52.000.000
3.12	Tractomula adicional con cama alta	MES	$	28.000.000	0	$ -
3.13	Mantenimiento herramientas de pulling y running EBES	GLOBAL	$	250.000	0	$ -
	SUBTOTAL					$ 757.910.100
	BASE GRAVABLE					$ 68.723.800
	FACTOR DE SERVICIO					0
	TOTAL BASE GRAVABLE					$ 68.723.800
	BASE NO GRAVABLE					$ 689.117.392
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					$ 757.910.100
	IVA BASE GRAVABLE					$ 9.726.800
	TOTAL EQUIPO DE WO					$ 767.636.900

Acacías	$	[illegible]	61%
Castilla La Nueva	$	1.504.197.409,91	27%
Guamal	$	858.635.213,20	14%
Total	$	[illegible]	100%

En constancia de lo anterior se firman los [illegible] de las partes:

Independence Drilling S.A.
FRANCISCO VILLABONA
REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA

HIRON MOLINA BAQUERO
ECOPETROL
GESTOR TECNICO


LUIS JOSE ALMEIDA PINZON
ECOPETROL
ADMINISTRADOR

OBSERVACION:
PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO, EL FACTOR DE SERVICIO FUE -5% (SE ADJUNTA INFORMACION), POR TAL MOTIVO Y SIGUIENDO CON LAS INDICACIONES DE CUENTAS POR PAGAR EL VALOR DEL PAGO SE REALIZA COMPLETO Y SE INGRESA A SAP UNA NOTA CREDITO POR EL DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL PORCENTAJE ESTABLECIDO. VALOR DEL ACTA $ 6.111.795.800. VALOR DEL ACTA CON DESCUENTO $ 6.087.288.857.

LIQUIDACION PARCIAL 9
CONTRATO PIA-0009249

Desde 16-Feb-13 Hasta 15-Mar-13

Torre 27 - 250 HP

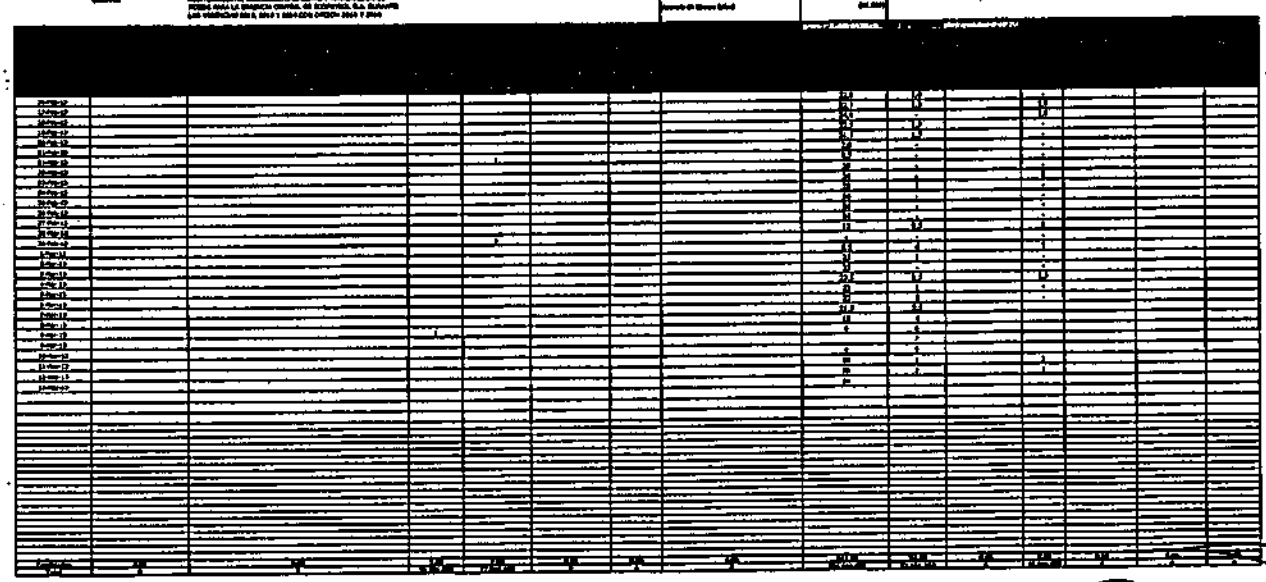






Independence
ENERGY
SUPERINTENDENTE VILLAVICEN


586

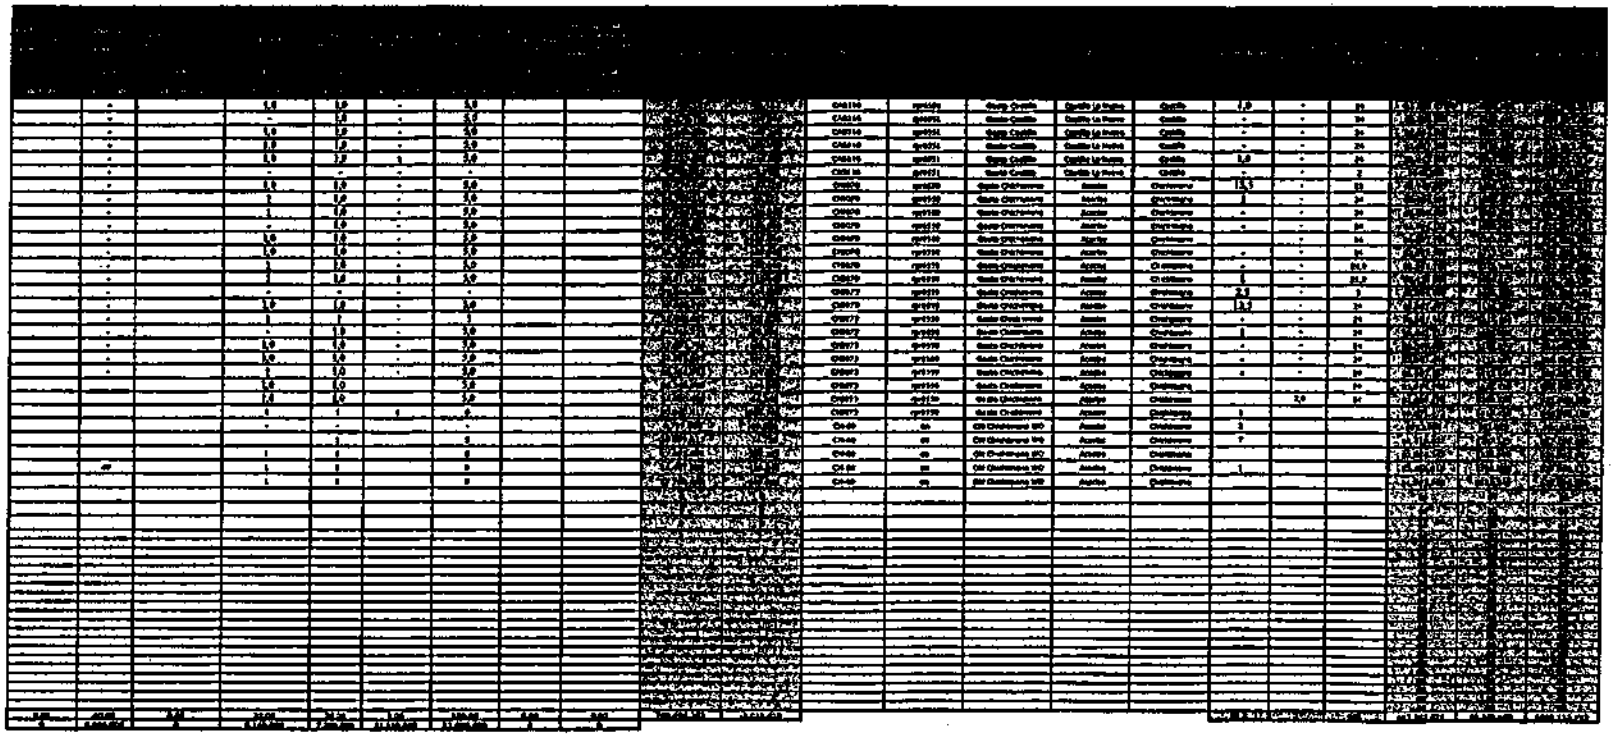


LIQUIDACION PARCIAL 9
CONTRATO HA-0000348


Desde 16-Feb-13 Hasta 15-Mar-13


Torre 28 - 550 HP

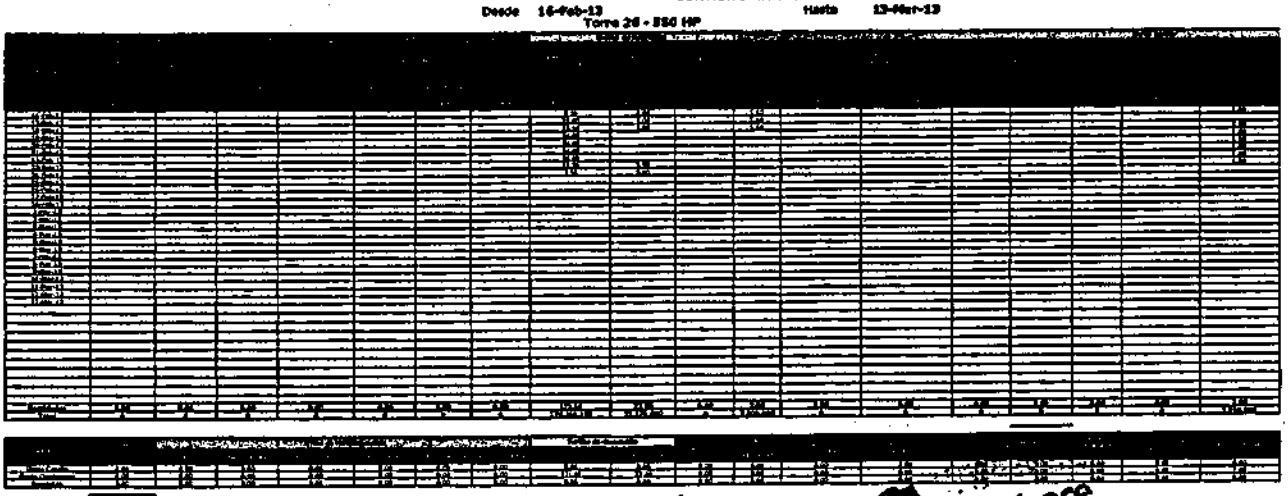













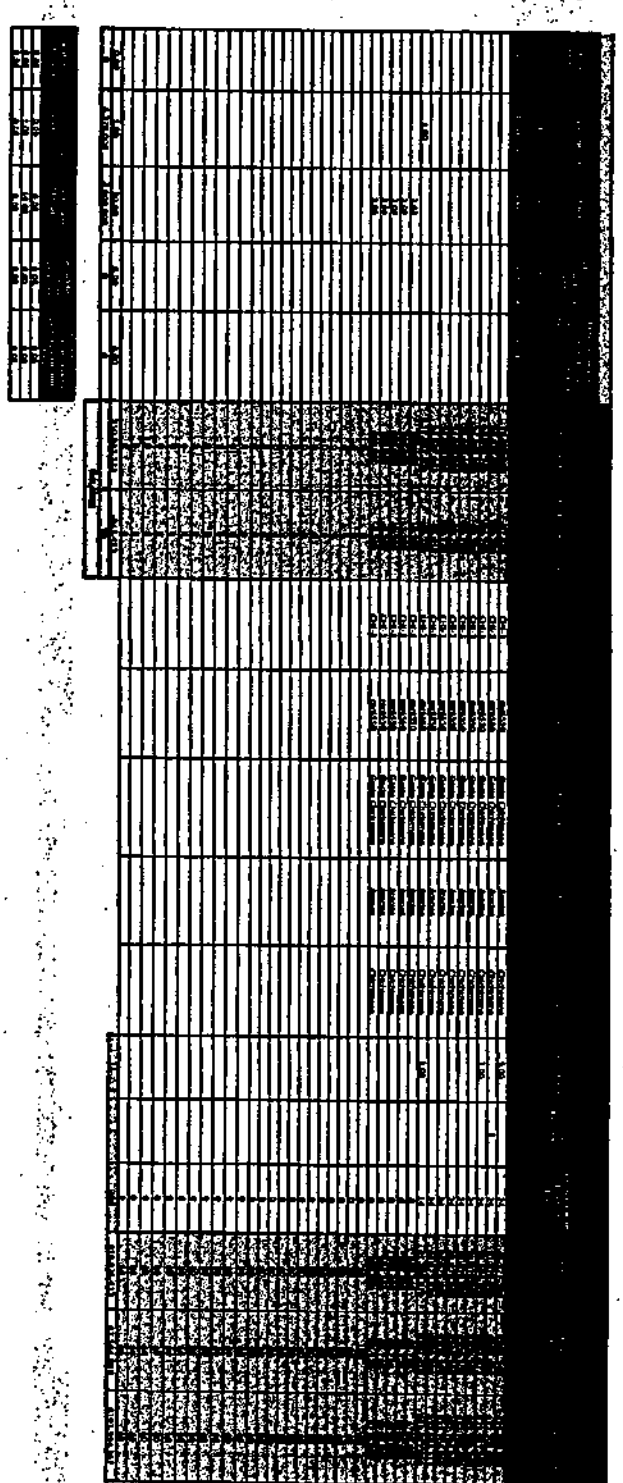

LIQUIDACION PARCIAL 9
CONTRATO MA-6005346


Desde 16-Feb-13 Hasta 13-Mar-13

Torre 28 - 550 HP

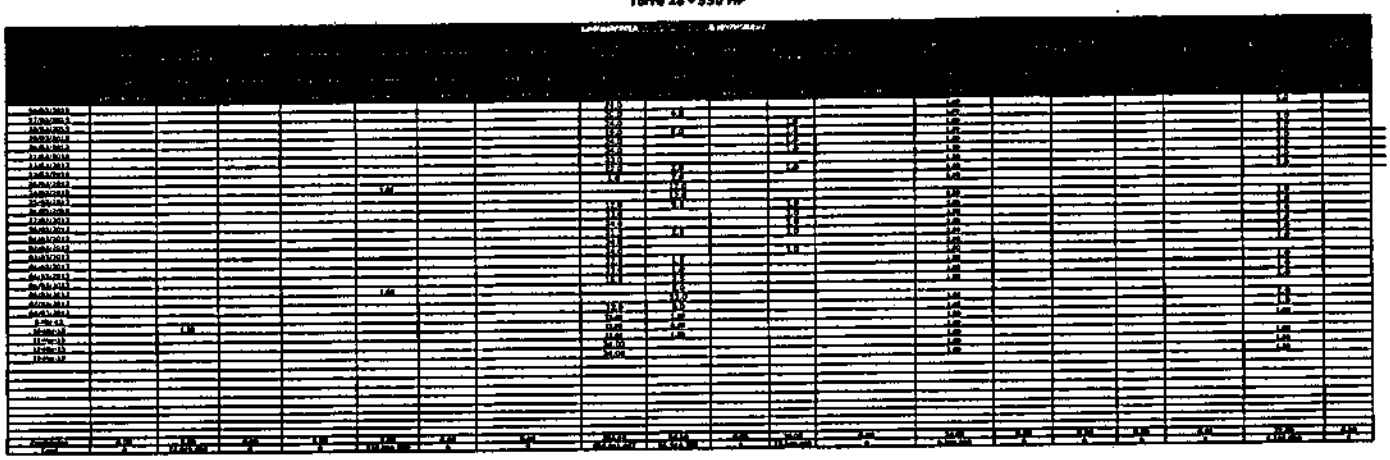

Pozos de Guerdón (%)











Independence
ENERGY
SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO

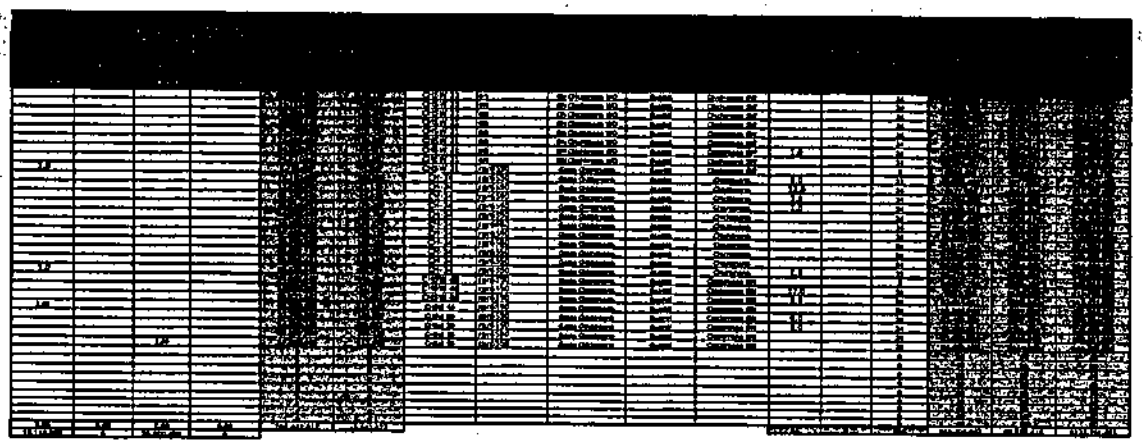


LIQUIDACI ON PARCIAL9
CONTRATO MA-0009346


Desde 16-Feb-13 Hasta 13-Mar-13

Torre 31 - 550 HP

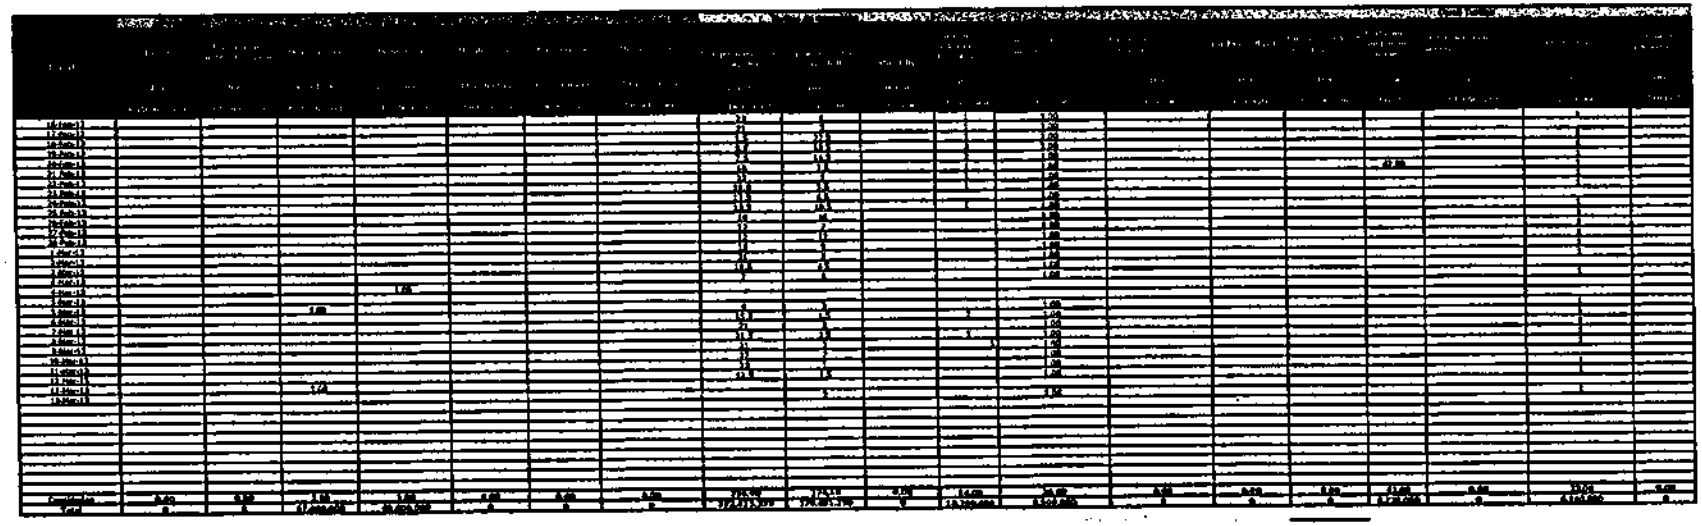






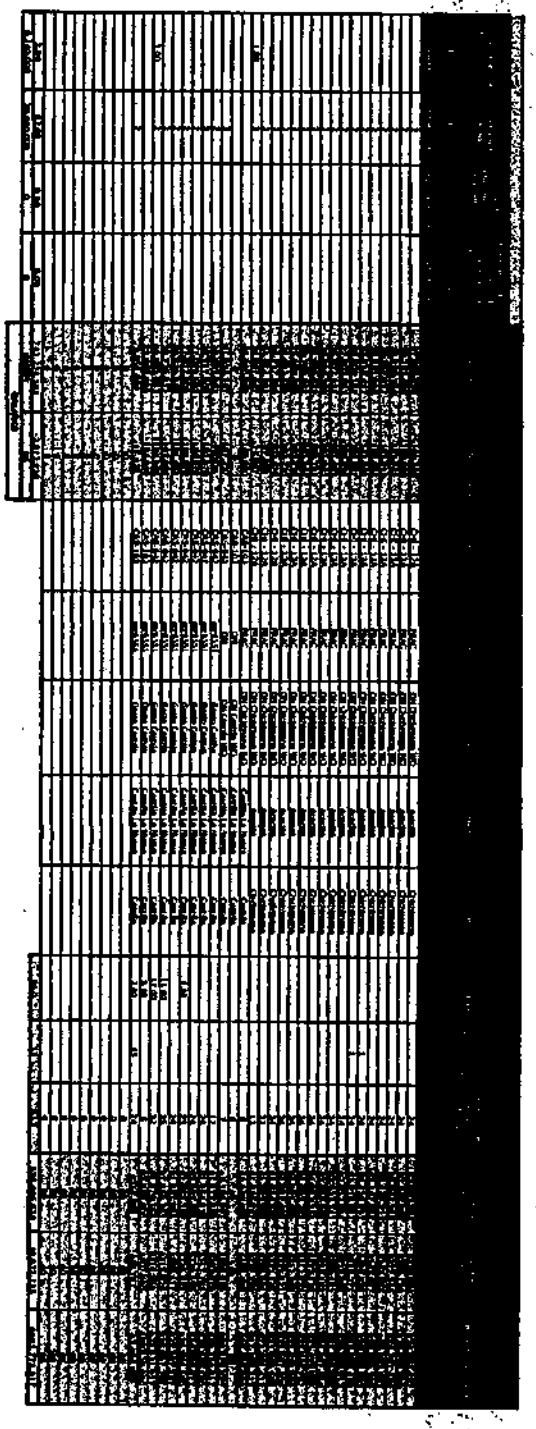



LIQUIDACION PARCIAL 9
CONTRATO MA-0009348

Desde 16-Feb-13 Hasta 13-Mar-13


Torre 32 - 650 HP

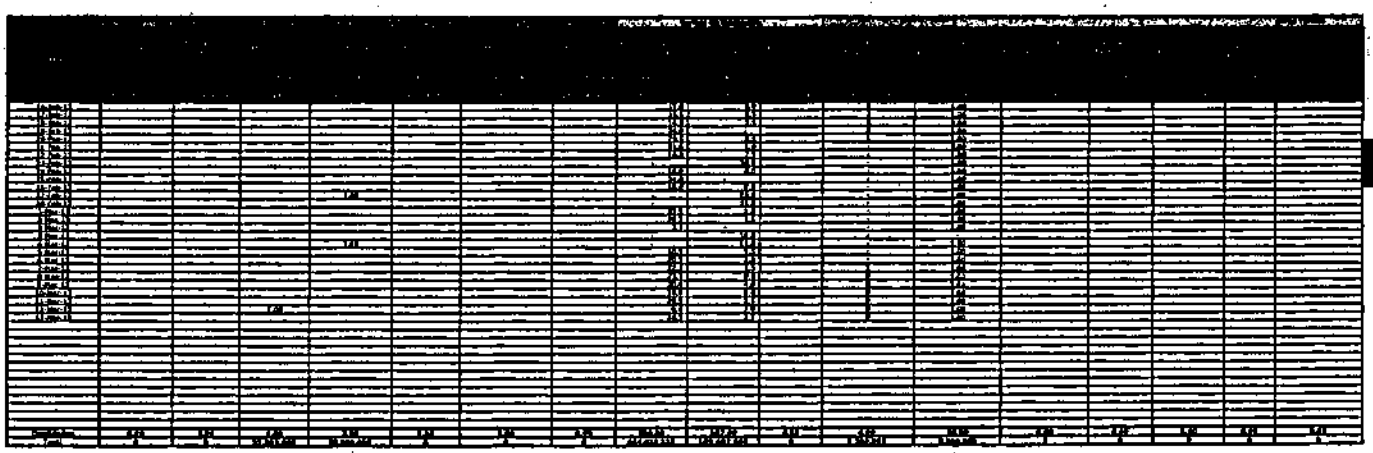











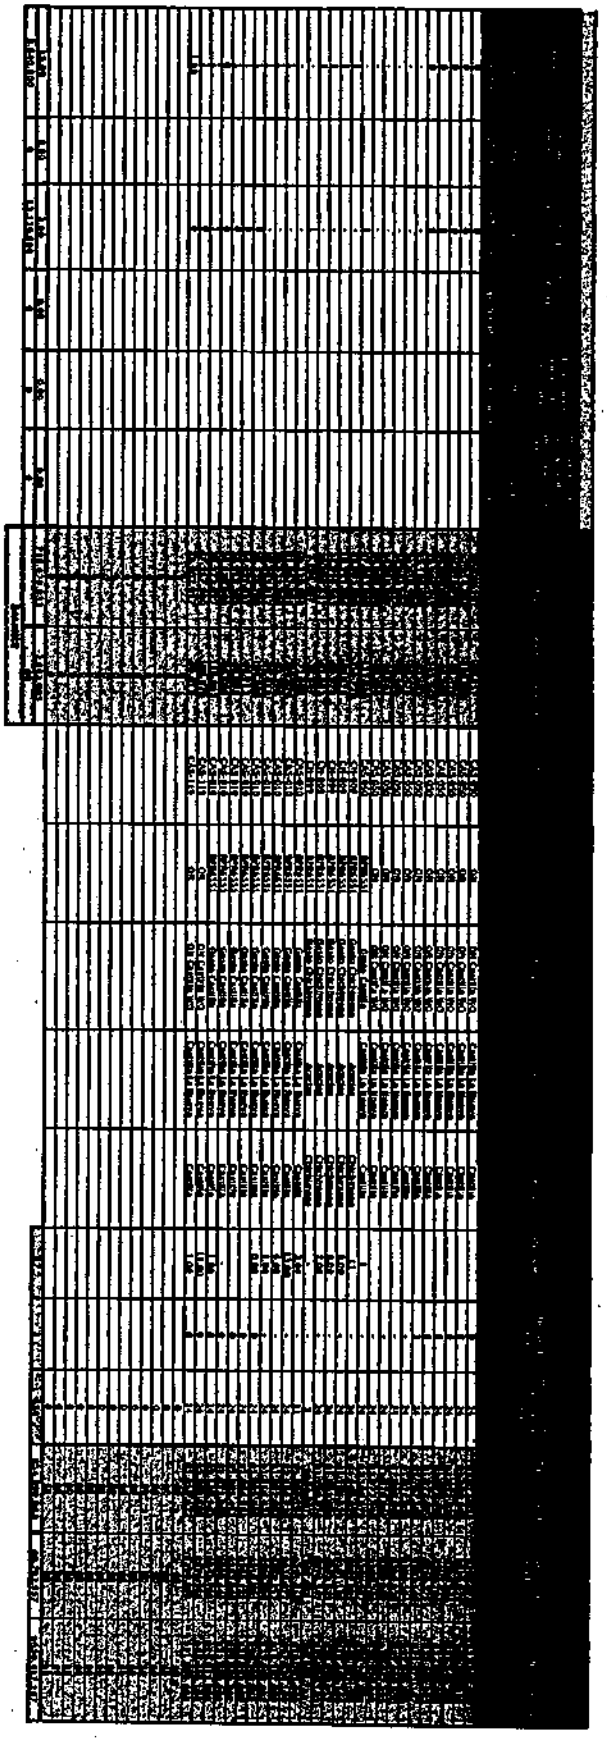



LIQUIDACION PARCIAL 9
CONTRATO HA-0009346

Desde 16-Feb-13 Hasta 13-Mar-13

Torre 34 - 850 HP

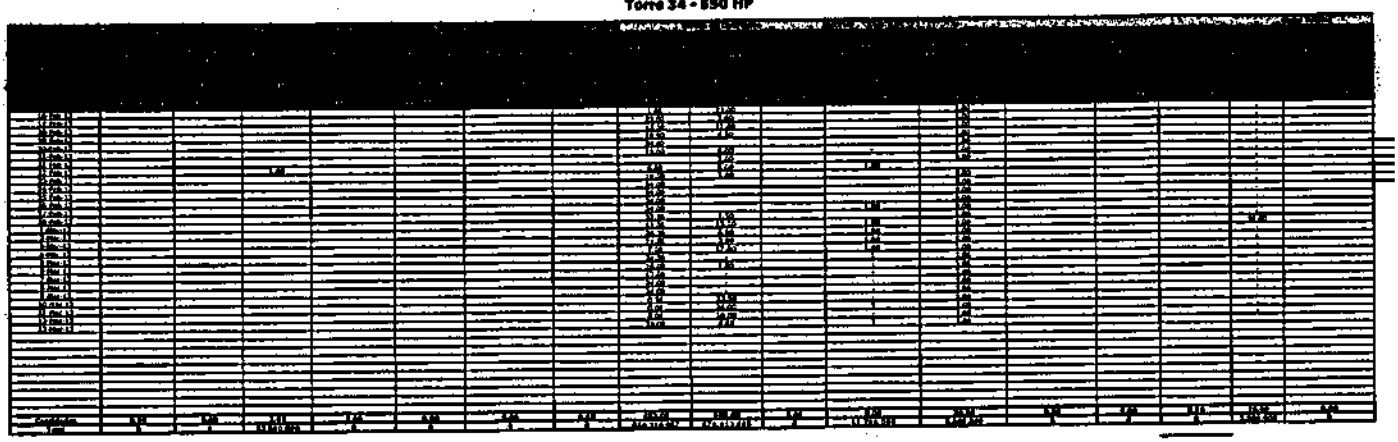










Independence
ENERGY
SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO

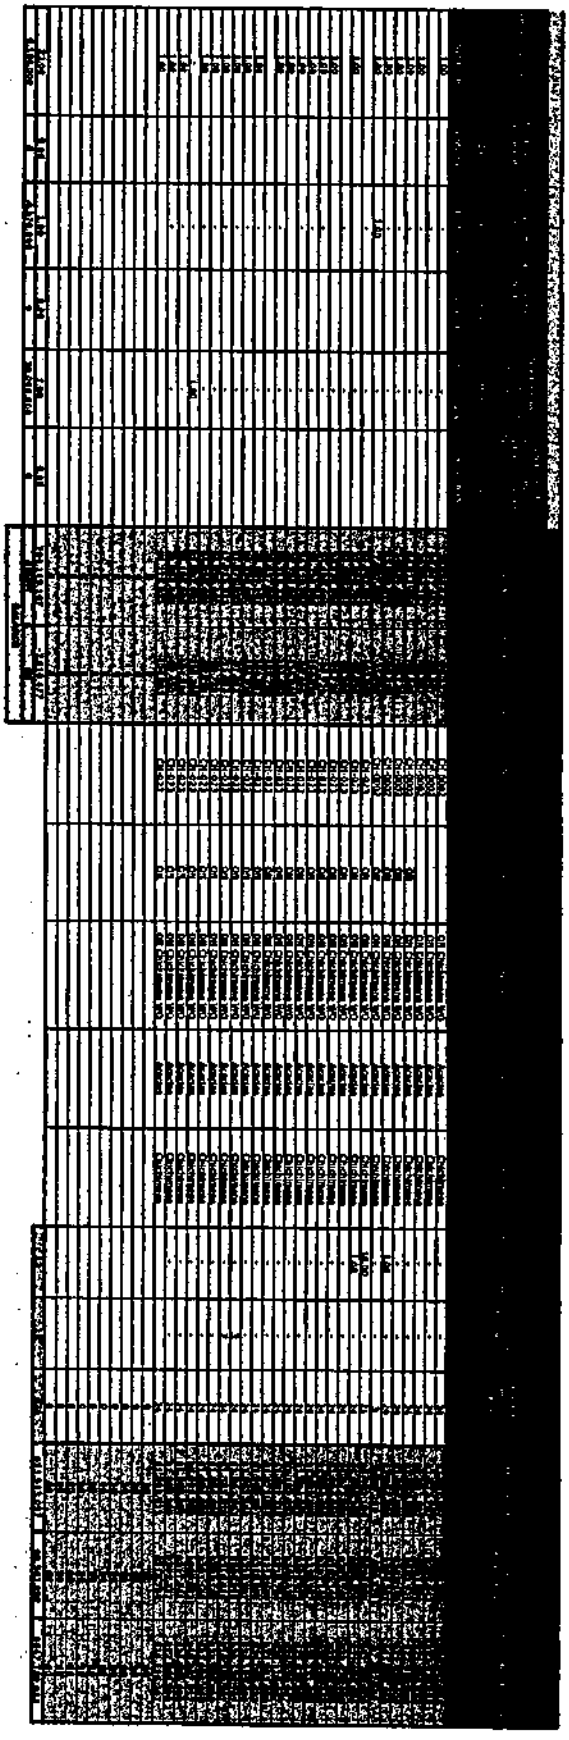



LIQUIDACION PARCIAL


CONTRATO MA-0009346 0


Desde 16-Feb-13 Hasta 19-Mar-13

Torre 42 - SSO HP

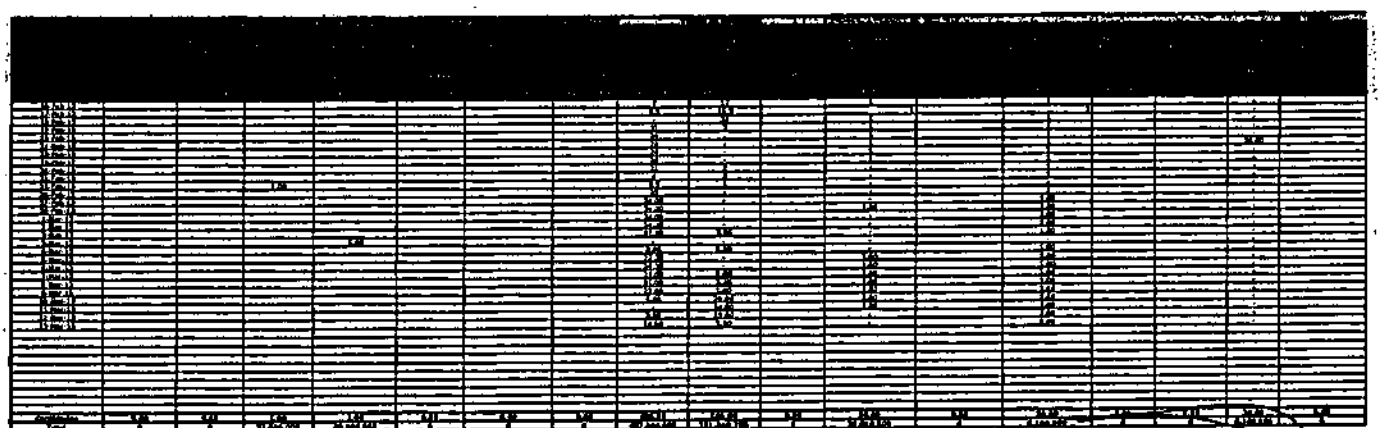











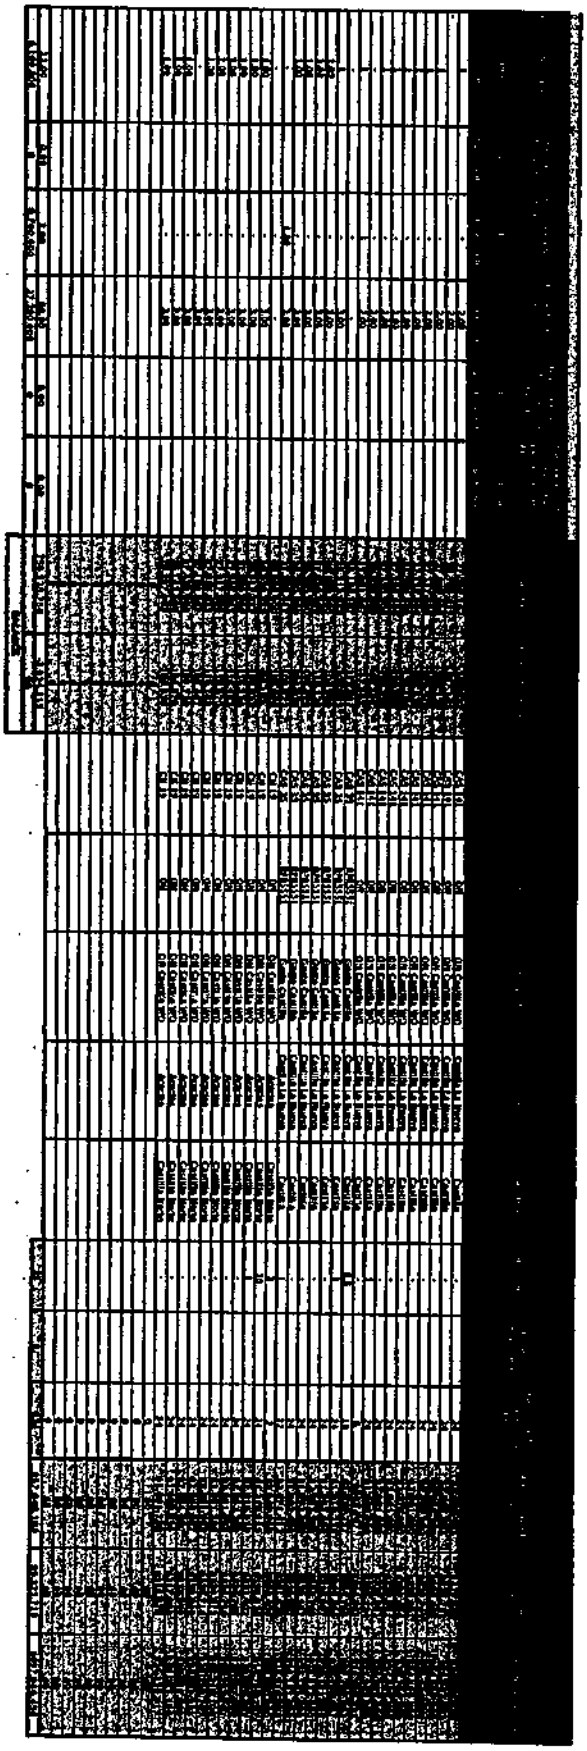



LIQUIDACI ON PARCIALS
CONTRATO MA-0009146

Desde 16-Feb-13 Hasta 13-Mar-13

Torre 83 - 350 HP

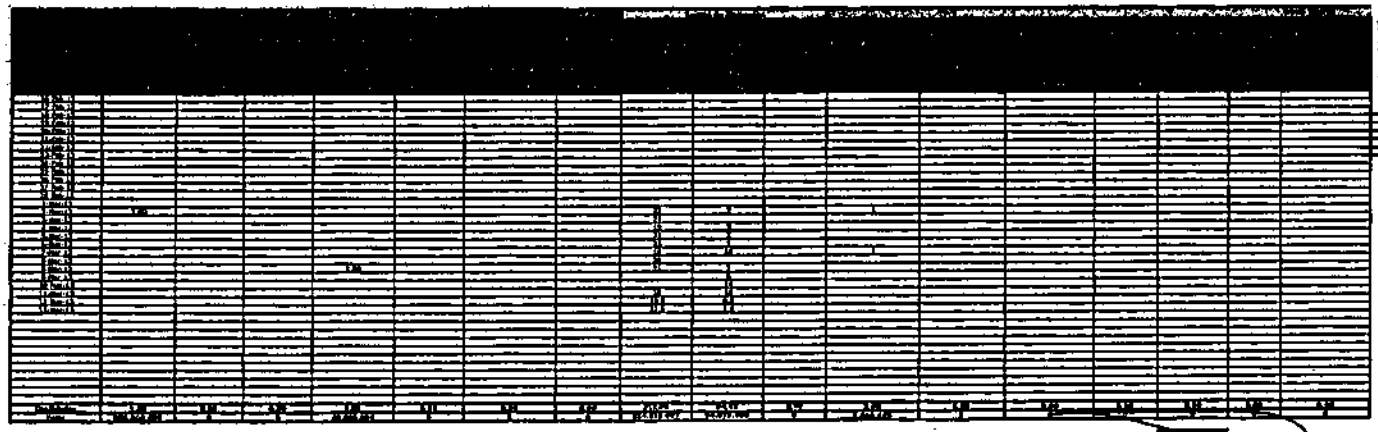








SUPERINTENDENTE VILLAVICENCIO

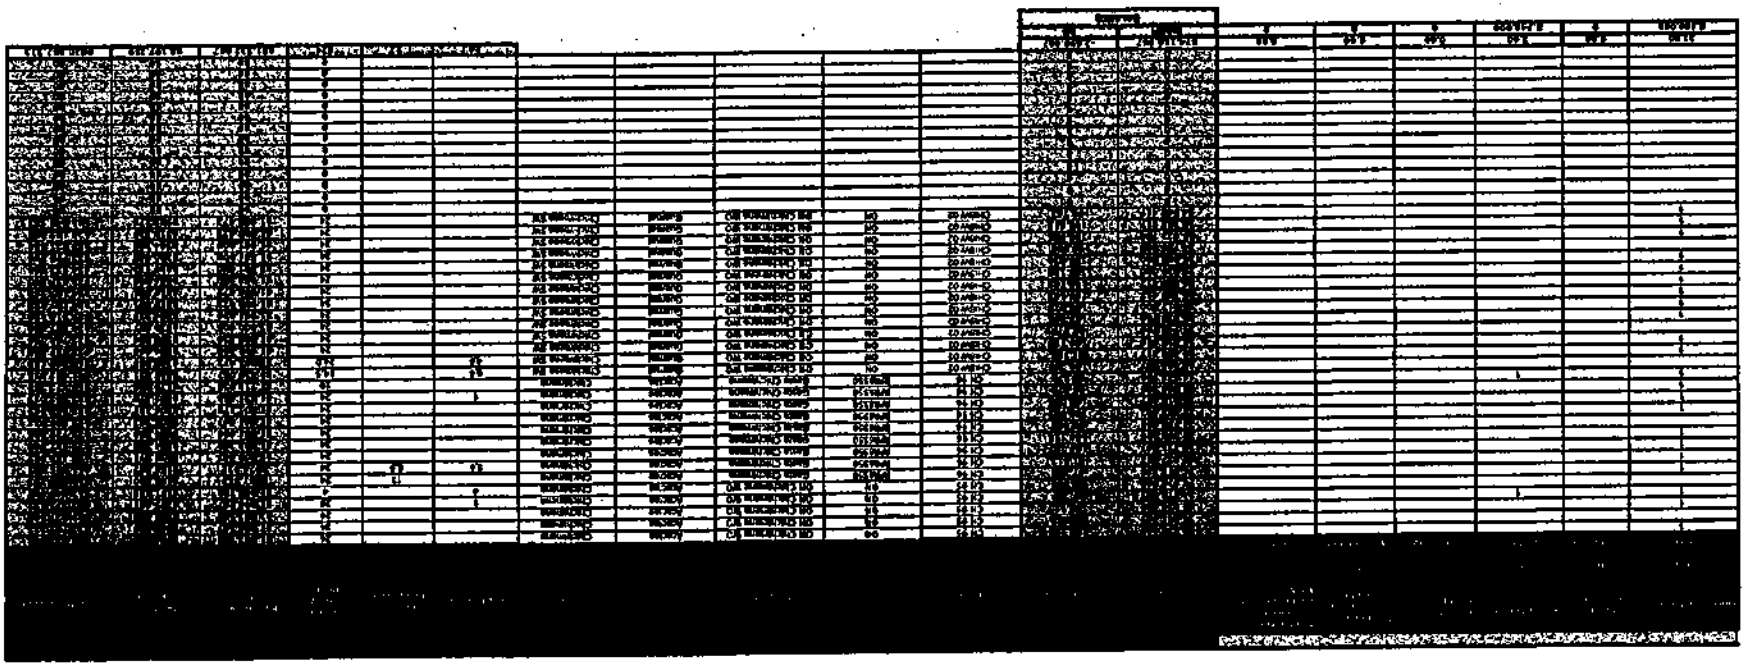



LIQUIDACION PARCIAL


CONTRATO HA-0009346 S

Desde 16-Feb-13 Hasta 13-Mar-13

Tanque Bombe

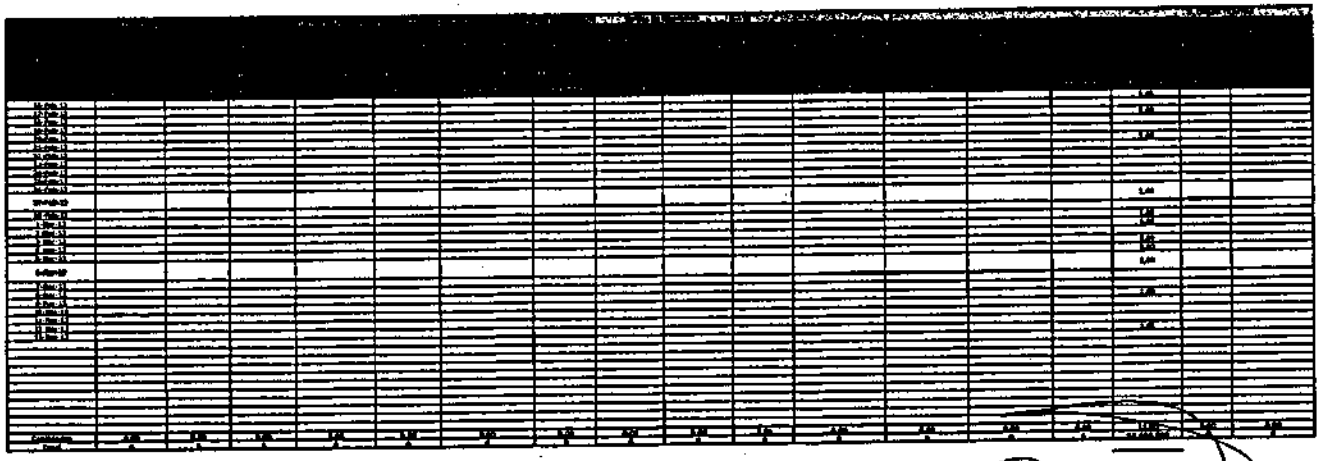







NIT 900.110.112-7
IVA RÉGIMEN COMÚN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCIÓN 11744 DEL 29/12/04
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 010394 DEL 28/12/2012

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 1120
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 304, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. XDD009126497, FECHA 2012-06-25
FACTURACION AUTORIZADA No. 2630 A la 9999 POR COMPUTADOR

COPIA

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

FECHA: 09/04/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 95 7 21 Piso 1
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: 3919 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN : 7953 SP

UN: PT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

ECOPETROL S.A. Coordinación Cuentas Regional
Número de Radicación
Recepción de la Factura
09 ABR 2013
Recibida copia para contabilización y verificación
No aceptada
El beneficiario tenedor de la factura deberá informar de su recepción a Ecopetrol S.A. como máximo tres días antes de su vencimiento.
Observaciones:

CONCEPTO: ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL N° 10
PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2013
HOJAS DE ENTRADA
1000884715 1000884721 1000884718 1000884722 1000884725 1000884753 1000884756 1000884731 1000884755
1000884757 1000884732 1000884735 1000884737 1000884741 1000884758 1000884738 1000884734 1000884759
APROBACIONES
5001082606 5001082607 5001082608 5001082609 5001082610 5001082611 5001082612 5001082613 5001082614
5001082735 5001082736 5001082737 5001082738 5001082739 5001082740 5001082741 5001082742 5001082743
Manifestamos que Independence Drilling S.A. ha efectuado los aportes a la seguridad social por los ingresos materia de esta facturación, dando cumplimiento al monto máximo dispuesto por la ley para la base de cotización. El pago de los aportes a seguridad social respectivos se realizó bajo la planilla número 8421859331 del mes de Febrero 2013.

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	3.000	4.370.000,0000	13.110.000
2.000	CARTUCHO UNIDAD DE FILTRADO	DI	40.000	160.000,0000	6.400.000
3.000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	8.000	1.300.000,0000	10.400.000
4.000	CONTAINER ADICIONAL	DI	26.000	280.000,0000	7.280.000
5.000	TARIFA DE FRAC TANK	DI	130.000	400.000,0000	52.000.000
6.000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	22.000	280.000,0000	6.160.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

ECOPETROL S.A.
OFICINA CUENTAS
BOGOTA
09 ABR 2013
RECIBIDO

595

NIT 830.130.580-7
IVA RÉGIMEN COMÚN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCIÓN 11940 DEL 29/12/04
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 010300 DEL 30/12/2013

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1120
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 204, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCIÓN DIAN No. 320000012695, FECHA 2013/06/25
FACTURACIÓN AUTORIZADA No. 3820 a la 9999 POR COMPUTADOR

COPIA

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

No. PAGINA: - 2 of 11

FECHA: - 09/04/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 Piso 1
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: - 3919 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN : 7953 SP

UN: PT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

CONCEPTO: ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL N°10
PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2013
HOJAS DE ENTRADA
1000884715 1000884721 1000884718 1000884722 1000884726 1000884753 1000884756 1000884731 1000884755
1000884757 1000884732 1000884735 1000884737 1000884741 1000884758 1000884738 1000884744 1000884759
APROBACIONES
5001082606 5001082607 5001082608 5001082609 5001082610 5001082611 5001082612 5001082613 5001082614
5001082735 5001082736 5001082737 5001082738 5001082739 5001082740 5001082741 5001082742 5001082743
Manifestamos que Independence Drilling S.A. ha efectuado los aportes a la seguridad social por los ingresos materia de esta facturación, dando cumplimiento al monto máximo dispuesto por la ley para la base de cotización. El pago de los aportes a seguridad social respectivos se realizó bajo la planilla número 8421859331 del mes de Febrero 2013.

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
7.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 0 A 10 KM	UN	1.000	30.500.000,0000	30.500.000
8.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 10 A 30 KM	UN	2.000	38.500.000,0000	77.000.000
9.000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	522.000	966.666,6667	504.600.000
10.000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	54.500	962.500,0000	52.456.250
11.000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	2.000	4.370.000,0000	8.740.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.Co.)

Aceptado - Cliente

NIT 830.130.188-7
IVA REGIMEN COMUN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION 11948 DEL 27/12/04
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 010389 DEL 28/12/2012

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 1120
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 304, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 320000912897, FECHA 2012/09/25
FACTURACION AUTORIZADA No. 2628 a la 9999 POR COMPUTADOR

COPIA

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

FECHA: - 09/04/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 95 7 21 Piso 1
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: - 3919 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN : 7953 SP

UN: PT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOEPTROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

CONCEPTO: ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL N°10
PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2013
HOJAS DE ENTRADA
1000884715 1000884721 1000884718 1000884722 1000884726 1000884753 1000884756 1000884731 1000884755
1000884757 1000884732 1000884735 1000884737 1000884741 1000884758 1000884738 1000884744 1000884759
APROBACIONES
5001082606 5001082607 5001082608 5001082609 5001082610 5001082611 5001082612 5001082613 5001082614
5001082735 5001082736 5001082737 5001082738 5001082739 5001082740 5001082741 5001082742 5001082743

Manifestamos que Independence Drilling S.A. ha efectuado los aportes a la seguridad social por los ingresos materia de esta facturación, dando cumplimiento al monto máximo dispuesto por la ley para la base de cotización. El pago de los aportes a seguridad social respectivos se realizó bajo la planilla número 8421859331 del mes de Febrero 2013.

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
12.000	CAMPERO CON CONDUCTOR	DI	26,000	350.000,0000	9,100.000
13.000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	6.000	1.300.000,0000	7.800.000
14.000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	22.000	280.000,0000	6.160.000
15.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 10 A 30 KM	UN	1.000	40.000.000,0000	40.000.000
16.000	MOVILIZACION EN LA MISMA LOCACIÓN	UN	1.000	14.075.000,0000	14.075.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptado - Cliente

596

NIT. 830.130.908-7
IVA REGIMEN COMUN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION 11944 DEL 23/12/04
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 010389 DEL 28/12/2012

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 4120
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 994, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 320000912697, FECHA 2012-06-25
FACTURACION AUTORIZADA No. 3038 a la 5999 POR COMPUTADOR

COPIA

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

FECHA: 09/04/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 Piso 1
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: 3919 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN: 7953 SP

UN. FT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

CONCEPTO: ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL N°10
PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2013
HOJAS DE ENTRADA
1000884715 1000884721 1000884718 1000884722 1000884726 1000884753 1000884756 1000884731 1000884755
1000884757 1000884732 1000884735 1000884737 1000884741 1000884758 1000884738 1000884744 1000884759
APROBACIONES
5001082606 5001082607 5001082608 5001082609 5001082610 5001082611 5001082612 5001082613 5001082614
5001082735 5001082736 5001082737 5001082738 5001082739 5001082740 5001082741 5001082742 5001082743
Manifestamos que Independence Drilling S.A. ha efectuado los aportes a la seguridad social por los ingresos materia de esta facturación, dando cumplimiento al monto máximo dispuesto por la ley para la base de cotización. El pago de los aportes a seguridad social respectivos se realizó bajo la planilla número 8421859331 del mes de Febrero 2013.

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
17.000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	481.000	1.016.666,6674	489.016.667
18.000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	98.000	1.012.500,0000	99.225.000
19.000	TARIFA DE CIRCULACION DE POZOS (INCLUYE CUADRILLA BOMBA)	DI	11.000	8.500.000,0000	93.500.000
20.000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	1.000	4.370.000,0000	4.370.000
21.000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	2.000	1.300.000,0000	2.600.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION, DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptado - Cliente

COPIA

Nit. 900.110.388-7
IVA RÉGIMEN COMÚN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCIÓN 11944 DEL 25/12/04
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 010389 DEL 28/12/2012

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1120
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 354, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCIÓN DIAN No. 320000012497, FECHA 2012/08/23
FACTURACIÓN AUTORIZADA No. 2638 a la 9999 POR COMPUTADOR

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

FECHA: 09/04/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 Piso 1
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: 3919 R1
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN: 7953 SP

UN: PTZ7227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

CONCEPTO: ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL N°10
PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2013

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
22.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 10 A 30 KM	UN	1.000	40.000.000,0000	40.000.000
23.000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	211.000	1.016.666,6700	214.516.667
24.000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	54.000	1.012.500,0000	54.675.000
25.000	MOVILIZACION INICIAL	GL	1.000	350.000.000,0000	350.000.000
26.000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	2.000	4.370.000,0000	8.740.000
27.000	CAMPERO CON CONDUCTOR	DI	26.000	350.000,0000	9.100.000
28.000	CARTUCHO UNIDAD DE FILTRADO	DI	26.000	160.000,0000	4.160.000
29.000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	16.000	1.300.000,0000	20.800.000
30.000	TARIFA DE FRAC TANK	DI	68.000	400.000,0000	27.200.000
31.000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	22.000	280.000,0000	6.160.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CIO.)

Aceptado - Cliente

597

COPIA

Nit. 900.110.288-3
IVA RÉGIMEN COMÚN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION 11966 DEL 23/12/04
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 010099 DEL 28/12/2012

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD SECONDARIA 1120
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 364, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 320000012097, FECHA 2012-06-05
FACTURACION AUTORIZADA No. 3620 a la 4000 POR COMPUTADOR

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

FECHA: 09/04/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 Piso 1
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: 3919 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN : 7953 SP

UN: PT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

CONCEPTO: ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL N°10
PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2013

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
32.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 0 A 10 KM	UN	1,000	33.500.000,0000	33.500.000
33.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 10 A 30 KM	UN	1,000	40.000.000,0000	40.000.000
34.000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	450,000	1.016.666,6667	457.500.000
35.000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	149,500	1.012.500,0000	151.368.750
36.000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	1,000	4.370.000,0000	4.370.000
37.000	CAMPERO SIN CONDUCTOR	DI	26,000	250.000,0000	6.500.000
38.000	CARTUCHO UNIDAD DE FILTRADO	DI	16,000	160.000,0000	2.560.000
39.000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	9,000	1.300.000,0000	11.700.000
40.000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	22,000	280.000,0000	6.160.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptado - Cliente

Nit. 900.134.918-7
IVA REGIMEN COMUN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION 1944 DEL 23/12/04
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 010309 DEL 20/12/2012

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 1120
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 204, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 320000912897, FECHA 2013/06/25
FACTURACION AUTORIZADA No. 2628 a la 9999 POR COMPUTADOR

COPIA

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

FECHA: - 09/04/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 Piso 1
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: - 3919 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL.: 57-1 2344000

No. ORDEN : 7953 SP

UN: PT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

CONCEPTO: ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL N°10
PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2013

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
41.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 0 A 10 KM	UN	1.000	33.500.000,0000	33.500.000
42.000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	433,000	1.016.666,6674	440.216.667
43.000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	169,000	1.012.500,0000	171.112.500
44.000	TRACTOMULA ADICIONAL (MENSUAL)	DI	1,000	28.000.000,0000	28.000.000
45.000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	3,000	4.370.000,0000	13.110.000
46.000	CAMPERO SIN CONDUCTOR	DI	26.000	250.000,0000	6.500.000
47.000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	4.000	1.300.000,0000	5.200.000
48.000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	13,000	280.000,0000	3.640.000
49.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 0 A 10 KM	UN	1.000	33.500.000,0000	33.500.000
50.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 10 A 30 KM	UN	2.000	40.000.000,0000	80.000.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptado - Cliente

598

COPIA

NIT. 900.139.188-7
IVA RÉGIMEN COMÚN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION 11644 DEL 23/12/04
SOMOS AUTOR RETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 010589 DEL 20/12/2012

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 0130
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 304, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 110000120997, FECHA 2012-04-25
FACTURACION AUTORIZADA No. 3638 a la 4000 POR COMPUTADOR

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

FECHA: - 09/04/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 Piso 1
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: - 3919 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL.: 57-1 2344000

No. ORDEN: 7953 SP

UN: PT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

CONCEPTO: ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL N°10
PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2013

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
51.000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	398.000	1.016.666,6658	404.633.333
52.000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	167.000	1.012.500,0000	169.087.500
53.000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	2.000	4.370.000,0000	8.740.000
54.000	CAMPERO SIN CONDUCTOR	DI	26.000	250.000,0000	6.500.000
55.000	CARTUCHO UNIDAD DE FILTRADO	DI	42.000	160.000,0000	6.720.000
56.000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	14.000	1.300.000,0000	18.200.000
57.000	TARIFA DE FRAC TANK	DI	52.000	400.000,0000	20.800.000
58.000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	22.000	280.000,0000	6.160.000
59.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 0 A 10 KM	UN	2.000	33.500.000,0000	67.000.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY OPOSICION DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptado - Cliente

Nit. 830.110.286-7
IVA REGIMEN COMUN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION 11946 DEL 23/12/04
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 010399 DEL 28/12/2012

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1120
ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO 204, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 320000013695, FECHA 2015/04/25
FACTURACION AUTORIZADA No. 2620 a la 9999 POR COMPUTADOR

COPIA

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

FECHA: - 09/04/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 Piso 1
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: - 5919 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN: 7953 SP

UN: PT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOEPTROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

CONCEPTO: - ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL N°10
PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2013

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
60.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 10 A 30 KM	UN	1,000	40.000.000,0000	40.000.000
61.000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	386,000	1.016.666,6658	392.433.333
62.000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	174,500	1.012.500,0000	176.681.250
63.000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	3,000	4.370.000,0000	13.110.000
64.000	CAMPERO CON CONDUCTOR	DI	26,000	350.000,0000	9.100.000
65.000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	10,000	1.300.000,0000	13.000.000
66.000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	22,000	280.000,0000	6.160.000
67.000	MOVILIZACION ENTRE POZOS DE 30 A 60 KM	UN	2,000	60.000.000,0000	120.000.000
68.000	MOVILIZACION EN LA MISMA LOCACIÓN	UN	1,000	14.075.000,0000	14.075.000
69,000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	488,500	1.016.666,6700	496.641.668

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA, AL MAXIMO ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptado - Cliente

599

COPIA

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

FECHA: - 09/04/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 95 7 21 Piso 1
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: - 3919 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN: 7953 SP

UN: PT27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

CONCEPTO: ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL N°10
PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2013

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
70.000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	84,500	1.012.500,0000	85.556.250
71.000	TRACTOMULA ADICIONAL (MENSUAL)	DI	1,000	28.000.000,0000	28.000.000
72.000	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCACIONES	GL	1,000	4.370.000,0000	4.370.000
73.000	TARIFA CAMION CISTERNA DE 11.000 GLS	UN	3,000	1.300.000,0000	3.900.000
74.000	TARIFA DIARIA OBRERO DE PATIO ADICIONAL	DI	7,000	280.000,0000	1.960.000
75.000	EQUIPO ACTIVO CON CUADRILLA	HR	171,500	1.016.666,6617	174.358.333
76.000	EQUIPO INACTIVO CON CUADRILLA	HR	22,000	1.012.119,6400	22.266.632
77.000	TARIFA DE FRAC TANK	DI	10.000	400.000,0000	4.000.000

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA AL MAXIMO. ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptado - Cliente

NIT 900.110.188-7
IVA REGIMEN COMUN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION 11966 DEL 23/12/04
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 046 DEL 30/12/2013

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 1120
ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIO 304, TARIFA 9.66 POR MIL
RESOLUCION DIAN No. 320000012697, FECHA 2012/04/25
FACTURACION AUTORIZADA No. 2638 a la 9999 POR COMPUTADOR

COPIA

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Independence

FECHA: 09/04/2013
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 Piso 1
BOGOTA

FACTURA DE VENTA No: 3919 RI
NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 2344000

No. ORDEN: 7953 SP

UN: FI27227

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO,REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE ECOEPTROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013,2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
	TOTAL				6.111.735.800,00
	BASE GRAVADA				488.938.663,00
	BASE NO GRAVADA				5.622.796.937,00
	I.V.A 16 %				78.230.218,00
	TOTAL A PAGAR				6.189.966.018,00

CONDICIONES DE PAGO: Contado a 30 dias

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MI L DIECIOCHO PESOS CON 00/100 M.L. **********

ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HAY INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION. DESPUES DE LA FECHA SE COBRARA INTERES POR MORA AL MAXIMO, ESTIPULADO POR LEY. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.CO.)

Aceptado - Cliente

600

ENDOSO FTO CESION EN PROPIEDAD
BAJO NUESTRA RESPONSABILIDAD
A FAVOR DE:
FACTOR DINERO S.A.
CON NIT. 900.151.196-7

CONCRETOL S.A. Coordinación Cuentas por Pagar.
Regional
Recepción de facturas
Número de Radicación
09 ABR 2013
Recibida copia para contabilización y verificación
No aceptada
El legítimo tenedor de la factura deberá informar de su tenencia a Concretol S.A. como máximo tres días antes de su vencimiento.
Otras veces

Tribunal Administrativo del Meta

CONSTANCIA CIERRE DE CUADERNO

ESTE CUADERNO ESTÁ CERRADO, POR LO TANTO LA CORRESPONDENCIA DEBERÁ SER AGREGADA EN EL CUADERNO SIGUIENTE

Carrera 29 No. 33 B-79 Palacio de Justicia Torre B Oficina 411
Teléfono: 6624093 fax 6622241 Villavicencio, Meta
sgtadmvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co
