



731914

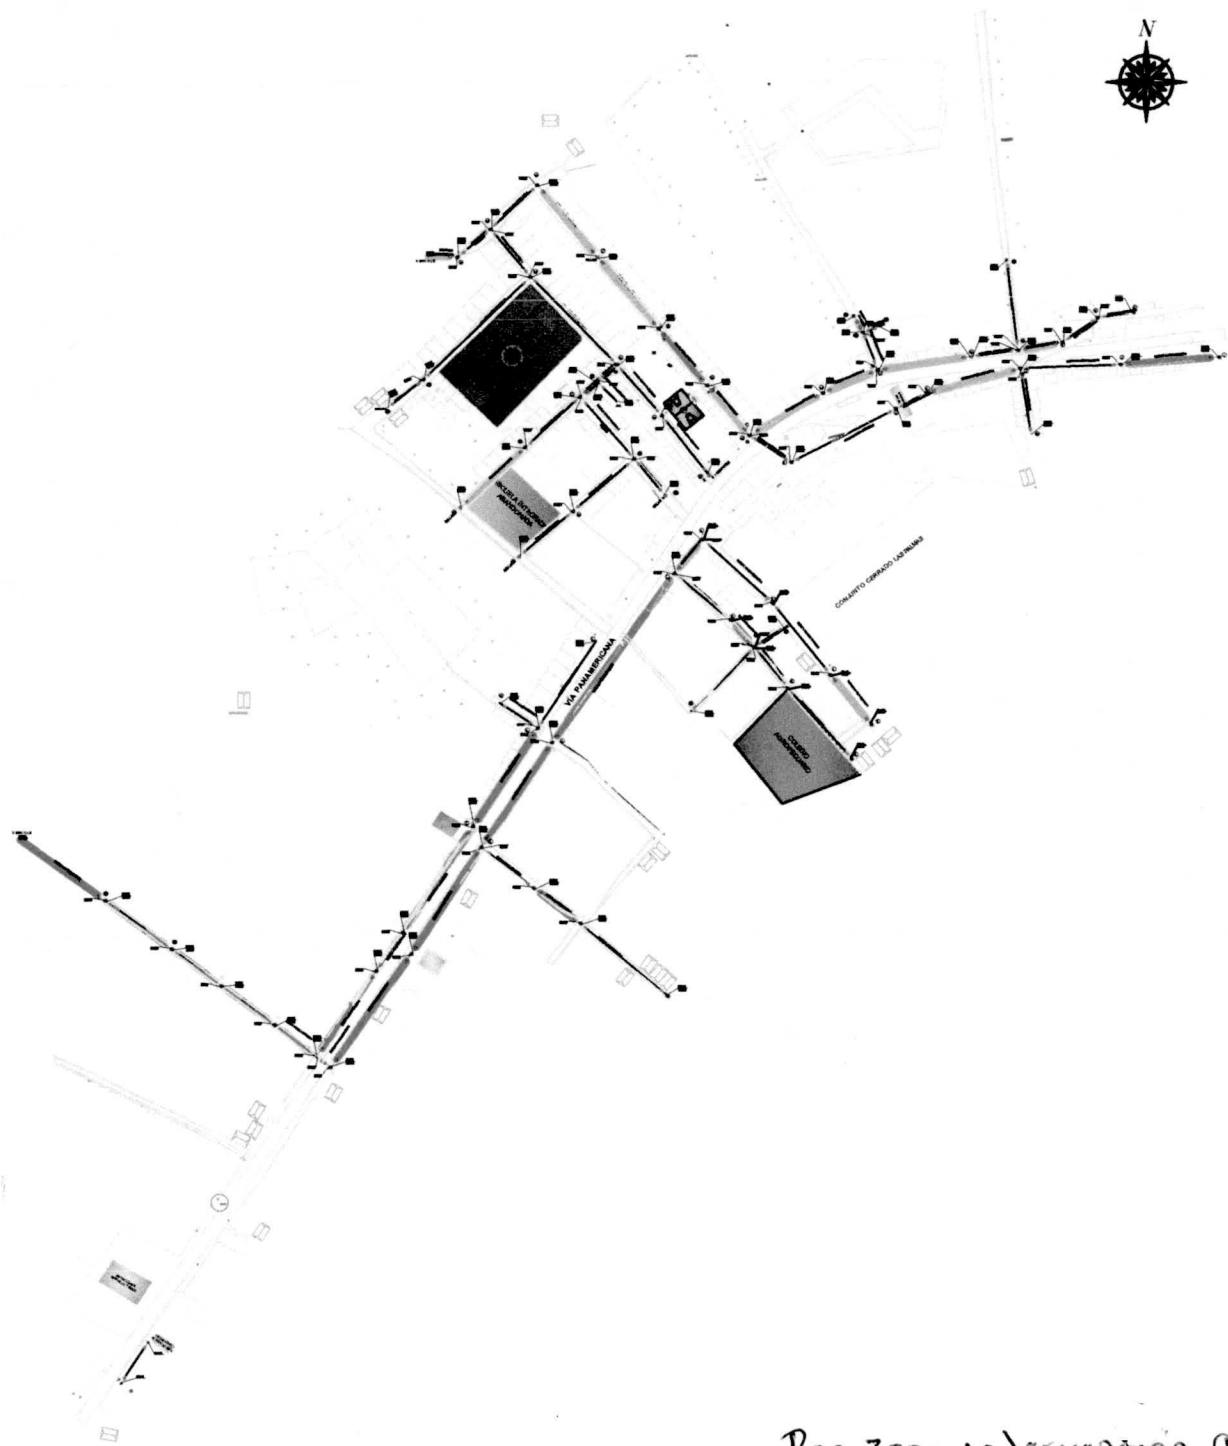


Repz zona intervencion Contrato 005-L.P. 2014

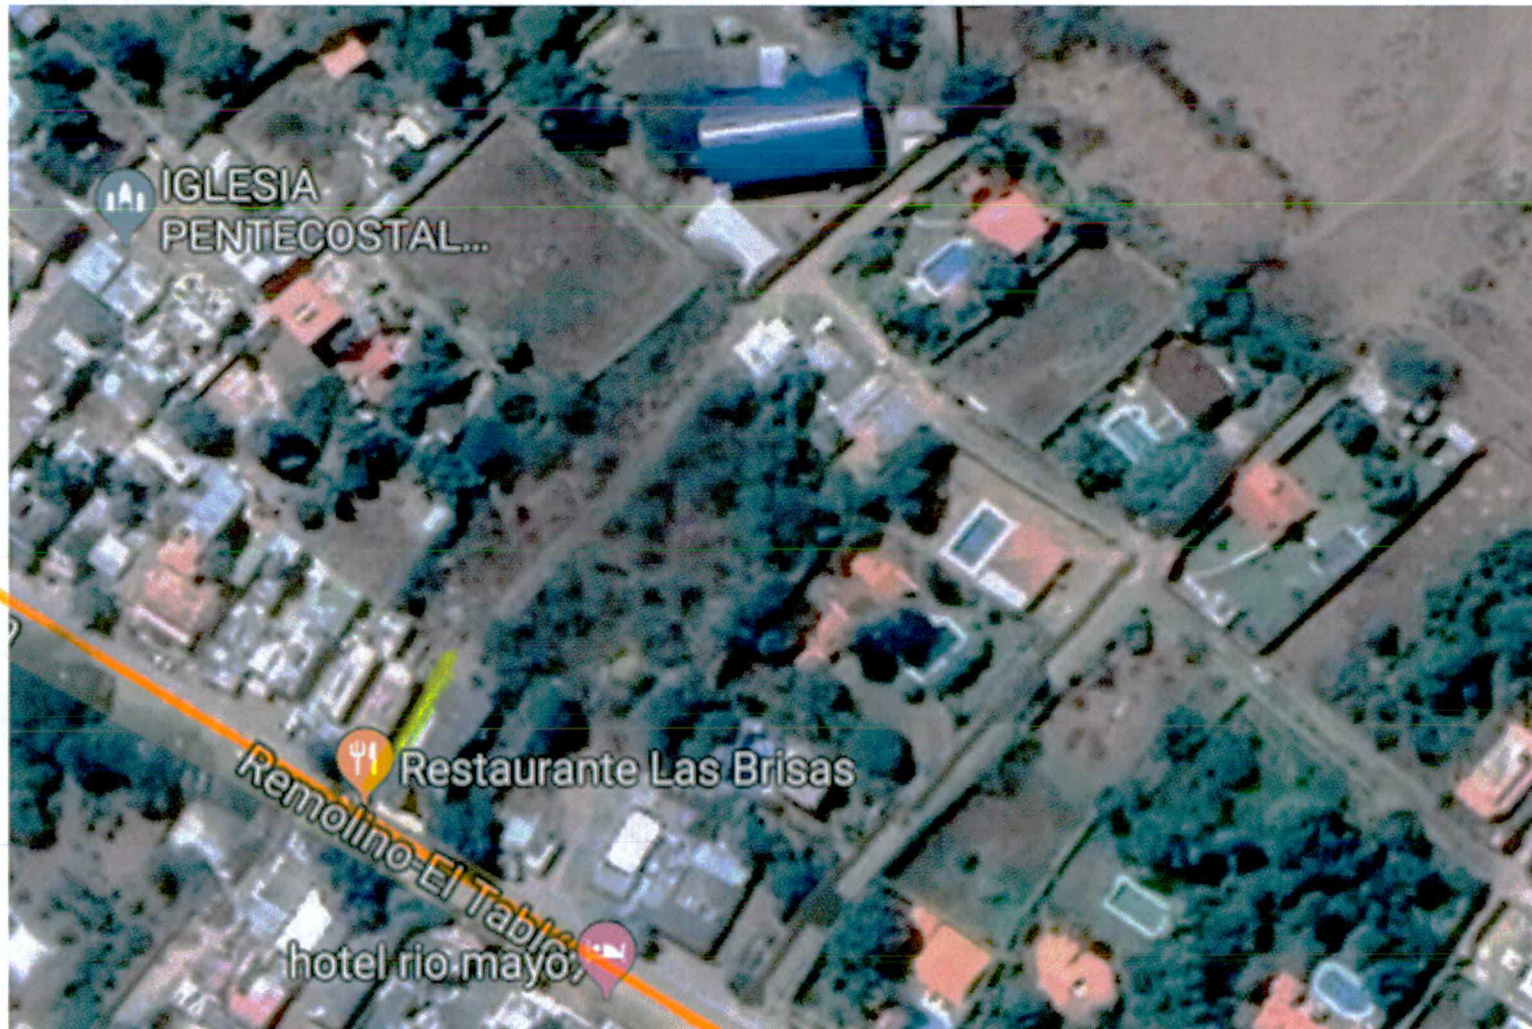

Naranja: Tramo intervenido con el contrato 005-LP2014  
Amarillo: Obra de particulares, No intervenido con el proyecto



131

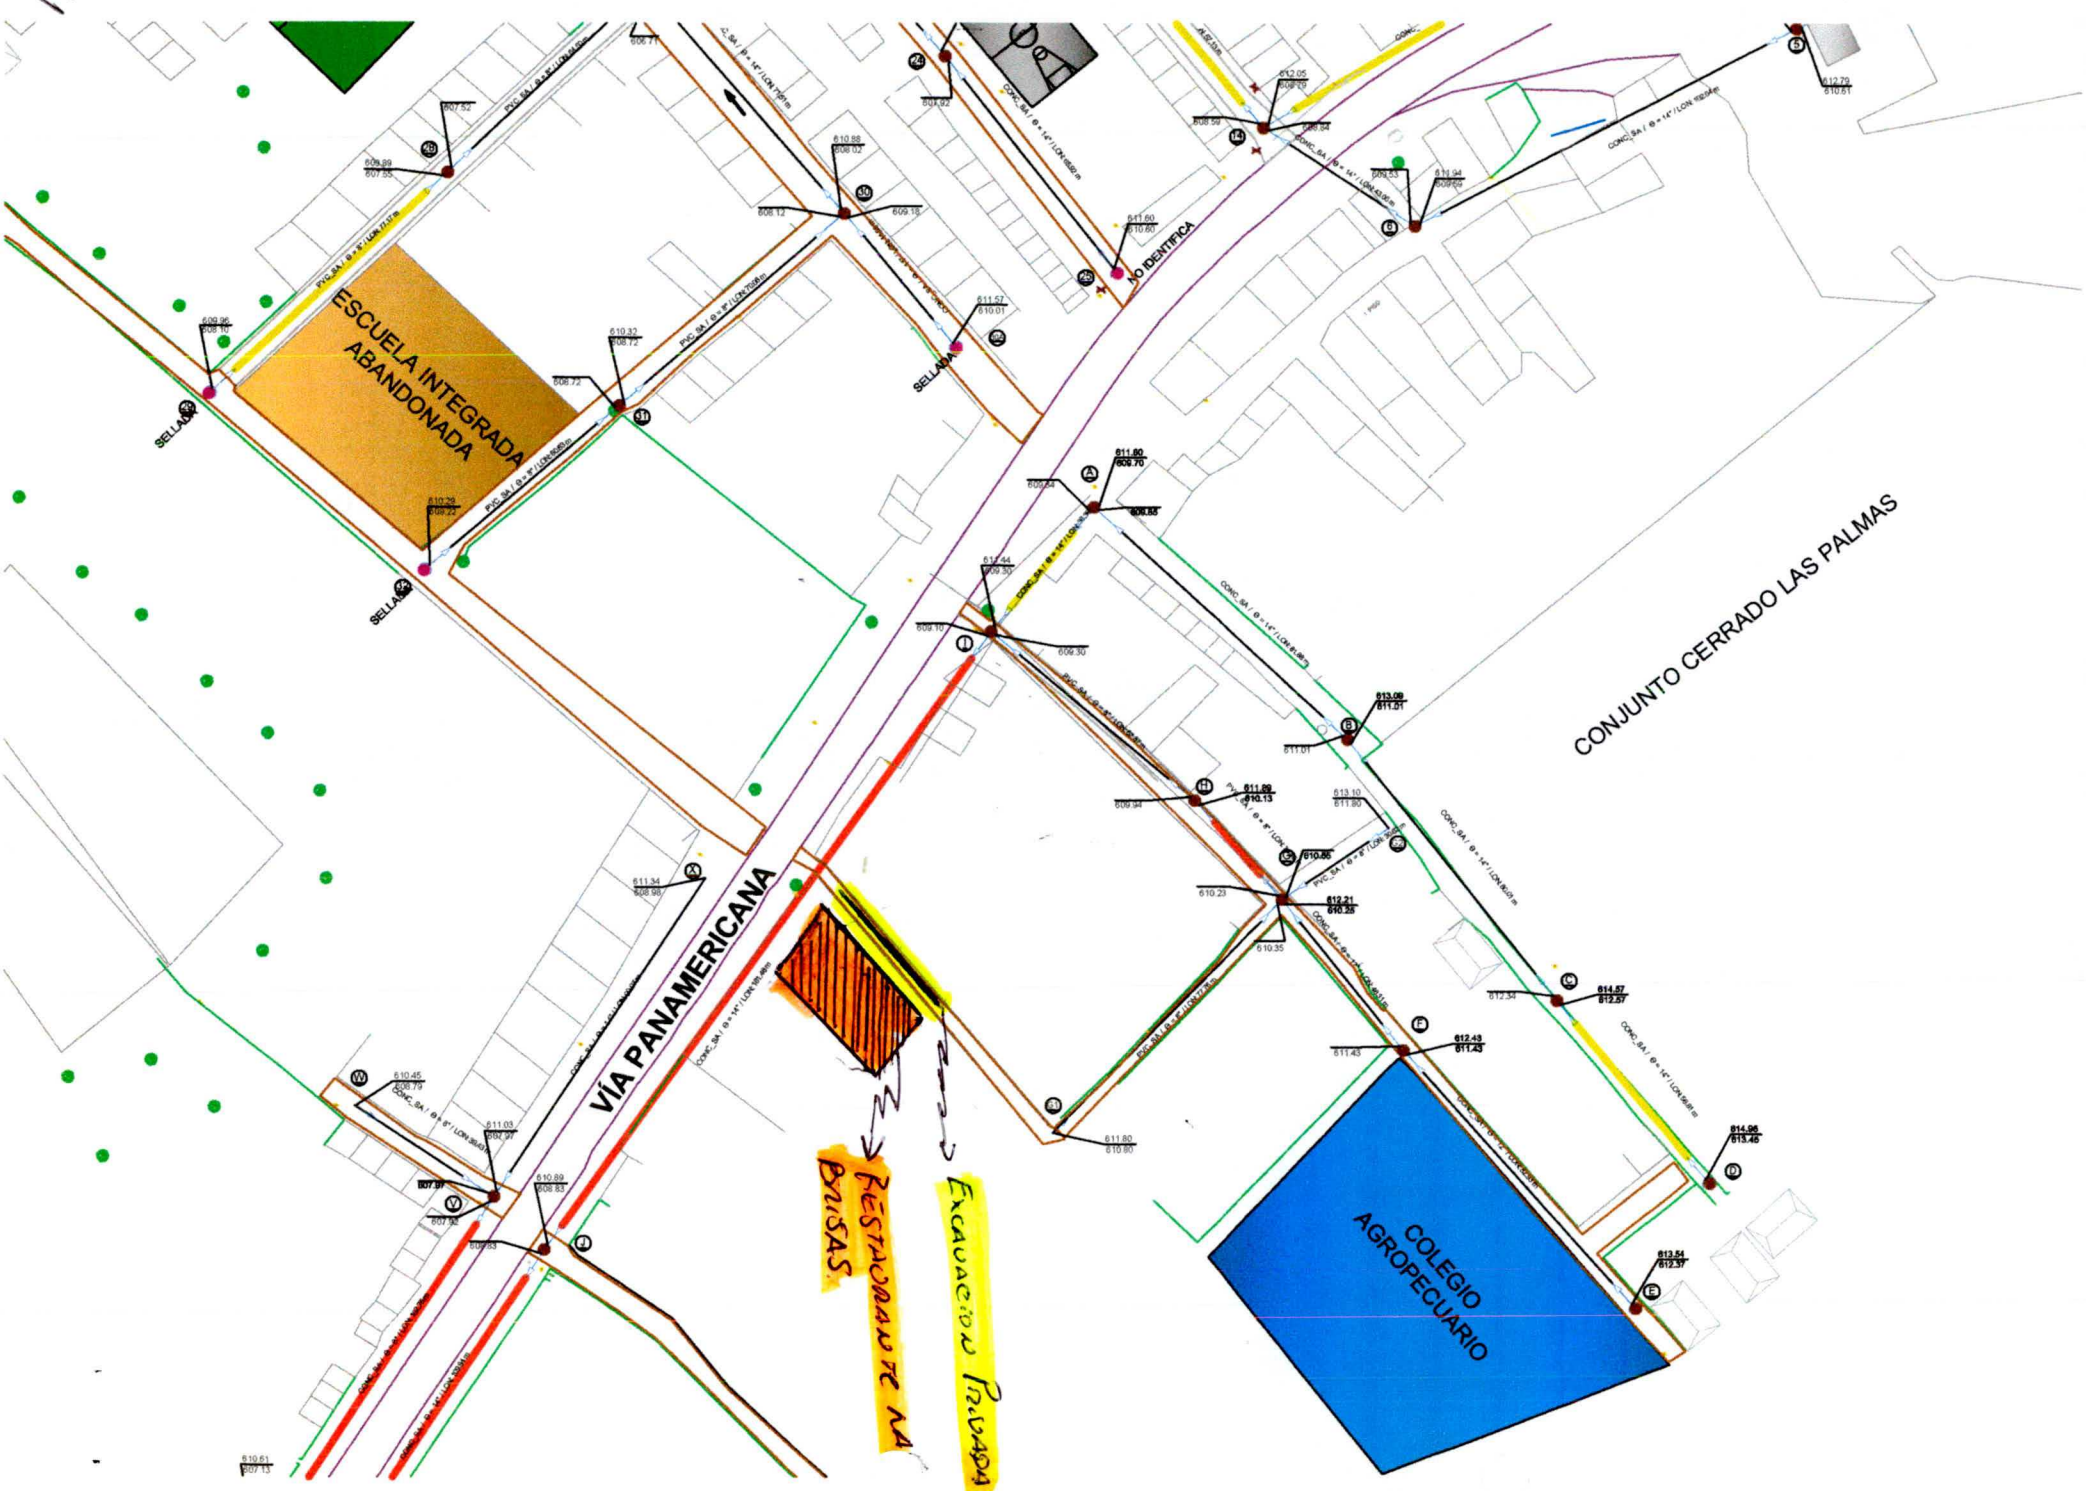



REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA INTERVENCION DEL CONTRAO Y LA NO INTERVENCION DE LOS PARTICULARES.



**Naranja:** Tramo intervenido con el contrato 005-LP2014

**Amarillo:** Obra de particulares, No intervenido con el proyecto



**Naranja:** Tramo intervenido con el contrato 005-LP2014

**Amarillo:** Obra de particulares, No intervenido con el proyecto



AMPLIACION, OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL REMOLINO, MUNICIPIO DE TAMINANGO  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

## PERMISO USO ZONA DE VIA

VIA CARRETERA CANO-MOJARRAS RUTA 2502  
SECTOR EL REMOLINO



Libertad y Orden  
Presidencia de la República  
República de Colombia



**INVIAS**  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**AMPLIACION, OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE  
ALCANTARILLADO EL REMOLINO, MUNICIPIO DE TAMINANGO  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO**

**ENTIDAD CONTRATANTE:** ALCALDIA DE TAMINANGO 2012-2015  
**CONTRATO:** 005 LP de 2014  
**CONTRATISTA:** AMERICANA DE CONSTRUCCIONES

**ELABORO: ING. OSWALDO OJEDA HIDALGO  
MP 19202-18034 CPC**

**SAN JUAN DE PASTO, 23 DE NOVIEMBRE DE 2015**

---

**AMERICANA DE CONSTRUCCIONES**

Calle 17 No. 34 A – 40 Tel 7310262 Pasto - email orlando70b@yahoo.com





### **CONTENIDO DOCUMENTACION**

1. OBJETO DE LA SOLICITUD
2. LOCALIZACION DEL PROYECTO
3. REGISTRO FOTOGRAFICO
4. PLANOS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO EN PLANTA-PERFIL
5. DESCRIPCION TECNICA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
6. PLAZO TOTAL DE INTERVENCION DE LA VIA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
7. COSTOS DE LAS OBRAS DEL OBJETO DEL PERMISO
8. COSTOS DE LAS OBRAS DE REPOSICION
9. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y PROYECTO DE SEÑALIZACION
10. CARTA DE COMPROMISO
11. OFICIO DE RADICACION DEL PROYECTO.

---

**AMERICANA DE CONSTRUCCIONES**

Calle 17 No. 34 A – 40 Tel 7310262 Pasto - email orlando70b@yahoo.com

15  
143



**1. OBJETO DE LA SOLICITUD**

La alcaldía de Taminango en convenio con el Plan Departamental del Agua PDA – PAP están ejecutando obras de alcantarillado en el corregimiento El Remolino donde se involucra el tramo de Vía Panamericana comprendido entre el K87 y K88 paralelamente al eje en una longitud de 969 metros por el carril izquierdo y en 454 metros sobre el carril derecho tomado en el sentido del abcisado. Por tanto se requiere del PERMISO DE USO DE VIA otorgado por el INVIAS Regional Nariño para poder continuar.

**2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO**

**Localización geográfica del municipio.** El Municipio se encuentra localizado al norte del Departamento de Nariño, en región limítrofe con el Departamento del Cauca, haciendo parte del nudo de los pastos y sobre vertiente de los ríos Patía, Mayo y Juanambú. Su acceso desde Pasto se hace por carretera panamericana hasta el sitio denominado Panoya en una distancia de 62 kilómetros y de aquí por carretera destapada secundaria en una longitud de 17.0 kilómetros.

El municipio se encuentra localizado entre las siguientes coordenadas geográficas:


Latitud: 1° 30' 00" N (Desembocadura río Mayo en el río Patía), 1° 41' 05" N (Desembocadura del río Pasto en el río Juanambú), Longitud: 77° 14' 35" W (Cerro Chiquito, límites con San Lorenzo), 77° 22' 58" W (Desembocadura río Juanambú en el río Patía).

**Límites municipio.** El Municipio limita así: Por el norte con los municipios de El Rosario y Mercaderes (Cauca), teniendo como divisoria principal los ríos Patía y Mayo; por el sur con los municipios de El Tambo y Chachagüí, teniendo como divisoria principal el río Juanambú; por el oriente con el municipio de San Lorenzo, teniendo como divisoria principal las quebradas Honda y Charguayaco y por el occidente con los municipios de El Peñol y Policarpa, teniendo como divisoria principal los ríos Patía y Juanambú.

**División política administrativa.** El municipio en la actualidad se encuentra dividido en siete corregimientos y en cuarenta y tres veredas de acuerdo con el siguiente detalle.



AMPLIACION, OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL REMOLINO, MUNICIPIO DE TAMINANGO  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

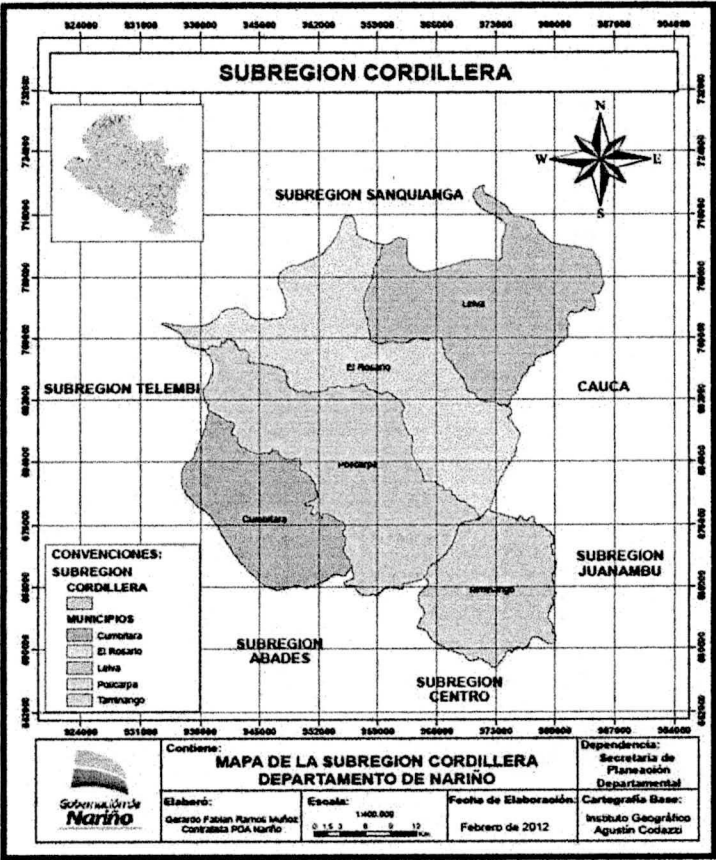

CORREGIMIENTO	TOTAL VEREDAS POR CORREGIMIENTO	VEREDAS CON PERSONERIA JURÍDICA
Especial Zona Centro	14	Taminango, Taminanguito, El Páramo, Bellavista, La Cocha, El Chilcal, Limoncito, Turbambilla, Don Diego, La Concordia, San Isidro, LLano Verde, El Arado.
Remolino	6	Remolino, Algodonal, Las Juntas, Lecheral, Papayal, Viento Libre.
Granada	5	Granada, México, El Hueco, Guayacanal.
El Tablón	4	El Tablón, Guambuyaco, Chapungo, Panoya. Majuando. Loma larga la Llana
Curiaco	6	Curiaco, Paso feo, La Palma, El Platanal, Manipia.
El Manzano	4	El Manzano, Mamajuana, El Diviso, Cumbal.
Charguayaco	5	Charguayaco, Corneta, Palobobo, El Salado, El Pantano
TOTAL	44	





## CARACTERISTICAS GENERALES DEL ENTORNO

### Localización del corregimiento

El proyecto se ubica en el Corregimiento El Remolino del Municipio de Taminango; a dos horas de la ciudad de Pasto con acceso fácil Vía Panamericana. El corregimiento sirve durante los fines de semana como lugar de recreación para muchas familias de la ciudad de Pasto y de Popayán así como de los pueblos y veredas vecinas.

Según censo del SISBEN el casco corregimental consta de 271 viviendas para un total de 1385 habitantes

El sector a intervenir está destinado a la vivienda estrato 2 y negocios como Restaurantes; Hoteles y También hay Estaciones de Gasolina.

La longitud a intervenir consta de tres tramos de red de alcantarillado paralelos a la vía Panamericana (Fase I - Fase II-Fase III) como se aprecia en la fotografía satelital..

### Vías y transporte

Las vías del centro urbano de Remolino se han constituido alrededor de la vía internacional Panamericana, a excepción de esta, no hay vías que posean capa de rodadura mejorada o pavimento ya sea rígido o flexible. Todos los ejes viales perpendiculares a la vía Panamericana requieren acondicionamiento de superficie, deben ser intervenidas con la construcción de pavimentos rígidos, flexibles o articulados.


El transporte de pasajeros se realiza principalmente por los vehículos que transitan por la vía Panamericana y comunican con la capital del Departamento. Hacia las zonas rurales se presta el servicio de transporte público con camperos rurales que cubren las distintas vías de la región.

En general la comunidad tiene una infraestructura poblacional consistente en un colegio; una escuela; un puesto de salud y para la recreación y deporte se construirá dentro de poco un Centro de Integración Ciudadana CIC en un predio junto a la actual plaza de ventas.

Cabe anotar que la población no dispone de puentes peatonales sobre la calzada de la vía Panamericana, peligrando la integridad de quienes atraviesan constantemente de un lado a otro como es el caso de estudiantes y personas que toman el transporte colectivo y que no hay una terminal bien definida.



AMPLIACION, OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL REMOLINO, MUNICIPIO DE TAMINANGO  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

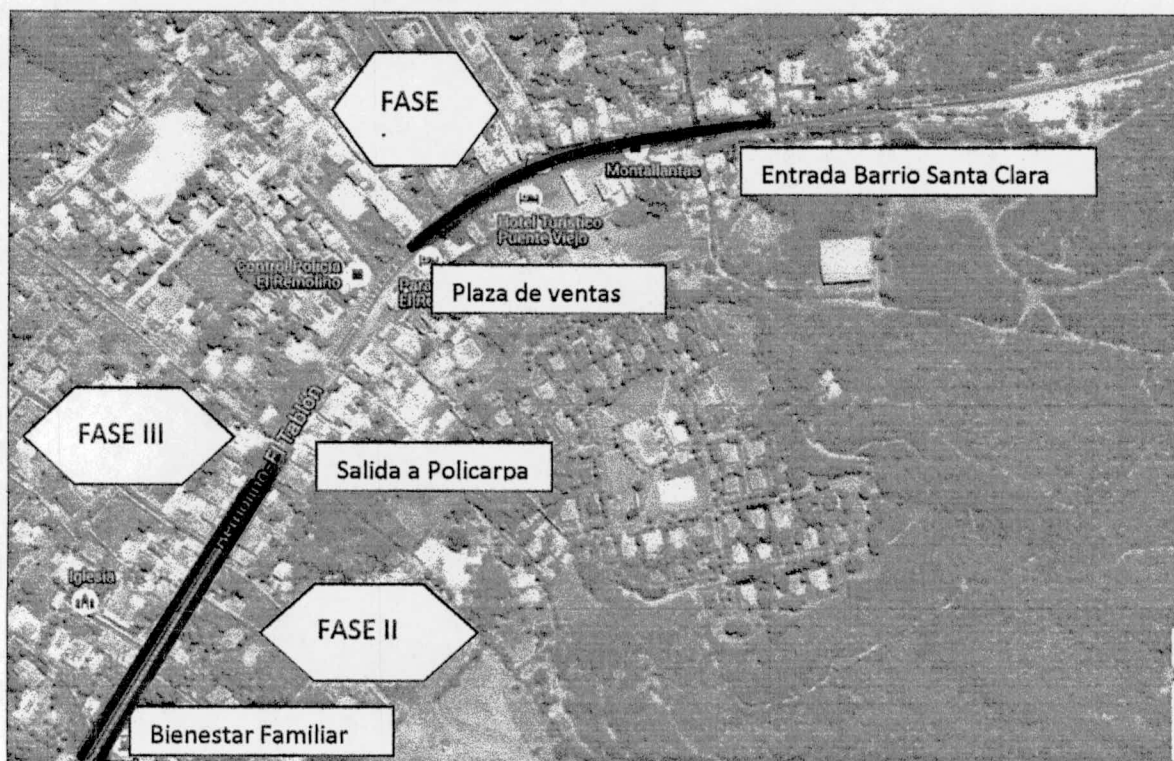

**Fotografía No.1** Tramo de Vía Panamericana a Intervenir

**Fuente:** Google Earth vista panorámica del corregimiento El Remolino



**Fotografía No.2** Panorama de tramo vía Panamericana sector Remolino

**Fuente:** Este estudio

**AMERICANA DE CONSTRUCCIONES**

Calle 17 No. 34 A – 40 Tel 7310262 Pasto - email orlando70b@yahoo.com





San Juan de Pasto, 15 de Octubre de 2016.

*Handwritten signature and date:*  
15-OCT-2016

Señor:

CLAUDIO ALEJANDRO LOPEZ VALLEJO

Secretaria de planeación y D.C

MUNICIPIO DE TAMINANGO

Ref.: información contrato 005-LP 2014 "Optimización y Ampliación del Sistema de Alcantarillado El Remolino del Municipio de Taminango"

Asunto: Contestación a la solicitud de información de Fecha 6 de Octubre de 2016.

Cordial saludo,

En primer lugar queremos aclarar que la calle que dice ser un predio privado del señor Hernán Martínez M. que colinda al Restaurante las Brisas (Casa Esquinera.) Callejón que va hasta la I.E. Agropecuaria El Remolino, no se adelantó la reposición del sistema de Alcantarillado ya que este tramo no hacia parte del contrato No 005-LP-2014.

**Narración de los procesos constructivos en el área y los Hechos.**

Para determinar donde se encontraba el tubo viejo de alcantarillado y la tubería de acueducto se realizó por parte de Americana de Construcciones dos apiques exploratorios en el punto de intersección \*\*. De estos apiques se pudo determinar la altura real del tubo de alcantarillado, localizar el de Acueducto y se observó que el tubo viejo de alcantarillado paralelo a la panamericana se encontraba totalmente aplastado, fallado, colmatado, vertiendo sus aguas por las capas del subsuelo, prácticamente se filtraba todas las aguas servidas al subsuelo. Es tanto así que las cámaras de este tramo se encontraban totalmente rebosadas causando malos olores. Esta situación se presentaba en varios puntos de este tramo. Cabe anotar que los apiques fueron exploratorios, se realizaron en puntos donde había hundimientos, uno de ellos al pie de la casa del señor Laurentino, todo esto se hizo a lo largo de todo el tramo K - 6 antes de iniciar los trabajos de remplazo de la tubería.

El proceso constructivo utilizado fue la instalación paralela de la nueva tubería sin destruir el alcantarillado existente (Cumplió su vida útil) por lo tanto es imposible pensar que se dejó sin conectar alguna tubería ya que prácticamente el sistema anterior no se tocó y quedo funcionado temporalmente hasta realizar los empalmes.





**"EN NINGUN PUNTO DEL PROYECTO SE SUSPENDIO UN TUBO Y SE DEJO FILTRANDO AGUAS O NO SE REALIZARON LOS EMPALES RESPECTIVOS".**

Cuando llegamos con la instalación de la tubería al tramo J - I' en el punto designado como I' se realizó la construcción de una cámara de inspección con una altura de 2.64 metros, el cual recibe aguas del tramos 6 - 34; 34 - A; A - I y del I - I' tramos donde se remplazó la tubería existente. En esta intersección se construyó dos acometidas de alcantarillado la una para el señor Hernán Martínez M. y la otra para el señor Laurentino, se dejó dos cajillas una a cada frente de sus predios, hasta donde llegaba la responsabilidad de Americana de Construcciones. Ellos debían realizar los empalmes internos de sus propiedades. En la casa del supuesto afectado como situación particular con el fin de no dañar el piso existente ejecuto un túnel de dos o tres metros para encontrar el tubo.

Existe una disputa entre el señor Laurentino y El señor Hernán Martínez, el primero manifiesta que es calle y el segundo manifiesta que es un lote que hace parte de su propiedad. Don Hernán se opuso rotundamente a dejar empalmar la tubería que viene del restaurante escolar de la I.E. Puerto Remolino, por lo tanto se decidió en su momento dejar funcionando esta conducción con el antiguo alcantarillado que seguía funcionando.

Para poder realizar este empalme fue necesario la intervención de la Inspección de Policía y el acompañamiento de la policía nacional el cual se realizó el día 14 de Octubre de 2016 por parte del maestro Moisés Madroñero contratista de mano de obra, con lo cual se empalmo el tubo que viene del Restaurante escolar de la I.E. Puerto Remolino.

Como en el tramo comprendido entre la I.E. Puerto Remolino y el Restaurante las Brisas no se ejecutó ninguna actividad contractual no se elaboró ninguna acta de vecindad.

\*\* Los dos apiques exploratorios hechos en la intersección se hicieron un 70% con la excavadora y el 30% se completaron a mano. Don Hernando Martínez viendo la maquina disponible al frente de su supuesto predio, solicito a manera de favor al Señor Jesús Muñoz Operario de la excavadora y bajo su responsabilidad que le ayudara con una excavación de la chamba para instalar un tubo de diámetro 6" que se instalaría al día siguiente. La dimensión de esta excavación es de 80 cm de ancho (Ancho del Balde), por una longitud de 30 a 35 metros con una profundidad de 60 cm aproximadamente. La tubería no fue instalada por el señor Hernán Martínez nunca y menos se realizó el relleno de la misma, por lo cual esta excavación siguió abierta por varios días más bajo responsabilidad del señor Hernán.



Cabe anotar que esta excavación fue hecha sin autorización de la empresa Americana de Construcciones prueba de ello es que en este tramo no es parte contractual.


Atentamente:

**Ing. ORLANDO BENAVIDES CACERES**  
**MP 52202 54316**  
**Representante Legal**  
**AMERICANA DE CONSTRUCCIONES E.U.**

Soluciones integrales en ingeniería, arquitectura y minería



**REGISTRO FOTOGRAFICO**  
**CONSTRUCCION DE EMPALME**

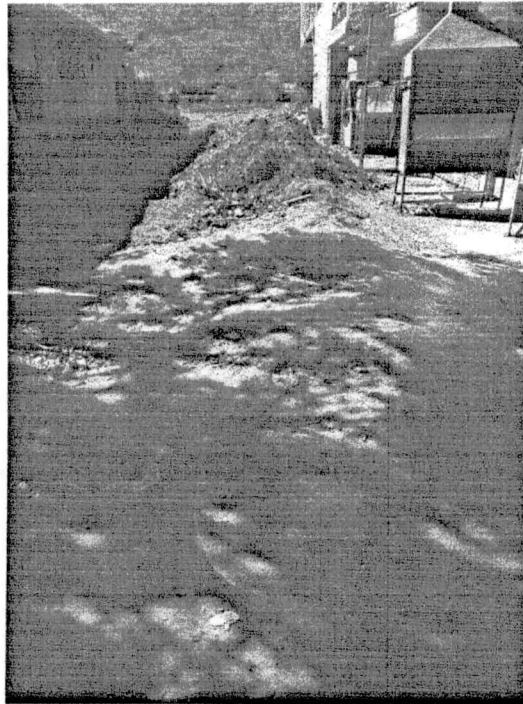

Soluciones integrales en ingeniería, arquitectura y minería



151  
23



AMERICANA DE CONSTRUCCIONES EU

NIT 814000302 - 2



Soluciones integrales en ingeniería, arquitectura y minería

Oficinas: Cll. 17 No. 34<sup>a</sup> - 40 - Pasto, Nariño, Colombia

Mina: "Cantera Las Delicias" KM 4 antigua salida al norte, Pasto, Nariño, Colombia


Servicio al Cliente: TELEFAX: (2) 7310262 - EMAIL: [orlando70b@yahoo.com](mailto:orlando70b@yahoo.com)

152  
264



AMERICANA DE CONSTRUCCIONES EU

NIT 814000302 - 2

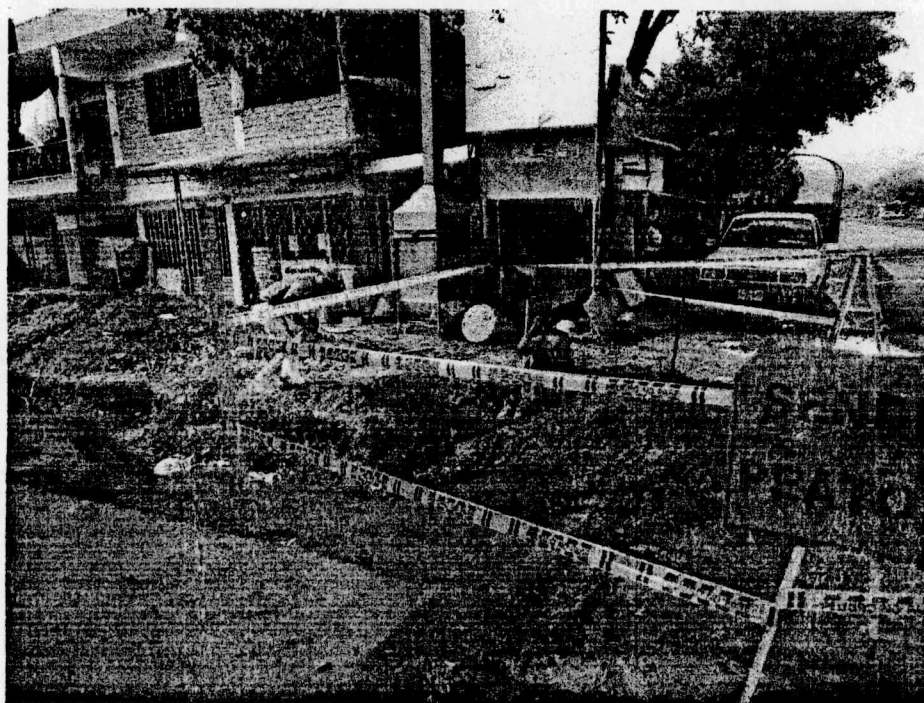

Soluciones integrales en ingeniería, arquitectura y minería

Oficinas: Cl. 17 No. 34<sup>a</sup> - 40 - Pasto, Nariño, Colombia  
Mina: "Cantera Las Delicias" KM 4 antigua salida al norte, Pasto, Nariño, Colombia  
Servicio al Cliente: TELEFAX: (2) 7310262 - EMAIL: [orlando70b@yahoo.com](mailto:orlando70b@yahoo.com)



Señor:

**JUEZ NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO**  
**E. S. D.**

REF: PROCESO: REPARACION DIRECTA  
RADICADO No: 2019-00013  
DEMANDANTE: LAURENTINO MARTHOS NARVAEZ Y OTRO  
DEMANDADO: MUNICIPIO DE TAMINANGO, AMERICANA DE  
CONSTRUCCIONES Y HERNAN MARTINEZ MELENDEZ



ORLANDO GERARDO BENAVIDES CACERES, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 12.998.270 de Pasto (N, actuando en calidad de representante legal de la sociedad AMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.S., persona jurídica de derecho privado, identificada por el Nit: 801.000.302-2, con domicilio principal es la Calle 17 No. 34A - 40, Barrio Maridiaz de Pasto Nariño, por medio del presente escrito manifiesto a Usted que confiero poder especial amplio y suficiente al Doctor **ALVARO ANDRES GONZALEZ MURIEL**, abogado en ejercicio identificado con cédula de ciudadanía número 98.390.835 de Pasto (N) y portador de la T. P. número 245481 del Consejo Superior de la Judicatura para que en mi nombre y representación inicie tramite de contestación de la demanda del PROCESO DE REPARACION DIRECTA, por los perjuicios Materiales e Inmateriales ocasionados a los señores LAURENTINO MARTHOS NARVAEZ y SANDRA VIVIANA MARTHOS, de la falla en el servicio ante la ejecución del contrato de obra pública No 005 L.P.2014, constituido por la sociedad la sociedad AMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. y la ALCALDIA MUNICIPAL DE TAMINANGO NARIÑO.

La contestación de dicha demanda estará formulada según los fundamentos de hecho y derecho de los cuales está ilustrado el apoderado.

Mi apoderado queda facultado para solicitar medidas cautelares, desistir, transigir, conciliar, recibir, renunciar, sustituir, formular requerimiento extrajudicial y todo cuanto en derecho sea necesario para el cabal cumplimiento de este mandato.

Sírvase señor Juez reconocer personería a mi apoderado judicial para los efectos y dentro de los términos de este mandato.

Atentamente,

ORLANDO GERARDO BENAVIDES CACERES,  
C.C 12.998.270 de Pasto (N)  
Representante Legal  
AMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.,  
Nit: 801.000.302-2

ACEPTO

ALVARO ANDRES GONZALEZ MURIEL  
C. C. No. 98.390.835 de Pasto (N)  
T. P. No. 245481 del C. S. de la J.



2/5/1

20

20

20

20


$$A \neq \{ \}$$



## DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL



104151

### Artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1069 de 2015

En la ciudad de Pasto, Departamento de Nariño, República de Colombia, el diecisiete (17) de mayo de dos mil diecinueve (2019), en la Notaría Tres (3) del Círculo de Pasto, compareció:

ORLANDO GERARDO BENAVIDES CACERES, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0012998270, presentó el documento dirigido a JUEZ NOVENO ADTVO DEL CTO DE PASTO y manifestó que la firma que aparece en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo como cierto.



6zjympzh8tl1

17/05/2019 - 14:36:31:297



----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.



JAQUELIN URBANO GOMEZ

Notaría tres (3) del Círculo de Pasto - Encargada

Consulte este documento en [www.notariasegura.com.co](http://www.notariasegura.com.co)

Número Único de Transacción: 6zjympzh8tl1



ISS 2/1

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **12998270**

**BENAVIDES CACERES**  
APELLIDOS

**ORLANDO GERARDO**  
NOMBRES

*[Signature]*  
FIRMA

*[Portrait Photo]*

*[Fingerprint]*  
IMPORTE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-FEB-1970**

**PASTO**  
(NARIÑO)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.76**      **A+**      **M**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**31-AGO-1988 PASTO**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Signature]*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMAREATRIZ BERRIO LOPEZ

*[Barcode]*

A-2300100-53113762-M-0012998270-20030723      02398032940 02 134778814





**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
AMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.S**

Fecha expedición: 2019/03/04 - 11:03:08 \*\*\*\* Recibo No. S001370321 \*\*\*\* Num. Operación. 01-APUETA-20190304-0043  
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS  
RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V  
**CODIGO DE VERIFICACIÓN 9F79Q9tTNU**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.**

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

**CERTIFICA**

**NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

**NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:** AMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.S  
**ORGANIZACIÓN JURÍDICA:** SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
**CATEGORÍA :** PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL  
**NIT :** 814000302-2  
**ADMINISTRACIÓN DIAN :** PASTO  
**DOMICILIO :** PASTO

**MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN**

**MATRÍCULA NO :** 45197  
**FECHA DE MATRÍCULA :** SEPTIEMBRE 05 DE 1995  
**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2018  
**FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA :** MARZO 27 DE 2018  
**ACTIVO TOTAL :** 2,652,250,793.64  
**GRUPO NIIF :** GRUPO II

**UBICACIÓN Y DATOS GENERALES**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL :** CALLE 17 34A 40 MARIDIAZ  
**BARRIO :** Maridiaz  
**MUNICIPIO / DOMICILIO:** 52001 - PASTO  
**TELÉFONO COMERCIAL 1 :** 7413030  
**TELÉFONO COMERCIAL 2 :** 3217463842  
**TELÉFONO COMERCIAL 3 :** 3013716952  
**CORREO ELECTRÓNICO No. 1 :** info@americanadeconstrucciones.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL :** CALLE 17 34A 40 MARIDIAZ  
**MUNICIPIO :** 52001 - PASTO  
**BARRIO :** Maridiaz  
**TELÉFONO 1 :** 7413030  
**TELÉFONO 2 :** 3217463842  
**TELÉFONO 3 :** 3013716952  
**CORREO ELECTRÓNICO :** orlando70b@gmail.com

**CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA**

**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL  
**ACTIVIDAD SECUNDARIA :** F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO  
**OTRAS ACTIVIDADES :** F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL  
**OTRAS ACTIVIDADES :** B0811 - EXTRACCION DE PIEDRA, ARENA, ARCILLAS COMUNES, YESO Y ANHIDRITA

**CERTIFICA - CONSTITUCIÓN**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1261 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 1995 DE LA NOTARIA CUARTA DE PASTO, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 5806 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 1995, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA AMERICANA

157 29



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
AMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.S**

Fecha expedición: 2019/03/04 - 11:03:08 \*\*\*\* Recibo No. S001370321 \*\*\*\* Num. Operación. 01-APUETA-20190304-0043  
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS  
RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V  
**CODIGO DE VERIFICACIÓN 9F79Q9!TNU**

DE CONSTRUCCIONES CIA LTDA.

**CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO**

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

- 1) AMERICANA DE CONSTRUCCIONES CIA LTDA
- 2) AMERICANA DE CONSTRUCCIONES EU
- Actual.) AMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.S

**CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 2876 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2005 SUSCRITO POR NOTARIA TERCERA DE PASTO, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 2667 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2005, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE AMERICANA DE CONSTRUCCIONES CIA LTDA POR AMERICANA DE CONSTRUCCIONES EU

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE JUNIO DE 2017 SUSCRITO POR NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 16758 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE OCTUBRE DE 2017, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE AMERICANA DE CONSTRUCCIONES EU POR AMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.S

**CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 2876 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2005 DE LA NOTARIA TERCERA DE PASTO, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 2667 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2005, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : TRANSFORMACION DE SOCIEDADES COMERCIALES

ENTE JURIDICO ANTERIOR : Sociedad Limitada

ENTE JURIDICO ACTUAL : Empresa Unipersonal

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE JUNIO DE 2017 DE LA NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 16758 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE OCTUBRE DE 2017, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : TRANSFORMACION DE SOCIEDADES COMERCIALES

ENTE JURIDICO ANTERIOR : Empresa Unipersonal

ENTE JURIDICO ACTUAL : Sociedad por Acciones Simplificada

**CERTIFICA - REFORMAS**

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
EP-4175	20040803	NOTARIA CUARTA PASTO	RM09-1860	20040805
EP-2876	20050906	NOTARIA TERCERA PASTO	RM09-2667	20050920
EP-2876	20050906	NOTARIA TERCERA PASTO	RM09-2668	20050920
EP-2876	20050906	NOTARIA TERCERA PASTO	RM09-2668	20050920
EP-2876	20050906	NOTARIA TERCERA PASTO	RM09-2668	20050920
EP-2876	20050906	NOTARIA TERCERA PASTO	RM09-2668	20050920
EP-2876	20050906	NOTARIA TERCERA PASTO	RM09-2668	20050920
EP-3018	20050914	NOTARIA TERCERA PASTO	RM09-2670	20050920
DOC.PRIV.	20100628	ACTAS CONSEJO DE PASTO	RM09-6980	20100629
		ADMINISTRACION		
DOC.PRIV.	20130801	ACTAS ASAMBLEA GENERAL PASTO	RM09-10459	20130802
DOC.PRIV.	20170627	NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO PASTO	RM09-16758	20171011
DOC.PRIV.	20170627	NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO PASTO	RM09-16758	20171011
DOC.PRIV.	20171221	ACTAS ASAMBLEA GENERAL DE PASTO	RM09-17072	20171229
		ASOCIADOS		



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
AMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.S**

Fecha expedición: 2019/03/04 - 11:03:08 \*\*\*\* Recibo No. S001370321 \*\*\*\* Num. Operación. 01-APUETA-20190304-0043  
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS  
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V  
**CODIGO DE VERIFICACIÓN 9F79Q9tTNU**

**CERTIFICA - VIGENCIA**

VIGENCIA: TERMINO INDEFINIDO

**CERTIFICA - OBJETO SOCIAL**

OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL:1.CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL,HIDRÁULICA, SANITARIA, AMBIENTALES, URBANISMO, SISTEMAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, . MONTAJES ELECTROMECAÑICOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS PARA MINERÍA. 2. CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, TALES COMO CASAS UNIFAMILIARES Y EDIFICIOS MULTIFAMILIARES. 3. MANTENIMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA. 4. CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES TALES COMO: EDIFICIOS DESTINADOS A ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, COMO FÁBRICAS, TALLERES, PLANTAS DE MONTAJE, HOSPITALES, CENTROS DE SALUD, ESCUELAS, COLEGIOS, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS O ESPACIOS RELACIONADOS CON ESCUELAS Y. COLEGIOS, EDIFICIOS DE OFICINAS, HOTELES, TIENDAS, CENTROS COMERCIALES, RESTAURANTES, EDIFICIOS DE AEROPUERTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS CUBIERTAS, PARQUEADEROS, INCLUIDOS LOS SUBTERRÁNEOS, ALMACENES, EDIFICIOS RELIGIOSOS, EL MONTAJE Y LEVANTAMIENTO DE CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES1 5. CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN. 6. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE RECREACIÓN, ESCENARIOS DEPORTIVOS, CANCHAS MÚLTIPLES Y COLISEOS.7. MONTAJE, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS Y DEMÁS ELEMENTOS METÁLICOS COMO PARTE DE LA CONSTRUCCIÓN.8.CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMPLETAS DE OBRAS Y REDES HIDRÁULICAS 9. CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, PAVIMENTACIÓN, REFORMAS Y REPARACIONES COMPLETAS DE CARRETERAS, CALLES Y OTRAS VÍAS PARA VEHÍCULOS O PEATONES. CONSTRUCCIÓN DE: SISTEMAS DE ALCANTARILLADO (INCLUIDA SU REPARACIÓN), INSTALACIONES DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, ESTACIONES DE BOMBEO, CENTRALES ELÉCTRICAS Y PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA.11.CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE ACUEDUCTOS Y RELLENOS SANITARIOS.12.CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMPLETAS DE PUENTES, CANALES Y MUELLES.13.TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES.14.SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENOS DE CONSTRUCCIÓN, MOVIMIENTO DE TIERRAS: EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y ORDENACIÓN DE TERRENOS DE CONSTRUCCIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, REMOCIÓN DE PIEDRAS, VOLADURA, ETCÉTERA.15. ACTIVIDADES DE GEOFÍSICA, GEOLOGÍA, INVESTIGACIÓN SÍSMICA Y TOPOGRAFÍA,16.PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS: REMOCIÓN DEL ESTÉRIL Y ACTIVIDADES DE OTRO TIPO PARA PREPARAR Y APROVECHAR TERRENOS Y PROPIEDADES MINERAS. 17. CONSTRUCCIÓN DE BENEFICIARIO DE ORO.18.CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE GAVIONES Y PONTONES,19.DRENAJE DE TERRENOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE TIERRAS AGRÍCOLAS O FORESTALES. 20. DISEÑO, REFORMAS Y MANTENIMIENTO DE INTERIORES Y EXTERIORES.21.TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL.22.CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA. 23. DISEÑO DE MÁQUINAS, MATERIALES, INSTRUMENTOS, ESTRUCTURAS, PROCESOS Y SISTEMAS. 24. DISEÑO, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, ALUMINIO Y MADERA.25. CONSULTORÍA, FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN EL CAMPO DE LA: INGENIERÍA CIVIL, VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL Y URBANA, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, HIDRÁULICA; INGENIERÍA ELECTRÓNICA, INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL,INGENIERÍA, INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD, INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, REFRIGERACIÓN, SANEAMIENTO, CONTROL DE LA ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO, ETCÉTERA. 26. CONSULTORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES, EN EL PROCESO DE ALISTAMIENTO, FORMULACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL- POT Y ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - EOT. 27. SOLUCIONES DE INGENIERÍA AMBIENTAL, ECO DISEÑO Y TODO TIPO DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 28. INGENIERÍA Y CONSULTORÍA AMBIENTAL, ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y ECO EFICIENCIA. 29. PROYECTOS DE REFORESTACIÓN QUE AYUDEN A PROTEGER EL ECOSISTEMA Y RECUPERAR LAS ESPECIES SUS HÁBITATS ORIGINALES, REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS. 30. DISEÑAR ESTRATEGIAS QUE PROPENDAN A LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL. 31. SERVICIO DE COLMATACIÓN Y DES COLMATACIÓN. 32. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E INSTALACION DE REDES DE DATOS CABLEADAS E INALÁMBRICAS,REDES DE INTERNET. 33. TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 34. SERVICIO DE ANÁLISIS E I NSTALACION DE SISTEMAS, 35. DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PLANIFICACIÓN, PRUEBAS), CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 36. ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS PARA CONSTRUCCION, MINERIA E INGENIERIA CIVIL. 37.





**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
AMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.S**

Fecha expedición: 2019/03/04 - 11:03:08 \*\*\*\* Recibo No. S001370321 \*\*\*\* Num. Operación. 01-APUETA-20190304-0043

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V

**CODIGO DE VERIFICACIÓN 9F79Q9ITNU**

FORMULACION, EVALUACIÓN , DESARROLLO Y GERENCIA DE PROYECTOS: COMERCIALES, SOCIALES, CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA 38. SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO: ARENA, RAJÓN, GRAVAS, ARENA, BASES, SUB BASES, PIEDRA, GRAVILLA, CEMENTO, BALDOSAS, PISOS, LADRILLO, HIERRO, ACERO, VARILLAS, VIGAS, ALUMINIO, TUBERIA, ESTRUCTURAS METÁLICAS O ARMAZONES, Y PARTES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (ELABRADAS EN ACERO), Y PRODUCTOS SIMILARES PARA USO ESTRUCTURAL ENTRE OTROS. 39. SUMINISTRO DE ARTICULOS DE FÉRRETERÍA, PINTURA, VIDRIOS, CERRADURAS, CALENTADORES DE AGUA, SANITARIOS (BAÑERAS, LAVABO, INODOROS Y OTROS SANITARIOS DE PORCELANA), EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN DE SANITARIOS TALES COMO: TUBOS, TUBERÍAS, ACCESORIOS, GRIFOS, DERIVACIONES, CONEXIONES, TUBERÍAS DE CAUCHO, ETC . 40. SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS O ARMAZONES, Y PARTES. DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (LABORADAS DE ACERO), Y PRODUCTOS SIMILARES PARA USO ESTRUCTURAL. 41. SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS EN MADERA O ARMAZONES, Y PARTES DE ESTRUCTURAS EN MADERA Y PRODUCTOS SIMILARES PARA USO ESTRUCTURAL 42 SUMINISTRO DE EQUIPO DE TODA CLASE DE TUBOS Y TUBERÍAS. 43. SUMINISTRO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS PARA LA INDUSTRIA, COMERCIO, MINERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN. 44 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. 45. COMERCIALIZACIÓN DE MOBILIARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA OFICINA E INDUSTRIA. 46. DISEÑO, ELABORACIÓN, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE TODA CLASE DE MOBILIARIO PARA CONSTRUCCIONES, HOGAR, INDUSTRIA Y OFICINA. 47. INSTALACIÓN DE MOBILIARIO. 48. SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS, INCLUYE COMPUTADORES SOFTWARE Y EQUIPO PERIFÉRICO. 49. SUMINISTRO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS, INCLUYE LA COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y BICICLETAS. 50. SUMINISTRO DE TODO TIPO DE MAQUINARIA SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA EL SECTOR: INDUSTRIA, CONSTRUCCIÓN, MINERÍA, ALIMENTOS, ENTRE OTROS. 51. COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPO, PARTES Y PIEZAS ELECTRÓNICOS Y DE TELECOMUNICACIONES 52. SUMINISTRO DE TEXTILES COMO: TELAS, ALFOMBRAS, TAPETES, ROPA DE CAMA, MANTELERÍA, TOALLAS DE BAÑO, PAÑOS DE COCINA, CORTINAS, VISILLOS, FRAZADAS, COBERTORES, ACOLCHADOS, COLCHONES, COLCHONETAS, ALMOHADAS, ENTRE OTROS. 53 SUMINISTRO DE MUEBLES, ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN, TELEVISORES Y TODO TIPO DE 'ELECTRODOMÉSTICOS Y GASODOMÉSTICOS COMO: REFRIGERADORES, LAVADORAS, MÁQUINAS PARA SECAR ROPA, MÁQUINAS LAVAPLATOS ASPIRADORAS, APARATOS PARA CALEFACCIÓN, HORNOS, ASADORES, ESTUFAS, CALENTADORES, ENTRE OTROS. 54. COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD, ALARMAS ELECTRÓNICAS, TALES COMO ALARMAS CONTRA INCENDIOS Y ROBOS, INCLUSO SU MANTENIMIENTO. 55. SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL Y ESPECIALIZADA, TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR DE TODO TIPO DE EDIFICIOS, LIMPIEZA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, DESINFECCIÓN Y EXTERMINIO DE PLAGAS EN EDIFICIOS Y MAQUINARIA INDUSTRIAL, LIMPIEZA DE BOTELLAS, BARRIDO DE CALLES, RECICLAJE. 56. SERVICIO DE CERRAJERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TERMINADOS Y ACABADOS PARA TODO TIPO DE EDIFICIOS COMO: INSTALACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS, MARCOS, INSTALACIÓN DE COCINAS Y TODO TIPO DE MOBILIARIO, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, INSTALACIÓN DE VIDRIOS ENTRE OTRAS. 57. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE OFICINA CORRIENTES, COMO LOS DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA, FACTURACIÓN Y REGISTRO, PERSONAL Y DISTRIBUCIÓN FÍSICA Y DE LOGÍSTICA. 58. SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN . USANDO VARIAS TÉCNICAS COMO: PRENSA, OFFSET, FOTOGRAFADO, FLEXOGRAFÍA, MÁQUINAS REPRODUCTORAS, IMPRESORAS CONTROLADAS POR COMPUTADORES, REPUJADORA, SERIGRAFÍA, OLEOGRAFÍA; Y PUEDEN SER EJECUTADAS SOBRE DIFERENTES , MATERIALES O SUSTRATOS: PAPEL, TEXTILES, PLÁSTICOS, VIDRIO, METAL, MADERA Y CERÁMICA. 59. COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y ACCESORIOS 60. COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE TRABAJO, CALZADO PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL. 61. COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS Y DE TERAPIA. 62. COMERCIALIZACIÓN DE TODA CLASE DE MATERIAS PRIMAS. 63. ASESORÍA, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA OPERACIONAL A EMPRESAS Y OTRAS ORGANIZACIONES SOBRE CUESTIONES DE GESTIÓN, COMO LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y TEMAS DE DECISIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO; OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE COMERCIALIZACION PLANIFICACION DE LA PRODUCCIÓN; POLÍTICAS, PRÁCTICAS Y PLANIFICACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 64. ASESORIA Y AYUDA A LAS EMPRESAS Y LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCION Y CONTROL INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, ETCÉTERA. 65. FORMULACIÓN, PROYECTOS: COMERCIALES, SOCIALES, CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL. 66. CONTRATAR PERSONAL Y SERVICIOS DE TODO TIPO PARA SU FUNCIONAMIENTO Y 67. IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE AYUDEN AL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE ESTA EMPRESA 68. PARTICIPAR EN TODA CLASE DE LICITACIONES PARA ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS. 69. COMERCIO DE UNA VARIEDAD DE PRODUCTOS SIN NINGUNA ESPECIALIZACION EN PARTICULAR Y CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA QUE PERMITA FORTALECER A LA EMPRESA EN EL EJERCICIO COMERCIAL. 70. CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ENERGÍA DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y SUBESTACIONES DE ENERGÍA. 71. EXTRACCIÓN DE



CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
AMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.S

Fecha expedición: 2019/03/04 - 11:03:08 \*\*\*\* Recibo No. S001370321 \*\*\*\* Num. Operación. 01-APUETA-20190304-0043  
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS  
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V  
CODIGO DE VERIFICACIÓN 9F79Q9iTNU

PIEDRA, ARENA, ARCILLAS COMUNES, YESO Y ANHIDRITA1 72. ACTIVIDADES DE APOYO PARA OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. 73. FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE HORMIGÓN, CEMENTO Y YESO. 74. INSTALACIÓN ESPECIALIZADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL. 75 SILVICULTURA Y OTRAS ACTIVIDADES FORESTALES. PARÁGRAFO. DESARROLLO DEL OBJETO: PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO DELA COMPAÑÍA PODRÁ:1.ADQUIRIR TODOS LOS ACTIVOS FIJOS DE CARÁCTER MUEBLE O INMUEBLE QUE SEAN' NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES; GRAVAR O LIMITAR EL DOMINIO DE SUS ACTIVOS FIJOS, SEAN MUEBLES O INMUEBLES, Y ENAJENARLOS CUANDO POR RAZONES DE NECESIDAD O CONVENIENCIA FUERE ACONSEJABLE SU DISPOSICIÓN. 2. ADQUIRIR Y USAR NOMBRES COMERCIALES, LOGOTIPOS, MARCAS Y DEMÁS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLA POR LA SOCIEDAD Y CON LOS SERVICIOS A LOS QUE SE EXTIENDE SU GIRO; SI SE TRATA DE DERECHOS DE TERCEROS, CELEBRAR LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE USO O CONCESIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.3 CONCURRIR A LA CONSTITUCIÓN DE OTRAS EMPRESAS O SOCIEDADES, CON O SIN EL CARÁCTER DE FILIALES, O VINCULARSE A EMPRESAS O SOCIEDADES YA EXISTENTES, MEDIANTE APORTES EN DINERO, EN BIENES O EN SERVICIOS, INCORPORADAS O INCORPORARSE A ELLAS. 4.TOMAR DINERO EN MUTUO Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES FINANCIERAS, POR ACTIVA O POR PASIVA, QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES. 5. EN GENERAL, EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE GUARDEN RELACIÓN DE MEDIO A FIN CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO EN EL PRECEDENTE ARTÍCULO Y TODOS AQUELLOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALES DERIVADAS DE . SU EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMPAÑÍA. 6 ACTUAR COMO AGENTE O REPRESENTANTE DE PERSONAS NACIONALES O EXTRANJERAS, NATURALES O JURÍDICAS. 7. PARTICIPAR COMO CONTRATISTA EN TODA CLASE DE LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, NACIONALES, SUBREGIONALES ANDINAS O INTERNACIONALES Y FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES, CONSORCIOS O EMPRESAS NACIONALES, MULTINACIONALES ANDINAS O INTERNACIONALES.8. REALIZAR EN SU PROPIO NOMBRE, POR CUENTA DE TERCERAS PERSONAS O EN PARTICIPACION CON ELLAS, LAS OPERACIONES QUE SEAN NECESARIAS O CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. SE ENTENDERÁN INCLUIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO, LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD ADQUIRIR DERECHOS O CUMPLIR OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. 9. ADQUIRIR, POSEER, CONSERVAR, ADMINISTRAR O ARRENDAR SUS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO DARLOS Y TOMARLOS A CUALQUIER TÍTULO DE TENENCIA Y ENTREGARLOS O RECIBIRLOS EN GARANTÍA DE OBLIGACIONES. 10. ASOCIARSE CON OTRAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES AFINES A LAS DE SU OBJETO.11.CONSTITUIR SUCURSALES, AGENCIAS Y ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O EN EL EXTERIOR Y DESIGNAR AGENTES, GERENTES O ADMINISTRADORES, ASÍ COMO APODERADOS GENERALES O ESPECIALES PARA SU REPRESENTACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL. 1.2. MANEJO DE FRANQUICIAS, REPRESENTACIÓN COMERCIAL, RECEPCIÓN DE BIENES EN CONSIGNACIÓN, CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE LEASING, CELEBRACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	600.000.000,00	600,00	1.000.000,00
CAPITAL SUSCRITO	462.000.000,00	462,00	1.000.000,00
CAPITAL PAGADO	462.000.000,00	462,00	1.000.000,00

CERTIFICA - ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, DEL GERENTE: EN DESARROLLO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO DE COMERCIO SON FUNCIONES FACULTADES DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA LAS SIGUIENTES:1.REPRESENTAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALME, A LA SOCIEDAD Y HACER USO DE LA RAZÓN SOCIAL.2. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑÍA A SESIONES ORDINARIAS Y A LAS EXTRAORDINARIAS, CADA VEZ QUE LO JUZGUE CONVENIENTE NECESARIO, O CUANDO SE LO SOLICITE POR LO MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DÉ LAS ACCIONES SUSCRITAS. 3. VINCULAR MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO A LOS EMPLEADOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL.4.REALIZAR LA APERTURA Y CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE EMPRESA Y TODA TRANSACCIÓN FINANCIERA QUE REQUIERA LA EMPRESA. 5. AUTORIZAR LA APERTURA DE AGENCIAS, SUCURSALES, ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO. 6. NOMBRAR ADMINISTRADORES Y GERENTES DE LAS AGENCIAS Y

33  
161



CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO  
AMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.S

Fecha expedición: 2019/03/04 - 11:03:08 \*\*\*\* Recibo No. S001370321 \*\*\*\* Num. Operación. 01-APUETA-20190304-0043

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V

CODIGO DE VERIFICACIÓN 9F79Q9tNU

SUCURSALES QUE SE ABRAEN EN OTRAS CIUDADES.7. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE DEMANDE EL EJERCICIO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD SÍN PERJUICIO DE OBTENER PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARÁ EJECUCION DE AQUELLOS CONTRATOS QUE REQUIERAN DICHA FORMALIDAD DE ACUERDO CON DERECHO POR MEDIO DEL PRESENTE PARA TERMINAR, RESOLVER, O SOCIEDAD, O PARA PRORROGARLOS, SEGUN EL CASO, SUPONIENDO QUE DICHA AUTORIDAD NO HAYA SIDO CONFERIDA EXPRESAMENTE A OTRO ORGANO DE LA SOCIEDAD DE ACUERDO CON ESTOS ESTATUTOS.8. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS UN INFORME ESCRITO DE TODAS LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO Y DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE SE RECOMIENDAN A LA ASAMBLEA. 9.PRESENTAR ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CADA AÑO FISCAL ANEXANDO TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA LEY.10. MANTENER INFORMADA A LA ASAMBLEA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD. 11. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.12. OTORGAR LOS PODERES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD CON O SIN LAS FACULTADES PARA DESISTIR, RECIBIR, SUSTITUIR, DELEGAR, REVOCAR, REASUMIR Y TRANSIGIR Y LIMITAR LOS PODERES QUE PUEDAN SER OTORGADOS.13. SOMETER A LA DECISIÓN DE ARBITROS POR MEDIO DE COMPROMISOS Y CLÁUSULAS COMPROMISORIAS, LAS DIFERENCIAS QUE SURJAN ENTRE LA SOCIEDAD Y TERCEROS, ACORDAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS ÁRBITROS Y NOMBRAR AL APODERADO QUE REPRESENTARÁ A LA SOCIEDAD ANTE EL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE.14. ADÓPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS DERECHOS, ¡OS BIENES Y ¡OS INTERESES DE LA SOCIEDAD. 15. DESIGNAR Y REMOVER LIBREMENTE LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA QUÉ NO DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y ESCOGER, AL PERSONAL DE TRABAJADORES Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO. 16. APREMIAR A LOS EMPLEADOS Y DEMÁS SERVIDORES DE LA COMPAÑÍA A QUE CUMPLAN LOS DEBERES DE SU CARGO, Y VIGILAR CONTINUAMENTE LA MARCHA DE LA EMPRESA,ESPECIALMENTE SU CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS. 17. CUIDAR QUE LA RECAUDACIÓN O INVERSIÓN DE LOS FOND6S DE,LA EMPRESA.SE HAGAN DEBIDAMENTE.18. ESTABLECER REGLAMENTOS DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA POLÍTICA QUE DEBE SEGUIR LA COMPAÑÍA EN LAS SIGUIENTES MATERIAS: SISTEMAS DE TRABAJO Y DIVISI6N DEL MISMO, PROCEDIMIENTO PARA ¡A PROVISI6N DE LOS CARGOS PREVISTOS, REGULACI6N DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES Y DEL MANEJO QUE EN CUESTIONES DE ESTA ÍNDOLE DEBA OBSERVARSE; OPERACI6N Y DIRECCI6N FINANCIERA Y FISCAL; MÉTODOS Y OPORTUNIDADES SOBRE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO; FIJACI6N DE LA POLÍTICA DE PRECIOS DE VENTA PARA LOS BIENES Y SERVICIOS Y, EN GENERAL, TODO LO RELATIVO CON SISTEMAS DE DISTRIBUCI6N DE LOS MISMOS, INCLUYENDO NORMAS SOBRE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS, PLAZOS, DESCUENTOS, CONTRATACI6N DE SEGUROS Y DE ASESORÍAS, Y SIMILARES. 19. EJERCER TODAS LAS FACULTADES QUE DIRECTAMENTE DELEGUE EN ÉL LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 20. 'ESTABLECER LA PLANTA DE PERSONAL NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL Y FIJAR LA CORRESPONDERTE ESCALA SALARIAL. 21. TODAS AQUELLAS FUNCIONES QUE LE HAYAN SIDO CONFERIDAS BAJO LA LEY Y BAJO ESTOS ESTATUTOS, Y AQUELLAS QUE LE . CORRESPONDAN POR LA NATURALEZA DE SU OFICIO.

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE MARZO DE 2018 DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 17407 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE MARZO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	BENAVIDES CACERES ORLANDO GERARDO	CC 12,998,270

CERTIFICA

LA INFORMACI6N ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACI6N DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS



Taminango 29 de Mayo de 2019

Señor(a):

**JUEZ NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO**  
E.S.D.



Radicación: No. 2019- 00013  
Medio de Control: Reparación Directa  
Demandante: LAURENTINO MARTOS NARVAEZ Y OTROS  
Demandado: MUNICIPIO DE TAMINANGO N Y OTROS  
Actuación: Llamamiento en Garantía.

Cordial saludo:

**CARLOS ANDRES OJEDA LUNA**, identificado con la C.C. No. 98.390.308 de Pasto y T.P. No. 105.477 del C.S de la J., en mi calidad de apoderado de la Alcaldía Municipal de Taminango Nariño, demandado en el proceso de la referencia, comedidamente solicito a usted que involucre en el presente procedimiento judicial de Acción de Reparación Directa referenciado, a la Compañía de Seguros Solidaria de Colombia, identificada con NIT No. 860.524.654. -6, en razón de la Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 436 – 74 - 994000004958, en calidad de **LLAMADO EN GARANTÍA**, para amparar las obligaciones que resulten en el presente trámite en contra de mi mandante y a favor del demandado, con base en los siguientes:

### HECHOS

**PRIMERO:** La empresa AMERICANA DE CONSTRUCCIONES, identificada con NIT No.814.000.302-2 constituyo en favor de la Alcaldía Municipal de Taminango N y a través de la Compañía de Seguros Aseguradora Solidaria de Colombia., la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 436 – 74 - 994000004958, con fecha de expedición 06 – 02 – 2015, la cual se renovó en el tiempo hasta el 20 de Mayo de 2016, en razón de la suscripción del contrato de obra civil 005 – L.P.2014 cuyo objeto fue ejecutar el proyecto denominado Ampliación, optimización del sistema de alcantarillado el Remolino, Taminango, Nariño, Occidente”.....,

**SEGUNDO.-** Los amparos que cubre la póliza en razón de la cual se pretende vincular a la Compañía de Seguros Solidaria de Colombia, cubren contratistas y subcontratistas, responsabilidad civil cruzada entre otros, la cual se encontraba vigente a la fecha de la ocurrencia de los hechos que son materia de la presente acción de reparación directa.

**TERCERO:** Los hechos narrados en el libelo demandatorio de la referencia, ocurrieron en las fechas, para las cuales, La póliza por la cual se llama en garantía a la Compañía de Seguros Solidaria de Colombia se encontraba vigente, por tanto se verá afectada con la sentencia proferida en el presente proceso toda vez que, debe ser ella quien entre a responder por las declaraciones y condenas en caso de que las mismas llegaren a prosperar en contra de la Alcaldía Municipal de Taminango N

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

Invoco como fundamento de derecho los artículos 217 del Código Contencioso Administrativo y 57 y demás normas concordantes del Código de Procedimiento Civil.

## PRUEBAS

Solicito, se oficie a la Compañía de Seguros Solidaria de Colombia, identificada con NIT No. 860.524.654-6, a fin de que anexe con destino al proceso, copia auténtica de la póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 436 - 74 - 994000004958, cuyo beneficiario es la Alcaldía Municipal de Taminango N.

Anexo copia simple de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 436 - 74 - 994000004958, expedida por la Compañía de Seguros Solidaria de Colombia identificada con NIT No. 860.524.654-6 que reposa en la entidad que apodero

## ANEXOS

Adjunto los documentos señalados en el acápite de pruebas.

## NOTIFICACIONES

El demandado las recibirá en: la Calle 5ª No. 4 - 16, Barrio el Poder del Municipio de Taminango N. correo electrónico: [alcaldia@taminango-narino.gov.co](mailto:alcaldia@taminango-narino.gov.co)

El suscrito las recibirá en: la Calle 5ª No. 4 - 16, Barrio el Poder del Municipio de Taminango N. correo electrónico: [alcaldia@taminango-narino.gov.co](mailto:alcaldia@taminango-narino.gov.co)

A la Compañía de Seguros Solidaria de Colombia, identificada con NIT No. 860.524.654-6, a quien se pretende vincular en llamamiento en garantía en la Calle 100 No. 9A - 45, pisos 8 y 12 de la ciudad de Bogotá D.C.

Del Señor Juez

Atentamente,



**CARLOS ANDRÉS OJEDA LUNA**

C.C. No. 98.390.308 de Pasto

Í.P. No. 105.477 del C.S de la J.

Apoderado Alcaldía Municipal Taminango Nariño.

**POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL**

Somos la PRIMERA Mejor Empresa para  
Trabajar en Colombia y la Novena Mejor  
Empresa para Trabajar en América Latina



**NÚMERO ELECTRÓNICO  
PARA PAGOS**

**4360798195**

**PÓLIZA No: 436 -74 - 994000004958 ANEXO:0**

contactado para realizar el procedimiento

transmisión de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la

AGENCIA EXPEDIDORA: PASTO				COD. AGE: 436				RAMO: 74				PAP:			
DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	
06	02	2015		03	02	2015	23:59	03	08	2015	23:59	181	06	02	
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				FECHA DE IMPRESIÓN			
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL				A LAS				A LAS				DÍAS			
TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESIÓN															

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION				VIGENCIA DEL ANEXO				DIA				MES				AÑO				HORAS				DÍAS															
				03				02				2015				23:59				03				08				2015				23:59				181			
				VIGENCIA DESDE				A LAS				VIGENCIA HASTA				A LAS																							

NOMBRE: AMERICANA DE CONSTRUCCIONES		IDENTIFICACIÓN: NIT 814.000.302-2	
DIRECCIÓN: CL 17 34A 40		TELÉFONO: 7310262	
CIUDAD: PASTO, NARIÑO			

ASEGURADO: MUNICIPIO DE TAMINANGO		IDENTIFICACIÓN: NIT 800.024.977-6	
DIRECCIÓN: Taminango		TELÉFONO: 0	
CIUDAD: TAMINANGO, NARIÑO			
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS		IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8	

ASEGURADO: MUNICIPIO DE TAMINANGO		IDENTIFICACIÓN: NIT 800024977	
EM: 1 DEPARTAMENTO: NARIÑO		CIUDAD: TAMINANGO	

DIRECCIÓN: MUNICIPIO DE TAMINANGO			
ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA			
CONSTRUCCION: GRUPO 1: (ESTRUCTURA SOLIDA, MUROS SOLIDOS, ENTREPISOS SOLIDOS)			
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO		TIPO DE RIESGO: ESTATAL	
		MANZANA:	

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUB LIMITE
CONTRATO		\$ 128,870,000.00		
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES		128,870,000.00		
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		12,887,000.00		
RCE PATRONAL		12,887,000.00		
GASTOS MEDICOS		12,887,000.00		
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA		12,887,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS  
IT 001 - TERCEROS AFECTADOS  
NIT 800024977 - MUNICIPIO DE TAMINANGO

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución del CONTRATO No. 005 L.P. 2014 DE OBRA PUBLICA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TAMINANGO Y AMERICANA DE CONSTRUCCIONES E.U. REFERENTE A CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA REALIZAR AMPLIACION, OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL REMOLINO, MUNICIPIO DE TAMINANGO- DEPARTAMENTO DE NARIÑO - CÓDIGO BPIM 20130527860086.

ARACION:  
GARANTIAS AMPARADAS DECRETO 1510 DE 2013.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***128,870,000.00	VALOR PRIMA: \$ *****383,432.00	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ ****61,349.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****444,782.00
--	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE NIDIA EUGENIA ORTEGA BENAVIDES	CLAVE 4432	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR	(415)7701861000019(8020)00000000007000436079819	FIRMA TOMADOR
------------------	---	---------------

2  
164

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2503 DIC/83 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6801, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE





NIT. 860.524.634 - 6

NÚMERO ELECTRÓNICO  
PARA PAGOS

4360798195

## POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Somos la PRIMERA Mejor Empresa para  
Trabajar en Colombia y la Mejor  
Empresa para Trabajar en América LatinaLas Mejores  
Empresas  
para Trabajar 2014

PÓLIZA No: 436 -74 - 994000004958 ANEXO:2

AGENCIA EXPEDIDORA PASTO

COD. AGE: 436

RAMO: 74

PAP:

DIA MES AÑO

23 07 2015

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

DIA MES AÑO

13 07 2015

HORAS

23:59

DIA MES AÑO

13 01 2016

HORAS

23:59

DÍAS

184

DIA MES AÑO

23 07 2015

FECHA DE EXPEDICIÓN

VIGENCIA DESDE

A LAS

VIGENCIA HASTA

A LAS

DÍAS

FECHA DE IMPRESIÓN

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL

TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESIÓN

TIPO DE MOVIMIENTO MODIFICACION

VIGENCIA DEL ANEXO

DIA MES AÑO HORAS

13 07 2015 23:59

DIA MES AÑO HORAS

13 01 2016 23:59

DÍAS

184

VIGENCIA DESDE

A LAS

VIGENCIA HASTA

A LAS

NOMBRE:

AMERICANA DE CONSTRUCCIONES

IDENTIFICACIÓN: NIT

814.000.302-2

DIRECCIÓN:

CL 17 34A 40

CIUDAD: PASTO, NARIÑO

TELÉFONO:

7310252

ASEGURADO:

MUNICIPIO DE TAMINANGO

IDENTIFICACIÓN: NIT

800.024.977-6

DIRECCIÓN:

#TABLON PANAMERICANO

CIUDAD: TAMINANGO, NARIÑO

TELÉFONO:

3148213532

BENEFICIARIO:

TERCEROS AFECTADOS

IDENTIFICACIÓN: NIT

001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

NIT : 800024977

ASEGURADO: MUNICIPIO DE TAMINANGO

ITEM: 1

DEPARTAMENTO: NARIÑO

CIUDAD: TAMINANGO

DIRECCIÓN: MUNICIPIO DE TAMINANGO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

CONSTRUCCION: GRUPO 1: (ESTRUCTURA SOLIDA, MUROS SOLIDOS, ENTREPISOS SOLIDOS)

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO

TIPO DE RIESGO: ESTATAL

MANZANA:

DESCRIPCION

AMPAROS

SUMA ASEGURADA &amp; INVAR

SUBÍMITE

CONTRATO

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES  
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS  
RCE PATRONAL  
GASTOS MEDICOS  
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA\$ 128,870,000.00  
128,870,000.00  
12,887,000.00  
12,887,000.00  
12,887,000.00  
12,887,000.00

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS

NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS  
NIT 800024977 - MUNICIPIO DE TAMINANGO

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución del CONTRATO No. 005 L.P. 2014 DE OBRA PUBLICA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TAMINANGO Y AMERICANA DE CONSTRUCCIONES E.U. REFERENTE A CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA REALIZAR AMPLIACION, OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL REMOLINO, MUNICIPIO DE TAMINANGO- DEPARTAMENTO DE NARIÑO - CODIGO BPIM 20130527860086.

ACLARACION:

GARANTIAS AMPARADAS DECRETO 1510 DE 2013.

VALOR ASEGURADO TOTAL:

\$ \*\*\*\*\*0.00

VALOR PRIMA:

\$ \*\*\*\*\*0.00

GASTOS EXPEDICION:

\$ \*\*\*\*\*0.00

IVA:

\$ \*\*\*\*\*0.00

TOTAL A PAGAR:

\$ \*\*\*\*\*0.00

INTERMEDIARIO

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE  
NIDIA EUGENIA ORTEGA BENAVIDESCLAVE  
4432%PART  
100.00

NOMBRE COMPAÑIA

%PART

VALOR ASEGURADO

LA HORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701851000019(8020)00000000007000436079819

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

FIRMA TOMADOR



CGAMBOA 0

CADB2678070AFC7857

CLIENTE

Gran Contribuyente RES 2508 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6801, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE



NIT. 860.524.654 - 6

NÚMERO ELECTRÓNICO  
PARA PAGOS

4360798195

## POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

PÓLIZA No: 436 -74 - 994000004958 ANEXO:3

AGENCIA EXPEDIDORA: PASTO	COD. AGE: 436	RAMO: 74	PAP:
DIA MES AÑO 28 12 2015	DIA MES AÑO 13 01 2016	HORAS 23:59	DIA MES AÑO 28 12 2015
FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL	TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION		

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA	DIA MES AÑO HORAS 13 01 2016 23:59	DIA MES AÑO HORAS 07 04 2016 23:59	DIA MES AÑO HORAS 07 04 2016 23:59
VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA

NOMBRE: AMERICANA DE CONSTRUCCIONES	IDENTIFICACIÓN: NIT 814.000.302-2
DIRECCIÓN: CL 17 34A 40	CIUDAD: PASTO, NARIÑO
	TELÉFONO: 7310262

ASEGURADO: MUNICIPIO DE TAMINANGO	IDENTIFICACIÓN: NIT 800.024.977-6
DIRECCIÓN: CALLE 5 NO. 4 - 16 BARRIO EL PODER	CIUDAD: TAMINANGO, NARIÑO
	TELÉFONO: 3148214786
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS	IDENTIFICACIÓN: PS 0

ASEGURADO: MUNICIPIO DE TAMINANGO	DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS
ITEM: 1	NIT: 800024977

DEPARTAMENTO: NARIÑO	CIUDAD: TAMINANGO
DIRECCIÓN: MUNICIPIO DE TAMINANGO	
ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	
CONSTRUCCION: GRUPO 1: (ESTRUCTURA SOLIDA, MUROS SOLIDOS, ENTREPIOS SOLIDOS)	
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO	TIPO DE RIESGO: ESTATAL
	MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBIMITE
CONTRATO		\$ 128,870,000.00		
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES		128,870,000.00		
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		12,887,000.00		
RCE PATRONAL		12,887,000.00		
GASTOS MEDICOS		12,887,000.00		
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA		12,887,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS  
PS 0 - TERCEROS AFECTADOS,  
NIT 800024977 - MUNICIPIO DE TAMINANGO

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución del CONTRATO No. 005 L.P. 2014 DE OBRA PUBLICA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TAMINANGO Y AMERICANA DE CONSTRUCCIONES E.U. REFERENTE A CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA REALIZAR AMPLIACION, OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL REMOLINO, MUNICIPIO DE TAMINANGO- DEPARTAMENTO DE NARIÑO - CODIGO BPIM 20130527860086.

DECLARACION:  
GARANTIAS AMPARADAS DECRETO 1510 DE 2013.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***128,870,000.00	VALOR PRIMA: \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00
--	------------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------------------------

INTERMEDIARIO	COASEGURO CEDIDO
NOMBRE NIDIA EUGENIA ORTEGA BENAVIDES	NOMBRE COMPAÑIA
CLAVE 4432	%PART
%PART 100.00	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.



FIRMA ASEGURADOR

(415)7701881000019(8020)00000000007000436079819

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

FIRMA TOMADOR




CGAMBO: 0

CAD26780706F5765B

CI. TENTE

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 8601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

**POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL**



**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**  
**4360850673**

**PÓLIZA No: 436 -74 - 994000004958 ANEXO:4**

Enticulado para realizar el procedimiento

a en cuenta que se

acción de los clientes a través del Call Center, por favor

Ahora Aseguradora Solidaria dr

ombia confirma la li

AGENCIA EXPEDIDORA: PASTO			COD. AGE: 436			RAMO: 74			PAP:					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	
08	02	2016	07	04	2016	23:59	20	05	2016	23:59	43	08	02	2016
FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA			VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA			FECHA DE IMPRESIÓN		
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL			A LAS			A LAS			DÍAS			TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESIÓN		

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA			VIGENCIA DEL ANEXO			VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA			DÍAS		
			07 04 2016 23:59			20 05 2016 23:59			43					

DATOS DEL TOMADOR											
NOMBRE: AMERICANA DE CONSTRUCCIONES											
DIRECCIÓN: CL 17 34A 40											
CIUDAD: PASTO, NARIÑO											
IDENTIFICACIÓN: NIT 814.000.30 -2											
TELÉFONO: 7310 62											

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO											
ASEGURADO: MUNICIPIO DE TAMINANGO											
DIRECCIÓN: CALLE 5 NO. 4 - 16 BARRIO EL PODER											
CIUDAD: TAMINANGO, NARIÑO											
IDENTIFICACIÓN: NIT 800.024.97 -6											
TELÉFONO: 3148 34786											
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS											
IDENTIFICACIÓN: NIT 001											

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS											
ASEGURADO: MUNICIPIO DE TAMINANGO											
NIT : 800024977											

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: NARIÑO CIUDAD: TAMINANGO											
DIRECCIÓN: MUNICIPIO DE TAMINANGO											
ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA											
CONSTRUCCION: GRUPO 1: (ESTRUCTURA SOLIDA, MUROS SOLIDOS, ENTREPISOS SOLIDOS)											
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:											

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SU LIMITE
CONTRATO		\$ 128,870,000.00		
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES		128,870,000.00		
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		12,887,000.00		
RCE PATRONAL		12,887,000.00		
GASTOS MEDICOS		12,887,000.00		
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA		12,887,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS  
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS,  
NIT 800024977 - MUNICIPIO DE TAMINANGO

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución del CONTRATO No. 005 L.P. 2014 DE OBRA PUBLICA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TAMINANGO Y AMERICANA DE CONSTRUCCIONES E.U. REFERENTE A CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA REALIZAR AMPLIACION, OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL REMOLINO, MUNICIPIO DE TAMINANGO- DEPARTAMENTO DE NARIÑO - CODIGO BPIM 20130527860086.

ACLARACION:  
GARANTIAS AMPARADAS DECRETO 1510 DE 2013.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***128,870,000.00	VALOR PRIMA: \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00
--	------------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------------------------

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE NIDIA EUGENIA ORTEGA BENAVIDES	CLAVE 4432	NOMBRE COMPAÑIA %	VALOR ASEGURADO %
	100.00		

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y LA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

**FIRMA ASEGURADOR** (415)7701581000019(8020)00000000007000436085067  
**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 3 y 12 Bogotá

CAD2678060E7C57 CLIENTE CGAMDA 0

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 8601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

167/13



**POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL**

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS

4360798195

PÓLIZA No: 436 -74 - 994000004958

ANEXO:5

AGENCIA EXPEDIDORA: PASTO

COD. AGE: 436

RAMO: 74

PAP:

DIA MES AÑO  
03 06 2016

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

DIA MES AÑO HORAS  
20 05 2016 23:59

DIA MES AÑO HORAS  
13 07 2016 23:59

DIA MES AÑO  
03 06 2016

FECHA DE EXPEDICIÓN

VIGENCIA DESDE

A LAS

VIGENCIA HASTA

A LAS

DÍAS

FECHA DE IMPRESIÓN

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESIÓN

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO DIA MES AÑO HORAS  
20 05 2016 23:59

VIGENCIA HASTA DIA MES AÑO HORAS  
13 07 2016 23:59

DÍAS  
54

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: AMERICANA DE CONSTRUCCIONES

DIRECCIÓN: CL 17 34A 40

IDENTIFICACIÓN: NIT 814.000.002-2

TÉLEFONO: 710262

CIUDAD: PASTO, NARIÑO

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE TAMINANGO

DIRECCIÓN: CALLE 5 NO. 4 - 16 BARRIO EL PODER

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.024.77-6

TÉLEFONO: 348234786

CIUDAD: TAMINANGO, NARIÑO

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

NIT : 800024977

ASEGURADO: MUNICIPIO DE TAMINANGO

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: NARIÑO

CIUDAD: TAMINANGO

DIRECCIÓN: MUNICIPIO DE TAMINANGO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

CONSTRUCCION: GRUPO 1: (ESTRUCTURA SOLIDA, MUROS SOLIDOS, ENTREPISOS SOLIDOS)

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL

MANZANA:

DESCRIPCIÓN AMPAROS

SUMA ASEGURADA % INVAR

SUBLIMITE

CONTRATO

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES  
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS  
RCE PATRONAL  
GASTOS MEDICOS  
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

\$ 128,870,000.00  
128,870,000.00  
12,887,000.00  
12,887,000.00  
12,887,000.00  
12,887,000.00

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS

NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

NIT 800024977 - MUNICIPIO DE TAMINANGO

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución del CONTRATO No. 005 L.P. 2014 DE OBRA PUBLICA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TAMINANGO Y AMERICANA DE CONSTRUCCIONES E.U. REFERENTE A CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA REALIZAR AMPLIACION, OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL REMOLINO, MUNICIPIO DE TAMINANGO- DEPARTAMENTO DE NARIÑO - CODIGO BPIM 20130527860086.

ACLARACION:

RANTIAS AMPARADAS DECRETO 1510 DE 2013.

VALOR ASEGURADO TOTAL:  
\$ \*\*\*128,870,000.00

VALOR PRIMA:  
\$ \*\*\*\*\*0.00

GASTOS EXPEDICION:  
\$ \*\*\*\*\*0.00

IVA:  
\$ \*\*\*\*\*0.00

TOTAL A PAGAR  
\$ \*\*\*\*\*0.00

INTERMEDIARIO

NOMBRE  
NIDIA EUGENIA ORTEGA BENAVIDES

CLAVE  
4432

%PART  
100.00

NOMBRE COMPAÑIA

COASEGURO CEDIDO

%PART

VALOR ASEGURADO

DO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(3020)00000000007000436079819

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

FIRMA TOMADOR

**POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL**

NÚMERO ELECTRÓNICO  
PARA PAGOS

4360850673

PÓLIZA No: 436 -74 - 994000004958

ANEXO:6

AGENCIA EXPEDIDORA: PASTO

COD AGE: 436

RAMO: 74

PAP:

DIA MES AÑO  
09 08 2016

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

DIA MES AÑO HORAS  
13 07 2016 23:59

VIGENCIA DESDE

A LAS

DIA MES AÑO HORAS  
06 09 2016 23:59

VIGENCIA HASTA

A LAS

DIA MES AÑO  
09 08 2016

FECHA DE IMPRESIÓN

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPR SION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO

DIA MES AÑO HORAS  
13 07 2016 23:59

VIGENCIA DESDE

DIA MES AÑO HORAS  
06 09 2016 23:59

VIGENCIA HASTA

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: AMERICANA DE CONSTRUCCIONES

IDENTIFICACIÓN: NIT 814.000.102-2

DIRECCIÓN: --CALLE 17 NO. 34A-40

CIUDAD: PASTO, NARIÑO

TÉLEFONO: 7 10262

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE TAMINANGO

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.024.177-6

DIRECCIÓN: CALLE 5 #4 - 16

CIUDAD: TAMINANGO, NARIÑO

TÉLEFONO: 3 48234786

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: MUNICIPIO DE TAMINANGO

NIT : 800024977

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: NARIÑO

CIUDAD: TAMINANGO

DIRECCIÓN: MUNICIPIO DE TAMINANGO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

CONSTRUCCION: GRUPO 1: (ESTRUCTURA SOLIDA, MUROS SOLIDOS, ENTREPISOS SOLIDOS)

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL

MANZA A:

DESCRIPCION AMPAROS

SUMA ASEGURADA % INVAR

SUBLIMITE

CONTRATO

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES  
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS  
RCE PATRONAL  
GASTOS MEDICOS  
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

\$ 128,870,000.00  
128,870,000.00  
12,887,000.00  
12,887,000.00  
12,887,000.00  
12,887,000.00

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS

NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

NIT 800024977 - MUNICIPIO DE TAMINANGO

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución del CONTRATO No. 005 L.P. 2014 DE OBRA PUBLICA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TAMINANGO Y AMERICANA DE CONSTRUCCIONES E.U. REFERENTE A CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA REALIZAR AMPLIACION, OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL REMOLINO, MUNICIPIO DE TAMINANGO- DEPARTAMENTO DE NARIÑO - CODIGO BPIM 20130527860086.

ACLARACION:

ARANTIAS AMPARADAS DECRETO 1510 DE 2013.

VALOR ASEGURADO TOTAL:

\$ \*\*\*128,870,000.00

VALOR PRIMA:

\$ \*\*\*\*\*

GASTOS EXPEDICION:

\$ \*\*\*\*\*0.00

IVA:

\$ \*\*\*\*\*

TOTAL A PAGAR:

\$ \*\*\*\*\*

INTERMEDIARIO

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE NIDIA EUGENIA ORTEGA BENAVIDES

CLAVE 4432

%PART 100.00

NOMBRE COMPAÑIA

%PART

VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)00000000007000436085067

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

M CASTILLO 0


CADB26780609FF7D5D

Gran Contribuyente RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6801. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

San Juan de Pasto, mayo 29 de 2019

Señor(a):

**JUEZ NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO**  
E.S.D.



Radicación:

No. 2019- 00013

Medio de Control:

Reparación Directa

Demandante:

LAURENTINO MARTOS NARVAEZ Y OTROS

Demandado:

MUNICIPIO DE TAMINANGO N Y OTROS

Actuación:

CONTESTACION DEMANDA

CARLOS ANDRES OJEDA LUNA, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Pasto (N), identificado con la cédula de ciudadanía No. 98.390.308 de Pasto, y con Tarjeta Profesional No. 105.477 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado judicial del Dr. RODRIGO JURADO MORENO, en su calidad de Representante Legal de La Alcaldía Municipal de Taminango N, mayor de edad y vecino del municipio de Taminango (N), identificado con Cédula de Ciudadanía Número 94.448.323 de Cali V, actuando en calidad de Alcalde, por medio del presente memorial y dentro de la oportunidad legal<sup>1</sup>, me permito dar respuesta a la demanda instaurada por el señor LAURENTINO MARTOS NARVAEZ Y OTROS, contestación que se hace en los siguientes términos:

### **DESIGNACION DE LA PARTE DEMANDADA**

Demandada: Lo es la Alcaldía Municipal de Taminango Nariño- y Otros, con domicilio en el Municipio de Taminango (N).

Representante legal de la Alcaldía Municipal de Taminango N: Doctor RODRIGO JURADO MORENO, mayor de edad y vecino del municipio de Taminango (N), identificado con Cédula de Ciudadanía Número 94.448.323 de Cali V.

Apoderado Judicial: CARLOS ANDRES OJEDA LUNA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 98.390.308 de Pasto N, y con Tarjeta Profesional No. 105.477 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, domiciliado en Pasto y para efectos de notificaciones, comunicaciones y demás, téngase la Alcaldía Municipal de Taminango N, correo electrónico [alcalde@taminango-narino.gov.co](mailto:alcalde@taminango-narino.gov.co)

### **RESPECTO A LAS PRETENSIONES**

Teniendo en cuenta los hechos narrados del escrito y que sirven de sustento a la presente demanda contencioso administrativa y en ejercicio del medio de control de Acción de Reparación Directa en los términos del Art. 138 Ley 1437 de 2011, alegando una presunta responsabilidad por parte de la ALCALDIA MUNICIPAL DE TAMINANGO N., teniendo en cuenta de que el soporte, probatorio, normativo y jurisprudencia, de la defensa que presento con el presente escrito se desvirtúan los hechos de la demanda, además y con base en las excepciones previas y de mérito que se formularan, nos oponemos desde ya a todas y cada una de la pretensiones expuestas en la demanda, como así se hace por carencia fáctica y jurídica de lo pedido.



La anterior posición de por sí, hace innecesario referirse de forma expresa a cada una de las pretensiones.

**PRETENSIÓN DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.**

- 1.- Se declaren probadas las excepciones formuladas en este escrito.
- 2.- Se Condene en costas y agencias en derecho a la accionante.

**RESPECTO A LOS HECHOS.**

La presente contestación de los hechos se realiza teniendo en cuenta desde luego los supuestos fácticos presentados en el escrito de la demanda.

**AL PRIMER HECHO:** No me consta, me atengo a lo demostrado dentro del proceso que nos ocupa

**AL SEGUNDO HECHO:** Es cierto, la Alcaldía Municipal de Taminango N, celebró contrato de obra pública con la empresa AMERICANA DE CONSTRUCCIONES E.S., el cual tenía por objeto ejecutar el proyecto denominado Ampliación, optimización del sistema de alcantarillado el Remolino, Taminango, Nariño, Occidente....., el cual en su cláusula decima primera habla de la responsabilidad de las partes, y a la letra dice **"Decima Primera – Responsabilidad: El contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula primera del presente contrato y además por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/ o consultores de sus subcontratistas al Municipio en la ejecución del objeto del presente contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la Ley."** y además al contratista se le obligó a constituir unas garantías que se encuentran estipuladas en la cláusula décimo sexta del contrato de Obra No. 005 – L.P.2014 de Obra Pública; De igual manera dentro de dicho contrato se encuentra estipulada la cláusula denominada **INDEMNIDAD: que a la letra dice: El contratista se obliga a indemnizar al Municipio con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El contratista se obliga a mantener indemne al Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato...."**

**AL TERCER HECHO:** Me atengo a lo que se encuentre consignado en el contrato de obra pública No. 005 – L.P.2014, en lo relacionado a la duración del contrato.

**AL CUARTO HECHO:** ES CIERTO,

**AL QUINTO HECHO:** Es parcialmente cierto, pero como lo he como se ha dicho el objeto contractual de este proyecto fue suscrito con la empresa AMERICANA DE CONSTRUCCIONES, quien era la directamente responsable de adelantar los trabajos y labores para llevar a feliz término el objeto contractual en el término acordado, pero aun así la Alcaldía Municipal ha ejercido vigilancia de la obra y para eso fue establecida una interventoría ejercida por el Ingeniero MAURICIO MELO MOSQUERA, pero frente a la actitud renuente del Sr. HERNAN MARTINEZ MELENDEZ de obstruir la vía pública, la Alcaldía Municipal adelantó el debido proceso de restitución de bien inmueble de uso público volviendo a dejar en funcionamiento la vía pública denominada Calle 2 entre carreras 5 y 6 corregimiento del Remolino Nariño, ejerciendo así el debido control y vigilancia sobre los bienes del Estado, pero no puede la Alcaldía Municipal intervenir en las obras que realicen o deje realizar la empresa AMERICANA DE CONSTRUCCIONES, firma que debía adelantar la obra sin ocasionar perjuicios

en el municipio o corregimiento donde adelantaba la obra, tal y como reza en el contrato de obra pública No. 005 – L.P.2014, donde los únicos llamados a responder por estos daños son el Sr. MARTINEZ MELENDEZ, en caso de llegar a demostrar su responsabilidad en razón de la obstrucción ilegal de la vía pública y la empresa AMERICANA DE CONSTRUCCIONES por no haber tenido el cuidado que se requiere en la ejecución de las obras, para no perjudicar a terceros, pues reitero así reza en el contrato suscrito con la Alcaldía Municipal.

**AL SEXTO HECHO:** No es cierto, por cuanto por cuanto la Alcaldía Municipal adelantó un proceso de restitución de bien inmueble el cual logró la recuperación de la vía pública la cual se encuentra en funcionamiento, ahora deberá demostrar el accionante que efectivamente la obra fue suspendida por esta razón, de otra parte nos es cierto que la Alcaldía no haya ejercido el debido control y vigilancia al proyecto que adelanta la constructora pues para ello nombró un interventor el cual era el Ingeniero MAURICIO MELO MOSQUERA, y estuvo atento de la obra, la cual llegó a feliz término, otra cosa es que presuntamente no se hayan realizado los trabajos de manera técnica, por parte de la empresa AMERICANA DE CONSTRUCCIONES, para lo cual existe una póliza que ampara cualquier daño, y unas cláusulas contractuales que mantienen indemne y libre de cualquier responsabilidad a la Alcaldía Municipal de Taminango Nariño, frente a los hechos materia de controversia.

**AL SEPTIMO HECHO:** No me consta, me atengo a lo probado dentro del presente asunto, mas sin embargo, reitero, la Alcaldía Municipal de Taminango Nariño, suscribió un contrato de obra con la empresa AMERICANA DE CONSTRUCCIONES, quien es la directamente responsable de cumplir con el objeto contractual, y de los perjuicios que cause con las obras que adelante manteniendo indemne de estas situaciones a la Alcaldía Municipal

**AL OCTAVO HECHO:** No me consta, es un hecho que deberá probar la parte demandante, mas sin embargo, reitero, la Alcaldía Municipal de Taminango Nariño, suscribió un contrato de obra con la empresa AMERICANA DE CONSTRUCCIONES, quien es la directamente responsable de cumplir con el objeto contractual, y de los perjuicios que cause con las obras que adelante., manteniendo indemne de estas situaciones a la Alcaldía Municipal

**AL NOVENO HECHO:** No me consta, es un hecho que deberá probar la parte demandante más sin embargo, reitero, la Alcaldía Municipal de Taminango Nariño, suscribió un contrato de obra con la empresa AMERICANA DE CONSTRUCCIONES, quien es la directamente responsable de cumplir con el objeto contractual, y de los perjuicios que cause con las obras que adelante., manteniendo indemne de estas situaciones a la Alcaldía Municipal

**AL DECIMO HECHO:** Es cierto.

**AL DECIMO PRIMER HECHO:** Es parcialmente cierto, ya que efectivamente la Alcaldía Municipal de Taminango N, recuperó la vía, cerró zanjas y recuperó la movilidad, pero no me consta la afectación en que se encuentre la vivienda del demandante, si es que se encuentra afectada, es un hecho que deberá ser probado, ya que al respecto debo manifestar que existe dentro del proceso contractual y de ejecución de obra la respectiva acta de recibo a satisfacción por parte de la comunidad, y es en este momento en que el ahora demandante ha debido presentar sus inconformidades y realizar su reclamo, pero guardo silencio al respecto, lo que indica que no se encontraba afectado de manera alguna.

**AL DECIMO SEGUNDO HECHO:** No me consta, es un hecho que deberá probarse, y demostrar si las razones que exponen los demandantes son la causa de los daños de la vivienda, o son otros totalmente ajenos a los hechos que esgrimen en su libelo demandatorio.



## FUNDAMENTOS DE HECHO

El objeto contractual de este proyecto fue suscrito con la empresa AMERICANA DE CONSTRUCCIONES, quien era la directamente responsable de adelantar los trabajos y labores para llevar a feliz término el objeto contractual en el término acordado, pero aun así la Alcaldía Municipal estableció dentro del contrato la figura del interventor para que ejerciera la vigilancia de la obra, pero frente a la actitud renuente del Sr. HERNAN MARTINEZ MELENDEZ de obstruir la vía pública, la Alcaldía Municipal adelantó el debido proceso de restitución de bien inmueble de uso público volviendo a dejar en funcionamiento la vía pública Calle 2 entre carreras 5 y 6 del corregimiento del Remolino Nariño, ejerciendo así el debido control y vigilancia sobre los bienes del Estado, pero no puede la Alcaldía Municipal intervenir en las obras que realicen o deje realizar la empresa AMERICANA DE CONSTRUCCIONES, firma que debía adelantar la obra sin ocasionar perjuicios en el municipio o corregimiento donde adelantaba la obra, tal y como reza en el contrato de obra pública No. 005 – L.P.2014, donde los únicos llamados a responder por estos daños son el Sr. MARTINEZ MELENDEZ, en caso de llegar a demostrar su responsabilidad en razón de la obstrucción ilegal de la vía pública y la empresa AMERICANA DE CONSTRUCCIONES por no haber tenido el cuidado que se requiere en la ejecución de las obras, para no perjudicar a terceros, pues reitero así reza en el contrato suscrito con la Alcaldía Municipal.

Así las cosas debo resaltar que la Alcaldía Municipal de Taminango N, celebró contrato de obra pública con la empresa AMERICANA DE CONSTRUCCIONES E.S., el cual tenía por objeto ejecutar el proyecto denominado Ampliación, optimización del sistema de alcantarillado el Remolino, Taminango, Nariño, Occidente”...., el cual en su cláusula decima primera habla de la responsabilidad de las partes, y a la letra dice **“Decima Primera – Responsabilidad: El contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula primera del presente contrato y además por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/ o consultores de sus subcontratistas al Municipio en la ejecución del objeto del presente contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la Ley.”** y además al contratista se le obligó a constituir unas garantías que se encuentran estipuladas en la cláusula décimo sexta del contrato de Obra No. 005 – L.P.2014 de Obra Pública; De igual manera dentro de dicho contrato se encuentra estipulada la cláusula denominada **INDEMNIDAD: que a la letra dice: El contratista se obliga a indemnizar al Municipio con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El contratista se obliga a mantener indemne al Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato....”**

Por otra parte, es necesario tener presente que la construcción es una actividad comercial y, particularmente, que las empresas dedicadas a “las obras o construcciones, reparaciones, montajes, instalaciones u ornamentaciones” se consideran mercantiles, para todos los efectos legales. En ese sentido, debe advertirse que en la actualidad se considera que los constructores son empresarios profesionales, lo que resulta crucial para efectos de determinar el sistema de responsabilidad civil que les es aplicable por los daños que ocasionen, toda vez que no se puede desconocer que ellos tienen una organización establecida para desarrollar su actividad empresarial, cuentan con una preparación y una habilitación particular para tales efectos, su conocimiento y su técnica son especializados, además de desconocidos, por regla general, para las personas que se relacionan con ellos, contexto éste que los coloca en una situación de preeminencia frente a los adquirentes de los bienes que comercializan. Lo anterior conduce a que el régimen de responsabilidad civil aplicable a los constructores sea más estricto que el que se predica del resto de



ciudadanos, cuyo parámetro de comparación aún continua siendo el del “buen padre de familia” y no el del buen profesional o el del empresario razonable, más aún cuando a estos últimos les son exigibles deberes específicos de comportamiento derivados de la buena fe, e, incluso, la propia Constitución Política, junto a los restantes empresarios, los hace responsables de los daños que se causen en la producción y comercialización de bienes y servicios (art. 78 de la C.P.).

Entonces como podrá ver el señor Juez, la responsabilidad dentro del asunto que nos ocupa radica exclusivamente sobre la empresa AMERICANA DE CONSTRUCCIONES, quien como lo he dicho suscribió contrato de obra pública con la Alcaldía Municipal, y dentro de las cláusulas contractuales se encuentran la de responsabilidad y la de indemnidad, que exoneran de cualquier responsabilidad a mi patrocinada; de otra parte el Señor HERNAN MARTINEZ MELENDEZ, con su proceder arbitrario al cerrar abusivamente la calle aledaña a la vivienda que alega daños el demandante produjo humedad, pues durante el tiempo en que procedió a su cierre, dejó acumular basuras y males que produjeron humedad, tiempo que duró el proceso que tuvo que adelantar la Alcaldía Municipal hasta lograr recuperar el inmueble y habilitar nuevamente la vía pública.

### **EXCEPCIONES**

#### **1.- FALTA DE CAUSA PARA DEMANDAR A LA ENTIDAD QUE REPRESENTO:**

No existe fundamento legal para exigir las pretensiones consagradas en la demanda en contra de mi representada, ya que reitero, la Alcaldía Municipal de Taminango N celebró contrato de obra pública con la empresa AMERICANA DE CONSTRUCCIONES E.S., el cual tenía por objeto ejecutar el proyecto denominado Ampliación, optimización del sistema de alcantarillado el Remolino, Taminango, Nariño, Occidente”...., el cual en su cláusula decima primera habla de la responsabilidad de las partes, y a la letra dice **“Decima Primera – Responsabilidad: El contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula primera del presente contrato y además por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/ o consultores de sus subcontratistas al Municipio en la ejecución del objeto del presente contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la Ley.”** y además al contratista se le obligó a constituir unas garantías que se encuentran estipuladas en la cláusula décimo sexta del contrato de Obra No. 005 – L.P.2014 de Obra Pública; De igual manera dentro de dicho contrato se encuentra estipulada la cláusula denominada **INDEMNIDAD: que a la letra dice: El contratista se obliga a indemnizar al Municipio con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El contratista se obliga a mantener indemne al Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato....”**, como lo cual queda exonerada de todo tipo de responsabilidades frente a las pretensiones elevadas dentro de la demanda que nos ocupa.

De otra parte, debo manifestar que existe dentro del proceso contractual y de ejecución de obra la respectiva acta de recibo a satisfacción por parte de la comunidad, y es en este momento en que el ahora demandante ha debido presentar sus inconformidades y realizar su reclamo, pero guardo silencio al respecto, lo que indica que no se encontraba afectado de manera alguna.

#### **2.- FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA.**

Es procedente la presente excepción, por cuanto la Alcaldía Municipal de Taminango N, no está obligada a cancelar ningún tipo de perjuicios materiales, o

perjuicios de los que se consagran en las pretensiones de la presente demanda , ni ninguna otra que se le parezca, mismas que no se han causado, debido a que con el material probatorio, y las explicaciones rendidas en la contestación de la demanda, claramente se demuestra, que mi representado no es responsable de los hechos ocurridos a raíz de la suscripción del contrato suscrito entre esta y la empresa AMERICANA DE CONSTRUCCIONES E.S., el cual tenía por objeto ejecutar el proyecto denominado Ampliación, optimización del sistema de alcantarillado el Remolino, Taminango, Nariño, Occidente”...., el cual en su cláusula decima primera habla de la responsabilidad de las partes, y a la letra dice **“Decima Primera – Responsabilidad: El contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula primera del presente contrato y además por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/ o consultores de sus subcontratistas al Municipio en la ejecución del objeto del presente contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la Ley.”** y además al contratista se le obligó a constituir unas garantías que se encuentran estipuladas en la cláusula décimo sexta del contrato de Obra No. 005 – L.P.2014 de Obra Pública; De igual manera dentro de dicho contrato se encuentra estipulada la cláusula denominada **INDEMNIDAD: que a la letra dice: El contratista se obliga a indemnizar al Municipio con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El contratista se obliga a mantener indemne al Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato....”**

De otra parte, debo manifestar que existe dentro del proceso contractual y de ejecución de obra la respectiva acta de recibo a satisfacción por parte de la comunidad, y es en este momento en que el ahora demandante ha debido presentar sus inconformidades y realizar su reclamo, pero guardo silencio al respecto, lo que indica que no se encontraba afectado de manera alguna.

## 2.- INEXISTENCIA DEL NEXO CAUSAL

Nexo de causalidad.- Es sabido que para que exista la responsabilidad se requiere de tres elementos absolutamente indispensables y necesarios: el daño, el hecho generador del mismo y un nexo de causalidad que permita imputar el daño a la conducta (acción u omisión) del agente generador. El nexo causal se entiende como la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado. La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona natural o jurídica y declararla responsable como consecuencia de su acción u omisión, es indispensable definir si aquél aparece ligado a ésta por una relación de causa-efecto. Si no es posible encontrar esa relación mencionada, no tendrá sentido alguno continuar el juicio de responsabilidad.

La jurisprudencia ha sido clara al establecer que el nexo de causalidad debe ser probado en todos los casos por el actor, independientemente de si el régimen de responsabilidad aplicable está fundamentado en la culpa, en la falla, o en alguno de los regímenes de responsabilidad objetiva. El nexo de causalidad es un elemento autónomo del daño y del fundamento que no admite, ningún tipo de presunción como sí lo admite la culpa o la falla.

Así las cosas no se observa dentro de la demanda que se encuentre probado el nexo causal, toda vez que no existe prueba contundente de la responsabilidad o el accionar del Municipio en los hechos de la demanda, por cuanto como ya lo he dicho mi representada suscribió un contrato de obra civil, el cual mantiene indemne al municipio por la violación o el



incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. Y de igual manera El contratista se obliga a mantener indemne al Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato....” Razón por la cual no es el Municipio el llamado a responder por las pretensiones elevadas en la demanda objeto de contestación, de llegarse a comprobar los hechos.

De otra parte, debo manifestar que existe dentro del proceso contractual y de ejecución de obra la respectiva acta de recibo a satisfacción por parte de la comunidad, y es en este momento en que el ahora demandante ha debido presentar sus inconformidades y realizar su reclamo, pero guardo silencio al respecto, lo que indica que no se encontraba afectado de manera alguna.

### **AUSENCIA DE PRUEBAS QUE RESPONSABILICEN A LA ENTIDAD QUE REPRESENTO DE SER RESPONSABLE DE LOS PRESUNTOS DAÑOS CAUSADOS**

Es necesario manifestar dentro del presente asunto la importancia de la prueba, que es el único medio de comprobación de los hechos puestos en conocimiento de este despacho.

Para esto se debe resaltar que son objeto de la prueba las realidades susceptibles de ser probadas, sin relación con ningún proceso en particular; se trata de una noción objetiva y abstracta. Desde este punto de vista, y siguiendo las enseñanzas del profesor Hernando Devis Echandía, son hechos objeto de prueba:

- a) Todo lo que puede representar una conducta humana, los sucesos, acontecimientos, hechos o actos humanos, voluntarios o involuntarios, individuales o colectivos, que sean perceptibles, inclusive las simples palabras pronunciadas, sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, y el juicio o calificación que de ellos se tenga.
- b) Los hechos de la naturaleza en que no interviene actividad humana
- c) Las cosas o los objetos materiales y cualquier aspecto de la realidad material sean o no producto del hombre, incluyendo los documentos.
- d) La persona física humana, su existencia y características, estado de salud, etc.
- e) Los estados y hechos síquicos o internos del hombre, incluyendo el conocimiento de algo, cierta intención o voluntad y el consentimiento tácito o la conformidad, siempre que no impliquen una conducta apreciable en razón de hechos externos porque entonces correspondería al primer grupo.

Igualmente por hechos hay que entender algo que ha sucedido o que está sucediendo, lo que ocurrió en el pasado o en el presente.

**Objeto de la prueba:** Efectivamente, los hechos pueden ser afirmados o negados, pero de todas maneras lo que se prueba son los hechos y no las afirmaciones, ya que estas son simplemente manifestaciones

Ya para el caso que nos ocupa, existe ausencia de prueba que demuestre que el Municipio es responsable de los hechos acaecidos, por cuanto no fue quien directamente adelantó la obra en cuestión, sino que lo hizo a través de un tercero como lo es la firma AMERICANA DE CONSTRUCCIONES, a través de contrato de obra civil que mantiene indemne y legos de cualquier responsabilidad a la Alcaldía Municipal de Taminango N.



## **RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA:**

Por otra parte, es necesario tener presente que la construcción es una actividad comercial y, particularmente, que las empresas dedicadas a "las obras o construcciones, reparaciones, montajes, instalaciones u ornamentaciones" se consideran mercantiles, para todos los efectos legales. En ese sentido, debe advertirse que en la actualidad se considera que los constructores son empresarios profesionales, lo que resulta crucial para efectos de determinar el sistema de responsabilidad civil que les es aplicable por los daños que ocasionen, toda vez que no se puede desconocer que ellos tienen una organización establecida para desarrollar su actividad empresarial, cuentan con una preparación y una habilitación particular para tales efectos, su conocimiento y su técnica son especializados, además de desconocidos, por regla general, para las personas que se relacionan con ellos, contexto éste que los coloca en una situación de preeminencia frente a los adquirentes de los bienes que comercializan. Lo anterior conduce a que el régimen de responsabilidad civil aplicable a los constructores sea más estricto que el que se predica del resto de ciudadanos, cuyo parámetro de comparación aún continúa siendo el del "buen padre de familia" y no el del buen profesional o el del empresario razonable, más aún cuando a estos últimos les son exigibles deberes específicos de comportamiento derivados de la buena fe, e, incluso, la propia Constitución Política, junto a los restantes empresarios, los hace responsables de los daños que se causen en la producción y comercialización de bienes y servicios (art. 78 de la C.P.).

Entonces como podrá ver el señor Juez, la responsabilidad dentro del asunto que nos ocupa radica exclusivamente sobre la empresa AMERICANA DE CONSTRUCCIONES, quien como lo he dicho suscribió contrato de obra pública con la Alcaldía Municipal, y dentro de las cláusulas contractuales se encuentran la de responsabilidad y la de indemnidad, que exoneran de cualquier responsabilidad a mi patrocinada; de otra parte el Señor HERNAN MARTINEZ MELENDEZ, con su proceder arbitrario al cerrar abusivamente la calle aledaña a la vivienda que alega daños el demandante produjo humedad, pues durante el tiempo en que procedió a su cierre, dejó acumular basuras y males que produjeron humedad, tiempo que duró el proceso que tuvo que adelantar la Alcaldía Municipal hasta lograr recuperar el inmueble y habilitar nuevamente la vía pública.

### **2.3. INNOMINADA O GENERICA (RECONOCIMIENTO OFICIOSO DE EXCEPCIONES)**

Interpongo cualquier excepción que aparezca probada en el proceso que contrarreste o quiebre las pretensiones de la demanda de conformidad con el inciso 2 del Art. 187 del C.P.A.C.A.<sup>2</sup>

### **PRUEBAS**

Solicito se decreten y se practiquen las siguientes y se le otorgue el valor probatorio que corresponda.

#### **1.- DOCUMENTAL APORTADA:**

Contrato de obra pública No. 005 – L.P.2014, cuyo objeto es ejecutar el proyecto denominado Ampliación, optimización del sistema de alcantarillado el Remolino, Taminango, Nariño, Occidente"...., de donde podrá observar la existencia de las cláusulas de indemnidad y responsabilidad a que he hecho referencia dentro de la presente contestación de demanda

**Objeto de las Pruebas**

Demostrar que el Municipio de Taminango Nariño, no es responsable de los hechos y pretensiones de la presente demanda, en razón de que suscribió contrato de obra pública que lo mantiene indemne y que responsabiliza al contratista por estos supuestos hechos.

Copia del acta de recibo a satisfacción de la comunidad.

**Objeto de la prueba:**

Demostrar que la obra fue entregada a satisfacción a la comunidad y que el ahora demandante no presentó sus inconformidades ni realizó reclamo alguno, guardando silencio al respecto, lo que indica que no se encontraba afectado de manera alguna.

**ANEXOS**

Me permito anexar.

- El poder conferido por el Alcalde Municipal de Taminango N y Representante legal de la Alcaldía Municipal de Taminango N. para actuar dentro del presente proceso.
- 
- Decreto de Nombramiento y Posesión del Sr. Alcalde Municipal de Taminango N y Representante legal de la Alcaldía Municipal de Taminango N.
- 
- Los enunciados en el acápite de pruebas como documentales aportadas.

**NOTIFICACIONES**

El demandado las recibirá en: la Calle 5ª No. 4 – 16, Barrio el Poder del Municipio de Taminango N. correo electrónico: [alcaldia@taminango-narino.gov.co](mailto:alcaldia@taminango-narino.gov.co)

El suscrito las recibirá en: la Calle 5ª No. 4 – 16, Barrio el Poder del Municipio de Taminango N. correo electrónico: [alcaldia@taminango-narino.gov.co](mailto:alcaldia@taminango-narino.gov.co)



Atentamente,



**CARLOS ANDRES OJEDA LUNA**

C.C. No. 98.390.308 de Pasto

T.P. No. 105.477 del C.S de la J.



DA-300-031-19

Taminango, 22 de Febrero de 2019.

Señor:

**JUEZ NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO**

Pasto - Nariño

E.S.D.

**REF. MEMORIAL PODER**

PROCESO: 2019 – 00013 – 00  
DEMANDANTE: LAURENTINO MARTOS NARVAEZ Y OTROS  
DEMANDADOS: MUNICIPIO DE TAMINANGO – AMERICANA DE  
CONSTRUCCIONES Y HERNAN MARTINEZ  
MELENDEZ

Cordial saludo:

**RODRIGO JURADO MORENO**, identificado con la C.C. No. la C.C. No. 94.448.323 de Cali V, en mi calidad de Alcalde Municipal de Taminango N, por medio del presente escrito, manifiesto a usted que otorgo poder especial, amplio y suficiente al Dr. **CARLOS ANDRES OJEDA LUNA**, identificado con la C.C. No. 98.390.308 de Pasto y T.P. No. 105.477 del C.S de la J, para que, ejerza la defensa del Municipio frente al asunto que nos ocupa en la referencia, a partir del momento procesal en que se encuentre.

Mi apoderado queda facultado para contestar la demanda, comparecer participar e intervenir en las audiencias programadas, hacer parte de las etapas procesales, presentar alegatos, recursos, y en fin hacer uso de todas las oportunidades procesales brindadas encaminadas a la defensa de los derechos del Municipio de Taminango N, en los términos estipulados en el presente mandato.

Atentamente,

  
**RODRIGO JURADO MORENO**  
C.C. No. 94.448.323 de Cali V  
Alcalde Municipal  
Taminango N

Acepto,

  
**CARLOS ANDRES OJEDA LUNA**  
C.C. No. 98.390.308  
T.P. No. 105.477 del C.S de la J





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE PASTO  
AUTENTICACION DE FIRMA REGISTRADA

La suscrita Notaria Primera del Círculo de Pasto  
CERTIFICA

Que previa confrontación con la firma otorgada  
registrada en esta notaría, doy fé, que la firma  
impuesta en el presente documento corresponde al

Señor: (a) Roberto Luna

Identificado con C.C. No. 9448323 de Col

Fecha: 15 JUL 2019

MABEL MARTÍNEZ VARGAS





REPUBLICA DE COLOMBIA  
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE TAMINANGO NARIÑO

ACTA DE POSESION No. 01 de 2016

En la población de Taminango, capital del Municipio y Circulo Notarial del mismo nombre, Departamento de Nariño, República de Colombia, a primero (01) de enero de dos mil dieciséis (2016), siendo las ocho y treinta de la mañana (8:30 A.M.), ante mí WILMA DANAY IDROBO MARTINEZ, Notaria Única del Circulo, compareció el doctor RODRIGO JURADO MORENO, mayor de edad, vecino Taminango Nariño, quien se identificó con cédula de ciudadanía No. 94.448.323 expedida en Cali, con el objeto de tomar posesión del cargo de ALCALDE MUNICIPAL DE TAMINANGO NARIÑO, elegido para el periodo constitucional 2016 a 2019. Para tal efecto presentó los siguientes documentos:.....

1. Hoja de vida en formato del Departamento Administrativo de la Función Pública.....
2. Cédula de ciudadanía No. 94.448.323 expedida en Cali.....
3. Credencial expedida por la Comisión Escrutadora Municipal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por la cual se declara que RODRIGO JURADO MORENO, con C.C. No. 94.448.323 ha sido elegido ALCALDE por el Municipio de TAMINANGO (NARIÑO) para el periodo de 2016 al 2019.....
4. Libreta Militar No. 94448323 y mención de Honor expedidos por el Batallón de Infantería No. 9 "Batalla de Boyacá".....
5. Consulta en línea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales, de fecha 17 de diciembre de 2015, por medio del cual la Policía Nacional de Colombia informa que el ciudadano con cédula de ciudadanía No. 94.448.323 y nombre JURADO MORENO RODRIGO, NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES. ....
6. Certificado de antecedentes fiscales, de fecha 17 de diciembre de 2015, expedido por la Contraloría General de la República, por medio del cual el CONTRALOR DELEGADO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURIDISCCION COACTIVA certifica que el número de identificación 94.448.323, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL Código de verificación 1048900352015.....
7. Certificado especial de antecedentes disciplinarios No. 78219801, de fecha 23 de diciembre de 2015, expedido por la Procuraduría General de la Nación, según el cual el señor RODRIGO JURADO MORENO identificado con cédula de ciudadanía No. 94448323 NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES, NO PRESENTA INHABILIDADES ESPECIALES APLICADAS AL CARGO DE ALCALDE.....
8. Certificado general de antecedentes disciplinarios No. 78355644, de fecha 31 de diciembre de 2015, expedido por la Procuraduría General de la Nación, según el cual el señor RODRIGO JURADO MORENO identificado con cédula de ciudadanía No. 94448323 NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES.....
9. Paz y salvo municipal expedido el día 30 de diciembre de 2015.....
10. Certificado médico de aptitud, expedido el día 27 de diciembre de 2015.....
11. Certificado expedido por la Escuela Superior de la Administración Pública- ESAP, sobre su participación en el Seminario de Inducción para Alcaldes y Gobernadores electos periodo 2016-2019.....



REPUBLICA DE COLOMBIA  
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE TAMINANGO NARIÑO

- 12. Declaración extraproceso sobre ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para ejercer el cargo de Alcalde Municipal de Taminango Nariño, para el respectivo periodo constitucional y sobre no cursar en su contra demanda alguna por alimentos.....
- 13. Constancia expedida por la Comisaría Municipal de Taminango Nariño, de no reposar proceso alguno en ese despacho en contra del señor RODRIGO JURADO MORENO.....
- 14. Declaración extraproceso sobre sus bienes y rentas y actividad económica privada, y los de su compañera permanente y sus hijos no emancipados y declaraciones en formato del Departamento Administrativo de la Función Pública.....
- 15. Certificado expedido por el señor Personero Municipal de Taminango Nariño, sobre ausencia de sanciones, antecedentes disciplinarios o procesos disciplinarios en su contra.....
- 16. Certificado sobre su vinculación al Sistema de Seguridad Social en Salud en la NUEVA E.P.S. y manifestación bajo juramento de afiliarse a la E.P.S. con motivo de su posesión y hacer llegar la documentación para que haga parte de esta acta, lo anterior para efectos de cumplir con la movilidad que establece el Decreto 3047 de 2013.....
- 17. Otros documentos: Copia del RUT, Diploma de bachiller académico, Curso de Administración Política- CAP y Diplomado en Actualización en Administración Pública cursado ante la ESAP.....

Verificado el cumplimiento de los anteriores requisitos con los documentos que hacen parte de la presente acta, el doctor RODRIGO JURADO MORENO, procede a tomar posesión del cargo de ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO NARIÑO para el periodo constitucional 2016 a 2019, en los términos del artículo 94 de la ley 136 de 1994, para cuyo efecto textual, pública y perceptiblemente rindió el siguiente juramento: "JURO A DIOS Y PROMETO AL PUEBLO CUMPLIR FIELMENTE LA CONSTITUCION, LAS LEYES DE COLOMBIA, LAS ORDENANZAS Y LOS ACUERDOS" ante lo cual la suscrita Notaria manifiesta "SI ASÍ LO HICIERE DIOS Y EL PUEBLO OS PREMIEN, DE LO CONTRARIO DIOS Y EL PUEBLO OS LO DEMANDEN". No siendo otro el objeto de la presente diligencia se la termina una vez leída al posesionado, quien la aprueba en todas y cada una de sus partes y en constancia firma ante la suscrita Notaria que da e imprime la autorización de ley.

El posesionado:

  
RODRIGO JURADO MORENO

HUELLA DEDO INDICE DERECHO

  
WILMA DANEY IDROBO MARTÍNEZ  
Notaria Unica del Circulo





REGISTRADURÍA  
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
ORGANIZACIÓN ELECTORAL  
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

E-27

LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA MUNICIPAL

**DECLARAMOS**

Que, **RODRIGO JURADO MORENO** con C.C. No. **94.448.323**

Ha sido elegido **ALCALDE** por el Municipio de **TAMINANGO**, (NARIÑO),

para el período de 20016 al 2019

Por el **Partido Conservador Colombiano**


En consecuencia, se expide la presente **CREDENCIAL**, en **TAMINANGO**, (NARIÑO)

A los veintisiete (27) días del mes octubre de 2015.

  
**DANNY ALFONSO RIASCOS BASANTE**

Comisión Escrutadora Municipal

  
**DIEGO MARÍA OJEDA DAZA**

  
**JOSE IGNACIO VELASCO CERON**  
Secretaría Comisión Escrutadora Municipal

Registrada al folio (1) del libro de credenciales

la  
**democracia**  
es nuestra  
*huella*



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA  
94.448.323

NUMERO

JURADO MORENO

APELLIDOS

RODRIGO

NOMBRES



*[Handwritten signature]*  
FIRMA




INDICE DERACHC

FECHA DE NACIMIENTO 11-ABR-1975  
TAMINANGO  
(NARIÑO)  
LUGAR DE NACIMIENTO  
1.70 O+  
ESTATURA G.S. RH  
29-OCT-1993 CALI  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

M  
SEXO

*[Handwritten signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO YACHA



4-23 3300-43158553-M-0094442323-20070515

0225507134A 02 212654890



ALCALDIA MUNICIPAL TAMINANGO  
NIT 800.024.977-6

HACE CONSTAR

Que este documento es auténtico conforme a su  
Original, previo cotejo de rigor

Fecha 12 de julio de 2019.

Firma:

Folios del 1 a 9.



Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE NARIÑO  
MUNICIPIO DE TAMINANGO  
DESPACHO ALCALDE MUNICIPAL.  
NIT.800.024.977-6

### CONTRATO No. 005-L.P.2014 DE OBRA PÚBLICA

Para la ejecución del proyecto "AMPLIACION OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL REMOLINO, TAMINANGO, NARIÑO, OCCIDENTE", se ha celebrado el presente contrato entre EL MUNICIPIO DE TAMINANGO (N) y AMERICANA DE CONSTRUCCIONES E.U.

Entre los suscritos: MILLER LEONARDO URBANO OJEDA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 89.001.872, expedida en Armenia, en su calidad de Alcalde Municipal, nombrado Mediante acuerdo con la credencial expedida por El Consejo Nacional Electoral el día dos (2) de noviembre del 2011, cargo para el cual tomó posesión el día primero (1) de enero de 2012 según consta en El Acta de Posesión de fecha primero (1) de enero de 2012, en uso de las facultades y funciones contenidas para celebrar El Presente Contrato por El Acuerdo No. 028 de 23 de Diciembre de 2014, y en ejercicio de la competencia otorgada por El Artículo 11 literal B de La Ley 80 de 1993, actuando en Nombre y Representación del Municipio de Taminango (N), quien para los efectos del presente contrato se denomina El Municipio y Americana de Construcciones E.U., identificado con NIT No. 814000302-2, representado legalmente por el señor ORLANDO GERARDO BENAVIDES identificado con cedula de ciudadanía N° 12998270 de Pasto (N) y quien para los efectos de este documento se llamará El Contratista, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra pública, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

I. Que la misión del Municipio de Taminango según lo dispuesto en La Ley 136 de 1994 es, entre otras, propender por el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio, además, ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal; solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y La Nación, en los términos que defina La Ley. En este entendido, el contrato a celebrarse se relaciona con esta misión porque la realización de las obras objeto del presente contrato promueven el avance del Municipio y para iniciar la ejecución de la rehabilitación red de alcantarillado centro poblado puerto Remolino, del cual se beneficiarán los habitantes, productores agrícolas, turistas y el comercio en general existente, contribuyendo con el desarrollo social y económico de la región. II. Que la necesidad a satisfacer por parte de La Entidad Estatal Contratante es la "Ampliación, optimización del sistema de alcantarillado el Remolino, Municipio de Taminango - Departamento de Nariño,". III. Que El Municipio de Taminango desarrolló los respectivos estudios y documentos previos. IV. Que la oferta del Proponente AMERICANA DE CONSTRUCCIONES E.U., resultó como la ganadora del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en El Pliego de Condiciones de La Licitación Pública No. 005-L.P.2014. V. Que el presente Contratista se seleccionó por medio de proceso licitatorio identificado como No. 005-L.P.2014. VI. Que la actividad a contratar se encuentra incluida en El Plan Anual de Adquisiciones, Contrato No. 005-L.P.2014 DE OBRA PUBLICA para la ejecución del proyecto "Ampliación, optimización del sistema de alcantarillado el Remolino, Municipio de Taminango - Departamento de Nariño", adjudicado mediante Resolución No. 054 del 27 de enero de 2015. Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes CLÁUSULAS: PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del Contrato es "CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR AMPLIACION,





## REPUBLICA DE COLOMBIA

### MUNICIPIO DE TAMINANGO DESPACHO ALCALDE MUNICIPAL NIT. 800.024.977-6

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL REMOLINO, MUNICIPIO DE TAMINANGO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO - CODIGO BPIM 20130527860086", que incluye la ampliación y optimización del sistema de alcantarillado el Remolino. La Obra Pública a desarrollar tiene como especificaciones técnicas de construcción, presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y actividades, contenidas en los anexos técnicos del proceso contractual y la oferta seleccionada. Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.

**SEGUNDA.- DEFINICIONES:** Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en El Decreto 1510 de 2013 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

#### Definiciones:

**Acta de Inicio:** Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecución de la Obra Pública objeto del presente Contrato.

**Acta de Recibo Final:** Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra.

**Acta de Obra:** Es el documento en el que El Contratista y El Interventor identifican y cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada.

**Anexo Técnico:** Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las especificaciones técnicas de construcción y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante.

**Anticipo:** Entrega de dinero por parte del Contratante al Contratista para que inicie la ejecución del contrato. No constituye utilidad o ganancia para El Contratista y debe administrarse de acuerdo con La Ley.

**Contratante:** Municipio de Taminango.

**Contratista:** Americana de Construcciones E.U, identificado Con NIT No. 814000302-2

**Contrato:** Es el presente acuerdo de voluntades.

**Cronograma Estimado de Obra:** Es El Cronograma presentado por El Contratista para ejecutar el presente.

**TERCERA.- ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO:** El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en el Anexo Técnico del pliego de condiciones y la Propuesta Económica presentada por el contratista, de acuerdo al siguiente detalle:  
Ver anexo técnico al final.

**CUARTA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** El valor del Contrato es SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS. (\$ 743.525.416 MDA/CTE), de acuerdo a la propuesta económica presentada por El Contratista y que se incorpora al presente documento, el cual se pagará teniendo en cuenta que el precio se pactó mediante precios unitarios, así:

Clase de pago	Fecha probable de pago	Condiciones para el pago
---------------	------------------------	--------------------------



REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE TAMINANGO  
DESPACHO ALCALDE MUNICIPAL  
NIT. 800.024.977-6

PAGOS PARCIALES (Hasta el 90%)	Conforme al avance en la ejecución de las obras	<ul style="list-style-type: none"><li>- Informe de ejecución debidamente soportado con material fotográfico, previa aprobación Interventoria y Supervisoría.</li><li>- Comprobante de pagos de aportes a seguridad social integral y parafiscales.</li></ul>
PAGO FINAL (10%)	Terminación de las obras	<ul style="list-style-type: none"><li>- Informe final de ejecución debidamente soportado con material fotográfico, previa aprobación Interventoria y Supervisoría.</li><li>- Comprobante de pagos de aportes a seguridad social integral y parafiscales.</li></ul>

**QUINTA.- DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:** El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los documentos del proceso. 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibió del Municipio respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4 Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el anexo respectivo. 5.5 El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 5.7 El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el cronograma de obra. 5.8 El Contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

**SEXTA.- PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA:** El plazo del Contrato es seis (06) meses. El plazo se computará a partir de la suscripción del acta de inicio de obra, previo cumplimiento de los requisitos para la ejecución y legalización del contrato del contrato, es decir, efectuado el pago de los impuestos establecidos por la entidad, aprobada la garantía única por parte del Municipio y la emisión del Registro Presupuestal. El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del Contratista y del Contratante, previamente aprobado por el contratista.

**SÉPTIMA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:** 7.1 Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 7.2 Entregar el cronograma estimado de obra. 7.3 Colaborar con El Municipio de Taminango en cualquier requerimiento que el haga. 7.4 Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con El Anexo Técnico, El Pliego de Condiciones y La Oferta



Libertad y Orden

## REPUBLICA DE COLOMBIA

### MUNICIPIO DE TAMINANGO DESPACHO ALCALDE MUNICIPAL.

NIT. 800.024.977-8

presentada al Municipio. 7.5 Dar a conocer al Municipio cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 7.6 Comunicarle al Municipio cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 7.7 Elaborar, suscribir y presentar al Municipio las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por El Interventor y/o Supervisor del Contrato, según corresponda.

**OCTAVA.- DERECHOS DEL CONTRATISTA:** 8.1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en La Cláusula Cuarta del presente Contrato.

**NOVENA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** 9.1 Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2 Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato.

**DÉCIMA.- DERECHOS DEL CONTRATANTE:** 10.1 Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite. 10.2 Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato. 10.3 Hacer uso de La Cláusula de imposición de multas, La Cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a La Entidad Contratante de manera legal o contractual.

**DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD:** El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en La Cláusula Primera del presente Contrato y además por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al Municipio en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

**DÉCIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO:** El Municipio puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente El Contrato, de acuerdo con los Artículos 15 a 17 de La Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que El Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.

**DÉCIMA TERCERA.- MULTAS:** En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, El Municipio puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: La Entidad cobrará multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil del valor total de este Contrato, por cada día hábil de retardo o incumplimiento, si a juicio de La Entidad de ello se derivan perjuicios para la administración, sin que el monto total de la multa exceda el 10% diez por ciento del valor total de este Contrato, cantidad que se imputará a la de los perjuicios que reciba La Entidad por el incumplimiento.

**DÉCIMA CUARTA.- CLÁUSULA PENAL:** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, El Contratista debe pagar al Municipio a título de indemnización, una suma equivalente al 10% diez por ciento del valor del Contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no





REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE TAMINANGO  
DESPACHO ALCALDE MUNICIPAL  
NIT. 800.024.977-6

impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que El Municipio adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil.

**DÉCIMA QUINTA.- CADUCIDAD:** La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legalmente establecidos, puede ser declarada por El Municipio cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1 Paralización de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a diez (10) días por causas imputables al Contratista. 15.2 Paralización del personal de obra por un tiempo igual o superior a diez (10) días.

**DÉCIMA SEXTA.- GARANTIAS:** El Contratista debe presentar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantía de cumplimiento a favor del Municipio de la siguiente manera: 1. **Cumplimiento:** Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales a su cargo, incluidas el pago de multas y la cláusula penal pecuniaria, indemnizaciones a que hubiere lugar, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a la del plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 2. **Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:** Para garantizar que El Contratista cumpla con las obligaciones laborales derivadas del empleo de terceras personas, en cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con vigencia equivalente al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. 3. **Estabilidad y calidad de la Obra:** Cubrirá al Municipio de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de daño o deterioro, independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada, imputable al Contratista, en cuantía equivalente al diez por diez (10%) del valor total del contrato por un término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de aprobación del Acta de Recibo Final a Satisfacción. 4. **Responsabilidad Civil Extracontractual:** Para garantizar la responsabilidad civil frente a terceros, derivada de la ejecución del contrato, en cuantía equivalente a doscientos 200 S.M.L.M.V y con una vigencia igual a la del plazo del contrato. Esta póliza deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos, en virtud de lo establecido en el artículo 110 y S.S. del Decreto 1510 de 2013: • Amparo Básico Predios y Operaciones. • Responsabilidad Civil Patronal. • Contratistas y Subcontratistas. • Responsabilidad Civil Cruzada. • Gasto Médicos Inmediatos. • Daños a cables, tuberías e instalaciones subterráneas. Modalidad e intervinientes: La Modalidad de ocurrencia. Los Asegurados: Municipio de Taminango y Contratista. Los Beneficiarios: Tanto El Municipio de Taminango como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad extracontractual del Contratista o sus subcontratistas. Los mecanismos de participación de la pérdida por parte de La Entidad aseguradora: Deducible con tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida. Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por La Entidad aseguradora no serán admisibles. El Contratista deberá hacer entrega de estas garantías a La Entidad dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del contrato, las cuales serán aprobadas por la misma, de acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y El Decreto 1510 de 2013. **PARÁGRAFO:** Suficiencia de las garantías. El Contratista debe mantener durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución del contrato y/o su valor se amplie o aumente, respectivamente, El Contratista deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago. De igual modo, El Contratista deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el



Libertad y Orden

## REPUBLICA DE COLOMBIA

### MUNICIPIO DE TAMINANGO DESPACHO ALCALDE MUNICIPAL NIT. 800.024.977-6

caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o de recibo del informe final, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo de El Contratista.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA:** El Contratista es una entidad independiente del Municipio y en consecuencia, El Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Municipio, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

**DÉCIMA OCTAVA.- CESIONES:** El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del Municipio. Si El Contratista es objeto de fusión, decisión o cambio de control, El Municipio está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, El Contratista se obliga a informar oportunamente al Municipio de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, El Municipio exigirá al Contratista una garantía adicional a la prevista en La Cláusula Décima Sexta del presente Contrato. Si El Contratista no entrega esta garantía adicional, La Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control.

**DÉCIMA NOVENA.- SUBCONTRATACIÓN:** El Contratista puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, El Contratista debe comunicar de estas contrataciones a la Contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. El Contratista debe mantener indemne a La Entidad Contratante de acuerdo con La Cláusula Vigésima.

**VIGÉSIMA.- INDEMNIDAD:** El Contratista se obliga a indemnizar al Municipio con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendrá indemne a la Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que El Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

**VIGÉSIMA PRIMERA.- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR:** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.



Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE TAMINANGO  
DESPACHO ALCALDE MUNICIPAL.

NIT. 800.024.977-6

**VIGÉSIMA SEGUNDA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Las controversias o diferencias que surjan entre El Contratista y La Entidad Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado una o varias de las siguientes opciones: Amigable composición: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante la Asociación de Ingenieros territorial, previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional. Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composición debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de esta jurisdicción, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga el Centro de Conciliación, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, amigable composición, en la conciliación presta[n] mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

**VIGÉSIMA TERCERA.- NOTIFICACIONES:** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

MUNICIPIO	CONTRATISTA
Nombre: <b>MILLER LEONARDO URBANO OJEDA</b> Cargo: <b>Alcalde Municipal</b> Dirección: <b>Calle 3 No. 4 – 60 Barrio Oficial</b> <b>Cabecera Municipal de Taminango</b> Correo Electrónico: <b>contactenos@Taminango-narino.gov.co</b>	Nombre: <b>AMERICANA DE CONSTRUCCIONES E.U.</b> Dirección: <b>Calle 17 N° 34 A 40 B/ Paraná</b> Teléfono: <b>321 746 3842</b> Correo Electrónico: <b>avasgetial@hotmail.com</b>

**VIGÉSIMA CUARTA.- SUPERVISIÓN:** El Municipio de Taminango ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través del Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Comunitario.



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE NARIÑO  
MUNICIPIO DE TAMINANGO  
DESPACHO ALCALDE MUNICIPAL.  
NIT 800.024.977-6

**VIGÉSIMA QUINTA.- INTERVENTORIA:** La interventoría del presente Contrato está a cargo del proponente seleccionado en el proceso de selección de contratistas a través de proceso contractual adelantado por la Gobernación de Nariño - Plan Departamental de Aguas PDA.

**VIGÉSIMA SEXTA.- ANEXOS DEL CONTRATO:** Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato: •Estudios y documentos previos. •El Pliego de Condiciones del proceso. •La Oferta presentada por El Contratista.

**VIGÉSIMA SEPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes, la acreditación de encontrarse El Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía de que trata La Clausula Décima Sexta del presente Contrato.

**VIGÉSIMA OCTAVA.- APROPIACION PRESUPUESTAL:** El Municipio pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al 2018867 del 29 de Noviembre de 2014 y acuerdo 11 del 08 de septiembre de 2014 que autoriza al ejecutivo municipal de Taminango para comprometer vigencias futuras año 2015.

**VIGÉSIMA NOVENA.- REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

**TRIGÉSIMA.- CONFIDENCIALIDAD:** En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial.

**TRIGÉSIMA PRIMERA.- LIQUIDACIÓN:** Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar El Contrato. En caso que El Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el Contratante puede liquidar unilateralmente el presente Contrato.

**TRIGÉSIMA SEGUNDA.- LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL:** Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Taminango y el domicilio contractual es El Municipio de Taminango.

Para constancia, se firma en El Municipio de Taminango - Nariño, a los tres (03) días del mes de Febrero del año dos mil quince (2015).

La Entidad Estatal Contratante

MILLER LEONARDO URBANO OJEDA  
Alcalde Municipal Taminango

El Contratista

ORLANDO GERARDO BENAVIDES  
AMERICANA DE CONSTRUCCIONES E.U





REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE NARIÑO  
MUNICIPIO DE TAMINANGO  
DESPACHO ALCALDE MUNICIPAL.  
NIT. 800.024.977-6

**VIGÉSIMA QUINTA.- INTERVENTORIA:** La interventoría del presente Contrato está a cargo del proponente seleccionado en el proceso de selección de contratistas a través de proceso contractual adelantado por la Gobernación de Nariño – Plan Departamental de Aguas PDA.

**VIGÉSIMA SEXTA.- ANEXOS DEL CONTRATO:** Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato: •Estudios y documentos previos. •El Pliego de Condiciones del proceso. •La Oferta presentada por El Contratista.

**VIGÉSIMA SEPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes, la acreditación de encontrarse El Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía de que trata La Cláusula Décima Sexta del presente Contrato.

**VIGÉSIMA OCTAVA.- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** El Municipio pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al 2018867 del 29 de Noviembre de 2014 y acuerdo 11 del 08 de septiembre de 2014 que autoriza al ejecutivo municipal de Taminango para comprometer vigencias futuras año 2015.

**VIGÉSIMA NOVENA.- REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

**TRIGÉSIMA.- CONFIDENCIALIDAD:** En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial.

**TRIGÉSIMA PRIMERA.- LIQUIDACIÓN:** Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar El Contrato. En caso que El Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el Contratante puede liquidar unilateralmente el presente Contrato.

**TRIGÉSIMA SEGUNDA.- LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL:** Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Taminango y el domicilio contractual es El Municipio de Taminango.

Para constancia, se firma en El Municipio de Taminango – Nariño, a los tres (03) días del mes de Febrero de año dos mil quince (2015).

La Entidad Estatal Contratante

El Contratista

MILLER LEONARDO URBANO OJEDA  
CC: 89.001.872 de Armenia  
Alcalde Municipal Taminango

AMERICANA DE CONSTRUCCIONES E.U  
NIT No. 614000302-2

193



República de Colombia  
Departamento de Nariño

# ALCALDÍA DE TAMINANGO

**"Gestión y Compromiso con Mi Pueblo"**

Administración 2016 - 2019

NIT: 800.024.977-6

SECRETARÍA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO COMUNITARIO



## ACTA DE RECIBO DE LA COMUNIDAD

**CONTRATO DE OBRA CIVIL No:** 005- L.P. 2014 DE OBRA PUBLICA

**OBJETO:** CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR AMPLIACIÓN, OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL REMOLIN, MUNICIPIO DE TAMINANGO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO - CÓDIGO BPIM 20130527860086

**CONTRATISTA:** AMERICANA DE CONSTRUCCIONES E.U  
Representante legal  
ORLANDO BENAVIDES CÁCERES

**VALOR CONTRATO:** SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE. (\$743.525.416)

**PLAZO CONTRACTUAL:** SEIS (06) MESES

**FECHA DE INICIACIÓN:** 13 DE JULIO DE 2015

**FECHA TERMINACIÓN:** 13 DE ENERO DE 2016

**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:** 31 DE AGOSTO DE 2015

**FECHA DE REINICIO No. 01:** 23 DE NOVIEMBRE DE 2015

**FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No.01:** 6 DE ABRIL DE 2016

**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02:** 23 DE DICIEMBRE DE 2015

**FECHA DE REINICIO No. 02:** 4 DE FEBRERO DE 2016

**FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No.02:** 19 DE MAYO DE 2016

**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 03:** 23 DE FEBRERO DE 2016

**FECHA DE REINICIO No. 03:** 18 DE ABRIL DE 2016

**FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No.03:** 13 DE JULIO DE 2016

**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 04:** 31 DE MAYO DE 2016

**FECHA DE REINICIO No. 04:** 25 DE JULIO DE 2016

**FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No.04:** 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016

**INTERVENTOR:** ING. MAURICIO MELO MOSQUERA



ALCALDIA MUNICIPAL TAMINANGO  
NIT 800.024.977-6

### HACE CONSTAR

Que este documento es auténtico conforme a su Original, previo cotejo de rigor

Fecha: 12 de julio de 2019

Firma:

Folios del 197

Continúa Acta de Recibo de la Comunidad del contrato N° 005- L.P. 2014 de Obra Publica

2  
194



República de Colombia  
Departamento de Nariño

## ALCALDÍA DE TAMINANGO

**"Gestión y Compromiso con Mi Pueblo"**

Administración 2016 - 2019

Nit:800.024.977-6



SECRETARÍA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO COMUNITARIO

### ACTA DE RECIBO DE LA COMUNIDAD

Continúa Acta de Recibo de la Comunidad del contrato N° 005- L.P. 2014 de Obra Publica

#### GARANTÍAS:

#### ASEGURADORA SOLIDARIA

Póliza No.: 436-47-994000029172

Póliza No.: 436-74-994000004958

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

13/07/2015

06/01/2017

#### CUMPLIMIENTO:

PAGO SALARIOS,

PRESTACIONES S.:

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA

OBRA:

RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRA CONTRACTUAL:

13/07/2015

06/09/2019

Cinco (05) años

13/07/2016

06/09/2016

#### FECHA PRESENTE ACTA:

24 DE AGOSTO DE 2016

En el Municipio de Taminango, a los veinticuatro (24) días del mes de Agosto de 2016 se reunieron en el lugar de la obra: **DR. RODRIGO JURADO MORENO** Alcalde Municipal de Taminango, **ING. CLAUDIO ALEJANDRO LÓPEZ** Secretario de Planeación, Infraestructuras y Desarrollo Comunitario, **ING. LUIS FABIÁN IPIALES MUÑOZ** Ingeniero de Apoyo a la Supervisión PAP-PDA Nariño, **ING. MAURICIO MELO MOSQUERA** quien ejecuta la Interventoría de Obra y el **ING. ORLANDO BENAVIDES CÁCERES** como representante legal de **AMERICANA DE CONSTRUCCIONES E.U.** Contratista de obra, para la ejecución del proyecto denominado: **"AMPLIACIÓN, OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL REMOLINO, MUNICIPIO DE TAMINANGO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO - CÓDIGO BPIM 20130527860086**, con el objeto de suscribir el Acta de Recibo de la Comunidad, quienes reciben la obra objeto del contrato No. 005- L.P. 2014 de Obra Pública del 3 de Febrero de 2015, a entera satisfacción.

Entre las actividades que se ejecutaron por parte del Contratista se tienen:

#### EJECUCIÓN DE OBRA

##### 1. PRELIMINARES

1.1 Localización y replanteo general

##### 2. EXCAVACIONES Y RELLENOS

2.1 Excavación en material común  $1 < H < 2$  m.

2.2 Excavación en material común  $2 < H < 3$  m. con entibado

2.3 Excavación en material común  $3 < H < 4$  m. con entibado

2.4 Excavación en material común  $4 < H < 5$  m con entibado

Continúa Acta de Recibo de la Comunidad del contrato N° 005- L.P. 2014 de Obra Publica

Dirección: Calle 5 No: 4-16 Barrio el Poder- Taminango-Nariño

Correos Electrónicos: [alcaldia@taminango-narino.gov.co](mailto:alcaldia@taminango-narino.gov.co) / [contactenos@taminango-narino.gov.co](mailto:contactenos@taminango-narino.gov.co)

Pág. Web: [www.taminango-narino.gov.co](http://www.taminango-narino.gov.co) Celular: 3104688705 Código Postal: 521560

195



República de Colombia  
Departamento de Nariño

## ALCALDÍA DE TAMINANGO

**"Gestión y Compromiso con Mi Pueblo"**

Administración 2016 - 2019

Nit:800.024.977-6

SECRETARÍA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO COMUNITARIO



### ACTA DE RECIBO DE LA COMUNIDAD

Continúa Acta de Recibo de la Comunidad del contrato N° 005- L.P. 2014 de Obra Publica

- 2.5 Relleno con material de recebo compactado 95% proctor modificado (tipo 1) colchon y atraque
- 2.6 Relleno con material de subbase tipo invias SBG-1 ó SBG-2 compactado con presión manual (tipo 2) colchón y atraque
- 2.7 Relleno con material seleccionado proveniente de la excavación compactado con salitrín (tipo 3)
- 2.10 Desalojo de material sobrante

### 3. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

- 3.1 Instalación de tubería alcantarillado 16"
- 3.2 Instalación de tubería alcantarillado 14"
- 3.3 Instalación de tubería alcantarillado 10"
- 3.4 Instalación de tubería alcantarillado 8"

### 4. CÁMARAS DE INSPECCIÓN

- 4.1 Cámara de inspección  $H < 2$  m. cónica
- 4.2 Cámara de inspección  $2 < H < 3$  m. cónica
- 4.3 Cámara de inspección  $3 < H < 4$  m. cónica
- 4.4 Cámara de inspección  $4 < H < 5$  m. cónica

### 6. INSTALACIONES DOMICILIARIAS

- 6.1 Caja domiciliaria 0.7 \* 0.7 m.  $H < 1$  m.
- 6.2 Instalación de tubería alcantarillado 6" acometida domiciliaria, incluye acople y codo 45°.

### 7. DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS

- 7.1 Demolición de andenes, concreto 2500 PSI  $E < 0,12$ m
- 7.2 Demolición sardinel en concreto incluye corte
- 7.9 Demolición en concreto rígido  $e = 0.20$  incluye corte
- 7.10 Demolición en concreto asfáltico  $e = 0.12$  con compresor, incluye corte
- 7.11 Desalojo de material sobrante
- 7.13 Reposición pavimento rígido concreto de 3000 psi  $e = 0.20$  m
- 7.14 Reposición de andén, concreto de 2500 psi.
- 7.15 Reposición de sardinel, concreto de 3000 psi.

### 9. SEÑALIZACIÓN

- 9.1 Aislamiento preventivo

Continúa Acta de Recibo de la Comunidad del contrato N° 005- L.P. 2014 de Obra Publica



196 A



República de Colombia  
Departamento de Nariño  
**ALCALDÍA DE TAMINANGO**

**"Gestión y Compromiso con Mi Pueblo"**

Administración 2016 - 2019

Nit: 800.024.977-6

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO COMUNITARIO



**ACTA DE RECIBO DE LA COMUNIDAD**

Continúa Acta de Recibo de la Comunidad del contrato N° 005- L.P. 2014 de Obra Publica

**10. OBRAS COMPLEMENTARIAS**

10.1 Limpieza general

**11. ÍTEMS NO PREVISTOS**

- 11.1 Caja domiciliaria 0.7 \* 0.7 m. H>1 m.
- 11.2 Desalojo y almacenamiento de material a 1,5 KM
- 11.3 Desalojo y almacenamiento de material a 0,5 KM
- 11.4 Excavación subterránea en roca
- 11.5 Retiro e instalación de adoquín
- 11.6 Implementación PMT
- 11.7 Reposición pavimento rígido concreto de 3000 psi e=0.17 m
- 11.8 Concreto de 2500 psi para recubrimiento de tubo de 10" y construcción de andén e = 0,27 m

**1. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS SANITARIA**

- 1.1 Suministro de tubería estructurada 16"
- 1.2 Suministro de tubería estructurada 14"
- 1.3 Suministro de tubería estructurada 10"
- 1.4 Suministro de tubería estructurada 8"

**3. INSTALACIONES DOMICILIARIAS**

- 3.2 Suministro de tubería PVC estructurada 6"
- 3.7 Suministro acople domiciliaria 200 \* 160
- 3.8 Suministro acople domiciliaria 250 \* 160
- 3.9 Suministro acople domiciliaria 400 \* 160
- 3.10 Suministro acople domiciliaria 355 \* 160
- 3.14 Suministro codo sanitario PVC estructurado 45°\*6"

Después de examinada la obra, por las partes que intervinieron en la presente acta la Comunidad recibe la obra contratada a satisfacción.

Para constancia se firma la presente Acta en original y una (1) copia por los que en ella intervienen a los veinticuatro (24) días del mes de Agosto de 2016.

Continúa Acta de Recibo de la Comunidad del contrato N° 005- L.P. 2014 de Obra Publica

1925



República de Colombia  
Departamento de Nariño

## ALCALDÍA DE TAMINANGO

**"Gestión y Compromiso con Mi Pueblo"**

Administración 2016 - 2019

Nit: 800.024.977-6

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO COMUNITARIO





### ACTA DE RECIBO DE LA COMUNIDAD


Continúa Acta de Recibo de la Comunidad del contrato N° 005- L.P. 2014 de Obra Publica

  
\_\_\_\_\_  
**DR. RODRIGO JURADO MORENO**  
Alcalde Municipio de Taminango

  
\_\_\_\_\_  
**ING. CLAUDIO ALEJANDRO LÓPEZ**  
Secretario de Planeación, Infraestructuras y  
Desarrollo Comunitario

  
\_\_\_\_\_  
**ING. MAURICIO MELO MOSQUERA**  
Interventor de obra

  
\_\_\_\_\_  
**R.L. ORLANDO BENAVIDES CÁCERES**  
AMERICANA DE CONSTRUCCIONES E.U  
Contratista

  
\_\_\_\_\_  
**Vo. Bo. ING. LUIS FABIÁN INJALES MUÑOZ.**  
Apoyo a la Supervisión PAP- PDA Gobernación  
de Nariño

Continúa Acta de Recibo de la Comunidad del contrato N° 005- L.P. 2014 de Obra Publica



República de Colombia  
Departamento de Nariño


# ALCALDÍA DE TAMINANGO

"Gestión y Compromiso con Mi Pueblo"

Administración 2016 - 2019

Nit: 800.024.977-6

SECRETARÍA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO COMUNITARIO



## ACTA DE RECIBO DE LA COMUNIDAD

Continúa Acta de Recibo de la Comunidad del contrato N° 005- L.P. 2014 de Obra Publica

POR LA COMUNIDAD:

NOMBRE	C.C	FIRMA
Silbio Cubano	94486588	
Wilfredo Bastidas	87029252	
Wesley Paredes	77482623	
Jesús Ortega	18153102	
Yokanny Figueroa	34455095	
Alberto Ortiz	98331501	
Jose Andres M	1.061713394	
	27481079	
	1085689843	
Abairus Erazo	10415067	
OLIVER A ORDONIZ	1.085.627546	
Charly Madroñero	7067736400	
Luis A Madroñero	1085687661	
Juan Carlos Vivar	1067447474	
Jose Luis Madroñero	104175106	
Angemisa Guevara	10415163	



# ALCALDÍA DE TAMINANGO

"Gestión y Compromiso con Mi Pueblo"

Administración 2016 - 2019

Nit: 800.024.977-6

SECRETARÍA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO COMUNITARIO



## ACTA DE RECIBO DE LA COMUNIDAD

Continúa Acta de Recibo de la Comunidad del contrato N° 005- L.P. 2014 de Obra Publica

POR: \_\_\_\_\_

NOMBRE

C.C

FIRMA

<u>Jairo Martos</u>	<u>10.592.120</u>	<u>Jairo Martos</u>
<u>Aldemar Daza Oterera</u>	<u>7862512</u>	<u>Aldemar Daza O.</u>
<u>Moises eladronero</u>	<u>15570981</u>	<u>SE</u>
<u>Martha Dolly Arteaga</u>	<u>36751656</u>	<u>Martha Arteaga.</u>
<u>Nilsa Botina Diaz</u>	<u>59861011</u>	<u>Nilsa Botina Diaz</u>
<u>Carlos Solarte</u>	<u>95293210</u>	<u>Carlos Solarte</u>
<u>Harold Dely Diaz</u>	<u>5207270</u>	<u>Harold Dely Diaz</u>
<u>Blanca Cecilia Corallo</u>	<u>27.481.155</u>	<u>Blanca Cecilia Corallo</u>
<u>Yaneth martinez M.</u>	<u>59862568</u>	<u>Yaneth martinez M.</u>
<u>Fabriciano Urreaga M.</u>	<u>96790266</u>	<u>Fabriciano Urreaga M.</u>
<u>Yulee Lacerda</u>	<u>27482221</u>	<u>Yulee Lacerda</u>
<u>Jair Zamora M.</u>	<u>87060555</u>	<u>Jair Zamora M.</u>
<u>María fernanda Martinez</u>	<u>1085688352</u>	<u>María fernanda Martinez</u>
<u>Lucy Melendez</u>	<u>66863571</u>	<u>Lucy Melendez</u>
<u>Anaer Martos</u>	<u>36.780089</u>	<u>Anaer Martos</u>
<u>Claudia Celmina Daza S.</u>	<u>1085686797</u>	<u>Claudia Daza</u>
<u>Gilberto Lopez</u>	<u>10593210</u>	<u>Gilberto Lopez</u>



Sanchez

FIRMA DE ABOGADOS S.A.S.  
NIT. 900.875.648-1

San Juan de Pasto, 15 de enero de 2020.

**SEÑOR**

**JUEZ NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO**

200

JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO	
<b>RECIBIDO</b>	
Fecha: <b>16 ENE 2020</b>	Hora: _____
Cuadernos: _____	Folios: _____
SECRETARIA	

**RAD: 2019 - 0013**  
**DE. LAURENTINO MARTOS**  
**CONTRA: MPIO DE TAMINANGO Y OTROS**

Cordial Saludo,

**JOHANNA MARCELA NARVAEZ VALENCIA**, mayor de edad, vecina de la ciudad de Pasto, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.085.932.709 de Ipiales (N), abogada en ejercicio e inscrita con la tarjeta profesional N°. 290463 Del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderada judicial de la parte demandante, con toda atención me permito manifestar a su Despacho que renuncio al poder que me fue conferido.

Se suscribe de Ud,



**JOHANNA MARCELA NARVAEZ VALENCIA**  
**C.C. 1.085.932.709**  
**T.P. N° 290463 del Consejo Superior de la Judicatura**

San Juan de Pasto, Enero de 2020

Señores  
**JUEZ NOVENO ADMINISTRATIVO**  
Pasto - Nariño  
E. S. D.



PROCESO: REPARACION DIRECTA.  
RADICACION: No. 2019 – 0013  
DEMANDANTE: LAURENTINO MARTHOS y Otros  
DEMANDADOS: ALCLADIA MUNICIPAL DE TAMINANGO N

**CORDIAL SALUDO,**

**CARLOS ANDRES OJEDA LUNA**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de San Juan de Pasto, identificado con la cédula de Ciudadanía número 98.390.308 expedida en Pasto, Abogado titulado con Tarjeta Profesional No. 105.477 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de apoderado judicial del MUNICIPIO DE TAMINANGO - NARIÑO, con el debido respeto manifiesto a usted que renuncio al poder otorgado, con el cual se adelantaba la representación judicial en el presente proceso, debido a terminación del contrato con el nombrado Municipio

Me permito manifestarle que me declaro a paz y salvo por concepto de honorarios por los servicios profesionales prestados.

**ANEXOS.-**

1. Oficio dirigido al Alcalde Municipal Dr. RODRIGO JURADO MORENO donde se le informa de la determinación de renuncia.

**NOTIFICACIONES.-**

Las recibiré en mi Despacho de Abogado, ubicado en la carrera 37 No. 17 – 75, Edificio Matiz, celular 311 7454257; correo electrónico andresojeda19@hotmail.com

Del Sr. Juez, atentamente,

**CARLOS ANDRES OJEDA LUNA**  
C.C. No. 98.390.308 DE PASTO  
T.P. No. 105.477 del C.S. de la J.

202




República de Colombia  
Departamento de Nariño

## ALCALDÍA DE TAMINANGO

*"Gestión y Compromiso con Mi Pueblo"*

Administración 2016 - 2019

Nit:800.024.977-6



Taminango, 31 de Diciembre de 2019

Doctor:

**RODRIGO JURADO MORENO**

Alcalde Municipal

Taminango Nariño

Ref. Renuncia Procesos Judiciales.

Cordial saludo:

**CARLOS ANDRES OJEDA LUNA**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de San Juan de Pasto, identificado con la C.C. No. 98.390.308 de Pasto, Abogado Titulado y en Ejercicio, con T.P. No. 105.477 del C.S de la J., en mi calidad de apoderado judicial de los procesos que cursan en los distintos Juzgados Administrativos de la ciudad de Pasto, en contra del Municipio de Taminango N y de los procesos judiciales que cursan en el Tribunal Administrativo de Nariño en contra del Municipio de Taminango N, con el debido respeto me dirijo a usted, con el fin de informarle que debido a la terminación de mi contrato de Orden de Prestación de Servicios con el Municipio de Taminango N, procederé a renunciar a los poderes a mí otorgados en dichos procesos por usted en su calidad de Alcalde Municipal, cuyo objeto es la defensa judicial del municipio, a partir del día 31 de Diciembre de 2019, o cuando termine la vacancia judicial.

El presente oficio se lo remito con el fin de que sea acreditado ante los despachos judiciales de conocimiento.

Atentamente,

**CARLOS ANDRES OJEDA LUNA**

C.C. No. 98.390.308 de Pasto

T.P. No. 105.477 del C.S. de la J


Acepto

**RODRIGO JURADO MORENO**

Alcalde Municipal

Taminango Nariño

Señor,  
**JUEZ NOVENO ADMINISTRATIVO DE PASTO**  
E. S. D.



**REFERENCIA: MEMORIAL PODER ARTÍCULO 74 DEL C.G.P.**  
**PROCESO: 2019 - 0013**  
**DEMANDANTE: LAURENTINO MARTHOS**  
**DEMANDADO: MUNICIPIO DE TAMINANGO (N)**

**MILLER LEONARDO URBANO OJEDA** identificado con Cedula de Ciudadanía N° 89.001.872 expedida en Armenia (Q), actuando en mi calidad de Alcalde del Municipio de Taminango (N) según consta en certificación electoral del 30 de octubre de 2019 y posesionado mediante acta No. 02 de 2019 emitida por la Notaria Única del Circulo de Taminango (N), con el debido respeto por medio del presente escrito manifiesto que confiero poder especial amplio y suficiente al abogado **ROLANDO MUÑOZ MARTÍNEZ**, mayor y vecino de la Ciudad de Pasto, abogado en ejercicio, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.085.255.619 expedida en la Ciudad de Pasto (N) y portador de la Tarjeta Profesional número 239.751 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en representación del municipio de Taminango (N), asuma la defensa y actúe como apoderado judicial en el proceso anteriormente referenciado.

El apoderado judicial constituido, se encuentra facultado para ejercer la representación judicial en todas sus etapas en primera y segunda instancia, llamar en garantía, asistir a las audiencias que programe su despacho, aportar pruebas, realizar peticiones, asistir y actuar en todas las etapas del proceso, solicitar, recaudar, recibir, aportar documentos y pruebas, conciliar, transigir, sustituir, suplir, reasumir, recibir, desistir, renunciar, presentar recursos, y las demás facultades de ley según el artículo 74 del C. G. P. y las propias del cargo encomendado.

Sírvase reconocer personería para actuar al abogado **ROLANDO MUÑOZ MARTÍNEZ**, en los términos y para los efectos del presente memorial poder.

Atentamente,

**MILLER LEONARDO URBANO OJEDA**  
C. de C. N° 89.001.872 expedida en Armenia (Q)  
Alcalde del municipio de Taminango

ACEPTO:

**ROLANDO MUÑOZ MARTÍNEZ**  
C. de C. No. 1.085.255.619 de Pasto  
T. P. No. 239.751 del C. S. de la J.

**EL SUSCRITO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO NOTARIAL DE PASTO,**  
HACE CONSTAR

Que el anterior Poder  
Dirigido a: **Juez Noveno Administrativo de Pasto**  
Fue presentado directa y personalmente por su signatario (a) **Miller**  
**Leonardo Urbano Ojeda**  
quien se identificó con C. de C. No. **89.001.872** expedida en  
Primera En consecuencia se firma en Pasto el día  
**05 FEB 2020**





204

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE TAMINANGO NARIÑO**

Proceso No. 2019-0013

ACTA DE POSESION No. 02 de 2019

En la población de Taminango, capital del Municipio y Círculo Notarial del mismo nombre, Departamento de Nariño, República de Colombia, a treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), siendo las 11:30 A.M., ante mí WILMA DANÉY IDROBO MARTÍNEZ, Notaría Única del Círculo, compareció el doctor MILLER LEONARDO URBANO OJEDA, mayor de edad, vecino Pasto Nariño, quien se identificó con cédula de ciudadanía No. 89.001.872 expedida en Armenia, con el objeto de tomar posesión del cargo de ALCALDE MUNICIPAL DE TAMINANGO NARIÑO, elegido popularmente para el periodo constitucional 2020 a 2023, que iniciará el 01 de enero de 2020. Para tal efecto presentó los siguientes documentos:

1. Hoja de vida en formato del Departamento Administrativo de la función pública.....
2. Cédula de ciudadanía No. 89.001.872 expedida en Armenia.....
3. Credencial expedida por la Comisión Escrutadora Municipal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por la cual se declara que MILLER LEONARDO URBANO OJEDA, con C.C. No. 89.001.872 ha sido elegido ALCALDE por el Municipio de TAMINANGO (NARIÑO) para el periodo de 2020 a 2023. Se adjunta fotocopia autenticada.....
4. Certificado sobre la definición de situación militar, de fecha 27 de diciembre de 2019.....
5. Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales, de fecha 27 de diciembre de 2019, por medio del cual la Policía Nacional de Colombia informa que el ciudadano con cédula de ciudadanía No. 89.001.872 y nombre URBANO OJEDA MILLER LEONARDO, NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES. ....
6. Certificado de antecedentes fiscales, de fecha 27 de diciembre de 2019, expedido por la Contraloría General de la República, por medio del cual LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURIDISCCION COACTIVA certifica que el número de identificación 89.001.872, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. Código de verificación 89001872191227091147.....
7. Certificado especial de antecedentes disciplinarios No. 138747153, de fecha 27 de diciembre de 2019, expedido por la Procuraduría General de la Nación, según el cual el señor MILLER LEONARDO URBANO OJEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 89.001.872 NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES, NO PRESENTA INHABILIDADES ESPECIALES APLICADAS AL CARGO DE ALCALDE.....
8. Paz y salvo municipal, con fecha de expedición 30 de diciembre de 2019.....
9. Certificado médico de aptitud, expedido el día 30 de diciembre de 2019.....
10. Certificado expedido por la Escuela Superior de la Administración Pública- ESAP, sobre su participación en el Seminario de Inducción para Alcaldes y Gobernadores electos periodo 2020-2023. Se adjunta fotocopia autenticada.....
11. Declaración extraproceso sobre ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para ejercer el cargo de Alcalde Municipal de Taminango Nariño, para el respectivo periodo constitucional y sobre no cursar en su contra demanda alguna por alimentos.....


205

12. Declaración extraproceso sobre sus bienes y rentas y actividad económica privada, y los de su esposa e hijos no emancipados y declaraciones en formato del Departamento Administrativo de la Función Pública.....

13. Certificado sobre su vinculación al Sistema de Seguridad Social en Salud expedido por E.P.S. SANITAS .....

14. Otros documentos: Copia del RUT, .....

Verificado el cumplimiento de los anteriores requisitos con los documentos que hacen parte de la presente acta, el doctor MILLER LEONARDO URBANO OJEDA, procede a tomar posesión del cargo de ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO NARIÑO para el periodo constitucional 2020 a 2023, en los términos del artículo 94 de la ley 136 de 1994, para cuyo efecto textual, pública y perceptiblemente rindió el siguiente juramento: "JURO A DIOS Y PROMETO AL PUEBLO CUMPLIR FIELMENTE LA CONSTITUCION, LAS LEYES DE COLOMBIA, LAS ORDENANZAS Y LOS ACUERDOS". La presente acta surte efectos fiscales a partir del primero (01) de enero de dos mil veinte (2020). No siendo otro el objeto de la presente diligencia se la termina una vez leída al posesionado, quien la aprueba en todas y cada una de sus partes y en constancia firma ante la suscrita Notaria que da e imprime la autorización de ley.

  
MILLER LEONARDO URBANO OJEDA  
Posesionado

  
WILMA DANEY IDROBO MARTINEZ  
Notaria Unica del Circulo



REPUBLICA DE COLOMBIA  
ORGANIZACIÓN ELECTORAL  
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

E-27

REGISTRADURIA  
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA MUNICIPAL

DECLARAMOS

Que, MILLER LEONARDO URBANO OJEDA con C.C. 89001872 ha sido elegido(a)  
ALCALDE por el Municipio de TAMINANGO - NARIÑO, para el periodo de 2020 al  
2023, por el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO.

En consecuencia, se expide la presente CREDENCIAL, en TAMINANGO (NARIÑO), el  
viércoles 30 de octubre del 2019.

VICTORIA EUGENIA CORAL  
MUÑOZ

MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA

ERIKA LORENA DE LA CRUZ  
BURBANC

BAYRON COMALICA HERRERA

SECRETARIO(S) DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA

COMO NOTARIO UNICO DE ESTE CIRCULO DOY FE QUE  
ESTA FOTOCOPIA COINCIDE CON SU ORIGINAL QUE  
TENIENDO A LA VISTA. TAMINANGO Octubre 31 de 2019

2019  
REPUBLICA DE COLOMBIA  
Wilma Daney Ibarra Martínez  
TAMINANGO - NARIÑO

106

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 89.001.872

URBANO OJEDA

APELLIDOS

MILLER LEONARDO

NOMBRES

  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-JUL-1974  
TAMINANGO  
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO  
1.74

ESTATURA 1.74  
15-ENE-1993 ARMENIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

B+

C.S. III

M

SEXO

REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS CALENDO YACHA



A 2000100 00040711-M-0069001672-20160914

0051089851A 1

6834022047

Diciembre 31 de 2019  
