 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. 1419


DEPENDENCIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	CODIGO TABLA RETENCIÓN DOCUMENTAL	
-------------	--	-----------------------------------	--

1. INFORMACIÓN GENERAL				
1.1 FECHA DE PRESENTACIÓN:				
1.2 NOMBRE DE PROYECTO:		CONSTRUCCION, OPTIMIZACION, HABILITACION, AMPLIACION, ESTUDIOS, DISEÑOS Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y POZOS PROFUNDOS DE LAS CABECERAS MUNICIPALES, RURALES Y CENTROS POBLADOS. ✓		
1.3 CÓDIGO SSEPI:		2008 – 085000 – 0021 ✓		
1.4 IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				
1.4.1 NOMBRE:		CONSTRUCCION, OPTIMIZACION, HABILITACION, AMPLIACION, ESTUDIOS, DISEÑOS Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y POZOS PROFUNDOS DE LAS CABECERAS MUNICIPALES, RURALES Y CENTROS POBLADOS.		
1.4.2 CÓDIGO:		6.RP 60. 920607100050102 ✓		
1.4.3 FUENTE:		6. RP60. REGALÍAS PETROLERAS DEL 60%. ✓		
1.5 COMPONENTE(S) DEL PROYECTO:		ETAPA DE INVERSION. ✓		
1.6 ACTIVIDAD(ES) DEL PROYECTO:		ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA. ✓		
1.7 PRODUCTO(S) DEL PROYECTO:		DIECINUEVE (19) MUNICIPIOS OPTIMIZADOS, HABILITADOS, AMPLIADOS Y MANTENIDOS CON LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS Y POZOS PROFUNDOS Y EL OBJETO ES INCREMENTAR EN 90% LA COBERTURA PARA CUMPLIR LO REGLAMENTADO POR LA LEY.		
1.8 PRODUCTO(S) DEL OBJETO A CONTRATAR		"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE"		
1.9 POBLACIÓN BENEFICIADA CON EL OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR:		120 PERSONAS, REPRESENTADAS EN 36 FAMILIAS, PERTENECIENTE A LA VEREDA AGUALINDA SEGÚN FUENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL		
1.10 EMPLEOS ESTIMADOS CON LA INVERSIÓN		DIRECTO(S)	20	INDIRECTO (S) 12

2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

La ordenanza No 004 de Mayo 24 de 2008 de la Asamblea Departamental mediante la cual se aprobó el Plan de desarrollo Departamental: "Pensando en Todos" 2008-2011 Casanare , territorio de equidad social; fuerza agroindustrial del llano; Reto VII "INTEGRACIÓN Y AFIRMACIÓN TERRITORIAL: ACUERDOS FUNDAMENTALES

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. _____

HACIA EL DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE URBANO Y RURAL" en el programa 7.5 ESTABLECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANIFICACION EFECTIVA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, en el Subprograma 7.5.1 SISTEMAS DE AGUA POTABLE, se encuentra inmerso el proyecto "CONSTRUCCION, OPTIMIZACION, HABILITACION, AMPLIACION, ESTUDIOS, DISEÑOS Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y POZOS PROFUNDOS DE LAS CABECERAS MUNICIPALES, RURALES Y CENTROS POBLADOS." que consta de un conjunto de actividades y/o componentes que necesitan en su ETAPA DE INVERSION, la 2.1 Obra Física, - Adquisición de Bienes. Servicios y obra Pública

Este proyecto se convierte en la herramienta básica para el cumplimiento de los Subprogramas , Programas, Políticas y Estrategias desarrolladas en el plan de Desarrollo de orden Departamental, por medio del cual los Municipios del Departamento de Casanare presentaran proyectos concertados con la Gobernación (los cuales inscriben y viabilizan en el Banco de Proyectos Departamental), con el objeto de que sean financiados por la administración Departamental, ya que los Municipios no cuentan con los recursos económicos necesarios para la ejecución de las obras contenidas en ella. Sin embargo la administración municipal de Pore, realizo el diseño y caracterización del Sistema de Acueducto de la Vereda Agualinda para presentar este proyecto de infraestructura en agua potable a la oficina de Planeación Departamental, para ser viabilizado como macro proyecto y aspirar su financiación.


Geográficamente el Municipio de Pore, se localiza en la zona Norte del Departamento del Casanare a 5° 43'. Latitud Norte y 72° 00'. Longitud Occidental; con altitud de 250 msnm.; temperatura entre 22° C y 27° C, y una extensión de 786 Km2. Limitando por el norte con el Municipio de Paz de Ariporo, al sur con el Municipio Nunchia y San Luís de Palenque, por el occidente con el Municipio de Támara y al oriente con el Municipio de Trinidad. Dista de Yopal 70 Km. Actualmente y según los datos de E.O.T., el municipio cuenta con las veredas denominadas: Matalarga, Miralindo, El Banco (Inspección de Policía), Curama , La Plata (Inspección de Policía), Brisas del Pauto, Agualinda, San Isidro, El Verde, Guanábanas, Vijagual, Bocas de Pore, Altamira, Caffies, Curimina, Guachiria, Regalito, El Retiro, La Jase, La Macolla, La Mapora, Tasajeras, Los Alpes, La Sequí, San Rafael, Ramón Nonato (Inspección de Policía).

La Vereda Agualinda, limita por el Nor- Occidente con la Vereda La Curama, por el Oriente con la Vereda La Mapora, por el Sur con la Vereda El Banco.

De las Necesidades a resolver:

- Los habitantes de la Vereda Agualinda del Municipio de Pore carecen del servicio de agua potable.
- La calidad de agua que la población toma es de fuente de agua cercana (pozo, aljibe, río), sin realizarle ningún tipo de tratamiento (ni depuración de arena, ni desinfección, ni tratamiento bacteriológico) salvo el realizado por cada usuario, como el hervirla antes del consumo. El agua no es óptima para el consumo humano: no es potable.
- Las fuentes de agua tienen altos contenido de hierro, color, turbidez y bacteriológicamente con coliformes y E coli.
- Los sistemas artesanales existentes para la captación de agua cruda, prestan un insuficiente servicio en cuanto a cobertura, continuidad y/o calidad lo cual ocasiona la mayoría de las enfermedades gastrointestinales.

[Handwritten signatures and initials]

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. _____

- Deficiencia en la prestación del servicio causada por malas condiciones de la infraestructura existente, las cuales en su mayoría son aljibes, estanques y reservorios propensos a la contaminación animal, de aves y presencia de algas y hongos, los cuales se conectan con mangueras hasta pocetas y/o tanques de almacenamiento.

Como se solucionará la necesidad: El presente proyecto busca abastecer de agua potable a los habitantes de la vereda Agualinda, del Municipio de Pore, para lo cual se realizar las siguientes actividades:

- Mantenimiento, limpieza del pozo profundo existente y suministro de bomba sumergible, e instalaciones eléctricas necesarias incluidas red de energía.
- Adecuación del Tanque elevado, incluye impermeabilización.
- Suministro e instalación de planta de tratamiento de agua potable.
- Construcción de redes principales y acometidas a cada una de las viviendas de la vereda Agualinda.

Fuente de agua sub superficial, para proveer de agua el proyecto La vereda Agualinda cuenta con un pozo profundo construido en las coordenadas E=896.396, N=1.117.546 y esta localizado a una altura de 244 msnm. Este pozo fue perforado, hace aproximadamente 4 años, con una profundidad de 60 metros y un diámetro de 4 pulgadas. En la Actualidad de este pozo solo se beneficia el propietario de la finca.

Se anexan informe de laboratorio con los resultados Físico-químico, bacterológico y prueba de tratabilidad realizada al agua cruda del pozo profundo según informe nro. 0345 de fecha 5 de Junio de 2009, elaborada por la firma Ambitex, con Nit. 832.008.00-4 con domicilio en la Carrera 26 Nro. 21-47 de la ciudad de Yopal, firmada por el director de Laboratorio Ingeniero Químico Leonel Torres Arias (2 folios).

Con la ejecución de proyecto se pretende satisfacer las necesidades de la comunidad tratando de ofrecer una correcta y eficiente prestación del servicio, de tal forma que se presente en forma continua y eficiente, dado que el agua con la cual se abastece la comunidad no cumple con los requisitos establecidos en la normatividad vigente (Ras – 2000), ni con los parámetros de calidad de agua contemplados en el decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 de 2007 del MAVDT.. Otro de los puntos críticos que se tiene en el sector rural, es el desconocimiento de la calidad del agua de suministro, ya que no se tienen registros por parte de las entidades responsables del servicio

Mejorar las condiciones de salubridad de la población del Área Rural y Disminuir el riesgo de enfermedades producidas por el consumo de agua cruda. – Son objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal, dentro del cual se establecen proyectos de mejoramiento de acueductos, suplir de agua potable a la comunidad dispersa y disminuir el porcentaje de necesidades insatisfechas para la zona rural.

Por tal razón y en aras de atender la solicitud de la Administración Municipal de Pore para suplir la carencia de agua potable en la Vereda Agualinda, surge la necesidad de construir el sistema de Acueducto por gravedad, tomando agua desde un pozo profundo, de acuerdo al documento "DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA, ALCALDIA DE PORE", viabilizado por el Municipio de PORE", elaborado por GEOHINTÉL EU, identificada con Nit. 844.004.030-1. Diseñador; Omar Monsalve M.P. 68202084720 STD, Levantamiento Topográfico realizado por el Topógrafo Luis Norberto Ascencio LP Nro. 00-4089 CNPT. Interventor, Ing. Fernando Monsalve, Especificaciones técnicas de la Planta de tratamiento de Agua Potable, por la firma Aguatecnicos con Nit. 942.812.36-8, siendo Representante comercial el Ingeniero Jorge Pérez.

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. 1116

2.2 ANÁLISIS DE CONVENIENCIA:

En el plan de Desarrollo Departamental: "PENSANDO EN TODOS" 2008 - 2011 "CASANARE, TERRITORIO DE EQUIDAD SOCIAL; FUERZA AGROINDUSTRIAL DEL LLANO"; se incluye la meta o reto VII "INTEGRACIÓN Y AFIRMACIÓN TERRITORIAL: ACUERDOS FUNDAMENTALES HACIA EL DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE URBANO Y RURAL" en el programa 7.5 ESTABLECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANIFICACION EFECTIVA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, en el subprograma 7.5.1 SISTEMAS DE AGUA POTABLE, se encuentra inmerso el proyecto "CONSTRUCCION, OPTIMIZACION, HABILITACION, AMPLIACION, ESTUDIOS, DISEÑOS Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y POZOS PROFUNDOS DE LAS CABECERAS MUNICIPALES, RURALES Y CENTROS POBLADOS", requiere la construcción de subproyectos en los cuales se den solución a las necesidades, carencias y prioridades de las comunidades, por ello se deben realizar procesos para garantizar la mejor utilización de los recursos disponibles y de ésta manera cumplir las metas establecidas en el plan de desarrollo departamental.

La ejecución de este proyecto se realizara en aras de garantizar el acceso al servicio de agua potable de forma continua que conlleve a mejorar la calidad de vida y aumentar la cobertura en la zona rural y con esto poder ir alcanzando las metas establecidas en el plan de desarrollo para los municipios con red de acueducto y sistemas de tratamiento, cubriendo al menos el 90% de cobertura mejorados o construidos, operando y funcionando sosteniblemente.


Teniendo en cuenta lo establecido en el plan de desarrollo departamental programa 7.4, la Cobertura en los Servicios de Acueducto Rural en zona dispersa se tiene una cobertura en el servicio de acueducto del 14.5% y del 66% en el abastecimiento de agua. Considerando tanto los centros poblados como las zonas rurales dispersas, se tiene en el departamento una cobertura en el servicio de acueducto del 22%; con una cobertura en el abastecimiento de agua del 69%.

El proyecto es oportuno por cuanto como meta general se ha definido que el Numero de optimizaciones, ampliaciones de centro poblados de los municipios con red de acueducto y sistemas de tratamiento, cubriendo al menos el 90% de cobertura mejorados o construidos por lo tanto se espera que esta actividad, contribuya con 1.0 % en cobertura para la zona rural aproximadamente

Se anexan los siguientes documentos, que soportan la conveniencia del proyecto:

- Solicitud de Recursos para ejecución del proyecto "Construcción Acueducto Vereda Agualinda Municipio de Pore" presentada por Alcalde Municipal de Pore, Señor JORGE EZEQUIEL GARZON, con fecha 15 de Septiembre de 2008, dirigida al Gobernador de Casanare, Ing. OSCAR IVAN RAÚL FLOREZ.
- Solicitud de Recursos para ejecución del proyecto "Construcción Acueducto Vereda Agualinda Municipio de Pore" presentada por Alcalde Municipal de Pore, Señor JORGE EZEQUIEL GARZON, con fecha 1 de Junio de 2010, dirigida al Director Técnico del Banco Proyectos Departamental señor JOSE FELIZ MARTINEZ BARRERA.
- Certificación del Secretario de Planeación y Obras del Municipio de Pore, Señor LUIS ORLANDO SANCHEZ ABRIL, expedida el Ocho (8) de Junio de 2009, de que el Proyecto "Construcción Acueducto Vereda Agualinda Municipio de Pore", se encuentra registrado y Viabilizado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal, con el código No. 0808526300151.

1247

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. _____


- Certificación del Secretario de Planeación y Obras del Municipio de Pore, Señor MILLER ANDRES PEREZ MALAGON, expedida el Ocho (8) de Julio de 2010, de que el Proyecto "Construcción Acueducto Vereda Agualinda Municipio de Pore", se encuentra registrado y Viabilizado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal, con el código No. 0808526300151.
- Certificación del Secretario de Planeación y Obras del Municipio de Pore, Señor MILLER ANDRES PEREZ MALAGON, expedida el Ocho (8) de Julio de 2010, donde se certifica que el proyecto "Construcción Acueducto Vereda Agualinda Municipio de Pore" se encuentra incluido en el Programa "Estudios, Diseños, Construcción, Ampliación, Remodelación y Mejoramiento de Acueductos y Alcantarillados", correspondiente a la Dimensión Social " Servicios Públicos" del Plan de Desarrollo "LIDERAZGO Y GESTION 2008 – 2011", adoptado mediante acuerdo Nro. 03 de Abril 12 de 2008. Así mismo, se certifica que el proyecto esta incluido en el esquema de ordenamiento Territorial Municipal (EOT), adoptado el 30 de Junio de 2000, según acuerdo 017 del Municipio de Pore.
- Radicación del Proyecto en el banco de Programas y Proyectos Departamental, de fecha del 29 de Junio de 2010.
- El proyecto es conveniente, teniendo en cuenta que según certificación del Secretario de Planeación y Obras del Municipio de Pore, Señor MILLER ANDRES PEREZ MALAGON, expedida el Ocho (8) de Julio de 2009, el proyecto "Construcción Acueducto Vereda Agualinda Municipio de Pore" se encuentra incluido en el Programa "Estudios, Diseños, Construcción, Ampliación, Remodelación y Mejoramiento de Acueductos y Alcantarillados", correspondiente a la Dimensión Social " Servicios Públicos" del Plan de Desarrollo "LIDERAZGO Y GESTION 2008 – 2011", adoptado mediante acuerdo Nro. 03 de Abril 12 de 2008. Así mismo, se certifica que el proyecto esta incluido en el esquema de ordenamiento Territorial Municipal (EOT), adoptado el 30 de Junio de 2000, según acuerdo 017 del Municipio de Pore.

La Gobernación de Casanare a través del Banco de Proyecto Departamental, viabilizo técnica, ambiental, financiera y económicamente el proyecto "CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE" así mismo certifica la Oficina de Programación de Obras, mediante la firma del presente Estudio Previo que el proyecto cumple con todos los requisitos técnicos, económicos financieros, ambientales y documentales de ley.

Es conveniente cumplirse en su totalidad con el decreto 1575 de 2007 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por el cual se establece el sistema para la protección y control de calidad de agua para consumo humano y la Resolución 2115 de 2007 por medio de la cual se señalan las Características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano en beneficio de la comunidad estipulada en el proyecto.

El proyecto es conveniente por cuanto se satisface la demanda de agua potable en la Vereda Agualinda, del Municipio de Pore, se disminuyen los riesgos en la población de adquirir enfermedades gastrointestinales, virales y endémicas por consumo de agua contaminada

Es conveniente que la Administración municipal como conocedora de las necesidades de su localidad, garantice que el sistema de acueducto por gravedad se construya para todas las viviendas que estén habitadas en el momento de la construcción.

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. 416

Que CORPORINOQUIA mediante Resolución No 200.41.09.0930 de fecha 28 de Agosto de 2009, otorgo una concesión de aguas subterráneas al Municipio de Pore, Departamento de Casanare, para el Acueducto de la Vereda Agualinda. Bajo los siguientes condiciones:


- Otorgar concesión de 0.92 l/s de aguas Subterráneas al Municipio de Pore, para la construcción del Acueducto de la Vereda Agualinda, en jurisdicción de dicho ente territorial, en el Departamento de Casanare. El caudal concedido será de un pozo profundo, el cual se encuentra ubicado bajo las coordenadas Norte: 1.117.546, E: 896.396 y a una altura de 244 msnm.
- El término por el cual se otorga la Concesión de agua es de Diez (10) años, contados a partir de la notificación de la presente providencia. La concesión solo podrá prorrogarse durante el último año de su vigencia, para la cual ha sido otorgada, salvo por razones de conveniencia pública, de conformidad al Artículo 47 del Decreto 1541 de 1978.
- El Municipio de Pore, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
 - Supervisar periódicamente el funcionamiento de las sistemas de acueducto para determinar y reparar posibles fugas de agua u otro tipo de problema que pueda ocasionar perdidas, lo anterior en concordancia con las disposiciones establecidas en la ley 373 de Junio 6 de 1997.
 - Realizar una prueba de bombeo anual para evaluar el comportamiento de las condiciones hidrogeológicas, frente a la captación realizada; los resultados deberán presentarse a CORPORINOQUIA.
 - Se debe instalar equipos de medición de caudal, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 199 del Decreto 1541/78, el cual señala; toda obra de captación o alumbramiento de aguas deberá estar provista de aparatos de medición u otros elementos que permitan en cualquier momento conocer tanto la cantidad derivada como la consumida.
 - Presentar ante CORPORINOQUIA, un Plan para el uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997.

Por lo anterior el documento "DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA, ALCALDIA DE PORE", es conveniente su construcción, pues se esta dando cumplimiento con lo establecido en la Ley.

Es oportuna, pues se logran las metas del plan de desarrollo son prioridad de la Administración Departamental a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Casanare, suministrando agua potable a familias dispersas y que no han sido beneficiadas de proyectos de acueducto. El proyecto es oportuno pues se han realizado mesas de trabajo conjuntas definiendo cada una de las actividades, cantidades y especificaciones técnicas del caso.

2.3 ANALISIS DE OPORTUNIDAD:

Para cumplir las metas de los productos mediante los proyectos incluídas en los subprograma 7.5.1 SISTEMAS DE AGUA POTABLE, se encuentra inmerso el proyecto "CONSTRUCCION, OPTIMIZACION, HABILITACION, AMPLIACION, ESTUDIOS, DISEÑOS Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y POZOS PROFUNDOS DE LAS CABECERAS MUNICIPALES, RURALES Y CENTROS POBLADOS" del plan de desarrollo "Pensando en Todos" se requieren realizar la construcción, adecuación, optimización, ampliación y regulación de los

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. 416

sistemas de acueducto en la zona urbana y rural.

Existe un documento denominado "DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA, ALCALDIA DE PORE", con el cual el Alcalde Municipal avala, radica y solicita apoyo económico para el desarrollo de este proyecto, teniendo en cuenta que a través de su ejecución garantizara una mejor prestación de servicios públicos que mejorara la calidad de vida de la población del área rural, el diseño elaborado por la firma GEOHINTEL EU. siendo el diseñador el Ingeniero Omar Monsalve C. con M.P. 682 020 84 720 STD, levantamiento Topográfico por Luis Norberto Ascencio, Topógrafo con L.P. 00-4089 CNPT, Interventor Ing. Fernando Monsalve. Concepto técnico de la firma Ferreaguas, firmado por el Ing. Fabian Peralta, donde se hace da cuenta de las buenas condiciones del pozo perforado.

Se anexa diseño eléctrico elaborado por el Ing. Electromecánico, Héctor Gustavo Pérez M.P. 250 26907 BY, Teléfono 635 4124, se presento el proyecto a Enerca quien dio el certificado de disponibilidad de energía, el pasado 18/06/09.

De manera indirecta, esta inversión genera empleo al personal de la región, como son mano de obra no calificada y calificada. Personas que se beneficiarían durante la ejecución del contrato de obra, junto con la contratación de personal que opere los equipos requeridos para la ejecución de la obra y equipos menores. Además, también se generarían otros empleos indirectos, tales como las personas que suministren materiales, equipos, alimentación entre otros.

El proyecto es oportuno ejecutarlo pues se desea para la próxima época de verano contar con el servicio de agua potable, pues al disminuir los volúmenes de agua, se aumentan las concentraciones de hierro, y las comunidad se ven obligada a transportar por varios kilómetros el agua para su consumo, a veces se surten de cañadas y estanques contaminados aledaños a sus viviendas.

Es oportuno teniendo en cuenta que la Gobernación de Casanare cuenta con los recursos financieros para ejecutar las obras proyectadas, dado que el municipio no cuenta con el patrimonio necesario para llevar a cabo este proyecto.

Es oportuno teniendo en cuenta que la meta general del proyecto es aumentar la cobertura en la prestación de los servicios de agua potable en los diecinueve (19) municipios de Casanare

El proyecto es oportuno por cuanto el agua cruda con que se abastece la comunidad de la Vereda Agualinda del municipio requiere de procesos de tratamiento de acuerdo al informe de laboratorio con los resultados

Físico-químico, bacterológico y prueba de tratabilidad realizada al agua cruda del pozo profundo según informe nro. 0345 de fecha 5 de Junio de 2009, elaborada por la firma Ambitex.

El proyecto es oportuno por cuanto los beneficiarios establecidos por la Secretaria de Planeación y Obras Públicas de Pore surgen de la socialización, visitas de inspección e identificación de sus necesidades vitales y calidad de vida,. Adicionalmente los beneficiarios del proyecto firmaron una carta de compromiso y autorización para la construcción de las obras.

Los anteriores argumentos muestran que el proyecto es aceptado y por lo tanto viable técnica, económica y ambientalmente para la Vereda Agualinda del Municipio de Pore, según concepto de viabilidad favorable emitido por los Secretarios de Planeacion de Pore: Hugo Saavedra Goyeneche – septiembre 15 de 2008, Secretario de Planeación y Obras Miller Andrés Pérez Malagón- 8 de Julio de 2010- Jorge Ezequiel Garzón,

RMA7

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. _____

Alcalde Municipal

2.4 INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

La interventoría contratada será financiada con recursos del Departamento y deberá ejecutarse estrictamente, de acuerdo a la Resolución No. 256 de fecha 17 de Mayo de 2004 "Por la cual se adopta el manual del interventor versión 0 en el Departamento de Casanare", o el acto que la modifique o sustituya. Esta a su vez, estará bajo la supervisión del Secretario de Obras Públicas y Transporte del Departamento, según Decreto 0511 del 26 de junio de 2008, o por el que este designe.

3. DEFINICIÓN TÉCNICA

3.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR:

"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA, ALCALDIA DE POR, DEPARTAMENTO DE CASANARE",

Descripción Sistema de Acueducto: El diseño propuesto y avalado por la administración municipal y por el Banco de Proyectos Departamental, plasmada en el documento "DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA, ALCALDIA DE PORE" establece el nivel de complejidad del sistema como nivel bajo y el periodo de diseño de 20 años, de acuerdo a lo establecido en el RAS 2000.

El Acueducto para la Vereda Agualinda, es un sistema que trabajará por gravedad, con redes de tubería en PVC, las cuales llevarán el agua hasta los habitantes de la vereda. Existe un pozo profundo perforado a 80 metros, desde donde se sacará el agua, a un tanque elevado de almacenamiento; Posteriormente con la instalación de una planta de tratamiento se potabilizara el agua y desde allí se entregara a la red de distribución.

REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS.

Consiste en la referencia de los puntos de los cuales parte el levantamiento planimétrico y altimétrico.

Planimétrico. El amarre se hizo en el delta 1, ubicado en la base del tanque elevado que se encuentra construido en la actualidad este sería el punto de partida. se inició el levantamiento topográfico, abscisa K0+000, se subdivide en dos ramales (RAMAL 1 Y RAMAL 2), los cuales suministrarán agua a las viviendas.

Altimétrico. Debido a que no se encuentran puntos geodésicos ni topográficos en el sector, para referenciar el levantamiento altimétrico se colocó un BM de referencia con la misma estación de precisión al segundo.

Equipo utilizado. Para éste levantamiento planimétrico se utilizó una Estación Geodesica marca TOPCON con aproximación a 1" , también se utilizó, 1 Prisma. Cinta métrica, plomadas, brújula y herramienta menor.

3.2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DEL OBJETO A CONTRATAR:

GI BP

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. 1416

Para cumplir las metas del subprograma 7.5.1 SISTEMAS DE AGUA POTABLE, los productos de los estudios de factibilidad de los proyectos, debe realizar las siguientes actividades:


La Gobernación de Casanare Aportara el 100% de los recursos para la construcción del total de la obra física, se entregará una copia al Contratista de los Estudios y Diseños, con memoria de cálculo y planos, especificaciones técnicas particulares, contempladas en el proyecto radicado en la Gobernación de Casanare los cuales se encuentran disponibles en la planoteca de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte, la Alcaldía Municipal de Pore.

Para el logro del objetivo, una vez se haga la contratación respectiva, en el momento de la construcción de las obras, el Interventor de obra y la veeduría ciudadana verificaran que se cumpla con las especificaciones técnicas exigidas. El diseño debe contemplar el 100% de las actividades a realizar durante la ejecución de las obras

Los trabajos se desarrollarán con recursos del Departamento para la Obra Física a fin de lograr el correcto desarrollo del proyecto "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

El sistema esta conformado de los siguientes elementos:

1. Estructuras existentes. Se tiene perforado un pozo profundo ubicado en la finca "El guanero" de propiedad del señor Carlos Eduardo García con número celular 314 457 68 71 ubicado en las coordenadas: E=896.396, N=1.117.546 y esta localizado a una altura de 244 msnm. Este pozo fue perforado, hace aproximadamente 4 años, con una profundidad de 60 metros y un diámetro de 4 pulgadas, actualmente es el único beneficiario. Adicionalmente, se encuentra construido, en este sitio, un tanque de almacenamiento de agua en concreto reforzado, que se encuentra en estado aceptable, al cual se debe hacer limpieza y mantenimiento.
2. Construcción de Redes. Se construirá una red principal del acueducto en tubería PVC de diámetros desde 3" hasta 1/2" en los sitios de las acometidas de cada una de las 24 viviendas que conforman la población estimada de este proyecto, el sistema trabajará por gravedad. Es responsabilidad de la Administración Municipal, confeccionar la lista definitiva de usuarios que se beneficiaran con este proyecto.
3. Los cálculos de la red de distribución, están soportados en las carteras de topografía y finalmente se produjeron los planos respectivos.
4. Como el suministro de agua es desde un pozo profundo, se deberá construir una red de media y baja tensión, incluido un transformador trifásico de 15Kva, para energizar la electro bomba sumergible de 7.5 Hp de 2" x 2" trifásica.
5. Durante el recorrido de la red de tubería, están previstos la construcción de pasos elevados en los sitios de cañadas y/o depresiones del terreno. Se deben construir dos(2) cruces subfluviales menores, en razón a lo plano del terreno y a la presencia de ganado en las fincas.
6. Se tiene, el suministro y puesta en marcha de una planta de tratamiento, para potabilizar el agua extraída del pozo profundo. La planta deberá contar con los siguientes elementos:

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. _____

FLOCULACIÓN EN LECHO POROSO Un vez el agua entra en contacto con el coagulante se conduce hacia el tanque Floculador de lecho poroso, en donde se genera la agitación necesaria que permite la formación de los flocs y la cual se va haciendo menos intensa en la medida que el agua asciende hacia la parte superior del tanque, mientras pasa a través de un lecho gradado que proporciona las condiciones hidráulicas de gradiente de agitación diferencial optimas para una adecuada floculación. en la medida que se va generando los flocs estos comienzan a unirse entre si, haciéndose mas pesados para finalmente precipitarse al fondo del tanque para su posterior extracción.

FILTRACIÓN

Se lleva acabo en filtros rápidos de presurizados en flujo descendente y de lavado ascendente, compuestos por una serie de material gradado, arenas y antracita, que permiten la retención de partículas finas (microflocs) que no fueron retenidas en el procesos anteriores, cada filtro es independiente y puede ser sacado de operación temporalmente sin comprometer severamente el funcionamiento de la planta (esto con fines de mantenimiento). El sistema de retrolavado de filtros se realiza utilizando un tanque diseñado para tal fin, el cual mediante un juego sencillo de válvulas.

CLORACIÓN


Se utiliza un dispositivo hidráulico tipo Ventury en donde el agua tratada por la planta entra en contacto eficazmente con el desinfectante (hipoclorito de calcio en pastas) y de acuerdo a las mediciones de cloro residual en el tanque de almacenamiento se ajustara la perilla de graduación para la dosis de desinfectante a aplicar.

En caso de que el sistema instalado no cumpla es deber y responsabilidad del contratista identificar y hacer por su cuenta los ajustes hasta que se cumplan con las normas RAS 2000 y los decretos 479/98 y 1575/07, resolución 2115 del 22 de junio de 2007, normas y demás especificaciones técnicas nacionales vigentes para que brinden agua potable. La Interventoría Contratada no deberá recibir el sistema de tratamiento sin el cumplimiento de los requisitos de potabilidad

Se recomienda tener en cuenta que solo se les debe llegar con agua a las viviendas que se encuentren habitadas y no a las que estén desocupadas o con la promesa de ocupar. Lo anterior con el fin de optimizar los recursos y dar mejor cobertura en la prestación del servicio.

3.2.1 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO COMO ENTE EJECUTOR

- Adelantar los procedimientos contractuales necesarios respetando los principios constitucionales de la función administrativa y la gestión fiscal, el deber de selección objetiva y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades atendiendo para ello los principios consagrados en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás normas reglamentarias.
- Socializar el proyecto con la comunidad con el fin de instruirlos sobre los beneficios del proyecto, el impacto social, la inversión de recursos y su fuente, coordinar el tránsito de vehículos, transporte de materiales, accesos a predios, ingreso de personal, y demás acciones que se deban tomar para el buen desarrollo del proyecto.
- En caso de presentarse ajustes a los diseños originales, se debe hacer entrega a la Gobernación de Casanare de los correspondientes soportes técnicos donde se indique claramente el por qué, las alternativas de solución y una vez aprobada la alternativa más conveniente para el proyecto, hacer


 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. _____

entrega de las memorias de cálculo y planos debidamente aprobados por el Municipio, la Empresa de servicios públicos de Pore, la interventoría contratada, la supervisión, y el aval de consultor de los diseños originales.

- Garantizar, la potabilización del agua que se capte para el consumo de los usuarios, para ello presentará los resultados de análisis de agua, antes y después del tratamiento, certificados por un laboratorio de aguas de reconocimiento. Analizar y Verificar el cumplimiento del decreto 1575/07 y la resolución 2115 del 22 de junio de 2007 con los ensayos de laboratorio propuestos. (uno al inicio de la obra y uno a la entrega a satisfacción del municipio y beneficiario).
- Elaborar informes técnicos, financieros y de gestión que se requieran durante la ejecución del proyecto.
- Antes de dar inicio a las obras, deben estar viabilizados los permisos, licencias y demás documentos. Verificar que los permisos de servidumbre, los de propiedad de terreno donde se construyan estructuras permanentes, estén debidamente legalizados.
- Dar cumplimiento de los requerimientos ambientales, emanados de los organismos competentes.
- Ejecución de las actividades de acuerdo a las normas técnicas establecidas en el RAS 2000 y demás normas concordantes.
- Para la construcción de estructuras de concreto se debe dar cumplimiento al NSR-98 y al comité de la ACI 350 para el diseño de estructuras sanitarias de concreto para el mejoramiento del medio ambiente.
- Los materiales pétreos deben ser extraídos de fuentes establecidas y avaladas por Corporinoquia, y sus licencias estén vigentes durante la ejecución de la obra y en la cantidad requerida para el proyecto.
- Socializar el proyecto con la comunidad beneficiada, para coordinar el tránsito de materiales, accesos, ingreso de personal, entre otras.
- Velar por el cumplimiento oportuno de los requerimientos ambientales, técnicos, sociales y económicos establecidos por Corporinoquia y el diseñador del proyecto.
- Revisar los planos y especificaciones técnicas del proyecto. Elaboración de planos record, entrega en medio físico y magnético, carteras topográficas con localización geográfica según plantillas IGAC, Registro fotográfico, Memoria de Cálculos de cantidades hidráulicas,
- Aportar la capacidad técnica, administrativa, económica y financiera para el buen desarrollo del proyecto.
- Iniciar la ejecución de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminación en el tiempo establecido.
- Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestión y demás documentos que se requieran durante la ejecución del proyecto.

g

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01


No. _____

- Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad el interventor y el supervisor del departamento
- Verificar que los usuarios se encuentren en los listados presentados en el diseño y cobijados en el permiso de Corporinoquia.
- Garantizar el suministro de agua potable certificada por la Secretaría de Salud a los beneficiarios unifamiliares del proyecto.
- Ejecutar todo tipo de actividades tendientes a capacitar, operar, puesta en marcha y funcionamiento de sistema para la potabilización del agua, asegurando el cumplimiento del decreto 1575/07 y la resolución 2115 del 22 de junio de 2007, elaborar análisis de vulnerabilidad, manuales de puesta en marcha y operación de la planta de tratamiento (con copia al beneficiario, empresa, Alcaldía y Gobernación de Casanare),
- Abrir cuenta de ahorros en entidad Bancaria Local o Regional, a nombre del proyecto, que genere rendimientos financieros, obligándose a entregar al Departamento los rendimientos financieros que se causen una vez se termine la ejecución del proyecto.
- El ente ejecutor exigirá a sus contratistas la garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato que celebren, como son: Garantía de seriedad de la propuesta, Buen manejo y correcta inversión del anticipo, cumplimiento general del contrato, pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, responsabilidad civil extracontractual, estabilidad y calidad de la obra y calidad del bien y servicio, de conformidad a lo estipulado en el artículo 7 de la ley 1150 del 2007 y el artículo 1 del decreto 2496 del 2009, y demás normas concordantes.
- Realizar la Liquidación del convenio con aprobación de la Interventoría, la Supervisión de la Gobernación, el Municipio de Pore y Empresas Públicas Aguas de Pore, como entidad encargada de la prestación de los servicios públicos.
- El municipio de Pore y la Empresa de servicios Públicos de Pore se hace responsables por el mantenimiento, puesta en marcha y funcionamiento del acueducto de la Vereda Agualinda
- Reintegrar los rendimientos financieros que se causen.

Los trabajos que se desarrollarán con recursos del Departamento y para lograr el correcto desarrollo del producto del Objeto a contratar que es "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE" se tienen las siguientes cantidades de obra

CUBS	Código	Ítem	Descripción	Und	Cant
		1	RED DE DISTRIBUCION		
3.2.1.10	5133	1.01	REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO, PAGADOS POR METRO LINEAL	ml	21,229.50
3.2.1.3	5138	1.02	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO ENTRE 1-2 MTS (ZANJAS ANGOSTAS)	m³	5,095.08
3.2.2.1	5603	1.03	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 4"	ML	2,044.00


WAT

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. _____

3.2.2.1 ✓	5602	1.04	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 3"	ml	5,749.00
3.2.2.1 ✓	5494	1.05	Suministro e instal. tubería presión PVC RDE 13,5 1/2"	ml	642.00
3.2.2.1.96 ✓	5503	1.06	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA PRESION RDE 21 3/4"	ml	4,680.00
3.2.2.1.97 ✓	4856	1.07	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA PRESION RDE 21 1"	ml	3,406.00
3.2.2.1.98 ✓	5569	1.08	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA PRESION RDE 21 1 1/2"	ml	3,120.60
3.2.2.1.99 ✓	5597	1.09	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 2 "	ml	1,159.00
3.2.2.1.100 ✓	5599	1.10	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 2 1/2"	ml	428.90
3.2.1 ✓	135	1.11	CAJA DE INSPECCION 60 X 60	un	25.00
3.2.2.3 ✓	5476	1.12	SUMINISTRO E INSTAL. VALVULA DE BOLA 2 1/2"	un	4.00
3.2.2.3 ✓	4618	1.13	Válvula de corte 1 1/2". Suministro e Instal.	un	6.00
3.2.2.3 ✓	4110	1.14	Válvula de corte 1/2". Suministro e Instal.	un	25.00
3.2.2.3 ✓	6745	1.15	Válvula de corte 3/4". Suministro e Instal.	un	20.00
3.2.2.3 ✓	6139	1.16	Válvula de corte 1". Suministro e Instal.	un	18.00
3.2.2.3 ✓	4618	1.17	Válvula de corte 1 1/2". Suministro e Instal.	un	15.00
3.2.2.3 ✓	5158	1.18	Válvula de corte 2". Suministro e Instal.	un	14.00
3.2.2.3 ✓	5565	1.19	Suministro e Instal. Válvula de bola 3".	un	10.00
3.2.2.3 ✓	5398	1.20	Suministro e Instal. Válvula de bola 4".	un	8.00
3.2.2.4 ✓	6124	1.21	SUMINISTRO E INSTAL. BUJE SOLDADO 1 x 3/4"	un	25.00
3.2.2.4 ✓	5666	1.22	SUMINISTRO E INSTAL. CODO GRAN RADIO 2 1/2"	un	10.00
3.2.2.4 ✓	6419	1.23	SUMINISTRO E INSTAL. BUJE SOLDADO 3 x 2 "	un	1.00
3.2.2.4 ✓	5424	1.24	SUMINISTRO E INSTAL. BUJE SOLDADO 2 1/2 x 2"	un	5.00
3.2.2.4 ✓	6566	1.25	SUMINISTRO E INSTAL. CODO PRESION PVC 45 ° 1 1/4"	UN	20.00
3.2.2.4 ✓	5733	1.26	SUM E INSTALC. COLLAR DE DERIVACION PVC 2" X 3/4 "	IN	25.00
3.2.1.5.6 ✓	5832	1.27	RELLENO AN ARENA LAVADA APISONADA PARA ATRAQUE DE TUBERIA, PAGADO EN M3	m³	1,019.02
3.2.1.5.3 ✓	3904	1.28	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO, PAGADO M3	m³	3,566.56
3.2.1.6 ✓	71	1.29	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	m³	509.51
3.6.9.3 ✓	62	1.30	TRANSPORTE DE MATERIAL A LOMO DE MULA (Viaje de 100 Kg)	vje	8,590.00
			PASO ELEVADO		
3.3.1.6.1 ✓	3052	1.31	REPLANTEO GENERAL, MEDIDO EN M2	m2	298.00
3.3.2.2 ✓	5820	1.32	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO ENTRE 1-2 MTS (ZANJAS ANGOSTAS)	m³	28.20
3.3.6 ✓	329	1.33	BASE CONCRETO POBRE 2000 PSI e = 0,05 m	M2	19.68
3.3.6.1 ✓	76	1.34	ZAPATA EN CONCRETO PARA CIMENTACION RESISTENCIA 3000 PSI	m³	3.03
3.3.6.6 ✓	333	1.35	COLUMNA EN CONCRETO RESISTENCIA 3000 psi	m³	1.08
3.3.6.8.2 ✓	5067	1.36	ACERO DE REFUERZO GRADO 60, PAGADO EN KG	KG	340.00
3.3.7 ✓	5964	1.38	SUMINISTRO E INSTAL. CABLE IPS - IWRC, 6*19 A/A, Ø 1/2"	ml	121.04

RMH

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO		VERSION:01

No. 6

3.3.7	✓	6393	1.39	PENDOLON GUAYA 3/8" CON SOPORTE PARA TUBERIA DE 90 A 25 mm SIN CONTRAVIENTOS	un	115.32
3.3.7	/	2226	1.40	PLATINA DE ANCLAJE 1/4" 0.15x0.20, INCLUYE PERNOS	un	16.00
3.2.1.5.3	/	3904	1.41	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO, PAGADO M3	m³	8.85
				PASO SUBFLUVIAL		
3.3.1.6.1	/	3052	1.42	REPLANTEO GENERAL, MEDIDO EN M2	m2	40.00
3.3.2.2	/	5511	1.43	Excavación a mano en conglomerado Bajo agua pagado en m3, a una profundidad de 2 m	m³	12.00
3.3.6.1	/	5346	1.44	Concreto ciclópeo de resistencia 3000 psi, pagado en m3	M3	10.00
			2	MEDIA TENSION		
3.4.7	✓		2.01	REPLANTEO RED MEDIA TENSION	km	1.90
3.4.7	/		2.02	APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE	un	17.00
3.4.7	✓		2.03	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCEMENTO 12 mtsx 510 kgs	un	11.00
3.4.7	✓		2.04	SUMINISTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA DE PASO LAR 202 (P- 101)	un	10.00
3.4.7	/		2.05	SUMINISTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA DE RETENCION LA 213 (R560)	un	2.00
3.4.7	/		2.06	SUMINISTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA DE CORTACIRCUITOS	un	1.00
3.4.7	/		2.07	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE ACSR 2 HILOS MEDIA TENSION (1xNo. 2)	ml	479.00
3.4.7	/		2.08	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE ACSR 3 HILOS MEDIA TENSION (3xNo. 2)	ml	1,900.00
3.4.7	/		2.09	SUMINISTRO E INSTAL. DE TEMPLETES MEDIA TENSION	un	6.00
3.4.7	/		2.10	SUMINISTRO E INSTAL. DE AISLADOR DE PIN CON ESPIGO EXTREMO DE POSTE	un	3.00
3.4.7	/		2.11	SUMINISTRO E INSTAL. DE CADENA DE AISLADORES	un	3.00
			3	BAJA TENSION		
3.4.7	/		3.01	APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE	un	3.00
3.4.7	/		3.02	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCEMENTO 8 mtsx 510 kgs	un	1.00
3.4.7	/		3.03	SUMINISTRO E INSTAL. DE TEMPLETES BAJA TENSION	un	2.00
3.4.7	/		3.04	SUMINISTRO E INSTAL. DE PERCHA TRES PUESTOS	un	2.00
3.4.7	✓		3.05	SUMINISTRO E INSTAL. DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3 x No 6 + 1 x No 8 THHNW AWG,INCLUYE MEDIDOR TRIFASICO 220 v 20-80 Amp. CAJA PARA MEDIDOR Y BREAKER TRIFASICO DE 3x 50 Amp.	un	1.00
3.4.7	/		3.06	SUMINISTRO E INSTAL. DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 4 x No. 8 AWG	ml	100.00

12/11/07

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. _____

3.4.7	/		3.07	SUMINISTRO E INSTAL. DE TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON TABLERO Y Y CHAPA, Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 3x50 AMP Y UN BREAKER TRIFASICO TERMO MAGNETICO DE 3x20 AMP Y UN BREAKER TRIFASICO TERMO MAGNETICO DE 3x15 AMP	un	1.00
3.4.7	/		3.08	SUMINISTRO E INSTAL. DE DUCTO PVC 3x1", INCLUYE ZANJA	ml	50.00
3.4.7	/		3.09	SUMINISTRO E INSTAL. DE PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE	un	1.00
			4	SUBESTACIONES		
3.4.7	/		4.01	SUMINISTRO E INSTAL. DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 15 KVA 13.2 kv - 240/120v	un	1.00
3.4.7	/		4.02	SUMINISTRO E INSTAL. DE PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE	un	1.00
3.4.7	/		4.03	REVISION DE CONFORMIDAD RETIE PARA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION	km	1.90
			5	POZO PROFUNDO		
3.1.5	/	7080	5.01	SUMINISTRO E INSTAL. DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 7,5 HP 2"x2" TRIFASICA, TIPO LAPICERO, INCLUYE TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	un	1.00
3.1.5	/	804	5.02	CABLE ENCAHUCHETADO 3 X 8 AWG, SUMI E INSTALC.	ML	70.00
3.1.5	/	6101	5.03	Registro electrico del pozo con sonda SP, Gamma Ray Resistividad	ml	80.00
3.1.5	/	6106	5.04	Limpieza y desarrollo de pozo profundo con compresor	h	36.00
3.1.5	/	858	5.05	Tuberia de Produccion, A.C. Ø=2" SCH 40, incluye el Sum e Instal.	m	70.00
3.1.5	/	881	5.06	Prueba de bombeo - minimo 24 horas	und	1.00
3.1.5	/	6105	5.07	Sello sanitario Placa base en Concreto 3000 Psi 1.0 x 1.0 x 0.08. Incluye alimentador gravilla Ø 1 1/2" y Tapon roscado	und	1.00
			6	MANTENIMIENTO A TANQUE ELVADO EXISTENTE		
3.3.1.1	//	1972	6.01	PICADA DE PISOS Y MUROS DEL TANQUE EXISTENTE CON RETIRO DE ESCOMBROS	m2	57.80
3.3.5	//	6950	6.02	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MURO 1:4	m2	40.00
3.3.10	/	6041	6.03	Alistado de piso impermeabilizado e=, 04 mts	m2	22.60
3.3.19.6	/	6770	6.04	Pintura exterior vinilo koraza 3 manos	m2	40.00
			7	PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE		
3.2.5	/	6954	7.01	Sum e instal y puesta en marcha. Planta de Tto de Agua Potable	un	1.00
3.2.5	/	7082	7.02	Sistema de cloración por tabletas (Hipoclorador Accu-tab, inc. accesorios)	und	1.00
3.2.5	/	7083	7.03	Torre de aireacion de 6 bandejas en fibra de vidrio 0.90 m x 0.90 m (Inc. accesorios)	und	1.00

RAB7

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO		VERSION:01

No. 16

3.2.5	7081	7.04	Suministro e instal. Filtro en grava, flujo ascendente (Lam. cal 14 recubierta en pintura de caucho, inc. grava)	und	1.00
3.2.2.1	4862	7.05	TUBERIA EN PVC 2" RDE 21 PARA SUCCION Y DESCARGA	ML	50.00
3.2.2.3	218	7.06	Válvula de bola en H.D. 2"	un	10.00
3.1.5	6981	7.07	Análisis físico - químico de agua- tratabilidad- DBO - Cloro y demás ensayos para un diagnostico completo	und	2.00
8 INSTALACIONES PARA PLANTA					
3.3.1.6	3052	8.01	REPLANTEO GENERAL, MEDIDO EN M2	m2	25.00
3.3.1	3052	8.02	LIMPIEZA Y DESCAPOTE (INCLUYE ACARREO)	m2	25.00
3.3.2.2	5138	8.03	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	3.00
3.3.6.1	5060	8.04	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 2000 psi	m3	1.50
3.6.6.17	6927	8.05	Bordillo 10 x 40 cm fundido en concreto 3000 psi	ML	40.00
3.2.1.5.3	3904	8.06	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO, PAGADO M3	M3	4.80
3.3.10	7077	8.07	PISO EN CONCRETO 3000 PSI e=0,12 MTS	M3	1.92
3.3.5	6401	8.08	PAÑETE LISO (ALLANADO) MUROS 1:3, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, PAGADO EN M2	M2	28.00
3.3.7	6669	8.09	Perfil estructural circular 4"*5 mm para estructura de cubierta, instalado.	ml	18.00
3.3.7	1995	8.10	Perfil estructural circular 2"*3 mm para estructura de cubierta, instalado.	ml	80.00
3.3.9.4	6726	8.11	CUBIERTA EN TEJA TIPO TERMIACUSTICA ONDULADA, PAGADA EN M2	M2	96.00
3.3.6.1	4441	8.12	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO PARA CIMENTACION DE RESISTENCIA 3000 PSI, PAGADO EN M3	M3	1.60
3.3.6.8.2	5067	8.13	ACERO DE REFUERZO GRADO 60, PAGADO EN KG	KG	70.00
3.3.6.8	5066	8.14	ACERO DE REFUERZO GRADO 37, PAGADO EN KG	KG	100.00
3.3.7	6108	8.15	TUBO GALVANIZADO 2" CON BRAZO PORTAPUAS (CERRAMIENTO -INCLUYE PIE DE AMIGOS ESQUINAS E INTERMEDIOS)	ML	14.00
3.3.1.4	2231	8.16	CERRAMIENTO EN MALLA CAL. 10 CON PLATINA DE ADHESION AL TUBO Y ANGULOS AGARRE SUPERIOR E INFERIOR CON ANTICORROSIVO	M2	52.00
3.3.4	7050	8.17	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO 12 cm (24.5 x 5 x 12)	M2	28.00
3.3.1.4	6110	8.18	ALAMBRE DE PUA CAL. 12 3 HILOS	ML	40.00
3.3.1.4	6611	8.19	PORTON EN MALLA ESLABONADA CAL. 10 Y TUBO H.G. 2" (ANTICORROSIVO Y PINTURA)	UN	1.00

Todos los materiales usados deben cumplir con los requerimientos técnicos requerido por la normatividad vigente para este tipo de obra y ser avalados por la respectiva interventoría.

Fuentes y distancias consideradas para la consecución de materiales en el Presupuesto:

FUENTE O SITIO	UBICACION	TIPO DE MATERIAL	DISTANCIAS	
			PAVIMENTADO	DESTAPADO

RAM

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. 116

Bocas de Pore	Via Pore - Trinidad	Triturado -arena	7 Km	2 Km
	Pore	Ferreteria	14 Km	9 Km

Liquidación de la Obra y del Contrato

La obra terminada se debe entregar a la comunidad beneficiaria, quienes deben certificar la existencia del trabajo y la llegada del agua potable a sus viviendas. El recibo de la obra y liquidación del contrato, cuya obligación radica única y exclusivamente en la interventoría, quien será la encargada de vigilar la ejecución del proyecto en la parte técnica, administrativa, financiera y ambiental, y así mismo informarle al Supervisor Designado por el Departamento, para lo cual deberá:

- Presentar informe final y acta de recibo final de obra, acta de entregar a la comunidad ✓
- Presentar acta de liquidación final de obra ✓
- Presentar copia de consignación de los rendimientos financieros. ✓
- Originales de los resultados de laboratorio, del agua analizada. ✓
- Paz y salvo y recibo de conformidad de cada uno de los beneficiarios, a los que se les construya el proyecto. ✓
- Como producto final de este proyecto, el ente ejecutor deberá entregar un informe detallado en la cual incluya las cantidades de obra, memorias de calculo, listado de beneficiarios a los que se les construyo el sistema y recomendaciones o ajustes que se requieran ✓

Toda la información deberá entregarse en medio físico y magnético, actas, registro fotográfico, visitas de obra, informe técnico y demás documentación pertinente.


Es de precisar que es requisito indispensable para el recibo de la obra, por parte de la interventoría y posteriormente por la Gobernación, que el sistema de tratamiento construido por el contratista, cumplan con los parámetros de calidad de agua potable establecidos en las normas vigentes, respecto del análisis físico – químico y bacteriológico. ✓

4. SOPORTE TÉCNICO Y ECONÓMICO

4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR:

- Para asegurar un soporte técnico en la contratación de la obra física; se requiere contratar con la persona natural o jurídica, individualmente o asociadas en consorcio o unión temporal, conformados en los términos establecidos en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y sus normas reglamentarias; que este en capacidad de ejecutar el objeto del contrato en los términos del artículo 6 de la ley 80 de 1993 y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el objeto y como mínimo en su equipo

12/17

 GOVERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. 18

de trabajo tener un director y residente de obra, cuyos perfiles profesionales correspondan como Ingeniero Civil o Ambiental y/o Sanitario

- Se debe cumplir con la legislación vigente que corresponda como lo son: RAS 2000. Decreto 1594/84, ley 142/94, se debe cumplir en caso de Estructuras y Construcciones en concreto y Estructuras Metálicas relacionadas deben seguir las Especificaciones Constructivas de la Norma NSR-98 y las NTC vigentes que correspondan.
- Especificaciones se pueden consultar en el manual de Especificaciones Técnicas de Construcción de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte de la Gobernación de Casanare.
- En caso de presentarse errores u omisiones o discrepancias entre las especificaciones técnicas, datos y cantidades de obras físicas al Objeto del presente proyecto, el contratista podrá sugerir y solicitar cambios o modificaciones con el visto bueno del interventor Contratado y del Supervisor de obras que se designe.
- Para la construcción, instalación y puesta en marcha de la planta de tratamiento, se deben atender las recomendaciones del proveedor.
- Para la cuantificación de los valores, en la elaboración de los presupuestos se deben tener en cuenta que las fuentes de materiales pétreos como la arena sucia de río para encamado y atraque de la tubería, material de rellenos; se encuentren con los permisos ambientales

4.2 SOPORTES TECNICOS:


El proyecto inscrito, viabilizado y revisado en el Banco de Programas y Proyectos Departamental, corresponde al subprograma 7.5.1 "Sistema de agua potable"; proyecto Construcción, optimización, habilitación, ampliación, estudios, diseños y mantenimiento de las redes del acueducto, sistemas de tratamiento de agua potable y pozos profundos de las cabeceras municipales, rurales y centros poblados, código SSEPI No. 2008-085000-0021; el componente del proyecto es Etapa de inversión - Adquisición de bienes, servicios y obra pública.

La " GOBERNACION DE CASANARE " aportara los recursos necesarios para la "CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA, ALCALDIA DE PORE", y así poder ampliar las coberturas de agua potable en el sector rural, con la continuidad, estabilidad, eficiencia y sostenibilidad esperada en el sistemas de Acueducto; el Municipio realizara todo lo relacionado a la contratación de las obras, implementar normas, adecuarse a las necesidades actuales, mejorar y optimizar los servicios, y realizar campañas con el fin de que la comunidad beneficiada se concencie y entienda cual es su verdadera responsabilidad con respecto a los deterioros ambientales y del uso eficiente y ahorro de agua.

La Gobernación de Casanare a través de la Secretaria de Obras Públicas y Transportes del Departamento ha estimado necesario viabilizar el proyecto de "CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA, ALCALDIA DE PORE", por un Valor de MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE (1.218.086.276), el cual beneficiara a 36 familias según listado que se encuentra en plano general de la red de distribución, firmado por el Secretario y Planeación de Pore Ing. Miller Andrés Pérez y el Ing Fernando Monsalve Galindo MP. 68202-06878 STD

Corporinoquia, expidió la Resolución No 200.41.09.0930 de fecha 28 de Agosto de 2009, por la cual se otorga una concesión de aguas subterráneas al municipio de Pore, para el Acueducto de la vereda Agualinda.

Para garantizar el funcionamiento del pozo profundo, la administración municipal, solicito a Ferreaguas, la inspección y recomendación del estado del pozo, quien según informe de febrero 8 de 2008, se reporta como

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. _____

en buenas condiciones.

Para la planta de tratamiento se aporta un documento de la firma Aguatecnicos, de fecha 9 de Junio de 2010, firmada por el Ing. Jorge Pérez, donde se hacen las recomendaciones de la planta con capacidad 1 l/s.

Como soporte técnico, se tiene el diseño de la planta de tratamiento, realizado por la Firma AGUATECNICOS, firmada por el ING. Jorge Pérez, donde se tomo como base los muestreos del agua del pozo profundo realizados por le Laboratorio de ingeniería AMBITEST Ltda., dando como resultado que esta planta deberá tener los siguientes procesos: Floculación; Sedimentación; Filtración; Desinfección, Consumo de Químicos.

4.3 SOPORTES LEGALES:

El artículo 287 de la Constitución Política señala que las Entidades Territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites que consagra la Constitución y la Ley, con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la denegación y la desconcentración de funciones, previstos en el artículo 209.

Dicha viabilidad Constitucional, se va enmarcando dentro de los preceptos que en los diferentes componentes del proyecto se van tipificando así:


a) Componente Administrativo y financiero : En aplicación de lo previsto las leyes 152 de 1.994, (Plan de Desarrollo) en concordancia, la Ordenanza No. 004 de Mayo 24 de 2008 mediante la cual se aprobó el plan de Desarrollo Departamental: 2008 -2011 "Pensando en todos" Casanare, territorio de equidad social; fuerza agroindustrial del llano; Reto VII "INTEGRACION Y AFIRMACION TERRITORIAL: ACUERDOS FUNDAMENTALES HACIA EL DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE URBANO Y RURAL" en el programa 7.5 ESTABLECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE UNA PLANIFICACION EFECTIVA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, en el subprograma 7.5.1 "SISTEMAS DE AGUA POTABLE.", en el artículo 345 de la Constitución Nacional en materia de (Presupuesto), en concordancia con las leyes 756 y 781 de 2002, los Decretos 1747 de 1995, 416 de 2007 (Regalías); Plan de Compras; Ley 99/94 (Ambientales); Ley 598 de 2000 y Decreto 3512 de 2003 (SICE).

b) Componente Técnico: En aplicación de lo previsto en las siguientes normas: Leyes 141 y 142 de 1994 (Servicios Públicos); Ley 400 de 2000 (Código de Sismo resistencia); NSR-98; RAS 2000; resolución No. 2663 del 21 de julio de 2008 del Ministerio de Transporte para los costos de transporte en el territorio Nacional. Ambientales (Ley 99/93): Permiso de concesión de aguas subterráneas para el acueducto de la vereda agualinda de Pore. Permisos y servidumbres:

c) Componente Legal o normativo: Además de las normas identificadas citadas para los anteriores componentes, aplica en general lo previsto en los Artículos. 2º,6º, 29, 209, 287 de la Constitución Nacional; Ley 80/93 arts. 24, Numeral 1º; Ley 1150/07 art. 2º numeral 1º; Decreto 2474/08 Art. 2º numeral 1º, y Art 14; Decreto 2493/09.

Dentro del anterior marco normativo general y especial, encuadran los componentes específicos del proyecto, en aplicación del principio de planeación previsto en el artículo 3º del Decreto No. 2474 de 2008 en concordancia con el artículo 25 numerales 7 y 12 de la ley 80 de 1993

2007

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. 0041416

Dar cumplimiento al art. 3 Decreto 851 del 13 de marzo de 2009.

Como soporte legal del proyecto, la administración municipal de Pore, realizo socialización del proyecto el día 3 de Julio, con la comunidad beneficiaria.

En el documento del diseño se anexa las constituciones de servidumbre de la comunidad para conceder Permisos de Servidumbre y Transito de materiales para la construcción de la obra. A continuación se relacionan parte de los permisos:

Nro	Propietario	Identificación	Nombre Finca
1	Oscar Barreto	3.297.129	Betania
2	Epimenio Martínez	7.361.281	La Rubiera
3	Israel Pidiache Inocencio	4.214.757	
4	Luis Olivo Girón Ortiz	1.117.749	
5	Margarita Guanoy	24.414.315	La Dorada
6	José Tabaco	4.184.235	Guanero
7	Arcadio Gómez Pregonero	4.214.263	Los Jazmines
8	Elviatila Ortiz	23.936.356	Puerto Escondido
9	José Antonio fuentes	74.897.067	Algarrobo
10	Elías Giron	4.214.333	El Palmar
11	Luciano Tumay	1.117.424	La Florida
12	Luz Marina Salamanca	23.937.298	La Carigua
13	Pedro Manuel Meche	4.214.452	Punto fijo
14	José Rafael García	6.750.575	El Sinai
15	Manuel Meche	74.862.708	La Mocoya
16	Raúl Chavita	763.897	Bella Vista
17	Didier Alberto Martínez	74.862.709	Palmarito
18	Maria Cristina Tumay	23.936.709	Algarrobo
19	Hilda Maria Ruiz	23.466.871	La Esperanza

RM7

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. 1415

20	Oscar Barreto Silva	74.862.304	La Sonrisa
----	---------------------	------------	------------

4.4 SOPORTES AMBIENTALES:

Concretamente para el proyecto de "CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA, ALCALDIA DE PORE", la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia emitió la Resolución No 200.41.09.0930 de fecha 28 de Agosto de 2009 emitida por Corporinoquia, por medio de la cual Resuelve: otorgar al Municipio de Pore, la concesión de aguas subterráneas para el Acueducto de la Vereda Agualinda

Es importante resaltar que los materiales pétreos o de construcción a utilizar, deberán ser adquiridos en fuentes autorizadas

Se tiene el consentimiento y aprobación del propietario del predio, señor Carlos García donde esta perforado el pozo profundo, para continuar con las actividades de construcción del sistema del acueducto.(se anexa el permiso autorizando el servicio del pozo profundo)


4.5 SOPORTE ECONOMICO:

Según Decreto 3512 del 2003, artículo 13, parágrafo: "Cuando el estudio de precios del mercado basado en información del SICE no incluya las características especiales de los bienes y servicios de uso común o de uso en contratos de obra a adquirir, la entidad, además de la consulta en el SICE, podrá efectuar los estudios de mercado adicionales que considere necesarios"; basados en lo anterior y ya que no se encuentran los precios indicativos georeferenciados necesarios para elaborar los respectivos presupuesto oficiales, se celebro el contrato de Consultoría No. 258-2004, entre el Departamento Administrativo de Planeación y la firma Legis S.A. "Estudio de precios del mercado para insumos de obra civil", adicionalmente La Secretaria de Obras Publicas con su dependencia Oficina de Programación de Obras adelanto la revisión y los ajustes correspondientes para la región realizando estudios del mercado para: alquiler de vehículos, puentes en tubería petrolera, tarifas de transporte, alquiler de maquinaria, materiales pétreos, remuneración de servicios, insumos, tarifa mano de obra y estudio de precios de insumos, los cuales son soporte para determinar el precio de una actividad y que se implemento con el software suministrado por el Contratista y denominado CONSTRUPLANPLUS NG.

Posteriormente se realizo el Contrato de Consultoría No.0518 de 2005 con la corporación gerencia de Proyectos-GP CORPORACIÓN y cuyo objeto "revisión, actualización y creación de análisis de precios unitarios para Saneamiento Básico y Vías sistematizado bajo software Microsoft Access y cuya finalidad fue la obtención de información y soportes requeridos típicos para cada actividad, proveedores, fuentes de material, precios de insumos, mano de obra y equipos; la sistematización de la información en bases de datos bajo la plataforma Microsoft Access, en CONTRUPLAN NG versión1.5 de Noviembre 8 de 2005 de LEGIS S.A.-CONSTRUDATA. Adicionalmente la secretaria de obras publicas con su dependencia oficina de programación adelanta la revisión y los ajustes correspondientes para la región actualizando los precios de insumos para realizar los presupuestos a través de cotizaciones para: Alquiler de vehiculos, tarifas de transporte, alquiler de maquinaria, materiales pétreos, remuneración de servicios, insumos, tarifa mano de obra; los cuales son soporte para determinar el precio de una actividad.

Los códigos internos del presupuesto, son los generados desde el programa CONSTRUPLAN NG.

DM

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01


No. _____

Adicionalmente se realizo verificación de cada uno de las actividades, en el SICE, entregando el sistema los respectivos CUBS

El resultado es la obtención de un presupuesto concertado y del análisis de alternativas de solución en mesas de trabajo y comité técnicos conjuntos entre la Secretaria de Obras Públicas y Transportes, Oficina Asesora de Programación de Obras y el Municipio para el proyecto teniendo en cuenta las necesidades, especificaciones técnicas y la socialización del proyecto, los precios de las actividades eléctricas fueron consultadas con la base de datos de la oficina de asuntos energéticos.


Presupuesto General para "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CUBS	Cod	Item	Descripción	Und	Cant	Vlr Unit	Vlr Total
		1	RED DE DISTRIBUCION				
3.2.1.10	5133	1.01	REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO, PAGADOS POR METRO LINEAL	ml	21,229.50	1,352	28,702,284.00
3.2.1.3	5138	1.02	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO ENTRE 1-2 MTS (ZANJAS ANGOSTAS)	m³	5,095.08	35,065	178,658,980.20
3.2.2.1	5603	1.03	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 4"	ML	2,044.00	26,540	54,247,760.00
3.2.2.1	5602	1.04	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 3"	ml	5,749.00	16,442	94,525,058.00
3.2.2.1	5494	1.05	Suministro e instal. tuberia presion PVC RDE 13,5 1/2"	ml	642.00	2,423	1,555,566.00
3.2.2.1.96	5503	1.06	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA PRESION RDE 21 3/4"	ml	4,680.00	3,261	15,261,480.00
3.2.2.1.97	4856	1.07	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA PRESION RDE 21 1"	ml	3,406.00	4,609	15,698,254.00
3.2.2.1.98	5569	1.08	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA PRESION RDE 21 1 1/2"	ml	3,120.60	9,382	29,277,469.20
3.2.2.1.99	5597	1.09	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 2 "	ml	1,159.00	9,036	10,472,724.00
3.2.2.1.100	5599	1.10	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 2 1/2"	ml	428.90	13,334	5,718,952.60
3.2.1	135	1.11	CAJA DE INSPECCION 60 X 60	un	25.00	190,398	4,759,950.00
3.2.2.3	5476	1.12	SUMINISTRO E INSTAL. VALVULA DE BOLA 2 1/2"	un	4.00	207,681	830,724.00
3.2.2.3	4618	1.13	Valvula de corte 1 1/2". Suministro e Instal.	un	6.00	203,173	1,219,038.00
3.2.2.3	4110	1.14	Valvula de corte 1/2". Suministro e Instal.	un	25.00	46,220	1,155,500.00
3.2.2.3	6745	1.15	Valvula de corte 3/4". Suministro e Instal.	un		58,968	1,179,360.00

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		CÓDIGO: RAB00-02-1
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO		VERSION:01

No. _____


					20.00		
3.2.2.3	6139	1.16	Valvula de corte 1". Suministro e Instal.	un	18.00	78,488	1,412,784.00
3.2.2.3	4618	1.17	Valvula de corte 1 1/2". Suministro e Instal.	un	15.00	132,636	1,989,540.00
3.2.2.3	5158	1.18	Valvula de corte 2". Suministro e Instal.	un	14.00	208,112	2,913,568.00
3.2.2.3	5565	1.19	Suministro e Instal. Valvula de bola 3".	un	10.00	184,779	1,847,790.00
3.2.2.3	5398	1.20	Suministro e Instal. Valvula de bola 4".	un	8.00	270,603	2,164,824.00
3.2.2.4	6124	1.21	SUMINISTRO E INSTAL. BUJE SOLDADO 1 x 3/4"	un	25.00	3,746	93,650.00
3.2.2.4	5666	1.22	SUMINISTRO E INSTAL. CODO GRAN RADIO 2 1/2"	un	10.00	29,993	299,930.00
3.2.2.4	6419	1.23	SUMINISTRO E INSTAL. BUJE SOLDADO 3 x 2 "	un	1.00	15,655	15,655.00
3.2.2.4	5424	1.24	SUMINISTRO E INSTAL. BUJE SOLDADO 2 1/2 x 2"	un	5.00	13,087	65,435.00
3.2.2.4	6566	1.25	SUMINISTRO E INSTAL. CODO PRESION PVC 45 ° 1 1/4"	UN	20.00	5,327	106,540.00
3.2.2.4	5733	1.26	SUM E INSTALC. COLLAR DE DERIVACION PVC 2" X 3/4 "	IN	25.00	8,815	220,375.00
3.2.1.5.6	5832	1.27	RELLENO AN ARENA LAVADA APISONADA PARA ATRAQUE DE TUBERIA, PAGADO EN M3	m³	1,019.02	40,411	41,179,455.58
3.2.1.5.3	3904	1.28	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO, PAGADO M3	m³	3,566.56	16,458	58,698,378.65
3.2.1.6	71	1.29	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	m³	509.51	13,420	6,837,597.36
3.6.9.3	62	1.30	TRANSPORTE DE MATERIAL A LOMO DE MULA (Viaje de 100 Kg)	vje	8,590.00	24,000	206,160,000.00
			PASO ELEVADO				
3.3.1.6.1	3052	1.31	REPLANTEO GENERAL, MEDIDO EN M2	m²	298.00	3,773	1,124,354.00
3.3.2.2	5820	1.32	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO ENTRE 1-2 MTS (ZANJAS ANGOSTAS)	m³	28.20	35,065	988,833.00
3.3.6	329	1.33	BASE CONCRETO POBRE 2000 PSI e = 0,05 m	M2	19.68	16,102	316,887.36
3.3.6.1	76	1.34	ZAPATA EN CONCRETO PARA CIMENTACION RESISTENCIA 3000 PSI	m³	3.03	623,695	1,889,795.85
3.3.6.6	333	1.35	COLUMNA EN CONCRETO RESISTENCIA 3000 psi	m³	1.08	682,872	737,501.76
3.3.6.8.2	5067	1.36	ACERO DE REFUERZO GRADO 60, PAGADO EN KG	KG	340.00	3,078	1,046,520.00
3.3.7	5964	1.38	SUMINISTRO E INSTAL. CABLE IPS - IWRC, 6*19 A/A, Ø 1/2"	ml	121.04	10,275	1,243,686.00
3.3.7	6393	1.39	PENDOLON GUAYA 3/8" CON SOPORTE PARA TUBERIA DE 90 A 25 mm SIN CONTRAVIENTOS	un	115.32	155,303	17,909,541.96
3.3.7	2226	1.40	PLATINA DE ANCLAJE 1/4" 0.15x0.20, INCLUYE PERNOS	un	16.00	109,670	1,754,720.00

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO		VERSION:01

No. 3

3.2.1.5.3	3904	1.41	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO, PAGADO M3	m³	8.85	16,458	145,653.30
			PASO SUBFLUVIAL				
3.3.1.6.1	3052	1.42	REPLANTEO GENERAL, MEDIDO EN M2	m2	40,00	3.773	150.920,00
3.3.2.2	5511	1.43	Excavación a mano en conglomerado Bajo agua pagado en m3, a una profundidad de 2 m	m³	12.00	58,815	705,780.00
3.3.6.1	5346	1.44	Concreto ciclopeo de resistencia 3000 psi, pagado en m3	m3	10,00	259.081	2.590.810,00
		2	MEDIA TENSION				
3.4.7		2.01	REPLANTEO RED MEDIA TENSION	km	1.90	405,578	770,598.20
3.4.7		2.02	APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE	un	17.00	40,772	693,124.00
3.4.7		2.03	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCEMENTO 12 mtsx 510 kgs	un	11.00	907,240	9,979,640.00
3.4.7		2.04	SUMINISTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA DE PASO LAR 202 (P- 101)	un	10.00	272,047	2,720,470.00
3.4.7		2.05	SUMINISTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA DE RETENCION LA 213 (R560)	un	2.00	1,050,752	2,101,504.00
3.4.7		2.06	SUMINISTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA DE CORTACIRCUITOS	un	1.00	760,890	760,890.00
3.4.7		2.07	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE ACSR 2 HILOS MEDIA TENSION (1xNo. 2)	ml	479.00	4,914	2,353,806.00
3.4.7		2.08	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE ACSR 3 HILOS MEDIA TENSION (3xNo. 2)	ml	1,900.00	9,541	18,127,900.00
3.4.7		2.09	SUMINISTRO E INSTAL. DE TEMPLETES MEDIA TENSION	un	6.00	190,493	1,142,958.00
3.4.7		2.10	SUMINISTRO E INSTAL. DE AISLADOR DE PIN CON ESPIGO EXTREMO DE POSTE	un	3.00	54,573	163,719.00
3.4.7		2.11	SUMINISTRO E INSTAL. DE CADENA DE AISLADORES	un	3.00	156,212	468,636.00
		3	BAJA TENSION				
3.4.7		3.01	APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE	un	3.00	40,772	122,316.00
3.4.7		3.02	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCEMENTO 8 mtsx 510 kgs	un	1.00	554,434	554,434.00
3.4.7		3.03	SUMINISTRO E INSTAL. DE TEMPLETES BAJA TENSION	un	2.00	190,493	380,986.00
3.4.7		3.04	SUMINISTRO E INSTAL. DE PERCHA TRES PUESTOS	un	2.00	60,980	121,960.00
3.4.7		3.05	SUMINISTRO E INSTAL. DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3 x No 6 + 1 x No 8 THHNW AWG, INCLUYE MEDIDOR TRIFASICO 220 v 20-80 Amp. CAJA PARA MEDIDOR Y BREAKER TRIFASICO DE 3x 50 Amp.	un	1.00	1,709,605	1,709,605.00
3.4.7		3.06	SUMINISTRO E INSTAL. DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 4 x No. 8 AWG	ml	100.00	49,349	4,934,900.00


10417

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. _____

3.4.7		3.07	SUMINISTRO E INSTAL. DE TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON TABLERO Y Y CHAPA, Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 3x50 AMP Y UN BREAKER TRIFASICO TERMO MAGNETICO DE 3x20 AMP Y UN BREAKER TRIFASICO TERMO MAGNETICO DE 3x15 AMP	un	1.00	1,313,681	1,313,681.00
3.4.7		3.08	SUMINISTRO E INSTAL. DE DUCTO PVC 3x1", INCLUYE ZANJA	ml	50.00	13,849	692,450.00
3.4.7		3.09	SUMINISTRO E INSTAL. DE PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE	un	1.00	591,973	591,973.00
		4	SUBESTACIONES				
3.4.7		4.01	SUMINISTRO E INSTAL. DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 15 KVA 13.2 kv - 240/120v	un	1.00	7,497,984	7,497,984.00
3.4.7		4.02	SUMINISTRO E INSTAL. DE PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE	un	1.00	591,973	591,973.00
3.4.7		4.03	REVISION DE CONFORMIDAD RETIE PARA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION	km	1.90	398,263	756,699.70
		5	POZO PROFUNDO				
3.1.5	7080	5.01	SUMINISTRO E INSTAL. DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 7,5 HP 2"x2" TRIFASICA, TIPO LAPICERO, INCLUYE TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	un	1.00	14,640,531	14,640,531.00
3.1.5	804	5.02	CABLE ENCAHUCHETADO 3 X 8 AWG, SUMI E INSTALC.	ML	70.00	13,475	943,250.00
3.1.5	6101	5.03	Registro electrico del pozo con sonda SP, Gamma Ray Resistividad	ml	80.00	32,130	2,570,400.00
3.1.5	6106	5.04	Limpieza y desarrollo de pozo profundo con compresor	h	36.00	40,145	1,445,220.00
3.1.5	858	5.05	Tubería de Producción, A.C. Ø=2" SCH 40, incluye el Suministro e Instalación.	m	70.00	48,981	3,428,670.00
3.1.5	881	5.06	Prueba de bombeo - mínimo 24 horas	und	1.00	956,596	956,596.00
3.1.5	6105	5.07	Sello sanitario Placa base en Concreto 3000 Psi 1.0 x 1.0 x 0.08. Incluye alimentador gravilla Ø 1 1/2" y Tapón roscado	und	1.00	74,354	74,354.00
		6	MANTENIMIENTO A TANQUE ELVADO EXISTENTE				
3.3.1.1	1972	6.01	PICADA DE PISOS Y MUROS DEL TANQUE EXISTENTE CON RETIRO DE ESCOMBROS	m2	57.80	6,849	395,872.20
3.3.5	6950	6.02	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MURO 1:4	m2	40.00	16,372	654,880.00
3.3.10	6041	6.03	Alistado de piso impermeabilizado e=, 04 mts	m2	22.60	21,059	475,933.40
3.3.19.6	6770	6.04	Pintura exterior vinilo kcraza 3 mancos	m2	40.00	17,546	701,840.00
		7	PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE				
3.2.5	6954	7.01	Sum e instal y puesta en marcha. Planta de Tto de Agua Potable	un	1.00	13,978,634	13,978,634.00
3.2.5	7082	7.02	Sistema de cloracion por tabletas (Hipoclorador Accu-tab, inc. accesorios)	und	1.00	2,616,900	2,616,900.00

10/11/17

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO		VERSION:01

No. _____

3.3.1.4	6611	8.19	PORTON EN MALLA ESLABONADA CAL. 10 Y TUBO H.G. 2" (ANTICORROSIVO Y PINTURA)	UN	1.00	812,009	812,009.00
TOTAL COSTO DIRECTO							934.587.291,00
				Administración	17.00%	158.879.840,00	
				Imprevistos	8.00%	74.766.984,00	
				Utilidad	5.00%	46.729.366,00	
				TOTAL AIU	30.00%	280.376.190,00	
				TOTAL PROYECTO		1.214.963.481	

Será responsabilidad del interventor contratado para el desarrollo de la obra física verificar que se cumpla con las cantidades de obra unitarias incluidas en los análisis de precios unitarios, verificar la distancia de explotación del material pétreo y la necesidad del transporte a lomo de mula.

5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

Dentro de los mecanismos para que el Estado Social de Derecho logre sus objetivos fundamentales, aparece consagrada en la Constitución Nacional, la disponibilidad de alternativas para obtener el adecuado cumplimiento de dichos fines. En concordancia con lo anterior, es viable la utilización de diferentes modalidades de selección de los contratistas, siendo una de ellas la contratación directa, dentro de la cual se encuentra los Convenios Interadministrativos.

Con base en los artículos 2º, 6º, 29, 209, 287 y concordantes de la Constitución, procede la aplicación de la normatividad especial en materia de contratación Estatal (Ley 80/93, Ley 489/98, Ley 1150/07, Decreto 2474/08, Decreto 2493/09), en donde se prevén las modalidades de selección y sus requisitos para aplicarlas, las cuales están y se implementan a discreción de quienes tienen la facultad decisoria, aplicando los postulados previstos en los artículos citados de la Carta Política.

Para este proyecto específico, se implementa un Convenio Interadministrativo , entre el Departamento de Casanare, actuando como entidad aportante y el Municipio de Pore actuando como entidad ejecutora

El Municipio de Pore, a través de su alcalde el señor JOREGE EZEQUIEL GARZON, en comunicación cursada el 8 de Marzo de 2010, al señor gobernador de Casanare Ing. Oscar Raúl Iván Florez, solicito apoyo económico para la financiación del proyecto denominado "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

De conformidad con lo señalado por el artículo 298 de la Carta Política, los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación , de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la nación y los municipios y de prestación de los servicios que determine la constitución y las leyes.

La coordinación implica que cada uno de los sujetos negociables va ha realizar separadamente sus funciones, pero en cuanto sean concordantes para lograr un fin común; se trata de mantener una separación de competencias, pero de ejercerlas de tal manera que se logre evitar una duplicidad de funciones y esfuerzos e ineficiencias.

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. _____

La colaboración por su parte se traduce en el cumplimiento de funciones que en principio le competen a la entidad que se apoya pero que en principio le interesa su cumplimiento a la entidad que apalanca con recursos financieros, humanos o físicos, logrando con ello una eficiente gestión contractual.

Para efectos de la selección del contratista se dará aplicación a la excepción general, contenida en el Literal c. del Numeral 4. Del artículo 2º de la ley 1150 de 2007, que señala como causal de contratación directa, los interadministrativos.

De la misma manera el artículo 78 del Decreto 2474 de 2008, señala como causal de contratación directa la celebración de contratos o convenios interadministrativos.

De igual forma el artículo 6 de la 489 de 1998, en concordancia con los principio establecidos en la constitución política, dispone que en virtud el principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y acometidos estatales y en consecuencia prestaran su colaboración a las demás entidades para el ejercicio de sus funciones. El artículo 95 de la citada ley establece que las entidades publicas podrán asociarse con el fin de cooperar en cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de contratos interadministrativos.

Para asegurar que la contratación de la obra física y de la interventoría garantice la calidad, el Municipio como ente ejecutor, deberá contratar con la persona natural o jurídica, individualmente o asociadas en consorcio o unión temporal, conformados en los términos establecidos en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y sus normas reglamentarias; que este en capacidad de ejecutar el objeto del contrato en los términos del artículo 6 de la ley 80 de 1993 y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el objeto y como mínimo en su equipo de trabajo cuenten con un director y residente de obra, cuyos perfiles profesionales correspondan al de Ingeniero Civil o Ambiental y/o Sanitario y demuestren una experiencia general no menor a cinco años y específica a tres años en este tipo de proyectos. En igual sentido para el personal que deba contratarse por concepto de interventoría.

Con relación a la experiencia general y específica, tanto para el contrato de obra como para la interventoría, los proponentes finales deben contar con la acreditación en este tipo de proyectos en cuantías no inferiores a 2.000 SMMLV


6. RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN, COBERTURAS Y JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN

6.1. RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN, COBERTURAS Y JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN.

Los riesgos previsibles que pueden afectar la normal ejecución del Contrato que se derive del desarrollo del convenio, son los siguientes

RIESGOS
RIESGOS PREVISIBLES
1. Que los predios no estén totalmente legalizados, lo cual constituye un riesgo medio y será asumido en su totalidad por el Municipio en calidad de ente ejecutor.
2. Que deban ajustarse o modificarse los diseños iniciales que impliquen modificaciones al presupuesto del convenio, un riesgo medio y lo asume el Municipio
3. Que se presenten mayores cantidades de obra, como riesgo medio y los asume el Municipio
4. El incumplimiento de los terceros contratistas, riesgo bajo y será asumido en su totalidad por el Municipio.



 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. _____

5. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del Contrato a celebrar parte de la Entidad ejecutora, éste deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 7° de la ley 1150-07, y los decretos 4828 del 24 de diciembre de 2008 y 2493 del 3 de julio de 2009, riesgo bajo y le compete al ejecutor.

6. Con ocasión de ejecución de los recursos aportados por el departamento, deberán pactarse los riesgos que se anexan al Estudio Previo.

RIESGOS IMPREVISIBLES

Corresponden a aquellos que son producto de circunstancias de fuerza mayor y que no dependen de la voluntad de ninguna de las partes tales como: Terremoto, inundación, huracán, tormenta eléctrica, descargas atmosféricas y similares.

6.2. REGIMEN DE GARANTIAS.

COBERTURA DE LAS GARANTIAS	Para garantizar las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del Contrato a celebrar por la Entidad ejecutora, de acuerdo con el decreto 4828/08, modificado por el Decreto 2493/09. No obstante que el artículo 7° de la ley 1150-07, no exige la constitución de garantías en los convenios interadministrativos, la entidad ejecutora debe exigir al contratista las siguientes garantías:			
	COBERTURA EXIGIBLE	SI	NO	CUANTÍA
	Garantía de seriedad de la propuesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diez (10%) por ciento del valor total del contrato
	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diez (10%) por ciento del valor total del contrato
	Estabilidad de Obra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diez por ciento (10%) del valor total del contrato
	Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ciento por ciento (100%) del Valor del Anticipo
	Salarios, prestaciones e indemnizaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato
	Responsabilidad Extracontractual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, y mayor 200 SMMLV al momento de legalización
	Suministro de repuestos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diez por ciento (10%) del valor total del contrato
	Correcto funcionamiento de los equipos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diez por ciento (10%) del valor total del contrato
	Calidad del bien o	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diez (10%) por ciento
				VIGENCIA
				Tres (3) meses a partir del cierre del proceso
				Duración del contrato más el plazo pactado para la liquidación.
				Cinco (5) años a partir de la entrega de la obra
				Duración del contrato hasta la liquidación del contrato.
				Duración del contrato y tres (3) años más
				Duración del contrato
				Duración del contrato Un (1) año más
				Duración del contrato Un (1) año más
				Duración del contrato y

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO		VERSION:01

No. _____


	servicio			del valor total del	cuatro (4) meses más
	Otras.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	contrato	

Nota: Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto.

6.3 JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN	Conforme a lo expresado en artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, concordado con el Decreto 2474 de 2008, los factores de selección que permiten la escogencia del ofrecimiento más favorable para la entidad son los siguientes:			
	PROCESO	FACTORES		CONSECUENCIA
	VERIFICACIÓN	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN	<input type="checkbox"/>	HABILITA/INHABILITA
		EXPERIENCIA	<input type="checkbox"/>	HABILITA/INHABILITA
		CAPACIDAD FINANCIERA	<input type="checkbox"/>	HABILITA/INHABILITA
		CAPACIDAD TÉCNICA	<input type="checkbox"/>	HABILITA/INHABILITA
		CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	<input type="checkbox"/>	HABILITA/INHABILITA
	EVALUACIÓN	PRECIO	<input type="checkbox"/>	PUNTUACIÓN
		CALIDAD (PROPUESTA TÉCNICA)	<input type="checkbox"/>	PUNTUACIÓN
		PONDERACIÓN CALIDAD Y PRECIO	<input type="checkbox"/>	PUNTUACIÓN
		RELACIÓN COSTO - BENEFICIO	<input type="checkbox"/>	VALORACIÓN MONETARIA

ESPACIO EN BLANCO








 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-02-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	ESTUDIO PREVIO	VERSION:01

No. 1416


7. CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

7.1 TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ✓
7.2 OBJETO A CONTRATAR:	"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
7.3 PLAZO:	Seis (6) meses para el desarrollo del convenio interadministrativo, de los cuales cuatro (4) meses para la obra física y dos (2) meses para los actos administrativos que se generen en el proceso de contratación
7.4 LUGAR DE EJECUCIÓN:	VEREDA AGUALINDA MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE ✓
7.5 PRESUPUESTO OFICIAL	MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE (1.214.963.481) ✓
7.6 FORMA DE PAGO:	El Departamento de Casanare desembolsará al ente Ejecutor el valor del convenio de la siguiente manera: a) Un desembolso equivalente al 50% sobre el valor total del convenio previa suscripción del acta de iniciación del Convenio, por parte del interventor del Convenio. b) Los pagos siguientes se efectuarán mediante actas parciales sobre el avance de la obra con amortización del anticipo, con aprobación de la interventoría. La suma de todos los pagos parciales no podrá exceder el 90% del valor total del convenio. c) Un pago final correspondiente al saldo que debe ser como mínimo el diez por ciento (10%) del valor del convenio, que será cancelado a la entrega final de la obra a satisfacción del DEPARTAMENTO DE CASANARE previa liquidación final del convenio.


8. RESPONSABLES DEL ESTUDIO PREVIO

COMPONENTE TECNICO NOMBRE: William Rojas Vergara C.C. 79.040.512 de Bogotá CARGO: Contrato de Consultoría Nro. 0881 de 2010 FIRMA: 	COMPONENTE JURIDICO NOMBRE: SANDRA CARDENAS C.C. 52.335.065 Bta CARGO: Profesional. FIRMA: 	REVISÓ ESTUDIO PREVIO: NOMBRE: Gloria I. Jiménez Rubiano C.C. 23.978.367 de Recetor CARGO: Jefe Oficina de Programación de Obras FIRMA: 
 ARMANDO ALFREDO VARGAS FUENTES Secretaría de Obras Públicas y Transporte	 RAFAEL ARIAS MARTÍNEZ Vo.Bo. Director Técnico Banco de Programas y Proyectos	

32

 GOBERNACION DE CASANARE		FICHA DE CONTROL DE SOLICITUD DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACION			CODIGO: VERSION: FECHA: PAGINAS:		FCO -001 6 29 de Abril de 2018	
PROCESO: ELABORACION PROGRAMAS DE PROYECTOS					APROBO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION			
ELABORO: BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - 820		SERIE DOCUMENTAL: PROYECTOS - 44						
DEPENDENCIA:		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE			CODIGO DOCUMENTO			
SECTOR:		AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO						
PROGRAMA:		ESTABLECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO						
SUBPROGRAMA:		SISTEMAS DE AGUA POTABLE						
NOMBRE DEL PROYECTO:		CONSTRUCCION, OPTIMIZACION, HABILITACION, AMPLIACION, ESTUDIOS, DISEÑOS Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y POZOS PROFUNDOS DE LAS CABECERAS MUNICIPALES, RURALES Y CENTROS POBLADOS.						
CODIGO SSEPI:		2008-085000-0021						
CODIGO PRESUPUESTAL:		6.RP60.920607100050101						
		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			CÓDIGO			
		PROCESO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PÚBLICA			FECHA			
					VERSION			
					02			
C.I	COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	VALOR DISPONIBLE PRESUPUESTO	VALOR ACUMULADO CDP	VALOR CDP SOLICITADO	NUEVO DISPONIBLE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	ETAPA DE PREINVERSION			\$	\$	\$	\$	\$
1.1	ESTUDIOS	Proy	1.000	\$ 71,596,943,343.68	\$ 71,596,943,343.68	\$ 55,389,654,850.74	\$ 1,214,963,481.00	\$ 14,992,325,011.94
2	ETAPA DE INVERSION							
2.1	OBRA FISICA			\$ 65,830,503,096.00	\$ 65,830,503,096.00	\$ 52,622,999,846.28	\$ 1,214,963,481.00	\$ 11,992,639,968.72
2.1.1	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Y OBRA PUBLICA	Proy	3.000	\$ 65,697,443,678.72	\$ 65,697,443,678.72	\$ 52,489,840,229.00	\$ 1,214,963,481.00	\$ 11,992,639,968.72
2.1.1.6	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	proy	1.000	\$ 1,214,963,481.00	\$ 1,214,963,481.00	\$	\$ 1,214,963,481.00	
2.1.2	POZOS PROFUNDOS	Proy	1.000	\$ 16,715,428.00	\$ 16,715,428.00	\$ 16,715,428.00	\$	
2.1.3	ADQUISICION DE TERRENOS Y PAGO DE SERVIDUMBRES			\$	\$	\$	\$	0.00
2.1.4	FORMULACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y DIAGNÓSTICO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE			\$ 116,343,989.28	\$ 116,343,989.28	\$ 116,343,989.28	\$	0.00
2.1.5	CONTROL AMBIENTAL			\$ 0.00	\$ 0.00	\$	\$	
2.2	ADMINISTRACION			\$ 5,766,440,247.68	\$ 5,766,440,247.68	\$ 2,766,755,204.46		\$ 2,999,685,043.22
2.2.1	INTERVENTORIA	PROY	23.00	\$ 5,766,440,247.68	\$ 5,766,440,247.68	\$ 2,766,755,204.46		\$ 2,999,685,043.22
2.2.2	GERENCIA DE PROYECTOS	PROY	0.001					
2.3	ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			\$ 0.00				
2.3.1	MANTENIMIENTO							
VALOR TOTAL DEL PROYECTO REDONDEADO AL PESO				\$ 71,596,943,344.00	\$ 71,596,943,344.00	\$ 55,389,654,851.00	\$ 1,214,963,481.00	\$ 14,992,325,012.00


RAFAEL ARIAS MARTINEZ
Vo.Bo. Director Tecnico Banco de Proyectos


GLORIA JIMENEZ RUBIANO
Jefe Oficina de Programacion

GOBERNACION DE CASANARE
PRESUPUESTO DE OBRA
CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA, MUNICIPIO DE PORE - CASANARE

CUBS	Codigo	Item	Descripcion	Und	Cant	Vlr Unit	Vlr Total
		1	RED DE DISTRIBUCION				
3.2.1.10	5133	1.01	REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO, PAGADOS POR METRO LINEAL	ml	21,229.50	1,352	28,702,284.00
3.2.1.3	5138	1.02	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO ENTRE 1-2 MTS (ZANJAS ANGOSTAS)	m²	5,095.08	35,065	178,658,980.20
3.2.2.1	5603	1.03	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 4"	ML	2,044.00	26,540	54,247,760.00
3.2.2.1	5602	1.04	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 3"	ml	5,749.00	16,442	94,525,058.00
3.2.2.1	5494	1.05	Suministro e instal. tubería presión PVC RDE 13,5 1/2"	ml	642.00	2,423	1,555,566.00
3.2.2.1.96	5503	1.06	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA PRESION RDE 21 3/4"	ml	4,680.00	3,261	15,261,480.00
3.2.2.1.97	4856	1.07	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA PRESION RDE 21 1"	ml	3,406.00	4,609	15,698,254.00
3.2.2.1.98	5569	1.08	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA PRESION RDE 21 1 1/2"	ml	3,120.60	9,382	29,277,469.20
3.2.2.1.99	5597	1.09	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 2 "	ml	1,159.00	9,036	10,472,724.00
3.2.2.1.100	5599	1.10	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 2 1/2"	ml	428.90	13,334	5,718,952.60
3.2.1	135	1.11	CAJA DE INSPECCION 60 X 60	un	25.00	190,398	4,759,950.00
3.2.2.3	5476	1.12	SUMINISTRO E INSTAL. VALVULA DE BOLA 2 1/2"	un	4.00	207,681	830,724.00
3.2.2.3	4618	1.13	Valvula de corte 1 1/2". Suministro e Instal.	un	6.00	203,173	1,219,038.00
3.2.2.3	4110	1.14	Valvula de corte 1/2". Suministro e Instal.	un	25.00	46,220	1,155,500.00
3.2.2.3	6745	1.15	Valvula de corte 3/4". Suministro e Instal.	un	20.00	58,968	1,179,360.00
3.2.2.3	6139	1.16	Valvula de corte 1". Suministro e Instal.	un	18.00	78,488	1,412,784.00
3.2.2.3	4618	1.17	Valvula de corte 1 1/2". Suministro e Instal.	un	15.00	132,636	1,989,540.00
3.2.2.3	5158	1.18	Valvula de corte 2". Suministro e Instal.	un	14.00	208,112	2,913,568.00
3.2.2.3	5565	1.19	Suministro e Instal. Valvula de bola 3".	un	10.00	184,779	1,847,790.00
3.2.2.3	5398	1.20	Suministro e Instal. Valvula de bola 4".	un	8.00	270,603	2,164,824.00
3.2.2.4	6124	1.21	SUMINISTRO E INSTAL. BUJE SOLDADO 1 x 3/4"	un	25.00	3,746	93,650.00
3.2.2.4	5566	1.22	SUMINISTRO E INSTAL. CODO GRAN RADIO 2 1/2"	un	10.00	29,993	299,930.00
3.2.2.4	6419	1.23	SUMINISTRO E INSTAL. BUJE SOLDADO 3 x 2 "	un	1.00	15,655	15,655.00
3.2.2.4	5424	1.24	SUMINISTRO E INSTAL. BUJE SOLDADO 2 1/2 x 2"	un	5.00	13,087	65,435.00
3.2.2.4	6566	1.25	SUMINISTRO E INSTAL. CODO PRESION PVC 45 9 1 1/4"	UN	20.00	5,327	106,540.00
3.2.2.4	5733	1.26	SUM E INSTALC. COLLAR DE DERIVACION PVC 2" X 3/4 "	IN	25.00	8,815	220,375.00
3.2.1.5.6	5832	1.27	RELLENO AN ARENA LAVADA APISONADA PARA ATRAQUE DE TUBERIA, PAGADO EN M3	m³	1,019.02	40,411	41,179,455.58
3.2.1.5.3	3904	1.28	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO, PAGADO M3	m³	3,566.56	16,458	58,698,378.65
3.2.1.6	71	1.29	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	m²	509.51	13,420	6,837,597.36
3.6.9.3	62	1.30	TRANSPORTE DE MATERIAL A LOMO DE MULA (Viaje de 100 Kg)	vje	8,590.00	24,000	206,160,000.00
			PASO ELEVADO				
3.3.1.6.1	3052	1.31	REPLANTEO GENERAL, MEDIDO EN M2	m2	298.00	3,773	1,124,354.00
3.3.2.2	5820	1.32	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO ENTRE 1-2 MTS (ZANJAS ANGOSTAS)	m³	28.20	35,065	988,833.00
3.3.6	329	1.33	BASE CONCRETO POBRE 2000 PSI e = 0,05 m	M2	19.68	16,102	316,887.36
3.3.6.1	76	1.34	ZAPATA EN CONCRETO PARA CIMENTACION RESISTENCIA 3000 PSI	m²	3.03	623,695	1,889,795.85
3.3.6.6	333	1.35	COLUMNA EN CONCRETO RESISTENCIA 3000 psi	m²	1.08	682,872	737,501.76
3.3.6.8.2	5067	1.36	ACERO DE REFUERZO GRADO 60, PAGADO EN KG	KG	340.00	3,078	1,046,520.00
3.3.7	5964	1.37	SUMINISTRO E INSTAL. CABLE IPS - JIVRC, 6"19 A/A, Ø 1/2"	ml	121.04	10,275	1,243,686.00
3.3.7	6393	1.38	PENDOLON GUAYA 3/8" CON SOPORTE PARA TUBERIA DE 90 A 25 mm SIN CONTRAVIENTOS	un	115.32	155,303	17,909,541.96
3.3.7	2226	1.39	PLATINA DE ANCLAJE 1/4" 0.15x0.20, INCLUYE PERNOS	un	16.00	109,670	1,754,720.00
3.2.1.5.3	3904	1.40	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO, PAGADO M3	m³	8.85	16,458	145,653.30
			PASO SUBFLUVIAL				
3.3.1.6.1	3052	1.42	REPLANTEO GENERAL, MEDIDO EN M2	m2	40.00	3,773	150,920.00
3.3.2.2	5511	1.43	Excavacion a mano en conglomerado Bajo agua pagado en m3, a una profundidad de 2 m	m³	12.00	58,815	705,780.00
3.3.6.1	5346	1.44	Concreto ciclopeo de resistencia 3300 psi, pagado en m3	m3	10.00	259,081	2,590,810.00
		2	MEDIA TENSION				
3.4.7		2.01	REPLANTEO RED MEDIA TENSION	km	1.90	405,578	770,598.20
3.4.7		2.02	APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE	un	17.00	40,772	693,124.00
3.4.7		2.03	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCEMENTO 12 mtsx 510 kas	un	11.00	907,240	9,979,640.00
3.4.7		2.04	SUMINISTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA DE PASO LAR 202 (P- 101)	un	10.00	272,047	2,720,470.00
3.4.7		2.05	SUMINISTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA DE RETENCION LA 213 (R560)	un	2.00	1,050,752	2,101,504.00
3.4.7		2.06	SUMINISTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA DE CORTACIRCUITOS	un	1.00	760,890	760,890.00
3.4.7		2.07	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE ACSR 2 HILOS MEDIA TENSION (1xNo. 2)	ml	479.00	4,914	2,353,806.00
3.4.7		2.08	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE ACSR 3 HILOS MEDIA TENSION (3xNo. 2)	ml	1,900.00	9,541	18,127,900.00
3.4.7		2.09	SUMINISTRO E INSTAL. DE TEMPLETES MEDIA TENSION	un	6.00	190,493	1,142,958.00
3.4.7		2.10	SUMINISTRO E INSTAL. DE AISLADOR DE PIN CON ESPIGO EXTREMO DE POSTE	un	3.00	54,573	163,719.00
3.4.7		2.11	SUMINISTRO E INSTAL. DE CADENA DE AISLADORES	un	3.00	156,212	468,636.00
		3	BAJA TENSION				

GOBERNACION DE CASANARE
PRESUPUESTO DE OBRA
CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA, MUNICIPIO DE PORE - CASANARE


CUBS	Codigo	Item	Descripcion	Und	Cant	Vlr Unit	Vlr Total
3.4.7		3.01	APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMplete	un	3.00	40,772	122,316.00
		3.02	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCEMENTO 8 mtsx 510 kgs	un	1.00	554,434	554,434.00
3.4.7		3.03	SUMINISTRO E INSTAL. DE TEMPLETES BAJA TENSION	un	2.00	190,493	380,986.00
3.4.7		3.04	SUMINISTRO E INSTAL. DE PERCHA TRES PUESTOS	un	2.00	60,980	121,960.00
3.4.7		3.05	SUMINISTRO E INSTAL. DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3 x No 6 + 1 x No 8 THHNW AWG, INCLUYE MEDIDOR TRIFASICO 220 v 20-80 Amp. CAJA PARA MEDIDOR Y BREAKER TRIFASICO DE 3x 50 Amp.	un	1.00	1,709,605	1,709,605.00
3.4.7		3.06	SUMINISTRO E INSTAL. DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 4 x No. 8 AWG	ml	100.00	49,349	4,934,900.00
3.4.7		3.07	SUMINISTRO E INSTAL. DE TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON TABLERO Y Y CHAPA, Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 3x50 AMP Y UN BREAKER TRIFASICO TERMO MAGNETICO DE 3x20 AMP Y UN BREAKER TRIFASICO TERMO MAGNETICO DE 3x15 AMP	un	1.00	1,313,681	1,313,681.00
3.4.7		3.08	SUMINISTRO E INSTAL. DE DUCTO PVC 3x1", INCLUYE ZANJA	ml	50.00	13,849	692,450.00
3.4.7		3.09	SUMINISTRO E INSTAL. DE PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE	un	1.00	591,973	591,973.00
		4	SUBESTACIONES				
3.4.7		4.01	SUMINISTRO E INSTAL. DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 15 KVA 13.2 kv - 240/120v	un	1.00	7,497,984	7,497,984.00
3.4.7		4.02	SUMINISTRO E INSTAL. DE PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE	un	1.00	591,973	591,973.00
3.4.7		4.03	REVISION DE CONFORMIDAD RETIE PARA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION	kmt	1.90	398,263	756,699.70
		5	POZO PROFUNDO				
		5.01	SUMINISTRO E INSTAL. DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 7,5 HP 2"x2" TRIFASICA, TIPO LAPICERO, INCLUYE TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	un	1.00	14,640,531	14,640,531.00
3.1.5	7080	5.02	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 8 AWG, SUMI E INSTALC.	ML	70.00	13,475	943,250.00
3.1.5	6101	5.03	Registro electrico del pozo con sonda SP, Gamma Ray Resistividad	ml	80.00	32,130	2,570,400.00
3.1.5	6106	5.04	Limpieza y desarrollo de pozo profundo con compresor	h	36.00	40,145	1,445,220.00
3.1.5	858	5.05	Tuberia de Produccion, A.C. O=2" SCH 40, incluye el Sum e Instal.	m	70.00	48,981	3,428,670.00
3.1.5	881	5.06	Prueba de bombeo - minimo 24 horas	und	1.00	956,596	956,596.00
3.1.5	6109	5.07	Sello sanitario Placa base en Concreto 3000 Psi 1.0 x 1.0 x 0.08. Incluye alimentador gravilla Ø 1 1/2" y Tapon roscado	und	1.00	74,354	74,354.00
		6	MANTENIMIENTO A TANQUE ELVADO EXISTENTE				
3.3.1.1	1972	6.01	RICADA DE PISOS Y MUROS DEL TANQUE EXISTENTE CON RETIRO DE ESCOMBROS	m2	57.80	6,849	395,872.20
3.3.5	6950	6.02	PANETE LISO IMPERMEABILIZADO MURO 1:4	m2	40.00	16,372	654,880.00
3.3.10	6041	6.03	Alistado de piso impermeabilizado e= 04 mts	m2	22.60	21,059	475,933.40
3.3.19.6	6770	6.04	Pintura exterior vinilo koraza 3 manos	m2	40.00	17,546	701,840.00
		7	PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE				
3.2.5	6954	7.01	Sum e instal y puesta en marcha. Planta de Tto de Agua Potable	un	1.00	13,978,634	13,978,634.00
3.2.5	7082	7.02	Sistema de cloracion por tabletas (Hipoclorador Accu-tab, inc. accesorios)	und	1.00	2,616,900	2,616,900.00
3.2.5	7083	7.03	Torre de aireacion de 6 bandejas en fibra de vidrio 0.90 m x 0.90 m (Inc. accesorios)	und	1.00	7,915,350	7,915,350.00
3.2.5	7081	7.04	Suministro e instal. Filtro en grava, flujo ascendente (Lam. cal 14 recubierta en pintura de caucho, inc. grava)	und	1.00	7,815,356	7,815,356.00
3.2.2.1	4862	7.05	TUBERIA EN PVC 2" RDE 21 PARA SUCCION Y DESCARGA	ML	50.00	8,035	401,750.00
3.2.2.3	218	7.06	Válvula de bola en H.D. 2"	un	10.00	100,441	1,004,410.00
3.1.5	6981	7.07	Análisis físico - químico de agua- tratabilidad- DBO - Cloro y demas ensayos para un diagnostico completo	und	2.00	551,580	1,103,160.00
		8	INSTALACIONES PARA PLANTA				
3.3.1.6	3052	8.01	REFLANTEO GENERAL, MEDIDO EN M2	m2	25.00	3,773	94,325.00
3.3.1	3052	8.02	LIMPIEZA Y DESCAPOTE (INCLUYE ACARREO)	m2	25.00	5,343	133,575.00
3.3.2.2	5138	8.03	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	3.00	35,065	105,195.00
3.3.6.1	5060	8.04	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 2000 psi	m3	1.50	301,740	452,610.00
3.6.6.17	6927	8.05	Bordillo 10 x 40 cm fundido en concreto 3000 psi	ML	40.00	23,159	926,360.00
3.2.1.5.3	3904	8.06	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO, PAGADO M3	M3	4.80	16,458	78,998.40
3.3.10	7077	8.07	PISO EN CONCRETO 3000 PSI e=0.12 MTS	M3	1.92	836,895	1,606,838.40
3.3.5	6401	8.08	PANETE LISO (ALLANADO) MUROS 1:3, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, PAGADO EN M2	M2	28.00	13,037	365,036.00
3.3.7	6669	8.09	Perfil estructural circular 4"x5 mm para estructura de cubierta, instalado.	ml	18.00	92,104	1,657,872.00
3.3.7	1995	8.10	Perfil estructural circular 2"x3 mm para estructura de cubierta, instalado.	ml	80.00	35,565	2,845,200.00
3.3.9.4	6726	8.11	CUBIERTA EN TEJA TIPO TERMIAACUSTICA ONDULADA, PAGADA EN M2	M2	96.00	38,823	3,727,008.00

GOBERNACION DE CASANARE


PRESUPUESTO DE OBRA

CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA, MUNICIPIO DE PORE - CASANARE

CUBS	Codigo	Item	Descripcion	Und	Cant	Vir Unit	Vir Total
3.3.6.1	4441	8.12	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO PARA CIMENTACION DE RESISTENCIA 3000 PSI, PAGADO EN M3	M3	1.60	426,713	682,740.00
3.3.6.8.2	5067	8.13	ACERO DE REFUERZO GRADO 60, PAGADO EN KG	KG	70.00	3,078	215,460.00
3.3.6.8	5066	8.14	ACERO DE REFUERZO GRADO 37, PAGADO EN KG	KG	100.00	3,097	309,700.00
3.3.7	6108	8.15	TUBO GALVANIZADO 2" CON BRAZO PORTAPUAS (CERRAMIENTO - INCLUYE PIE DE AMIGOS ESQUINAS E INTERMEDIOS)	ML	14.00	21,008	294,112.00
3.3.1.4	2231	8.16	CERRAMIENTO EN MALLA CAL. 10 CON PLATINA DE ADHESION AL TUBO Y ANGULOS AGARRE SUPERIOR E INFERIOR CON ANTICORROSIVO	M2	52.00	22,011	1,144,572.00
3.3.4	7050	8.17	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO 12 cm (24.5 x 5 x 12)	M2	28.00	53,685	1,503,180.00
3.3.1.4	6110	8.18	ALAMBRE DE PUA CAL. 12 3 HILOS	ML	40.00	2,089	83,560.00
3.3.1.4	6611	8.19	PORTON EN MALLA ESLABONADA CAL. 10 Y TUBO H.G. 2" (ANTICORROSIVO Y PINTURA)	UN	1.00	812,009	812,009.00
				TOTAL COSTO DIRECTO			934,587,291.00
Administración						17.00%	158,879,840.00
Imprevistos						8.00%	74,766,984.00
Utilidad						5.00%	46,729,366.00
				TOTAL	AIU	30.00%	280,376,190.00
				TOTAL			1,214,963,481.00



Ing. WILLIAM ROJAS VERGARA
Cto Consultoría # 0881/10


	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO:	RIF01-02-1
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA	FECHA:	22/06/2009
	ACTA DE VISITA DE OBRA	VERSIÓN:	02

HOJA / DE 2

PROYECTO	Acueducto Vela Aguilinda		
COMPONENTE			
ACTIVIDAD			
MUNICIPIO	POME	FECHA	
TERRENOS	Carlos Garcia		
PERMISOS			
CONCESION DE AGUAS (ANTE	Resolución # 200-41 09 0930 Agosto 28/09	EXISTE	
	CORDUNOCUA	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

OBJETIVO CONCERTADO
<p>Inspeccion al predio del sr. Carlos Garcia en la vereda Aguilinda donde existe una infraestructura consistente en:</p> <p>Pozo profundo y Tanque de almacenamiento.</p> <p>Permiso para la adscripción y puesta en marcha del pozo profundo, aprovechamiento del agua subterránea para el consumo humano, de los habitantes de la vereda Aguilinda.</p>
SITUACION ENCONTRADA
<p>1. La infraestructura existente, al momento de habilitarla, la red de conducción de la tubería pvc. estaba cruzando predios que se proyectan sembrar en arroz.</p> <p>El pozo, está en la parte alta de la vereda, pero el área donde están la gran mayoría de casas de los beneficiarios se ubican cerca a la escuela, donde se acaba de terminar la perforación de un pozo profundo.</p>
OBSERVACIONES
<p>• Placen un replanteamiento del proyecto, el señor Carlos Garcia muestra su disposición en colaborar con el proyecto, de ser necesario disponer de algún terreno para la nueva localización.</p> <p>• La red eléctrica que se construyó para la alimentación de energía es muy larga, respecto a una nueva red, próxima a la escuela, los costos se compensarían con la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento.</p> <p>• El objetivo inicial de la construcción del tanque y perforación del pozo profundo en el predio de propiedad hoy del señor Carlos Garcia, fue aprovechar la diferencia de altura</p>




	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO:	RIFUT-02-1
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA	FECHA:	22/06/2009
	ACTA DE VISITA DE OBRA	VERSIÓN:	02



37


COMENTARIOS ADICIONALES
• Se solicitó al Municipio de Pácora, adelantar una revisión del proyecto en general.
• El señor Carlos García, propietario de la finca donde está localizada y perforado el pozo profundo, autoriza para que se use el agua del pozo para servir el Acueducto de la vereda Aguablanca del Municipio de Pácora

REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD			
CARGO	CEDULA	NOMBRE	FIRMA


PROFESIONALS.O.P.T.



CARGO Profesional SPOPH
PROFESIONAL MUNICIPAL

C.C. No. 74211767 


C.C. No. 17306093



C.C. No. 91.200.772 

C.C. No. _____

C.C. No. _____

Aquí puede consultar bienes o servicios por códigos del CUBS.
Utilice el ícono (listar) para hacer una búsqueda jerárquica por la estructura del CUBS.
Para buscar un bien o servicio por su nombre o por sus características haga clic aquí 

Búsqueda código CUBS: 3.2.1.3.* Consultar

- Búsqueda jerárquica CUBS**
- 3 Obra Publica
 - 3.2 Obras sanitarias y ambientales
 - 3.2.1 Obras preliminares y construcción general.
 - 3.2.1.3 EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS

Lista de elementos (13 registros)


Resultados 1 - 13 de 13

Código	Descripción
3.2.1.3.1	Excavación a cielo abierto, pagado por m3
3.2.1.3.2	Excavación subterránea, pagado por m3
3.2.1.3.3	Excavación de zanjas para la instalación de tuberías, pagado por m3
3.2.1.3.4	Excavación para estructuras, pagado por m3
3.2.1.3.5	Demolición de concreto o de cualquier otro material, pagado por m3
3.2.1.3.6	Demolición de adecuación de terreno, pagado por m2
3.2.1.3.7	Demolición de caja de mampostería para válvula, pagado por unidad
3.2.1.3.8	Traslado de estructuras, pagado por unidad
3.2.1.3.9	Traslado de cerramiento en malla eslabonada , pagado por m
3.2.1.3.10	Traslado de cerramiento en muros en ladrillo, pagado por m
3.2.1.3.11	Traslado de cerramiento en alambre de púas, pagado por m
3.2.1.3.12	Traslado de cerramiento en estructura metálica, pagado por m
3.2.1.3.13	Traslado de cerramiento en reja metálica, pagado por m

Resultados 1 - 13 de 13

Si encuentra alguna inconsistencia en la información, puede reportarla al correo electrónico sica@contraloragen.gov.co

Ayuda

Aquí puede consultar bienes o servicios por códigos del CUBS.
Utilice el icono ↴ (listar) para hacer una búsqueda jerárquica por la estructura del CUBS.
Para buscar un bien o servicio por su nombre o por sus características haga clic aquí 

Búsqueda código CUBS:3.3.7.*

Consultar

- Búsqueda jerárquica CUBS
- 3Obra Publica

3.3Edificaciones, obras de urbanismo y mobiliario urbano

3.3.7ESTRUCTURA METALICA
- ↴

↴

↴

↴

Lista de elementos (3 registros)

Resultados 1 - 3 de 3


Código	Descripción	
3.3.7.1	LOSA METALICA	↴
3.3.7.2	CORREA METALICA	↴
3.3.7.3	PLATINA DE LAMINA	↴

Resultados 1 - 3 de 3

Si encuentra alguna inconsistencia en la información, puede reportarla al correo electrónico sice@contralonagen.gov.co

Ayuda

40

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: FAB06-01-I
	PROCEDIMIENTO PLAN DE COMPRAS ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA	FECHA: 12/05/08
	FORMATO CERTIFICACION PLAN DE COMPRAS	VERSION:01

Yopal, septiembre 03 de 2010

Certificado Nro 002268

EL SUSCRITO SECRETARIO TECNICO DE LA JUNTA DE COMPRAS

CERTIFICA


Que en el Plan de Adquisiciones de bienes, Servicios y Obra Pública que esta entidad registró ante el SICE, la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE, incluyo los siguientes servicios:

CUBS	MES PROYECTADO	CANT.	VALOR TOTAL	DESCRIPCION
3.2.1.10	8	21.230	37.312.969,00	REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO, PAGADOS POR METRO LINEAL
3.2.1.3	8	5.095	232.256.674,00	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO ENTRE 1-2 MTS (ZANJAS ANGOSTAS)
3.2.2.1	8	2.044	70.522.088,00	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 4"
3.2.2.1	8	5.749	122.882.575,00	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 3"
3.2.2.1	8	642	2.022.236,00	Suministro e instal. tuberia presion PVC RDE 13,5 1/2"
3.2.2.1.96	8	4.680	19.839.924,00	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA PRESION RDE 21 3/4"
3.2.2.1.97	8	3.406	20.407.730,00	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA PRESION RDE 21 1"
3.2.2.1.98	8	3.121	38.060.710,00	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA PRESION RDE 21 1 1/2"
3.2.2.1.99	8	1.159	13.614.541,00	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 2 "
3.2.2.1.100	8	429	7.434.638,00	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA UNION MECANICA RDE 21 2 1/2"

Edificio Emiro Sossa Pacheco Carrera 19 N° 6-100 Tel. 6353852 Ext. 125-126-127-129 Yopal, Casanare
Web: <http://www.casanare.gov.co>



41


 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: FAB06-01-I
	PROCEDIMIENTO PLAN DE COMPRAS ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA	FECHA: 12/05/08
	FORMATO CERTIFICACIÓN PLAN DE COMPRAS	VERSION:01

Yopal, septiembre 03 de 2010

Certificado Nro 002268

3.2.1 ✓	8	25	6.187.935,00	CAJA DE INSPECCION 60 X 60
3.2.2.3 ✓	8	4	1.079.941,00	SUMINISTRO E INSTAL. VALVULA DE BOLA 2 1/2"
3.2.2.3 ✓	8	6	1.584.749,00	Valvula de corte 1 1/2". Suministro e Instal.
3.2.2.3 ✓	8	25	1.502.150,00	Valvula de corte 1/2". Suministro e Instal.
3.2.2.3 ✓	8	20	1.533.168,00	Valvula de corte 3/4". Suministro e Instal.
3.2.2.3 ✓	8	18	1.836.619,00	Valvula de corte 1". Suministro e Instal.
3.2.2.3 ✓	8	15	2.586.402,00	Valvula de corte 1 1/2". Suministro e Instal.
3.2.2.3 ✓	8	14	3.787.638,00	Valvula de corte 2". Suministro e Instal.
3.2.2.3 ✓	8	10	2.402.127,00	Suministro e Instal. Valvula de bola 3".
3.2.2.3 ✓	8	8	2.814.271,00	Suministro e Instal. Valvula de bola 4".
3.2.2.4 /	8	25	121.745,00	SUMINISTRO E INSTAL. BUJE SOLDADO 1 x 3/4"
3.2.2.4 /	8	10	389.909,00	SUMINISTRO E INSTAL. CODO GRAN RADIO 2 1/2"
3.2.2.4 /	8	1	20.352,00	SUMINISTRO E INSTAL. BUJE SOLDADO 3 x 2"
3.2.2.4 /	8	5	85.066,00	SUMINISTRO E INSTAL. BUJE SOLDADO 2 1/2 x 2"
3.2.2.4 /	8	20	138.502,00	SUMINISTRO E INSTAL. CODO PRESION PVC 45 ° 1 1/4"
3.2.2.4 /	8	25	286.488,00	SUM E INSTALC. COLLAR DE DERIVACION PVC 2" X 3/4"
3.2.1.5.6 /	8	1.019	53.533.292,00	RELLENO AN ARENA LAVADA APISONADA PARA ATRAQUE DE TUBERIA, PAGADO EN M3
3.2.1.5.3 /	8	3.567	76.307.892,00	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION. COMPACTADO, PAGADO M3



 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: FAB06-01-I
	PROCEDIMIENTO PLAN DE COMPRAS ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA	FECHA: 12/05/08
	FORMATO CERTIFICACION PLAN DE COMPRAS	VERSION:01


Yopal, septiembre 03 de 2010

Certificado Nro 002268

3.2.1.6	8	510	8.888.877,00	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
3.6.9.3	8	8.590	268.008.000,00	TRANSPORTE DE MATERIAL A LOMO DE MULA (Viaje de 100 Kg)
3.3.1.6.1	8	298	1.461.660,00	REPLANTEO GENERAL, MEDIDO EN M2
3.3.2.2	8	28	1.285.483,00	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO ENTRE 1-2 MTS (ZANJAS ANGOSTAS)
3.3.6	8	20	411.954,00	BASE CONCRETO POBRE 2000 PSI e = 0,05 m
3.3.6.1	8	3	2.456.735,00	ZAPATA EN CONCRETO PARA CIMENTACION RESISTENCIA 3000 PSI
3.3.6.6	8	1	958.752,00	COLUMNA EN CONCRETO RESISTENCIA 3000 psi
3.3.6.8.2	8	340	1.360.476,00	ACERO DE REFUERZO GRADO 60, PAGADO EN KG
3.3.7	8	121	1.616.792,00	SUMINISTRO E INSTAL. CABLE IPS - IWRC, 6*19 A/A, Ø 1/2"
3.3.7	8	115	23.282.405,00	PENDOLON GUAYA 3/8" CON SOPORTE PARA TUBERIA DE 90 A 25 mm SIN CONTRAVIENTOS
3.3.7	8	16	2.281.136,00	PLATINA DE ANCLAJE 1/4" 0.15x0.20, INCLUYE PERNOS
3.2.1.5.3	8	9	189.349,00	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO, PAGADO M3
3.3.1.6.1	8	40	196.196,00	REPLANTEO GENERAL, MEDIDO EN M2
3.3.2.2	8	12	917.514,00	Excavacion a mano en conglomerado Bajo agua pagado en m3, a una profundidad de 2 m
3.3.6.1	8	10	3.368.053,00	Concreto ciclopeo de



43


 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: FAB06-01-I
	PROCEDIMIENTO PLAN DE COMPRAS ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA	FECHA: 12/05/08
	FORMATO CERTIFICACION PLAN DE COMPRAS	VERSION:01

Yopal, septiembre 03 de 2010

Certificado Nro 002268

				resistencia 3000 psi, pagado en m3
3.4.7 ✓	8	2	1.001.778,00	REPLANTEO RED MEDIA TENSION
3.4.7 /	8	17	901.061,00	APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE
3.4.7	8	11	12.973.532,00	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCEMENTO 12 mtsx 510 kgs
3.4.7	8	10	3.536.611,00	SUMINISTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA DE PASO LAR 202 (P- 101)
3.4.7	8	2	2.731.955,00	SUMINISTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA DE RETENCION LA 213 (R560)
3.4.7	8	1	989.157,00	SUMINISTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA DE CORTACIRCUITOS
3.4.7	8	479	3.059.948,00	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE ACSR 2 HILOS MEDIA TENSION (1xNo. 2)
3.4.7	8	1.900	23.566.270,00	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE ACSR 3 HILOS MEDIA TENSION (3xNo. 2)
3.4.7	8	6	1.485.845,00	SUMINISTRO E INSTAL. DE TEMPLETES MEDIA TENSION
3.4.7	8	3	212.835,00	SUMINISTRO E INSTAL. DE AISLADOR DE PIN CON ESPIGO EXTREMO DE POSTE
3.4.7 \	8	3	609.227,00	SUMINISTRO E INSTAL. DE CADENA DE AISLADORES
3.4.7 //	8	3	159.011,00	APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE
3.4.7 //	8	1	720.764,00	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE




 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: FAB06-01-I
	PROCEDIMIENTO PLAN DE COMPRAS ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA	FECHA: 12/05/08
	FORMATO CERTIFICACIÓN PLAN DE COMPRAS	VERSION:01


Yopal, septiembre 03 de 2010

Certificado Nro 002268

				POSTE DE FERROCEMENTO 8 mtsx 510 kgs
3.4.7	8	2	495.282,00	SUMINISTRO E INSTAL. DE TEMPLETES BAJA TENSION
3.4.7	8	2	158.548,00	SUMINISTRO E INSTAL. DE PERCHA TRES PUESTOS
3.4.7	8	1	2.222.487,00	SUMINISTRO E INSTAL. DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3 x No 6 + 1 x No 8 THHNW AWG, INCLUYE MEDIDOR TRIFASICO 220 v 20-80 Amp. CAJA PARA MEDIDOR Y BREAKER TRIFASICO DE 3x 50 Amp.
3.4.7	8	100	6.415.370,00	SUMINISTRO E INSTAL. DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 4 x No. 8 AWG
3.4.7	8	1	1.707.785,00	SUMINISTRO E INSTAL. DE TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON TABLERO Y Y CHAPA, Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 3x50 AMP Y UN BREAKER TRIFASICO TERMO MAGNETICO DE 3x20 AMP Y UN BREAKER TRIFASICO TERMO MAGNETICO DE 3x15 AMP
3.4.7	8	50	900.185,00	SUMINISTRO E INSTAL. DE DUCTO PVC 3x1", INCLUYE ZANJA
3.4.7	8	1	769.565,00	SUMINISTRO E INSTAL. DE PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE
	8	1	9.747.379,00	SUMINISTRO E INSTAL. DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 15 KVA 13.2 kv - 240/120v
3.4.7	8	1	769.565,00	SUMINISTRO E INSTAL. DE

Edificio Emiro Sossa Pacheco Carrera 19 N° 6-100 Tel. 6353852 Ext. 125-126-127-129 Yopal, Casanare
Web: <http://www.casanare.gov.co>





 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: FAB06-01-I
	PROCEDIMIENTO PLAN DE COMPRAS ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA	FECHA: 12/05/08
	FORMATO CERTIFICACION PLAN DE COMPRAS	VERSION:01

Yopal, septiembre 03 de 2010

Certificado Nro 002268

				PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE
3.4.7	8	2	983.710,00	REVISION DE CONFORMIDAD RETIE PARA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION
3.4.7	8	1	19.032.690,00	SUMINISTRO E INSTAL. DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 7,5 HP 2"x2" TRIFASICA, TIPO LAPICERO, INCLUYE TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS DE INSTALACION.
3.1.5	8	70	1.226.225,00	CABLE ENCAHUCHETADO 3 X 8 AWG, SUMI E INSTALC.
3.1.5	8	80	3.341.520,00	Registro electrico del pozo con sonda SP, Gamma Ray Resistividad
3.1.5	8	36	1.878.786,00	Limpieza y desarrollo de pozo profundo con compresor
3.1.5	8	70	4.457.271,00	Tuberia de Produccion, A.C. Ø=2" SCH 40, incluye el Sum e Instal.
3.1.5	8	1	1.243.575,00	Prueba de bombeo - minimo 24 horas
3.1.5	8	1	96.660,00	Sello sanitario Placa base en Concreto 3000 Psi 1.0 x 1.0 x 0.08. Incluye alimentador gravilla Ø 1 1/2" y Tapon roscado
3.1.5	8	58	514.634,00	PICADA DE PISOS Y MUROS DEL TANQUE EXISTENTE CON RETIRO DE ESCOMBROS
3.3.1.1	8	40	851.344,00	PANETE LISO IMPERMEABILIZADO MURO 1:4
3.3.5	8	23	618.713,00	Alistado de piso impermeabilizado e=, 04 mts




 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: FAB06-01-I
	PROCEDIMIENTO PLAN DE COMPRAS ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA	FECHA: 12/05/08
	FORMATO CERTIFICACIÓN PLAN DE COMPRAS	VERSION:01

Yopal, septiembre 03 de 2010

Certificado Nro 002268


3.3.10	8	40	912.392,00	Pintura exterior vinilo koraza 3 manos
3.3.19.6				PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE
3.2.5	8	1	18.172.224,00	Sum e instal y puesta en marcha. Planta de Tlo de Agua Potable
3.2.5	8	1	3.401.970,00	Sistema de cloracion por tabletas (Hipoclorador Accu- tab, inc. accesorios)
3.2.5	8	1	10.289.955,00	Torre de aireacion de 6 bandejas en fibra de vidrio 0.90 m x 0.90 m (Inc. accesorios)
3.2.5	8	1	10.159.963,00	Suministro e instal. Filtro en grava, flujo ascendente (Lam. cal 14 recubierta en pintura de caucho, inc. grava)
3.2.2.1	8	50	522.275,00	TUBERIA EN PVC 2" RDE 21 PARA SUCCION Y DESCARGA
3.2.2.3	8	10	1.305.733,00	Valvula de bola en H.D. 2"
3.1.5	8	2	1.434.108,00	Analisis fisico - quimico de agua- tratabilidad- DBO - Cloro y demas ensayos para un diagnostico completo
3.3.1.6	8	25	122.623,00	REPLANTEO GENERAL, MEDIDO EN M2
3.3.1	8	25	173.648,00	LIMPIEZA Y DESCAPOTE (INCLUYE ACARREO)
3.3.2.2	8	3	136.754,00	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO
3.3.6.1	8	2	588.393,00	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 2000 psi
3.6.6.17	8	40	1.204.268,00	Bordillo 10 x 40 cm fundido en concreto 3000 psi
3.2.1.5.3	8	5	102.698,00	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO, PAGADO

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: FAB06-01-I
	PROCEDIMIENTO PLAN DE COMPRAS ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA	FECHA: 12/05/08
	FORMATO CERTIFICACION PLAN DE COMPRAS	VERSION:01

Yopal, septiembre 03 de 2010

Certificado Nro 002268

				M3
3.3.10	8	2	2.088.890,00	PISO EN CONCRETO 3000 PSI e=0,12 MTS
3.3.5	8	28	474.547,00	PANETE LISO (ALLANADO) MUROS 1:3, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, PAGADO EN M2
3.3.7	8	18	2.155.234,00	Perfil estructural circular 4"x5 mm para estructura de cubierta, instalado.
3.3.7	8	80	3.698.760,00	Perfil estructural circular 2"x3 mm para estructura de cubierta, instalado.
3.3.9.4	8	96	4.845.110,00	CUBIERTA EN TEJA TIPO TERMIACUSTICA ONDULADA, PAGADA EN M2
3.3.6.1	8	2	887.563,00	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO PARA CIMENTACION DE RESISTENCIA 3000 PSI, PAGADO EN M3
3.3.6.8.2	8	70	280.098,00	ACERO DE REFUERZO GRADO 60, PAGADO EN KG
3.3.6.8	8	100	402.610,00	ACERO DE REFUERZO GRADO 37, PAGADO EN KG
3.3.7	8	14	382.346,00	TUBO GALVANIZADO 2" CON BRAZO PORTAPUAS (CERRAMIENTO -INCLUYE PIE DE AMIGOS ESQUINAS E INTERMEDIOS)
3.3.1.4	8	52	1.487.944,00	CERRAMIENTO EN MALLA CAL. 10 CON PLATINA DE ADHESION AL TUBO Y ANGULOS AGARRE SUPERIOR E INFERIOR CON ANTICORROSIVO
3.3.4	8	28	1.954.134,00	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO 12 cm (24.5 x 5 x 12)

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: FAB06-01-I
	PROCEDIMIENTO PLAN DE COMPRAS ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA	FECHA: 12/05/08
	FORMATO CERTIFICACIÓN PLAN DE COMPRAS	VERSION:01

Yopal, septiembre 03 de 2010

Certificado Nro 002268


3.3.1.4	8	40	108.628,00	ALAMBRE DE PUA CAL. 12 3 HILOS
3.3.1.4	8	1	1.055.612,00	PORTON EN MALLA ESLABONADA CAL. 10 Y TUBO H.G. 2" (ANTICORROSIVO Y PINTURA)

Se expide el presente Certificado por valor de \$ 1.214.963.481,00 Para el Estudio Previo.
"CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA, MUNICIPIO DE PORE -
CASANARE".

La Presente Certificación se expide en cumplimiento de la Circular No. 0024 de fecha
Septiembre 12 de 2005 y con base en la modificación del Plan de Compras de fecha
septiembre 03 de 2010.


WALTER FERNEY MARIÑO GOYENECHÉ
Director de Servicios Administrativos

Digito: Jaira m

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO: RAB00-14-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	VERSIÓN. 01

PROCESO: CONTRATACION		
ELABORO: DIRECCION DE PRESUPUESTO	SERIE DOCUMENTAL: PROYECTOS	APROBO:

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE	CODIGO DOCUMENTO:	DEL	0191
--------------	---	-------------------	-----	------

IMPUTACION PRESUPUESTAL	
6.RP60.920607100050101	Nombre del Proyecto: Construccion, Optimizacion, Habilitacion, Ampliacion, Estudios y Diseños y Mantenimiento de Las Redes de Acueducto y Sistemas de Tratamiento de Agua Potable y Pozos Profundos de las Cabeceras Municipales y Centros Poblados.


CÓDIGO SSEPI: 2008-085000-0021

NOMBRE DEL PROYECTO:
Nombre del Proyecto: Construccion, Optimizacion, Habilitacion, Ampliacion, Estudios y Diseños y Mantenimiento de Las Redes de Acueducto y Sistemas de Tratamiento de Agua Potable y Pozos Profundos de las Cabeceras Municipales y Centros Poblados.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	VALOR:
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE - DEPARTAMENTO DE CASANARE.	\$ 1.214.963.481,00
TOTAL:	\$ 1.214.963.481,00


FUENTE DE FINANCIACION:					
FAEP	VIGENCIA		REOR	VIGENCIA	
SFIL			SIFI		
SF60			DFFI		
SF60			ICLD		
RP60		\$ 1.214.963.481,00	ITRP		
REGP			ITRP		

FECHA DE SOLICITUD:	DIA	MES	AÑO

NOMBRE DEL SOLICITANTE:	AR MANDO ALFREDO VARGAS FUENTES Secretario de Obras Públicas y Transporte	
-------------------------	--	---

FIRMA AUTORIZADA:	GOBERNADOR DE CASANARE	
-------------------	------------------------	--

Revisó:
Elaboró: Dorelly F.

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA DE PRESUPUESTO
RECIBIDO 
FECHA 04-10-09 A 4:20

001610
ALFONSO URREA
Asesor Despacho
DOCUMENTO REVISADO
FECHA 04-10-2010
FIRMA 

GOBERNACION DE CASANARE
Nit : 892099216

YOPAL, 04-OCT-2010
Pagina : 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


Documento: 01-CD CERTIFICADO DISPONIBILIDAD
División: 01-06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Número : 102527

Concepto: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA AGUALANDA DEL MUNICIPIO DE PORE-DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Fecha: 04-OCT-2010
Vence: 31-DIC-2010

Cuenta	Descripción	Valor
60.920607100050101	Construcción, Optimización, habilitación, ampliación, estudios, diseños y mantenimiento de las redes del acueducto, sistemas de tratamiento de agua potabl	1,214,963,481.00
Total :		1,214,963,481.00


LUZ AMPARO ARIZA SUAREZ
APRUEBA

Digitó: PGLORIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CECULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 4.214.677

GARZON

APELLIDOS

JORGE EZEQUIEL

CONSEJO

FECHA DE NACIMIENTO 26-FEB-1970

PORE

(CASANARI)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

04-OCT-1983 PORE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


PROCE DERECHO

PROSTRADOR NACIONAL

ALTERNATIVO VOTOS CUOTE

A-4272099-7012034E-04-2004-214977-22099910

01558942515 02 10433312



El Departamento Administrativo de Seguridad certifica:

Que a la fecha lunes 24 agosto 2009 JORGE EZEQUIEL GARZON
con Cédula de Ciudadanía N° 4214677 de Pore

NO REGISTRA ANTECEDENTES

de acuerdo con el art. 248 de la Constitución Política de Colombia.


Código de Verificación: 791884536023

Para verificar la autenticidad del presente certificado, deberá ingresar a www.das.gov.co
al servicio "Consultar Certificado Judicial".

Haciendo más fácil tu relación con el Estado | DAS 2008 © Todos Los derechos reservados.



REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA MUNICIPAL

DECLARAMOS

Que **JORGE EZEQUIEL GARZON C.C. No. 4.214.677** ha sido elegido **ALCALDE** del Municipio de **PORE - CASANARE** para el periodo comprendido entre 2008 al 2011 por el **PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO**

En consecuencia, se expide la presente **CREDENCIAL**, en el Municipio de **PORE - CASANARE** a los **TREINTA Y UNO (31)** días del mes de **OCTUBRE** de 2007

Margolfa Barreto Leguizamón
MARGOLFA BARRETO LEGUIZAMON

Arnulfo Sierra Pabón
ARNULFO SIERRA PABON


COMISIÓN ESCRUTADORA MUNICIPAL/DISTRITAL

Greethel Soler Sabria
GREETHEL SOLER SABRIA

REGISTRADORA DEL ESTADO CIVIL

Secretaria de la Comisión Escrutadora

(Registrada al folio UNO (01) del libro de credenciales)



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal


001

2. Concepto

02

Actualización

4. Número de formulario



(415)7707212469984(8020) 000001407516489 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 0 9 9 4 2 9 - 3

6. DV

3

12. Administración:

Yopal

14. Buzón electrónico:

4 4

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

25. Tipo de documento:

1

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido:

32. Segundo apellido:

33. Primer nombre:

34. Otros nombres:

35. Razón social:

MUNICIPIO DE PORE

36. Nombre comercial:

MUNICIPIO DE PORE

37. Signa:

38. País:

COLOMBIA

39. Departamento:

1 6 9 Casanara

40. Ciudad/Municipio:

8 5 Pore

2 6 3

41. Dirección:

CL 4 16 44

42. Correo electrónico:

ALCALDIA@MUNICIPIO-P

43. Apartado aéreo:

44. Teléfono 1:

6 3 8 8 0 0 7

45. Teléfono 2:

46. Código:

7 5 1 5

47. Fecha inicio actividad:

1 9 9 0 0 7 1 1

48. Código:

49. Fecha inicio actividad:

50. Código:

1 2

51. Código:

52. Número establecimientos:

53. Código:

7 8 9 1 4

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención timbra nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las v

14- Informante de exogena

54. Código:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

55. Forma:

56. Tipo:

57. Modo:

58. CPC:

59. Anexos:

SI X NO


60. No. de folios:

5

61. Fecha:

2 0 0 8 0 1 1 5

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante:


Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma del funcionario autorizado:

983. Nombre: HERNANDEZ RODRIGUEZ WILSON LEONARD

984. Cargo: PROFESIONAL EN INGRESOS PUBLICOS I



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCION COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez revisado el Boletín de Responsables Fiscales No. 62 con corte a 30 de junio de 2010, el nombre del(a) señor(a) y su correspondiente número de identificación, relacionado a continuación, NO FIGURA REPORTADO en el citado Boletín.

No. Identificación	4.214.677
Nombre y Apellidos	JORGE EZEQUIEL GARZON
Código de Verificación	156249042010

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional siempre y cuando el número consignado en el documento de identificación coincida con el aquí registrado.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este documento tiene vigencia hasta la publicación del Boletín número 63 en la Página Web de la Entidad, la cual se efectuará en el mes de Octubre de 2010.

KAROL TATIANA GONZÁLEZ TORRES

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.

Comuníquese 3537700 Ext 3205-7623 Nivel Central o en las Gerencias de cada Departamento -- www.contraloriagen.gov.co

SIBOR

jueves 22 de julio de 2010

Página 1 de 1



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

11:42:08

Hoja: 1 de 1

CERTIFICADO ORDINARIO

No. 19350984

Bogotá DC, 22 de julio de 2010

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JORGE EZEQUIEL GARZON identificado(a) con Cédula de ciudadanía No. 4214677 :

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIAS:

La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002)

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN:

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 1 HOJA(S). SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)
Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá DC
www.procuraduria.gov.co

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO
PAZ DE ARIPORO (CASANARE)


ACTA DE POSESION DEL SEÑOR JORGE EZEQUIEL GARZON
COMO ALCALDE MUNICIPAL DE PORE (CASANARE)

En el Municipio de Paz de Aripuro, Departamento de Casanare, República de Colombia, a veintiocho (28) de diciembre de dos mil siete (2007), compareció a la Notaria Única del Círculo de Paz de Aripuro, el Señor JORGE EZEQUIEL GARZON, quien se identificó con la Cédula de Ciudadanía número 4'214.677 expedida en Pore (Casanare), y MANIFESTO: Que comparece con el fin de tomar posesión como ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PORE (CASANARE), elegido por votación popular, conforme a Credencial expedida por los Delegados del Consejo Nacional Electoral, para el periodo comprendido entre el primero (1º) de enero de dos mil ocho (2.008) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil once (2.011), para lo cual presentó los siguientes documentos:

- Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía
- Fotocopia del Certificado Judicial
- Fotocopia de la Credencial expedida por los Delegados del Consejo Nacional Electoral de la ciudad de Pore de fecha 31 de Octubre de 2007
- Declaración juramentada sobre los bienes y rentas
- Certificado de Antecedentes Disciplinarios
- Certificación expedida por la Contraloría Departamental
- Declaración extraproceso manifestando la inexistencia de procesos por alimentos y el no estar incurso en causales de inhabilidades o incompatibilidades de conformidad con la Constitución Nacional, Las Leyes y demás normas sobre la materia.

En consecuencia el suscrito Notario, procede a recibirle el juramento, al por posesionar, por cuya gravedad prometió sostener y respetar la Constitución, Las Leyes de la República de Colombia; y cumplir bien y fielmente con las funciones que el cargo le impone, según su leal saber y entender. La presente posesión tiene efectos a partir del primero de enero de dos mil ocho (2008). No siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina y firma por los que en ella intervinieron, del modo que aparece:

EL POSESIONADO,


JORGE EZEQUIEL GARZON
CC. 4'214.677 de Pore (Casanare)

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO.
PAZ DE ARIPORO (CASANARE)

DILIGENCIA DE REGISTRO DE FIRMA

En Paz de Ariporo, Departamento de Casanare, República de Colombia, a veintiocho (28) de Diciembre de dos mil siete (2007), ante mí, JOSE ANTONIO DELGADO ORTIZ, Notario Único de este Circulo, compareció el Señor JORGE EZEQUIEL GARZON, mayor de edad, natural de Pore - Casanare y vecino de Pore (Casanare), identificado con la Cédula de Ciudadania número 4'214.677 expedida en Pore - Casanare; con el fin de REGISTRAR SU FIRMA, ante este Despacho, y en su condición de ALCALDE del MUNICIPIO DE PORE, así:

JORGE EZEQUIEL GARZON

INDICE DERECHO

Manifiesta JORGE EZEQUIEL GARZON, que la anterior firma es la que acostumbra en todos sus actos públicos y privados; En constancia se firma como aparece.

EL NOTARIO,

JOSE ANTONIO DELGADO ORTIZ



40
60

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO
PAZ DE ARIPORO (CASANARE)

ACTA DE RECEPCION DE DECLARACION EXTRAJUICIO- DECRETO 1557 DE 1989

En la ciudad de Paz de Ariporo, a los veintiocho (28) del mes de Diciembre del año dos mil siete (2007), ante mí, JOSE ANTONIO DELGADO ORTIZ, Notario Único del Circulo de Paz de Ariporo - Casanare, compareció:

JORGE EZEQUIEL GARZON, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 4'214.677 de Pore - Casanare, estado civil Casado, domiciliado en la Ciudad de Pore, persona idónea para declarar quien manifestó bajo la gravedad del juramento.

PRIMERO: Que mis generales de Ley son los que dije anteriormente, con estudios Universitarios a nivel de Pregrado Licenciado en Educación básica con énfasis en Español, de Ocupación actualmente independiente.

SÉGUNDO: Que como declarante no tengo ninguna clase de impedimento legal o moral para rendir esta declaración la cual presto bajo mi única y entera responsabilidad.

TERCERO: Manifiesto bajo la gravedad de juramento que soy casado con sociedad conyugal vigente con la señora NOHORA ISABEL ORTIZ, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 23'937.475 de Pore. Son mis hijos JORGE ALBERTO GARZON ORTIZ y LUIS EDUARDO GARZON ORTIZ quienes dependen económicamente en todo sentido como moral y económicamente de mí. Manifiesto que soy hijo de la señora ANGELA GARZON.

Los ingresos que obtuve en el último año gravable equivalen a treinta y seis millones de pesos (\$36'000.000.00).

Mis bienes patrimoniales son los siguientes: una casa ubicada en la carrera 14 número 7-42, barrio Simón Bolívar en la ciudad de Pore, valorada en treinta millones de pesos (\$30'000.000.00). Una finca denominada "EL PORTAL" ubicada en la vereda Bocas de Pore, del Municipio de Pore, valorada en cuarenta millones de pesos (\$40'000.000.00), y setenta y cinco (75) cabeza de ganado vacuno de cría y levante entre machos y hembras, valoradas en treinta y siete millones quinientos mil pesos (37'500.000.00).

A la fecha tengo acreencias, y obligaciones con el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA por ocho millones cuatrocientos mil pesos (\$8'400.000.00).

Las actividades económicas de carácter privado, adicionales a las declaradas anteriormente, que he venido desarrollando de forma ocasional y permanente son: ganadería.

CUARTO: La anterior declaración la rindo con destino a tomar posesión como ALCALDE ELECTO DEL MUNICIPIO DE PORE.

El Declarante;

Jorge Ezequiel Garzon
JORGE EZEQUIEL GARZON
C.C. 4'214.677 de Pore

EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE PAZ DE ARIPORO CERTIFICA: Que la anterior declaración cumple los requisitos señalados en el artículo primero del Decreto 1557 de Julio de 1989 y el artículo 299 del C.P.C.


Tarifa Notarial: \$8.380 IVA 16% \$1.340. Según Resolución N°7880 del 28 de Diciembre de 2006, expedida por el Superintendente de Notariado y Registro.

En constancia se firma la presente acta por el declarante y suscrito notario a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2007.

El Declarante;

Jorge Ezequiel Garzon
JORGE EZEQUIEL GARZON
C.C. 4'214.677 de Pore

JOSE ANTONIO DELGADO ORTIZ
Notario Único del Circulo de Paz de Ariporo



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONCEJO MUNICIPAL DE PORE
"Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación"



ACUERDO N° 019
(Noviembre 23 - 009)

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE PORE CASANARE PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2010.

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PORE

En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales y en especial las que le confiere la Constitución Política de 1991, ley 136/1994, Decreto 111/1996, Ley 617/2000, Ley 715/2001, Ley 819 de 2003, y demás disposiciones vigentes.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO.- Fijese el Presupuesto de Rentas del Municipio de Pore Casanare para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre del año dos mil diez (2010) en la suma de CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS (\$5.156.613.315=) M/CTE, y según los siguientes por menores:

Código (1)	Concepto	Proyección de Rentas y Recursos de Capital
		2010 Propuesta
1	INGRESOS	5,156,613,315
11	INGRESOS CORRIENTES	5,156,605,315
111	INGRESOS TRIBUTARIOS	670,353,177
1111	IMPUESTOS DIRECTOS	134,874,660
111101	Impuesto Predial Unificado	134,424,660
111102	Vehículos automotores (Circulación y Tránsito)	450,000

Concejo Municipal (Biblioteca Municipal) calle 3 Nro. 16 - 34 telefax 6388147
Correo: concejo@pore-casanare.gov.co
Pore - Casanare

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONCEJO MUNICIPAL DE PORE
"Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación"



La ejecución del Presupuesto General de Ingresos del Municipio de Pore será de Caja, debiéndose reconocer adicionalmente como ingreso de la vigencia fiscal del 2010, las transferencias y los recursos del crédito contenidos en este presupuesto y pendientes de desembolso a diciembre 31 de 2009.

La disponibilidad de Ingresos para adiciones al Presupuesto General, deberá certificarse debidamente por el Contador General del Municipio de Pore, estableciendo la fuente de los recursos disponibles en la Tesorería de Rentas y/o las cuentas por cobrar si se trata de un convenio o contrato.

Los recursos provenientes de la celebración de convenios y contratos y los de destinación específica, se incorporarán al Presupuesto General mediante Acto Administrativo expedido por el Señor Alcalde.

AJUSTE DE LOS PRESUPUESTOS: Si durante la vigencia fiscal, el recaudo efectivo de ingresos corrientes de libre destinación resulta inferior a la programación en que se fundamentó el presupuesto de rentas del Municipio, los recortes, aplazamientos o reducciones que deba hacer la administración afectarán el presupuesto anual, de manera que en la ejecución efectiva del gasto de la respectiva vigencia se respeten los límites establecidos en el presente Acuerdo.

DE LOS GASTOS

La Ejecución del Presupuesto General de Gastos del Municipio de Pore será de causación, esto es, lo ordenado pagar efectivamente más los compromisos legalmente adquiridos a diciembre 31 del 2009.

Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.

Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal que sean afectadas con los compromisos iniciales se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios y demás gastos.

Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el Presupuesto de gastos cuando no se reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y el ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.

Los compromisos y las obligaciones de los órganos que sean una Sección del Presupuesto General del Municipio de Pore correspondientes a las apropiaciones financiadas con las Rentas provenientes de Contratos o Convenios, sólo podrán ser asumidos cuando éstos se hayan perfeccionado.

Concejo Municipal (Biblioteca Municipal) calle 3 Nro. 16 - 34 telefax 6388147
Correo: concejo@pore-casanare.gov.co
Pore - Casanare

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONCEJO MUNICIPAL DE PORE
"Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación"



Los titulares de las Secciones que hacen parte del Presupuesto General del Municipio, a través de los cuales se ejecuten convenios o contratos, serán los responsables de su correcta ejecución, seguimiento y liquidación.

Las Secciones que conforman el Presupuesto General del Municipio de Pore cancelarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del asunto que la originó. Para cancelarlas, en primera instancia, se deberán efectuar los traslados presupuestales requeridos, con cargo a los saldos de apropiación disponibles en la vigencia fiscal en curso.

Así mismo cada sección presupuestal deberá atender las providencias que se profieran en su contra en primer lugar con recursos propios, es decir de su propio presupuesto.

Cuando sea necesario realizar correcciones y aclaraciones de leyenda y las numéricas que no cambien la destinación de recursos, la Administración Municipal lo podrá realizar mediante la expedición del correspondiente acto administrativo.

Con el fin de garantizar el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2008-2011, la Administración Municipal mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá realizar los traslados presupuestales dentro y entre agregados de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión.

El alcalde queda autorizado para celebrar los contratos, convenios y demás negocios jurídicos a que haya lugar de conformidad con la ley 80 de 1993 la ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, el decreto 777 de 1992, la ley 489 de 1998 y otorgar las garantías que sean necesarias para el cabal cumplimiento de programas y proyectos contemplados en el presupuesto Municipal y el Plan de Desarrollo.

La Administración deberá presentar al Concejo Municipal un informe sobre los actos administrativos más relevantes expedidos en ejecución de esta potestad. Dichas facultades se conceden hasta el 31 de diciembre de 2010.

No requerirán operación presupuestal alguna, las sustituciones de activos que se realicen de acuerdo con la ley y no signifiquen erogaciones en dinero.

La Administración Municipal no podrá iniciar procesos de negociación laboral, recategorizaciones, reestructuraciones, reclasificaciones, creaciones de cargos, autorización de Horas Extras, cesantías y devoluciones de impuestos sin contar con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal expedido por el técnico de Presupuesto o quien haga sus veces, que garantice la existencia de los recursos.

Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie.

La Administración Municipal podrá adicionar al Presupuesto General, los recursos provenientes de las indemnizaciones por la recuperación de la pérdida de activos, con el fin prioritario de realizar las respectivas reposiciones.

Concejo Municipal (Biblioteca Municipal) calle 3 Nro. 16 - 34 telefax 6388147
Correo: concejo@pore-casanare.gov.co
Pore - Casanare

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONCEJO MUNICIPAL DE PORE
"Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación"




Gastos Administrativos, Operativos y de Inversión. Son los gastos de funcionalidad de los fondos y permiten realizar pagos en servicios personales, gastos generales, transferencias y de inversión, del sector a cargo del fondo.

PARÁGRAFO.- Las Disposiciones Generales, que no se mencionan en el presente artículo de los conceptos contenidos en los rubros del presupuesto de egresos del Municipio de Pore para la vigencia Fiscal del año 2010, se asemejan al Estatuto Orgánico de Presupuesto o en su defecto a los criterios de la Oficina de Planeación Municipal.

ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación, sanción y publicación.

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de Pore a los veinte tres (23) días del mes de Noviembre de 2009.


RAUL ARIOSTO CUEVAS BERNAL
Presidente


LEDY CRUZ GUTIÉRREZ
Secretaria

Concejo Municipal (Biblioteca Municipal) calle 3 Nro. 16 - 34 telefax 6388147
Correo: concejo@pore-casanare.gov.co
Pore - Casanare

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONCEJO MUNICIPAL DE PORE
"Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación"



LA SUSCRITA SECRETARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PORE,
CASANARE

CERTIFICA:

Que, el Acuerdo Nro. 019 de Noviembre 23 de 2009 "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE PORE CASANARE PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2010" *Recibió sus dos debates reglamentarios los días:*

PRIMER DEBATE: Noviembre 17 de 2009
SEGUNDO DEBATE: Noviembre 23 de 2009

La presente certificación se expide en el despacho del Honorable Concejo Municipal de Pore, Casanare a los veintitrés (23) días del mes de Noviembre del año 2009.


LOBY CRUZ GUTIERREZ
Secretaria Concejo Municipal


Concejo Municipal (Biblioteca Municipal) calle 3 Nro. 16 - 34 telefax 6388147
Correo: concepore1@hotmail.com
Pore - Casanare

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT ALCALDIA: 800.099.429 - 3



SECRETARÍA.- Pore, 03 de Diciembre de 2009

El Acuerdo Nro. 019 de Noviembre 23 de 2009, recibido el día 03 de Diciembre de 2009 y dentro del término para sanción, pasa al Despacho del Señor Alcalde para su conocimiento y demás fines pertinentes.


MARIA TERESA AVILA TORRES
Secretaría General y de Gobierno

ALCALDÍA MUNICIPAL.- Pore, Casanare, 03 de Diciembre de 2009.

SANCIONADO

El Acuerdo Nro. 019 de Noviembre 23 de 2009 "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE PORE - CASANARE, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2010", en consecuencia, dentro de los siguientes Diez (10) días, **PUBLIQUESE** en la cartelera oficial de este Despacho.

Envíese copia del presente Acuerdo a la gobernación de Casanare, para su revisión respectiva.

CUMPLASE

El Alcalde Municipal,


JORGE EZEQUIEL GARZÓN

CONSTANCIA DE FIJACIÓN.- La suscrita Secretaria adscrita al Despacho del Alcalde Municipal de Pore, Casanare, **CERTIFICA** que el Acuerdo Nro. 019 de Noviembre 23 de 2009, se fija en PUBLICACIÓN en la cartelera oficial de este Despacho, hoy a los Cuatro (04) días del mes de Diciembre del Dos Mil Nueve (2009), hora 7:30 A.M. por el termino de Un (01) día.


EDITH JANETH PIDIACHE OROS
Secretaria

CONSTANCIA DE DESFIJACION: La suscrita Secretaria adscrita al Despacho del Alcalde Municipal de Pore, Casanare, **HACE CONSTAR**, que el presente Acuerdo, permaneció fijado por el termino de Un (01) día y se desfija hoy a los Cuatro (04) días del mes de Diciembre del Dos Mil Nueve (2009), siendo las 5:00 PM.


EDITH JANETH PIDIACHE OROS
Secretaria

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RGD-11-1
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	RESOLUCION	VERSION:01

RESOLUCION No. 0321

POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO COMO CAUSAL DE CONTRATACIÓN DIRECTA

EI SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE,

En uso de sus atribuciones conferidas en la resolución No 0807 del 30 de julio de 2010, por medio de la cual se le delega funciones en materia de contratación y,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política en su artículo 209, dispone: "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado".


Que el artículo 298 de la Constitución Política consagra que los Departamentos ejercen funciones administrativas de coordinación y complementariedad de la acción Municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determine la constitución y la ley.

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 305 de la Constitución Política, corresponde al Gobernador dirigir y coordinar la acción administrativa del Departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y la ley.

Que el artículo 365 de la Constitución consagra: "Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional".

Que el artículo 6o de la Ley 489 de 1998, en concordancia con los principios establecidos en la Constitución Política, establece que en virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales y en consecuencia prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones.

Que el artículo 95 de la ley 489 de 1998, dispone que las Entidades Públicas podrán asociarse con el fin de coopera en el cumplimiento de funciones administrativas o de

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RGD-11-1
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	RESOLUCION 0321	VERSION:01

prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro

Que en lo que al sector de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico se refiere, compete a los departamentos la ineludible responsabilidad, impuesta por el legislador, de apoyo y coordinación como de concurrencia en la prestación de los mismos.

Que el Artículo 77 del Decreto 2474 de 2008, dispone que para efectos de la modalidad de selección de contratación directa se debe proferir un acto administrativo que la justifique.

Que el artículo 2º Numeral 4, Literal c, de la ley 1150 de 2007, y el artículo 78 del decreto 2474 de 2008, permiten que las entidades señaladas en el artículo 2º de la ley 80 de 1993, celebren convenios interadministrativos mediante la modalidad de selección de contratación directa.

Que el objeto del presente convenio es desarrollar la CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.


Que el valor del Convenio a celebrar asciende a la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$3.417.874.562) MCTE.

Que para cubrir los costos de la obra se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 102527 del 4 de octubre de 2010, por un valor de MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$1.214.963.481)MCTE, Imputación Presupuestal No 6.RP60.920607100050101, expedido por la Dirección Técnica de Presupuesto Departamental.

Con fundamento en lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar procedimiento mediante la modalidad de selección de contratación directa, Convenio Interadministrativo con el MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE, para desarrollar la CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE, por un valor de MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$1.214.963.481)MCTE, y un plazo de seis (6) meses

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RGD-11-1
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	RESOLUCION 0321	VERSION:01

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente acto no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el presente acto en el portal www.contratos.gov.co de la Gobernación de Casanare.


ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.


COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Yopal a los

24 OCT 2010


ARMANDO ALFREDO VARGAS FUENTES
Secretario de Obras Públicas y Transporte

Reviso: 
Profesional de Servicios.

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-08-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	MINUTA	VERSION:01

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO


CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.	0053	06 OCT 2010
ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPIO DE PORE	
NIT. No.	NIT. 800099429-3	
VALOR:	MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$1.214.963.481) MCTE.	
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	
PLAZO:	SEIS (6) MESES.	

DOCUMENTO REVISADO
FECHA 06-10-2010
FIRMA



Entre los suscritos a saber **RODRIGO FLECHAS RAMIREZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.774.689, expedida en Tunja, quien actúa en nombre y representación del Departamento de Casanare, entidad territorial con NIT 892.099.216-6, actuando como Director de Contratación de conformidad al Decreto No 0180 del 15 de septiembre de 2010, delegado para la contratación según el Decreto No 0181 del 15 de septiembre de 2010, quien para efectos del presente convenio, se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por una parte y por otra **JORGE EZEQUIEL GARZON**, identificado con cédula de ciudadanía No 4.214.677 expedida en Pore, en su condición de representante legal del **MUNICIPIO DE PORE**, con NIT. 800099429-3, en su condición de Alcalde, quien para efectos del presente convenio se denominará **EL MUNICIPIO**, hemos acordado celebrar el presente Convenio Interadministrativo, previas las siguientes consideraciones: 1) Que la Constitución Política en su artículo 209, dispone: "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado". 2) Que el artículo 298 de la Constitución Política consagra que los Departamentos ejercen funciones administrativas de coordinación y complementariedad de la acción Municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determine la constitución y la ley. 3) Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 305 de la Constitución Política, corresponde al Gobernador dirigir y coordinar la acción administrativa del Departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y la ley. 4) Que el artículo 365 de la Constitución consagra: "Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional". 5) Que en lo que al sector de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico se refiere, compete a los Departamentos la ineludible responsabilidad, impuesta por el legislador, de apoyo y coordinación como de concurrencia en la prestación de los mismos. 6) Que le corresponde a los Departamentos un papel protagónico en el desarrollo y éxito de esa política pública del Gobierno Nacional en la que debe prestarse por parte del departamento todo el apoyo posible a los municipios del área de


RECIBIDO PRESUPUESTO
FECHA 06-10-2010
FIRMA

[Handwritten signature]

 GOBERNACIÓN DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-08-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	0053 MINUTA 06 OCT 2010	VERSION:01

su jurisdicción, para que atiendan sus responsabilidades constitucionales y legales en materia de agua potable y saneamiento básico y adicionalmente para guardar la debida coherencia del Plan Departamental de Desarrollo con el Plan Nacional de Desarrollo, resulta ineludible la vinculación del Departamento en dicha política, de manera que se hará parte del respectivo Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDAS-. 7) Que el artículo 6o de la Ley 489 de 1998, en concordancia con los principios establecidos en la Constitución Política, establece que en virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales y en consecuencia prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones. 8) Que el artículo 95 de la ley 489 de 1998, dispone que las Entidades Públicas podrán asociarse con el fin de coopera en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro. 9) Que el artículo 2º Numeral 4, Literal c, de la ley 1150 de 2007, y el artículo 78 del decreto 2474 de 2008, permiten que las entidades señaladas en el artículo 2º de la ley 80 de 1993, celebren convenios interadministrativos en forma directa. 10) Que mediante Ordenanza 004 de Mayo de 2008, la Asamblea Departamental, aprobó el Plan de Desarrollo "Pensando en todos", en el cual se contempla: Reto VII "INTEGRACIÓN Y AFIRMACIÓN TERRITORIAL: ACUERDOS FUNDAMENTALES HACIA EL DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE URBANO Y RURAL", en el programa 7.5 "ESTABLECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE UNA PLANIFICACION EFECTIVA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO". En el subprograma 7.5.1. "Sistemas de Agua Potable", se encuentra inmerso el proyecto CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN, HABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, ESTUDIOS, DISEÑOS Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y POZOS PROFUNDOS DE LAS CABECERAS MUNICIPALES RURALES Y CENTROS POBLADOS. 11) Que el proyecto construcción, optimización, habilitación, ampliación estudios, diseños y mantenimiento de las redes del acueducto, sistemas de tratamiento de agua potable y pozos profundos de las cabeceras municipales, rurales y centros poblados, se encuentra inscrito y viabilizado en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento, bajo el Código SSEPI N°. 2008-085000-0021, en el cual se contempla la actividad de CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE. 12) Que mediante Ordenanza No. 020 del 18 de Diciembre de 2009, la Honorable Asamblea Departamental autorizó al Gobernador para celebrar los contratos y convenios, cualquiera sea su naturaleza o cuantía, con el fin de cumplir con lo aprobado en el presupuesto general de rentas y recursos de capital y de apropiaciones del Departamento para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2010. 13) Que para cubrir los costos de la obras e interventoria a ejecutar por el presente Convenio Interadministrativo, el Departamento cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 102527 del 4 de octubre de 2010, por un valor de MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$1.214.963.481)MCTE, Imputación Presupuestal No 6.RP60.920607100050101, expedido por la Dirección Técnica de Presupuesto Departamental. 14) Que mediante Resolución se Justifica la modalidad de selección de contratación directa mediante convenio Interadministrativo. 15). Que se consulto el portal del




 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-08-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	0053 MINUTA 06 OCT 2010	VERSION:01

SICE, evidenciándose que el objeto a contratar no está codificado a nivel de ítem, por lo tanto y en virtud del artículo 18, literal a) del Decreto 3512 de 2003, el convenio queda exento de la aplicación de las normas que regulan el SICE. 19). Que la Dirección de Servicios Administrativos expidió las certificaciones Nos. 002268 del 3 de septiembre de 2010, en las cuales se manifiesta que en el Plan de Adquisición de Bienes, Servicios y Obra Pública, esta entidad registró e incluyó ante el SICE los bienes y/o servicios los objetos de la presente contratación, conforme a las disposiciones del Literal b) del artículo 13 del Decreto 3512 de 2003. Por lo expuesto las partes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO:** El presente convenio tiene por objeto desarrollar la CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE. **CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR Y DESEMBOLSO DE LOS APORTES:** El valor total de los aportes del presente Convenio interadministrativo asciende a la suma de MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$1.214.963.481) MCTE. Valor que corresponden a los ítems, actividades, unidades, cantidades y precios unitarios descritos en los presupuestos aprobados por la Oficina de Programación de la Secretaria de Obras Públicas y Transporte del Departamento, los cuales hacen parte integral del presente Convenio, y que se deberán invertir única y exclusivamente en la Obra Física del proyecto a desarrollar. **PARAGRAFO:** El Departamento de Casanare desembolsará su aporte al Municipio, en calidad de ente ejecutor, de la siguiente forma: a) Un desembolso equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del convenio, una vez se suscriba el acta de iniciación del convenio. b) Los pagos siguientes se efectuaran mediante actas parciales sobre el avance de la obra, previa comprobación de la inversión del primer desembolso y aprobación por parte de la interventoría y de la supervisión. La suma de todos los pagos parciales no podrán exceder el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato c) Un pago final correspondiente al saldo que debe ser como mínimo el diez por ciento (10%) del valor del convenio, que será cancelado a la entrega final de la obra a satisfacción del Departamento de Casanare previa liquidación final del convenio. **CLAUSULA TERCERA. PLAZO:** La duración del presente Convenio interadministrativo será de SEIS (6) MESES, de los cuales Cuatro (4) meses serán para la ejecución de la obra física y Dos (2) meses, serán para los procedimientos administrativos para los actos contractuales que deba adelantar el Municipio. **CLÁUSULA CUARTA. IMPUTACION PRESUPUESTAL.** Los recursos que se transfieren al Municipio para pagar los costos de la obra a ejecutar por el presente Convenio interadministrativo, se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 102527 del 4 de octubre de 2010, por un valor de MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$1.214.963.481) MCTE, Imputación Presupuestal No 6.RP60.920607100050101, expedido por la Dirección Técnica de Presupuesto Departamental. **CLAUSULA QUINTA. INTERVENTORIA.** La interventoria de la obra a desarrollar por el presente convenio será ejercida por un interventor contratado con recursos del departamento, quien debe cumplir con lo dispuesto en el Manual de interventoria del Departamento, Resolución No 256 del 17 de mayo de 2004. **CLAUSULA SEXTA. SUPERVISION.** La vigilancia y supervisión del presente Convenio Interadministrativo será ejercida por el Secretario de Obras Públicas y Transporte del Departamento, o por quien el designe, quien vigilará el cumplimiento del mismo en su parte técnica, administrativa, financiera y ambiental. **PARAGRAFO.** En ejercicio de la vigilancia del factor financiero del proyecto, el supervisor designado por el departamento, vigilará y

DOCUMENTO REVISADO
FECHA 6-10-2010
FIRMA [Firma]


REGISTRADO PRESUPUESTO
FECHA 06-10-2010
FIRMA [Firma]

 GOBERNACIÓN DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-08-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	0053 MINUTA 06 OCT 2010	VERSION:01

aprobará todo desembolso de recursos que con ocasión a la ejecución del Convenio Interadministrativo se generen por parte del Municipio, previa presentación de los informes pertinentes. **CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES: A) POR PARTE DEL MUNICIPIO:** Antes de la suscripción del acta de Inicio de ejecución de la obra, el Municipio se obliga con la suscripción del convenio a adelantar todas las acciones necesarias ante las entidades correspondientes, para la obtención de: a) Legalización de servidumbres de predios que se afectarán con la ejecución del proyecto, ello se traduce en la constitución de la respectiva servidumbre y su inscripción ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. b) Demostrar tener la propiedad de los predios donde se construirán las obras permanentes de sistema, para lo cual deberá aportar las copias de las escrituras públicas respectivas. c) Legalización de Permisos de ocupación de derechos de vía, al cruce de líneas de hidrocarburos y gas, si fuere necesario. d) Legalización de Permisos del cruce de Vías, si fuere necesario. **2)** Adelantar los procedimientos contractuales necesarios respetando los principios constitucionales de la función administrativa y la gestión fiscal, el deber de selección objetiva y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades atendiendo para ello consagrados en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás normas reglamentarias. **3)** Socializar el proyecto con la comunidad con el fin de instruirlos sobre los beneficios del proyecto, el impacto social, la inversión de recursos y su fuente, coordinar el tránsito de vehículos, transporte de materiales, accesos a predios, ingreso de personal, y demás acciones que se deban tomar para el buen desarrollo del proyecto. **4)** Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental y velar por que la misma cumpla con las obligaciones que se establecen en estudios previos y en el Manual de interventoria del Departamento, Resolución No 256 del 17 de mayo de 2004. **5)** En caso de presentarse ajustes a los diseños originales se debe hacer entrega a la Gobernación de Casanare de los correspondientes soportes técnicos donde se indique claramente el por qué, las alternativas de solución y una vez aprobada la alternativa más conveniente para el proyecto, hacer entrega de las memorias de cálculo y planos debidamente aprobados por el Alcalde Municipal, la interventoría contratada y el aval de consultor de los diseños originales. **6)** Garantizar, la potabilización del agua que se capte para el consumo de los usuarios, para ello presentará los resultados de análisis de agua, antes y después del tratamiento, certificados por un laboratorio de aguas de reconocimiento. **7)** Analizar y Verificar el cumplimiento del decreto 1575/07 y la resolución 2115 del 22 de junio de 2007 con los ensayos de laboratorio propuestos. (uno al inicio de la obra y uno a la entrega a satisfacción del municipio y beneficiario). **8)** Elaborar informes técnicos, financieros y de gestión que se requieran durante la ejecución del proyecto. **9)** Verificar que se encuentren vigentes los permisos, licencias y demás documentos pertinentes que surjan en el transcurso de la ejecución del proyecto. **10)** Verificar que los permisos de servidumbre, los de propiedad de terreno donde se construyan estructuras permanentes, estén debidamente legalizados. **11)** Dar cumplimiento de los requerimientos ambientales, emanados de los organismos competentes. **12)** Ejecución de las actividades de acuerdo a las normas técnicas establecidas en el RAS 2000 y demás normas concordantes. **14)** Para la construcción de estructuras de concreto se debe dar cumplimiento al NSR-98 y al comité de la ACI 350 para el diseño de estructuras sanitarias de concreto para el mejoramiento del medio ambiente. **15)** Los materiales pétreos deben ser extraídos de fuentes establecidas y avaladas por Corporinoquia, y sus licencias estén vigentes durante la ejecución de la obra y en la cantidad requerida para el proyecto. **16)** Velar por el cumplimiento preventivo y correctivo en materia de seguridad con la adecuada señalización de las vías, caminos de herradura y

DOCUMENTO REVISADO
FECHA 06-10-2010
FIRMA

REGISTRADO PRESUPUESTO
FECHA 06-10-2010
FIRMA


 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-08-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	0053 MINUTA 06 OCT 2010	VERSION:01

trochas durante el desarrollo de la obra. Decreto 769 de 2002. Establecer vallas informativas y preventivas suficientes.17) Dar cumplimiento a los requerimientos que haga el diseñador del proyecto.18) Socializar el proyecto con la comunidad beneficiada, para coordinar el tránsito de materiales, accesos, ingreso de personal, entre otras.19) Velar por el cumplimiento oportuno de los requerimientos ambientales, técnicos, sociales y económicos establecidos por Corporinoquia y el diseñador del proyecto. 20) Revisar los planos y especificaciones técnicas del proyecto. Elaboración de planos record, entrega en medio físico y magnético, carteras topográficas con localización geográfica según plantillas IGAC, Registro fotográfico, Memoria de Cálculos de cantidades hidráulicas. 21) Aportar la capacidad técnica, administrativa, económica y financiera para el buen desarrollo del proyecto. 22) Iniciar la ejecución de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminación en el tiempo establecido. 23) Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestión y demás documentos que se requieran durante la ejecución del proyecto. 24) Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad el interventor y el supervisor del Departamento. 25) Garantizar el suministro de agua potable certificada por la Secretaria de Salud a los beneficiarios unifamiliares del proyecto. 26) Ejecutar todo tipo de actividades tendientes a capacitar, operar, puesta en marcha y funcionamiento del sistema para la potabilización del agua, asegurando el cumplimiento del decreto 1575/07 y la resolución 2115 del 22 de junio de 2007, elaborar análisis de vulnerabilidad, manuales de puesta en marcha y operación. 27) Abrir cuenta de ahorros en entidad Bancaria Local o Regional, a nombre del proyecto, que genere rendimientos financieros, obligándose a entregar al Departamento los rendimientos financieros que se causen una vez se termine la ejecución del proyecto. 28) Exigir a sus contratistas la garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato que celebren, como son: Garantía de seriedad de la propuesta, Buen manejo y correcta inversión del anticipo, cumplimiento general del contrato, pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, responsabilidad extracontractual, estabilidad y calidad de la obra, de conformidad a lo estipulado en el artículo 7 de la ley 1150 del 2007 y el artículo 1º del decreto 2496 del 2009, y demás normas concordantes. 29) Cumplir con lo dispuesto en la Resolución No 02413 de 1979, por medio de la cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción, emitido por el Ministerio de Trabajo y seguridad Social. 30) Realizar la Liquidación del convenio con aprobación de la Interventoría, la Supervisión de la Gobernación y el Municipio. 31) Reintegrar los rendimientos financieros que se causen. B) POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.1. Desembolsar los recursos comprometidos para la ejecución del convenio. 2. Designar un Supervisor que efectúe el seguimiento al Convenio. 3. Aprobar las modificaciones que sean necesarias realizar al proyecto. 4. Exigir informes periódicos que permitan determinar la ejecución real del convenio. 5. Recibir las obras a satisfacción y Liquidar el Convenio. **CLAUSULA OCTAVA. PRESUPUESTO DE INVERSION: EI MUNICIPIO**, se obliga a invertir los recursos dando estricto cumplimiento al presupuesto de inversión, de acuerdo a las actividades, cantidades, ítem, precios unitarios, aprobados por la Oficina de Programación de la Secretaria de Obras Públicas del Departamento, el cual hace parte integral del presente Convenio. **CLÁUSULA NOVENA. TERMINACION DEL CONVENIO.** El presente Convenio se dará por terminado por las siguientes causales. 1. Por cumplimiento del objeto pactado. 2. Por expiración del termino de vigencia del Convenio. 3. Por mutuo acuerdo entre las partes. 4. Por ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible el cumplimiento del Convenio 5. Por incumplimiento de las obligaciones de

DOCUMENTO REVISADO
FECHA 06-10-2010
FIRMA [Signature]

REGISTRADO PRESUPUESTO
FECHA 06-10-2010
FIRMA [Signature]

[Signature]

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-08-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	0053 MINUTA 06 OCT 2010	VERSION:01

las partes. **CLAUSULA DECIMA. LIQUIDACION DEL CONVENIO.** El presente Convenio Interadministrativo será liquidado por las partes de conformidad con el Artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y Ley 80 de 1993. En caso que no se llegue a un acuerdo frente a la liquidación o se conmine al plazo de su liquidación y la misma no se haya realizado de manera bilateral, el Departamento podrá hacerlo de manera unilateral. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA. VEEDURIA CIUDADANA.** El presente Convenio está sujeto a la vigilancia y control conforme lo establece el artículo 66 de la ley 80 de 1993 y ley 850 de 2003, el Municipio se obliga a dar aviso a la veeduría ciudadana respectiva. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. LEGISLACION APLICABLE.** El presente Convenio se rige por la Ley 80 de 1993; ley 1150 de 2007; Decreto 2474 de 2008 y ley 489 de 1998. **CLAUSULA DECIMA TERCERA. PROHIBICION DE LA DOBLE TRIBUTACION:** Prohibase la doble tributación sobre los recursos aportados por el Departamento, en consecuencia los tributos que se generen sobre estos recursos deben ser pagados por el Municipio, de conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza No 011 del 01 de agosto de 2009 y al convenio celebrado entre las partes para dicho fin. **CLAUSULA DECIMA CUARTA. INDEMNIDAD:** De conformidad con el Decreto 0931 del 18 de marzo de 2009, por la cual se modifica el artículo 6o del decreto 4828 del 24 de Diciembre de 2008, El Municipio, se obliga a mantener al Departamento libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamación de terceros o que se derive de sus actuaciones o las de sus subcontratistas o dependientes. **CLAUSULA DECIMA QUINTA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** El presente convenio se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución requiere: 1) Registro presupuestal. 2) Pago de impuestos a que haya lugar. 3) publicación en la Gaceta Departamental a cargo del Departamento. 4) Suscripción del acta de inicio. **CLAUSULA DECIMA SEXTA. DOMICILIO:** Para todos los efectos se tiene como domicilio la ciudad de Yopal, Departamento de Casanare. Para constancia se firma a los

DOCUMENTO REVISADO
FECHA 06-10-2010
FIRMA

RODRIGO FLECHAS RAMÍREZ
Unidad de Contratación.

JORGE EZEQUIEL GARZÓN
Alcalde

Proyecto: CARLOS OMAR GONZALEZ
Profesional de servicios S.G

REGISTRADO PRESUPUESTAL
FECHA 06-10-2010
FIRMA

Documento 01-CV CONVENIOS Numero.[1000053]

Division 01-06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


Tercero 800099429 MUNICIPIO PORE - CASANARE

Fecha: 06-10-2010

Concepto CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE-DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Cuenta	Descripción	Valor
6.RP60.920607100050101	Construcción, Optimización, habilitación	1,214,963,481.00
Total :		1,214,963,481.00

Digitó: HUMBERTO


LUZ AMPARO BELTRÁN SUAREZ
APRUEBA

Pore, 11 de octubre 2010.

El suscrito director del Banco Agrario de Colombia Oficina Pore en uso de sus facultades.


CERTIFICA:

Que el(a) señor(a) MUNICIPIO DE PORE identificado con Nit N° 800.099.429-3, es cliente de esta oficina y realizó apertura de la cuenta de ahorros No. 48646300137-5 Denominada CONVENIO No. 0053/10 Construcción sistema de acueducto vereda Agualinda.

La presente se expide a los 11 días del mes de OCTUBRE de 2010.



MARIA ZORAIDA NOREÑA GÓMEZ
Directora

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RGD00-10-I
	PROCESO DE GESTION DE CALIDAD	FECHA: 05/12/2008
	CONSTANCIA	VERSION:01

**EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CORRESPONDENCIA
DE LA GOBERNACION DE CASANARE**

HACE CONSTAR

Que, el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.0053** de fecha 06/10/2010; suscrito entre EL **DEPARTAMENTO DE CASANARE R/L RODRIGO FLECHAS RAMIREZ**, Director de Contratación c.c No. 6.774.689 expedida en Tunja; y EL **MUNICIPIO DE PORE NIT No. 800.099.429-3 R/L JORGE EZEQUIEL GARZON** identificado con c.c No. 4.214.677; **Objeto:** Construcción del sistema de acueducto por gravedad para La Vereda Agualinda del municipio de Pore, Departamento de Casanare; se encuentra en proceso de publicación en la Gaceta Departamental, conforme lo requiere la ley.

Se expide en Yopal a los 22 días del mes de Octubre de 2010.


ANA ISABEL SILVA PAEZ
Profesional Universitario (E)

Elaboró:
Yudy Marilza Moreno Lozano
Técnico C.P.S



APERTURA DE CUENTA AHORROS


OFICINA : 8646
SOLICITUD No. :

FECHA : 11/10/2010
DEPOSITO INICIAL : 200,000.00
TIPO : COPIA


No. CUENTA AHORROS : 4-8646-3-00137-5

MONEDA : 0-PESO COLOMBIAN

<u>NOMBRE</u>	<u>CÉDULA</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>
MUNICIPIO DE PORE	8000994293	TITULAR PRINC



NOMBRE DE LA CUEN	MUNICIPIO DE PORE		
PRODUCTO BANCARIO :	CUENTAS DE AHORRO ACTIVO		
ORÍGEN DE LA CUENTA :	NO REFERIDO	OFICIAL DE CUENTA :	NORENA GOMEZ MARI
ORIGEN DE FONDOS	CONVENIO N. 0053/10 CONSTRUCCION ACUEDUCTO, VEREDA AGUALINDA		
TIPO DE PROMEDIO :	MENSUAL	CICLO DE LA CTA. :	30 DE CADA MES
TIPO CAPITALIZACIÓN :	DIARIA	CATEGORÍA DE CTA :	NORMAL
No. LIBRETA :		FECHA DE CORTE ESTADO CTA.	29/10/2010

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RGD00-04-I
	PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	FECHA: 05/12/08
	MEMORANDO	VERSION:01

700 46-05 No. 1645

Yopal, 02 DE NOVIEMBRE DE 2010

PARA: JOSE MIGUEL CARDENAS ORTIZ
DIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCIONES

DE: SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE

ASUNTO: DESIGNACION SUPERVISION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0053-2010

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 511 del 26 de Junio de 2008 y/o Decreto No. 193/09, y lo contenido en la CLAUSULA SEXTA del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, me permito comunicarle que ha sido designado para ejercer la SUPERVISION por parte de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte cumpliendo con sus Funciones propias de su cargo al.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.0053-2010

EJECUTOR: MUNICIPIO DE PORE

NIT: 800099429-3

R/L: JORGE EZEQUIEL GARZON

OBJETO: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VALOR: \$1.214.963.481

PLAZO: SEIS (06) MESES

En ejecución del acto contractual, se hace necesario dar cabal cumplimiento a la presentación del proyecto con el respectivo ente ejecutor, la socialización con la comunidad y ejercer estricto control a los cronogramas de ejecución planteados para el cumplimiento de la meta física, a las obligaciones que se derivan del respectivo Convenio Interadministrativo, las contenidas en el Manual de Interventoría y todas aquellas que se requieran para su normal desarrollo.


Se anexa para el desempeño de sus funciones copia del Convenio Interadministrativo No. 0053-2010 CDR No 102527 Estudios Previos, solicitud de oferta, y demás documentos soportes.


Cordialmente,


ING. ARMANDO ALFREDO VARGAS FUENTES
Secretario de Obras Públicas y Transporte

Nohora S.

GESTION DOCUMENTAL
Original: Ing. JOSE MIGUEL CARDENAS ORTIZ
1° Copia: Secretario de Obras
2° Copia: Oficina Jurídica




	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-01-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009
	ACTA DE INICIO			VERSION:	01
HOJA 1 de 2	DD	MM	AA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0053 DE 2010	
	5	11	2010		
DIRECCION TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES					
Nombre dependencia responsable del proyecto o convenio (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)					
ORDEN DE INICIACION DE:					
INTERVENTORIA <input type="checkbox"/> CONVENIO INTERADMINISTRATIVO <input checked="" type="checkbox"/>					
OBRA <input type="checkbox"/>					
GRADO DE RESPONSABILIDAD					
1) Mediante la suscripción de la presente orden de iniciación, el supervisor del convenio asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:					
- Fecha de iniciación y fecha de terminación del convenio					
- Valor del convenio					
Alcanza de metas físicas del convenio					
En consecuencia el representante legal del municipio de Pore inicia la ejecución del convenio Interadministrativo bajo la supervisión designada					
1) El representante legal del municipio de Pore manifiesta que antes de suscribir el convenio Interadministrativo, entrego planos de diseño debidamente aprobados por el y conoce ampliamente las condiciones de las obras a ejecutar.					
TIPO DE CONVENIO					
INTERADMINISTRATIVO					
(Indique en este espacio si se trata de Obra Pública o si corresponde a Estudios o Diseños, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de convenio de consultoría)					
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0053 DE 2010					
(Número de convenio) (Año de suscripción)					
VIGENCIA					
SEIS (6) MESES					
(Indique la vigencia del convenio suscrito especificando días y meses según sea necesario)					
LICITACION PUBLICA () CONCURSO DE MÉRITOS ()					
CONTRATACION DIRECTA (X)					
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)					
OBJETO DEL CONVENIO					
(Indique el objeto del convenio de ejecución suscrito)					
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA ÁGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE					
LOCALIZACION DEL PROYECTO					
MUNICIPIO DE PORE					
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del convenio)					
PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO					
SEIS (6) MESES					
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el convenio)					
FECHA DE INICIACION DEL CONVENIO					
5 DE 11 DE 2010					
(Día) (Mes) (Año)					
FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO					
4 DE MAYO DE 2011					
(Día) (Mes) (Año)					
VALOR APOORTE DEL DEPARTAMENTO					
\$ 1,214,963,481.00					
VALOR APOORTE DEL MUNICIPIO					
\$ 0.00					
VALOR TOTAL DEL CONVENIO					
\$ 1,214,963,481.00					
(Indique el valor del convenio suscrito en números)					
MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE					
(Indique el valor del convenio suscrito en letras)					
EJECUTOR					
MUNICIPIO DE PORE - R/L JORGE EZEQUIEL GARZON					
TRANSFIERE					
GOBERNACION DE CASANARE					
SUPERVISOR					
ING. JOSÉ MIGUEL CARDENAS ORTIZ					
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del convenio)					

GOBERNACIÓN DE CASANARE
SECRETARÍA ASISTENTE JURÍDICA
12 NOV 2010
HORA: 9:05
RECIBIDO POR: [Firma]

GOVERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA ASESORA JURÍDICA
FECHA: 12 NOV 2019
RADICADO No. 9.05
RECIBIDO POR: [Signature]
FORMATO DE 001

83

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RGD00-04-I
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	FECHA: 05-12-08
	MEMORANDO	VERSION:01

730 29-04

97 7-4-0

Yopal,

11 NOV 2010

PARA : ELIANA ANDREA VARGAS SANCHEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE : DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

ASUNTO : Radicación Memorando Designación de Supervisor y Acta de Inicio del Convenio Interadministrativo 053-10 con objeto "Construcción del Sistema de Acueducto por Gravedad de la Vereda Agualinda del Municipio de Pore Departamento de Casanare"

Con el presente me permito radicar Memorando Designación de Supervisor y el Acta de inicio del Contrato del asunto para su trámite y fines pertinentes.

Agradeciendo su gentil colaboración



JOSÉ MIGUEL CARDENAS ORTIZ
Director Técnico de Construcciones




A. G.

Anexos: Tres (3) Folios

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Oficina Asesora Jurídica
Copia: Dirección Técnica de Construcciones
Carpeta.

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RGD00-04-I
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	FECHA: 05-12-08
	MEMORANDO	VERSION:01

730 29 04.

Yopal,

PARA : ELIANA ANDREA VARGAS SANCHEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE : DIRECTOR TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES


ASUNTO: Solicitud desembolso del 50% del aporte del Departamento al Convenio Interadministrativo del Convenio Interadministrativo 053-10 con objeto "Construcción del Sistema de Acueducto por Gravedad de la Vereda Agualinda del Municipio de Pore Departamento de Casanare"

Me permito remitir a usted para su conocimiento, estudio y trámite pertinente la solicitud de la referencia de acuerdo al Parágrafo de la cláusula Segunda del Convenio "Valor y Desembolso de los Aportes", donde se establece que "El Departamento de Casanare desembolsara su aporte al Municipio de Monterrey de la siguiente forma a) Un desembolso equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del convenio, una vez se suscriba suscripción del acta de iniciación del convenio, b) los pagos siguientes mediante actas parciales sobre el avance de obra previa comprobación de la inversión del primer desembolso y aprobación por parte de la Interventoría y de la supervisión. La suma de todos los pagos parciales no podrá exceder el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato c) un pago final correspondiente al saldo que debe ser como mínimo el Diez por Ciento (10%) del valor del convenio que será cancelado a la entrega final de la obra a satisfacción del Departamento de Casanare previa liquidación final del Convenio"

Se adjunta copia de los siguientes documentos:

1. Acta de Iniciación del convenio (2 folios)
2. Copia de la minuta (6folios)
3. Copia de la designación (1 folio)
4. Registro de Disponibilidad Presupuestal (1 folio)
5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal (1 folio)
6. Certificación de la Oficina de Archivo y Correspondencia por pago de publicación (1 folio)
7. Copia de la Apertura de la Cuenta de Ahorro No. 4-8646-3.00137-5 del Banco Agrario (1 folio)
8. Resolución No. 0321 del 06 de Octubre de 2010 (3 folios)

JOSÉ MIGUEL CARDENAS ORTIZ
Director Técnico de Construcciones



Proyectó. A. GONZÁLEZ

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: O.A.J.

Copia: No. 1 Carpeta.

No. 2 Supervisor



NIT. 892.099.216-6

SEÑOR:	ORDEN DE PAGO No.
TESORERO(A):	VALOR:
	FECHA:

SIRVASE PAGARA: _____ NIT: _____ 25-MAY-2010

LA SUMA DE: MUNICIPIO BOB - CAS - ARE - 000000429

SEISCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO

CONCEPTO:

PAGO ANTICIPO DEL 50% DEL CONVENIO N.º 89 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2010, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE FOME, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO:	DESCRIPCION	VALOR
8 RP60 920607100050101	Construcción, Optimización, habilitación, ampliación, estudios, diseño y mantenimiento	507.481.740,50

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
142003	Antic. sobre Conv. y Acuerdos	607,481,740.50	
340101004	Anticipos Por Pagar		607,481,740.50

NETO A PAGAR \$ _____

Ordenador del Pago


Tesorero

Director de Contabilidad

RECIBI: _____

C.C. ó NIT. _____

BANCO	CUENTA No.	CHEQUE No.	FECHA GIRO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE PORE
Nít. 800.099.429-3

Pore, 18 de Marzo de 2011

Señores.

GOBERNACIÓN DE CASANARE
ATT ING. JOSE MIGUEL CÁRDENAS
Director Técnico de Construcciones
Supervisor contrato interadministrativo

**Ref. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0053 DE 2010 – CONSTRUCCION
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA
AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE**

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION

Cordial saludo, Ingeniero Miguel

La presente es con el fin de solicitar formalmente una suspensión al convenio de la referencia, ya que como es de su conocimiento no se ha adjudicado el contrato de interventoría para el respectivo convenio; por lo tanto no es posible dar inicio a la ejecución de actividades de obra.

Sin otro en particular,


JORGE EZEQUIEL GARZÓN
ALCALDE MUNICIPAL DE PORE

Nota: Se adjunta solicitud de prorroga proyectada.

Calle 4 No 16-45 Tel. 6388014 Fax. 6388007
www.porecasanare.gov.co

Liderazgo y Gestión

87

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-10-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009
	ACTA DE SUSPENSION			VERSIÓN:	01

HOJA 1 de 3	Fecha	DD 18	MM 3	AA 2011	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 053 DE 2010
-------------	-------	----------	---------	------------	--

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 1 DE SUSPENSION
(Suspensión/Ampliación de suspensión)

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
- Fecha prevista de reiniciación

En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.

2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de la condiciones de suspensión por parte del Supervisor de Contrato.

5- El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

CONSULTORIA	<input type="checkbox"/>	OBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	DISEÑO Y CONSTRUCCION	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------	------	-------------------------------------	-----------------------	--------------------------

CONTRATO No 53 DE 2010
(Número de contrato) (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

LOCALIZACION DEL PROYECTO PORE CASANARE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO SEIS (6) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)


FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 5 DE 11 DE 2010
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 1,214,963,481.00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESO MLCTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

EJECUTOR	ALCALDIA MUNICIPAL DE PORE (Escriba el nombre o razón social del contratista)	
TRANSFIERE	GOBERNACION DE CASANARE (Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)	
SUPERVISOR	ING. JOSE MIGUEL CARDENAS (Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)	
ANTECEDENTES DEL CONTRATO		

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
XX	XX

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-10-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009
	ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO			VERSIÓN:	01

HOJA 2 de 3	Fecha	DD 18	MM 3	AA 2011	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 053 DE 2010
-------------	-------	----------	---------	------------	--

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ACTA NO. 1 DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
XX	XX
XX	XX

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO SEIS (6) MESES
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE TERMINACION ACTUAL 4 DE MAYO DE 2011
(Día) (Mes) (Año)

VALOR ACTUAL \$ \$ 1.214.963.481,00

MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESO MLCTE

En Yopal Casanare ; a los dieciocho (18) días del mes Marzo de 2011
(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y número (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunieron JORGE EZEQUIEL GARZON representante
Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)

legal del contratista, XX representante legal de la interventoria, y
(Nombre del representante legal o delegado de la firma interventoria)

JOSE MIGUEL CARDENAS ORTIZ Supervisor gubernamental con el fin de suspender el
(Indique el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del Contrato) Suspender/Ampliar la suspensión)

convenio anteriormente citado, de acuerdo con la solicitud de la DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN del 18
(Indique el nombre de la dependencia o entidad) (Interventor o Contratista) (Día de la solicitud)

de Marzo de 2011
(Mes de la solicitud) (Año de la solicitud)

CAUSAS

De acuerdo a la clausula sexta del acta de inicio del presente convenio, en donde se aclara que la interventoria sera contratada por el departamento quien verificara previa a la ejecucion de las obras lo concerniente a la parte tecnica, administrativa, financiera y ambiental, por lo que el municipio no podra dar inicio a las obras hasta que no se surta el proceso contractual de la interventoria. Se aclara que a la fecha no se ha contratado la interventoria por lo tanto no se pueden ejecutar obras.

En vista de las anteriores consideraciones se solicita formalmente una suspensión por término de dos (2) meses,


NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSION 18 DE Marzo DE 2011
(Día) (Mes) (Año)

PLAZO TRANSCURRIDO 133
(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)

PLAZO FALTANTE 47
(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)

FECHA PREVISTA DE REINICIACION 18 DE Mayo DE 2011
(Día) (Mes) (Año)

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-10-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009
	ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO			VERSIÓN:	01

HOJA 3 de 3	Fecha	DD 18	MM 3	AA 2011	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 053 DE 2010
-------------	-------	----------	---------	------------	--

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 1 DE SUSPENSION

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROF
XX	XX	XX	XX

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	CANTIDAD
XX	XX

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
XX	XX	XX	XX

Nota: Se deja constancia que la presente acta no genera costo adicional al proyecto por lo tanto el contratista renuncia a cualquier reclamacion.


El Contratista se compromete a terminar el objeto de convenio No. 53 de 2010
(Indique el número y año del contrato que se suspende o amplía la suspensión)

en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.


Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los dieciocho (18) días del mes de Marzo de 2011
(Mes en que se firma e) (Año de finalización)

<div>Firma</div> <div>Nombre ALCA DIA MUNICIPAL DE POR R/L JORGE GARZON</div> <div>Ejecutor</div>	<div>Firma</div> <div>Nombre JOSE MIGUEL CARDENAS ORTIZ</div> <div>Director Tecnico de Construcciones</div>
<div>Firma</div> <div>Nombre AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA</div> <div>Supervisor designado</div>	




Original Oficina Jurídica:
1era copia interventor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato




FECHA 23 ABR 2011 HORA
RADICADO N° FOLIOS
RECIBIDO POR

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-26-I	
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009	
	ACTA DE REINICIO			VERSIÓN:	01	
HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0053 DE 2010	
		9	5	2011		
DIRECCION TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES						
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)						
ORDEN DE REINICIACION No. 1						
Se hace constar:						
1) Que mediante acta No. 01 se suspendió el Convenio No.053DE 2010						
2) Mediante la suscripción de la presente orden de reiniciación, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:						
- Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del Convenio						
- Nueva fecha de terminación del Convenio con respecto a la inicialmente pactada						
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado						
- Relación de personal y maquinaria inactiva						
- Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el Convenio						
En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del supervisor y contratista.						
3) El supervisor de Convenio velará porque las razones por las cuales se reinicia el Convenio, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.						
CONSULTORIA <input type="checkbox"/> OBRA <input type="checkbox"/> CONVENIO INTERADMINISTRATIVO <input checked="" type="checkbox"/>						
CONVENIO No. 0053 DE 2010 (Número de Convenio)						
VIGENCIA SEIS (6) MESES (Indique la vigencia del Convenio suscrito especificando días y meses según sea necesario)						
OBJETO DEL CONVENIO (Indique el objeto del Convenio de ejecución suscrito)						
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE						
LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE PORE (Indique en este espacio el sitio de ejecución del Convenio)						
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONVENIO SEIS (6) MESES						
FECHA DE INICIACION DEL CONVENIO 5 DE NOV DE 2010 (Día) (Mes) (Año)						
VALOR INICIAL DEL CONVENIO \$ 1.214.963.481,00						
MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (Indique el valor del Convenio suscrito en letras)						
EJECUTOR MUNICIPIO DE PORE - R/L JORGE EZEQUIEL GARZON (Escriba el nombre o razón social del contratista)						
SUPERVISOR ING ROSALINA BARAJAS (ENC.) (Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor de la etapa del Convenio)						

FORMATO DC-027

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-26-I	
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009	
	ACTA DE REINICIO			VERSIÓN:	01	
HOJA 2 de 2	Fecha	DD 9	MM 5	AA 2011	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0053 DE 2010	
DIRECCION TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES						
Nombre dependencia responsable del proyecto o Convenio (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)						
ORDEN DE REINICIACION						
ANTECEDENTES DEL CONVENIO						
CONVENIO ADICIONAL No				TIEMPO (DIAS CALENDARIO)		
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION						
ACTAS No				TIEMPO (DIAS CALENDARIO)		
ACTA DE SUSPENSION No. 1 (18-03-2011)				SESENTA (60) DIAS		
FECHA DE SUSPENSION VIGENTE		18		DE		MARZO
		(Mes)				(Mes)
TIEMPO DE SUSPENSION						
(Indique el tiempo durante el cual el Convenio estuvo suspendido, especificando meses y días según sea necesario)						
FECHA DE REINICIACION		9		DE		MAYO
		(Mes)				(Mes)
						DE 2011
						(Año)
VALOR ACTUAL DEL CONVENIO		\$ 1.214.963.481,00				
(Indique el valor actual del Convenio en números)						
MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE						
En Yopal; a l <u>nueve</u> <u>9</u> días del mes <u>MAYO</u> de <u>2011</u> se reunieron						
(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números)						
JORGE EZEQUIEL GARZON representante legal del MUNICIPIO DE PORE						
Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)						
y la <u>ING ROSALINA BARAJAS</u> Supervisor designado, con el fin de aprobar la orden de						
(Nombre del representante legal o delegado de la supervisor(a))						
reinicio del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminación de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspension.						
El Contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reinicio suscrita						
NUEVA FECHA DE TERMINACION		26		DE		JUN
		(Mes)				(Mes)
						DE 2011
						(Año)
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinie: <u>nueve</u> <u>9</u>						
(Día en letras)						
días del mes (<u>MAYO</u> DE <u>2011</u>		(Mes en que se firma el acta) (Año de finalización)				
Firma						
Nombre		JORGE EZEQUIEL GARZON				
		R/L MUNICIPIO DE PORE				
		Contratista				
Firma						
Nombre		ING ROSALINA BARAJAS				
		DIRECTORA TEC. CONSTRUCC. (ENC.)				
Original Oficina Jurídica 1era copia :supervisor 2da copia contratista 3ra copia dependencia responsable del Convenio FORMATO DC-027						





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE PORE
NIT. 800.099.429-3

Pore, 13 de Junio de 2011

Señores.

GOBERNACIÓN DE CASANARE
ATT.ING. JOSE MIGUEL CÁRDENAS
Director Técnico de Construcciones
Supervisor contrato interadministrativo

GOBERNACIÓN DE CASANARE
Radicación de Correspondencia

20 JUN 2011 4 p
Fecha de Recibo Hora
Nº de Radicación 10128
Proyecto

Ref. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0053 DE 2010 – CONSTRUCCION
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA
AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA

Cordial saludo, Ingeniero Miguel

La presente es con el fin de informarle que debido a la demora en la adjudicación del contrato de interventoría respectivo por parte de la gobernación la iniciación de las obras se atrasó considerablemente, a su vez el trámite contractual generó un atraso en la iniciación de las obras, con lo cual los tiempos establecidos se afectaron notablemente.

La temporada invernal que azota a todas las veredas que limitan con el Rio Pauto incluyendo la vereda Agualinda, genera dificultades y disminución de rendimientos de las actividades de excavación, perforación y fundición de concretos, a su vez atrasa la entrega de materiales de manera oportuna sobre los frentes de obra.

Por lo tanto solicito a usted se sirva evaluar la posibilidad de prorrogar por cinco (5) meses el convenio de la referencia, con el objeto de dar cumplimiento al objeto contractual.

Sin otro en particular,

JORGE EZEQUIEL GARZÓN
ALCALDE MUNICIPAL DE PORE

Nota: Se adjunta solicitud de prórroga proyectada.

Calle 4 No 16-45 Tel. 6388014 Fax. 6388007
www.porecasanare.gov.co

Liderazgo y Gestión

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-10-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009
	ACTA DE SUSPENSION			VERSIÓN:	01

HOJA 1 de 3	Fecha	DD 14	MM 6	AA 2011	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 053 DE 2010
-------------	-------	----------	---------	------------	--

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado).

ACTA No. 3 SUSPENSION No. 2
(Suspensión/Ampliación de suspensión)

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
- Fecha prevista de reiniciación

En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.

2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de la condiciones de suspensión por parte del Supervisor de Contrato.

5- El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

CONSULTORIA	<input type="checkbox"/>	OBRA	<input type="checkbox"/>	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	--------------------------	------	--------------------------	------------------------------	-------------------------------------

CONTRATO No 53 DE 2010
(Número de contrato) (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

LOCALIZACION DEL PROYECTO PORE CASANARE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO SEIS (6) MESES
(Indique en este espacio el numero de dias o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 5 DE 11 DE 2010
(Dia) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 1,214,963,481.00
(Indique el valor del contrato suscrito en numeros)

MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESO MLCTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

EJECUTOR ALCALDIA MUNICIPAL DE PORE
(Escriba el nombre o razón social del contratista)


TRANSFIERE GOBERNACION DE CASANARE
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR ING. JOSE MIGUEL CARDENAS
(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
XX	XX

94

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-10-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009
	ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO			VERSIÓN:	01

HOJA 2 de 3	Fecha	DD 14	MM 6	AA 2011	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 053 DE 2010
-------------	-------	----------	---------	------------	--

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 3 SUSPENSION No. 2

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
ACTA No 01	45 DIAS
XX	XX

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO SEIS (6) MESES
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE TERMINACION ACTUAL 25 DE JUNIO DE 2014
(Día) (Mes) (Año)

VALOR ACTUAL \$ 1,214,963,481.00

MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESO MLCTE

En Yopal Casanare ; a los catorce (14) días del mes Junio de 2011
(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y número (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunieron JORGE EZEQUIEL GARZON representante
Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)

legal del contratista, XX representante legal de la interventoria, y
(Nombre del representante legal o delegado de la interventoria)

JOSE MIGUEL CARDENAS ORTIZ Supervisor gubernador con el fin de suspender el
(Indique el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del Contrato)
Suspender/Ampliar la suspensión)

convenio anteriormente citado, de acuerdo con la solicitud del ejecutor del 14
(Interventor o Contratista) (Día de la solicitud)

de Junio de 2011
(Mes de la solicitud) (Año de la solicitud)

CAUSAS

Una vez realizada la visita técnica a la obra se constata que debido a los desbordamientos del Rio Pauto, es imposible el acceso a la zona, las vías están totalmente anegadas y el transporte de maquinaria pesada es imposible, las tierras donde se realizan excavación para instalación de tubería se encuentran inundadas; en vista de lo anterior no se puede ejecutar actividades de ahí que se toma la decisión de suspender por dos (2) meses el convenio interadministrativo esperando sea el tiempo necesario para que los niveles del río Pauto disminuyan y su flujo de caudal se mantenga dentro del cauce normal.

Se adjunta registro fotografico que evidencia, las inundaciones y anegacion de vías.


NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSION 14 DE Junio DE 2011
(Día) (Mes) (Año)

PLAZO TRANSCURRIDO 134
(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)

PLAZO FALTANTE 46
(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)

FECHA PREVISTA DE REINICIACION 13 DE Agosto DE 2011
(Día) (Mes) (Año)



GOBERNACION DE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA

ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO

CÓDIGO:

FECHA:

VERSIÓN:

RIF02-10-I

22/06/2009

01

HOJA 3 de 3

Fecha

DD

MM

AA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 053 DE 2010

14

6

2011

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ante descentralizado)

ACTA No. 3 SUSPENSION No. 2

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROF
XX	XX	XX	XX

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	CANTIDAD
XX	XX

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
XX	XX	XX	XX

Nota: Se deja constancia que la presente acta no genera costo adicional al proyecto por lo tanto el contratista renuncia a cualquier reclamacion.

El Contratista se compromete a terminar el objeto de convenio No. 53 de 2010
(Interventor o Contratista según el caso)
en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los catorce (14)
(Día en letras)
días del mes de Junio de 2011
(Mes en que se firma e (Año de finalización)

Firma

Nombre ALCAIDIA MUNICIPAL DE POPE R/L JORGE GARCIA
Ejecutor

Firma

Nombre AGUSTIN GONZALEZ GUAYBONZA
Supervisor designado

Firma

Nombre JOSE MIGUEL CARDENAS ORTIZ
Director Tecnico de Construcciones

Original Oficina Juridica:

1era copia :interventor


2da copia contratista

3ra copia dependencia responsable del contrato

Edificio Emiro Sossa Pacheco Carrera 19 No. 6-100 Tel. 6358497 Ext. 208-210 Yopal,
CasanareWeb:http://www.casanare.gov.co

Email: construcciones@casanare.gov.co


96

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-10-I	
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009	
	ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN			VERSION:	1	
HOJA 1 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0053 DE 2010	
		13	AGOSTO	2011		
DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES						
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)						
ACTA No. 4 DE AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2						
GRADO DE RESPONSABILIDAD						
1) Mediante la suscripción de la presente acta de ampliación No.1 a la suspensión No.2, el ejecutor y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: - Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la ampliación de la suspensión del convenio. - Fecha de la ampliación de la suspensión con respecto al plazo convenido - Fecha prevista de reiniciación En consecuencia el ejecutor continuará con la suspensión de las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del convenio en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista. 2) El supervisor del convenio velará porque las razones por las cuales se solicita la ampliación de la suspensión del convenio, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio. 3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el convenio se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de la condiciones de suspensión por parte del Supervisor de convenio.						
INTERVENTORIA <input type="checkbox"/> OBRA <input type="checkbox"/> CONVENIO INTERADMINISTRATIVO <input checked="" type="checkbox"/>						
CONVENIO No. 0053 DE 2010 (Número de convenio) (Año de suscripción)						
VIGENCIA SEIS (6) MESES (Indique la vigencia del convenio suscrito especificando días y meses según sea necesario)						
OBJETO DEL CONVENIO						
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE (Indique el objeto del CONVENIO de ejecución suscrito)						
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO DE PORE (Indique en este espacio el sitio de ejecución del convenio)						
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONVENIO SEIS (6) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el convenio)						
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONVENIO 5 DE NOV DE 2010 (Día) (Mes) (Año)						
VALOR INICIAL DEL CONVENIO \$ 1.214.963.481,00 (Indique el valor del convenio suscrito en números)						
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE (Indique el valor del convenio suscrito en letras)						
EJECUTOR MUNICIPIO DE PORE - R/L JORGE EZEQUIEL GARZON						
SUPERVISOR ING. JOSÉ MIGUEL CARDENAS ORTIZ (Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del convenio)						

FORMATO DC-010




X


97

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-10-I	
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009	
	ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN			VERSION:	1	
HOJA 2 de 3	Fecha	DD 13	MM AGOSTO	AA 2011	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0053 DE 2010	
DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES						
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato(Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)						
ACTA No. 4 DE AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2						
ANTECEDENTES DEL CONVENIO.						
CONVENIO ADICIONAL No		TIEMPO (DIAS CALENDARIO)				
SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN						
ACTAS No		TIEMPO (DIAS CALENDARIO)				
SUSPENSIÓN No. 1 (18/03/2011)		CINCUENTA Y DOS (52) DIAS				
SUSPENSIÓN No. 2 (14/06/2011)		SESENTA (60) DIAS				
CONDICIONES ACTUALES DEL CONVENIO						
PLAZO ACTUAL DEL CONVENIO		SEIS (6) MESES <small>(Indique el plazo actual del convenio, especificando meses y días según sea necesario)</small>				
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		24 <small>(Día)</small>	DE	AGOSTO <small>(Mes)</small>	DE	2011 <small>(Año)</small>
VALOR ACTUAL		\$ 1.214.963.481,00				
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE						
En Yopal, a los TRECE (13) días del mes de AGOSTO de 2011 se reunieron JORGE EZEQUIEL GARZON representante legal del municipio de Pore , como entidad ejecutora del convenio y el Ingeniero JOSÉ MIGUEL CARDENAS ORTIZ ,supervisor designado, con el fin de ampliar la suspensión el convenio anteriormente citado por CUATRO PUNTO CINCO (4.5) MESES, previa las siguientes causas.						
CAUSAS						
1. A la fecha no se han superado las causas que motivaron la suspensión. Como ha sido el desbordamiento del Río Pauto ha imposibilitado el acceso las veredas Agualinda, San Isidro, El Banco, Matalarga e impedidio ejecutar actividades de perforación; excavaciones y por ende sus obras posteriores como colchon de arena, instalacion de tuberia y rellenos.						
NUEVAS CONDICIONES DEL CONVENIO						
FECHA DE SUSPENSIÓN		14 <small>(Día)</small>	DE	JUNIO <small>(Mes)</small>	DE	2011 <small>(Año)</small>
PLAZO TRANSCURRIDO		SESENTA (60) DIAS <small>(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del convenio)</small>				
PLAZO FALTANTE DEL CONVENIO		CERO (0) DIAS <small>(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)</small>				
FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN		26 <small>(Día)</small>	DE	DIC <small>(Mes)</small>	DE	2011 <small>(Año)</small>
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN		6 <small>(Día)</small>	DE	ENERO <small>(Mes)</small>	DE	2012 <small>(Año)</small>






FORMATO DC-010


98

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-10-I	
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009	
	ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN			VERSION:	1	
HOJA 3 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0053 DE 2010	
		13	AGOSTO	2011		
DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES						
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato(Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)						
ACTA No. 4 DE AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2						
RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO						
PERSONAL DIRECTIVO						
CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS		No TARJETA PROF		
X	X	X		X		
X	X	X		X		
PERSONAL OPERATIVO						
CARGO	CANTIDAD					
X	X					
X	X					
MAQUINARIA						
TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD		ESTADO		
X	X	X		X		
EL EJECUTOR se compromete a terminar el objeto del convenio No 053-010 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciacion que para el efecto se suscriba.						
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los TRECE (13) DÍAS del mes de AGOSTO de 2011.						
Firma			Firma			
	JORGE EZEQUIEL GARZON R/L. MUNICIPIO DE PORO EJECUTOR		ING. JOSÉ MIGUEL CARDENAS ORTIZ Director Tecnico de Construcciones			
Firma						
	Nombre AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA Supervisor designado					
Original Oficina Juridica:						
1era copia :interventor						
2da copia contratista						
3ra copia dependencia responsable del convenio						

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD				CÓDIGO:	RIF02-26-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA				FECHA:	22/06/2009
	SOLICITUD DE PRORROGA O ADICION				VERSIÓN:	01
HOJA 1 de 2	Fecha	DD 18	MM NOV	AA 2011	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0053 DE 2010	
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE						
Nombre dependencia responsable del proyecto o convenio (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)						
SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA						
ADICIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input checked="" type="checkbox"/>						
GRADO DE RESPONSABILIDAD 1) Mediante la suscripción de la presente acta de adición, el contratista y el Interventory dell Supervisor del convenio asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: - Avance físico ejecutado de la obra - Valor actual del convenio - Valor facturado hasta la fecha - Valor anticipo, si lo hubo - Valor anticipo amortizado - Valor anticipo por amortizar - Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adición del convenio. 2) El supervisor del convenio velará porque las razones por las cuales se solicita la prorroga del mismo, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio. 3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar estar conforme con la adición o prorroga, previa aprobación del interventor y supervisor .						
A. ANTECEDENTES CONVENIO No. 053 DE 2010 OBJETO DEL CONVENIO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE						
PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO SEIS (6) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el convenio)						
FECHA DE INICIACION DEL CONVENIO 5 DE NOV DE 2010 (Día) (Mes) (Año)						
PRORROGAS						
CONVENIO ADICIONAL No		TIEMPO (MESES)				
X		X				
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION						
ACTAS No.		TIEMPO (DIAS)				
ACTA No. 1 DE SUSPENSION 1 (18/06/09)		CUARENTA Y TRES (43) DIAS				
ACTA No. 3 DE SUSPENSION No- 2 (14/06/2011)		SESENTA (60)DIAS				
AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 2 (13/08/2011)		CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS				
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONVENIO 6 DE ENERO DE 2012 (Día) (Mes) (Año)						
VALOR INICIAL DEL CONVENIO \$ 1.214.963.481,00 (Indique el valor del convenio suscrito en números)						
VALOR ADICIONES						
CONVENIO ADICIONAL No.		VALOR (\$)				
X		X				

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD				CÓDIGO:	RIF02-26-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA				FECHA:	22/06/2009
	SOLICITUD DE PRORROGA O ADICION				VERSIÓN:	01
HOJA 2 de 3	Fecha	DD 18	MM NOV	AA 2011	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0053 DE 2010	
DIRECCION TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES						
Nombre dependencia responsable del proyecto o convenio (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)						
SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA						
EJECUTOR		MUNICIPIO DE PORE - R/L JORGE EZEQUIEL GARZON				
SUPERVISOR		JOSÉ MIGUEL CARDENAS ORTIZ				
B. OBJETO						
El presente documento tiene por objeto solicitar a la GOBERNACION DE CASANARE, una PRORROGA de CINCO (05) MESES, a partir de la fecha de terminación actual, una vez analizada la solicitud emanada por el ejecutor , de fecha 13 de Junio de 2011, radicado el día 20 de Junio del presente año bajo el No. 10128 la cual forma parte integral de la presente solicitud.						
D. ESTADO FINANCIERO						
Valor Aporte Departamento		\$ 1.214.963.481,00				
Valor Aporte Empresa		\$ 0,00				
Valor actual del contrato		\$ 1.214.963.481,00				
Valor 1er desembolso 50% del Aporte de la Gob.				\$ 607.481.740,50		
Valor por transferir				\$ 607.481.740,50		
E. CAUSALES DE LA SOLICITUD						
Debido a a demora en la adjudicacion del contrato de intereventoria respectivo por pate de la Gobernacion la inciación de las obras se atrasó considerablemente, a su vez el tramite contractual genero un ataraso en la iniciación de las obras, con lo cual los tiempos establecidos se afectaron notablemente.						
La temporada invernal que azota a todas las veredas que limitan con el RíoPauto incluyendo la vereda Agualinda genera dificultades y disminución de rendimientos de las actividades de excavación, perforación y fundicion de concretos, a su vez atrasa la entrega de materiales de manera oportuna sobre los frentes de obra.						
COMENTARIOS DE LA SUPERVISION ACERCA DE LA SOLICITUD						
De acuerdo a la solicitud por parte del Ejecutor y avalado por la interventoria contratada, y considerando que:						
1. Está justificada la solicitud en tiempo debidamente avalada por la interventoria .						
2. Es importante aclarar que la obra contratada tiene el carácter de prioritario y representa para la comunidad un paso fundamental para su vida social y económica , por lo que su no continuidad de ejecución inmediata y completa ocasiona no sólo grandes riesgos de daño de las obras ya ejecutadas, sino que afecta en forma directa a la comunidad beneficiaria de la misma,						
3. Es necesario darle cumplimiento al objeto contractual, para dejar un proyecto en óptimas condiciones de funcionabilidad suministrado agua potable. De esta manera se estará cumpliendo con las metas establecidas en el plan de desarrollo departamental.						
FORMATO DC-026						

 GOBERNACIÓN DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD				CÓDIGO:	RIF02-26-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA				FECHA:	22/06/2009
	SOLICITUD DE PRORROGA O ADICION				VERSIÓN:	01
HOJA 3 de 3	Fecha	DD 18	MM NOV	AA 2011	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0053 DE 2010	
DIRECCION TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES						
Nombre dependencia responsable del proyecto o convenio (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)						
SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA						
Por lo anterior se recomienda darle viabilidad a la solicitud presentada por el municipio de Pore						
El ejecutor se compromete a terminar el objeto del convenio en el plazo faltante, de conformidad con la presente solicitud de adición suscrita.						
Para constancia de lo anterior, firman la presente solicitud los que en ella intervinieron a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2011.						
 JORGE EZEQUIEL GARZON R/L. MUNICIPIO DE PORE		 ING. JOSÉ MIGUEL CARDENAS ORTIZ Director Técnico de Construcciones				
Vo.Bo.  ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA Supervisor C.P.S. No. 735-09 Gobernación de Casanare		Vo. Bo.  JAVIER D. FONSECA RODRIGUEZ Secretario de Obras Públicas y Transporte				
1era copia Interventor						
2da copia contratista						
3ra copia Supervisor de Proyecto y/o convenio						
FORMATO DC-026						

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RGD00-04-I
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	FECHA: 05-12-08
	MEMORANDO	VERSION:01

730 29 04

0636

Yopal Casanare,

25 NOV 2011


PARA:

Dr. JUAN CARLOS OSSA QUIÑONES
Director Unidad de Contratación

DE:

DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

ASUNTO:

REMISION SOLICITUD PRÓRROGA CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO. 053 DE 2010

Una vez hecho las correcciones solicitadas me permito reenviar los documentos soporte con el fin de brindar celeridad en el trámite correspondiente en su despacho a la prórroga solicitada por cinco meses del Contrato Interadministrativo 053 de 2010 cuyo objeto corresponde a la Construcción Del Sistema De Acueducto Por Gravedad De La Vereda Agualinda Del Municipio De Pore Departamento De Casanare, me permito remitir dicha solicitud debidamente avalada por la supervisión.

Solicito disponer el trámite que corresponda antes del vencimiento de los respectivos plazos contractuales.

Cordialmente,



ING. JOSE MIGUEL CARDENAS ORTIZ
Director Técnico de Construcciones

Proyectó


Ing. AGUSTÍN GONZÁLEZ GUATIBONZA
Supervisor Designado C.P.S. 0735-09

GESTIÓN DOCUMENTAL.

Original: SOPT
Copia: Carpeta.

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RGD00-04-I
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	FECHA: 05-12-08
	MEMORANDO	VERSION:01

730 29 04

1285-
02 DIC 2011

Yopal Casanare,

PARA: Dra. MARTHA INES GONFRIER SARMIENTO
Gobernadora Designada del Departamento de Casanare

DE: DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

ASUNTO: REMISION MINUTA DE PRÓRROGA CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO. 053 DE 2010

Muy comedidamente le estoy reenviando la minuta de prórroga del convenio referenciado en el asunto cuyo objeto corresponde a la "Construcción del Sistema de Acueducto de Las Vereda Aqualinda del Municipio de Pore, Departamento de Casanare", con sus respectivos soportes para su aprobación y firma, toda vez que este fue devuelto por el grupo asesor del sexto piso en el día ayer sin justificación alguna.

Por lo que de manera muy respetuosamente solicito de su valiosa colaboración, toda vez que la solicitud de prórroga se hizo dando cumplimiento al numeral b del numeral 9.2.2.18 manual de interventoría y teniendo en cuenta que tanto la Supervisión como éste despacho consideraron de vital importancia dicha prórroga para dar cumplimiento al objeto contractual, dando traslado a la oficina de Contratación a través el memorando 730 29 4 0636 calendado el 25 de noviembre del año en curso con radicado 2586, donde dieron el Vo.Bo. a la minuta, como también lo hizo el Asesor de Despacho.

El proyecto enmarcado dentro de dicho convenio tiene el carácter de prioritario y representa para la comunidad un paso fundamental para su vida social y económica (tener Agua Potable), por lo que su no continuidad de ejecución inmediata y completa, ocasiona no sólo grandes riesgos de daño de las obras ya ejecutadas, sino que afecta en forma directa a la comunidad beneficiaria de la misma,

Cordialmente,

ING. JOSE MIGUEL CARDENAS ORTIZ
Director Técnico de Construcciones

Proyectó

Ing. AGUSTIN GONZÁLEZ GUATIBONZA
Supervisor Designado C.P.S. 1847-010

ANEXO VEINTINUEVE (29) FOLIOS


GESTIÓN DOCUMENTAL.


Original: Despacho Gobernadora

Copia: Carpeta.

Control Interno


Secretaría de Obras Públicas y Transporte



 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-15-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	PRÓRROGA	VERSION:01

PRORROGA N° 01 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 0053 DE 06 DE OCTUBRE DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y EL MUNICIPIO DE PORE

Entre los suscritos a saber **MARTHA INÉS GONFRIER SARMIENTO** identificada con cédula de ciudadanía Nro. 21.232.712 de Villavicencio en su calidad de Gobernadora designada del Departamento de Casanare según Decreto No 2961 de 17 de agosto de 2011 suscrito por el Ministro de la Protección Social, delegatario de funciones presidenciales, y quien para el presente documento será **EL DEPARTAMENTO** y por otra parte, **JORGE EZEQUIEL GARZON** identificado con cedula de ciudadanía N° 4.214.677 expedida en Pore, en su condición de Representante Legal del **MUNICIPIO DE PORE**, con NIT 8000994293, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**, hemos acordado celebrar la presente prórroga al convenio interadministrativo N° 0053 de 2010, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1). Que con fecha 06 de octubre de 2010 se celebro el convenio interadministrativo N° 0053 de 2010 cuyo objeto es: **"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE"** 2). Que el Alcalde Municipal mediante oficio de fecha 13 de junio de 2011, radicado No10128 solicito prórroga al convenio interadministrativo en mención, argumentando las siguientes razones: 1) Que debido a la demora en la adjudicación del contrato de interventoría respectiva por parte de la Gobernación, la iniciación de las obras se atrasó considerablemente, a su vez el tramite contractual generó un atraso en la iniciación de las obras, con lo cual los tiempos establecidos se afectaron notablemente. 2) Que la temporada invernal que azota a todas las veredas que limitan con el Río Pauto incluyendo la vereda Agua linda genera dificultades y disminución de rendimientos de las actividades de excavación, perforación y fundición de concretos, a su vez atrasa la entrega de materiales de manera oportuna sobre los frentes de obra. 3).Que se diligenció el formato DC-026 el día 18 de noviembre de 2011, mediante el cual se avalaron las razones expuestas a la solicitud de prórroga del MUNICIPIO, por parte del supervisor Ing. AGUSTIN GONZALEZ y el Director Técnico de Construcciones Ing. JOSE MIGUEL CARDENAS ORTIZ, con el fin de garantizar el cumplimiento del 100% del objeto contratado, y estableciendo con ello que subsiste la necesidad de continuar con el convenio en mención. 4). Que el plazo del convenio interadministrativo N° 053 de 2010 actualmente se encuentra vigente y según las condiciones anteriormente relacionadas se solicito una prórroga por el termino de cinco (5) meses. Analizadas las anteriores consideraciones las partes acuerdan realizar la presente Prórroga, en los siguientes términos: **CLAUSULA PRIMERA. OBJETO:** El objeto del presente documento es Prorrogar el Plazo estipulado en la Cláusula tercera del Convenio Interadministrativo N° 053 de 2010 en cinco (5) meses, contados a partir vencimiento del plazo inicialmente pactado. **CLAUSULA**

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-15-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/12/2008
	PRÓRROGA	VERSION:01

PRORROGA N° 01 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 0053 DE 06 DE OCTUBRE DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y EL MUNICIPIO DE PORE

SEGUNDA: La presente prórroga no generará ningún costo para el Departamento y el ejecutor garantiza indemnidad al departamento frente a su contratista, con ocasión de las causas de la presente. **CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS:** Las cláusulas del convenio que no hubieren sido expresamente modificadas por la presente prórroga, conservan su eficacia y vigencia. **CLAUSULA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente prórroga se perfecciona con: La firma de las partes y la publicación en la Gaceta a cargo del Departamento. En constancia se firma en Yopal a los

EL DEPARTAMENTO

EL MUNICIPIO

06 DIC 2011


MARTHA INÉS GORFRIER SARMIENTO
Gobernadora Designada



JORGE EZEQUIEL GARZÓN
Representante Legal
Alcaldía Municipal Pore


VoBo JUAN CARLOS OSSA QUINONES
Director de Contratación



VoBo
Asesor Despacho

Reviso: 
Director de Contratación


20

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-10-I	
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009	
	ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN			VERSION:	1	
HOJA 1 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0053 DE 2010	
		26	DICIEMBRE	2011		
DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES						
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)						
ACTA No. 5 DE AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2						
GRADO DE RESPONSABILIDAD						
1) Mediante la suscripción de la presente acta de ampliación No.2 a la suspensión No.2, el ejecutor y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:						
- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la ampliación de la suspensión del convenio.						
- Fecha de la ampliación de la suspensión con respecto al plazo convenido						
- Fecha prevista de reiniciación						
En consecuencia el ejecutor continuará con la suspensión de las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del convenio en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.						
2) El supervisor del convenio velará porque las razones por las cuales se solicita la ampliación de la suspensión del convenio, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.						
3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el convenio se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de la condiciones de suspensión por parte del Supervisor de convenio.						
INTERVENTORIA <input type="checkbox"/> OBRA <input type="checkbox"/> CONVENIO INTERADMINISTRATIVO <input checked="" type="checkbox"/>						
CONVENIO No. 0053 DE 2010 (Número de convenio) (Año de suscripción)						
VIGENCIA SEIS (6) MESES (Indique la vigencia del convenio suscrito especificando días y meses según sea necesario)						
OBJETO DEL CONVENIO						
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE						
(Indique el objeto del CONVENIO de ejecución suscrito)						
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO DE PORE (Indique en este espacio el sitio de ejecución del convenio)						
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONVENIO SEIS (6) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el convenio)						
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONVENIO 5 DE NOV DE 2010 (Día) (Mes) (Año)						
VALOR INICIAL DEL CONVENIO \$ 1,214,963,481.00 (Indique el valor del convenio suscrito en números)						
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE						
(Indique el valor del convenio suscrito en letras)						
EJECUTOR MUNICIPIO DE PORE - R/L JORGE EZEQUIEL GARZON						
SUPERVISOR ING. JOSÉ MIGUEL CARDENAS ORTIZ (Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del convenio)						

FORMATO DC-010

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD				CÓDIGO:	RIF02-10-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA				FECHA:	22/06/2009
	ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN				VERSION:	1
HOJA 2 de 3	Fecha	DD 26	MM DICIEMBRE	AA 2011	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0053 DE 2010	
DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES						
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)						
ACTA No. 5. DE AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2						
ANTECEDENTES DEL CONVENIO.						
CONVENIO ADICIONAL No			TIEMPO (DIAS CALENDARIO)			
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN						
ACTAS No			TIEMPO (DIAS CALENDARIO)			
SUSPENSIÓN No. 1 (18/03/2011)			CINCUENTA Y DOS (52) DIAS			
SUSPENSIÓN No. 2 (14/06/2011)			SESENTA (60) DIAS			
AMPLIACION SUSPENSIÓN No. 2 (14/06/2011)			CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS			
CONDICIONES ACTUALES DEL CONVENIO						
PLAZO ACTUAL DEL CONVENIO			SEIS (6) MESES (Indique el plazo actual del convenio, especificando meses y días según sea necesario)			
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL			6 DE ENERO DE 2011 (Día) (Mes) (Año)			
VALOR ACTUAL			\$ 1,214,963,481.00			
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE						
En Yopal, a los VEINTISEIS (26) días del mes de DICIEMBRE de 2011 se reunieron JORGE EZEQUIEL GARZON representante legal del municipio de Pore , como entidad ejecutora del convenio y el Ingeniero JOSÉ MIGUEL CARDENAS ORTIZ, supervisor designado, con el fin de ampliar la suspensión el convenio anteriormente citado por TREINTA (30) DIAS, previa las siguientes causas.						
CAUSAS						
1. A la fecha no se han superado las causas que motivaron la suspensión. Como ha sido el desbordamiento del Río Pauto ha imposibilitado el acceso las veredas Agualinda, San Isidro, El Banco, Matalarga e impedido ejecutar actividades de perforación; excavaciones y por ende sus obras posteriores como colchon de arena, instalacion de tuberia y rellenos.						
2. Adicional debido a la temporada de fin de año es difícil conseguir el personal necesario para desarrollo de actividades como oficiales y ayudantes de obra. Lo cual afecta el desarrollo de la misma.						
NUEVAS CONDICIONES DEL CONVENIO						
FECHA DE SUSPENSIÓN			26 DE diciembre DE 2011 (Día) (Mes) (Año)			
PLAZO TRANSCURRIDO			CIENTO SESENTA Y OCHO (168) DIAS (Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del convenio)			
PLAZO FALTANTE DEL CONVENIO			DOCE (12) DIAS (Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)			
FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN			29 DE ENE DE 2012 (Día) (Mes) (Año)			
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN			6 DE FEBRERO DE 2012 (Día) (Mes) (Año)			

FORMATO DC-010

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-10-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009
	ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN			VERSION:	1

HOJA 3 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0053 DE 2010
		26	DICIEMBRE	2011	

DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 5 DE AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROF
X	X	X	X
X	X	X	X

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	CANTIDAD
X	X
X	X

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
X	X	X	X

EL EJECUTOR se compromete a terminar el objeto del convenio No 053-010 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTISEIS (26) DÍAS del mes de DICIEMBRE de 2011.

Firma

JORGE EZEQUIEL GARZON
R/L MUNICIPIO DE PORE
EJECUTOR

Firma

ING. JOSÉ MIGUEL CARDENAS ORTIZ
Director Técnico de Construcciones

Nombre


AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
Supervisor designado

Original Oficina Jurídica:


1era copia :interventor

2da copia contratista


3ra copia dependencia responsable del convenio

 GOBERNACIÓN DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-10-I	
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009	
	ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN			VERSION:	1	
HOJA 1/de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0053 DE 2010	
		26	ENERO	2012		
DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES						
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)						
ACTA No. 6 DE AMPLIACION No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 2						
GRADO DE RESPONSABILIDAD						
1) Mediante la suscripción de la presente acta de ampliación No.2 a la suspensión No.2, el ejecutor y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:						
- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la ampliación de la suspensión del convenio.						
- Fecha de la ampliación de la suspensión con respecto al plazo convenido						
- Fecha prevista de reiniciación						
En consecuencia el ejecutor continuará con la suspensión de las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del convenio en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.						
2) El supervisor del convenio velará porque las razones por las cuales se solicita la ampliación de la suspensión del convenio, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.						
3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el convenio se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de las condiciones de suspensión por parte del Supervisor de convenio.						
INTERVENTORIA <input type="checkbox"/> OBRA <input type="checkbox"/> CONVENIO INTERADMINISTRATIVO <input checked="" type="checkbox"/>						
CONVENIO No.		0053 DE		2010		
		(Número de convenio)		(Año de suscripción)		
VIGENCIA		DIEZ (10) MESES				
		(Indique la vigencia del convenio suscrito especificando días y meses según sea necesario)				
OBJETO DEL CONVENIO						
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE						
(Indique el objeto del CONVENIO de ejecución suscrito)						
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		MUNICIPIO DE PORE				
		(Indique en este espacio el sitio de ejecución del convenio)				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONVENIO		SEIS (6) MESES				
		(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el convenio)				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONVENIO		5 DE NOV DE 2010				
		(Día) (Mes) (Año)				
VALOR INICIAL DEL CONVENIO		\$ 1,214,963,481.00				
		(Indique el valor del convenio suscrito en números)				
MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE						
(Indique el valor del convenio suscrito en letras)						
EJECUTOR		MUNICIPIO DE PORE R/L LADY PATRICIA BOHORQUEZ				
SUPERVISOR		ING AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA				
		(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del convenio)				

FORMATO DC-010

 GOBERNACIÓN DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-10-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009
	ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN			VERSION:	1
HOJA 2 de 3	Fecha	DD 26	MM ENERO	AA 2012	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0053 DE 2010
DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)					
ACTA No. 6 DE AMPLIACION No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 2					
ANTECEDENTES DEL CONVENIO.					
CONVENIO ADICIONAL No		TIEMPO (DIAS CALENDARIO)			
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN					
ACTAS No		TIEMPO (DIAS CALENDARIO)			
SUSPENSIÓN No. 1 (18/03/2011)		CINCUENTA Y DOS (52) DIAS			
SUSPENSIÓN No. 2 (14/06/2011)		SESENTA (60) DIAS			
AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSP 2 (13/08/2011)		CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS			
AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSP 2 (26/12/2011)		TREINTA (30) DIAS			
CONDICIONES ACTUALES DEL CONVENIO					
PLAZO ACTUAL DEL CONVENIO		SEIS (6) MESES			
(Indique el plazo actual del convenio, especificando meses y días según sea necesario)					
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		6 DE FEBRERO DE 2012			
		(Día) (Mes) (Año)			
VALOR ACTUAL		\$ 1,214,963,481.00			
MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE.					
En Yopal, a los VEINTISEIS (26) días del mes de ENERO de 2012 se reunieron LADY PATRICIA BOHORQUEZ representante legal del municipio de Pore, como entidad ejecutora del convenio y el Ingeniero AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA supervisor designado con el fin de ampliar la suspensión el convenio anteriormente citado por Dos (2) meses, previa las siguientes causas.					
CAUSAS					
1. Mediante memorando 730/29-04.0636 de fecha 25 de Noviembre de 2011, se envió a la Unidad de Contratación solicitud de Prorroga.					
2. Mediante memorando 730/29-04.1285 de fecha 2 de Diciembre de 2011, se envió al Despacho de la Sra. Gobernadora la minuta de la prorrogas con el visto bueno de la Unidad de Contratación y Asesor de Despacho para su firma y legalización. Sin que a la fecha se tenga respuesta alguna.					
3. Tal como se manifestó y se puso en conocimiento en el memorando del numeral 3 de las causas. El proyecto enmarcado dentro de dicho convenio tiene el carácter de prioritario y representa para la comunidad un paso fundamental para su vida social y económica (tener Agua Potable) por lo que su no continuidad de ejecución inmediata y completa ocasiona no sólo grandes riesgos de daño de las obras ya ejecutadas sino que afecta en forma directa a la comunidad beneficiaria de la misma.					
NUEVAS CONDICIONES DEL CONVENIO					
FECHA DE SUSPENSIÓN		14 DE JUNIO DE 2011			
		(Día) (Mes) (Año)			
PLAZO TRANSCURRIDO		DOSCIENTOS VEINTICINCO (225) DIAS			
(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del convenio)					
FORMATO DC-010					

111

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-10-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009
	ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN			VERSION:	1

HOJA 3 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0053 DE 2010
		26	ENERO	2012	

DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 6 DE AMPLIACION No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 2

PLAZO FALTANTE DEL CONVENIO CERO (0) DIAS
(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)

FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN 26 DE MARZO DE 2012
(Día) (Mes) (Año)

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN 6 DE ABRIL DE 2012
(Día) (Mes) (Año)

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROF
X	X	X	X
X	X	X	X

PERSONAL OPERATIVO


CARGO	CANTIDAD
X	X
X	X

MAQUINARIA


TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
X	X	X	

EL EJECUTOR se compromete a terminar el objeto del convenio No 053-010 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.


Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTISEIS (26) DIAS del mes de ENERO de 2012.

Firma 

LADY PATRICIA BOHORQUEZ
R/L. MUNICIPIO DE PORE
EJECUTOR

Firma 

ADRIANA HERNÁNDEZ FUENTES
DIRECTORA DE CONSTRUCCIONES

Firma 

AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
Supervisor designado

Original Oficina Jurídica:
1era copia :Interventor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del convenio





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE PORE

Pore, 10 de Febrero de 2012

INGENIERA
ADRIANA HERNANDEZ FUENTES
Directora Técnica de Construcciones
Gobernación De Casanare
Yopal

GOBERNACIÓN DE CASANARE
Radicación de Correspondencia

10 FEB 2012

Fecha de Recibo

Hora 11:10 PM

Nº. de Radicación

Código

02247

Ref. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 053 DE 2010 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

ASUNTO: Reiteración Solicitud de Prorroga

Cordial saludo, Ingeniera Adriana

La presente es con el fin de expresar la preocupación por algunos sucesos que han afectado el normal desarrollo de la ejecución del convenio de la referencia, los cuales relaciono a continuación:

En primer lugar como es bien sabido el convenio 053 de 2010 tiene como fecha de acta de inicio el día 5 de noviembre de 2010, con un plazo contractual de 6 meses.

Posteriormente se suspende el día 18 de marzo de 2011 debido a que a la fecha, la interventoría la cual era contratada por la gobernación no tenía contrato alguno suscrito, por lo tanto no se podía dar inicio al contrato de obra derivado (ver aclaración 10 del acta de inicio del convenio 053 de 2010). Posteriormente se reinicio el día 9 de mayo de 2011, debido a que las causas que motivaron la suspensión se tenían subsanadas. A esta fecha el convenio tenia ejecutado en tiempo 4 meses aproximadamente, restando solo 2 meses, acorde al plazo inicialmente pactado.

En vista de las observaciones plasmadas anteriormente mediante oficio del 13 de agosto de 2011 y radicado numero 10128 de 20 de junio de 2011 se solicito a la Gobernación de Casanare prorroga al convenio en mención; el tiempo adicional necesario para ejecutar la obra era de 5 meses, acorde a las proyecciones realizadas por el ente ejecutor, ya que la ola invernal que azotaba la vereda generaba dificultades y disminución de rendimientos en las actividades de excavación, fundición de concretos, entrega de materiales a los frentes de obra.

A partir del 14 de junio de 2011 el convenio entro en suspensión hasta la fecha, debido entre otras a los problemas generados por el invierno los cuales imposibilitaban acceso a los frentes de obra. Vale aclarar que actualmente la zona se encuentra en perfectas condiciones para

Calle 4 No 16-45 Tel. 6388014 Fax. 6388007
www.pore-casanare.gov.co

15-02-012
8-45-44



ejecutar la obra, pero en razón a que a la fecha no se ha dado aprobación a la prórroga requerida, la cual ha sido tramitada por el supervisor de la Gobernación sin obtener respuesta favorable, el convenio se encuentra suspendido.

Es preocupante para la administración Municipal el hecho que si bien el convenio tiene un plazo inicial, este se ha visto afectado debido a la falta en la contratación de la interventoría por parte de la Gobernación de Casanare. Adicional a ello sabemos que nuestro departamento es fuertemente azotado por la temporada invernal (abril-noviembre) y más aun la zona donde se ejecuta la obra, pues son áreas ribereñas al Río Pauto.

Resulta entonces de gran importancia dar viabilidad a la ejecución del proyecto, mediante la aprobación cuanto antes de la prórroga de 5 meses solicitada y dar así reinicio a la mayor brevedad posible a las obras pues el tiempo de verano que tenemos actualmente permite avanzar considerablemente en la ejecución de las mismas.

Es importante resaltar aquí nuestro deber como servidores públicos y es cumplir a cabalidad el fin último del convenio de la referencia que es *la satisfacción de una necesidad colectiva de la vereda Agualinda*. Es cumplir con dar agua apta para consumo humano a una comunidad de veinticinco usuarios con que cuenta el proyecto (*tomado de estudios y diseños*).

Dejo a su amable consideración la petición realizada todo en aras de dar cumplimiento al objeto del convenio 053 de 2010.

Sin otro en particular,



LADY PATRICIA BOHORQUEZ
Alcalde(a) Municipal de Pore

Revisó. 
TOMAS STEEWARTH ALFARO
Secretario de Planeación y Obras

Elaboró. 
BORIS ANDRÉS ROA
Profesional Apoyo Aguas de Pore

Nota: Se adjunta copia radicada Gobernación de Casanare

1 folio



GOBERNACIÓN DE
CASANARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO: GESTION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA

SOLICITUD DE PRORROGA O ADICION

CÓDIGO:

FECHA:

VERSIÓN:

RIF02-26-I

22/06/2009

01

HOJA 1 de 3

Fecha

DD

MM

AA

20

FEB

2012

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 0053 DE 2010

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

Nombre dependencia responsable del proyecto o convenio (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

SOLICITUD DE PRORROGA

ADICIÓN

PRÓRROGA

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de adición, el ejecutor y el Supervisor del convenio asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
- Avance físico ejecutado de la obra
- Valor actual del convenio
- Valor facturado hasta la fecha
- Valor anticipo, si lo hubo
- Valor anticipo amortizado
- Valor anticipo por amortizar
- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adición del convenio.
2) El supervisor del convenio velará porque las razones por las cuales se solicita la prórroga del mismo, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.
3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar estar conforme con la adición o prórroga, previa aprobación del interventor y supervisor.

A. ANTECEDENTES

CONVENIO No. 053 DE 2010

OBJETO DEL CONVENIO

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO

SEIS (6) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el convenio)

FECHA DE INICIACION DEL CONVENIO

5 DE NOV DE 2010

PRORROGAS

CONVENIO ADICIONAL No	TIEMPO (MESES)
X	X

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS)
ACTA No. 1 DE SUSPENSION 1 (18/03/011)	CINCUENTA Y DOS (52) DIAS
ACTA No. 3 DE SUSPENSION No. 2 (14/06/2011)	SESENTA (60) DIAS
AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 2 (13/08/2011)	CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS
AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION 2 (26/12/2011)	TREINTA (30) DIAS
AMPLIACION 3 A LA SUSPENSION 2 (26/01/2012)	SESENTA (60) DIAS

FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONVENIO

6 DE ABRIL DE 2012


VALOR INICIAL DEL CONVENIO






S 1.214.963.481.00


VALOR ADICIONES

CONVENIO ADICIONAL No.	VALOR (\$)
X	X

FORMATO DC-026

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-26-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009
	SOLICITUD DE PRORROGA O ADICION			VERSIÓN:	01
HOJA 2/de 3/	Fecha	DD 20/	MM FEB/	AA 2012/	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0053 DE 2010
DIRECCION TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES					
Nombre dependencia responsable del proyecto o convenio (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)					
SOLICITUD DE PRORROGA					
EJECUTOR	MUNICIPIO DE PORE R/LADY PATRICIA BOHORQUEZ				
SUPERVISOR	AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA				
B. OBJETO					
El presente documento tiene por objeto reiterar a la GOBERNACION DE CASANARE una PRORROGA de CINCO (05) MESES a partir de la fecha de terminación actual, una vez analizada la solicitud emanada por el ejecutor de fecha 10 de febrero de 2012, radicado el mismo día bajo el No. 02247 la cual forma parte integral de la presente solicitud					
D. ESTADO FINANCIERO					
Valor Aporte Departamento				\$ 1,214,963,481.00	
Valor Aporte Empresa				\$ 0.00	
Valor actual del convenio				\$ 1,214,963,481.00	
Valor 1er desembolso 50% del Aporte de la Gob.					\$ 607,481,740.50
Valor por transferir					\$ 607,481,740.50
E. CAUSALES DE LA SOLICITUD					
1. Oficio enviado por el ejecutor de fecha 10 de febrero de 2012, radicado en la Gobernación de Casanare, el mismo día, bajo el No. 02247, donde argumenta lo siguiente:					
En primer lugar como es bien sabido el convenio 053 de 2010 tiene como fecha de acta de inicio el día 5 de noviembre de 2010, con un plazo contractual de 6 meses.					
Posteriormente se suspende el día 18 de marzo de 2011 debido a que a la fecha la interventoría la cual era contratada por la gobernación no tenía contrato alguno suscrito, por lo tanto no se podía dar inicio al contrato de obra derivado (ver aclaración 10 del acta de inicio del convenio 053 de 2010). Posteriormente se reinició el día 9 de mayo de 2011, debido a que las causas que motivaron la suspensión se tenían subsanadas. A esta fecha el convenio tenía ejecutado en tiempo 4 meses aproximadamente, restando solo 2 meses, acorde al plazo inicialmente pactado.					
En vista de las observaciones plasmadas anteriormente, mediante oficio del 13 de junio de 2011 y radicado número 10128 de 20 de junio de 2011 se solicitó a la Gobernación de Casanare prorrogar al convenio en mención el tiempo adicional necesario para ejecutar la obra era de 5 meses, acorde a las proyecciones realizadas por el ente ejecutor, ya que la ola invernal que azotaba la vereda generaba dificultades y disminución de rendimientos en las actividades de excavación, fundición de concretos, entrega de materiales a los frentes de obra.					
A partir del 14 de junio de 2011 el convenio entro en suspensión hasta la fecha, debido entre otras a los problemas generados por el invierno los cuales imposibilitaban acceso a los frentes de obra. Vale aclarar que actualmente la zona se encuentra en perfectas condiciones para ejecutar la obra, pero en razón a que a la fecha no se ha dado aprobación a la prórroga requerida la cual ha sido tramitada por el supervisor de la Gobernación sin obtener respuesta favorable, el convenio se encuentra suspendido.					
FORMATO DC-026					

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD				CÓDIGO:	RIF02-26-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA				FECHA:	22/06/2009
	SOLICITUD DE PRORROGA O ADICION				VERSIÓN:	01
HOJA/3 de 3/	Fecha	DD 20/	MM FEB/	AA 2012/	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0053-DE/ 2010/	
DIRECCION TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES						
Nombre dependencia responsable del proyecto o convenio (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)						
SOLICITUD DE PRORROGA						
Es preocupante para la administración Municipal el hecho que si bien el convenio tiene un plazo inicial este se ha visto afectado debido a la falta en la contratación de la interventoria por parte de la Gobernación de Casanare. Adicional a ello sabemos que nuestro departamento es fuertemente azotado por la temporada invernal (abril-noviembre) y más aun la zona donde se ejecuta la obra pues son aéreas ribereñas al Rio Paulo.						
Resulta entonces de gran importancia dar viabilidad a la ejecución del proyecto mediante la aprobación cuanto antes de la prórroga de 5 meses solicitada y dar así reinicio a la mayor brevedad posible a las obras pues el tiempo de verano que tenemos actualmente permite avanzar considerablemente en la ejecución de las mismas.						
Es importante resaltar aquí nuestro deber como servidores públicos y es cumplir a cabalidad el fin último del convenio de la referencia que es la satisfacción de una necesidad colectiva de la vereda Agualinda. Es cumplir con dar agua apta para consumo humano a una comunidad de veinticinco usuarios con que cuenta el proyecto (tomado de estudios y diseños).						
Dejo a su amable consideración la petición realizada todo en aras de dar cumplimiento al objeto del convenio 053 de 2010.						
COMENTARIOS DE LA SUPERVISION ACERCA DE LA SOLICITUD						
De acuerdo a la solicitud por parte del Ejecutor y considerando que:						
1. Está justificada la solicitud en tiempo debidamente avalada por el Ejecutor.						
2. Mediante memorando 730/29-04-0636 de fecha 25 de Noviembre de 2011 se envió a la Unidad de Contratación solicitud de Prórroga.						
3. Mediante memorando 730/29-04-1285 de fecha 2 de Diciembre de 2011 se envió al Despacho de la Sra. Gobernadora la minuta de la prórroga con el visto bueno de la Unidad de Contratación y Asesor de Despacho para su firma y legalización. Sin que a la fecha se tenga respuesta alguna.						
4. Tal como se manifestó y se puso en conocimiento en el memorando del numeral 3 de las causas. El proyecto enmarcado dentro de dicho convenio tiene el carácter de prioritario y representa para la comunidad un paso fundamental para su vida social y económica (tener Agua Potable) por lo que su no continuidad de ejecución inmediata y completa ocasiona no sólo grandes riesgos de daño de las obras ya ejecutadas sino que afecta en forma directa a la comunidad beneficiaria de la misma.						
5. Es necesario darle cumplimiento al objeto contractual para dejar un proyecto en óptimas condiciones de funcionamiento suministrado agua potable.						
Por lo anterior se recomienda darle viabilidad a la solicitud presentada por el municipio de Pore.						
El ejecutor se compromete a terminar el objeto del convenio en el plazo faltante de conformidad con la presente solicitud de adición suscrita.						
Para constancia de lo anterior firman la presente solicitud los que en ella intervinieron a los veinte (20) días del mes de febrero de 2012.						
Firma				Firma		
	LADY PATRICIA BOHORQUEZ R/L MUNICIPIO DE PORE				ING. ADRIANA HERNANDEZ FUENTES Directora Técnica de Construcciones	
Vo Bo.				VoBo		
	ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA Supervisor C.P.S. No. 1845-010				ING NELSON NADYN NIETO RAMIREZ Secretario de Obras Publicas y Transporte	
1era copia interventor 2da copia contratista 3ra copia Supervisor de Proyecto y/o convenio FORMATO DC-026						

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RGD00-04-I
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	FECHA: 05-12-08
	MEMORANDO	VERSION:01

730 29 04 0079

Yopal Casanare, 05 MAR 2012

PARA: Ing. NELSON NADYN NIETO RAMIREZ
Secretario de obras Públicas y Transporte

DE: DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

ASUNTO: REMISION SOLICITUD PRÓRROGA CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO. 053 DE 2010


Me permito enviar los documentos soporte con el fin de brindar celeridad en el trámite correspondiente en su despacho a la prórroga solicitada por cinco meses del Convenio Interadministrativo 053 de 2010 cuyo objeto corresponde a la Construcción Del Sistema De Acueducto Por Gravedad De La Vereda Agualinda Del Municipio De Pore Departamento De Casanare, debidamente avalada por la supervisión.

Solicito disponer el trámite que corresponda antes del vencimiento de los respectivos plazos contractuales.

Cordialmente,


ING. ADRIANA HERNANDEZ FUENTES
Directora Técnica de Construcciones

Proyectó


Ing. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
Supervisor Designado C.P.S. 1847-010

GESTIÓN DOCUMENTAL.

Original: SOPT.
Copia: Carpeta.

GOBERNACION DE CASANARE


S.O.A.T.

RECIBIDO POR:

Juliana

FECHA: 5/03/2012 HORA:

538


 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-15-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/03/2011
	ADICIONAL	VERSION:01

ADICIONAL EN PLAZO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 0053 DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y MUNICIPIO DE PORE-R/L LADY PATRICIA BOHORQUEZ

Entre los suscritos a saber **NELSON NADYN NIETO RAMIREZ**, identificado con cédula de ciudadanía N° 74.859.572 expedida en Yopal, obrando en nombre y representación del Departamento de Casanare, con NIT 892099216-6, en su calidad de Secretario de Obras Publicas y Transportes, Nombrado mediante Decreto N° 001 del 02 de Enero de 2012, Delegado para contratar mediante Decreto Departamental N° 032 del 17 de Febrero de 2012, y quien para el presente documento será **EL DEPARTAMENTO** y por la otra parte **LADY PATRICIA BOHORQUEZ** identificada con cedula de ciudadanía N° 52.897.176 expedida en Bogota, en su condición de alcalde del **MUNICIPIO DE PORE** Con NIT-800099429-3, quien en adelante se denominara **EL MUNICIPIO**, hemos convenido prorrogar el Contrato Interadministrativo N° 0053 de 2010, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE", previa las siguientes consideraciones: 1). Que el Municipio mediante comunicación de fecha 02 de Febrero de 2012, solicita al Departamento una prorrogas al Contrato Interadministrativo N° 0053 de 2010, por un periodo de cinco (5) meses argumentando: a) Que el Municipio de la obra objeto de esta Interventoría solicitó una prorrogas al contrato, y por lo tanto dicho contrato requiere de la continuidad en el seguimiento por parte de la interventoría. 2). Que se anexa la solicitud en el formato DC-026 del Manual de Interventoría del Departamento, de fecha 02 de Febrero de 2012, debidamente diligenciado por el contratista y el supervisor, acompañado por los respectivos soportes técnicos. 3). La presente prorrogas no genera ningún costo para el Departamento. 4). Que analizadas las causas expuestas se considera viable la prorrogas la cual se registrará por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO:** La presente prorrogas tiene por objeto ampliar el plazo pactado en la **CLAUSULA SEPTIMA** del Contrato Interadministrativo N° 0053 de 2010. **CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO.** Prorróguese el plazo pactado en la **CLAUSULA TERCERA** del Contrato Interadministrativo N° 0053 de 2010 en Cinco (5) MESES, contados a partir de la fecha de vencimiento actual. **CLÁUSULA TERCERA: IGENCIA DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS:** Las cláusulas del contrato que no hubieren sido expresamente modificadas por el presente adicional, conservan su eficacia y vigencia. **CLAUSULA CUARTA.** Las partes manifiestan que con el presente adicional no se causa un mayor valor ni un reconocimiento extra económico por parte del Departamento, por lo que se manifiesta que se declaran a paz y salvo de cualquier reclamación económica a futuro por el presente adicional. **CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente prórrogas se perfecciona con la firma de las partes. En

Digitado: Yenny Benavides

Edificio Emiro Sossa Pacheco Carrera 19 N° 6-100 Tel. 6357676 Ext. 401 Yopal, Casanare
Web: <http://www.casanare.gov.co> Email: contratacion@casanare.gov.co

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RAB00-15-I
	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/03/2011
	ADICIONAL	VERSION:01

ADICIONAL EN PLAZO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 0053 DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y MUNICIPIO DE PORE-R/L LADY PATRICIA BOHORQUEZ

constancia se firma en Yopal a los 22 días del mes de MAR de 2012.

EL DEPARTAMENTO

EL MUNICIPIO



NELSON NADYN NIETO RAMIREZ
Secretario de Obras Públicas y Transporte


MUNICIPIO DE PORE
RL/ LADY PATRICIA BOHORQUEZ

Revisó: 
GUSTAVO ADOLFO LARA SEPULVEDA
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Digitó: Yenny Benavides

Edificio Emiro Sossa Pacheco Carrera 19 N° 6-100 Tel. 6357676 Ext_401 Yopal, Casanare
Web: <http://www.casanare.gov.co> Email: contratacion@casanare.gov.co

 GOBERNACIÓN DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-26-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009
	ACTA DE REINICIO			VERSIÓN:	01

HOJA 1 de 2	Fecha	DD 26	MM 3	AA 2012	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0053 DE 2010
-------------	-------	----------	---------	------------	---

DIRECCION TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ante desconcentrado)

ORDEN DE REINICIACION No. 3

Se hace constar:

1) Mediante la suscripción de la presente orden de reiniciación, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del Convenio
- Nueva fecha de terminación del Convenio con respecto a la inicialmente pactada
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
- Relación de personal y maquinaria inactiva

Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el Convenio

En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del supervisor y contratista.

3) El supervisor de Convenio velará porque las razones por las cuales se reinicia el Convenio, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.

CONSULTORIA ☐ OBRA ☐ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ☒

CONVENIO No. 053 DE 2010
(Número de Convenio)

VIGENCIA DIEZ (10) MESES
(Indique la vigencia del Convenio suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONVENIO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE PORE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del Convenio)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONVENIO SEIS (6) MESES

ECHA DE INICIACION DEL CONVENIO 5 DE NOVIEMBRE DE 2010
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONVENIO \$ 1.214.963.481,00
MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MCTE.

(Indique el valor del Convenio suscrito en letras)

EJECUTOR MUNICIPIO DE PORE - R/L LADY PATRICIA BOHORQUEZ
(Escriba el nombre o razón social del contratista)






SUPERVISOR ING AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor de la etapa del Convenio)

ANTECEDENTES DEL CONVENIO

CONVENIO ADICIONAL No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
PRORROGA No. 1 (22/03/2012)	CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS

FORMATO DC-027

Am

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD				CÓDIGO:	RIF02-26-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA				FECHA:	22/06/2009
	ACTA DE REINICIO				VERSIÓN:	01
HOJA 2 de 2	Fecha	DD 26	MM 3	AA 2012	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0053 DE 2010	
DIRECCION TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES						
Nombre dependencia responsable del proyecto o Convenio (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)						
ORDEN DE REINICIACION No. 3						
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION						
ACTAS No				TIEMPO (DIAS CALENDARIO)		
ACTA DE SUSPENSION No. 1 (18/03/2011)/				CINCUENTA Y DOS (52) DIAS /		
ACTA DE SUSPENSION No. 2 (14/06/2011)/				SESENTA (60) DIAS /		
AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No. 2 (13/08/2011)/				CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS /		
AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No. 2 (26/12/2011)/				TREINTA (30) DIAS /		
AMPLIACION No. 3 A LA SUSPENSION No. 2 (26/01/2012)				SESENTA (60) DIAS /		
FECHA DE SUSPENSION VIGENTE		26 /	DE	ENERO /	DE 2012	
		(Mes)		(Mes)	(Año)	
TIEMPO DE SUSPENSION		DOS (2) MESES				
		(Indique el tiempo durante el cual el Convenio estuvo suspendido, especificando meses y días según sea necesario)				
FECHA DE REINICIACION		26 /	DE	MARZO /	DE 2012	
		(Mes)		(Mes)	(Año)	
VALOR ACTUAL DEL CONVENIO		\$ 1.214.963.481,00 /				
		(Indique el valor actual del Convenio en números)				
MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MCTE....						
En Yopal, a los VEINTISEIS (26) días del mes de MARZO de 2012 se reunieron LADY PATRICIA BOHORQUEZ representante legal del municipio de Pore, como entidad ejecutora del convenio, la ingeniera ADRIANA HERNANDEZ FUENTES, directora técnica de construcciones y el Ingeniero AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA, supervisor designado, con el fin de aprobar la orden de reiniciación del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminación de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.						
El ejecutor se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reinicio suscrita						
NUEVA FECHA DE TERMINACION		12 /	DE	SEPTIEMBRE /	DE 2012	
		(Mes)		(Mes)	(Año)	
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTISEIS 26 /						
(Día en letras)						
días del mes de MARZO /		DE		2012 /		
		(Mes en que se firma el acta)		(Año de finalización)		
Firma						
Nombre	LADY PATRICIA BOHORQUEZ			ADRIANA HERNANDEZ FUENTES		
	R/L MUNICIPIO DE PORE			DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		
	Ejecutor					
Firma						
Nombre	AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA			Vo.Bo. NELSON NADYN NIETO RAMIREZ		
	Supervisor designado C.P.S. No. 1847 DE 2010			Secretario de Obras Publicas y Transporte		
Original Oficina Jurídica	1era copia supervisor	2da copia contratista	3ra copia dependencia responsable del Convenio	FORMATO DC-027		



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
PORE - CASANARE
NIT: 800.099.429 - 3



Pore, 24 de Abril de 2012.

Señores
GOBERNACION DE CASANARE
ATN.ING.ADRIANA HERNANDEZ FUENTES
DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES
Yopal

Ref.: Convenio Interadministrativo No. 053 de 2010; cuyo objeto es: **"Construcción Sistema de Acueducto por gravedad de la vereda Agualinda del Municipio de Pore Casanare"**

Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSION AL CONVENIO

Cordial saludo, Ingeniera Adriana

La presente es con el fin de solicitar a usted se sirva evaluar la aprobación de una suspensión al convenio de la referencia, justificado en los siguientes considerandos, los cuales son reportados por el contratista y verificados por interventoría:

- Debido a las condiciones climáticas reinantes en la zona, el nivel freático esta muy alto lo cual no permite realizar excavaciones, ya que las zanjas al estar tan saturadas no permiten la correcta instalación de la tubería, el uso de motobombas es infructuoso.

Por lo anterior se solicita formalmente una suspensión del convenio 053 de 2010 por un termino de CUATRO (4) Meses.

Sin otro en particular,


LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS
Alcaldesa Municipal de Pore

Nota: Se adjunta
Copia solicitud contratista (1 folio)
Copia solicitud interventor (1 folio)
Copia Acta suscrita contrato de obra derivado (2 folios)


123 / 12

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-10-I	
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009	
	ACTA DE SUSPENSIÓN			VERSION:	1	
HOJA 1/ de 3	Fecha	DD 24	MM ABRIL	AA 2012	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0053 DE 2010	
DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES						
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)						
ACTA No. 7 DE SUSPENSIÓN No. 3						
GRADO DE RESPONSABILIDAD						
1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión No.3, el ejecutor y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:						
- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la ampliación de la suspensión del convenio						
- Fecha de la ampliación de la suspensión con respecto al plazo convenido						
- Fecha prevista de reiniciación						
En consecuencia el ejecutor continuará con la suspensión de las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del convenio en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.						
2) El supervisor del convenio velará porque las razones por las cuales se solicita la ampliación de la suspensión del convenio, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.						
3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el convenio se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de la condiciones de suspensión por parte del Supervisor de convenio.						
INTERVENTORIA <input type="checkbox"/> OBRA <input type="checkbox"/> CONVENIO INTERADMINISTRATIVO <input checked="" type="checkbox"/>						
CONVENIO No. 0053 DE 2010 (Número de convenio) (Año de suscripción)						
VIGENCIA DIEZ (10) MESES (Indique la vigencia del convenio suscrito especificando días y meses según sea necesario)						
OBJETO DEL CONVENIO						
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE						
(Indique el objeto del CONVENIO de ejecución suscrito)						
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO DE PORE (Indique en este espacio el sitio de ejecución del convenio)						
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONVENIO SEIS (6) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el convenio)						
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONVENIO 5 DE NOV DE 2010 (Día) (Mes) (Año)						
VALOR INICIAL DEL CONVENIO \$ 1.214.963.481,00 (Indique el valor del convenio suscrito en números)						
MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MCTE...						
(Indique el valor del convenio suscrito en letras)						
EJECUTOR MUNICIPIO DE PORE R/L LADY PATRICIA BOHORQUEZ						
SUPERVISOR ING AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA (Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del convenio)						


FORMATO DC-010

[Handwritten signature]

124

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-10-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009
	ACTA DE SUSPENSIÓN			VERSION:	1
HOJA 2 de 3	Fecha	DD 24	MM ABRIL	AA 2012	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0053 DE 2010
DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)					
ACTA No. 7 DE SUSPENSIÓN No. 3					
ANTECEDENTES DEL CONVENIO.					
CONVENIO ADICIONAL No		TIEMPO (DIAS CALENDARIO)			
ADICIONAL EN PLAZO (22/03/2012)		150 DIAS			
SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN					
ACTAS No		TIEMPO (DIAS CALENDARIO)			
SUSENSION No. 1 (18/03/2011)		CINCUENTA Y DOS (52) DIAS			
SUSENSION No. 2 (14/06/2011)		SESENTA (60) DIAS			
AMPLIACION SUSPENSIÓN No. 2 (13/08/2011)		CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS			
AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2 (26/12/2011)		TREINTA (30) DIAS			
AMPLIACION No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 2 (26/01/2012)		SESENTA (60) DIAS			
CONDICIONES ACTUALES DEL CONVENIO					
PLAZO ACTUAL DEL CONVENIO		ONCE (11) MESES <small>(Indique el plazo actual del convenio, especificando meses y días según sea necesario)</small>			
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		6 DE SEPTIEMBRE DE 2011 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>			
VALOR ACTUAL		\$ 1,214,963,481.00			
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE					
En Yopal, a los VEINTICUATRO (24) días del mes de ABRIL de 2012 se reunieron LADY PATRICIA BOHORQUEZ representante legal del municipio de Pore, como entidad ejecutora del convenio, la ingeniera ADRIANA HERNANDEZ FUENTES, directora tecnica de construcciones y el Ingeniero AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA, supervisor designado, con el fin de suspender el convenio anteriormente citado por CUATRO (4) Meses, previa las siguientes causas.					
CAUSAS					
Debido a las condiciones climaticas reinantes en la zona, el nivel freatico esta muy alto lo cual no permite realizar excavaciones, ya que las zanjas al estar tan saturadas no permiten la correcta instalacion de la tuberia, el uso de motobombas es infructuoso.					
Por lo anterior se solicita la suspensión del contrato de obra por un termino de CUATRO (4) MESES.					
NUEVAS CONDICIONES DEL CONVENIO					
FECHA DE SUSPENSIÓN		24 DE ABRIL DE 2012 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>			
PLAZO TRANSCURRIDO		CIENTO NOVENTA Y SIETE (197) DIAS <small>(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del convenio)</small>			
PLAZO FALTANTE DEL CONVENIO		CIENTO TREINTA Y TRES (133) DIAS <small>(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)</small>			
FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN		23 DE AGOSTO DE 2012 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>			
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN		6 DE ENERO DE 2013 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>			
FORMATO DC-010					

Departamento de Casanare
Municipio de Pore
RECIBIDO
02 OCT 2012
HORA:
RADICACION

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			CÓDIGO:	RIF02-10-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			FECHA:	22/06/2009
	ACTA DE SUSPENSIÓN			VERSION:	1

HOJA 3 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. 0053 DE 2010
		24	ABRIL	2012	

DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 7 DE SUSPENSIÓN No. 3

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No. TARJETA PROF
X	X	X	X
X	X	X	X

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	CANTIDAD
X	X
X	X

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
X	X	X	X

EL EJECUTOR se compromete a:

1. Terminar el objeto del convenio No 053-010 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciacion que para el efecto se suscriba.

2. Dar estricto cumplimiento al memorando 730 46- 05 No. 0318 del 22 de Agosto del 2012 expedido por la Direccion Técnica de Construcciones del Departamento de Casanare

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTICUATRO (24) DÍAS del mes de ABRIL de 2012.

Firma

LADY PATRICIA BOHORQUEZ/

R/L MUNICIPIO DE BORE

EJECUTOR

Firma

Nombre AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA

Supervisor designado C.P.S No. 1847 de 2010

Firma

ADRIANA HERNANDEZ FUENTES

Director Técnico de Construcciones

Vo.Bo

NELSON NADYN NIETO RAMIREZ

Secretario de Obras Publicas

VoBo.

GUSTAVO ADOLFO LARA SEPULVEDA


Jefe Oficina Asesora Juridica


Original Oficina Juridica.


1era copia interventor

2da copia contratista

3ra copia dependencia responsable del convenio



	REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACION DE CASANARE <i>Liderazgo y Gestión</i>	Hoja 1 de 2		
	Fecha			
	2	4	0	4
		DD	MM	AA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE SA ESP"		CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011		
ACTA No. 09 DE SUSPENSIÓN No. 03 DE CONTRATO				
GRADO DE RESPONSABILIDAD 1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: - Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato - Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado - Fecha prevista de reiniciación - Relación de personal y maquinaria inactivo En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista. 2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio. 3) El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.				
CONSULTORIA <input type="checkbox"/> OBRA <input checked="" type="checkbox"/> INTERADMINISTRATIVO <input type="checkbox"/>				
CONTRATO No _____ 020 DE _____ 2011				
VIGENCIA _____ DOS (02) MESES				
OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE				
LOCALIZACION DEL PROYECTO _____ MUNICIPIO DE PORE				
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO _____ DOS (02) MESES				
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO _____ 23 DE MAYO DE 2011				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO _____ \$ 1.206.176.863				
MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE				
CONTRATISTA _____ OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA				
INTERVENTORIA _____ CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES				
SUPERVISOR _____ AGUAS DE PORE S.A. - E.S.P. ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA				
ANTECEDENTES DEL CONTRATO				
CONTRATO ADICIONAL No		TIEMPO (DIAS CALENDARIO)		
PRORROGA (16/09/2011)		SESENTA (60) DIAS		
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION				
ACTAS No		TIEMPO (DIAS CALENDARIO)		
ACTA No. 2 DE SUSPENSION No. 1 (14/06/2011)		TREINTA (30) DIAS		
ACTA No. 3 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 1 (13/07/2011)		TREINTA (30) DIAS		
ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2 (16/08/2011)		CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS		
ACTA No. 6 DE AMP No. 1 DE SUSP No. 2 (26/12/2011)		TREINTA (30) DIAS		
ACTA No. 7 DE AMPLIACION DE SUSP. No. 2 (26/01/2012)		SESENTA (60) DIAS		

	REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACION DE CASANARE <i>Liderazgo y Gestión</i>	Hoja 2 de 2		
		Fecha		
		2	4	0
		DD	MM	AA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "AGUAS DE PORE"		CONTRATO DE OBRA No. 020 DE 2011		
CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO				
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO		CUATRO (04) MESES		
FECHA DE TERMINACION ACTUAL		(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)		
		4	DE	JULIO DE 2012
		(Dia)		(Mes) (Año)
VALOR ACTUAL \$		\$ 1.206.176.863		
MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE				
En Pore, a los Veinticuatro (24) días del mes de Abril de 2012 se reunieron BORIS ANDRES ROA PINEDA, Supervisor designado de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, JOSE PEREZ CORTES, R/L de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P, CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES R/L CONSORCIO MATAGUASAN. firma interventora y OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA como contratista, con el fin de suspender el contrato anteriormente citado por TRES (3) MESES o hasta tanto no se subsanen las causas que motivaron la suspensión.				
CAUSAS				
1.Debido a las condiciones climaticas reinantes en la zona, el nivel freatico esta muy alto lo cual no permite realizar excavaciones, ya que las zanjas al estar tan saturadas no permiten la correcta instalacion de la tubería, el uso de motobombas es infructuoso.				
Por lo anterior se solicita la suspensión del contrato de obra por un termino de TRES (3) MESES. Esto queda plasmado en oficio enviado por el contratista el 23/04/2012.				
NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO				
FECHA DE SUSPENSION		24 DE ABRIL DE 2012		
		(Dia)	(Mes)	(Año)
PLAZO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO		CINCUENTA (50) DIAS		
PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO		SETENTA (70) DIAS		
PLAZO DE LA SUSPENSION		TRES (3) MESES		
FECHA PREVISTA DE REINICIACION		(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)		
		23	DE	JULIO DE 2012
		(Dia)	(Mes)	(Año)
EL CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto del Contrato No. 020 de 2011 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.				
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTICUATRO (24) días del mes de ABRIL de 2012				
Firma		Firma		
DR. JOSE PEREZ CORTES R/L AGUAS DE PORE S.A. E.S.P		ING. BORIS ANDRES ROA PINEDA Supervisor		
Firma		Firma		
ING. OSCAR JAVIER ACUÑA CORREA Contratista		ING. CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES R/L CONSORCIO MATAGUASAN Interventor		
Original Oficina Juridica: 1era copia : Supervisor 2da copia contratista 3ra copia. interventoria				
FORMATO DC-010				

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA
AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO
PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE
PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONSULTORIA /

INFORME EJECUTIVO /
ACTA DE SUSPENSION /
25/04/2012 /

CONSORCIO MATAGUASAN

Contratista

CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME EJECUTIVO	25/04/2012
-------------------	------------

INFORME EJECUTIVO

	DEPARTAMENTO DE CASANARE
Nombre del Contratante Supervisor	ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
Nombre del Contratista	CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
Numero del Contrato	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303
Plazo (Meses)	CINCO (5) MESES
Valor fiscal	\$ 138.381.040,00
Fecha de Iniciación	06/05/2011
Fecha de terminación contractual	05/10/2011
Objeto	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Fecha de autorización	
Periodo autorizado	
Motivo	
Fecha	
Plazo Adicional	
Valor Adicional	
Fecha de suspensión No. 01	14 de Junio de 2011
Motivo	. Debido a las condiciones de invierno que imperan en las veredaa, han ocasionado que en los accesos con que cuentan las veredas se encuentren en mal estado, presentandose dificultades de acceso por desbordamiento de caños y destrucción de las vías, que impiden la entrada de personal equipos y materiales, ademas las lluvias constantes son un impedimento para la ejecución de las actividades tales como excavaciones, rellenos, localización y replanteo y demás inherentes a la ejecución del objeto del contrato.
Tiempo de suspensión	DOS (2) MESES
Nueva fecha de Terminación	05 DE DICIEMBRE DE 2011
Fecha de reiniciación	12 de Agosto de 2011
Fecha de suspensión No. 02	16 de Agosto de 2011

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME EJECUTIVO		25/04/2012
Motivo	que el rio Pauto volvera a desviar su cauce al caños alimeta lo que origino inundaciones en las vias de acceso de las veredas Agualinda; San Isidro y Matalarga como se plasma en el oficio enviado al supervisor de la Gobernacion de Casanare. estas inundaciones impiden el acceso de equipos, personal y material a las zonas de trabajo.	
Tiempo de suspensión	CUATRO Y MEDIO (4,5) MESES ✓	
Fecha de Ampliacion de suspensión No. 02	26 de Diciembre de 2011	
Motivo	Aun no se han superado las causas que motivaron la suspension No. 02, como se plasma en oficio enviado al supervisor de la Gobernacion de Casanare.	
Tiempo de suspensión	UN (1) MES/	
Nueva fecha de Terminación	19 de Mayo de 2012	
Fecha de reiniciación	30 de enero de 2012 /	
Valor ejecutado (Según Actas)		
Valor acta de suspensión		
Valor acta de Adición		
Valor sobrante contrato		
Valor reajustes		

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO
VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y
MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME EJECUTIVO

ACTA DE SUSPENSION

25/04/2012

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA /
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLE /
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303 /

JUSTIFICACION PARA SUSPENSION

El día 23 de Abril el contratista Oscar Acuña solicita la suspensión de los contratos de obra No. 020 y No. 021 suscritos con la Empresa Aguas de Pore S.A. esp. Que tienen por objeto la construcción del acueducto de la vereda Agualinda y la construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore, Departamento de Casanare. /

VEREDA AGUALINDA:

"1. Debido a las condiciones climáticas reinantes en la zona, el nivel freático esta muy alto lo cual no permite realizar excavaciones, ya que las zanjas al estar tan saturadas no permiten la correcta instalación de la tubería, el uso de motobombas es infructuoso. /

Por lo anterior el contratista de obra del contrato 020-2011, suscrito entre Aguas de Pore y el ingeniero Oscar Acuña solicita la suspensión del contrato de obra por un término de Cuatro (4) meses. /

VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA: /

"1. El Puente metálico de acceso a la vereda Matalarga del Municipio de Pore se desplomo totalmente, por la socavación de los extremos de los estribos, evitando el paso de vehículos. /

2. Esto genera que sea imposible en este momento la entrada de material, equipos y personal al sitio de la obra en la vereda Matalarga. /

Por lo anterior el contratista de obra del contrato 021-2011 suscrito entre Aguas de Pore y el ingeniero Oscar Acuña solicita la suspensión del contrato de obra por un término de Cuatro (4) meses. Esto queda plasmado en oficio enviado por el contratista de obra el 23/04/2012 con registro fotográfico. /

"Una vez expuestas esta solicitud la interventoría considera viable realizar la suspensión requerida por el contratista de obra; por lo cual suscribe el acta No. 09 de suspensión No. 03 del contrato de obra No. 020-2011 suscrito entre Aguas de Pore y el ingeniero Oscar Javier Acuña. /

También suscribe el acta No 07 de Suspensión No. 03 de Contrato de Obra No. 021-2011 suscrito entre Aguas de Pore y el ingeniero Oscar Javier Acuña. /

Por lo anterior solicito que el contrato de Interventoría No 303 - 2011 suscrito por la Gobernación de Casanare y el Consorcio Mataguasan, sea suspendido por el mismo tiempo de los contratos de obra citados por un lapso de cuatro (4) meses. /


INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME EJECUTIVO	ACTA DE SUSPENSION	25/04/2012
-------------------	--------------------	------------


ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAQUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303

PRESUPUESTO DE OBRA SAN ISIDRO

3	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	contratado	ejecutado	por ejecutar
		\$ 69.634.609,11	\$ 62.032.498,79	\$ 7.602.110,32
		100%	89,08%	10,92%

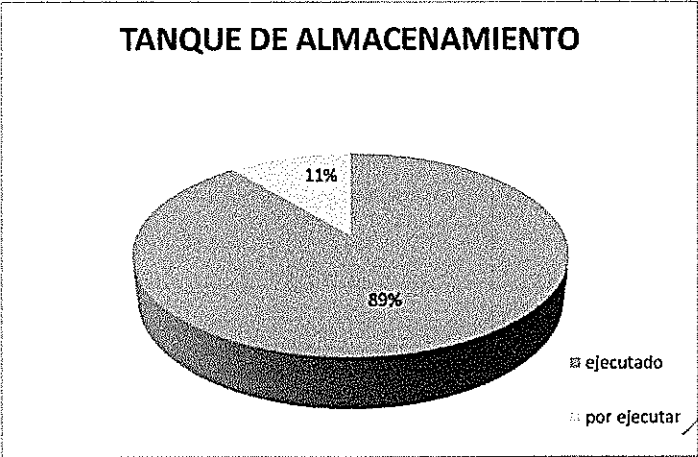

4	RED DE DISTRIBUCION	contratado	ejecutado	por ejecutar
		\$ 196.246.196,00	\$ 109.314.752,09	\$ 86.931.443,91
		100%	55,70%	44,30%

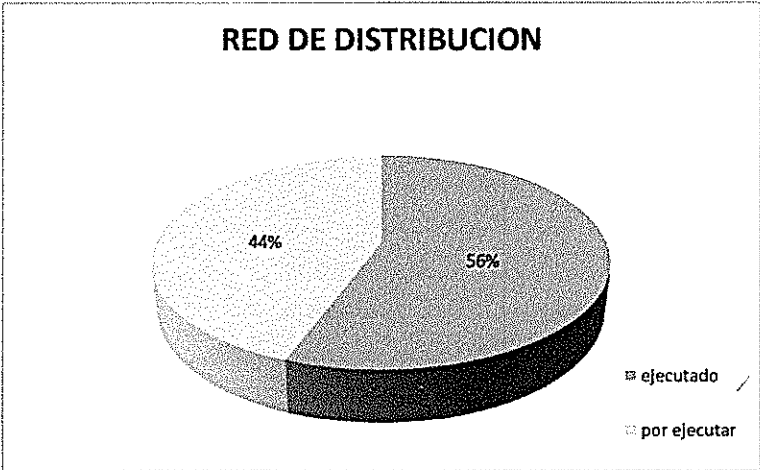


INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME EJECUTIVO	ACTA DE SUSPENSION	25/04/2012
ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA		
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES		
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303		

PRESUPUESTO DE OBRA SAN ISIDRO								
						contratado	ejecutado	por ejecutar
4,01	REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO, PAGADO EN ML	ML	6902	6.983,29	\$ 1.337,00	\$ 9.227.974,00	\$ 9.336.658,73	-\$ 108.684,73
						100%	101,18%	0,00%




						contratado /	ejecutado /	por ejecutar
4,04	SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA PRESION RDE 21 3/4"	ML	3348,5	4.365,89	\$ 3.172,00	\$ 10.621.442,00	\$ 13.848.603,08	-\$ 3.227.161,08
						100% /	130,38% /	0,00% /

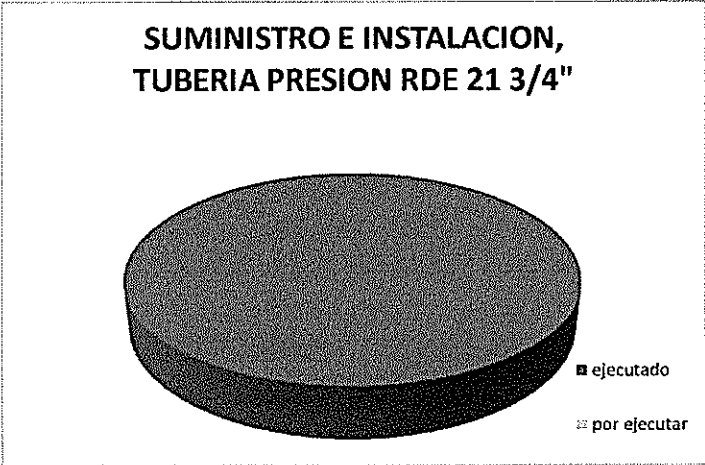


INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME EJECUTIVO	ACTA DE SUSPENSION	25/04/2012
ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA		
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES		
CONTRATO DE CONSULTORA No. 303		

PRESUPUESTO DE OBRA SAN ISIDRO								
						contratado	ejecutado	por ejecutar
4,05	SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA PRESION RDE 21 1"	ML	756,5	679,60	\$ 4.714,00	\$ 3.566.141,00 /	\$ 3.203.634,40 /	\$ 362.506,60 /
						100% /	89,83% /	10,17% /

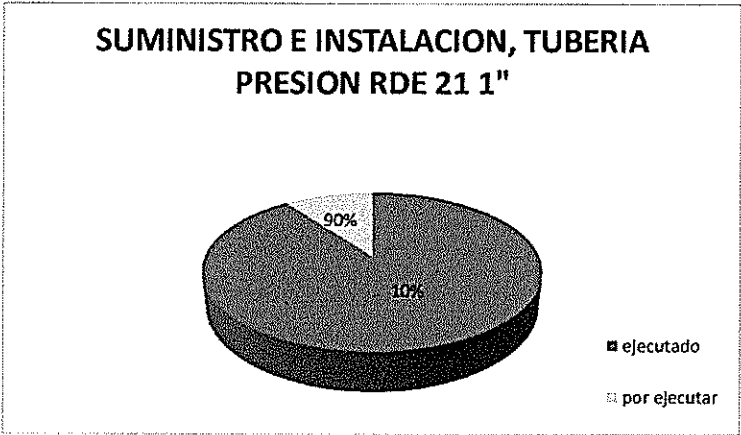

						contratado	ejecutado	por ejecutar
						COMPROMETIDO	COMPLETADO	POR COMPLETAR
4,06	SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA PRESION RDE 21 1 1/4"	ML	366,5	348,60	\$ 7.645,00	\$ 2.801.892,50	\$ 2.665.047,00	\$ 136.845,50
						100%	95,12%	4,88%

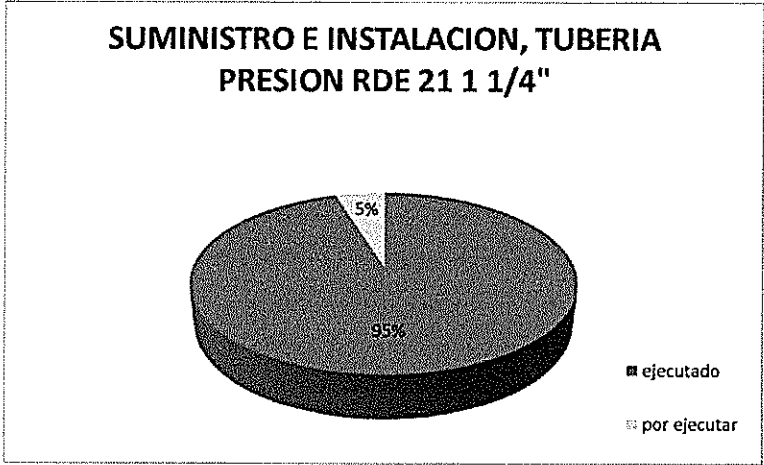


INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME EJECUTIVO	ACTA DE SUSPENSION	25/04/2012
-------------------	--------------------	------------

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303


PRESUPUESTO DE OBRA SAN ISIDRO								
						contratado	ejecutado	por ejecutar
4,07	SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA PRESION RDE 21 1 1/2"	ML	869,50	87,30	\$ 9.720,00	\$ 8.451.540,00	\$ 848.556,00	\$ 7.602.984,00
						100%	10,04%	89,96%

SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA
PRESION RDE 21 1 1/2"



						contratado	ejecutado	por ejecutar
4,08	SUMINISTRO E INSTALACION, UNION MECANICA RDE 26 2 1/2"	ML	461	440,60	\$ 10.315,00	\$ 4.755.215,00	\$ 4.544.789,00	\$ 210.426,00
						100%	95,57%	4,43%

SUMINISTRO E INSTALACION, UNION
MECANICA RDE 26 2 1/2"



INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALUNDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME EJECUTIVO	ACTA DE SUSPENSION	25/04/2012
-------------------	--------------------	------------

ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
CONTRATO DE CONSULTORA No. 303

PRESUPUESTO DE OBRA SAN ISIDRO								
						contratado	ejecutado	por ejecutar
4,09	SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA PRESION RDE 21 2"	ML	1080	1.061,40	\$ 8.175,00	\$ 8.829.000,00	\$ 8.676.945,00	\$ 152.055,00
						100%	98,28%	1,72%




						contratado	ejecutado	por ejecutar
4,10	SUMINISTRO E INSTALACION, UNION MECANICA RDE 21 4"	ML	20		\$ 26.496,00	\$ 529.920,00	\$ 0,00	\$ 529.920,00
						100%	0,00%	100,00%




INFORME EJECUTIVO	ACTA DE SUSPENSION	25/04/2012
ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA		
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES		
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303		

PRESUPUESTO DE OBRA MATALARGA

		contratado	ejecutado	por ejecutar
3	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	\$ 68.489.909,32	\$ 35.169.889,00	\$ 33.320.020,32
		100%	51,35%	48,65%

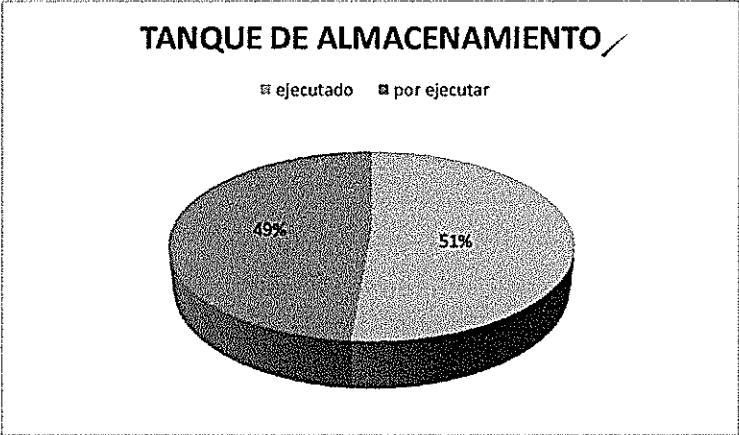


		contratado	ejecutado	por ejecutar
4	RED DE DISTRIBUCION	\$ 243.465.487,40	\$ 174.107.517,37	\$ 69.357.970,03
		100%	71,51%	28,49%

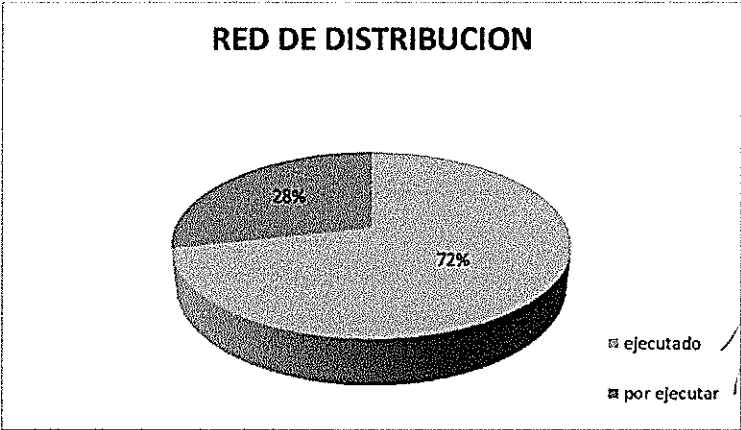


INFORME EJECUTIVO	ACTA DE SUSPENSION	25/04/2012
ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA		
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES		
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303		

PRESUPUESTO DE OBRA MATALARGA						contratado	ejecutado	por ejecutar
4,01	REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO, PAGADO EN ML	ML	8392	7.032,00	\$ 1.337,00	\$ 11.220.104,00	\$ 9.401.784,00	\$ 1.818.320,00
						100%	83,79%	16,21%

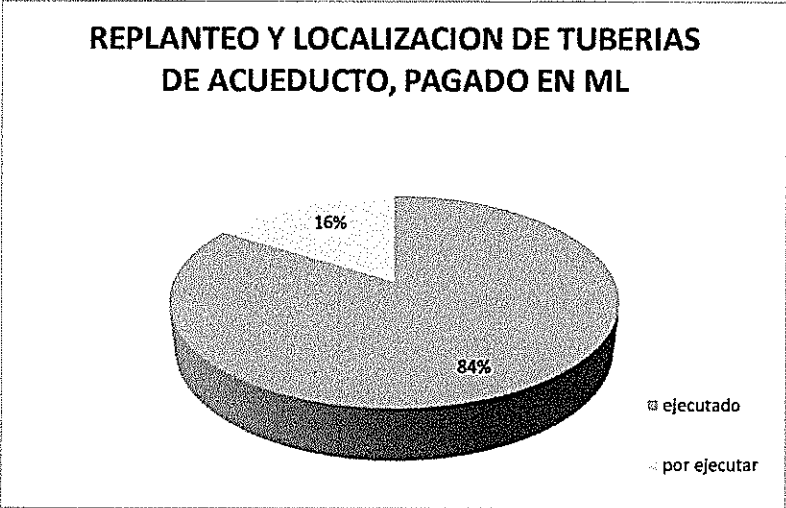


						contratado	ejecutado	por ejecutar
4,04	SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA PRESION RDE 21 3/4"	ML	4336,00	3.776,80	\$ 3.172,00	\$ 13.753.792,00	\$ 11.980.009,60	\$ 1.773.782,40
						100%	87,10%	12,90%

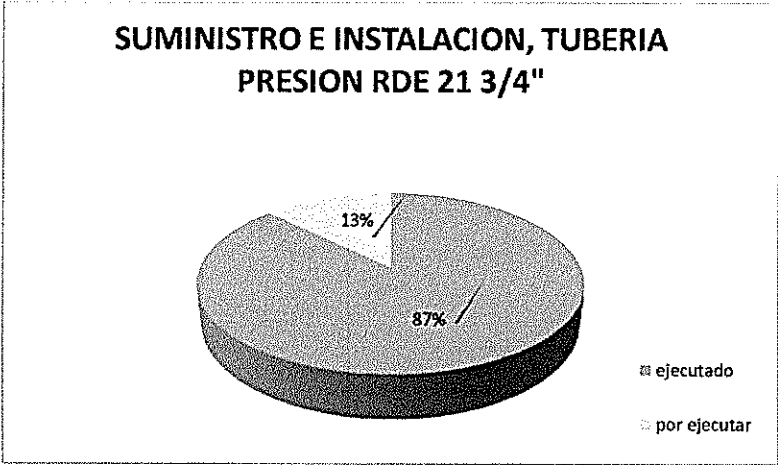

INFORME EJECUTIVO	ACTA DE SUSPENSION	25/04/2012
ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA		
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES		
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303		


PRESUPUESTO DE OBRA MATALARGA								
						contratado	ejecutado	por ejecutar
						presupuestado	presupuestado	presupuestado
4,05	SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA PRESION RDE 21 1"	ML	1471,00	1.250,60	\$ 4.714,00	\$ 6.934.294,00	\$ 5.895.328,40	\$ 1.038.965,60
						100% ✓	85,02% ✓	14,98% ✓

SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA
PRESION RDE 21 1"

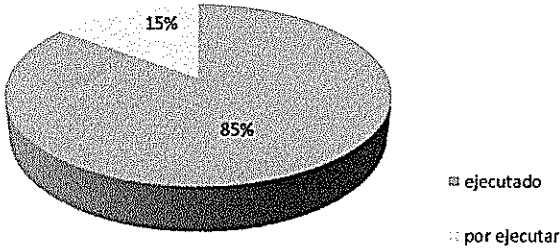

						contratado	ejecutado	por ejecutar
						presupuestado	presupuestado	presupuestado
4,06	SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA PRESION RDE 21 1 1/4"	ML	597,00	519,50	\$ 7.645,00	\$ 4.564.065,00	\$ 3.971.577,50	\$ 592.487,50
						100% ✓	87,02% ✓	12,98% ✓

SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA
PRESION RDE 21 1 1/4"




INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y

INFORME EJECUTIVO	ACTA DE SUSPENSION	25/04/2012
ING. AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA		
CONSORCIO MATAGUASAN R/L CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES		
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303		


PRESUPUESTO DE OBRA MATALARGA								
						contratado	ejecutado	por ejecutar
						CONCEPTOS	CONCEPTOS	CONCEPTOS
4,07	SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA PRESION RDE 21 1 1/2"	ML	719,50	894,50	\$ 9.720,00	\$ 6.993.540,00	\$ 8.694.540,00	-\$ 1.701.000,00
						100%	124,32%	0,00%


SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA PRESION RDE 21 1 1/2"



						contratado	ejecutado	por ejecutar
						CONCEPTOS	CONCEPTOS	CONCEPTOS
4,08	SUMINISTRO E INSTALACION, UNION MECANICA RDE 26 2 1/2"	ML	536,00	532,10	\$ 10.315,00	\$ 5.528.840,00	\$ 5.488.611,50	\$ 40.228,50
						100%	99,27%	0,7%

SUMINISTRO E INSTALACION, UNION MECANICA RDE 26 2 1/2"





GOBERNACION DE
CASANARE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA PUBLICA

ACTA DE REINICIO

CÓDIGO:

RIF02-26-I

FECHA:

22/06/2009

VERSIÓN:

01

HOJA 1/ de 2/

Fecha

DD

MM

AA

23 / 8 / 2012/

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0053-DE 2010

DIRECCION TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ORDEN DE REINICIACION No. 3/

Se hace constar:

1) Mediante la suscripción de la presente orden de reiniciación, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
- Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del Convenio.
- Nueva fecha de terminación del Convenio con respecto a la inicialmente pactada.
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado.
Relación de personal y maquinaria inactiva
Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el Convenio.

Departamento de Casanare

O.A. JURIDICA

RECIBIDO: 2 OCT 2012

HORA:

VALIDACIÓN

En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del supervisor y contratista.

3) El supervisor de Convenio velará porque las razones por las cuales se reinicia el Convenio, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.

CONSULTORIA

OBRA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

CONVENIO No. 053 DE 2010
(Número de Convenio)

VIGENCIA DIEZ (10) MESES
(Indique la vigencia del Convenio suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONVENIO

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE PORE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del Convenio)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONVENIO SEIS (6) MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONVENIO 5 DE NOVIEMBRE DE 2010
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONVENIO \$ 1.214.963.481,00

MIL DOSCIENTOS, CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MCTE.

(Indique el valor del Convenio suscrito en letras)

EJECUTOR MUNICIPIO DE PORE - R/L LADY PATRICIA BOHORQUEZ
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

SUPERVISOR ING AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor de la etapa del Convenio)

ANTECEDENTES DEL CONVENIO


CONVENIO ADICIONAL No

PRORROGA No. 1 (22/03/2012)

TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

CIENTO CINCUENTA (150) DIAS

FORMATO DC-027

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD				CÓDIGO:	RIF02-26-I
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA				FECHA:	22/06/2009
	ACTA DE REINICIO				VERSIÓN:	01
HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0053 DE 2010	
		23	8	2012		
DIRECCION TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES						
Nombre dependencia responsable del proyecto o Convenio (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)						
ORDEN DE REINICIACION No. 3						
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION						
ACTAS No				TIEMPO (DIAS CALENDARIO)		
ACTA DE SUSPENSION No. 1 (18/03/2011)/				CINCUENTA Y DOS (52) DIAS		
ACTA DE SUSPENSION No. 2 (14/06/2011)/				SESENTA (60) DIAS		
AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No. 2 (13/08/2011)/				CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS		
AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No. 2 (26/12/2011)/				TREINTA (30) DIAS		
AMPLIACION No. 3 A LA SUSPENSION No. 2 (26/01/2012)/				SESENTA (60) DIAS		
ACTA DE SUSPENSION No. 3 (24/04/2012)/				CIENTO VEINTE (120) DIAS		
FECHA DE SUSPENSION VIGENTE				24	DE	ABRIL
				(Mes)		(Mes)
TIEMPO DE SUSPENSION				CUATRO (4) MESES		
				(Indique el tiempo durante el cual el Convenio estuvo suspendido, especificando meses y días según sea necesario)		
FECHA DE REINICIACION				23	DE	AGOSTO
				(Mes)		(Mes)
VALOR ACTUAL DEL CONVENIO				\$	1.214.963.481,00	
				(Indique el valor actual del Convenio en números)		
MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MCTE./						
En Yopal, a los VEINTITRES (23) días del mes de AGOSTO de 2012 se reunieron LADY PATRICIA BOHORQUEZ representante legal del municipio de Pore, como entidad ejecutora del convenio, la ingeniera ADRIANA HERNANDEZ FUENTES, directora técnica de construcciones y el Ingeniero AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA, supervisor designado, con el fin de aprobar la orden de reiniciación del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminación de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.						
<input checked="" type="checkbox"/> El ejecutor se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reinicio						
Firmada						
NUEVA FECHA DE TERMINACION						
12 DE ENERO DE 2013						
(Mes) (Año)						
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTITRES 23						
(Día en letras)						
días del mes de AGOSTO DE 2012						
(Mes en que se firma el acta) (Año de finalización)						
Firma						
Nombre						
LADY PATRICIA BOHORQUEZ						
R/L MUNICIPIO DE PORE						
Ejecutor						
Firma						
Nombre						
AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA						
Supervisor designado C.P.S. No. 1847 DE 2010						
Firma						
Nombre						
ADRIANA HERNANDEZ FUENTES						
DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES						
Firma						
Nombre						
Vo.Bo. NELSON NADYN NIETO RAMIREZ						
Secretario de Obras Publicas y Transporte						
Original Oficina Jurídica 1era copia :supervisor 2da copia contratista 3ra copia dependencia responsable del Convenio						
FORMATO SC-027						
