

# **CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN**

NIT: 901.583.472-2

*Sincelejo, 15 de Marzo de 2024*

**OFICIO: CIPM-218**

**Señores**  
**CAMILO PEÑUELA MORENO**  
**R/L PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS.**

**REFERENCIA:** *Contrato de Obra No. 3644036 "Modernización de la Red de Agua Potable del Centro Distrital de Salud, incluye renovación de equipos de presión de agua."*

**ASUNTO:** *SOLICITUD DE ENTRADA DE MATERIAL Y PERSONAL EN OBRA*

Cordial saludo.

Por medio de la presente, solicitamos muy comedidamente, se nos de acceso al personal de obra, al sitio de trabajo, programado para el día lunes 18 de marzo de 2024, esto con el fin de dar cumplimiento a la reprogramación de obras, según el plazo restante para ejecutar las obras, en este caso para inspeccionar los tanques de agua potable existentes, e iniciar con la ejecución de la actividad NP-2 IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON METODO DEL MEBRANA PVC. INLUYE MATERIALES MANO DE OBRA.

Solicitamos, además, permiso para la entrada de materiales al edificio, correspondientes a la actividad descrita, los cuales serán recibidos por el residente de obra.

Al presente adjuntamos la reprogramación de las obras, hecha con el plazo restante de ejecución de las obras, sin embargo, esta también será enviada el día de hoy, junto con el plan de contingencia solicitado, anteponiendo que no fue entregado el día de ayer 15 de marzo de 2024, al no tener certeza de la duración de algunas actividades, limitando la construcción de dicha reprogramación, no obstante, se entregara en el transcurso del día.


Nota: fueron enviada las hojas de vida del personal profesional y técnico para su aprobación, junto con las afiliaciones a ARL, con lo cual el lunes podrían entrar al sitio de trabajo, contando con la aprobación de la interventoría.

No siendo otro el motivo atentamente.

*Carmelo Mendivil Tovar*  
**Ingeniero: CARMELO FABIAN MENDIVL TOVAR**  
**Rep. Legal CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN**

DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

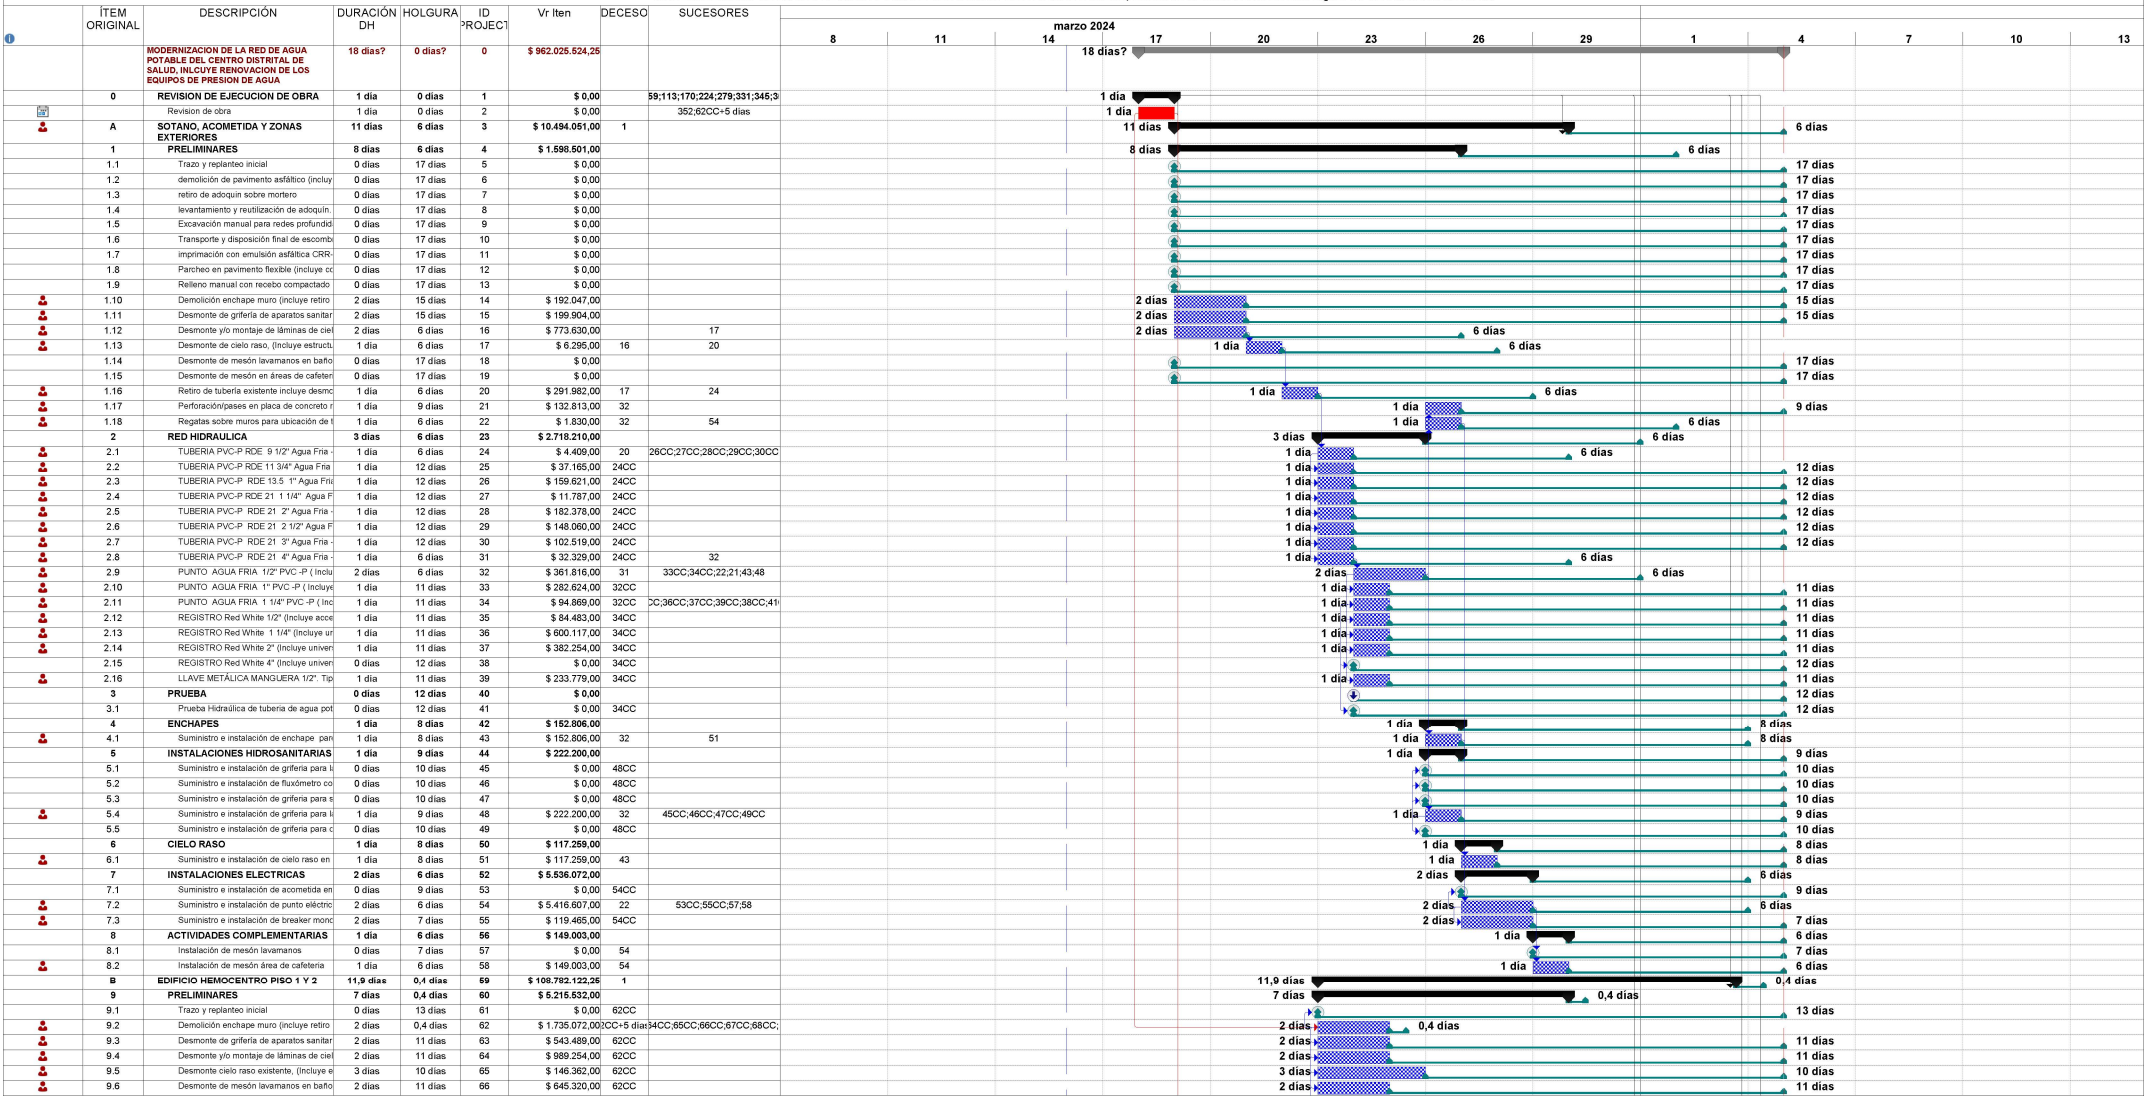

Tarea Normal Ruta Crítica  
División Tarea Normal Ruta Crítica  
Tarea Normal NO Crítica  
División Tarea Normal NO Crítica  
Progreso En Duración Tareas Normales  
Progreso En Costos Tareas Normales  
Hito Tareas Normales  
Holgura Total  
Posposición Previsto a Real Línea de Base  
Posposición Previsto a Real Línea de Base  
Resumen General  
Tarea Ruta Crítica Resumida (Recogida)













División Tarea Ruta Crítica Resumida (Recogida)  
Tarea Normal NO Crítica Resumida (Recogida)  
División Tarea Normal NO Crítica Resumida (Recogida)  
Hito Tarea Resumida (Recogida)  
Progreso En Duración Tarea Resumida (Recogida)  
Progreso En Costos Tarea Resumida (Recogida)  
Tarea Externa  
Hito Tarea Externa  
Fecha Límite  
Agrupar por Síntesis  
Tarea Resumen Ruta Crítica













Tarea Resumen Ruta NO Crítica  
Progreso En Duración Tarea Resumen  
Progreso En Costos Tarea Resumen  
Hito Tarea Resumen  
Progreso del Resumen  
Tarea Prevista Línea de Base  
Tarea Prevista Línea de Base  
División Tarea Prevista Línea de Base  
Hito de Línea de Base  
Tarea Prevista Línea de Base  
Tarea Prevista Línea de Base 1 - AJUSTADA  
División Tarea Prevista Línea de Base 1 - AJUSTADA

Hito inactivo  
Resumen inactivo  
Tarea manual  
solo duración  
Informe de resumen manual  
Resumen manual  
solo el comienzo  
solo fin  
Tareas externas  
Hito externo  
Resumen del Proyecto

**MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA**



-  División Tarea Ruta Crítica Resumida (Recogida)
-  Tarea Normal NO Crítica Resumida (Recogida)
-  División Tarea Normal NO Crítica Resumida (Recogida)
-  Hito Tarea Resumida (Recogida)
-  Progreso En Duración Tarea Resumida (Recogida)
-  Progreso En Costos Tar
-  a Resumida (Recogida)
-  Tarea Externa
-  Hito Tarea Externa
-  Fecha Límite
-  Agrupar por Síntesis
-  Tarea Resumen Ruta Crítica


-  Tarea Resumen Ruta NO Crítica
-  Progreso En Duración Tarea Resumen
-  Progreso En Costos Tarea Resumen
-  Hito Tarea Resumen
-  Progreso del Resumen
-  Tarea Prevista Línea de Base
-  Tarea Prevista Línea de Base
-  División Tarea Prevista Línea de Base
-  Hito de Línea de Base
-  Tarea Prevista Línea de Base
-  Tarea Prevista Línea de Base 1 - AJUSTADA
-  División Tarea Prevista Línea de Base 1 - AJUSTADA

-  Hito inactivo
-  Resumen inactivo
-  Tarea manual
-  solo duración
-  Informe de resumen manual
-  Resumen manual
-  solo el comienzo
-  solo fin
-  Tareas externas
-  Hito externo
-  Resumen del Proyecto

**JORNADA LABORAL : LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-12:00M  
Y DE 2:00 PM A 6:00 PM SABADOS DE 8:00 AM - 1:00 PM**

DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

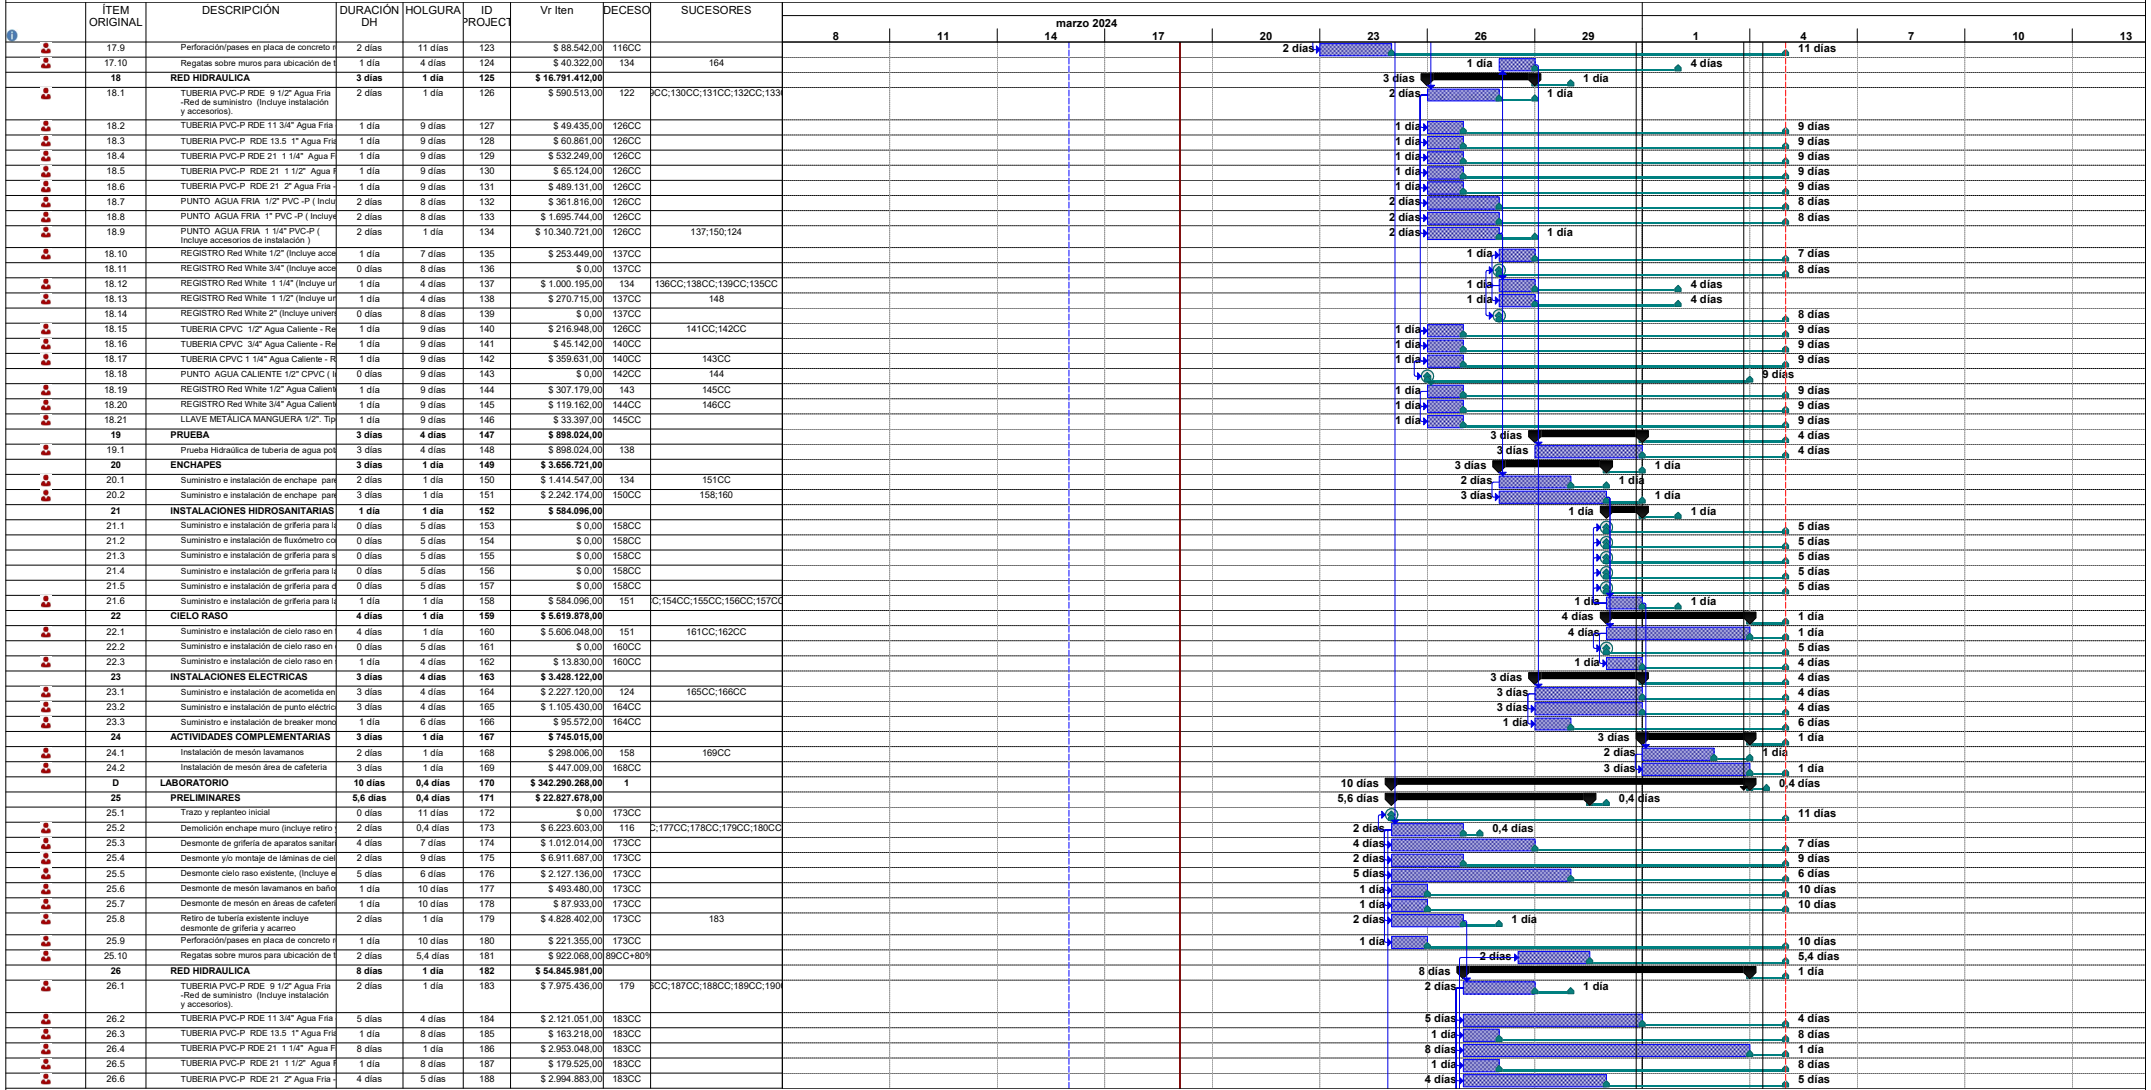

Tarea Normal Ruta Critica  
División Tarea Normal Ruta Critica  
Tarea Normal NO Critica  
División Tarea Normal NO Critica  
Progreso En Duración Tareas Normales  
Progreso En Costos Tareas Normales  
Hito Tareas Normales  
Holgura Total  
Posposición Previsto a Real Línea de Base  
Posposición Previsto a Real Línea de Base  
Resumen General  
Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida)


División Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida)  
Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogida)  
División Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogida)  
Hito Tarea Resumida (Recogida)  
Progreso En Duración Tarea Resumida (Recogida)  
Progreso En Costos Tarea Resumida (Recogida)  
Tarea Externa  
Hito Tarea Externa  
Fecha Límite  
Agrupar por Síntesis  
Tarea Resumen Ruta Critica

Tarea Resumen Ruta NO Critica  
Progreso En Duración Tarea Resumen  
Progreso En Costos Tarea Resumen  
Hito Tarea Resumen  
Progreso del Resumen  
Tarea Prevista Línea de Base  
Tarea Prevista Línea de Base  
División Tarea Prevista Línea de Base  
Hito de Línea de Base  
Tarea Prevista Línea de Base  
Tarea Prevista Línea de Base 1 - AJUSTADA  
División Tarea Prevista Línea de Base 1 - AJUSTADA

Hito inactivo  
Resumen inactivo  
Tarea manual  
solo duración  
Informe de resumen manual  
Resumen manual  
solo el comienzo  
solo fin  
Tareas externas  
Hito externo  
Resumen del Proyecto

# DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

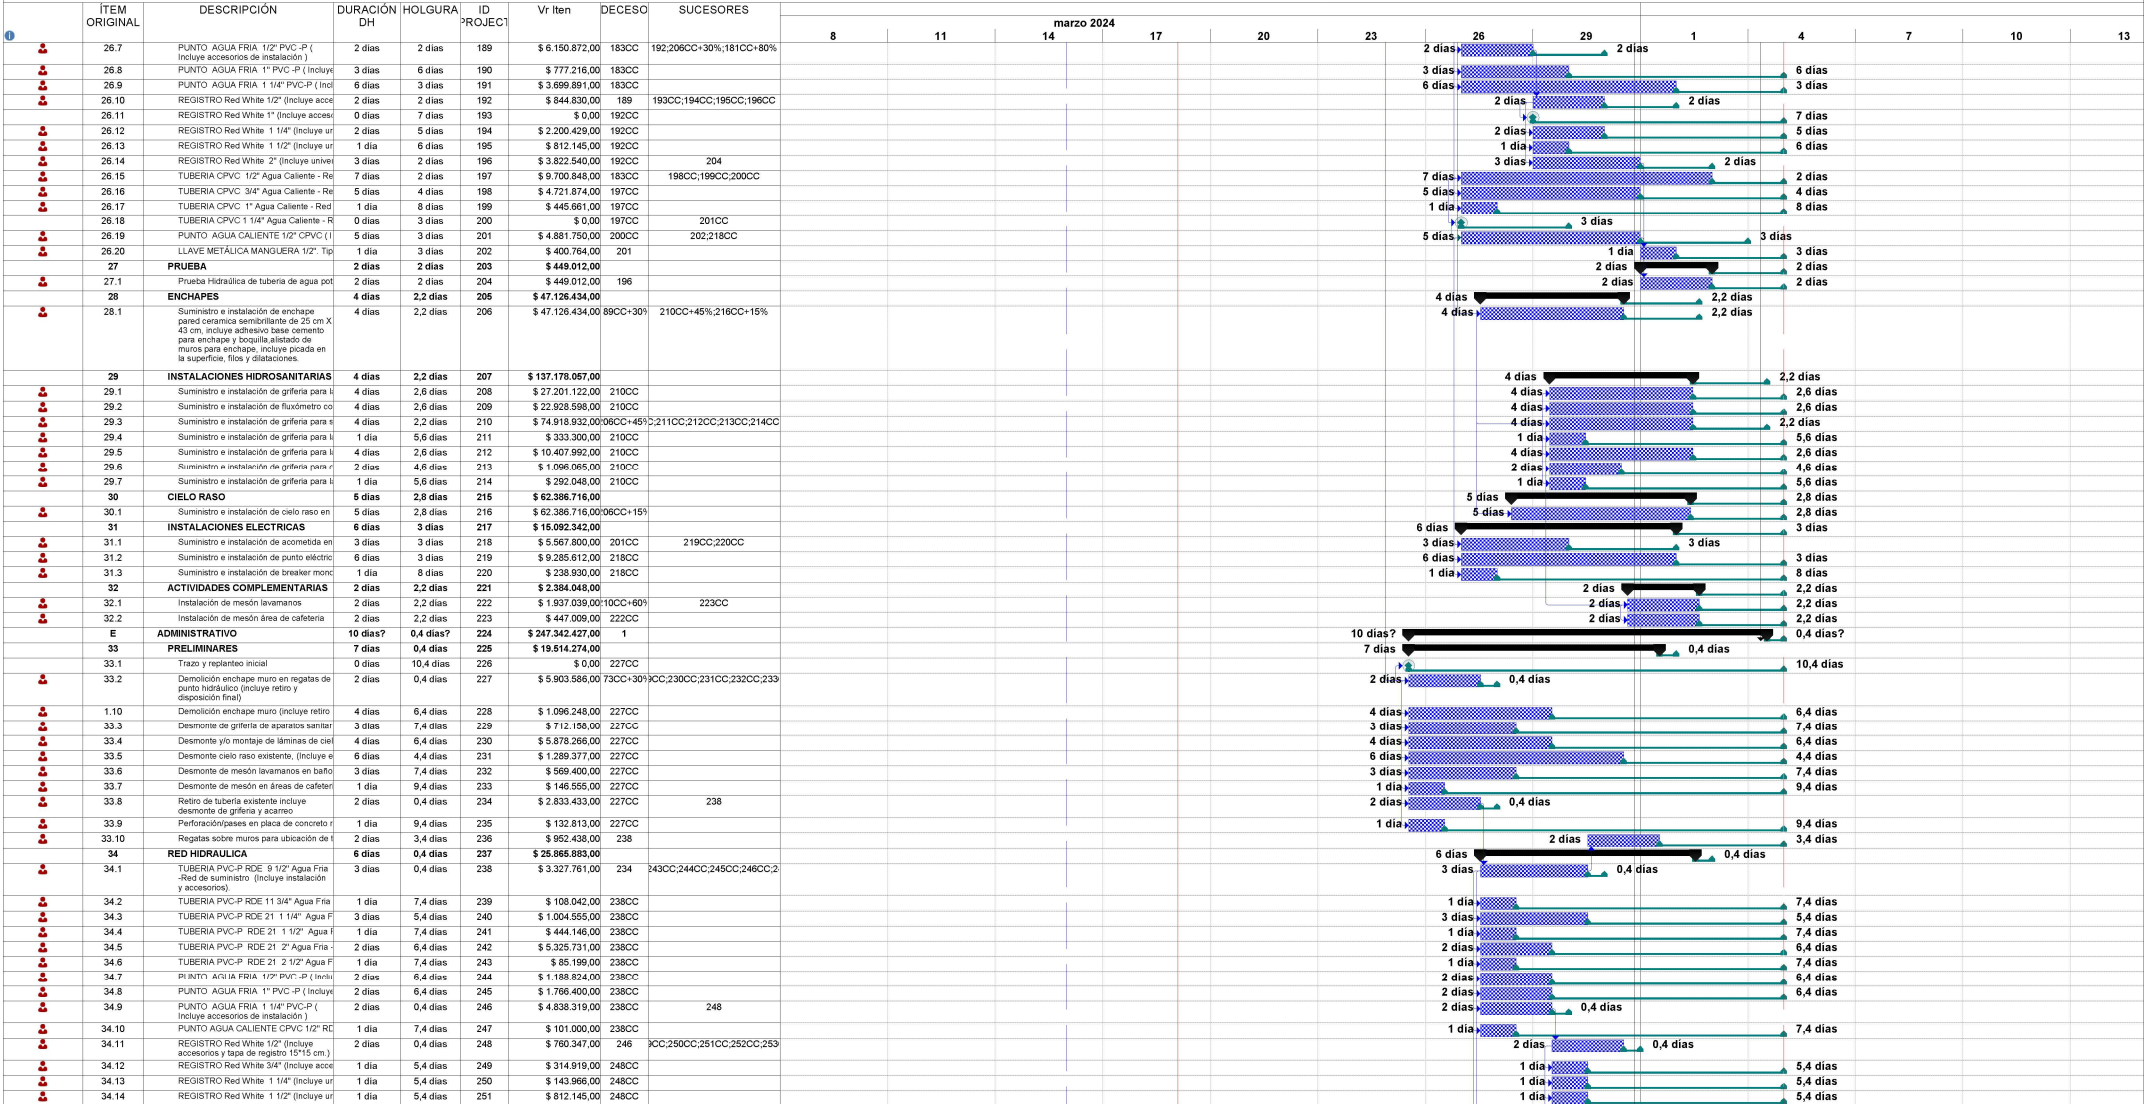

Tarea Normal Ruta Critica  
 División Tarea Normal Ruta Critica  
 Tarea Normal NO Critica  
 División Tarea Normal NO Critica  
 Progreso En Duración Tareas Normales  
 Progreso En Costos Tareas Normales  
 Hito Tareas Normales  
 Holgura Total  
 Posposición Previsto a Real Línea de Base  
 Posposición Previsto a Real Línea de Base  
 Resumen General  
 Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida)

División Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida)  
 Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogida)  
 División Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogida)  
 Hito Tarea Resumida (Recogida)  
 Progreso En Duración Tarea Resumida (Recogida)  
 Progreso En Costos Tarea Resumida (Recogida)  
 Tarea Externa  
 Hito Tarea Externa  
 Fecha Límite  
 Agrupar por Síntesis  
 Tarea Resumen Ruta Critica

Tarea Resumen Ruta NO Critica  
 Progreso En Duración Tarea Resumen  
 Progreso En Costos Tarea Resumen  
 Hito Tarea Resumen  
 Progreso del Resumen  
 Tarea Prevista Línea de Base  
 Tarea Prevista Línea de Base  
 División Tarea Prevista Línea de Base  
 Hito Línea de Base  
 Tarea Prevista Línea de Base  
 Tarea Prevista Línea de Base 1 - AJUSTADA  
 División Tarea Prevista Línea de Base 1 - AJUSTADA

Hito inactivo  
 Resumen inactivo  
 Tarea manual  
 solo duración  
 Informe de resumen manual  
 Resumen manual  
 solo el comienzo  
 solo fin  
 Tareas externas  
 Hito externo  
 Resumen del Proyecto

[illegible]

**JORNADA LABORAL : LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-12:00M  
Y DE 2:00 PM A 6:00 PM SABADOS DE 8:00 AM - 1:00 PM**

[illegible]

Tarea Normal Ruta Crítica		División Tarea Ruta Crítica Resumida (Recogida)		Tarea Resumen Ruta NO Crítica		Hito inactivo	
División Tarea Normal Ruta Crítica		Tarea Normal NO Crítica Resumida (Recogida)		Progreso En Duración Tarea Resumen		Resumen inactivo	
Tarea Normal NO Crítica		División Tarea Normal NO Crítica Resumida (Recogida)		Progreso En Costos Tarea Resumen		Tarea manual	
División Tarea Normal NO Crítica		Hito Tarea Resumida (Recogida)		Hito Tarea Resumen		solo duración	
Progreso En Duración Tareas Normales		Progreso En Duración Tarea Resumida (Recogida)		Progreso del Resumen		Informe de resumen manual	
Progreso En Costos Tareas Normales		Progreso En Costos Tarea Resumida (Recogida)		Tarea Prevista Línea de Base		Resumen manual	
Hito Tareas Normales		Tarea Externa		Tarea Prevista Línea de Base		solo el comienzo	
Holgura Total		Hito Tarea Externa		División Tarea Prevista Línea de Base		solo fin	
Posposición Previsto a Real Línea de Base		Fecha Limite		Hito de Línea de Base		Tareas externas	
Posposición Previsto a Real Línea de Base		Agrupar por Síntesis		Tarea Prevista Línea de Base		Hito externo	
Resumen General		Tarea Resumen Ruta Crítica		Tarea Prevista Línea de Base 1 - AJUSTADA		Resumen del Proyecto	
Tarea Ruta Crítica Resumida (Recogida)				División Tarea Prevista Línea de Base 1 - AJUSTADA			

JORNADA LABORAL : LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-12:00M  
Y DE 2:00 PM A 6:00 PM SABADOS DE 8:00 AM - 1:00 PM
